



Projekat: Izgradnja auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo

IZVJEŠTAJ O STATUSU I DINAMICI PROJEKTA

01.03. - 08.03.2022.



mart 2022. godine




Sadržaj:

1	NAPREDOVANJE RADOVA.....	3
1.1	NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU	3
1.1.1	Mostovi	3
1.1.2	Tuneli.....	4
1.1.3	Otvorena trasa	4
1.1.4	Asfalt na auto-putu.....	4
1.1.5	Elektro-mašinske instalacije i oprema	7
1.1.6	Baza za održavanje Pelev Brijeg.....	7
1.1.7	Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo	7
1.2	NAKNADNI RADOVI.....	8
1.2.1	Prilog 3 -petlja Smokovac	8
1.2.2	Prilog 4 - Sistem za Vodosnabdijevanje.....	8
1.2.3	Prilog 5 -izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica.....	8
2	RESURSI.....	8
3	FINANSIJSKI STATUS	9
3.1	Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru.....	9
3.2	Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5	9



1 NAPREDOVANJE RADOVA


1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU

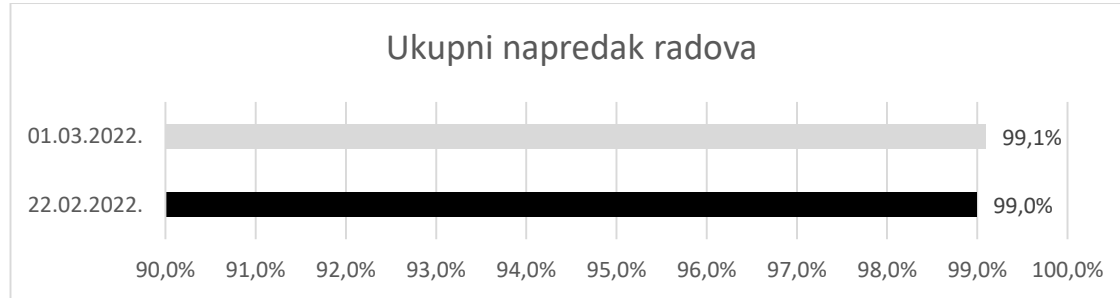

1.1.1 Mostovi


Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na ugradnji opreme mostova, radovi na uređenju terena i ispitivanje mostova probnim opterećenjem.

MOST	Ograda mosta	Hidroizolacija	Asfalt	Instalacije	Ispitivanje probnim opt.	Uređenje terena ispod
0 SMOKOVAC						
1 GORNJE MRKE						
2 MORACICA						
3 ĐURIČEV LAZ						
4 RATKOV LAZ						
5 LUTOVO						
6 SUVOVARA						
7 KRKOR						
8 MIŠTICA						
9 ZAGRAĐE						
28 PODOVI						
10 ČE STOGAZ						
11 UVAC 1						
12 UVAC 2						
13 UVAC 3						
14 UVAC 4						
15 PAJKOV VIR						
16 PRE SLO						
17 JABUKA						
18 TARA 1						
19 TARA 2						



Završeno
U toku

1.1.2 Tuneli

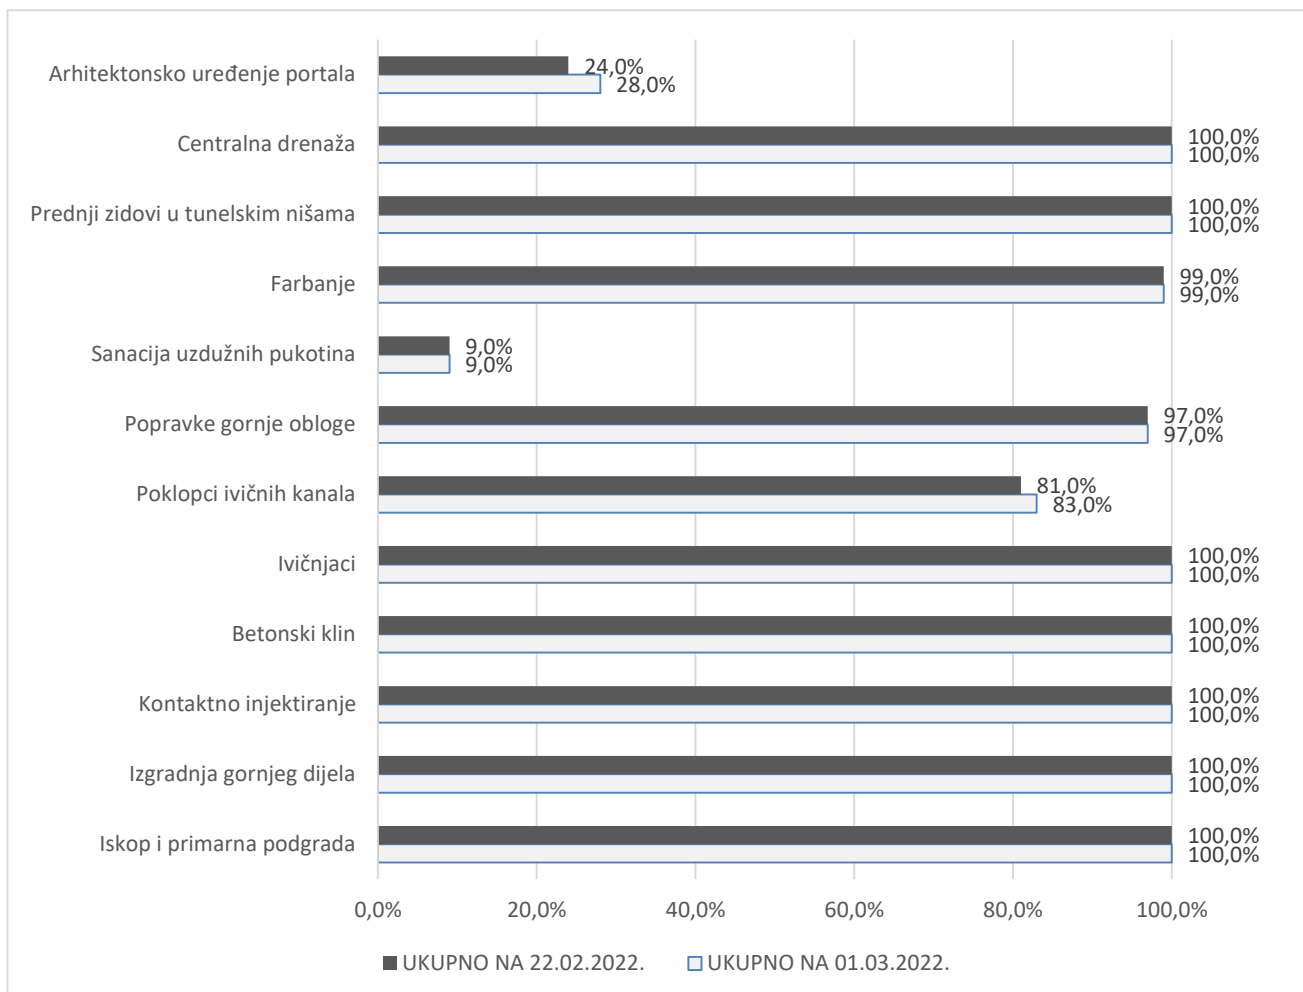

1.1.3 Otvorena trasa

Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi izvedeno oko **98.8%** radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj konstrukciji itd....

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) iznosi oko 99.5%. Preostali su završni radovi na zaštiti kosina.


Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto-puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti.

1.1.4 Asfalt na auto-putu


Na autoputu, petljama i devijacijama u toku ovog izvještajnog perioda, zbog vremenskih uslova, ograničeno su izvođeni radovi na otvorenoj trasi. Rađeno je na ispitivanju ugrađenog asfalta na prilaznom putu bazi za održavanje na Pelevom Brijegu.




Status izvedenih radova na asfaltu na trasi autoputa je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednom grafiku.

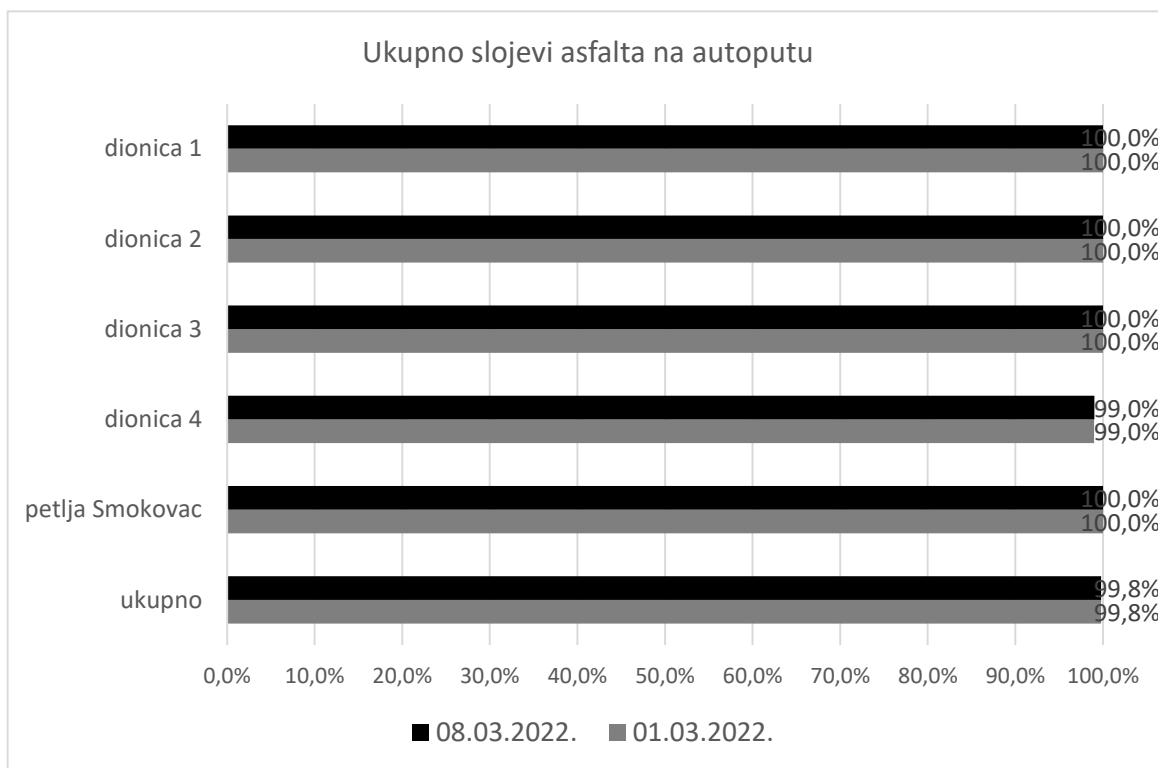

Status izvedenih radova na asfaltu na rampama petlji je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednom grafiku.

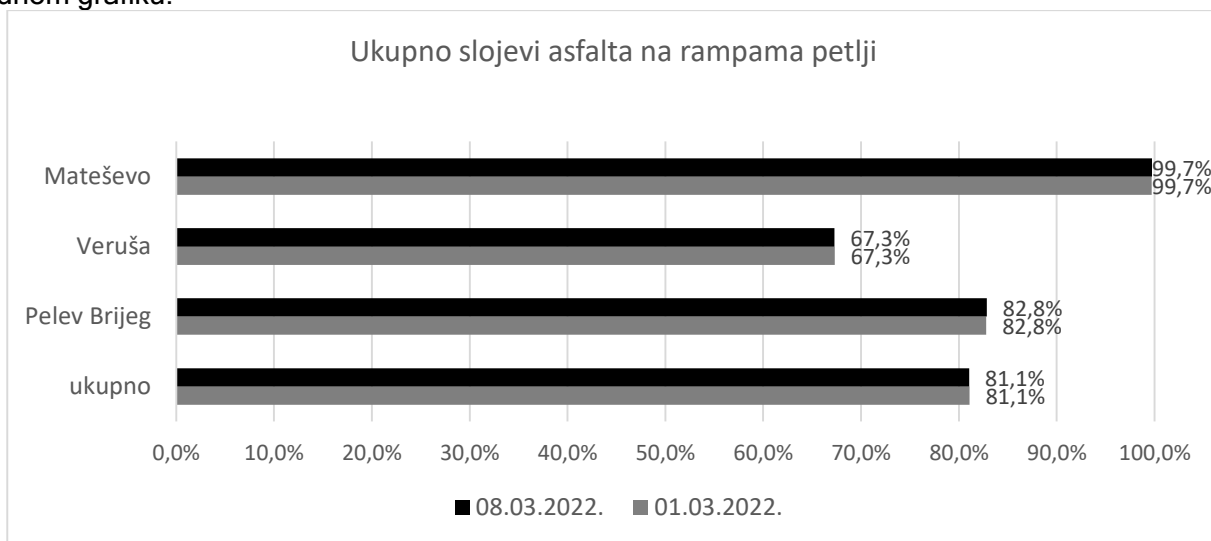


Status izvedenih radova na asfaltu na devijacijama je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednom grafiku.

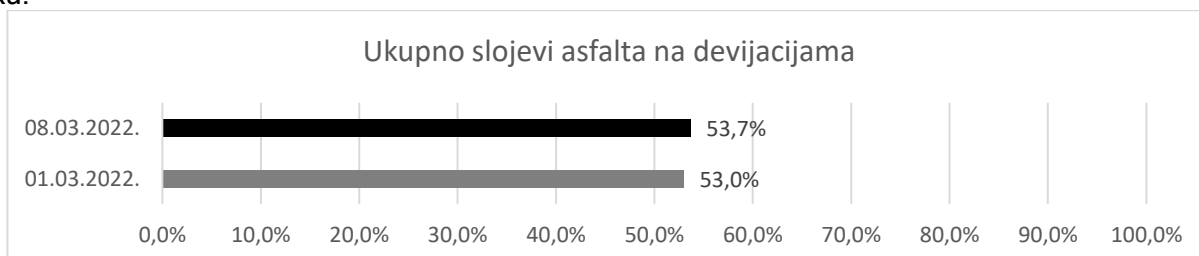



1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema

Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera:

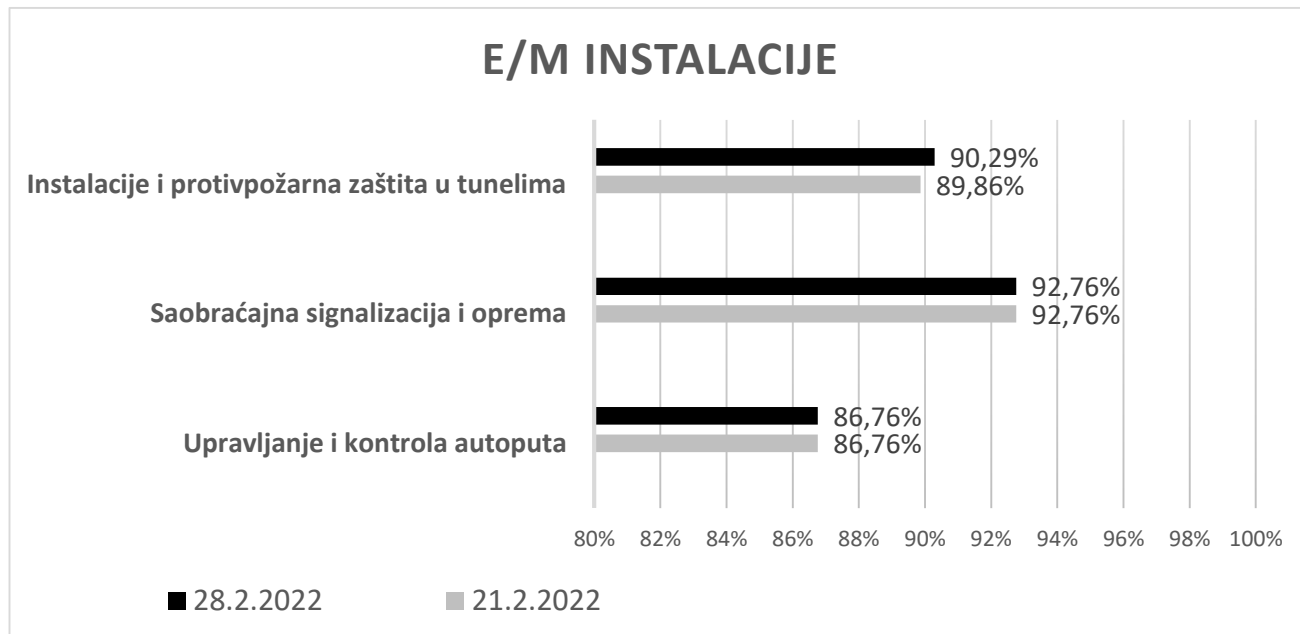

1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m². Bruto površina svih objekata iznosi cca 6300 m².

Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 97%.

1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo je oko 98%.

1.2 NAKNADNI RADOVI

1.2.1 Prilog 3 -petlja Smokovac

Na Petlji Smokovac je do sada završeno oko 99% radova.

U ovom izvještajnom periodu, nastavljni su radovi na zidovima za zaštitu od buke.

1.2.2 Prilog 4 – Sistem za Vodosnabdijevanje

Prema izvještaju Izvođača do sada je realizovano 99,7% radova iz Priloga 4.

1.2.3 Prilog 5 –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica

Vezano za realizaciju Priloga 5 Ugovora, izvršena je priopredaja od strane Izvođača/Inženjera dionice 20 kV kablovske kanalizacije od TS 110/20 kV Autoput 2 - Mateševo do TS 20/0,4 kV „19 tunel Mateševo“ Izvođaču TNEE. U toku su radovi na postavljanju kablovskih regala na izgrađenom pomoćnom mostu na rijeci Drcka kao preduslov za instalaciju 20 kV i optičkih kablova na ovoj dionici.

CRBC je dostavio zahtjev da mu se omogući povezivanje NN kablova u trafostanicama 20/0,4 kV. U koordinaciji sa Inženjerom, a na zahtjev Nadzora TNEE, definisan je Protokol za ulazak u trafostanice radi



povezivanja NN kablova u trafostanicama, a koji treba da bude potpisan od strane CRBC-a i Nadzora TNEE uz posredovanje Inženjera. U skladu sa dogovorenim protokolom započeto je sa povezivanjem NN kablova u nekim trafostanicama prema dostavljenom planu Izvođača. Vezano za povezivanje NN kablova u TS „Tunel Mala Trava“ obzirom da Izvođač TNEE nije omogućio radove u skladu sa dogovorenim protokolom, Izvođač je dostavio Obavještenje o namjeri potraživanja za produženja roka i dodatnog plaćanja usljed Investitorovog neuspjeha da obezbijedi ulazak u posjed za izgradnju tunelskih trafostanica (Potraživanje br. 191 - dopis br. RB-BBH/279/CD od 25.02.2022. godine).

2 RESURSI

U narednoj tabeli prikazan je broj radnika za period od 15.2.-22.01.2022.

ORGANIZACIONAJEDINICA	UKUPNO	KINESKI DRŽAVLJANI			DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA		
	(MEĐUZBIR1+2)	MEĐUZBIR1	RUKOVO- DIOCI	RADNICI	MEĐUZBIR2	CRBC	PODIZVOĐAČI
DIONICA 1	59	8	8	0	51	11	40
DIONICA 2	91	35	12	23	56	6	50
DIONICA 3	77	59	12	47	18	11	7
DIONICA 4	202	55	13	42	147	29	118
DIONICA 5	126	96	24	72	30	9	21
Asfaltni radovi	20	0	U SKLOPU DIONICA	0	20	0	20
GLAVNA KANCELARIJA	53	20	20	0	33	33	0
Petlja Smokovac	12	0	U SKLOPU GLAVNE KANCELARIJ E	0	12	0	12
PROJEKTNI ODSJEK 1	3	2	2	0	1	1	0
PROJEKTNI ODSJEK 2	4	0	0	0	4	4	0
SVE UKUPNO	647	275	91	184	372	104	268

3 FINANSIJSKI STATUS

3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 28.02.2022. godine data je u tabeli koja slijedi.



#	Opis	Iznos (EUR)	%	Ukupna isplata iz Budgeta CG u EUR (15%)	Ukupna isplata iz kredita u USD (85%) 1EUR=\$1,3718
A	Ukupna Vrijednost Ugovora	809,577,356.14 €		121,436,603.42 €	\$943,991,500.00
	<i>Amount of determined Variations/Iznos dogovorenih izmjena</i>	-1,523,595.59 €			
	Contract Price/ Ugovorna Cijena (Clause 14/Klauzula 14)	808,053,760.55 €			
B	Preostalo da se vrati avans (1-2)	44,734,920.69 €	27.63%	6,710,238.10 €	\$52,162,259.58
1	Isplaćeni avans	161,915,471.23 €	20.00%		
2	Amortizacija avansnog plaćanja	117,180,550.54 €	72.37%		
C	Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova	747,818,223.90 €	92.37%	112,172,733.58 €	\$871,978,483.61
D	Garantni depozit (5% od C)	37,390,911.19 €	4.62%	5,608,636.68 €	\$43,598,924.18
E	Ostalo	5,078,835.10 €		761,825.27 €	\$5,922,074.09
3	Neusaglašenost (Zadržavanja)	2,484,000.00 €			
4	Odbici	2,594,835.10 €			
F	Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E)	750,083,398.29 €	92.65%	105,802,271.64 €	\$822,457,485.34
G	Preostalo da se isplati (A-F)	59,493,957.85 €	7.35%	8,924,093.68 €	\$69,371,755.09

U skladu sa Ugovoru o projektovanju i izgradnji, Izvođaču je na dan 28.01.2022. godine ukupno isplaćeno **750.083.398,29€ (92,65%).**

Po osnovu **avansa** je isplaćeno **20%** od ukupno ugovorene sume odnosno **161.915.471,22€**, odkojeg je vraćeno **117.180.550,54€ (72,37%).**

3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5

OPIS	ANEX 3- Petlja Smokova	ANEX 4- Vodosnadbijevanje	ANEX 5- Trajno napajanje
I Isplaćeni AVANS	6,091,313.80 €	4,261,029.30 €	966,000.00 €
II Ukupno isplaćeno po situacijama	20,904,055.36 €	6,171,540.14 €	2,227,570.88 €
<i>Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi</i>	<i>27,687,467.00 €</i>	<i>8,880,491.85 €</i>	<i>3,527,244.09 €</i>
<i>Garantni depozit</i>	<i>-1,384,373.35 €</i>	<i>-444,024.59 €</i>	<i>-176,362.20 €</i>
<i>Amortizacija avansnog plaćanja</i>	<i>-5,399,038.30 €</i>	<i>-2,264,927.12 €</i>	<i>-640,311.02 €</i>
<i>Neusaglašenost (Zadržavanja)</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
<i>Odbici</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>-482,999.99 €</i>
III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II)	26,995,369.16 €	10,432,569.44 €	3,193,570.88 €
Ukupno isplaćeno do sad u %	88.64%	73.45%	66.12%
Ukupna Vrijednost Ugovora	30,456,569.00 €	14,203,431.00 €	4,830,000.00 €
Preostalo da se isplati	-3,461,199.84 €	-3,770,861.56 €	-1,636,429.12 €
Preostalo da se isplati u %	-11.36%	-26.55%	-33.88%
