




**Projekat: Izgradnja auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo**

---

**IZVJEŠTAJ O STATUSU I DINAMICI PROJEKTA**

**08.02.-15.02.2022.**

---

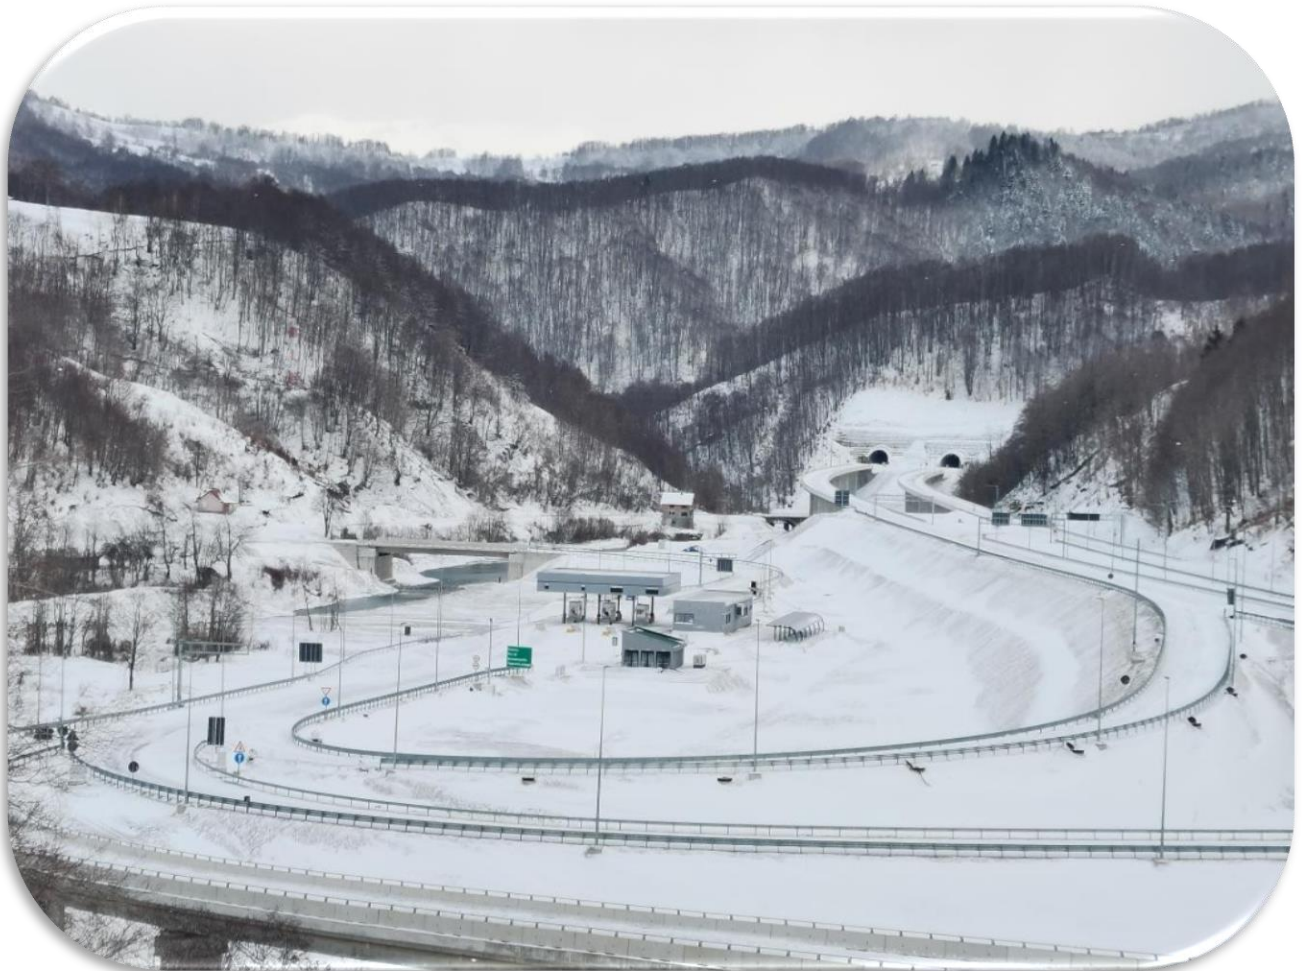

**februar 2022. godine**




Sadržaj:

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1     | NAPREDOVANJE RADOVA.....   | 3 |
| 1.1   | NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU .....  | 3 |
| 1.1.1 | Mostovi .....  | 3 |
| 1.1.2 | Tuneli.....  | 4 |
| 1.1.3 | Otvorena trasa .....   | 4 |
| 1.1.4 | Asfalt na auto-putu.....   | 4 |
| 1.1.5 | Elektro-mašinske instalacije i oprema .....  | 7 |
| 1.1.6 | Baza za održavanje Pelev Brijeg.....   | 7 |
| 1.1.7 | Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo .....   | 7 |
| 1.2   | NAKNADNI RADOVI.....   | 8 |
| 1.2.1 | Prilog 3 -petlja Smokovac .....  | 8 |
| 1.2.2 | Prilog 4 - Sistem za Vodosnabdijevanje.....  | 8 |
| 1.2.3 | Prilog 5 -izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica..... | 8 |
| 2     | RESURSI.....   | 8 |
| 3     | FINANSIJSKI STATUS .....   | 9 |
| 3.1   | Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru.....   | 9 |
| 3.2   | Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 .....  | 9 |



## 1 NAPREDOVANJE RADOVA



### 1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU

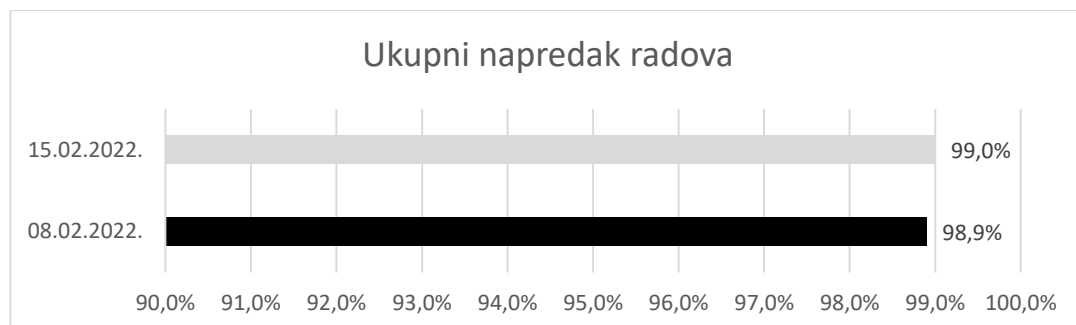

#### 1.1.1 Mostovi


Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na ugradnji opreme mostova, radovi na uređenju terena i ispitivanje mostova probnim opterećenjem.

| MOST          | Ograda mosta | Hidroizolacija | Asfalt | Instalacije | Ispitivanje probnim opt. | Uređenje terena ispod |
|---------------|--------------|----------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 0 SMOKOVAC    |              |                |        |             |                          |                       |
| 1 GORNJE MRKE |              |                |        |             |                          |                       |
| 2 MORACICA    |              |                |        |             |                          |                       |
| 3 ĐURICEV LAZ |              |                |        |             |                          |                       |
| 4 RATKOV LAZ  |              |                |        |             |                          |                       |
| 5 LUTOVO      |              |                |        |             |                          |                       |
| 6 SUVOVARA    |              |                |        |             |                          |                       |
| 7 KRKOR       |              |                |        |             |                          |                       |
| 8 MIŠTICA     |              |                |        |             |                          |                       |
| 9 ZAGRAĐE     |              |                |        |             |                          |                       |
| 28 PODOVI     |              |                |        |             |                          |                       |
| 10 ČESTOGAZ   |              |                |        |             |                          |                       |
| 11 UVAC 1     |              |                |        |             |                          |                       |
| 12 UVAC 2     |              |                |        |             |                          |                       |
| 13 UVAC 3     |              |                |        |             |                          |                       |
| 14 UVAC 4     |              |                |        |             |                          |                       |
| 15 PAJKOV VIR |              |                |        |             |                          |                       |
| 16 PRE SLO    |              |                |        |             |                          |                       |
| 17 JABUKA     |              |                |        |             |                          |                       |
| 18 TARA 1     |              |                |        |             |                          |                       |
| 19 TARA 2     |              |                |        |             |                          |                       |

 Završeno  
 U toku



### 1.1.2 Tuneli

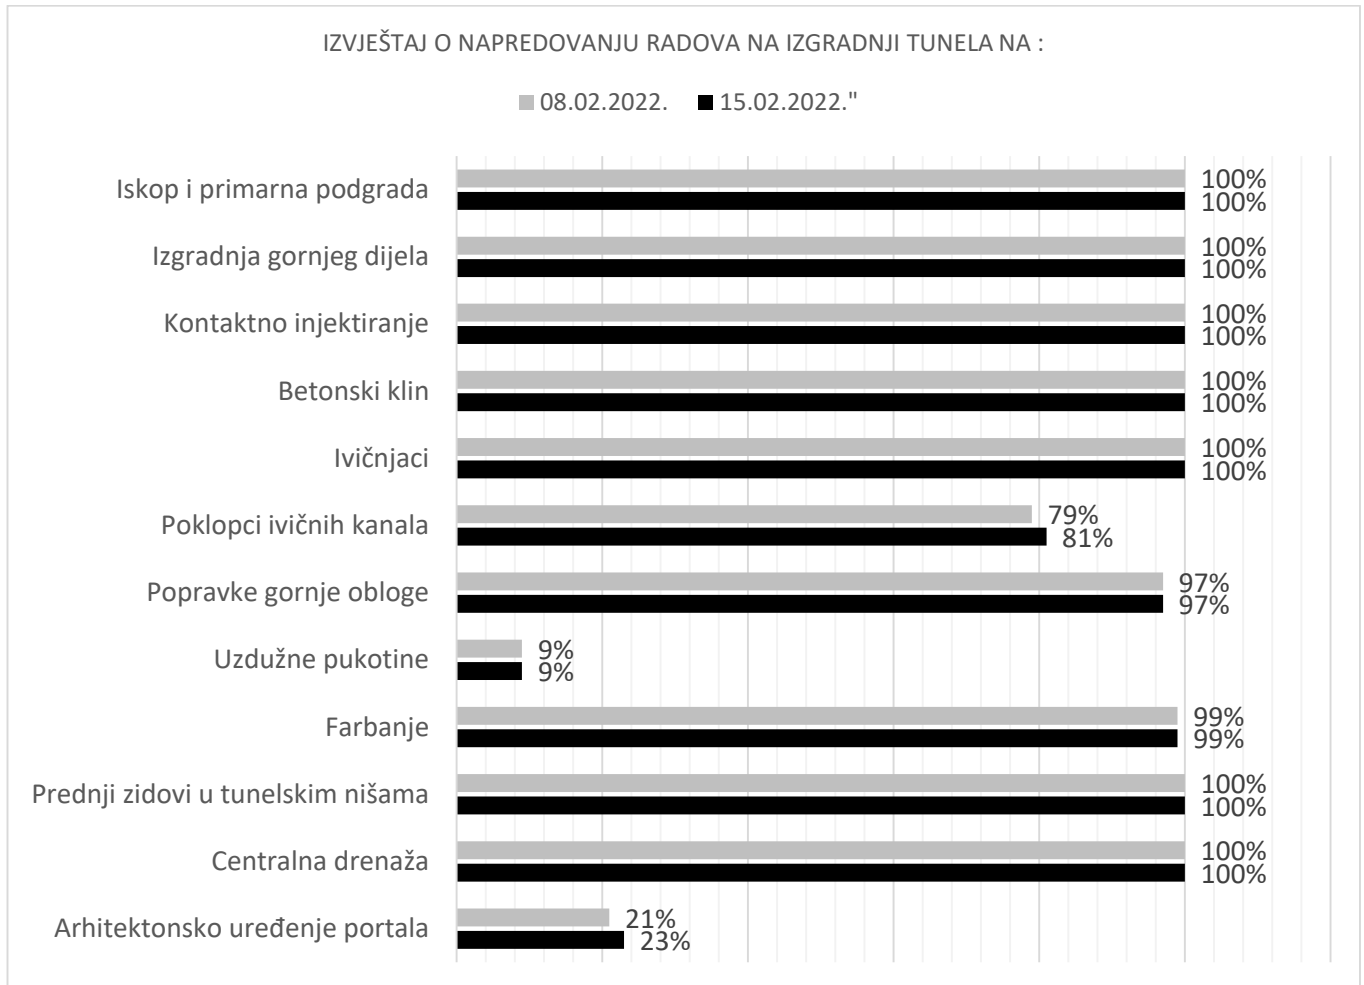

### 1.1.3 Otvorena trasa

Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi izvedeno oko **98.8%** radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj konstrukciji itd....

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) iznosi oko 99.5%. Preostali su završni radovi na zaštiti kosina.




Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto-puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti.

### 1.1.4 Asfalt na auto-putu

Na autoputu, petljama i devijacijama u toku ovog izvještajnog perioda, zbog loših vremenskih uslova, sniježnih padavina i niskih temperatura, nijesu izvođeni radovi na ugradnji preostalih slojeva asfalta.




Status izvedenih radova na asfaltu je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednim graficima.

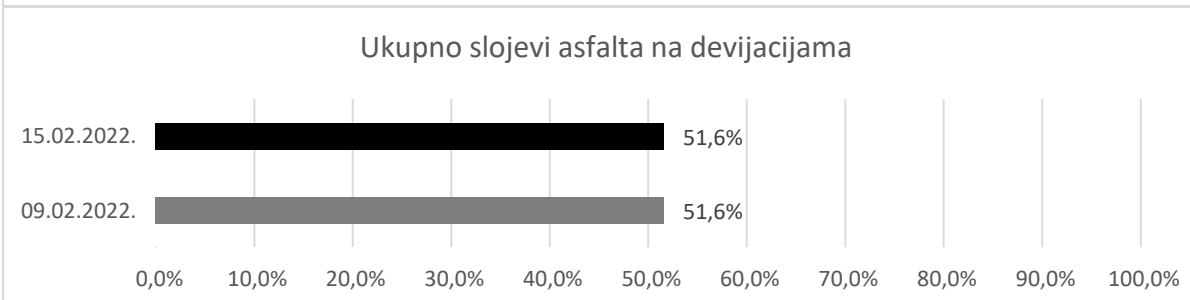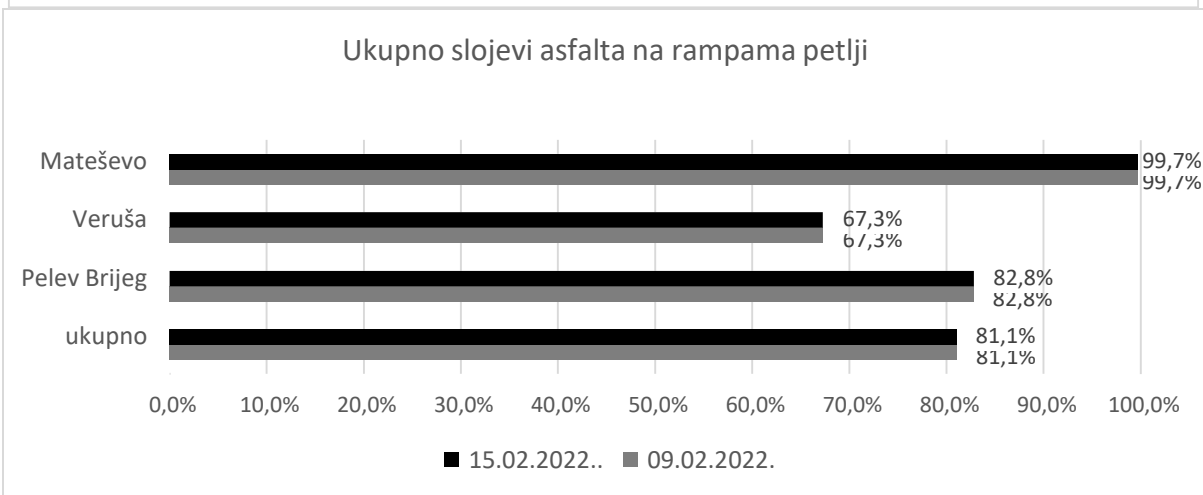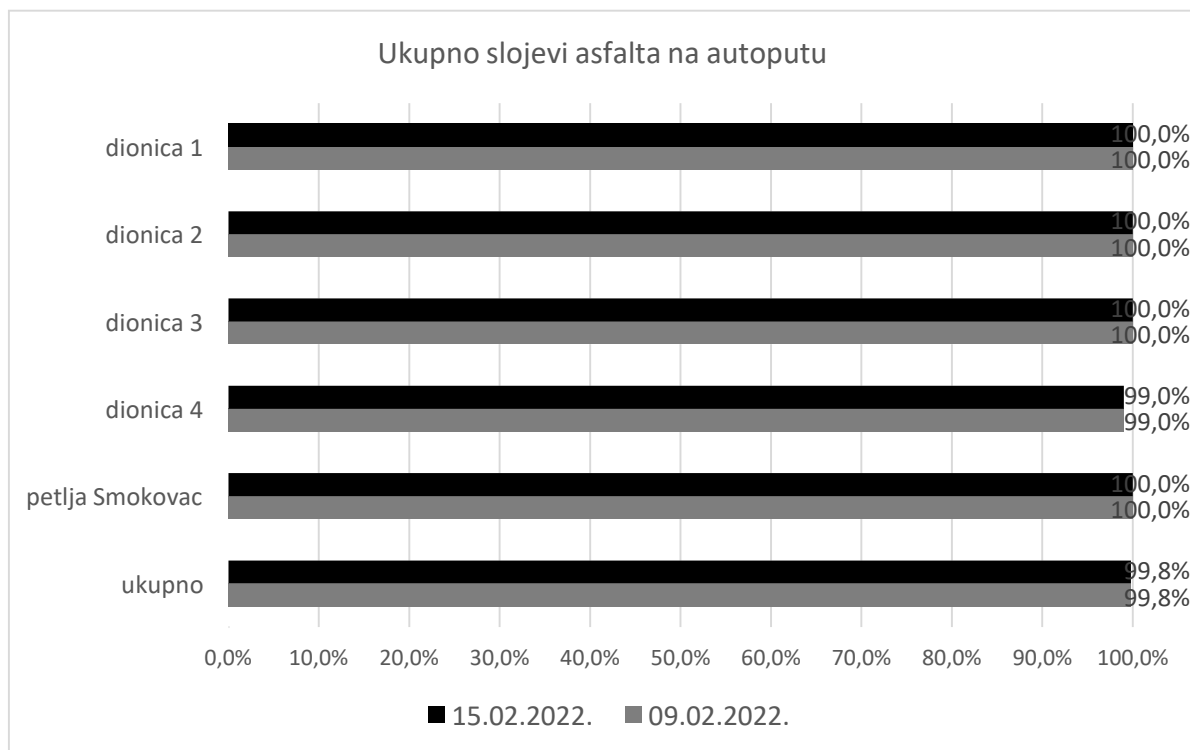

U toku ovog izvještajnog perioda, zbog loših vremenskih uslova i snježnih padavina, obim izvedenih radova na otvorenoj trasi je mali i odnosi se na pripreme za ispitivanje tamponskog sloja na devijacijama na dijelu 2.

### 1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema

Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera:

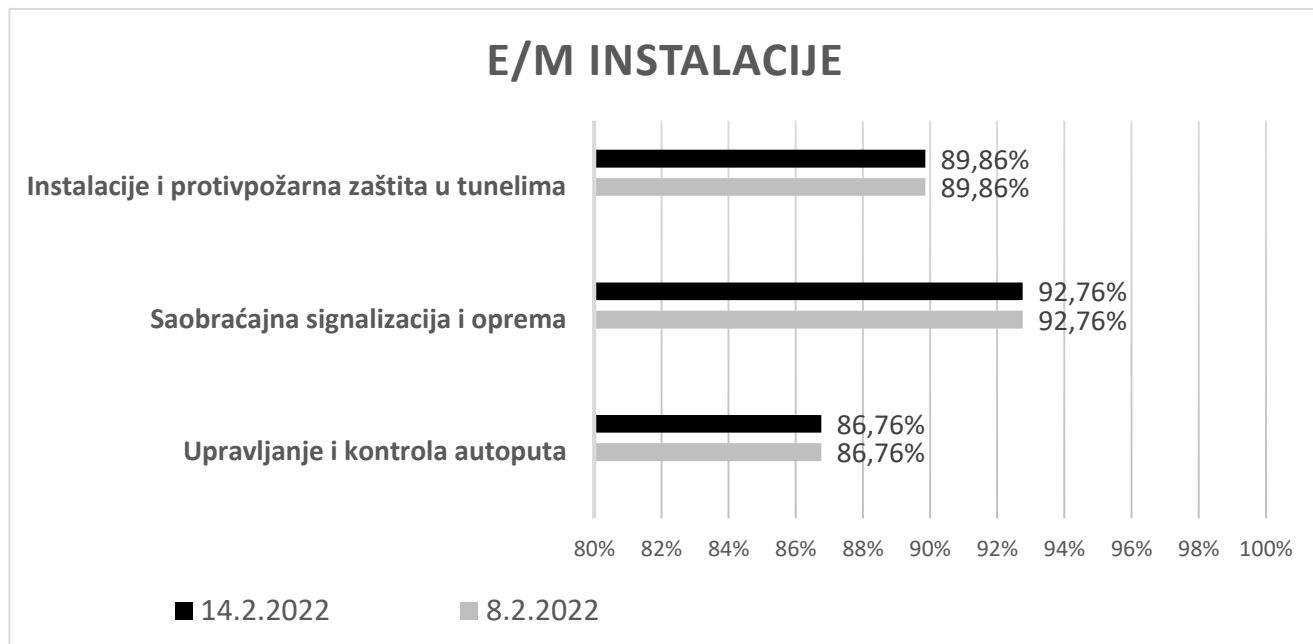

### 1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m<sup>2</sup>. Bruto površina svih objekata iznosi cca 6300 m<sup>2</sup>.

Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 97%.

### 1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo je oko 98%.

## 2 RESURSI

U narednoj tabeli prikazan je broj radnika za period od 18.-25.01.2022.

| ORGANIZACIONAJEDINICA | UKUPNO<br>(MEĐUZBIR1+2) | KINESKI DRŽAVLJANI |                        |          | DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA |           |             |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------|
|                       |                         | MEĐUZBIR1          | RUKOVO-<br>DIOCI       | RADNICI  | MEĐUZBIR2             | CRBC      | PODIZVOĐAČI |
| DIONICA 1             | <b>62</b>               | <b>11</b>          | <b>11</b>              | <b>0</b> | <b>51</b>             | <b>11</b> | <b>40</b>   |
| DIONICA 2             | 91                      | 35                 | 12                     | 23       | 56                    | 6         | 50          |
| DIONICA 3             | 134                     | 62                 | 12                     | 50       | 72                    | 11        | 61          |
| DIONICA 4             | 228                     | 60                 | 16                     | 44       | 168                   | 30        | 138         |
| DIONICA 5             | 128                     | 98                 | 26                     | 72       | 30                    | 9         | 21          |
| Asfaltni radovi       | 20                      | 0                  | Uključeno u<br>dionice | 0        | 20                    | 0         | 20          |
| GLAVNA KANCELARIJA    | 53                      | 20                 | 20                     | 0        | 33                    | 33        | 0           |

|                    |            |            |                                |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Petlja Smokovac    | 12         | 0          | Uključeno u glavnu kancelariju | 0          | 12         | 0          | 12         |
| PROJEKTNI ODSJEK 1 | 3          | 2          | 2                              | 0          | 1          | 1          | 0          |
| PROJEKTNI ODSJEK 2 | 4          | 0          | 0                              | 0          | 4          | 4          | 0          |
| <b>SVE UKUPNO</b>  | <b>735</b> | <b>288</b> | <b>99</b>                      | <b>189</b> | <b>447</b> | <b>105</b> | <b>342</b> |

### 3 FINANSIJSKI STATUS

#### 3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 15.02.2022. godine data je u tabeli koja slijedi.

| #        | Opis   | Iznos (EUR)             | %             | Ukupna isplata iz Budgeta CG u EUR (15 %) | Ukupna isplata iz kredita u USD (85%) 1EUR=\$1,3718 |
|----------|--|-------------------------|---------------|---|---|
| <b>A</b> | <b>Ukupna Vrijednost Ugovora</b>                                 | <b>809,577,356.14 €</b> |               | <b>121,436,603.42 €</b>                   | <b>\$943,991,500.00</b>                             |
|          | <i>Amount of determined Variations/Iznos dogovorenih izmjena</i> | <i>-1,523,595.59 €</i>  |               |   |   |
|          | <b>Contract Price/ Ugovorna Cijena (Clause 14/Klauzula 14)</b>   | <b>808,053,760.55 €</b> |               |   |   |
| <b>B</b> | <b>Preostalo da se vrati avans (1-2)</b>                         | <b>46,094,729.68 €</b>  | <b>28.47%</b> | <b>6,914,209.45 €</b>                     | <b>\$53,747,837.65</b>                              |
| 1        | Isplaćeni avans  | 161,915,471.23 €        | 20.00%        |   |   |
| 2        | Amortizacija avansnog plaćanja                                   | 115,820,741.55 €        | 71.53%        |   |   |
| <b>C</b> | <b>Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova</b>              | <b>741,019,178.97 €</b> | <b>91.53%</b> | <b>111,152,876.85 €</b>                   | <b>\$864,050,593.25</b>                             |
| <b>D</b> | <b>Garantni depozit (5% od C)</b>                                | <b>37,050,958.95 €</b>  | <b>4.58%</b>  | <b>5,557,643.84 €</b>                     | <b>\$43,202,529.66</b>                              |
| <b>E</b> | <b>Ostalo</b>  | <b>7,577,397.75 €</b>   |               | <b>1,136,609.66 €</b>                     | <b>\$8,835,473.09</b>                               |
| 3        | Neusaglašenost (Zadržavanja)                                     | 2,552,500.00 €          |               |   |   |
| 4        | Odbici   | 5,024,897.75 €          |               |   |   |
| <b>F</b> | <b>Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E)</b>                     | <b>742,485,551.95 €</b> | <b>91.71%</b> | <b>104,458,623.34 €</b>                   | <b>\$812,012,590.49</b>                             |
| <b>G</b> | <b>Preostalo da se isplati (A-F)</b>                             | <b>67,091,804.19 €</b>  | <b>8.29%</b>  | <b>10,063,770.63 €</b>                    | <b>\$78,231,071.86</b>                              |

U skladu sa Ugovorom o projektovanju i izgradnji, Izvođaču je na dan 20.12.2021. godine ukupno isplaćeno **742.485.551,95€ (91,71%).**

Po osnovu **avansa** je isplaćeno **20%** od ukupno ugovorene sume odnosno **161.915.471,22€**, od kojeg je vraćeno **115.820.741,55€ (71,53%).**

#### 3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5

| OPIS  | ANEX 3- Petlja Smokovac | ANEX 4- Vodosnadbijevanje | ANEX 5- Trajno napajanje |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>I Isplaćeni AVANS</b>                    | <b>6,091,313.80 €</b>   | <b>4,261,029.30 €</b>     | <b>966,000.00 €</b>      |
| <b>II Ukupno isplaćeno po situacijama</b>   | <b>20,904,055.36 €</b>  | <b>6,008,680.34 €</b>     | <b>2,047,695.79 €</b>    |
| <i>Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi</i>   | <i>27,687,467.00 €</i>  | <i>8,597,257.41 €</i>     | <i>3,270,279.69 €</i>    |
| <i>Garantni depozit</i>                     | <i>-1,384,373.35 €</i>  | <i>-429,862.87 €</i>      | <i>-163,513.98 €</i>     |
| <i>Amortizacija avansnog plaćanja</i>       | <i>-5,399,038.30 €</i>  | <i>-2,158,714.21 €</i>    | <i>-576,069.92 €</i>     |
| <i>Neusaglašenost (Zadržavanja)</i>         | <i>0.00 €</i>           | <i>0.00 €</i>             | <i>0.00 €</i>            |
| <i>Odbici</i>                               | <i>0.00 €</i>           | <i>0.00 €</i>             | <i>-482,999.99 €</i>     |
| <b>III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II)</b> | <b>26,995,369.16 €</b>  | <b>10,269,709.64 €</b>    | <b>3,013,695.79 €</b>    |
| <b>Ukupno isplaćeno do sad u %</b>          | <b>88.64%</b>           | <b>72.30%</b>             | <b>62.40%</b>            |
| <b>Ukupna Vrijednost Ugovora</b>            | <b>30,456,569.00 €</b>  | <b>14,203,431.00 €</b>    | <b>4,830,000.00 €</b>    |
| <b>Preostalo da se isplati</b>              | <b>-3,461,199.84 €</b>  | <b>-3,933,721.36 €</b>    | <b>-1,816,304.21 €</b>   |

|  |                             |         |         |         |
|--|-----------------------------|---------|---------|---------|
|  | Preostalo da se isplati u % | -11.36% | -27.70% | -37.60% |
|--|-----------------------------|---------|---------|---------|
