




*Ministarstvo finansija*

*Ponedjeljak, 07. oktobar 2024. godine*

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA ZA TREĆI KVARTAL 2024. GODINE**

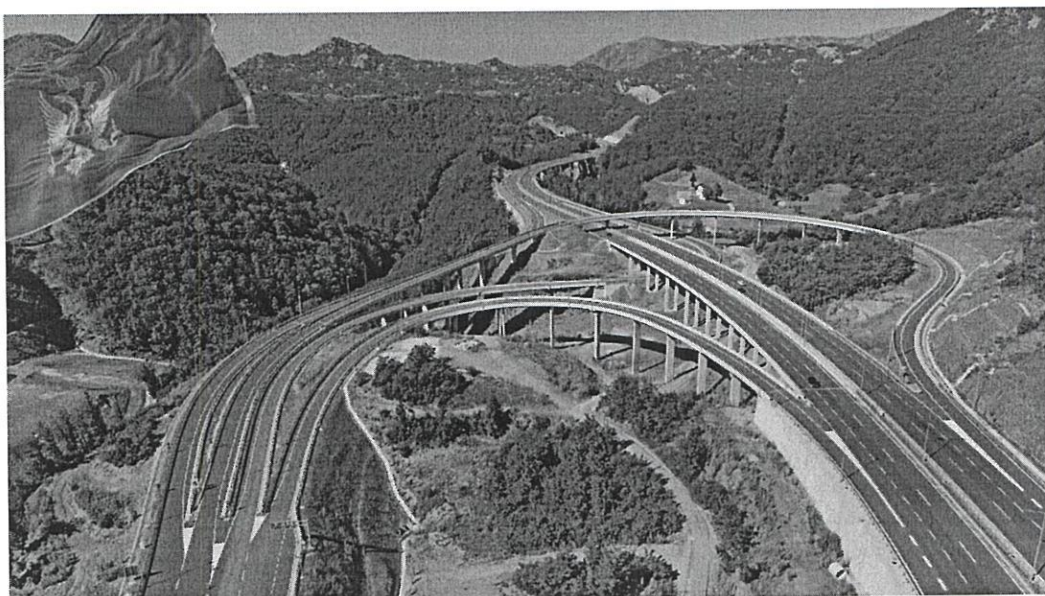

## UVOD

---

Ministarstvo finansija, u sklopu svojih nadležnosti, sprovodi aktivnosti planiranja i upravljanja kapitalnim projektima koji se realizuju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore. S tim u vezi, usmjereni smo na aktivnosti koje za cilj imaju razvoj procesa planiranja i koordinacije javnih investicija, odnosno unapređenje politika javnih investicija u saradnji sa implementacionim jedinicama, Upravom za kapitalne projekte i Upravom za saobraćaj.

Vlada Crne Gore je u januaru donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za javne investicije, kojim predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore, uz učešće resornih ministara i ključnih institucija u realizaciji kapitalnih projekata. Na ovaj način stvoren je novi institucionalni okvir za unapređenje javnih investicija, efikasniju koordinaciju i realizaciju aktivnosti u dijelu kapitalnih projekata i drugih projekata infrastrukturnog razvoja.

Vlada Crne Gore je u martu donijela Odluku o izradi kapitalnog budžeta, koja je stupila na snagu 19. aprila 2024. godine. Navedenim aktom su unaprijeđene procedure izrade kapitalnog budžeta i jasno definisani uslovi kojima kandidovani kapitalni projekat može da uđe u proceduru vrjednovanja i uključivanja u finansiranje iz kapitalnog budžeta države, kao i jasno definisan način rada Komisije za ocjenjivanje projekata.

U cilju razvoja procesa planiranja i koordinacije javnih investicija Ministarstvo finansija je u prvom kvartalu pokrenulo procedure na faznoj izradi informacionog sistema za upravljanjem javnim investicijama, koji će biti sastavni dio već postojeće systemske aplikacije za upravljanje budžetom (BMIS). S tim u vezi, već je uspješno uspostavljen Registar kapitalnih projekata koji se finansiraju iz državnog budžeta sa jasnim pregledom trenutnog statusa implementacije (Prilog 1).

Shodno navedenom, postignut je veći nivo transparentnosti u praćenju i koncipiranju politika daljeg podsticanja javnih investicija, a ujedno i omogućen efikasniji monitoring i izvještavanje o implementaciji kapitalnih i drugih investiciono razvojnih projekata, kako bi se dodatno osiguralo djelotvorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima u srednjem roku.

Uspostavljene nove procedure monitoringa i efikasniji rad implementacionih jedinica su doveli do rekordnog ostvarenja Kapitalnog budžeta na kraju drugog kvartala tekuće godine, koji je za čak 24,5 miliona eura veći u odnosu na uporedni period iz prethodne godine, a taj trend se nastavio i u trećem kvartalu gdje je zabilježena veća potrošnja od 14 miliona eura u odnosu na uporedni period prošle godine.

Shodno zaključku 11 Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa osme sjednice, održane 27. decembra 2023. godine, Ministarstvo finansija je pripremlilo Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta za treći kvartal 2024. godine, kojeg dostavlja Vladi Crne Gore radi daljeg izvještavanja Skupštine Crne Gore.

## REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA ZA DRUGI KVARTAL 2024. GODINE


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Službeni list CG", br. 86/24) za **Kapitalni budžet** su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **237.012.958,82 €**, što je za 3 miliona eura manje nego inicijalnim Zakonom. Navedeno umanjene se odnosi na projekte sa potprograma „13 025 K01 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane“, a u korist uvećanja za isti iznos tekućeg budžeta Ministarstva odbrane za potrebe plaćanja ugovorene vojne opreme (patrolnih brodova), a sve u cilju dostizanja NATO standarda od minimalnog izdvajanja za odbranu od 2% BDP-a.

Imajući u vidu da je za izgradnju dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice ugovoren kreditni aranžman, koji podrazumijeva i značajan iznos donacija, te da je već započet postupak tenderskih procedura po strogim pravilima EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj), opredijeljeni iznos za avansno plaćanje odabranom izvođaču radova (10 posto od ugovorene vrijednosti), a koji je inicijalnim Zakonom o budžetu planiran na iznos od 50 miliona eura neće biti potreban do kraja tekuće godine, pa je usvojenim „Rebalansom“ izvršena realokacija sredstava potrebnih za realizaciju drugih kapitalnih projekata čija realizacija se odvija brže od planirane dinamike potrošnje, čime je došlo do značajnog uvećanja ukupno opredijeljenih sredstava Upravi za kapitalne projekte na uštrb kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj.

**U PRVIH DEVET MJESECI 2024. GODINE** za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore **potrošeno je 110,91 mil.€** ili 47% od ukupno planiranog iznosa „Rebalansom“, od čega je 15,71 mil.€ plaćeno iz kredita, a 8,09 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).

Imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine potrošeno 96,80 mil.€ odnosno 48% od planiranog, dinamika izvršenja za prva tri kvartala tekuće godine je gotovo na identičnom nivou iako je u apsolutnom iznosu veća za čak 14,10 mil.€.

**Grafik 1: Uporedni prikaz ukupnog izvršenja Kapitalnog budžeta za prva tri kvartala 2023 i 2024.**

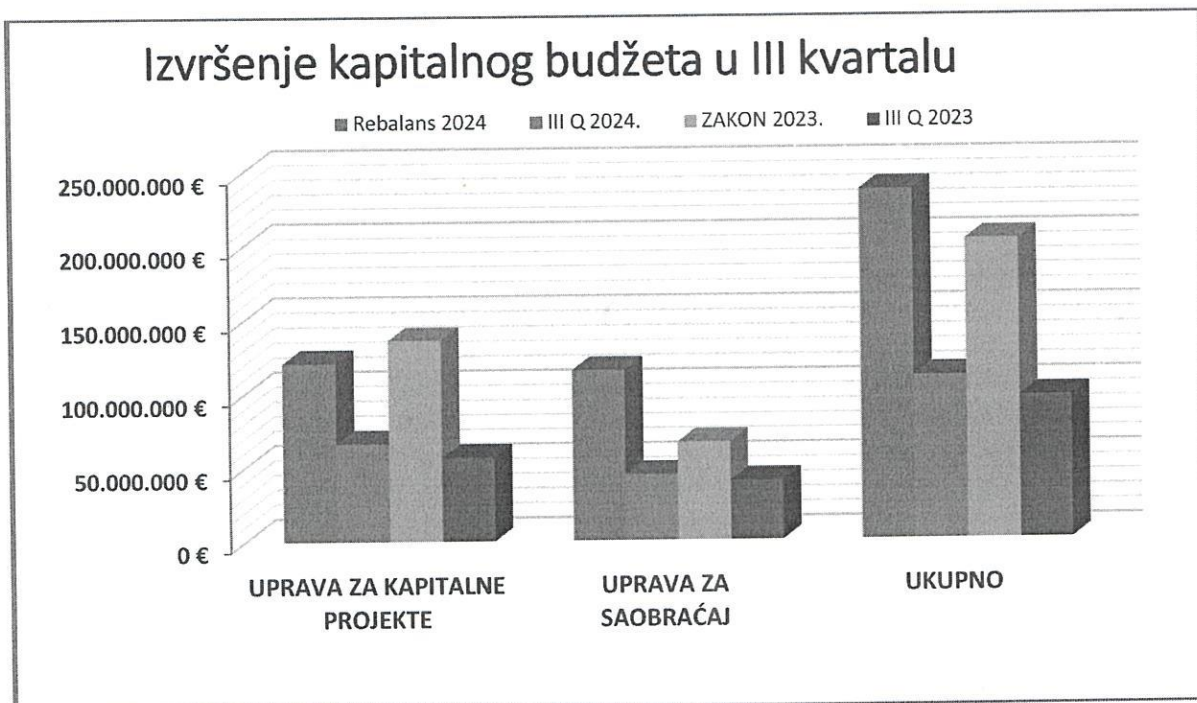

Posmatrajući samo potrošnju iz opštih prihoda budžeta bez iznosa opredijeljenih za autoput ista je na ukupnom iznosu od 85,81 mil.€ ili 44% od ukupno planiranog iznosa bez autoputa (196,74 mil.€) nakon usvojenog Rebalansa, što je za 5,87 mil.€ (39%) više nego u uporedni period prošle godine.

**Tabela 1: Prikaz izvršenja Kapitalnog budžeta Crne Gore po upravama i izvorima finansiranja za prva tri kvartala u 2024. i 2023. godini**

POTROŠAČKA JEDINICA	IZVOR FINASIRANJA	Rebalans 2024	III Q 2024.		III Q 2023	
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE	BUDŽET	121,275,045.07	55,569,693.90	46%	50,845,012.67	37%
	KREDIT	4,496.28	2,797,300.52		41,750.00	
	IPA	21,091.67	8,090,741.16		5,808,412.02	
	DONACIJA	7.12	0.00		0.00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>121,300,640.14</b>	<b>66,457,735.58</b>	<b>55%</b>	<b>56,695,174.69</b>	<b>42%</b>
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	BUDŽET	75,469,088.68	30,243,483.23	40%	29,096,156.58	44%
	KREDIT	5,340.00	12,917,556.75		9,099,232.25	
	DONACIJA	1,890.00	0.00		0.00	
	AUTOPUT	40,236,000.00	1,287,374.78		1,913,215.35	
	<b>UKUPNO</b>	<b>115,712,318.68</b>	<b>44,448,414.76</b>	<b>38%</b>	<b>40,108,604.18</b>	<b>61%</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>svi izvori</b>	<b>237,012,958.82</b>	<b>110,906,150.34</b>	<b>47%</b>	<b>96,803,778.87</b>	<b>48%</b>
Ukupno sa autoputem	BUDŽET	236,980,133.75	87,100,551.91	37%	81,854,384.60	40%
Ukupno bez autoputa	BUDŽET	196,744,133.75	85,813,177.13	44%	79,941,169.25	39%

Analizirajući uporedni prikaz iz gornje tabele uočljiva je i veće izvršenje iz kreditnih sredstava koje je u ovoj godini do sada potrošeno 15,71 mil.€ što je za 6,57 mil.€ više nego prošle. Navedeno plaćanje se odnosi na četiri projekta čija realizacija se odvija utvrđenom dinamikom i to: „Izgradnja OŠ Vladimir Nadzor u Podgorici“ i „Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz EIB-a“, koje realizuje Uprava za kapitalne projekte; odnosno „Rekonstrukcija magistralnog puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane“ i „Izgradnja bulevara Tivat-Jaz“, koje realizuje Uprava za saobraćaj.

Takođe, primjetna je i veća realizacija IPA projekata čije plaćanje se vrši preko Uprave za kapitalne projekte. Tako je u ovoj godini za prvih devet mjeseci potrošeno 8,09 mil.€ što je za 2,28 mil.€ više nego prošle godine. Navedeno plaćanje se dominantno odnosi na sljedeće projekte:

- „Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG“ (završen projekat);
- „Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija“ (završen projekat);
- „Radovi na izgradnji operativnog centra“ (završen projekat);
- „Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta“ (završen projekat);
- „Kompleks UIKS-a u Danilovgradu“ (realizacija u toku);
- „Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija“ (sprovodi se u kontinuitetu)“.

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte**, za sprovođenje **254 projekta** (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 1.476,15 mil.€, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu, opredijeljeno je **121,3 mil.€**, što je 51% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2024. godinu.

**Na kraju trećeg kvartala 2024. godine** za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte **plaćeno je ukupno 66,46 mil.€**, odnosno 55% od ukupno planirane sume Rebalansom, što je za 9,76 miliona više u odnosu na isti period prošle godine kada je plaćeno 56,69 mil.€ (42% od ukupno planirane za 2023. godinu). Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 55,57 mil.€ ili 46% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 2,80 mil.€, a iz EU donacija 8,09 mil.€ (IPA projekti) što je za 2,28 mil.€ više nego prošle godine.

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za saobraćaj** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **115,71 mil.€** (49% od ukupno planiranog), od čega je za sprovođenje **77 projekata**, ukupne procijenjene vrijednosti 955,65 mil.€, opredijeljeno **75,47 mil.€** ili to 32%, dok je za **Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevice**, čija je procijenjena vrijednost 605 mil.€, opredijeljeno **40,24 mil.€** što je 17% od ukupnog Kapitalnog budžeta.

**U prvih devet mjeseci 2024. godine** za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj **plaćeno je 44,45 mil.€**, odnosno 38% od ukupno planirane sume, što je za 4,34 miliona više nego prošle godine kada je plaćeno 18,95 mil.€. Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 31,53 mil.€, što je na prošlogodišnjem nivou (31 mil.€), dok je iz kredita plaćeno 12,92 mil.€ što je za oko 3,82 miliona više nego prošle godine.

Međutim, izuzimajući planirana (40,24 mil.€) i plaćena (1,29 mil.€) sredstva za autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 30,24 mil.€, što je na nivou od 40% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo autoputa, odnosno 1,15 miliona više nego prošle godine u istom periodu (29,09 mil.€).

- ✓ U dijelu realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta, **nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevice**, aktivnosti utvrđenom dinamikom sprovodi „Monteput DOO“, shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu i potpisanim sporazumom sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom saobraćaja.

U skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Moneput“ je okončao pretkvalifikacioni proces za izgradnju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice. Na osnovu evaluacije Komisije definisana je lista od pet kompanija i tri konzorcijuma koji su prošle pretkvalifikaciju, i za iste se čeka odobrenje EBRD-a nakon čega će uslijediti javni poziv za dostavljanje ponuda.

U toku je odobrenje od strane EBRD-a javnog poziva za izbor inženjera/nadzornog organa za vršenje nadzora nad projektovanjem i radovima, administraciju ugovora sa izvođačem radova i podršku upravljanju projektom, u skladu sa FIDIC-ovim uslovima, kao i primjenjivim pravnim propisima Crne Gore. Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor Inženjera, objavljen je u avgustu i u definisanom roku prijavilo se 14 kompanija. U toku je evaluacija prijave, nakon čega će se definisati lista kompanija koje su prošle pretkvalifikaciju i nakon odobrenja liste od strane EBRD-a, sprovedeće se druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača.

## ZAKLJUČCI

---

- U prvih devet mjeseci 2024. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 110,91 mil.€ ili 47% od ukupno planiranog iznosa „Rebalansom“, odnosno 14,10 mil.€ više nego u istom periodu prošle godine. Od navedenog iznosa 15,71 mil.€ je plaćeno iz kredita, a 8,09 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).
- Za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte plaćeno je ukupno 66,46 mil.€ (55% od ukupno planirane sume), odnosno 9,76 mil.€ više nego prošle godine. Od navedenog iznosa 55,57 mil.€ je plaćeno iz opštih prihoda budžeta, 2,80 mil.€ iz kredita, a 8,09mil.€ iz EU donacija.
- Za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je ukupno 44,45 mil.€, (49% od ukupno planirane sume), odnosno 9,76 mil.€ više nego prošle godine. Od navedenog iznosa 31,53 mil.€ je plaćeno iz opštih prihoda budžeta i 12,92 mil.€ iz kredita. Međutim, izuzimajući planirana (40,24 mil.€) i plaćena (1,29 mil.€) sredstva za autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 30,24 mil.€, što je na nivou od 40% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo autoputa.
- U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monteput DOO“ je završio pretkvalifikacioni proces za izbor izvođača radova i stručnog nadzora izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a i FIDIC-ovim uslovima, kao i pravnim propisima Crne Gore. U toku je i evaluacija prijava i odobrenje liste od strane EBRD-a, nakon čega će se sprovesti druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača.

**Prilog 1: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata za treći kvartal u okviru Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj, odobrenih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu**

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE (programski kod 40903) - realizovane aktivnosti u prvoj polovini 2024. godine					
Rb	Naziv i kod projekta	Procijenjena vrijednost	Zakon za 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje
1	11 052 K01 002 - Prilagodavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup licima smanjene pokretljivosti Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije.	2,850,000.00	8,900.89	0.00	0.00
2	11 052 K02 001 - Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije Uprava za kapitalne projekte nema informacije o ovom projektu.	1,000,000.00	8,908.01	0.00	7,430.36
3	12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu Uprava je ugovorila izradu i reviziju tehničke dokumentacije trafostanice i vodosnabdijevanja objekta zatvora i završila izradu i reviziju projektne dokumentacije regulacije korita Tare. Obaveza Opštine Mojkovac je putna infrastruktura. Ministarstvo pravde je ugovorilo izradu projektne dokumentacije objekta, za koju je UKP ugovorila posao revizije.	38,000,000.00	23,900.00	268,897.34	17,477.24
4	12 024 K01 004 - Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom.	1,000,000.00	708,900.00	5,110,214.13	1,010,618.89
5	12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi na izgradnji će biti obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, čije rješavanje je u nadležnosti Ministarstva.	14,000,000.00	1,368,773.50	13,809,971.09	1,682,620.67
6	13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe MUP-a i stanice Polije u Gusinju Završeni radovi I faze, osim dijela uređenja fasade. MUP je izvršilo dopunu projektne dokumentacije i rješilo eksproprijaciju, pa ja UKP rapisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova i nadzor.	650,000.00	25,900.00	553,454.35	0.00
7	13 024 K01 002 - Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici Završena je izgradnja kompleksa i objekti su predati korisniku na upotrebu, osim objekta magacina koji je u završnoj fazi i za koji treba da se plati po okončanoj situaciji.	9,700,000.00	8,900.00	9,155,641.06	134,197.24
8	13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Nakon što bude dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva odbrane, UKP će sprovesti tenderske procedure iz svoje nadležnosti.	12,000,000.00	10,000.00	6,485,246.73	0.00
9	13 025 K01 002 - Izgradnja objekta za prihvat i servisiranje vazduhoplova-hangar, aerodrom "Krnjuz Danilo" Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su završni radovi na ugradnji specifične opreme. Na zahtjev Ministarstva odbrane koje je dostavilo dokumentaciju za izmještanje toplovođa za potrebe funkcionisanja objekta UKP je pokrenula pripremu poziva za javno nadmetanje za izbor izvođača radova.	3,500,000.00	540,000.00	2,960,256.33	1,066,765.95
10	13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice u kasarni "13.jul" Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Završetak objekta je prolongiran zbog potrebe za ugovaranjem nepredviđenih radova koji su proistekli iz propusta i nedostataka u projektnoj dokumentaciji, a koju je UKP dostavilo Ministarstvo odbrane. U toku je usaglašavanje dokumentaciju u cilju utvrđivanja ukupnog obima posla i procedura za završetak izgradnje.	3,200,000.00	916,000.00	2,257,854.12	544,889.44
11	13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	6,850,000.00	100,000.00	0.00	0.00
12	13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.	12,000,000.00	4,070,000.00	11,691,852.80	1,289,571.48
13	13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su obustavljeni zbog nepredviđenih okolnosti u postojećem stanju objekta. Dopunjena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane dostavljena je u avgustu i u toku je utvrđivanje ukupnog obima posla i odnosu na ugovorene radove.	1,100,000.00	90,000.00	766,057.97	78,239.81
14	13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Volodja" u Pljevljima Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.	1,200,000.00	560,000.00	1,136,521.58	0.00
15	13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volodja", Pljevlja U toku je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.	1,750,000.00	60,000.00	0.00	0.00
16	13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu U toku je raspisivanje poziva za izbor izvođača radova i stručni nadzor.	5,460,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
17	15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin", Kolašin Dva Ski lifta tipa "Sidro" i "Tanjir" - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi" - Rekonstrukcija Ski staze - Na prvom javnom nadmetanju nije bilo ponuda. Bob na šinama - Prvo javno nadmetanje je poništeno.	40,000,000.00	3,400,000.89	35,497,744.76	235,268.77
18	15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	49,000,000.00	1,835,000.89	20,887,095.21	49,483.88

<p><u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - U toku je tenderska procedura za izgradnju dalekovoda Ribarevine-Cmiljača. Potrebno je da Ministarstvo turizma pribavi UT uslove i Projektni zadatak za kabl za povezivanje „Bazne stanice sa Cmiljačom“. Žičara i ski staze - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Bazna stanica - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Putna infrastruktura - Do sada ugovoreni radovi su završeni. U završnoj je fazi izrada projektnog zadatka koji priprema Opština Bijelo Polje. <u>Vodossnabdjevanje</u> - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. UKP je izvršila dopunu projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom.</p>	19	15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	29,500,000.00	1,335,000.89	17,921,626.75	21,958.37
<p>Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Bazna stanica - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog porasta cijena. Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, na koje nije bilo pristiglih ponuda. Ponovo je raspisano javno nadmetanje. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Elektroenergetska infrastruktura - Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije TS "Z4" i kablovskog voda za povezivanje TS "Bazna stanica Žarski" i TS "Cmiljača". Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju TS "Bazna stanica Žarski". Putna infrastruktura - Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije za završetak svih radova na trasi Vragodo-Vrioci-Žarski katun. U toku je priprema tendera za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za poslednju dionicu puta. Radovi koji su ugovoreni su obustavljeni. <u>Vodossnabdjevanje</u> - UKP nije dostavljena ništa od dokumentacije.</p>	20	15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32,000,000.00	5,082,000.89	24,930,470.96	4,120,908.27
<p>Elektroenergetska infrastruktura - UKP je nakon završetka tenderske procedure zaključila ugovore sa projektantom/izvođačem radova i stručnim nadzorom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Bazna stanica - UKP nije dostavljena dokumentacija. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. Putna infrastruktura - Ugovoreni radovi su završeni. <u>Vodossnabdjevanje</u> - Raspisano je javno nadmetanje za izradu studije, potpisan ugovor sa izabranim obradivačem studije vodossnabdjevanja. Haube - nakon izbora ponuđača zaključen je ugovor.</p>	21	15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	19,000,000.00	539,250.89	14,325,296.09	354,772.00
<p><u>Ski poligon</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi".</p>	22	15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32,000,000.00	3,010,000.89	23,222,279.57	671,325.92
<p>Elektroenergetska infrastruktura - zaključeni ugovor za projektovanje i izgradnju trafostanice i priključnog kabla za povezivanje objekta Vizitiring centra. Ministarstvo turizma je dostavilo UT uslove i projektni zadatak za izgradnju 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice na lokalitetu Đalovića pećina. Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Objekti na ulazu u pećinu - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Putna infrastruktura - Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za put Gubavač - Bistrica. Radovi na ostatku trase su završeni. <u>Vodossnabdjevanje</u> - Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti na projektovanju su obustavljene zbog stanja na terenu koje nije u skladu sa projektnim zadatkom. <u>Vizitiring centar</u> - Radovi na izgradnji su završeni i objekat je predat Ministarstvu. Da bi se stavio u funkciju potrebno je da se završi elektroenergetska infrastruktura.</p>	23	15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijašišta u Kolašinu	30,000,000.00	1,780,000.89	10,082,455.00	729,242.87
<p>Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta i izvođenje radova I faze po principu "projektuj i izgradi". Urađen je glavni projekat. Da bi se objekat stavio u funkciju neophodno je izgraditi pristupne saobraćajnice, a za nastavak izgradnje objekta II i III faze potrebno je da nadležno Ministarstvo turizma pribavi saglasnost Glavnog državnog arhitekta na idejno rješenje.</p>	24	15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektnih i tehničkih dokumentacije i izvođenje radova	5,000,000.00	48,950.00	4,147,103.19	148,390.60
<p>Oština Šavnik sproveli su aktivnosti na realizaciji projekta valorizacije kanjona Nevidio u skladu sa zaključenim ugovorom.</p>	25	15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevici	2,600,000.00	8,900.00	0.00	0.00
<p>Raskinut ugovor sa izvođačem radova. Aktivnosti na realizaciji projekta su obustavljene. Da bi se nastavilo sa radovima potrebno je da Ministarstvo poljoprivrede definiše tehnologiju, proizvodni proces i opremu koja će se koristiti u objektu i na osnovu iste uradi i UKP dostavi tehnološki elaborat u skladu sa kojim će ugovoriti preostale radove na završetku objekta. Pored problematike koja se odnosi na proizvodni proces, izvođač radova sa kojim je posao bio ugovoren je neopravdano prolongirao završetak nespornih ugovorenih radova, zbog čega su mu naplaćeni penali.</p>	26	15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanji Kule u Herceg Novom	5,500,000.00	97,900.00	1,458,672.90	346,132.59
<p>Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su bili obustavljeni zbog turističke sezone, a uzimajući u obzir lokaciju objekta. Radovi se ne izvode usled neriješenih imovinsko- pravnih odnosa, potrebe izmještanja podzemnih instalacija, kao i potrebe da se uskladi projekat dokumentacija sa dodatnim zahtjevima nadležne institucije za zaštitu kulturnih dobara.</p>	27	15 019 K01 013 - Hidrotehnička infrastruktura za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i 1450 sa osnježavanjem	25,000,000.00	1,780,000.89	2,112,660.00	950,058.91
<p>Na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije od strane Opštine Kolašin, UKP je sprovela postupak javne nabavke za odabir projektanta/izvođača po principu "projektuj i izgradi". Potpisan je aneks ugovora, završena je izrada i revizija Glavnog projekta i izvođač je uveden u posao za faze na kojima su riješeni imovinsko pravni odnosi. Obaveza Opštine Kolašin je rješavanja imovinsko pravnih odnosa na preostalim fazama bez kojih se objekat ne može staviti u funkciju, kao i spora sa dijelom građana koji su protestima usporavali dosadašnju dinamiku radova.</p>	28	15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	12,000,000.00	53,900.89	34,200.00	0.00
<p>Ugovorena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta puta Cmiljača-Žarski i izrada istog je u toku. Obaveza Ministarstva turizma je da dostavi UKP projektni zadatak i UT uslove za postavljanje žičare koja će povezati dva ski centra, a koja je prethodno bila planirana za ski centru "Dumitor" i koja je lagerovana od strane "Skijašišta doo".</p>	29	15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	12,500,000.00	1,390,000.89	12,106,155.12	0.00
<p>Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi".</p>	30	15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak	260,000.00	231,400.00	0.00	0.00
<p>Obaveza Ministarstva turizma je bila da dostavi dokumentaciju, kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.</p>						



31	15 019 K01 029 - Eko-katun Rujijšta, Andrijevica	258,000.00	8,900.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.			
32	15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilica poljani	7,000,000.00	852,000.00	97,169.50
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
33	15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture	800,000.00	200,000.00	123,335.90
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
34	15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učesče u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	1,000,000.00	850,000.00	1,000,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
35	15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
36	15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	12,950,000.00	900,000.00	4,587,036.06
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
37	15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada	300,000.00	400,000.00	300,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
38	15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	3,500,000.00	2,090,000.00	8,415,055.78
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
39	15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	3,000,000.00	700,000.00	3,000,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
40	15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opsteg interesa	500,000.00	548,000.00	548,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
41	15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	11,000,000.00	609,000.00	10,556,737.21
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Zaključen ugovor sa izvođačem dodatnih radova koji je uveden u posao. U toku je nabavka opreme i pripremni radovi na terenu za igru.			
42	15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	2,450,000.00	660,000.00	1,980,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
43	15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	11,100,000.00	30,000.00	300,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
44	15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	2,000,000.00	120,000.00	300,000.00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.			
45	16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i karantinske jedinice za bilje	100,000.00	20,425.00	0.00
	Nakon sprovedenih procedura od strane Ministarstva poljoprivrede, Evaluaciona komisija je dostavila je izvještaj Eu Delegaciji na odobrenje. Proces odabira ugovarača je u toku.			
46	17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	2,600,000.00	179,705.00	2,117,457.58
	U toku je implementacija projekta, aktivnosti na dopremanju opreme.			
47	17 019 K02 004 - Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1,200,000.00	1,001.00	941,474.00
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je u toku.			
48	17 019 K02 005 - Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i uskladjivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU	3,670,000.00	76,500.00	3,659,900.00
	U periodu 2023 godine završene su sve aktivnosti na projektu, osim finalnih izvještaja, te je iz tog razloga rok produžen do 09.01.2024. godine.			
49	17 019 K02 006 - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	2,510,000.00	125,850.47	1,981,040.00
	Radi se na projektovanju i izradi tenderske dokumentacije za 13 crnih tačaka za sub projekat Roads 01 i projektovanju i izradi tenderske dokumentacije za 3 dionice za sub projekat Railways. Idejna rješenja su gotova za sve crne tačke za sub projekat Roads i za sve dionice koje se tiču sub projekta Railways i radi se na izradi glavnih projekata.			
50	17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	1,500,000.00	218,670.70	1,500,000.00
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je u toku.			
51	17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	20,000,000.00	15,285,001.00	20,609,890.34
	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovode opštine. Ugovori sa Opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo Ministarstvo finansija do nivoa ukupne procijenjene vrijednosti od 20 mil.			
52	17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeke, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeke	10,000,000.00	408,900.00	1,226,763.45
	UKP je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izgradnju obaloutvrdnog zida rijeke Ibar i isto je u toku.			

53	17 020 K04 007 - Rekonstrukcija puta Plav-Bogičevića, Plav	12,000,000.00	955,000.00	117,379.87	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
54	17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose	15,000,000.00	445,000.00	11,385,553.17	102,026.84
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su započeti na dijelu trase gdje je Opština Hereceg Novi riješila imovinsko pravne odnose.				
55	17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	1,600,000.00	8,900.89	1,273,933.23	0.00
	Radovi su završeni za prvu fazu. Preostalo plaćanje po okončanoj situaciji za nastavak radova na pristupnim saobraćajnicama koje realizuje Opština.				
56	17 020 K04 012 - Izgradnja trga i šetališta u Sutomeru, Opština Bar	7,950,000.00	445,000.00	2,000,607.92	0.00
	Zaključen je trojni ugovor o realizaciji projekta. Aktivnosti na ugovaranju radova je sprovelo JP Morsko dobro Crne Gore.				
57	17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinčića	5,900,000.00	890,000.89	5,881,706.86	714,904.39
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
58	17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna	8,350,000.00	8,900.89	2,483,583.02	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				
59	17 020 K04 015 - Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	2,500,000.00	445,000.00	2,500,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
60	17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	6,200,000.00	890,000.00	5,400,000.00	653,484.59
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
61	17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje	3,500,000.00	222,500.89	1,073,530.26	32,328.42
	Radovi i faze su ugovoreni i čeka se da Opština Gusinje riješi eksproprijaciju. Za II fazu raskinut ugovor sa projektantom i revidentom uslijed izmjene Projektnog zadatka i UTU zbog eksproprijacije.				
62	17 020 K04 029 - Izgradnja autobuske stanice Igalu Bare	5,700,000.00	2,635,000.00	2,093,669.48	1,274,547.69
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
63	17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod mag. puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, Bar	1,300,000.00	8,900.00	11,495.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi se ne izvode jer je potrebno da Opština Bar obezbijedi odobrenje za građenje na koje je prethodno uložena žalba.				
64	17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	2,800,000.00	8,900.00	20,207.00	23,837.00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.				
65	17 020 K04 047 - Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalu Bare	820,000.00	360,450.89	369,041.89	73,641.82
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
66	17 020 K04 050 - Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	3,400,000.00	1,745,000.00	2,535,000.00	885,550.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
67	17 020 K04 055 - Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen	1,950,000.00	8,900.00	1,750,724.80	0.00
	Radovi su završeni. Preostala je isplata okončane situacije i primopredaja objekta.				
68	17 020 K04 056 - Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen	4,500,000.00	453,900.00	3,232,383.84	28,664.90
	Radovi su završeni, objekat je predat Ministarstvu.				
69	17 020 K04 059 - Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ul. Dušana Vujoševića do ul. Vuka Karadžića u Beranama	700,000.00	445,000.89	579,631.45	134,169.58
	Zaključen ugovor sa izvođačem radova i izvođač uveden u posao.				
70	17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	10,000,000.00	53,400.89	357,016.55	139,176.62
	Zaključeni su ugovori za izradu i reviziju projektne dokumentacije.				
71	17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikišić	6,000,000.00	578,500.00	884,289.69	4,450.00
	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije sprovedila je Opština. Zaključen ugovor sa izvođačem radova. Nakon zaključivanja ugovora za stručni nadzor radovi će početi.				
72	17 020 K04 062 - Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikišić	2,000,000.00	873,000.00	623,000.00	333,593.78
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
73	17 020 K04 064 - Glavna ulica u Gusinju	1,400,000.00	364,900.00	1,390,297.14	250,663.99
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
74	17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju	3,600,000.00	89,000.00	0.00	0.00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
75	17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikišićka	6,000,000.00	489,500.00	358,801.00	0.00
	Opština Nikišić je sprovedila aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. U toku je priprema javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.				

76	17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjele - Komani	4,000,000.00	364,900.00	2,297,552.56	1,089,263.82
	Završeni su radovi na izgradnji lokalnog puta I i II faze, preostalo je plaćanje po ispostavljenim situacijama. Aktivnosti na izgradnji rasvjele u skladu sa zaključenim ugovorom sprovodi Glavni grad.				
77	17 020 K04 092 - Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	4,000,000.00	699,500.00	489,500.00	445,000.00
	Aktivnosti na realizaciji I faze sprovodi Opština. Na prvo raspisano javno nadmetanje za preostale radove nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje poziva za izbor izvođača radova.				
78	17 020 K04 099 - Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	15,000,000.00	275,900.00	0.00	0.00
	Glavni grad sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
79	17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Mliševići - Most na rijeci Bijela	800,000.00	328,450.00	260,929.51	251,229.36
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su radovi I faze. Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze.				
80	17 020 K04 102 - Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	1,700,000.00	44,500.89	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
81	17 020 K04 113 - Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje	120,000.00	106,800.89	106,800.89	89,000.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
82	17 020 K04 114 - Rekonstrukcija UJ. Branka Čopića/Janka Vukotića u Podgorici	1,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
83	17 020 K04 119 - Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću	2,500,000.00	1,023,000.00	2,500,000.00	534,147.04
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština. Radovi su u toku.				
84	17 020 K04 120 - Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	300,000.00	226,950.00	226,950.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
85	17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjele na teritoriji Opštine Budva	3,250,000.00	949,450.00	3,250,000.00	444,966.61
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
86	17 020 K04 140 - Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	160,000.00	142,400.00	160,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
87	17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L - 29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	500,000.00	89,000.00	200,000.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
88	17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	2,500,000.00	672,800.00	2,154,168.82	511,611.67
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač uveden u posao.				
89	17 020 K04 147 - Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane	840,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
90	17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	7,600,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
91	17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	385,000.00	118,900.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača i stručnog nadzora.				
92	17 020 K04 150 - Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	3,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
93	17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	4,950,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje tendera.				
94	17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	660,000.00	566,800.00	609,709.62	120,247.92
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom i izvođač je uveden u posao. Radovi u toku.				
95	17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	1,100,000.00	1,289,800.00	997,810.59	201,195.84
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom i izvođač je uveden u posao. Radovi su u toku.				
96	17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	2,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
97	17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima	1,950,000.00	133,500.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
98	17 020 K04 156 - Lokalni put u MZ Šekular, Berane	200,000.00	102,000.00	102,755.62	101,987.48
	Radovi su završeni.				

99	17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, Budva	870,000.00	329,300.00	0.00	0.00
	Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Budva raspisani su pozivi za izbor izvođača radova i stručni nadzor i isti su u toku.				
100	17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	7,500,000.00	93,450.00	0.00	0.00
	Glavni grad Podgorica priprema dokumentaciju za rekonstrukciju objekta. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
101	17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	150,000.00	136,600.00	144,399.60	115,514.85
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni.				
102	17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	110,000.00	107,900.00	105,776.91	86,243.89
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni.				
103	17 020 K04 162 - Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti	840,000.00	178,000.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
104	17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	12,000,000.00	595,800.00	595,800.00	83,900.00
	Opština tuži završila aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. U toku je priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje javnih nadmetanja.				
105	17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikišiću	2,500,000.00	89,000.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
106	17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima	450,000.00	364,900.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
107	17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti	2,700,000.00	356,000.89	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Raspisana javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
108	17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	4,500,000.00	178,000.00	0.00	0.00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Raspisana javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
109	17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu	3,800,000.00	609,500.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
110	17 020 K04 169 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti	4,500,000.00	40,050.00	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
111	18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	14,500,000.00	2,112,503.56	12,998,594.36	2,543,103.48
	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu. Preostala plaćanja po okončanoj situaciji.				
112	18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta	10,000,000.00	48,950.00	0.00	18,303.71
	Pokrenuti tenderi za izradu projektne dokumentacije na zatvaranju privremenog skladišta otpada u Bakovićima, Kl. i Izradu GP za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Beluci I i II, GS.				
113	18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	15,000,000.00	58,900.00	0.00	3,104.37
	Izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje - u toku je izrada projekta.				
114	18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	15,000,000.00	1,335,001.89	1,463,957.99	0.00
	EPCG je potpisala ugovor po principu "ključ u ruke" za izradu projektne dokumentacije primarnog toplovoda u dužini od cca 6km i izgradnju prve faze u dužini od cca 2,3km. Nakon što projektne dokumentacija bude završena i dostavljena UKP će pokrenuti javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za II i III fazu toplifikacije.				
115	18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	2,500,000.00	8,900.00	810,000.00	0.00
	Opština Plav sprovodi aktivnosti na kompletiranju projektnog zadatka.				
116	18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegovačkom poluostrvu Luštica	11,000,000.00	756,500.00	9,888,572.03	417,026.57
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su radovi.				
117	18 003 K01 017 - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	500,000.00	284,800.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. Obaveza nadležnog Ministarstva je da dostavi dopunu dokumentacije kako bi se pokrenulo ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova i usluga stručnog nadzora.				
118	18 003 K01 021 - Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	900,000.00	8,900.00	732,033.06	74,574.72
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni, izuzev montaže opreme koja je naručena. Preostalo plaćanje po okončanoj situaciji.				
119	18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	19,000,000.00	44,500.00	0.00	0.00
	Nadležno Ministarstvo je u saradnji sa Opštinom Berane raspisalo arhitektonski konkurs. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije i UT uslova, UKP će pokrenuti tenderske procedure za izradu GP.				
120	18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa pješačkom stazom	5,700,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				

121	<b>18 003 K01 035 - Vodosnabdijevanje Pljevalja</b> Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ" - Na osnovu dostavljenog Glavnog projekta od strane Opštine, UKP je zaključila ugovor sa izvođačem i nadzorom. <u>Rekonstrukcija glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ-Grad sa povratnim cjevovodom</u> - Na osnovu dostavljenog Glavnog projekta od strane Opštine, UKP je zaključila ugovore sa izvođačem i nadzorom. Radovi su u toku.	11,000,000.00	890,000.00	8,045,488.04	1,333,838.94
122	<b>18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja</b> U toku projektovanje, završeno idejno rješenje.	2,500,000.00	8,900.00	33,154.00	0.00
123	<b>18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić</b> Završena je I faza radova. Nastavak aktivnosti u skladu sa dostavljenim prioritetima.	2,000,000.00	222,500.89	0.00	0.00
124	<b>18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica</b> Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Čeka se dostava prijave građenja.	200,000.00	93,450.00	174,499.88	34,899.98
125	<b>18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom nakon ponovljenog tendera. U toku uvođenje izvođača u posao.	3,000,000.00	445,000.00	2,987,987.31	968.00
126	<b>18 003 K01 049 - Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu</b> UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
127	<b>18 003 K01 050 - Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu</b> Završena je revizija projektno dokumentacije.	3,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
128	<b>18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.	6,900,000.00	198,900.00	216,450.43	43,290.09
129	<b>18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje</b> Opština Rožaje je u obavezi da dostavi izmijenjenu tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će Uprava raspisati tender za izbor izvođača radova. U toku je priprema tehničke dokumentacije.	550,000.00	363,900.00	0.00	0.00
130	<b>18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.	600,000.00	525,100.00	216,559.00	4,779.50
131	<b>18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici</b> Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija i u toku je priprema poziva za izbor izvođača aradova i stručni nadzor.	390,000.00	8,900.00	0.00	0.00
132	<b>18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću</b> U toku je izrada projektno dokumentacije.	10,000,000.00	44,500.00	213,444.00	0.00
133	<b>18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici</b> Potpisani su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je uvođenje izvođača u posao.	500,000.00	189,000.00	9,559.00	0.00
134	<b>18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane</b> U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	5,200,000.00	8,900.89	0.00	0.00
135	<b>18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane</b> U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	700,000.00	138,900.00	0.00	0.00
136	<b>18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva</b> Raspisani su pozivi za javna nadmetanja za izradu studija.	10,000,000.00	48,950.89	0.00	0.00
137	<b>18 003 K01 061 - Sanacija nesamitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac</b> Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.	5,000,000.00	1,661,000.00	4,371,820.05	1,113,276.89
138	<b>18 003 K01 062 - Izgradnja transfer stanice u Andrijevici</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za II fazu - završetak radova. U toku je izvođenje radova.	850,000.00	692,500.00	730,834.98	648,082.58
139	<b>18 003 K01 063 - Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica</b> Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi su završeni.	350,000.00	182,450.00	286,793.94	183,327.59
140	<b>18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje</b> Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa vodoizvorista Banjice II faza - zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.	4,500,000.00	500,500.00	915,703.62	116,228.30
141	<b>18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu</b> UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,520,000.00	8,900.00	0.00	0.00
142	<b>18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice</b> Završena je izrada projektno dokumentacije. UKP je izvršila dopunu projektno dokumentacije u skladu sa Eurokodovima.	4,800,000.00	18,900.00	0.00	0.00
143	<b>18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak</b> Završena je izrada projektno dokumentacije. UKP je izvršila dopunu projektno dokumentacije u skladu sa Eurokodovima.	2,150,000.00	8,900.00	0.00	0.00

	Nakon što od Opštine Žabljak bude dostavljena projektna dokumentacija UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
144	<b>18 003 K01 068 - Unaprjeđenje vodovodnog sistema "Višnjica" i "Veija Gora", Prijestonica Cetinje</b>	1,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Nakon što Opština dostavi kompletnu dokumentaciju, pristupaće se raspisivanju javnog nadmetanja.				
145	<b>18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnabdijevanja</b>	10,000,000.00	867,800.00	372,499.82	218,375.28
	Izgradnja vodovoda Razvrše (I faza) u opštini Žabljak - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzor. Analiza postojećeg stanja vodosnabdijevanja u opštini Žabljak sa predlogom mliera za rješavanje gubitaka - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzor. Izgradnja vodovoda i rezervoara u selu Goransko u opštini Plužine - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje javnih nadmetanja. Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik I faza - zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom i u toku je izvođenje radova. Rekonstrukcija PPOV Meljine, Herceg Novi - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izmištanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i izmištanje postojeće fekalne kanalizacije u zahvatu LSL "Donji Talum", Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Adaptacija vodovodne mreže u naseljima Gornji i Donji Mljiš u Tuzima - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzora.				
146	<b>18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama</b>	13,700,000.00	60,050.00	0.00	0.00
	Završen projekat.				
147	<b>18 003 K02 003 - Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija</b>	3,880,000.00	403,596.46	3,234,000.00	394,633.04
	Zaključen je ugovor sa izvršiocem usluga.				
148	<b>18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama</b>	2,500,000.00	93,392.39	2,399,500.00	329,060.74
	Zaključen je ugovor sa izvršiocem usluga.				
149	<b>18 003 K02 011 - Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine</b>	751,000.00	2,700.00	731,217.51	0.00
	Ugovor je završen.				
150	<b>18 003 K02 012 - Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija</b>	1,000,000.00	121,800.00	0.00	0.00
	Proces pripreme tenderske dokumentacije je u toku.				
151	<b>18 003 K02 013 - Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori</b>	500,000.00	76,500.00	0.00	0.00
	Zaključen ugovor.				
152	<b>18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme</b>	1,800,000.00	902,800.00	0.00	0.00
	Proces pripreme tenderske dokumentacije je u toku.				
153	<b>19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem</b>	1,000,000.00	270,000.00	797,707.12	0.00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač radova ima poteškoća sa nabavkom predviđenih taktilnih traka.				
154	<b>19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja</b>	10,000,000.00	933,901.78	3,098,559.12	3,074.95
	Zaključen je ugovor za izvođenje radova na sanaciji krova OŠ "Đašo Pavičić" u Sutorini, u Herceg Novom. U toku uvođenje izvođača u posao. Raspisana je po drugi put javna nabavka za izvođenje radova za adaptaciju školskog dvorišta JU SEŠ "Mirko Vešović" Podgorica nakon čega je potpisan ugovor. Adaptacija sistema grijanja JUOŠ "18.Oktobar" Biotče, JUOŠ "Polica" Berane, JUOŠ "Zarija Vujošević" Zeta, JUOŠ "kekec" Sutomore, JUOŠ "Vojin Popović" Drezga, JUSSŠ "Mirko Vešović" Podgorica - u toku tender za izbor izvođača radova i nadzor. Adaptacija krova vrtića JPU "Vukosava Ivanović" Bar - u toku tender za izbor izvođača radova i nadzor. Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JUOŠ "Janjko Bjelica" u Crkvicama - u toku javno nadmetanje za izbor izvođača radova i nadzor.				
155	<b>19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja</b>	10,000,000.00	63,901.78	1,869,612.11	5,069.89
	Završena je izrada i revizija GP za adaptaciju fiskulturne sale tri srednje stručne škole u Podgorici (elektro, građevinska i hemijska). U toku je tender za izbor izvođača radova i nadzor.				
156	<b>19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica</b>	7,000,000.00	134,501.78	0.00	0.00
	Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Ministarstva, raspisan je tender za izbor obradivača i revidenta projektne dokumentacije. U toku je vrednovanje ponuda.				
157	<b>19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica</b>	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
158	<b>19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica</b>	2,000,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
159	<b>19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica</b>	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
160	<b>19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama</b>	3,800,000.00	68,901.78	0.00	0.00
	Završena je izrada glavnog projekta, u toku je revizija.				
161	<b>19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju</b>	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				

162	19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	1,100,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
163	19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	2,000,000.00	8,901.78	25,050.00	25,050.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
164	19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	7,200,000.00	44,501.78	375,863.31	44,840.00
	Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije. Završena je izrada i revizija projekta. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor za I fazu izgradnje. Na zahtjev Ministarstva prosvjete otvaranje projektnih aktivnosti je prolongirano do usaglašavanja konstrukcije finansiranja sa CEB-om.				
165	19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	2,600,000.00	44,501.78	49,109.72	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je racionalizacija i revizija projekta.				
166	19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20,500,000.00	44,501.78	9,167,019.44	18,812.69
	Završena je izgradnja Fakulteta likovnih umjetnosti, kotlarnice i infrastrukturnih priključaka, kao i objekta Zajedničkih sadržaja sa podzemnom garažom u kompleksu za šta je preostalo plaćanje.				
167	19 032 K04 014 - Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	8,000,000.00	8,901.78	7,275,471.06	0.00
	Svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.				
168	19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	6,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
169	19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	6,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
170	19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	12,000,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	U toku je javno nadmetanje za izbor obradivača i revidenta projektne dokumentacije.				
171	19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	3,000,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
172	19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija vrtića na Zabjelu u PG	3,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
173	19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstr. i nadogradnja vrtića u Kotoru	1,600,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
174	19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	2,500,000.00	8,901.78	0.00	0.00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi UKP preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
175	19 032 K04 022 - Rekonstrukcija toplane Univerziteta CG na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1,100,000.00	8,901.78	853,699.71	67,364.80
	Svi radovi su završeni.				
176	19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekata Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	15,000,000.00	695,000.00	1,379,368.34	231,407.76
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
177	19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadružbina porodice Bošković-Durović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	1,000,000.00	68,950.00	69,938.00	26,620.00
	Zaključeni su ugovori sa obradivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
178	19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	6,235,000.00	2,360,000.00	4,164,314.48	1,819,432.45
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku.				
179	19 032 K04 027 - Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	20,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UCG je sprovodio aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor. U toku je adaptacija postojećeg objekta.				
180	19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	650,000.00	267,000.00	0.00	0.00
	Korisnik Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
181	19 032 K04 029 - Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	7,100,000.00	890,000.00	6,967,177.01	1,331,296.06
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku.				
182	19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	5,760,000.00	1,110,000.00	4,716,740.28	1,153,181.02
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. U toku su radovi.				
183	19 032 K04 031 - Renoviranje OŠ "Boško Radulović" - Komani	1,750,000.00	48,950.00	350,396.58	7,899.60
	Završeni su radovi na adaptaciji škole i radovi na uređenju terena.				

184	<b>19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đlački prevoz u Opštini Nikšić</b>		500,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja.					
185	<b>19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru</b>		300,000.00	304,600.00	12,100.00	0.00
	Na raspisana dva javna nadmetanja za izbor izvođača radova nije bilo ponuda. U toku je ponovljeno nadmetanje za izbor izvođača radova. Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom.					
186	<b>19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojević“ u Peuricama, Opština Bar</b>		1,550,000.00	627,000.00	1,196,590.33	475,326.47
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.					
187	<b>19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću</b>		2,600,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda i u toku je priprema ponovnog poziva.					
188	<b>19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojčić" u Andrijevici</b>		3,500,000.00	48,950.00	0.00	0.00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je racionalizacija projektne dokumentacije.					
189	<b>19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici</b>		10,000,000.00	358,950.00	34,775.40	25,168.00
	U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.					
190	<b>19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Vrsin" Prčanj, Kotor</b>		2,500,000.00	95,950.00	36,700.00	400.00
	Zaključen je ugovor sa obrađivačem projektne dokumentacije. U toku je izrada projekta.					
191	<b>19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a</b>		4,854,404.00	17,800.00	7,204,929.28	1,441,111.46
	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.					
192	<b>19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - Donje luge, Berane</b>		5,500,000.00	438,000.00	0.00	0.00
	Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.					
193	<b>19 032 K04 055 - Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat</b>		1,400,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Nakon što Ministarstvo prosvjete dostavi dopunjenu projektnu dokumentaciju pristupiće se raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača i stručnog nadzora.					
194	<b>19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću</b>		2,050,000.00	17,800.00	0.00	0.00
	Završene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kojima koordinira Opština Nikšić. U toku je priprema javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.					
195	<b>19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica</b>		2,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i stručnog nadzora.					
196	<b>19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat</b>		3,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.					
197	<b>19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću</b>		6,700,000.00	1,600,000.00	5,580,640.60	1,713,432.53
	Zaključeni su ugovori za izradu sportskog terena pod Golubinjom u Pljevljima na kojem nije bilo pristiglih ponuda i isto je ponovo raspisano.					
198	<b>19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata</b>		5,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Raspisano javno nadmetanje za izradu sportskog terena pod Golubinjom u Pljevljima na kojem nije bilo pristiglih ponuda i isto je ponovo raspisano.					
199	<b>19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - Instituta dr Simo Milošević AD Igalo</b>		6,000,000.00	8,900.00	4,713,850.05	0.00
	Zaključeni su ugovori za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Opština Herceg Novi imenovala revidenta. U toku je revizija projekta.					
200	<b>19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog bazena kod Starog grada Budva</b>		4,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Na dva raspisana javna nadmetanja nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.					
201	<b>19 038 K01 008 - Izgradnja multifunktionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru</b>		4,500,000.00	17,800.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.					
202	<b>19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama</b>		5,200,000.00	441,400.00	4,825,882.70	944,606.55
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođenje radova u toku.					
203	<b>19 038 K01 010 - Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru</b>		18,250,000.00	17,800.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti dalje aktivnosti. Potrebno je da nadležno Ministarstvo u saradnji sa Glavnim državnim arhitektom raspíše arhitektonski konkurs.					
204	<b>19 038 K01 011 - Olimpijska kuća u Podgorici</b>		4,200,000.00	17,800.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti dalje aktivnosti. Potrebno je da nadležno Ministarstvo u saradnji sa Glavnim državnim arhitektom raspíše arhitektonski konkurs.					
205	<b>19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti</b>		1,000,000.00	178,000.00	0.00	0.00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.					
206	<b>19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici</b>		13,000,000.00	905,000.00	11,258,552.88	3,163,011.01
	Zaključeni su ugovori sa izvođačima radova i stručnim nadzorom za radove na objektu i trafostanici. Svi radovi su završeni. U toku je plaćanje po okončanoj situaciji.					



207	<b>19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom. U toku je izvođenje radova.	2,300,000.00	645,890.00	733,988.22	313,776.16
208	<b>19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću</b> Raspisani pozivi za javno nadmetanje za izbor izvođača radova na kojem nije bilo pristiglih ponuda i isti će biti ponovljen.	2,500,000.00	559,850.00	0.00	0.00
209	<b>20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za osnovne i dodatne radove. Svi radovi su završeni u toku je izrada konačnog izvještaja nadzora i pregled objekta od konzervatorskih ustanova.	3,000,000.00	401,000.00	1,635,824.64	407,006.62
210	<b>20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture</b> UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	5,000,000.00	543,350.00	0.00	0.00
211	<b>20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić</b> Na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila Opština Nikšić i nakon sprovedene tenderske procedure, zaključen je Ugovor sa Izvođačem radova. Usluge Stručnog nadzora obezbijedila Opština kao donaciju. Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi i opremanje objekta specijalizovanom opremom su završeni. U toku je plaćanje po okončanim situacijama.	5,000,000.00	912,000.00	2,915,958.11	722,584.65
212	<b>20 021 K01 021 - Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću</b> Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	2,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
213	<b>20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulicinj</b> Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	1,800,000.00	8,900.00	0.00	0.00
214	<b>20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću</b> Završena je izrada projektne dokumentacije. Na dva javna nadmetanja nije bilo pristiglih ponuda.	330,000.00	243,000.00	26,559.00	17,000.00
215	<b>20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača</b> Na raspisana dva javna nadmetanja za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda.	3,800,000.00	299,800.00	0.00	0.00
216	<b>20 021 K01 030 - Scensko opremanje sale JU "Centar za kulturu Danilovgrad"</b> UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	360,000.00	8,900.00	0.00	0.00
217	<b>20 021 K01 031 - Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru</b> Na javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora nije bilo pristiglih ponuda. U toku su aktivnosti na ponavljanje postupka.	750,000.00	133,500.00	0.00	0.00
218	<b>20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici</b> UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	20,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
219	<b>21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetske blokove i pomoćnih izvora napajanja KCCG u PG</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. U toku su aktivnosti na usaglašavanju projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i potrebama korisnika u periodu izvođenja radova.	850,000.00	445,000.00	742,995.25	0.00
220	<b>21 011 K01 003 - Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u završnoj fazi. Preostala su finalna plaćanja po okončanim situacijama.	8,500,000.00	1,646,000.00	7,314,390.10	1,829,547.14
221	<b>21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu</b> Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Raspisano je javno nadmetanje za dodatne radove. Zaključeni su ugovori za nabavku medicinske opreme.	3,200,000.00	534,000.00	1,440,749.72	230,392.57
222	<b>21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima</b> Ministarstvo zdravlja i OB Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta koje je dostavljeno UKP, kao i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja sa predlogom za realizaciju projekta po principu "projektni i izgradi. Zaključen je ugovor sa izvođačem radova.	40,000,000.00	89,000.00	0.00	0.00
223	<b>21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica</b> Ministarstvo zdravlja i DZ Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje. U toku je tender za revidenta projekta.	21,000,000.00	44,500.00	88,865.18	88,865.18
224	<b>21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju</b> UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	2,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
225	<b>21 011 K01 008 - Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici</b> Ministarstvo zdravlja i KCCG u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što UKP bude dostavljeno idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	38,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
226	<b>21 011 K01 009 - Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog, Nikšić</b> Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	4,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
227	<b>21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"</b> Raspisano je javno nadmetanje za nabavku MRI za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić i nabavka multislaisnog skenera (CT) za potrebe KCCG.	2,400,000.00	445,000.00	422,290.00	0.00
228	<b>21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju</b>	15,000,000.00	292,005.34	111,560.79	0.00

229	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Projektant je konstatovao da je potrebno ukloniti postojeći objekat i predložio totalnu rekonstrukciju u postojećim gabaritima i za isto je dobijena saglasnost KCCG, a što za posljedicu ima produžetak roka izrade Glavnog projekta. Za inovirano idejno rješenje koje je od strane KCCG poslato glavnom državnom arhitekti dobijena je saglasnost	825,000.00	195,800.00	0.00	0.00
230	U toku je zaključivanje ugovora sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.	800,000.00	445,000.00	425,859.47	0.00
231	Nakon ponovljenog tenderskog postupka zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su ubrzo obustavljeni uslijed nekompletne projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva zdravlja i JZU Dom zdravlja, koji sprovode aktivnosti na dopuni i doradi projektne dokumentacije što će rezultirati raspisivanjem dodatnih javnih nabavki za dodatne radove.	3,000,000.00	445,000.00	0.00	0.00
232	Na prvi tender nije bilo pristiglih ponuda. Nakon ponovljenog javnog poziva donesena je odluka o izboru najpovoljnije ponude. Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i u toku je uvođenje u posao.	15,000,000.00	139,000.00	108,955.66	0.00
233	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je izrada projektne dokumentacije.	740,000.00	97,900.00	535,534.29	68,665.14
234	Radovi su završeni.	1,300,000.00	178,000.00	0.00	0.00
235	Raspisana su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora. Donesene su odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uložena žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova. Po rješenju Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki postupak je poništen. Ponovo je raspisan novi javni poziv za izbor izvođača radova.	920,000.00	441,000.00	884,927.41	240,421.70
236	Radovi su završeni.	4,200,000.00	53,900.00	0.00	0.00
237	Ministarstvo zdravlja i Opšta bolnica "Danilo I" u saradnji sa Ministarstvom ekologije sprovode aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što bude dostavljeno idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, UKP će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	400,000.00	8,900.00	0.00	0.00
238	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	360,000.00	358,400.00	358,400.00	0.00
239	Nakon drugog javnog nadmetanja za nabavku opreme zaključen je ugovor sa dobavljačem.	780,000.00	780,000.00	453,561.49	29,221.50
240	Nakon drugog tendera zaključen ugovor sa dobavljačem opreme za banku matičnih ćelija. Ugovor se realizuje po 9 partija, od čega je za 6 završena realizacija. Od nabavke opreme po jednoj partiji korisnik je odustao, dok je ponovljen poziv za nabavku opreme za preostale dvije partije.	800,000.00	445,000.00	0.00	0.00
241	Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom i izvođačem radova, koji je uveden u posao na objektima u Beranama i Nikšiću, dok se za Bar i Budvu očekuje oslobađanje prostora. U bijelom Polju očekuje se od strane Minszta zdravlja definisanje nastavka aktivnosti. Neusaglašenost projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta.	750,000.00	445,000.00	0.00	0.00
242	U toku je izrada projektne dokumentacije koju sprovodi nadležno ministarstvo.	3,900,000.00	445,000.00	0.00	0.00
243	UKP je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i KCCG krajem 2023. raspisalo javno nadmetanje za nabavku linearnog akceleratora za i u toku je realizacija ugovora.	5,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
244	UKP nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	5,000,000.00	409,000.00	14,223.72	11,853.10
245	Adaptacija terasa na paviljonima bolnice u Brezoviku – Po drugi put raspisan tender i u toku je vrednovanje ponuda; Izgradnju novog Urgentnog centra i dnevne bolnice OB Berane - priprema tenderske dokumentacije u toku; Rekonstrukciju operacionog bloka OB Berane - priprema tenderske dokumentacije u toku; Opšta bolnica Bijelo Polje - U toku je ponovno raspisivanje tendera za izbor izvođača radova za rekonstrukciju krova; Dječiji dispanzer u Nikšiću - U toku je ponovno raspisivanje tendera; Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić – Po drugi put raspisan tender.	8,280,000.00	1,027,967.82	8,828,218.22	4,019,809.36
246	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Doći će do produženja roka od nekoliko mjeseci zbog neusklađenosti tehničke dokumentacije sa realnim stanjem na terenu.	2,100,000.00	83,199.98	2,089,343.77	403,693.31
	Radovi su završeni.				

247	21 011 K02 004 - Radovi na izgradnji operativnog centra	2,200,000.00	6,137.50	2,193,991.25	662,301.88
	Radovi su završeni.				
248	22 025 K01 002 - Izgradnja Doma starih u Nikšiću	2,880,000.00	89,000.00	2,797,596.01	0.00
	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu. Preostalo plaćanje realizovano.				
249	22 025 K01 007 - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1,700,000.00	404,000.00	1,659,873.74	363,128.15
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
250	22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	1,000,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	UKP nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
251	22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Herceg Novi	1,200,000.00	267,000.00	903,154.10	0.00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
252	22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu	3,500,000.00	534,000.00	3,476,133.36	158,920.43
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
253	22 025 K01 011 - Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica	7,500,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	U toku su pripremne aktivnosti na utvrđivanju lokacije i izradi projektnog zadatka.				
254	22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	1,100,000.00	8,900.00	0.00	0.00
	Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
	<b>UKUPNO</b>	<b>1,476,148,404.00</b>	<b>121,300,640.14</b>	<b>517,046,599.80</b>	<b>66,457,735.58</b>

### UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ (programski kod 41003) - realizovane aktivnosti u prvom polovini 2024. godine

Rb	Naziv i kod projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu	Procijenjena vrijednost	Zakon 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje
1	17 020 K01 002 - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komisije za tehnički pregled.	67,800,000.00	8,425,426.68	59,352,576.35	2,507,473.48
2	17 020 K01 003 - Rekonstrukcija puta Dinoša - Cijevna Zatrijebačka Projekat je završen. Predat je konačan izvještaj stručnog nadzora.	890,000.00	38,359.00	696,617.09	124,043.01
3	17 020 K01 004 - Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrujica - Miljakovići Nakon što je sa prvobitnim izvođačem raskinut ugovor i sproveden novi tenderski postupak, zaključen je ugovor o izvođenju radova i isplaćen je avans po ugovoru.	10,500,000.00	1,837,850.00	7,697,497.53	783,096.37
4	17 020 K01 006 - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i BP Objavljena tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.	20,000,000.00	89,890.00	0.00	0.00
5	17 020 K01 009 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova Završeni su svi radovi na prvobitno planiranoj i ugovorenoj dionici, a u toku su pripreme radnje za raspisivanje tendera za dodatne radove shodno usvojenom zaključku skupštinskog odbora.	33,500,000.00	11,150,000.00	19,647,707.05	3,058,376.98
6	17 020 K01 010 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od Juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda regionalnog vodovoda.	66,000,000.00	2,225,890.00	58,454,879.18	1,291,130.57
7	17 020 K01 011 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarovina-Poda-Berane Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.	35,950,000.00	89,890.00	35,866,656.29	11,626,426.18
8	17 020 K01 014 - Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.	39,500,000.00	4,170,267.00	35,601,016.09	2,200,102.69
9	17 020 K01 016 - Rekonstrukcija puta most Zeleni - Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza U toku je priprema tenderske procedure za izbor izvođača radova. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.	15,600,000.00	418,300.00	168,190.00	109,323.50
10	17 020 K01 017 - Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor Nije bilo aktivnosti u posmatranom periodu jer se čeka HIA studija uticaja puta na zaštićeno područje Kotora. Izvršenja se odnose na isplatu po Rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara.	40,000,000.00	48,950.00	4,992.10	4,992.10
11	17 020 K01 018 - Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - Vragodo Priprema tenderske dokumentacije je u toku. Za objekat nije izdata građevinska dozvola jer projektna dokumentacija nije u skladu sa Zakonom.	13,400,000.00	1,375,050.00	13,200,961.20	1,846.41
12	17 020 K01 019 - Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica NK-Kuside i NK-Jasenovo Polje Izvođenje radova na predmetnoj dionici je u toku. Neriješeni imovinski pravni odnosi usporavaju izvođenje radova, kao i izmještanje instalacija u vlasništvu CEDIS-a.	7,100,000.00	3,886,360.00	6,902,975.56	1,959,751.08

13	<b>17 020 K01 021 - Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac</b> U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	48,885,000.00	925,600.00	307,674.42	11,341.24
14	<b>17 020 K01 022 - Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute</b> Potpisan ugovor o izvođenju radova i za stručni nadzor. U toku je izvođenje radova.	12,500,000.00	1,806,700.00	12,189,540.00	1,199,454.80
15	<b>17 020 K01 024 - Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta CT - Čevo, CT - Njeguši</b> Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi u dužini od oko 200m.	36,000,000.00	1,375,050.00	2,969,275.98	799,940.78
16	<b>17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva</b> Završeni radovi na investicionom presvlačenju za sekcije Kotor, Podgorica, Berane i Pljevlja, radovi u toku u sekciji Nikšić.	8,000,000.00	2,705,600.00	4,811,458.53	3,374,103.54
17	<b>17 020 K01 027 - Putni prelazi</b> Realizacija aktivnosti u planiranom obimu se očekuje u IV kvartal tekuće godine. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju projekta čiju realizaciju prati Uprava za željeznice.	800,000.00	180,937.00	0.00	0.00
18	<b>17 020 K01 028 - Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva</b> Realizovane aktivnosti se odnose: na isplatu naknada po Rješenjima za Jedinicu za implementaciju projekata koji se finansiraju iz kredita EIB i EBRD; na troškove advokatskih usluga po osnovu rješenja sudova i privremenih zastupnika po rješenjima Uprave za nekretnine za eksproprijaciju; na isplate po rješenjima Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; na isplate po rješenjima Uprave za katastar i državnu imovinu; tehnički pregledi izvedenih radova i izrada projekata elaborata i revizija istih, UTU uslovi; na isplate po osnovu eksproprijacije nepokretnosti za projekte koje su već završeni i iz ranijeg su perioda; na isplatu okončane situacije za radove za Sanaciju klizišta Donje luge.	4,900,000.00	1,173,040.00	608,903.31	592,989.17
19	<b>17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari</b> Priprema odluke za proglašenje javnog interesa za nepokretnosti iz elaborata eksproprijacije potrebne za realizaciju projekta.	7,600,000.00	72,090.00	143,034.10	1,694.00
20	<b>17 020 K01 032 - Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin</b> Radovi su izvršeni u potpunosti. Pribavljena potrebna dozvola.	6,500,000.00	453,900.00	6,431,746.80	904,758.75
21	<b>17 020 K01 035 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska</b> U toku je priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova, za II fazu.	2,300,000.00	542,900.00	86,284.50	0.00
22	<b>17 020 K01 036 - Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice</b> Dopuna i revizija tehničke dokumentacije od strane Glavnog grada Podgorica. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.	20,600,000.00	1,530,800.00	0.00	0.00
23	<b>17 020 K01 037 - Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir</b> Izrada tehničke dokumentacije je završena, u toku je konačan izvještaj revizije.	20,600,000.00	119,890.00	89,000.14	73,847.39
24	<b>17 020 K01 040 - Stručni nadzor za rekonstrukcije mag. puteva: PV-Mihajlovića, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-B.Polje i Berane-Tunnel "Lokve"-Rožaje</b> Nadzor je vršen na projektu Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane.	3,000,000.00	1,780.00	1,492,960.00	0.00
25	<b>17 020 K01 041 - Stručni nadzor za: Damilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz</b> Stručni nadzor je izvođen nad projektom Tivat - Jaz i Rožaje Špiljani.	3,000,000.00	420,000.00	2,488,905.00	254,611.71
26	<b>17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna</b> Otvaranje ponuda je bilo 30. avgusta i toku je vrednovanje pristiglih ponuda.	1,100,000.00	356,000.00	0.00	0.00
27	<b>17 020 K01 043 - Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić</b> Nije bilo realizovanih aktivnosti, još uvijek nije donijet prostorni plan.	58,000,000.00	996,800.00	420,309.99	0.00
28	<b>17 020 K01 045 - Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)</b> Nije bilo aktivnosti jer se čeka da se potpiše Međudržavni ugovor između Crne Gore i Albanije.	4,750,000.00	9,790.00	0.00	0.00
29	<b>17 020 K01 046 - Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Ščepan Polju</b> Priprema projektne dokumentacije. Priprema dokumentacije se vrši od strane organa BiH, koje učestvuju u ovom međudržavnom projektu.	4,075,000.00	9,790.00	0.00	0.00
30	<b>17 020 K01 048 - Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na Cijevni do Šipčanika</b> Nije bilo aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izbor Izvođača radova zbog ne riješenih imovinsko - pravnih odnosa od strane opštine Tuzi i izrade dopune tehničke dokumentacije.	14,500,000.00	449,450.00	0.00	0.00
31	<b>17 020 K01 056 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Jasenovno polje-Vidrovan</b> Izvođenje radova na predmetnoj dionici je završeno i plaćeno po okončanim situacijama.	4,800,000.00	1,797,800.00	4,707,402.30	3,105,311.12
32	<b>17 020 K01 057 - Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka</b> Raskinut prvobitni ugovor o reviziji i formirana je nova revizijska komisija i predata geodezija na reviziju.	18,000,000.00	99,680.00	150,400.00	16,120.00
33	<b>17 020 K01 058 - Rekonstrukcija tunela Vrmac</b> Postavljeni reperti za geodetsko praćenje i vrše se kontrolna mjerenja.	9,330,000.00	48,950.00	0.00	0.00

34	17 020 K01 063 - Rekonstrukcija magistralnog puta Pluzine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje Potpisan ugovor za projektovanje.	15,000,000.00	31,150.00	0.00	0.00
35	17 020 K01 065 - Izrada rasvjete u tunelu "Ključ" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin Izabran je izvođač radova. Otvaranje ponuda za vršenje stručnog nadzora je bilo u septembru.	300,000.00	89,890.00	4,840.00	0.00
36	17 020 K01 066 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen Pokrenuta je javna nabavka za izbor projektanta.	631,000.00	209,150.00	0.00	0.00
37	17 020 K01 067 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva Priprema tehničke dokumentacije u cilju stvaranja uslova za izbor izvođača radova.	6,200,000.00	1,845,000.00	464,285.71	141,785.06
38	17 020 K01 068 - Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica "Budoš" - DG Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi. U toku je izrada dodatne tehničke dokumentacije.	37,000,000.00	1,343,900.00	226,028.00	52,635.00
39	17 020 K01 069 - Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, II faza Bajička ulica Izvođenje radova je završeno. "U toku je tehnički pregled izvedenih radova, nakon čega će se dostaviti okončana situacija za isplatu zadržanih sredstava po ugovoru.	1,840,000.00	622,110.00	1,837,568.93	1,056,217.97
40	17 020 K01 070 - Uvodnje Inteligentnih transportnih sistema (ITS) Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.	1,520,000.00	538,450.00	0.00	0.00
41	17 020 K01 072 - Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica - Bioča U toku je usaglašavanje Glavnog projekta sa Eurokodovima.	11,620,000.00	8,900.00	22,856.90	25,821.40
42	17 020 K01 073 - Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate Zaključen je ugovor za projektovanje i izvođenje radova.	12,140,000.00	1,405,310.00	10,908,919.28	0.00
43	17 020 K01 076 - Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-10, dionica Tomaševo-Pavino polje Radovi su u cjelosti završeni.	1,215,000.00	963,350.00	1,196,922.32	1,136,212.68
44	17 020 K01 078 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevja-Dajevića han Nije bilo realizovanih aktivnosti jer se čeka izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Pljevlja.	5,100,000.00	453,900.00	0.00	0.00
45	17 020 K01 079 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Zaborje-Jasenovo polje Izabran izvođač radova, potpisan ugovor i isplaćen avans.	16,000,000.00	2,031,150.00	14,972,054.15	1,501,924.41
46	17 020 K01 081 - Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Tuzi.	6,613,000.00	588,290.00	0.00	0.00
47	17 020 K01 082 - Rekonstrukcija M-11 Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“ Priprema tenderske procedure za izvođača radova i stručnog nadzora. U toku je izmjena projektne dokumentacije od strane Opštine Tivat a po zahtjevu CEDIS-a.	18,000,000.00	454,790.00	0.00	0.00
48	17 020 K01 083 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-1, dionica Sutomore - ulaz u Baru Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar.	19,230,000.00	97,900.00	0.00	0.00
49	17 020 K01 091 - Izgradnja tunela „Lokve“ Priprema tenderske dokumentacije za izradu tehničke dokumentacije. Čeka se dobijanje urbanističko-tehničkih uslova od nadležnog ministarstva.	20,000,000.00	97,900.00	0.00	0.00
50	17 020 K01 092 - Unapređenje baze putnih podataka Potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci za usluge na izradi referentnog sistema državnih puteva Crne Gore.	830,000.00	373,800.00	15,415.40	12,740.00
51	17 020 K01 094 - Izgradnja puta Plav - Bogičevica Izrada projektne dokumentacije u nadležnosti Uprave za kapitalne investicije.	32,000,000.00	98,790.00	0.00	0.00
52	17 020 K01 095 - Rekonstrukcija Tunela "Budoš" na magistralnom putu M-3, Nikšić-Danilovgrad Izrada tehničke dokumentacije kako bi se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.	10,640,000.00	97,900.00	0.00	0.00
53	17 020 K01 096 - Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane - Riđani U toku je priprema projektne dokumentacije.	5,340,000.00	143,290.00	0.00	0.00
54	17 020 K02 001 - Obilaznica Rožaje, II faza Ni na drugom tenderu u julu mjesecu nije bilo ponuda zbog niske procijenjene vrijednosti. Rebalansom uvećana za 6,5 miliona i u toku su procedure za ponovno raspisivanje javnog poziva.	33,650,000.00	970,100.00	507,296.16	0.00
55	17 020 K02 002 - Rekonstrukcija magistralnog puta PG-NK, dionica Cetinjski semafori – Komanski Most Završeni radovi na 1km trase. Raskinut ugovor sa izvođačem. Radovi na preostalom dijelu od 700m nije moguće izvoditi do završetka izrade izmjenjene planske dokumentacije i rješavanja eksproprijacije.	4,500,000.00	102,350.00	3,135,570.55	0.00
56	17 020 K02 007 - Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić Završena je izrada tehničke dokumentacije sa izmjenama. Nakon okončanja postupka eksproprijacije koji sprovođi Glavni Grad i izabrani izvođača putem javnog nadmetanja će biti uveden u gradilište.	25,231,000.00	9,790.00	0.00	0.00

57	17 020 K02 008 - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na putu Berane - Grnčar	305,000.00	304,340.00	298,621.01	88,757.11
	Izvođač radova uveden u posao. Realizovane aktivnosti se odnose na isplatu avansa i prve privremene situacije. Radovi obustavljeni zbog izmjena u tehničkoj dokumentaciji od strane Opštine Plav.				
58	17 020 K03 001 - Autoput Bar-Bojare	605,000,000.00	40,236,000.00	1,450,882.94	1,287,374.78
	Pokrenut je postupak eksproprijacije i donijeta su rješenja o zabijeljzama na nepokretnostima. U toku je saslušanje vlasnika nepokretnosti pred Upravom za nekretnine PJ Kolašin i PJ Andrijevica.				
59	17 020 K05 003 - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petrijica	350,000.00	153,080.00	9,801.00	0.00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Problemi sa projektnom dokumentacijom i usaglašavanjem po Eurokodovima.				
60	17 020 K05 004 - Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	800,000.00	372,020.00	0.00	0.00
	Nije bilo ponuda na tenderu u julu tekuće godine i objavljen je novi javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača.				
61	17 020 K05 005 - Sanacija klizišta Brvenica na regionalnom putu Plijevlja-Gradac	350,000.00	264,330.00	0.00	0.00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Usaglašavanje tehničke dokumentacije sa Eurokodovima.				
62	17 020 K05 007 - Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica	1,400,000.00	117,035.00	1,332,063.07	443,538.18
	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.				
63	17 020 K05 008 - Sanacija klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac	330,000.00	117,124.00	615,554.04	115,492.66
	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.				
64	17 020 K05 009 - Sanacija klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjelaha	145,000.00	146,150.00	143,372.50	32,623.42
	Radovi su započeti krajem maja i završeni. Isplaćena je prva situacija.				
65	17 020 K05 010 - Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina	804,000.00	623,000.00	20,267.50	200.00
	Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova.				
66	17 020 K05 012 - Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin	1,430,000.00	364,900.00	24,079.00	2,047.36
	Tender za izbor izvođača poništen, jer nije bilo ponuda. Objavljen je novi. U toku je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.				
67	17 020 K05 014 - Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina	3,540,000.00	2,670.00	3,400.00	3,400.00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije po Ugovoru o malim nabavkama.				
68	17 020 K05 015 - Sanacija kritične tačke Sokolovina na putu Đurđevića Tara-Mojkovac	10,700,000.00	5,343,190.00	10,668,563.17	1,837,355.23
	Izvođenje radova u toku.				
69	17 020 K05 016 - Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na putu Žabljak-Šavnik	2,060,000.00	245,640.00	11,253.00	0.00
	Zaključen ugovor za projektovanje. Pozitivno revidovana geodezija.				
70	17 020 K05 018 - Sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar -Ulcinj	1,440,000.00	898,900.00	860.00	860.00
	Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije po rješenju Ministarstva kapitalnih aktivnosti.				
71	17 020 K05 019 - Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj	852,000.00	549,130.00	860.00	860.00
	Na ponovljenom tenderu za izbor izvođača nije bilo ponuda. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije po rješenju Ministarstva kapitalnih aktivnosti.				
72	17 020 K05 020 - Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na putu Ščepan polje-Plužine	2,110,000.00	75,650.00	0.00	0.00
	Završena tenderska procedura za izbor projektanta i potpisan ugovor o izradi glavnog projekta.				
73	17 020 K05 022 - Sanacija klizišta „Dobrakovo	5,515,000.00	3,814,600.00	5,386,946.60	1,892,371.20
	U toku je redovno izvođenje radova na predmetnoj dionici.				
74	17 020 K05 023 - Sanacija klizišta na putu Mateševo-Kolašin	1,300,000.00	449,450.00	1,269,042.67	249,003.95
	Radovi su izvršeni u potpunosti i pribavljane je potrebne dozvole. Završen tehnički pregled i dobijen pozitivan izvještaj.				
75	17 020 K05 024 - Sanacija mosta „Bare Kraljske“	780,000.00	48,950.00	0.00	0.00
	Izvršena privremena sanacija kroz program održavanja magistralnih i regionalnih puteva, te se u narednom periodu neće raditi ovaj projekat.				
76	17 020 K05 025 - Sanacija kosine „Galev krš“ na regionalnom putu Đurđevića Tara -Mojkovac	1,650,000.00	48,950.00	0.00	0.00
	Nije bilo aktivnosti zbog nedostavljanja urbanističko tehničkih uslova.				
77	17 020 K05 026 - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na regionalnom putu Đurđevića Tara - Mojkovac	1,380,000.00	48,950.00	0.00	0.00
	Uspješno okončan tender za izradu tehničke dokumentacije i u toku je faza potpisivanja ugovora.				
78	17 020 K05 027 - Sanacija kosina na regionalnom putu R-24 Buča - Lubnice	1,110,000.00	78,320.00	0.00	0.00
	Priprema tenderske dokumentacije sa ciljem izrade tehničke dokumentacije. Čekaju se Urbanističko tehnički uslovi od nadležnog ministarstva.				
	<b>UKUPNO</b>	<b>1,560,651,000.00</b>	<b>115,712,318.68</b>	<b>329,018,892.41</b>	<b>44,448,414.76</b>
