




**IZGRADNJA LOKALNE
CRNA GORA
UPRAVA JAVNIH RADOVA**

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA ZA PERIOD
OD 01.01.2018.GODINE DO 31.12.2018.GODINE**

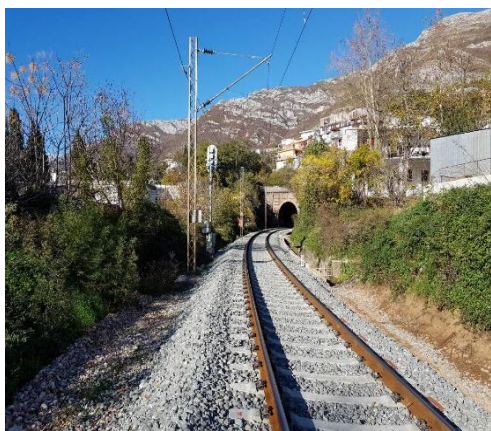

SADRŽAJ

SADRŽAJ	3
REZIME	8
	9
TABELARNI PREGLED REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA	18
ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018.GODINE	18
REALIZACIJA PO OBJEKTIMA	29
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG	30
PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA	30
1.8. REKONSTRUKCIJA SKUPŠTINSKE SALE U BIJELOM POLJU	38
2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA	40
OBJEKATA KULTURE	40
2.1. NADGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DOMA VOJSKE ZA POTREBE MUZIČKOG CENTRA, CRNOGORSKE	
KINOTEKE I DRŽAVNOG PROTOKOLA U PODGORICI	41
2.2. UREĐENJE TERENA OKO SPOMEN OBILJEŽJA PALIM BORCIMA NOR-A NA ŽABLJAKU	42
2.3. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DVORCA KRALJA NIKOLE U NIKŠIĆU	43
2.4. KONKATEDRALA SVETOG PETRA U BARU	43
2.5. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA	43
	44
3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	44
SPORTSKIH OBJEKATA	44
3.1. IZGRADNJA OBJEKTA SPORTSKE DVORANE U KOTORU	45
3.2. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZATVORENOG BAZENA “NIKŠA BUĆIN” U KOTORU	46
3.3. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA I SALA	47
3.4. IZGRADNJA SPORTSKE SALE U NIKŠIĆU	50
3.5. IZGRADNJA SPORTSKE SALE GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U ROŽAJAMA	51
3.6. IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE U GUSINJU	51
3.7. FUDBALSKI STADION NA CETINJU	52
3.9. UNAPREĐENJE LOKALNE SPORTSKE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE PRIJESTONICE CETINJE	53
4.PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE	54
4.1. SANITARNE DEPONIJE, POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I VODOSNADBILJEVANJE	55
4.2. IZGRADNJA REGIONALNIH CENTARA, TRANSFER STANICA I SANACIJA POSTOJEĆIH ODLAGALIŠTA OTPADA	59
4.3. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA HIDROTEHNIČKOG TUNELA U MOJDEŽU U HERCEG NOVOM	60
4.4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODA	61
4.5. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SISTEMA ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA	63
4.6. SPROVOĐENJE MJERA SMANJENJA ZAGAĐENJA I TOPLIFIKACIJE PLJEVALJA	65
4.7. UNAPRIJEĐENJE POSTOJEĆE MREŽE METEOROLOŠKIH I PADAVINSKIH STANICA	65
4.8. SANACIJA ODLAGALIŠTA U PLAVU	66
4.9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA PODRUČJU BUKOVICA- RADETINA U ROŽAJAMA	66
4.10. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VRANJINI	66
□ 4.11. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U OPŠTINI CETINJE	66
4.12. IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI PLAVSKOG JEZERA	67
4.13. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA ŽABLJAKU	67

	68
5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	68
5.1. REKONSTRUKCIJA „RIBARSKA” ULICE U PLAVU	69
5.2. IZGRADNJA PASARELE I PRATEĆIH SADRŽAJA ZA POTREBE ŠETALIŠTA I UREĐENJE PROSTORA JALOVIŠTA U MOJKOVCU	69
5.3. POMOĆ LOKALNIM UPRAVAMA U RJEŠAVANJU INFRASTRUKTURNIH PROBLEMA	70
5.4. REKONSTRUKCIJA MOSTA »RADOVAN PAVIĆEVIĆ« NA RIJECI ZETI U DANILOVGRADU	80
5.5. IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U GUSINJU	80
5.6. UREĐENJE OBALA RIJEKA, IZRADA OBALOUTVRDA I UREĐENJE KORITA RIJEKA	81
5.7. IZGRADNJA REIONALNE STOČNE PIJACE U BERANAMA	82
5.8. IZGRADNJA PJEŠAKOG MOSTA POTKRAJCI- NJEGNJEVO U BIJELOM POLJU	83
5.9. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA ZAIBILAZNICI U BIJELOM POLJU	83
5.10. IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U ROŽAJAMA	84
5.11. REKONSTRUKCIJA PUTA PLAV- VOJNO SELO U GUSINJU	85
5.12. REKONSTRUKCIJA PRNJAVORSKE ULICE U PLAVU	85
5.13. IZRADA PROJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA PLAV- BOGIĆEVIĆA	85
5.14. IZGRADNJA PJEŠAKOG MOSTA U HAREMIMA U OPŠTINI BERANE	86
5.15. IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA ZA BIZNIS ZONU U MOJKOVCU	86
5.16. KOMUNALNO OPREMANJE I HITNA SANACIJA NA DIJELU OBJEKATA U BIZNIS ZONAMA NA CETINJU	86
5.17. PODRŠKA U ZAPOSŁJAVANJU OSI NA CETINJU	86
5.18. REKONSTRUKCIJA STUDENTSKOG TRGA NA CETINJU	86
5.19. REKONSTRUKCIJA TRGA I PIJACE NA NJEGUŠIMA NA CETINJU	87
5.20. REKONSTRUKCIJA NJEGOŠEVOG PARKA NA CETINJU	87
5.21. NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐENJE RADA JAVNIH SLUŽBI PRIJESTONICE CETINJE	87
5.22. KUPOVINA PROSTORA ZA POTREBE „PARKING SERVIS I ODRŽAVANJE OBJEKATA” ZA POTREBE PRIJESTONICE CETINJE	87
5.23. IZGRADNJA PRIHVATIŠTA ZA NAPUŠTENE KUĆNE LJUBIMCE (AZIL) NA CETINJU	87
5.24. IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA POTREBE PRIJESTONICE CETINJE	88
5.25. SANACIJA PODVOŽNJAKA I UREĐENJA PROSTORA OD ČIPURA DO VLADINOG DOMA NA CETINJU	88
5.26. UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE DO ORLOVOG KRŠA NA CETINJU	88
5.27. UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA I OSVJETLJENJE TVRĐAVE NA ŽABĹJAKU CRNOJEVIĆA NA CETINJU	88
5.28. OSVJETLJENJA “ČIPURA” I “BILJARDE” NA CETINJU	88
5.29. PUTNI PRAVAC LUŠTICA 2 MONTE ROSE	89
STATUS PROJEKTA: U TOKU	89
5.30. IZRADA TEHNIČKE I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE ZA POTREBE PRIJESTONICE CETINJE	89
6. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA	90
6.1. REKONSTRUKCIJA ENERGETSKOG BLOKA- TRAFOSTANICE I POMOĆNIH IZVORA NAPAЈANJA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI	91
6.2. PRIVOĐENJE NAMJENI NOVOIZGRAĐENIH DJELOVA OBJEKATA DOM ZDRAVLJA „NOVA VAROŠ” I DOM ZDRAVLJA „STARA VAROŠ” U PODGORICI	91
6.3. REKONSTRUKCIJA DIJELA OBJEKTA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE ZA POTREBE URGENTNOG BLOKA	91
7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA	92
7.1. IZGRADNJA DOMA STARIH U PODGORICI	93
7.2. IZGRADNJA DOMA STARIH U NIKŠIĆU	94


7.3. KUPOVINA ZEMLJIŠTA ZA POTREBE IZGRADNJE OBJEKATA U CILJU RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA ZA POTREBE PRIJESTONICE CETINJE	94
8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	95
OBRAZOVANJA I NAUKE	95
8.1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A	96
8.1.1. VRTIĆ U PODGORICI	96
8.1.2. VRTIĆ U BARU	97
8.1.3. VRTIĆ U ULCINJU	98
8.1.4. VRTIĆ U PLJEVLJIMA	98
8.1.5. VRTIĆ U BLOKU VI U PODGORICI	99
8.1.6. VRTIĆ U TUZIMA	100
8.1.7. REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	100
8.2. IZGRADNJA OBJAKTA VRTIĆA U ROŽAJAMA	100
8.3. IZGRADNJA VRTIĆA U CITY KVARTU	101
8.4. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE U PODGORICI	101
8.5. IZGRADNJA OBJEKTA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U GOLUBOVCI, GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI	101
8.6. IZGRADNJA OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE U GUKAMA, OPŠTINA PLJEVLJA	103
8.7. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U TOLOŠIMA U PODGORICI	104
8.8. REKONSTRUKCIJA TOPLANE UNIVERZITETA CRNE GORE NA PROSTORU DUP-A »UNIVERZITETSKI CENTAR« U PODGORICI	104
8.9. REKONSTRUKCIJA ANEKSA OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE U BAĆU I KALAČAMA, U OPŠTINI ROŽAJE	104
8.10. SANACIJA KLIZIŠTA NA SAVINI ZA POTREBE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH OBJEKATA U HERCEG NOVOM	105
8.11. IZGRADNJA OSNOVNE I MUZIČKE ŠKOLE »DUŠAN KORAĆ« U BIJELOM POLJU	107
8.12. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U ROŽAJAMA	107
8.13. IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA AKADEMIJE UMJETNOSTI NA CETINJU	108
8.14. REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA ZA POTREBE USPOSTAVLJANJA BIZNIS INKUBATORA NA CETINJU	109
	110
8.15. IZGRADNJA SALE ZA OSNOVNU ŠKOLU »LOVČENSKI PARTIZANSKI ODRED« NA CETINJU	110
8.16. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE U KARABUŠKOM POLJU U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI	110
9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	111
9.1. SKI CENTAR „KOLAŠIN 1600“ U KOLAŠINU	112
9.2. SKI CENTAR NA LOKALITETU CMILJAČA U BIJELOM POLJU	116
9.3. SKI CENTAR NA LOKALITETU ŽARSKI U MOJKOVCI	118
9.4. SKI CENTAR NA LOKALITETU HAJLA U ROŽAJAMA	120
9.5. SKI CENTAR NA LOKALITETU DURMITOR NA ŽABLJAKU	121
9.6. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA, IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA	124
9.7. VALORIZACIJA ĐALOVIČA PEĆINE U BIJELOM POLJU	128
9.8. „KUĆA VOĆA“ U ANDRIJEVICI	131
9.9. IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KANLI KULE U HERCEG NOVOM	132
9.10. NACIONALNI PARKOVI	132
9.11. IZGRADNJA OBJEKTA NACIONALNE »KUĆE MASLINA« SA SJEDIŠTEM U BARU	135
9.12. DOM REVOLUCIJE U NIKŠIĆU- REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA	136
9.13. IZGRADNJA OBJEKTA ZA IZLOŽBENI PROCTOR NA CETINJU	137

9.14. IZRADA PROMOTIVNIH SADRŽAJA ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE PRIJESTONICE CETINJE	138
PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA	139
10.1. PPOV, KANALIZACIONA MREŽA I UREĐENJE VODOSNADBIVANJA U BERANAMA- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA	140
10.2. SANACIJA ODLAGALIŠTA „VRTIJELJKA” NA CETINJU- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA	142
10.3. SANACIJA ODLAGALIŠTA „ĆAFE” U BARU- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA	144
10.4. REKONSTRUKCIJA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI VIRPAZAR-SUTOMORE	145
10.5. DEMONTAŽA POSTOJEĆE, NABAVKA I MONTAŽA NOVE ELEKTRIČNE VUČNE PODSTANICE „TREBEŠICA”- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	145
10.6. TEHNIČKA POMOĆ	147
10.7. REHABILITACIJA DIJELA PRUGE SA TUNELIMA KOS- TREBEŠICA	147
10.8. INKLUZIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA U OBRAZOVNI SISTEM	147
10.9. PRIPREMA PROJEKATA ZA SEKTORE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMJENA	148
10.10. PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJE OTPADOM	148
10.11. PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJE VODAMA	148
11. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED	149
AUTOPUTA BAR- BOLJARE	149
12. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	151
12.1. DOM STARIH U OPŠTINI PLJEVLJA	152
12.2. STAMBENI OBJEKTI NA LOKACIJI KONIK II U PODGORICI	153
12.3. STAMBENI OBJEKTI U BERANAMA	154

REZIME

Kapitalnim budžetom za 2018. godinu planirano je da Direkcija javnih radova realizuje sredstva u ukupnom iznosu od **46.075.000,00 €**, od čega je: **45.162.200,00 €** iz opštih izvora, **13.600,00 €** iz kreditnih izvora, **1.700,00 €** donacija i **897.500,00 €** IPA sredstva.

U skladu sa tim svi projekti Kapitalnog budžeta, kao što je definisano Zakonom o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom opredijeljena su sredstva na sledeći način:

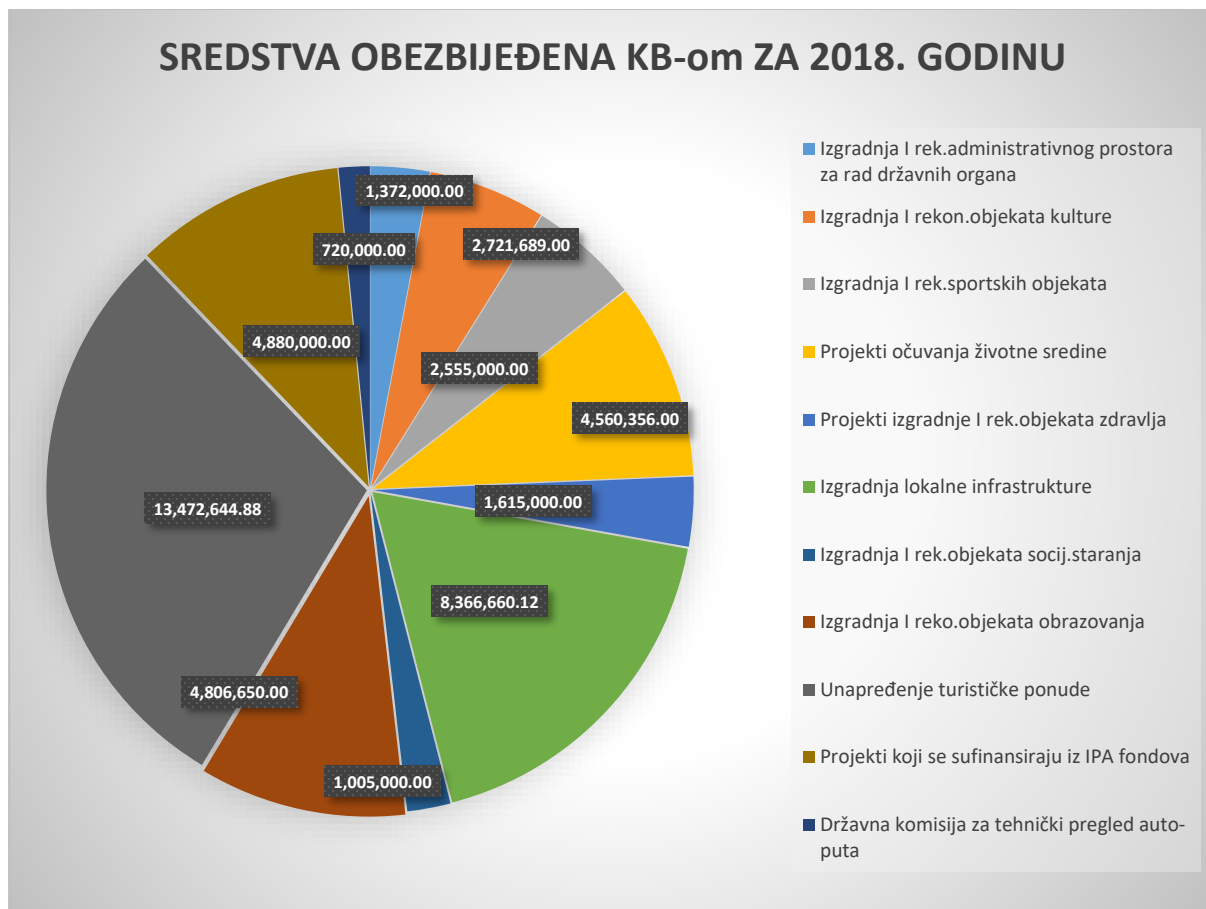

Kapitalnim budžetom je predviđeno da Direkcija javnih radova sprovodi aktivnosti na realizaciji 118 projekata koji se finansiraju iz sledećih izvora:

- opšti prihodi - 94 projekta
- opšti prihodi uz sufinansiranje - donacije stranih Vlada i organizacija-6 projekata
- bespovratna sredstava iz predpristupnih IPA programa, kreditna sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda - 1 projekat,
- bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa, kreditnih sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda – 10 projekata
- kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope, uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a - 7 projekata (Projekti Dječijih vrtića - projekat izgradnje dječijeg vrtića u Zagoriču u Podgorici završen je u 2016. godini, a radovi na izgradnji dječijeg vrtića na Starom aerodromu se odvijaju planiranom dinamikom

U članu 12 Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

- 1) Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte: "Sanitarne deponije";
"Vodosnabdijevanje i otpadne vode";
 - 2) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:
 - a) "Projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa";
 - b) "Projekat unapređenja obrazovanja";
- * Dječiji vrtić na Starom aerodromu u Podgorici,
 - * Dječiji vrtić u Baru,
 - * Dječiji vrtić u Ulcinju,
 - * Dječiji vrtić u Pljevljima,
 - * Dječiji vrtić u Bloku VI u Podgorici,
 - * Dječiji vrtić u Tuzima,
 - * Rekonstrukcija vrtića.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u članu 14 propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

-Donacije stranih Vlada i organizacija:

- * Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici
- * Sanacija deponije na Žabljaku
- * Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini
- * Sanacija odlagališta u Plavu
- * Izgradnja O.Š. u Sukobinu, Ulcinj

-Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa:

*Za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja, sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada, projekte saobraćajne infrastrukture i projekte iz oblasti tehničke pomoći.

Direkcija javnih radova je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine sklopila **228** ugovora i to:


- **81** ugovora za izvođenje radova
- **91** ugovora za vršenje stručnog nadzora
- **24** ugovora za izradu projektne dokumentacije
- **27** ugovora za vršenje revizije
- **5** ugovor za usluge

Samo u mjesecu decembru tekuće godine Direkcija javnih radova sklopila je 19 ugovora čija vrijednost iznosi **6.696.229,44 €**. Ukupna vrijednost svih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.2018. godine zaključno sa 31.12.2018. godine iznosi **53.569.398,28 €**.


U periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine raspisano je **139** tendera čija ukupna vrijednost iznosi **57.183.998,00 €**. U decembru su raspisana **23** tendera ukupne vrijednosti **35.700.00 €**.

Napominjemo da je Plan javnih nabavki usvojen 02. februara 2018. godine u mjesecu januaru nije bilo raspisivanja javnih nadmetanja.


ZAKLJUČENI UGOVORI DIREKCIJE JAVNIH RADOVA U 2018. GODINI

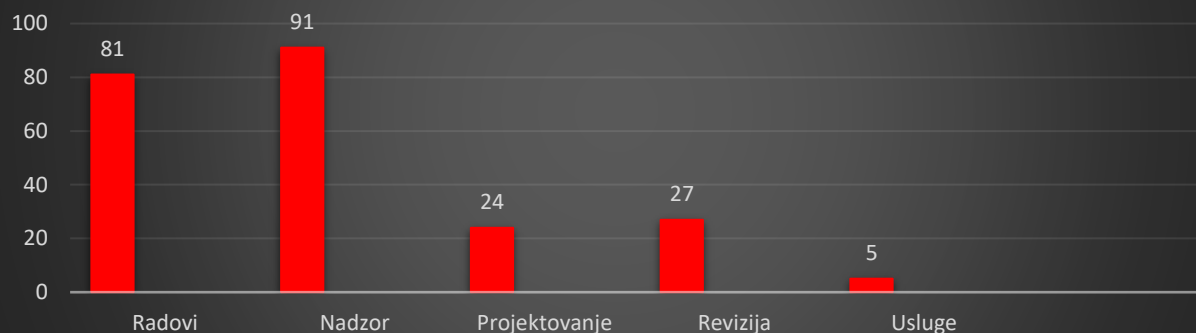

SREDSTVA UTROŠENA DO 31.12.2018. PO REGIONIMA

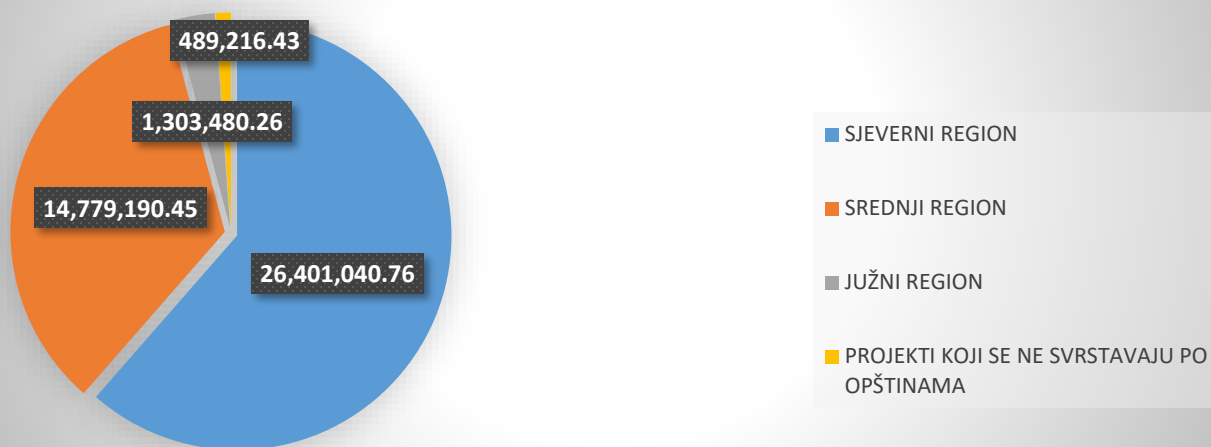

PRIKAZ UTROŠENIH SREDSTAVA PO OPŠTINAMA U 2018. GODINI

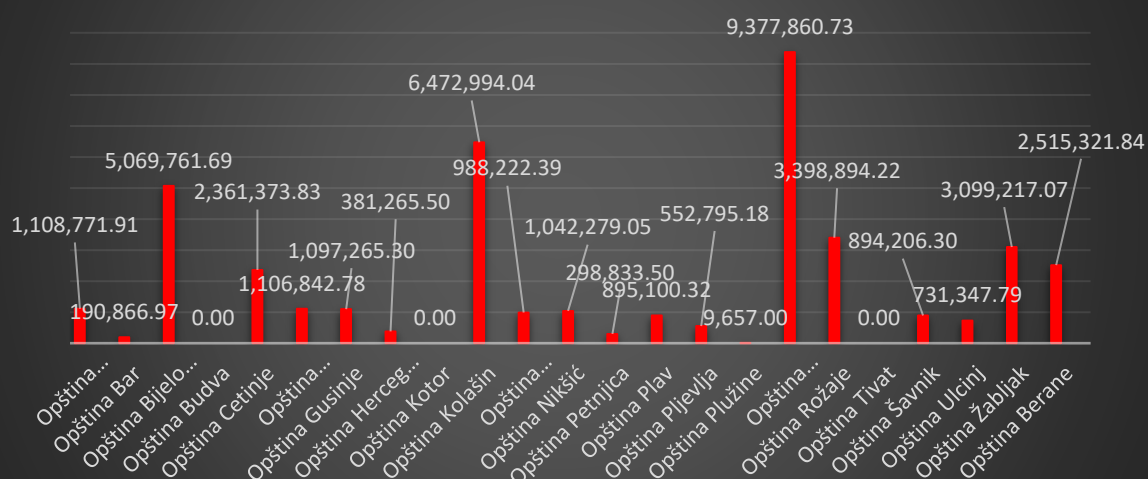

	UKUPNA PLAĆANJA PO OPŠTINAMA	REALIZOVANO OD 01.01. DO 31.12.2018. godine- €
1.	Opština Andrijevica	1,108,771.91
2.	Opština Bar	190,866.97
3.	Opština Berane	2,515,321.84
4.	Opština Bijelo Polje	5,069,761.69
5.	Opština Budva	0.00
6.	Opština Cetinje	2,613,373.83
7.	Opština Danilovgrad	1,106,842.78
8.	Opština Gusinje	1,097,265.30
9.	Opština Herceg-Novi	381,265.50
10.	Opština Kotor	0.00
11.	Opština Kolašin	6,472,994.04
12.	Opština Mojkovac	988,222.39
13.	Opština Nikšić	1,042,279.05
14.	Opština Petnjica	298,833.50
15.	Opština Plav	895,100.32
16.	Opština Pljevlja	552,795.18
17.	Opština Plužine	9,657.00
18.	Opština Podgorica	9,377,860.73
19.	Opština Rožaje	3,398,894.22
20.	Opština Tivat	0.00
21.	Opština Tuzi	638,834.06
22.	Opština Šavnik	894,206.30
23.	Opština Ulcinj	731,347.79
24.	Opština Žabljak	3,099,217.07
	Projekti IPA-e koji se ne svrstavaju po opštinama, a odnose se na usluge i robe	149,474.44
	Projekti KB koji se ne svrstavaju po opštinama	339,741.99
	Državna komisija za tehnički pregled autoputa	859,741.82
	UKUPNO REALIZOVANO U 2018. GODINI	43,832,669.72

Tabelarni prikaz potrošnje sredstava po programima

	KAPITALNI BUDŽET (EUR)	Realizacija Stanje na 31.12.2018.	Realizacija u odnosu na godišnji KB (%)
1	2	3	4
Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	1.372.000,00 €	1.211.201,07€	88,27°%
Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	2.721.689,00 €	2.699.809,75€	99,19 %
Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	2.555.000,00 €	2.469.229,60 €	96,64%
Izgradnja lokalne infrastrukture	8.366.660,12 €	8.029.357,67 €	95,96%
Projekti očuvanja životne sredine	4.560.356,00 €	4.472.713,21 €	98,07%
Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	1.615.000,00 €	1.538.075,00	84,091%
Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	1.005.000,00 €	1.003.757,80 €	99,87%
Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke	4.806.650,00 €	5.830.212,10 €	121,30%
Unapređenje turističke ponude	13.472.644,88 €	13.359.085,40 €	99,15 %
Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	4.880.000,00 €	2.511.412,49 €	51,46%
Državna komisija za auto put Bar- Boljare	720.000,00 €	707.815,53 €	98,30%
UKUPNO	46.075.000,00 €	43.832.669,72€	95,13%

Direkcija javnih radova je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine realizovala sredstva u ukupnom iznosu od **43.832.669,72 €** što je **95,13 %** ukupno opredijeljenih sredstava Kapitalnim budžetom za 2018. godinu.

Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlašćenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava, u 2018. godini donijela sljedeće Zaključke koji se odnose na rad Direkcije javnih radova:

1. Zaključak br. 07-1267 od 05. Aprila 2018.godine kojim je Vlada usvojila informaciju o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja fondovima predpristupne podrške (IPA)

-Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova da, u saradnji sa Rukovodiocem operativne structure, do 13.aprila 2018.godine pripremi dinamički plan za praćenje i sprovođenje aktivnosti u cilju finalizacije ugovora u okviru OPFR 2012-2013

- Zaduguje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova da, u saradnji sa institucijama uključenim u realizaciju programa pripremi dinamički plan za praćenje i sprovođenje aktivnosti u vezi postupka ugovaranja projekata u okviru Godišnjeg akcionog plana za 2014.godinu (CAP 2014).

- Zaduguje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova da, u saradnji sa Nacionalnim službenikom za ovjeravanje programa, u najkraćem roku pripremi i realizuje plan zapošljavanja u Direkciji javnih radova u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja i izvršavanja obaveza proisteklih Finansijskim sporazumom

2.Zaključak br.07-3435 od 06. jula 2018.godine kojim se zaduguje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da koordinira i prati aktivnosti na realizaciji prioriternih projekata iz oblasti turizma.

-Zadužuje se Direkcija javnih radova da pripremi i dostavi Vladi informaciju o ugovorima potpisanim sa izvođačima radova, uključujući i anekse istih, na lokacijama koje obuhvataju Bjelasica, Komovi i Savin kuk, sa statusom dinamike realizacije ugovorenih obaveza, visinom iznosa ugovorenih radova, kao i Predlogom za raskid ugovora za one koji ispunjavaju uslove za raskid, kao i naknadu štete zbog neispunjenosti ugovorenih obaveza.

3. Zaključak br.07-3348 od 09.07.2018. godine kojim se :

-Zadužuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da u saradnji sa Rukovodiocem operativne strukture, Nacionalnim službenikom za ovjeravanje i resornim ministarstvima i drugim relevantnim tijelima uključenim u upravljanjem Operativnim programom »Regionalni razvoj 2012-2013 organizuje sastanke u cilju ubrzavanja implementacije problematičnih ugovora i otklanjanje problema koji usporavaju ovaj proces

-Zadužuje se Nacionalni službenik za ovjeravanje da u saradnji sa rukovodiocem operativne strukture i Direktorom Direkcije javnih radova organizuje sastanak sa Ministrom održivog razvoj i turizma u cilju predočavanja kadrovskih problema u Direkciji javnih radova i neophodnosti pripreme i realizacije plana zapošljavanja u Direkciji javnih radova.

4.Zaključak br.07-4490 od 20.09.2018. godine kojim se:

-Zadužuje Direkcija javnih radova da u saradnji sa opštinom Bar izradi Idejno rješenje za put lokalnog karaktera od Ckla do granice sa Republikom Albanijom,a Uprava za imovinu izradi Idejno rješenje objekta budućeg zajedničkog graničnog prelaza na Cikla

-Zadužuje se Direkcija javnih radova da na osnovu zahtjeva Opštine Bar od 18.06.2018.godine,izrađenog Idejnog rješenja za put Cikla-granica sa Republikom Albanijom i objekta ZGP, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi-plan budžeta za 2019.godinu, a sve u cilju završetka puta Ckla-granica sa Republikom Albanijom do kraja 2020.godine.

5. Zaključak br. 07-4615 od 4.10.2018.godine kojim je:

-Vlada usvojila Informaciju o realizaciji projekata rekonstrukcije »Ribarske ulice«, »Prnjavorske ulice« i »Jezerske ulice« u Plavu i rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje

-Vlada je prihvatila Protokol između Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direkcije javnih radova i opštine Plav za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i finansiranja eksproprijacije zemljišta za projekte rekonstrukcije »Ribarske ulice«, »Prnjavorske ulice« i »Jezerske ulice« u Plavu i rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje.

-Zadužuju se Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direkcije javnih radova da iz ušteda po Programu 41501-812 Projekti očuvanja životne sredine sa pozicije 4412-Izdaci za lokalnu infrastrukturu izvrši prenos sredstava u iznosu odb 500.000,00 € i iz ušteda po Programu 41501-810 Izgradnja lokalne infrastrukture sa pozicije 4412-Izdaci za lokalnu infrastrukturu izvrši prenos sredstava na žiro račun opštine Plav u iznosu do 150.000,00 €

6. Zaključak br.07-5187 od 1.11.2018.godine kojim je:

-Vlada usvojila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Direkcije javnih radova za 2018.godinu

-Vlada je dala saglasnost Ministarstvu održivog razvoja i turizma-Direkciji javnih radova da iz neutrošenih sredstava Kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova za 2018.godinu, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 € i to:

*Sa programa 806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata, sa izdatka 4413-Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 600.000,00 € i sa izdatka 4147-Konsultantske usluge,projekti i studije- u iznosu od 100.000,00 € i sa programa 818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva sa izdatka 4413-Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 1.300.000,00 € izvrši plaćanja obaveza nastalih po osnovu ugovora:

-na program 805-»Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture« u iznosu od 1.000.000,00 €

-na program 819-»Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja« u iznosu od 850.000,00 €

-na program 830-»Državna komisija za tehnički pregled autoputa« u iznosu od 150.000,00 €

7. Zaključak br.07-6220 od 27.12.2018. godine kojim je:

-Vlada usvojila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Direkcije javnih radova za 2018.godinu

- Vlada je dala saglasnost Ministarstvu održivog razvoja i turizma-Direkciji javnih radova iz neutrošenih sredstava Kapitalnog budžeta za 2018.godinu izvrši plaćanja po osnovu prispjelih obaveza na realizaciji projekata i to:

-iz ušteda u Kapitalnom budžetu na Programu 41501-826 »Unapređenje turističke ponude« izdatak 4147-Konsultantske usluge, neutrošena sredstva u iznosu od 671.000,00 € potrebno je iskoristiti za plaćanje obaveza nastalih po osnovu ugovora na realizaciji projekta u okviru programa 41501-826 »Unapređenje turističke ponude« za projekte»Izgradnja ski centra Kolašin 1600«, »Izgradnja ski centra Durmitor« u iznosu od 480.500,00 € i 41501-810-»Izgradnja lokalne infrastrukture« za projekat» Izgradnja lokalnih saobraćajnica na Cetinju« do iznosa 63.500,00 € i 41501-819 »Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja« za projekat »Izgradnja doma starih u Podgorici« do iznosa 127.000,00 €

Kroz Kapitalni budžet Direkcija javnih radova realizuje i projekte obuhvaćene Operativnim programom za IPA komponenta III „Regionalni razvoj” koji se finansiraju 85% iz EU fondova i 15% iz Kapitalnog budžeta, kao i projekte Regionalnog stambenog programa – RHP koji nijesu finansijski prepoznati kroz Kapitalni budžet s obzirom na to da se finansiraju kroz fond osnovan pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora.

Crna Gora je krajem aprila 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj” U decembru 2014. godine je potpisan finansijski sporazum, što je stvorilo uslove da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture.

U 2015. godini otpočelo se sa realizacijom projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj” i na osnovu dokumentacije dostavljene od strane korisnika i nadležnih institucija, Direkcija javnih radova je pristupila pripremi tenderske dokumentacije i raspisivanju međunarodnih javnih nadmetanja u skladu sa PRAG pravilima.

Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12 €, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja sredstava za koja je krajnji rok bio 31. decembar 2015. godine.

Zajednički regionalni program o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljena lica (Regionalni stambeni program – RHP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Cilj regionalne inicijative je da doprinese rješavanju produžene raseljenosti najugroženijih izbjeglica i raseljenih lica nakon konflikta 1991.-1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori iz 1999. godine, između ostalog kroz pružanje trajnih stambenih rješenja.

Razvojna Banka Savjeta Evrope (CEB - Council of Europe Development Bank) je za RHP osnovala fond pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora. U svojstvu finansijske institucije, CEB između ostalog isplaćuje investicione grantove za subvencije iz sredstava RHP fonda Partnerskim zemljama za finansiranje potprojekata u sklopu Stambenih projekata za zemlju koji ispunjavaju određene kvalifikacione kriterijume, a nakon odluke Skupštine donatora.

Prema potpisanom Implementacionom sporazumu, čija revizija predstoji u narednom periodu, RHP u Crnoj Gori ima za cilj da obezbijedi dugotrajno rješenje stambenog pitanja za 1.177 izbjeglih porodica (6.063 osoba), koje su prema kriterijima UNHCR prepoznate kao najranjivije. Doprinos Crne Gore ogleda se prvenstveno u dodjeli zemljišta i obezbjeđivanju primarne infrastrukture.

Procijenjeni troškovi Programa:

- Ukupna vrijednost projekta: 27.696.000 eura;
- Donatorska sredstva: (85 %), tj. 23.542.000 eura;
- Kontribucija države (Ministarstvo i opštine): (min 15%), tj. 4.154.000 eura (kroz obezbjeđivanje lokacije, infrastrukture, tehničko-projektne dokumentacije);

Vlada Crne Gore je na sjednici od 9. aprila 2015. godine umjesto PROCON-a zadužila Direkciju javnih radova, da u saradnji sa menadžerskim timom Ministarstva rada i socijalnog staranja, implementira Regionalni stambeni program.

Sporazumom o implementaciji o donaciji definisano je da se sve procedure u okviru ovog programa sprovode u skladu sa Vodičem za nabavku dobara, radova i usluga- Banke za razvoj Savjeta Evrope i Priručnikom za nabake.

U prethodnom periodu Direkcija javnih radova je završila aktivnosti na izgradnji stambenog objekta u Nikšiću sa 62 stambene jedinice, kao i radove na izgradnji 12 stambenih objekata

sa 120 stambenih jedinica na lokaciji Kamp Koniku u Podgorici. Za realizovane objekte pribavljena je upotrebna dozvola i objekti su predati korisnicima na upotrebu.

U toku su radovi na izgradnji 5 stambenih objekata sa 51 stambenom jedinicom na lokaciji Kamp Konik u Podgorici, kao i izgradnja 4 stambena objekta u Beranama sa 94 stambene jedinice. U aprilu 2018. godine završen je tehnički pregled i dobijena je upotrebna dozvola i za objekat Doma za stara lica u Pljevljima sa 37 smještajnih jedinica.

**TABELARNI PREGLED REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA
ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018.GODINE**

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2018. GODINU

	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2018. GODINU			IZVORI FINANSIRANJA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2018.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
1.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	331,541.50	1,040,458.50	1,372,000.00		222,245.49	988,955.58	1,211,201.07
1.1.	Izgradnja objekata pravosudnih organa u Podgorici	45,000.00	5,000.00	50,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	3,980.90	0.00	3,980.90
1.2.	Nova zgrada tužilaštva u Podgorici	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
1.4.	Akcion plan prilagođavanja objekta javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	66,541.50	220,000.00	286,541.50	Opšti prihodi	23,818.90	210,760.28	234,579.18
1.5.	Rekonstrukcija Administrativnog objekat u Gusinju	14,342.90	470,000.00	484,342.90	Opšti prihodi	11,043.43	461,575.74	472,619.17
1.6.	Rekonstrukcije objekta stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Kremza Zoganj	10,000.00	150,000.00	160,000.00	Opšti prihodi	4,605.30	133,816.74	138,422.04
1.7.	Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici	50,000.00	90,458.50	140,458.50	Opšti prihodi	48,060.27	87,649.32	135,709.59

1.8.	Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju	5,657.10	100,000.00	105,657.10	Opšti prihodi	2,380.00	95,153.50	97,533.50
1.9.	Nadogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici	40,000.00	5,000.00	45,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
1.10.	Zaključak Vlade 07-5921 od 13,12,2018	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	128,356.69	0.00	128,356.69
2.	Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	86,650.00	2,635,039.00	2,721,689.00		65,370.75	2,634,439.00	2,699,809.75
2.1.	Nadogradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Pg za potrebe Muz.centra, Crnog kino. i Državni protoko. u Podgorici	55,000.00	2,373,939.00	2,428,939.00	Opšti prihodi	55,000.00	2,373,412.84	2,428,412.84
2.2.	Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	5,000.00	50,000.00	55,000.00	Opšti prihodi	2,000.00	50,000.00	52,000.00
2.3.	Rekonstrukcija "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	10,000.00	0.00	10,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	0.00	0.00
2.4.	Izgradnja, rekonst. i adapt.obj. za potrebe Crn.nar pozorišta	16,650.00	111,100.00	127,750.00	Opšti prihodi	8,370.75	111,026.16	119,396.91
2.5.	Katedrala Svetog Petra u Baru	0.00	100,000.00	100,000.00	Opšti prihodi	0.00	100,000.00	100,000.00
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	220,000.00	2,335,000.00	2,555,000.00		182,098.47	2,287,131.13	2,469,229.60

3.1.	Izgradnja objekta sportske dvorane u Kotoru	5,000.00	95,000.00	100,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.2.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena u Kotoru	100,000.00	345,000.00	445,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.3.	Izgradnja sportskih terena i sala	15,000.00	95,000.00	110,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	33,177.67	202,819.36	235,997.03
3.4.	Izgradnja sportske sale u Nikšiću	20,000.00	100,000.00	120,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.5	Izrada proj. dok. i izvođenje radova na rekon. sportske sale gim. i sredn struč. škole u Rožaje	20,000.00	200,000.00	220,000.00	Opšti prihodi	18,620.00	0.00	18,620.00
3.6	Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju	10,000.00	100,000.00	110,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.7	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	30,000.00	1,350,000.00	1,380,000.00	Opšti prihodi	17,493.00	1,191,781.76	1,209,274.76
3.8	Zaključ Vlade 07-5187 od 01,11,2018-uštede, i Zaključ Vlade 07-5921 od 13,12,2018	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	112,807.80	873,913.77	986,721.57
3.9	Rekonstrukcija sportske dvorane na Cetinju	5,000.00	45,000.00	50,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	18,616.24	18,616.24
3.10	Unapređenje lokalne sportske infrastrukture za potrebe prijestonice Cetinje	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
4.	Projekti očuvanja životne sredine	1,608,430.00	2,951,926.00	4,560,356.00		1,575,496.80	2,897,216.41	4,472,713.21
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdjevanje	454,905.00	105,000.00	559,905.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	318,677.81	32,956.33	351,634.14

4.2.	Izgradnja regionalnih centara, transfer stanica i sanacija postojećeg odlagališta za otpad	95,000.00	815,000.00	910,000.00	Opšti prihodi	31,612.15	756,287.88	787,900.03
4.3.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Moježu, Herceg Novi	10,000.00	121,000.00	131,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	2,500.00	120,072.17	122,572.17
4.4.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	410,451.00	805,000.00	1,215,451.00	Opšti prihodi	177,877.96	801,383.22	979,261.18
4.5.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	399,854.00	100,146.00	500,000.00	Opšti prihodi	337,229.00	0.00	337,229.00
4.6.	Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	10,000.00	110,000.00	120,000.00	Opšti prihodi	0.00	110,000.00	110,000.00
4.7.	Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	10,000.00	110,000.00	120,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	7,535.88	93,881.78	101,417.66
4.8.	Sanacija odlagališta u Plavu	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Opšti prihodi	2,394.00	0.00	2,394.00
4.9.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica radetina Rožaje	20,000.00	280,000.00	300,000.00	Opšti prihodi	2,700.00	276,736.15	279,436.15
4.10.	Izgradnja PPOV na Vranjini	15,000.00	100,000.00	115,000.00	Opšti prihodi	4,970.00	77,850.00	82,820.00
4.11.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u prijestonici Cetinje	168,220.00	400,780.00	569,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
4.12.	Zaključak Vlade 07-4615 Zaključak Vlade 07-5921 od 13.12.2018	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	690,000.00	628,048.88	1,318,048.88
4.13.	Radovi na zaštiti Plavskog jezera	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
5.	Izgradnja lokalne infrastrukture	622,571.00	7,744,089.12	8,366,660.12		350,647.25	7,678,710.42	8,029,357.67

5.1.	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	10,000.00	19,163.22	29,163.22	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.2.	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu	10,000.00	57,000.00	67,000.00	Opšti prihodi	2,950.00	24,633.00	27,583.00
5.5.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	275,740.00	4,080,000.00	4,355,740.00	Opšti prihodi	270,103.78	4,089,237.03	4,359,340.81
5.5.1.1	Lokalni putevi km	25,500.00	1,270,000.00	1,295,500.00	Opšti prihodi	21,957.97	1,282,775.93	1,304,733.90
5.5.2	Gradske saobraćajnice	250,240.00	2,810,000.00	3,060,240.00	Opšti prihodi	248,145.81	2,806,461.10	3,054,606.91
5.6	Rekonstrukcija mosta Radovan Pavićević na Zeti Danilovgrad	20,000.00	1,009,000.00	1,029,000.00	Opšti prihodi	16,334.99	1,008,468.06	1,024,803.05
5.7	Izgradnja gradske pijace u Gusinju	10,000.00	135,000.00	145,000.00	Opšti prihodi	9,046.66	134,610.23	143,656.89
5.8	Uređenje obala rijeka, Izrada obalo utvrda i uređenje korita rijeka	10,000.00	1,107,000.00	1,117,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	6,065.20	1,106,690.26	1,112,755.46
5.9	Izgradnja Regionalne stočne pijace u Beranama	5,000.00	221,000.00	226,000.00	Opšti prihodi	3,009.28	220,712.90	223,722.18
5.10	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci-Njegnjevo B. Polje	5,000.00	207,000.00	212,000.00	Opšti prihodi	4,600.00	206,855.34	211,455.34
5.12	Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju	10,000.00	120,000.00	130,000.00	Opšti prihodi	8,019.46	116,460.34	124,479.80
5.13	Izgradnja Gradske pijace u Rožajama	16,831.00	301,000.00	317,831.00	Opšti prihodi	3,989.47	300,823.42	304,812.89
5.14	Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo Gusinje Zaklj vlade uštede	20,000.00	150,000.00	170,000.00	Opšti prihodi	0.00	150,000.00	150,000.00
5.15	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu	10,000.00	224,000.00	234,000.00	Opšti prihodi	3,659.41	223,511.09	227,170.50
5.16	Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	40,000.00	4,925.90	44,925.90	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

5.17	Izgradnja pješačkoig mosta Haremi Berane	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.18	Izgradnja infrastrukturnih priključak. za Biznis zonu u Mojkovovcu	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	242.00	0.00	242.00
5.19	Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.20	Podrška u zapošljavanju OSI, Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.21	Rekonstrukcija Studenskog trga, Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.22.	Rekonstrukcija trga i pijace na Njegušima	10,000.00	0.00	10,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.22	Rekonstrukcija Njegoševog parka Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.23	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice Cetinje	5,000.00	97,000.00	102,000.00	Opšti prihodi	0.00	96,708.75	96,708.75
5.24	Kupovina prostora za potrebe parking servisa i održ. objekata Prijestonice Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.25	Izgradnja prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.26	Izgradnja objekata od lokalnog značaja za potrebe Prijestonice Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.27	Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Čipura do Vladinog doma, Prijestonice Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.28	Uređenje pješačke staze do Orlovog krša, Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.28.	Uređenje pristupnog puta i osvjetljenje Žabljaka Crnojevića	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.29	Osvjetljenje Čipura i Biljarde Cetinje	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00


5.30	Luštica 2 Monte Rose putni pravac	0.00	7,000.00	7,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.31	Izgradnja tehničke i druge potrebne dokumentacije za objekte za potrebe Prijestonice Cetinje	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi	22,627.00	0.00	22,627.00
6.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	30,000.00	1,585,000.00	1,615,000.00		0.00	1,538,075.10	1,538,075.10
6.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja KBC u Podgorici	10,000.00	185,000.00	195,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
6.2.	Privođenje namjeni novo izgrađenih djelova objekta Doma zdravlja Nova varoš i doma zdravlja stara varoš KBC u Podgorici	15,000.00	200,000.00	215,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
6.3.	Rekonstrukcija objekta za potrebe Urgentnog bloka	5,000.00	200,000.00	205,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
6.4.	Zaključ Vlade 07-5187 od 01.11.2018	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Opšti prihodi	0.00	1,538,075.10	1,538,075.10
7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	20,000.00	985,000.00	1,005,000.00		19,400.00	984,357.80	1,003,757.80
7.1.	Izgradnja doma starih u Podgorici	20,000.00	875,000.00	895,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	19,400.00	919,400.00	938,800.00
7.2.	Izgradnja doma starih u Nikšiću	0.00	45,000.00	45,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	0.00	0.00
7.3.	Zaklj Vlade 07-5921 od 13.12.2018	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00	45,000.00
7.4.	Kupovina zemljišta za potrebe izgradnje objekata u cilju rješavanja stambenih pitanja za potrebe Prijestonice Cetinje	0.00	65,000.00	65,000.00	Opšti prihodi	0.00	19,957.80	19,957.80
8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	591,650.00	4,215,000.00	4,806,650.00		561,743.90	5,268,468.20	5,830,212.10
8.2.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a	50,000.00	1,213,000.00	1,263,000.00	Opšti prihodi kredit 8.000,00	37,275.81	1,403,059.95	1,440,335.76

8.2.1.	Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	10,000.00	330,000.00	340,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	25,326.49	854,091.25	879,417.74
8.2.2.	Vrtić u Baru	5,000.00	368,000.00	373,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.	Vrtić u Ulcinju	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.	Vrtić u Pljevljima	10,000.00	160,000.00	170,000.00	Opšti prihodi kredit 2.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.5.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	3,499.32	0.00	3,499.32
8.2.6.	Vrtić u Tuzima	10,000.00	340,000.00	350,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	8,450.00	548,968.70	557,418.70
8.2.7.	Rekonstrukcija Vrtića	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
8.3.	Rekonstrukcija vrtića u Rožajama	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi	10,640.00	0.00	10,640.00
8.4.	Vrtić City kvart	20,000.00	0.00	20,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.4.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	80,000.00	5,000.00	85,000.00	Opšti prihodi	70,124.45	0.00	70,124.45
8.5	Srednja stručna škola u Golubovcima	25,000.00	2,176,000.00	2,201,000.00	Opšti prihodi	24,477.60	2,175,790.13	2,200,267.73
8.6	OŠ u Gukama	11,650.00	101,000.00	112,650.00	Opšti prihodi	9,895.21	100,553.63	110,448.84
8.7	OŠ u Tološima	75,000.00	5,000.00	80,000.00	Opšti prihodi	476.00	0.00	476.00
8.8.	Rekonstrukcija Toplane Univerziteta Crne Gore Podgorica	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.9	Rekonstrukcija objekata OŠ u Kalačima Rožaje	10,000.00	90,000.00	100,000.00	Opšti prihodi	9,898.64	87,461.12	97,359.76
8.10	Sanacija klizišta na savini za potrebe sanacija i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	100,000.00	260,000.00	360,000.00	Opšti prihodi	5,236.88	253,456.45	258,693.33
8.11	OŠ "Dušan Korać " Bijelo Polje	10,000.00	0.00	10,000.00	Opšti prihodi	4,760.00	0.00	4,760.00
8.12	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Rožajama	45,000.00	2,500.00	47,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.13	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	60,000.00	0.00	60,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

8.14.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe uspostavljanja biznis inkubatora na Cetinju	5,000.00	357,500.00	362,500.00	Opšti prihodi	0.00	357,146.92	357,146.92
8.15.	Zaključak Vlade 07-5921 od 13,12,2018	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	388,959.31	891,000.00	1,279,959.31
8.16.	Izgradnja sale za OŠ Lovčenski partizanski odred, Cetinje	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.17.	OŠ Karabuško polje	40,000.00	0.00	40,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.	Unapređenje turističke ponude	1,711,633.10	11,761,011.78	13,472,644.88		1,630,755.75	11,728,329.65	13,359,085.40
9.1	<i>Ski centar "Kolašin 1600", Kolašin</i>	<i>90,000.00</i>	<i>2,680,377.62</i>	<i>2,770,377.62</i>	Opšti prihodi	73,401.24	2,677,877.62	2,751,278.86
9.2.	<i>Ski centar na lokalitetu Cmrljača, Bijelo Polje</i>	<i>388,890.00</i>	<i>2,153,413.94</i>	<i>2,542,303.94</i>	<i>Opšti prihodi</i>	<i>167,448.44</i>	<i>2,135,704.76</i>	<i>2,303,153.20</i>
9.3.	<i>SKI centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac</i>	105,500.00	309,900.00	415,400.00	Opšti prihodi	105,436.02	307,852.88	413,288.90
9.4.	SKI centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	102,623.10	1,435,719.22	1,538,342.32	Opšti prihodi	11,816.26	1,433,219.22	1,445,035.48
9.5.	SKI centar na lokalitetu Durmitora, Žabljak	254,620.00	2,404,640.00	2,659,260.00	Opšti prihodi	92,450.30	2,404,558.15	2,497,008.45
9.6.	Turististička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	270,000.00	5,000.00	275,000.00	Opšti prihodi	264,052.46	4,990.00	269,042.46
9.7.	Valorizacija Đalovića pećine; Bijelo Polje	230,000.00	1,059,961.00	1,289,961.00	Opšti prihodi	182,624.81	1,054,758.61	1,237,383.42
9.8.	"Kuća Voća"- Andrijevića	10,000.00	500,000.00	510,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	5,355.00	499,952.92	505,307.92
9.9.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	150,000.00	0.00	150,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.10.	Nacionalni parkovi	15,000.00	430,000.00	445,000.00	Opšti prihodi	8,551.32	427,856.59	436,407.91
9.14.	Izgradnja objekta nacionalne kuće maslina u Baru	50,000.00	0.00	50,000.00	Opšti prihodi	9,711.50	0.00	9,711.50
9.15.	Dom revolucije u Nikšiću	20,000.00	782,000.00	802,000.00	Opšti prihodi	19,965.00	781,558.90	801,523.90
9.16.	Zaključak Vlade 07-6220 od 27,12,2018	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	675,060.40	0.00	675,060.40

9.17.	Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju	10,000.00	0.00	10,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.18.	Izrada promotivnih sadržaja za unapređenje turističke ponude Prijestonice Cetinje	15,000.00	0.00	15,000.00	Opšti prihodi	14,883.00	0.00	14,883.00
10	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	1,220,000.00	3,660,000.00	4,880,000.00		379,166.07	2,132,246.42	2,511,412.49
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	260,000.00	1,110,000.00	1,370,000.00	IPA Opšti prihodi Kredit	60,976.35	1,052,600.30	1,113,576.65
10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	30,000.00	550,000.00	580,000.00	IPA Opšti prihodi	20,702.36	54,378.50	75,080.86
10.3.	Sanacija odlagališta "Cafe" u Baru	85,000.00	1,200,000.00	1,285,000.00	IPA Opšti prihodi	33,325.47	0.00	33,325.47
10.4.	Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar-Sutomore	15,000.00	210,000.00	225,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.5.	Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice "Trebešica"	40,000.00	120,000.00	160,000.00	IPA Opšti prihodi	37,673.08	657.10	38,330.18
10.6.	Tehnička pomoć	235,000.00	0.00	235,000.00	IPA Opšti prihodi	179,029.81	0.00	179,029.81
10.7.	Rehabilitacija pruge sa tunelima KOS Trebišnica	75,000.00	450,000.00	525,000.00	IPA Opšti prihodi	47,459.00	1,024,610.52	1,072,069.52
10.8.	Uključivanje marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	10,000.00	5,000.00	15,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.9.	Priprema projekata za sektore zaštite Životne srđine i klimatskih promjena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.10	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	5,000.00	5,000.00	10,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.11	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	460,000.00	5,000.00	465,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	715,000.00	5,000.00	720,000.00	Opšti prihodi	707,517.87	297.66	707,815.53
	SVE UKUPNO	7,157,475.60	38,917,524.40	46,075,000.00		5,694,442.35	38,138,227.37	43,832,669.72

REALIZACIJA PO OBJEKTIMA



1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA

1.1. Izgradnja pravosudnih organa u Podgorici

Status projekta: Nijesu sprovedjene aktivnosti



- U planu je prenamjena administrativnog objekta u zahvatu koji je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 63 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i ulice Vaka Đurovića, a koji je u prethodnom periodu bio namijenjen Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti za korišćenje.
- Novoizgrađeni objekat je bruto površine 6.990 m² i sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova. U objektu je planirano: 70 kancelarija, 7 sala za sastanke, 2 laboratorije akademskog kluba, čitaonice, 3 depoa, 2 arhive, kao i ostale prateće tehničke prostorije.
- Radovi na izgradnji objekta započeti su krajem 2010. godine.
- U periodu do 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, radovi na oblaganju fasadnih zidova cijepanim kamenom, radovi na izradi ventilirajuće kamene fasade i polustrukturalnih fasada, kao i radovi na grubom razvodu vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.
- U 2014. godini radovi se nisu izvodili i gradilište je bilo konzervirano.
- U 2015. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova u okviru obezbijedenih sredstava i izvođeni su keramičarski radovi, montažni radovi, kao i radovi na izradi elektroinstalacija.
- Od 2016. godine nijesu izvođeni radovi na izgradnji objekta.
- U 2018. godini usvojena je nova planska dokumentacija i pribavljeni su urbanisticko- tehnicki uslovi.
- Nakon što što se novi Korisnik izjasni o potrebnim prostornim kapacitetima i pripremi Projektni zadatak, pristupiće se raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije na osnovu koje će se nastaviti sa radovima neophodnim za stavljanje objekta u funkciju.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 3.980,90 €

1.2. Nova zgrada Tužilaštva u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2018. godini usvojena je planska dokumentacija kojom će se omogućiti izgradnja kompleksa objekata za potrebe pravosudnih organa i tužilaštva u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića, a u neposrednoj blizini objekta koji je u prethodnom periodu građen za potrebe CANU-a.
- U toku je procedura pribavljanja urbanisticko- tehnickih uslova i priprema projektnog zadatka.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

1.3. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

Status projekta: U toku



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko–italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica. Objekat sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi 10.020m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja objekta se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Izvođenje radova je otpočelo krajem 2012. godine i do kraja 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze. U cilju nastavka izvođenja radova na izgradnji objekta, sprovedene su aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- Krajem 2017. godini raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. U toku je vrednovanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača kojim koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom životne sredine kopna i mora Republike Italije i projektantskim timom.
- U 2018. godini planiran je, nakon završetka procedure vrednovanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, početak izvođenja radova II faze.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

1.4. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritarno prilagođavanje u opštinama Podgorica, Nikšić i Berane.
- U prethodnom periodu završena je izrada i revizija Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- U 2016. godini završeni su svi radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici, Osnovni sud u Podgorici i Ekonomski fakultet u Podgorici.
- U 2017. godini završeni su radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Dom zdravlja u Beranama, Opšta bolnica u Beranama, Dom zdravlja u Nikšiću i Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik u Nikšiću.
- U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na prilagođavanju preostalih objekata iz Akcionog plana, a to su: objekat JZU Opšta bolnica u Nikšiću, objekat Ministarstva finansija i radovi koji se odnose na postavljanje taktilnih traka, oznaka pristupačnosti i orijentacionih planova na 5 objekata iz Akcionog plana, tj. na radove koji su revidovanim Glavnim projektima predviđeni u II fazi realizacije
- U 2018. godini realizovano je 234.579,18 €

Ministarstvo finansija u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova sa najpovoljnijim ponuđačem.
- Za uvođenje Izvođača u posao bilo je neophodno da Uprava za imovinu, odnosno Korisnici Ministarstvo finansija i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, oslobode kancelarije u suterenu objekta, u čijim gabaritima je planirana izgradnja lifta.
- U cilju rješavanja navedene problematike i otpočinjanja radova, održano je više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Uprave za imovinu, Izvođača, Nadzornog organa i Direkcije javnih radova, kada je na zahtjev Korisnika usaglašeno da radovi na objektu otpočnu u avgustu 2018. godine, za vrijeme trajanja godišnjeg odmora.
- Takođe, na zahtjev Korisnika - Ministarstva finansija, koje je imalo primjedbe na projektno rješenje lifta, izrađena je i 3D vizuelizacija prostora i ista je dostavljena na saglasnost Upravi za imovinu početkom avgusta tekuće godine.
- Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, posredstvom Uprave za imovinu, dostavilo je saglasnost za otpočinjanje radova, dok se Ministarstva finansija i nakon više urgencija nije izjasnilo po pitanju projektnog rješenja lifta, niti dalo saglasnost za izvođenje ostalih radova predviđenih revidovanim Glavnim projektom.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 499,73 €

JZU Opšta bolnica u Nikšiću

Status projekta: Završeno

- Radovi na objektu su započeti u 2016. godini i obustavljeni na zahtjev Korisnika zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem i velikog obima radova sa kojima Korisnik nije bio saglasan.
- Nakon više sastanaka održanih na objektu, dogovoreno je da se izvrši dopuna projektne dokumentacije i uskladi sa stvarnim stanjem na objektu i zahtjevima Korisnika.

- U skladu sa primjedbama i sugestijama Korisnika, projektant je dopunio projektnu dokumentaciju i na istu je dobijena saglasnost, nakon čega su radovi započeti.
- Svi radovi na prilagođavanju objekta završeni su u julu 2018. godine. Izvršena je primopredaja objekta kao i konačni obračun izvedenih radova.
- U 2018.godini ukupno je realizovano 126.034,68 €




Više objekata-Taktilne trake u Podgorici

Status projekta: U toku

- Ugovoreni radovi odnose se na postavljanje taktilnih traka, orijentacionih planova i oznaka pristupačnosti (II faza) za sljedećih 5 objekata:
 - Skupština Crne Gore, Podgorica
 - Ministarstvo finansija, Podgorica
 - Osnovni sud, Podgorica
 - Fond za zdravstveno osiguranje, Podgorica i
 - Opšta bolnica, Nikšić
- Nakon održanih sastanaka sa Korisnicima objekata(osim sa Ministarstvom finansija) Izvođač je uveden u posao i radovi na objektima su otpočeli.
- Do kraja 2018.godine završeni su svi radovi na na objektima: Skupštine Crne Gore u Podgorici,Osnovnom sudu, Fondu za zdravstveno osiguranje u Podgorici i Opštoj bolnici u Nikšiću.
- Radovi na objektu Ministarstva finansija nisu izvođeni jer nije dobijena saglasnost Korisnika za početak radova. U toku je primopredaja objekata Korisnicima.
- U 2018. godini ukupno je realizovano 86.748,60 €

Taktilne trake:

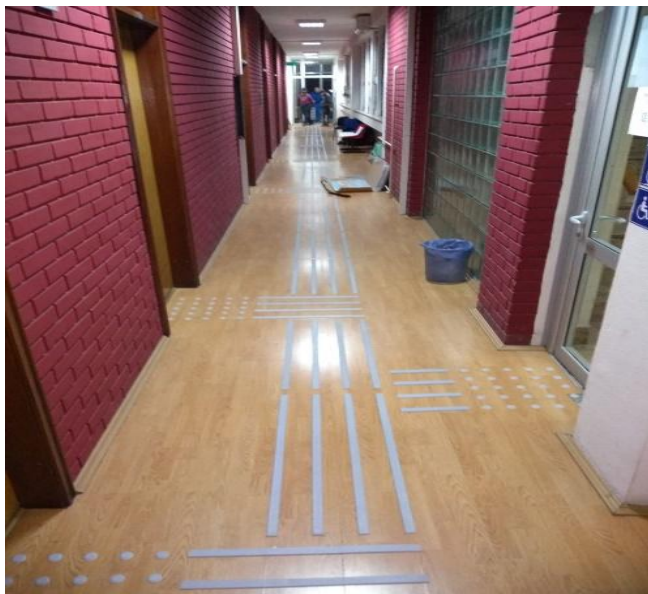

1.5. Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju

Status projekta:Završeno



- Aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije za potrebe administrativnog objekta sprovodila je Opština Gusinje.
- Predviđena bruto površina objekta iznosi 1.130 m² i spratnosti prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju objekta, na prvom i drugom spratu predviđeni su kancelarijski prostori sa pratećim sanitarnim prostorijama, dok su na poslednjoj etaži predviđeni sljedeći sadržaji: skupštinska sala za 30 odbornika, prostorija za prevodioce, prostorija za novinare, multifunkcionalna sala i sanitarni blok. U prethodnom periodu, prije formiranja Opštine

Gusinje, Opština Plav je sprovodila aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg objekta i realizovala grube građevinske radove.

- Nakon toga, od 2015. godine, aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je opština Gusinje. U 2015. i 2016. godini završeni su građevinsko zanatski radovi, radovi na izradi instalacija, vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkih instalacija.
- U 2017. godini su nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta. Završeni su radovi na izradi fasade objekta, opremanju objekta, kao i izradi multimedijalnog sistema za potrebe skupštinske sale.
- Za realizaciju projekta od 2015. godine iz sredstava Kapitalnog budžeta ukupno je utrošeno 1.131.460,00 €. Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2015, 2016, 2017 i 2018. godinu predstavljala su učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta.
- U 2018. godini realizovano je 472.619,17 €

1.6. Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju

Status projekta: U toku

- Objekat je planiran za potrebe stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove, ukupne bruto površine 412 m².
- U 2016. godini Direkcija javnih radova je, na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze na adaptaciji poslovnog prostora za potrebe stanice policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova. Radovi I faze obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama na objektu.
- U 2017. godini izabran je Izvođač radova i potpisan je ugovor. U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi osim radova na fasadi koje onemogućava vlasnik stambene jedinice.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze adaptacije objekta u Gusinju, nakon čega će Direkcija javnih radova pristupiti pripremi tenderske dokumentacije za ove radove koji obuhvataju uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka i opremanje objekta namještajem.
- U 2018. godini realizovano je 138.422,04 €



Krenza i Zoganje

Status projekta: Završeno

- Radovi na objektima u Krenzi i Zoganjama završeni su krajem 2016. godine.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na zamjeni krovnog pokrivača na objektu u Krenzi.
- Svi radovi su završeni u januaru 2018.godine.



1.7. Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe Korisnika.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi oko 5.350 m².
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta kompleksa objekata SAJ i PJP na Zlatici.
- U 2017. godini, nakon što je završena procedura kod Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje revizije projektne dokumentacije, završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i na osnovu iste pristupilo se raspisivanju javnih nadmetanja za fazno izvođenje radova na izgradnji objekata kompleksa u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru I faze raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji objekta magacina sa opremanjem. U 2018. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji magacina sa opremanjem. Rješenjem Agencije za investicije i razvoj Podgorice, za izgradnju magacina sa opremanjem predviđeno je plaćanje komunalne naknade za opremanje građevinskog zemljišta. Nakon potpisivanja ugovora o plaćanju naknade između Korisnika (Ministarstvo unutrašnjih poslova) i Agencije za investicije i razvoj Podgorice, izvršena je prijava građenja objekta i Izvođač je uveden u posao. Radovi na objektu su u toku.
- U toku je i priprema tendera za izvođenje II faze radova. Planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg Izvođača radova i javnog nadmetanja za izbor nadzora nad izvođenjem radova početkom 2019.godine.
- U 2018.godini realizovano je 135.709,59 €.



1.8. Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju

Status projekta: Završeno

- Nakon što je opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju i ista je dopunjena od strane Direkcije javnih radova, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje predmetnih radova, potpisan je ugovor i otpočelo se sa radovima.
- Rekonstrukcijom prostora skupštinske sale koja se nalazi u objektu Opštine Bijelo Polje, obezbijedena je nova organizacija prostora koja se ogleda u postavljanju atrijumskog načina sjedenja, sa polukružnim poslaničkim pultovima u četiri stepenasto postavljena reda, što omogućava jasan pregled svih aktivnosti u sali.
- Izrađen je, takođe, konferencijski sistem koji omogućava nesmetano održavanje sjednica lokalnog parlamenta, glasanje sa prikazom rezultata glasanja na odgovarajućim displejima i razne vidove prezentacija. Sala ima ukupno

70 mjesta za odbornike i 4 mjesta za stolom predsjedavajućeg. Sala je opremljena i potrebnim brojem radnih mjesta za predstavnike medija, kao i za potrebe skupštinskih službi.

- U 2018.godini svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu..
- U 2018.godini realizovano je 97.533,50 €



1.9. Nadgradnja i rekonstrukcija objekta Crnogorske akademija nauka i umjetnosti

Status projekta: U toku


- Predviđena je rekonstrukcija i nadgradnja postojećeg objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Beogradskoj ulici u Podgorici. Planirana bruto površina objekta iznosi cca 5.000 m² i u objektu su planirani sljedeći sadržaji: biblioteka, galerija, depo i ostali administrativni i naučni sadržaji.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, sprovelo je konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nadgradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta CANU-a. Dodijeljene su nagrade, a prvonagrađeno konkursno rješenje implementirano je kroz plansku dokumentaciju na osnovu koje su izdati UTU-i za izgradnju predmetnog objekta.
- U 2018.godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta. U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.



2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE

2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekta Doma vojske za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici

Status projekta: U toku

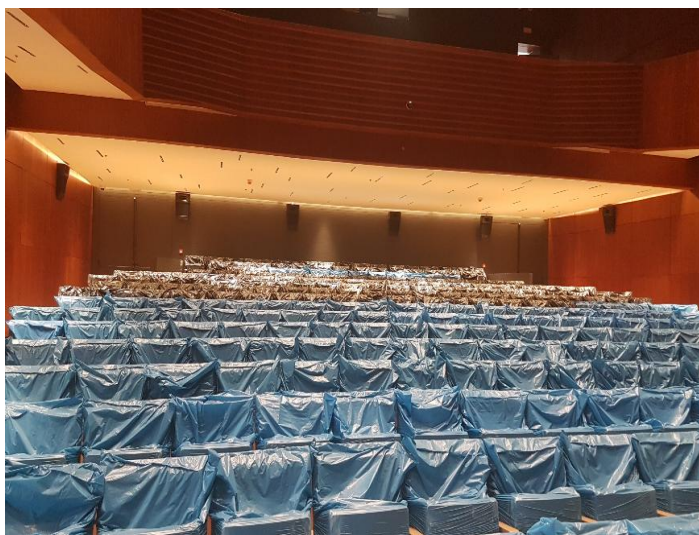

- U toku je rekonstrukcija i dogradnja bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m² u kojem će, nakon završetka radova, biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III

spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.

- U 2017. godini, nakon završetka tenderske procedure, potpisan je Ugovor sa Izvođačem radova za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, kao i za radove na opremanju objekta.
- U 2018. godini radovi su nastavljeni. U toku je izvođenje radova na izradi scenske tehnike, mehanike, postavljanju akustičnih panela i nabavci opreme za potrebe Crnogorske kinoteke. Planirani rok završetka radova je prvi kvartal 2019.godine.
- U 2018.godini realizovano je 2.428.412,84 €

2.2. Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku

Status projekta: U toku

- Projekat sanacije spomenika palim borcima NOR-a na Žabljaku realizovao se fazno.
- U 2016. godini izvođeni su radovi na sanaciji spomenika, dogradnji ograde oko lokacije i izgradnji postolja za spomenične biste.
- U 2017. godini završeni su radovi na sanaciji spomenika, dogradnji ograde oko lokacije, izgradnji postolja za spomenične biste, izgradnja šetališta sa rasvjetom i mobilijarom. Takođe, u 2017. godini raspisan je tender za izvođenje radova II faze na izgradnji parkinga.
- U 2018.godini završeni su svi radovi na sanaciji spomenika, izgradnji postolja za spomenične biste sa uređenjem šetališta i parkingom..
- U 2018.godini realizovano je 52.000,00 €



2.3. Rekonstrukcija objekta Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Dvorac kralja Nikole u Nikšiću je izgrađen 1900. godine, površine je 2.970 m² i sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja. U objektu su smješteni Zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv i depoi.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-4079 od 25. decembra 2017. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova je bila zadužena da sredstva opredijeljena u okviru Programa: Izrada, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture (programski kod 41501-805) za projekat Rekonstrukcija objekta „Dvorac Kralja Nikole“ u Nikšiću, sa pozicije: 4147- Izdaci za konsultantske usluge i projekte u iznosu od 5. 000,00 € i sa pozicije: 4413 – Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 125.000,00 €, prenese na žiro račun Opštine Nikšić za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije predmetnog objekta.
- Obezbjeđenje projektne dokumentacije sprovodi opština Nikšić i u toku je revizija Glavnog projekta.
- Direkcija javnih radova će raspisati javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje predmetnih radova kada se dostavi sva neophodna dokumentacija.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

2.4. Konkatedrala Svetog Petra u Baru

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za početak realizacije projekta.
- Po Protokolu potpisanim sa opštinom Bar br.101-1560/1-8925/1 od 24.12.2018. godine prenešena sredstva u iznosu od 100.000,00 €.

2.5. Izgradnja, rekonstrukcija I adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sklopljen je ugovor i otpočeti su radovi na adaptaciji „Male scene“ u objektu Crnogorskog narodnog pozorišta.
- Radovi na adaptaciji prostora za potrebe „Male scene“ obuhvataju građevinsko-zanatske radove, nabavku namještaja i teleskopskih tribina, nabavku i montažu scenskog osvjetljenja i nabavku i montažu audio i video sistema. Površina prostora koji se adaptira je 170 m².
- U decembru 2018.godine ugovoreni su i završeni radovi čime je adaptirani prostor „Male scene“ funkcionalno priveden namjeni.
- U 2018.godini realizovano je 119.396,91 €



3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

3.1. Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora kao i izvođenja radova na objektu. Shodno Ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, od 16.11.2011. godine, zaključen između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade CG preko Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €, od čega je realizovano do kraja 2017. godine 1.518.846,87 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- U 2017. godini i 2018. godini odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava



3.2. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru

Status projekta: U toku



- Planirana je rekonstrukcija zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru, bruto površine cca 5.400m².
- Na prizemnoj etaži su smještene četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa zasebnim svlačionicama i tuševima, prručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorije VK „Primorac“ i tehničke prostorij Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namjenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama.
- Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermance.
- U 2016. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova I faze.
- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze je raspisano u maju 2017. godine. Dana 18.07.2017. godine uložena je žalba na tetersku dokumentaciju. Nakon donošenja odluke Državne komisije za kontrolu postupka

javni nabavki, javno otvaranje ponuda održano je 11.09.2017. godine. Nakon završetka pregleda i ocjene pristiglih ponuda Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donijela je odluku o dodjeli ugovora na koju su uložene žalbe. Nakon ponovnog pregleda i ocjene pristiglih ponuda dana 20.12.2017. godine donešeno je novo Rješenje kojim su sve tri ponude proglašene neispravnim. Na predmetno Rješenje uložene su tri žalbe.

- Žaključkom od 20.04.2018. godine Državna komisije za kontrolu postupaka odbacila je sve tri žalbe i poništila postupak u cijelosti.
- Ponovljeno javno nadmetanje za izvođača radova II faze raspisano je 29. maja 2018. godine. Procjenjena vrijednost radova II faze iznosi 4.000.000,00 €. Donešena je odluka o najpovoljnijoj ponudi, ali je na istu uložena žalba.
- Tender je poništen, ponovno raspisan i isti je u toku. Otvaranje ponuda zakazano je za početak 2019. godine.
- Radovima II faze rekonstrukcije predviđeni su svi neophodni radovi za stavljanje objekta u funkciju, odnosno radovi na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehničkim i splinker instalacijama, kao i instalacije bazenske tehnike, radovi na uređenju terena i opremanje objekta namještajem.
- Tehnički rok završetka radova II faze je 7 mjeseci od dana uvođenja u posao.
- Završetkom radova II faze objekat će biti stavljen u funkciju.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

3.3. Izgradnja sportskih terena i sala

Status projekta: U toku

- Planirana je izgradnja sportskih i fudbalskih stadiona, terena i sala, kao i pomoćnih objekata u opštinama Nikšić, Žabljak, Šavnik, Andrijevici i Rožajama, kao i izvođenje sanacionih radova na sportskoj sali na Cetinju.
- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i u toku je izvođenje završnih radova. Preostali su radovi na iscrtavanju igrališta i ugradnja mobilijara.
- U 2018. godini je realizovano: 235.997,03 €


3.3.1. Sportski teren sa tribinama u Andrijevici

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izgradnju sportskog terena sa tribinama u opštini Andrijevica, a 2018. godine potpisan je i ugovor sa odabranim izvođačem
- Svi radovi na izgradnji sportskog terena su završeni.
- U 2018. godini realizovano je 47.166,12 €.

3.3.2. Izgradnja objekta Sportske dvorane u Beranama

Status projekta: Završeno

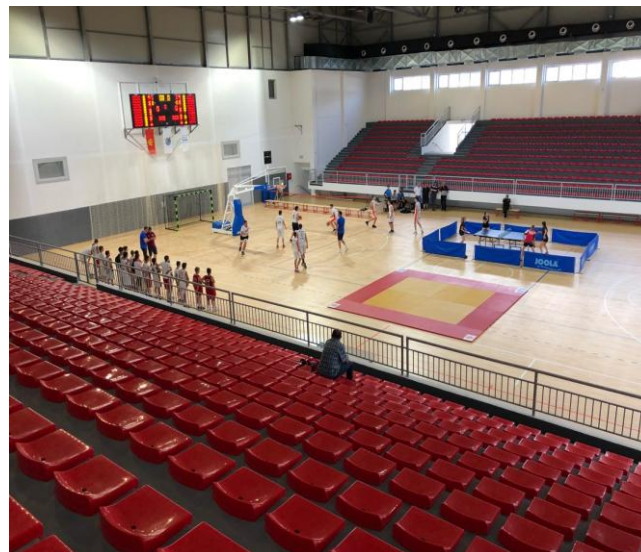

- Objekat Sportske dvorane u Beranama smješten je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa u neposrednoj blizini gradskog stadiona.
- Projektovana bruto površina Sportske dvorane iznosi 5.350 m² i planirana je za održavanje međunarodnih rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica i drugih sportskih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 1.528 mjesta. U objektu su planirani i ostali sadržaji: fitness centar, teretana, ambulanta, administrativni sadržaji, kafe restoran, lokali, svlačionice sa sanitarnim čvorom, prostorije za televizijski prenos, novinare i režiju, kao i tehnički i prateći sadržaji. Realizacija ovog objekta odvijala se fazno, u skladu sa dinamikom obezbjeđenja finansijskih sredstava.
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u 2008. godine i odvijale su se usporenom dinamikom i sa prekidima usled usaglašavanja projektne dokumentacije. U prethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali grube građevinske radove na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta. Radovi II faze koji se odnose na nastavak i završetak radova na objektu započeti su sredinom 2014. godine. U 2017. godini nakon javnog nadmetanja izabran je izvođač za izvođenje završnih radova za stavljanje objekta u funkciju. Svi radovi na izgradnji

i opremanju objekta završeni su krajem 2017. godine, kada je započeta i procedura tehničkog prijema u cilju pribavljanja upotrebne dozvole.

- Krajem maja mjeseca 2018. godine pribavljena je upotrebna dozvola i objekat je predat Korisniku na upotrebu.
- U 2018.godini realizovano je 60.552,86 €.

3.3.3. Sanacija sportske sale na Cetinju

Status projekta; U toku

- Prijestonica Cetinje, u skladu sa potpisanim Protokolom, koordinira aktivnostima na realizaciji projekta sanacije sportske sale na Cetinju. Krajem 2017.godine svi radovi na sanaciji su završeni.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 18.614,00 €.

3.3.4. Izgradnja školskog igrališta u MZ Bukovica u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017.godini otpočeli su radovi I faze i isti su bili obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova. U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na izgradnji igrališta.

Gradilište je konzervirano jer je završetak radova I faze uslovljen izvođenjem radova II faze kako bi se istovremeno ugradila dva sloja asfaltnog zastora. U toku je ponovna priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova II faze.

- U 2018. godini realizovano je 20.561,13 €



3.3.5. Izgradnja sportskog terena u Šavniku

Status projekta: U toku

- Nakon što je Opština Šavnik završila izradu projektne dokumentacije Direkcija javnih radova je 2017.godine raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji sportskog terena i donešena odluka o odabiru izvođača radova na koju je dva puta uložena žalba. Opština Šavnik, preko Ministarstva sporta, učestvuje u finansiranju u iznosu do 100.000 €
- Nakon rješavanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu postupka u 2018.godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova. Gradilište je konzervirano zbog zimskog perioda. Završeni su radovi na izgradnji tribina, hidrotehničkim i elektro instalacijama, kao i ograda oko igrališta. Preostala je ugradnja podne obloge i isporuka mobilijara.
- U 2018.godini realizovano je 24.742,54 €

3.3.6. Adaptacija svlačionica na sportskom terenu na Žabljaku

Status projekta: Završeno

- Direkcija javnih radova je potpisala Protokol sa opštinom Žabljak kojim je definisano da opština Žabljak sprovodi aktivnosti na adaptaciji svlačionica, a Direkcija javnih radova ima obavezu da izvrši prenos sredstava u iznosu do 58.946,48 € na žiro račun odabranog izvođača radova i do 1.000,00 € na žiro račun nadzornog organa, a na osnovu ovjerenih situacija od strane opštine. Planirane aktivnosti su završene.
- U 2018.godini realizovano je 58.946,00 €

3.4. Izgradnja sportske sale u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Planirana je izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta sportske sale koji je lociran u krugu školskog centra „Tvrtko Bijelić“, u neposrednoj blizini školskog objekta, u ulica Narodne omladine u Nikšiću.
- Objekat sadrži fiskulturnu salu sa gledalištem, planiranu za potrebe fakulteta i za sportska takmičenja- srednji nivo takmičenja, odnosno regionalna takmičenja, takmičenja lokalnih i malih klubova, trening i rekreaciju. Planirana bruto površina objekta je 1.000 m². Uz objekat se nalazi anex gdje su planirane garderobe, spravarnica, kancelarije i druge pomoćne prostorije. Na osnovu prethodno izrađenog Idejnog rješenja raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta za izgradnju predmetnog objekta. Na odluku o izboru uložena je Žalba pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki, koja je donijela rješenje o poništenju kompletnog postupka. Nakon što je Univerzitet krajem septembra dostavio saglasnost državnog arhitekta na Idejno arhitektonsko rješenje sportske sale, pristupilo se doradi i dopuni Projektnog zadatka na osnovu kojeg će se raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača Glavnog projekta. U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.



3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije I Srednje stručne škole u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon što je raspisano javno nadmetanje, potpisan je Ugovor sa najpovoljnijim obrađivačem projektne dokumentacije.
- Orađivač projektne dokumentacije je izradio Idejno rješenje i isto je dostavljeno gradskom arhitekti na saglasnost.
- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima
- U 2018. godine dobijena je saglasnost gradskog arhitekta na Idejno rješenje, nakon čega se pristupilo izradi Glavnog projekta. Orađivač projektne dokumentacije nije izvršio ugovorene obaveze u ugovorenom roku i raskinut je ugovor.
- Sprovedene su aktivnosti na ponovnom odabiru obrađivača projektne dokumentacije.
- U 2018. godini je završena izrada i revizija projektne dokumentacije. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti od nadležnih preduzeća.
- U 2018. godini realizovano je 18.620,00€.



3.6. Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju

Status projekta: U toku



- Školska sportska dvorana u Gusinju je locirana na dijelu katastarska parcela br. 18/1, KO Gusinje, u zahvatu plana „Plan uređenja naselja Gusinje“.
- Objekat je spratnosti visoko prizemlje, površine 2180 m², sa sljedećim sadržajima: glavni ulaz sa biletarnicom i sanitarnim blokom, igralište za rukomet, košarku i odbojku, tribine za gledaoce kapaciteta 500 mjesta, prostorija za rekvizite, svlačionice za učenike i nastavnike sa toaletom i tuševima, kancelarije za zaposlene, kao i tehničke

prostorije. Prostor dvorane je osim za razne vrste sportova planiran da se koristi i za druga dešavanja kao što su koncerti, plesne večeri, plesna takmičenja, proslave i mnoga druga društvena dešavanja.

- U okviru parcele formirana je interna saobraćajnica oko objekta koja je vezana za postojeću saobraćajnicu, parking sa 70 parking mjesta za vozila i 4 parking mjesta za autobuse, kao i pješaški pristupi objektu za nesmetano kretanje pješaka i lica sa invaliditetom.
- Tehnička dokumentacija za predmetni objekat je izrađena i revidovana 2014.godine u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 51 od 22. avgusta 2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14).
- U oktobru 2017. godine došlo je do promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti građevinarstva u skladu sa kojim je neohodno prilagoditi tehničku dokumentaciju školsko sportske dvorane u Gusinju, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji.
- Opština Gusinje je izradila predlog DUP-a »Centar Gusinje« i »Privredna zona Gusinje« i isti je poslat Ministarstvu održivog razvoja i turizma na saglasnost. Predlogom DUP-a obuhvaćen je i objekat školsko sportske dvorane. Nakon izdavanja utu-a pristupiće se daljem usaglašavanju projektne dokumentacije sa važećom zakonskom regulativom.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

3.7. Fudbalski stadion na Cetinju

Status projekta: U toku

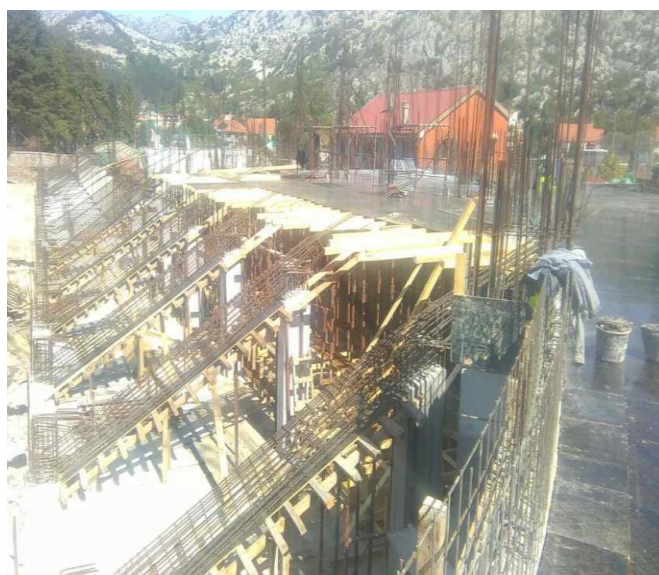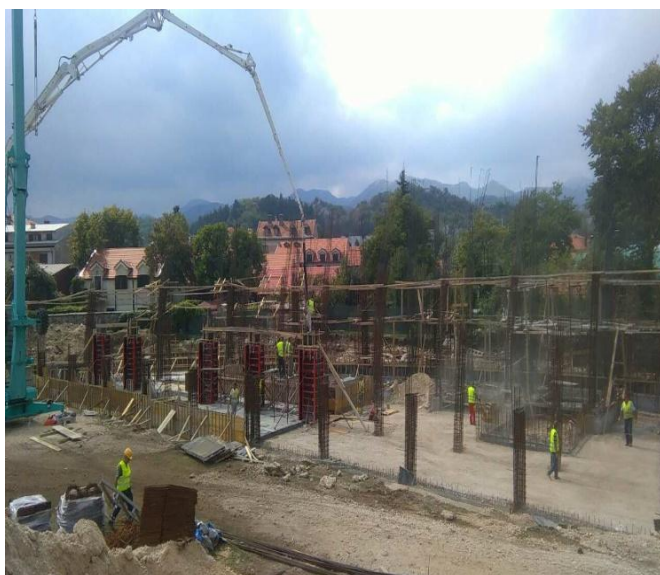

- Zaključkom Vlade Crne Gore od 26. decembra 2014. godine započeta je realizacija projekta kojim se utvrđuju obaveze po pitanju izrade projektne dokumentacije, kao i obezbjeđenja finansija od strane Fudbalskog saveza Crne Gore i Prijestonice Cetinje, dok će preostala sredstva biti obezbijeđena kroz Kapitalni budžet, u skladu sa mogućnostima, kao učešće Vlade Crne Gore u sufinansiranju projekta.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-2514 od 27. jula 2017. godine zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova planira sredstva u Kapitalnom budžetu za

2018. godinu u iznosu do 1.395.000,00 €, u 2019. godini, sredstva u iznosu do 1.500.000,00 € i u 2020. godini sredstva u iznosu do 1.500.000,00 €, na ime kofinansiranje projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju

- U 2016. završena je izrada i revizija Glavnog projekta kojim je kordinirala Prijestonica Cetinje.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja izabran je najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova i isti su započeti u novembru 2017. godine. Izvođač radova je "Erlang" d.o.o. Podgorica, a vrijednost ugovora je 8.784.604,06 Stručni nadzor vrši "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica, a vrijednost posla je 174.930,00€.
- U 2018. godini nastavljeno je sa radovima na izgradnji objekta. U toku su radovi na izradi armirano betonske konstrukcije istočne, zapadne i sjeverne tribin.
- U 2018.godini realizovano je 1.209.274,76 €

• 3.8. Rekonstrukcija Sportske dvorane na Cetinju

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je 05.02.2018.godine potpisala Protokol sa Prijestonicom kojim je definisano da Prijestonica Cetinje u skladu sa zakonskom regulativom odabere Izvođača radova za nastavak rekonstrukcije sportske dvorane na Cetinju, a da Direkcija javnih radova na osnovu dostavljenog zahtjeva i ovjerenih faktura izvrši plaćanje izvođačima radova.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

3.9. Unapređenje lokalne sportske infrastrukture za potrebe Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova potpisala je 12.06.2018.godine Protokol sa Prijestonicom Cetinje kojim je definisano da Prijestonica realizuje sve aktivnosti na ovom projektu.
- Za projekat izgradnje atletskog stadiona u naselju Humci upućen je zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma za sprovođenje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

4.PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje

Status projekta: U toku

- U periodu od 2008. godine, odvijaju se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i za izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za njihovu realizaciju iz domaćih izvora nedostatna, planirana je realizacija ovih projekata kroz instrument predpristupne pomoći IPA III „Regionalni razvoj”, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- Koordinator projekta izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Dokumentacija izrađena u prethodnom periodu koristila se u pregovorima oko kreditnih sredstava sa Evropskom investicionom bankom, kao i za razradu operativnog plana za korišćenje predpristupnih IPA fondova, čija je realizacija otpočela tokom 2015. godine.
- U 2018. godini realizovano je 351.634,14 €.

4.1.1. Izrada Glavnog projekta za odvođenje atmosferskih voda sa područja Ulcinjskog polja

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za početak realizacije projekta
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

4.1.2. Izmjene i dopune Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Rožajama, uključujući i izradu elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu

Status projekta: U toku

- Izmjene i dopune Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Rožajama su završene, a izradu Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu sprovodi opština Rožaje u okviru aktivnosti na iznalaženju donatorskih sredstava za realizaciju projekta.
- U 2018. godini izvršen je transfer sredstava opštini Rožaje za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji PPOV u iznosu od 337.229,00 €



4.1.3. Kanalizaciona mreža- uže gradsko jezgro u opštini Rožaje koje podrazumijeva i uređenje korita rijeke Ibar

Status projekta: U toku

- U 2017.godini sproveden postupak javne nabavke za radove na izgradnji Kanalizacione mreže –uže gradsko jezgro u opštini Rožaje koja podrazumijeva i uređenje korita rijeke Ibar
- U 2018.godini potpisan je ugovor i izvođač je uveden u posao.
- Radovi su započeti u avgustu 2018.godine i izvođeni su radovi na obaloutvrđi lijeve obale rijeke Ibar, ali su trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Nastavak i završetak radova planira se u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovano je 222.166,86 € .

4.1.4. Glavni projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ali se nisu stvorili administrativni uslovi za početak realizacije projekta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

4.1.5. Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je raspisala u 2016. godini javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za obrađivača projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu.
- Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donijela je rješenje kojim je usvojena Žalba i postupak vraćen na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku donijeto je rješenje o izboru najpovoljnije ponude protiv koga je takođe uložena Žalba pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2018. godini potpisan je Ugovor za izradu projektne dokumentacije i ista je završena. U toku je revizija projektne dokumentacije.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 18.150,00 €.

4.1.6. Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Direkcija javnih radova je raspisala u 2016. godini javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za obrađivača projektne dokumentacije i ugovorena izrada Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Idejnog projekta.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekta. U 2018. godini se nisu stvorili administrativni uslovi za početak realizacije projekta.



4.1.7. Glavni projekat kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja

Status projekta: U toku

- U prethodnom periodu ugovorena je izrada Glavnog projekta za kanalisanje i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, izrađena prethodna hidrotehnička studija i ista je prosljeđena u julu 2016. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
- Potrebno je da Ministarstva održivog razvoja i turizma i Prijestonica usvoje studiju, odnosno da se izjasne o predloženim varijantama, kako bi se mogle nastaviti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za objekte u funkciji odvođenja otpadnih i atmosferskih voda.
- U 2018. godini završena je dorada Studije u skladu sa smjernicama Ministarstva održivog razvoja i turizma i u toku je procedura sagledavanja i usvajanja Studije. Planiran je nastavak aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije u 2019.godini.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.


4.1.8. Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže za naselja na Cetinju

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za početak realizacije projekta

4.1.9. Sanacija postojeće kaptaže i izgradnja nove kaptaže na izvorištu Bistrica u Bijelom Polju

Status projekta: U toku


- U 2017.godini opština Bijelo Polje je dostavila projekat. Nakon raspisanog javnog nadmetanja ugovoreni su radovi i isti su otpočeli krajem 2017.godine.
- U 2018. godini radovi su nastavljani i isti su završeni.
- U 2018.godini realizovano je 34.166,33 €.

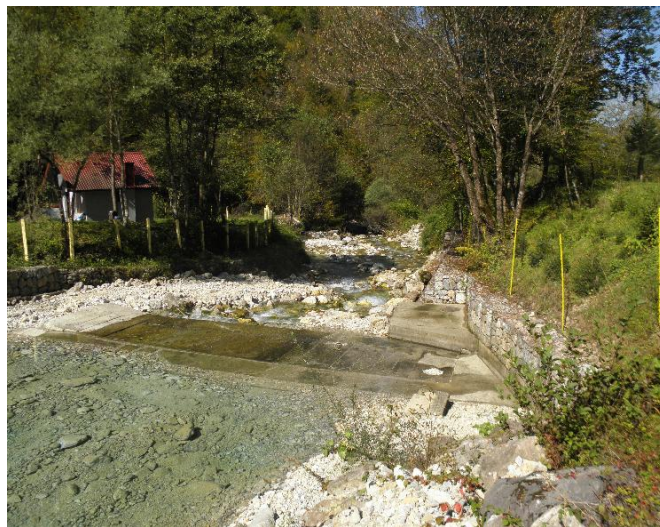

4.1.10. Sanacija i rekonstrukcija odlagališta Vasove vode u Beranama

Status projekta: U toku

- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje i izvršen izbor obrađivača Glavnog projekta sanacije postojećeg odlagališta "Vasove Vode" u Beranama.
- U 2016. godini izvedeni su radovi na hitnim sanacionim mjerama koji su obuhvatili zacjevljenje Lučkog potoka.
- U 2017. godini završen je i revidovan Glavni projekat, potpisan je ugovor za izvođenje radova i isti su i započeti.
- U 2018. godini radovi su nastavljani i isti su završeni.
- U 2018. godini realizovano je 557.225,14 €.

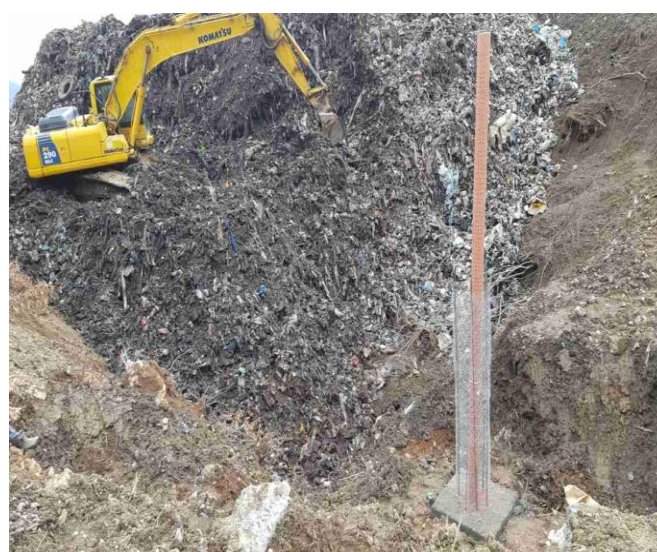

4.2. Izgradnja regionalnih centara, transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima kojima se realizuju projekti na sanaciji postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore, kao i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 787.900,03 €

4.2.1. Glavni projekat transfer stanica i Glavni projekat sanacije neuređenog odlagališta Zauglina u Šavniku

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnih projekata transfer stanica i Glavni projekat sanacije neuređenog odlagališta Zauglina u Šavniku.
- U 2017.godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radovana sanaciji, potpisan ugovor i radovi su otpočeli.
- U 2018. godini radovi su završeni .
- U 2018.godini realizovano je 204.042,89 €.

4.2.2. Glavni projekat transfer stanica u Plužinama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini izrađen je Glavni projekat, a u 2018.godini izvršena je revizija projekta.
- U 2018.godini realizovano je 6.664,00€.

4.2.3. Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- U 2017. godini izrađen je glavni projekat i revizija istog je završena.
- U 2018. godini objavljeno je javno nadmetanje za izvođenje radova i isto je u toku.
- U 2018.godini realizovano je 8,396.60€

4.2.4. Reciklažno dvorište u Danilovgradu

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekta

4.2.5. Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Beranama

Status projekta: U toku

- U 2017. ugovorena je izrada Glavnog projekta.
- U 2018. godini je završena izrada Glavnog projekta . Objavljeno je javno nadmetanje za izvođenje radova i isto poništeno zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji.
- U 2018.godini realizovano je 15.070,00 €.

4.2.6. Transfer stanica u Andrijevići

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta. Nakon završetka procedure javnih nadmetanja zaključeni su ugovori za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora. Izvođač će biti uveden u posao 2019.godine čim se stvore povoljni vremenski uslovi.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu u Herceg Novom

Status projekta: U toku



- Direkcija javnih radova je u 2014.godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju koja je u vezi s hidrotehničkim tunelom u Mojdežu, opština Herceg Novi. Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze. Radovi I faze podrazumijevali su sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350 m. Radovi su se odnosili na tunelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela.
- Radovi II faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela. Da bi se imao uvid u zatečeno stanje postojećeg tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije II faze, potrebno je isti u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Procijenjena vrijednost ovih radova je 286.000 €, a rok za završetak radova je 70 dana od dana uvođenja izabranog izvođača u posao. Za ove radove raspisano je javno nadmetanje početkom 2016. godine, donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču, ali je zbog žalbe tenderski postupak je poništen.
- U martu 2018.godine ponovno je raspisan tender za izvođenje radova i u junu 2018.godine je potpisan Ugovor sa odabranim izvođačem radova. S obzirom da se radovi mogu izvoditi samo u sušnom periodu, kada je nivo podzemnih voda u tunelu najniži, isti su otpočeli krajem avgusta i isti su se odvijali planiranom dinamikom sve do polovine novembra kada više uslovi to nisu dozvoljavali. Sa radovima će se nastaviti u 2019.godini čim to uslovi na terenu budu dozvoljavali.
- U 2018.godini realizovano je 122.572,17 €

4.4. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda

Status projekta: U toku

- U 2017. godini odvijale su se aktivnosti na realizaciji projekata vodovodnih sistema u više opština u Crnoj Gori. Izvođeni su radovi na vodovodu Krkori u Andrijevici- III faza, vodovodu u Gusinju, Gradiošnici u Tivtu, Hoti u Tuzima, Vodoizvorištu Gojaković u Mojkovcu i vodovodu Lovnica u Rožajama III faza
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 979.261,18 €

4.4.1. Izgradnja rezervoara „Gradiošnica” i sistema vodosnadbijevanja u Tivtu

Status projekta: U toku

- U toku 2017. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju rezervoara Gradiošnica I.
- U 2018. godini završen je postupak javnih nabavki, izabran je izvođač radova i ugovoreni su radovi.
- U 2018. godini planirani su radovi na izgradnji rezervoara, što predstavlja I fazu realizacije projekta. Izvođač je uveden u posao, ali su radovi obustavljeni jer Opština Tivat nije bila riješila imovinsko-pravne probleme u vezi sa pristupnim putem do lokacije rezervoara. Navedena problematika je riješena krajem 2018. godine i Izvođač je ponovo uveden u posao i otpočeo sa izvođenjem radova.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava

4.4.2. Izgradnja vodovoda Lovnica na ruralnom području opštine Rožaje

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. U 2015. godini Direkcija javnih radova je izradila Glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreno je izvođenje radova II faze koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnadbijevanje MZ Ćosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni. U 2017. godini ugovoreno je izvođenje radova za izgradnju primarnog cjevovoda za MZ Donja Lovnica i MZ Klanac što predstavlja III fazu realizacije projekta. U 2017. godini izvođeni su radovi III faze na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, sve dok su to dozvaljali vremenski uslovi. U 2018. godini radovi III faze su završeni.
- Takođe, u 2018. godini sproveden je postupak javnih nabavki za izvođenje radova IV faze izgradnje vodovoda čime bi realizacija ovog projekta biti kompletirana. Ugovor je potpisan, a ugovorena vrijednost radova iznosi 397.846,51 €. Radovi su trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 174.357,65 €.



4.4.3. Vodosnadbijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin) u gradskoj opštini Tuzi

Status projekta: Završeno

- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji vodovoda u MZ Hoti, u gradskoj opštini Tuzi nakon što je Gavni grad Podgorica pribavio građevinsku dozvolu. Krajem godine započeti su radovi I faze na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze.
- Takođe, u 2017. godini, u koordinaciji sa preduzećem "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica ugovoreni su i radovi na izgradnji rezervoara Skorać, što predstavlja II fazu realizacije ovog projekta.
- U 2018. godini započeto je sa radovima i isti su završeni.
- U 2018.godini realizovano je 75.714,37 €



4.4.5. Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- U 2018.godini, na osnovu tehničke dokumentacije koju je pribavila opština Mojkovac, raspisano je javno nadmetanje za izbor Izvođača radova na Rekonstrukciji i zaštiti vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu. Potpisan je ugovor za izvođenje radova, a izvođač će biti uveden u posao u 2019.godini čim se stvore povoljni vremenski uslovi i čim opština Mojkovac prijavi radove.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

4.4.6. Rekonstrukcija dijela vodovodnog sistema u Gusinju

Status projekta: U toku

- Krajem 2017. godine ugovoreni su radovi na rekonstrukciji dijela vodovodnog sistema u Gusinju na osnovu projektne dokumentacije koja je pribavljena od strane opštine Gusinje.
- U 2018.godini, nakon što su se stvorili povoljni vremenski uslovi, izvođač je uveden u posao. Radovi su se izvodili usporenom dinamikom zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.
- Nakon usaglašavanja projektne dokumentacije, nastaviće se sa izvođenjem radova.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

4.4.7. Vodovod Krkori u Andrijevici (III faza)

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodozahvata i izgradnji hlorne stanice na izvoru Krkori, kao i radovi na izgradnji cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85 km.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda. Takođe, raspisano je javno nadmetanje i ugovoreno izvođenje radova na opremanju hlorne stanice i spajanju vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom. Svi ugovoreni radovi završeni su u 2017. godini.
- Takođe, u 2017. godini, raspisano je i javno nadmetanje i ugovoreno je izvođenje radova III faze koja obuhvata izgradnju 7 km primarnog cjevovoda od hlorne stanice ka gradu i dogradnju vodozahvatne građevine sa pratećom opremom.
- U 2018. godini Izvođač je uveden u posao i radovi su izvođeni dok su to dozvoljavali meteorološki uslovi. Radovi na postavljanju cjevovoda i rekonstrukciji vodozahvata su većinom odrađeni i preostala je ugradnja opreme u 2019. godini.
- U 2018. godini realizovano je 394.472,47€.



4.4.8. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na ruralnom području na Cetinju

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- Aktivnosti na izgradnji i rekonstrukcij vodovoda na ruralnom području na Cetinju sprovodi Prijestonica u skladu sa potpisanim Protokolom. Od Prijestonice Cetinje obaviješteni smo da zbog nedostatka tehničke dokumentacije nijesu sprovedene aktivnosti na projektu, već su sredstva preusmjerena na projekat Modernizacije lokalnih puteva u Prijestonici.

4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima kojima se realizuju projekti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sistema za odvođenje otpadnih voda.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 337.229,00 €

4.5.1. Glavni projekat izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacione mreže DUP-a »Šavnik –Jug« i »Šavnik- Sjever«

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Šavnik su u junu 2017. godine dostavili projektni zadatak i UTU-e, nakon čega je objavljeno javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacione mreže DUP-a "Šavnik-Jug" i "Šavnik- Sjever" i isto je u toku. Na odluku o izboru izvođača radova uložena je žalba kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2018. godini. izrada Glavnog projekta je ugovorena i isti je završen i predat opštini Šavnik u cilju dalje realizacije aktivnosti na izgradnji, a sve u skladu sa potpisanim Protokolom. Izgradnjom nedostajuće fekalne kanalizacione mreže omogućice se da se objekti koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu priključe na istu, što će stvoriti uslove da u ranijem period izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u punom kapacitetu.
- U 2018. godini je realizovano: 8.620.00€

4.5.2. Sanacija ponora na Cetinju

Status projekta: U toku

- U 2017. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Prijestonica Cetinje su završili aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, nakon čega je raspisano javno nadmetanje i izabran Izvođač radova. Radovi su započeli i odvijali su se sve dok su to dozvoljavali vremenski uslovi.
- U 2018. godini radovi su nastavljani i ubrzo potom obustavljeni jer je utvrđena neusaglašenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu. S obzirom da je Prijestonica naručilac projektne dokumentacije, ista je preuzela i obavezu usaglašavanja projektne dokumentacije i nakon toga su radovi ponovio nastavljani da bi oponovo bili obustavljeni radi finansijskih poteškoća u koje je zapao Izvođač. Kako izvođač nije ispunjavao ugovorne obaveze u dijelu obezbjeđenja garancije banke za dobro izvršenje ugovora, sa istim je ugovor raskinut.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 97.415,22 €, ali zbog nedostatka garancije banke ista nisu isplaćena.



4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

Status projekta: U toku

Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja

- Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 510.000,00 €. Iznos od 110.000 € opredijeljen je za nabavku ekoloških goriva za građane opštine Pljevlja, u skladu sa potpisanim Protokolom, dok je preostali iznos predviđen za toplifikaciju Pljevalja.

Toplifikacija Pljevalja

- Opština Pljevlja je naručilac Glavnog projekta toplane, magistralnog cjevovoda i podstanice (centralna energetska stanica-CES) za toplifikaciju Pljevalja. Projektnu dokumentaciju je izradilo preduzeće “Esotech” iz Velenja u Sloveniji, a dokumentaciju je revidovalo preduzeće “Civilengineer” iz Podgorice. Vrijednost radova po projektnoj dokumentaciji iznosi 21.000.000,00 €.
- U 2017.godini, nakon dostavljanja projektne dokumentacije od Opštine, Direkcija javnih radova je raspisala tender za izvođenje radova na izgradnji mini toplane sa ugradnjom dva kotla ukupne snage 6.5MV sa građevinskim dijelom objekta i minimalnim radovima na ostaloj infrastrukturi (elektro, vodovod i kanalizacija i uređenje terena), procijenjene vrijednosti 3.800.000,00 €. Potpisan je Ugovor u vrijednosti od 3.596.004,22 sa rokom završetka od 7 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi će otpočeti nakon izdavanja građevinske dozvole.
- Takođe, u toku je priprema tendera za preostale radove I faze (toplovod, objekat elektroenergetske stanice snage 10MW i povezivanje sa postojećom toplanom u Skerlićevoj ulici), procijenjene vrijednosti 4.000.000,00 €.
- Završetkom svih radova dobiće se jedna funkcionalna cjelina.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 110.000,00 €.

4.7. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

Status projekta: U toku

- Realizacijom ovog projekta koordinira Hidrometeorološki zavod Crne Gore i on obuhvata izgradnju infrastrukture za unapređenje postojeće mreže meteoroloških stanica, a sama realizacija odvijaće se kroz III faze.
- U 2017. godini od strane Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore urađena je tehnička dokumentacija za izgradnju infrastrukture za I i II fazu, nakon čega je raspisano javno nadmetanje i zaključen ugovor za izvođenje radova prve faze.
- U 2018.godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture I faze koji su obuhvatali 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica i sproveden je postupak za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg Izvođača za izvođenje radova II faze koja obuhvata 5 padavinskih i 5 hidroloških stanica. U 2018. godini Ugovor za radove II faze je zaključen i realizovano je 90% radova.
- U 2018.godini realizovano je 101.417,66 € .



4.8. Sanacija odlagališta u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učešćem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi”. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- Reviziju i nadzor finansira Vlada Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova.
- U 2018.godini završena je izrada Glavnog projekta. Početak radova planiran je za jul 2018.godine, ali se radovi nisu izvodili zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Krajem 2018.godine opština Plav je riješila sporove sa građanima čime su se stvorili uslovi da se sa radovima započne u 2019.godini.
- U 2018. godini realizovano je 2.394,00 €

4.9. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica- Radetina u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017.godini raspisano je javno nadmetanje za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda na području Bukovica- Radetina u Rožajama.
- U 2018. godini, ugovoreni su radovi I faze i isti su završeni.
- U 2018.godini realizovano je 279.436,15 €.

4.10. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vranjini

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učešćem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi”. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine. Reviziju i nadzor finansira Vlada Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova. U 2018.godini završena je izrada projektne dokumentacije.
- Radovi na realizaciji ovog projekta su završeni.
- U 2018.godini realizovano je 82.820,00 €

• 4.11. Rekonstrukcija vodovodne mreže u opštini Cetinje

Status projekta: Završeno

- U 2018.godini, na osnovu projektne dokumentacije čiji je naručilac Prijestonica Cetinje, planiran je početak realizacije I, II i III faze rekonstrukcije vodovodne mreže u opštini Cetinje.
- Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca 4.600.000,00 €, a planirano je izvođenje radova u 2018., 2019. i 2020.godini.
- U 2018.godini sprovedena je procedura javnog nadmetanja i ista je poništena od strane Državne komisije zbog potrebe za bitnim izmjenama tenderske dokumentacije. Ponovno javno nadmetanje planirano je za 2019.godinu.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

4.12. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera


Status projekta: U toku

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Tokom 2017.godine odvijale su se aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za izradu Studije izvodljivosti na osnovu koje bi se odvijala dalja izrada tehničke dokumentacije.
- U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na izradi Studije na osnovu koje će se izraditi Glavni projekat zaštite Plavskog jezera. Od strane Opštine Plav dobijena je informacija da je Studija izrađena i da je procedura usvajanja Studije u toku. .
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 500.000,00 € na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore.

4.13. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na Žabljaku

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je u julu 2017.godini završila aktivnosti na izradi Glavnog projekta I faze rekonstrukcije vodovodne mreže i isti je dostavljen Opštini Žabljak, pri čemu su Opština Žabljak i Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovali realizaciju projekta kroz saradnju sa CMSR-om.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i CMSR su u novembru 2017.godine potpisali donatorski ugovor za realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji I faze vodovodne mreže Žabljaka, kao i za aktivnosti na dovođenju vode iz Modrog jezera, po sistemu "projektuj- izgradi", u cilju poboljšavanja vodosnabdijevanja i unapređenja turističke ponude.
- CMSR je izvršio izbor Izvođača radova i aktivnosti na realizaciji projekta su u toku.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

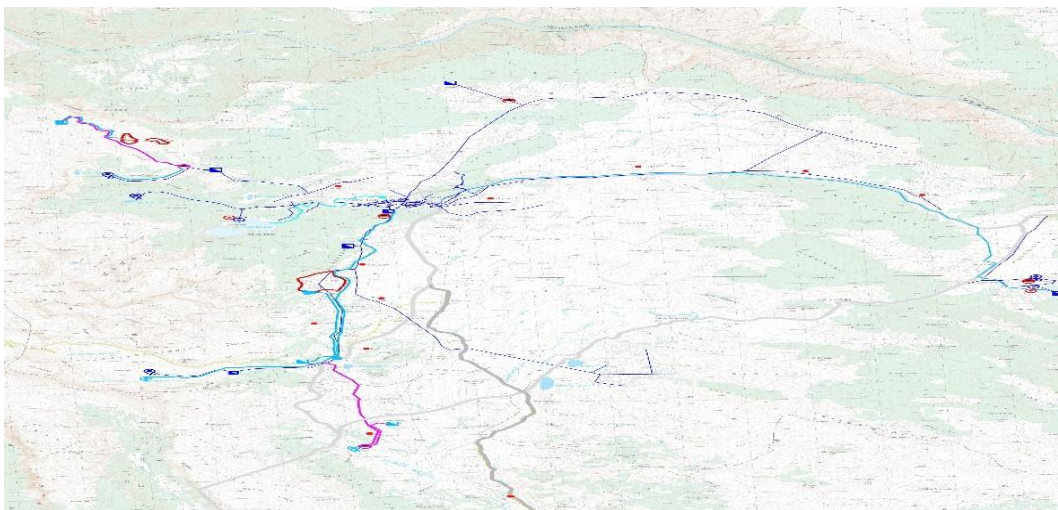

5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

5.1. Rekonstrukcija „Ribarske” ulice u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2015. godini završena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Ribarske ulice u opštini Plav i isti je odobren.
- U 2016. godini dobijena je građevinska dozvola od strane Opštine Plav, ali građani nisu dozvolili uvođenje izvođača u posao.
- U 2017. godini, s obzirom da nijesu rješeni imovinsko-pravni odnosi, početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice je odložen za 2018. godinu.
- Realizacija ovog projekta podrazumijeva radove na saobraćajnici dužine od cca 540 m, sa dvije kolovozne trake širine po 2,75 m i jednostranim trotoarom. Radovi takođe obuhvataju i izradu vodovoda, fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
- Krajem 2018. godine opština Plav je dostavila izvještaj da su imovinsko-pravni odnosi riješeni čime se stekao uslov za početak radova u 2019. godini čim vremenski uslovi to budu dozvoljavali.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija za potrebe izgradnje šetališta pored rijeke Tare od strane Opštine Mojkovac. Krajem 2015. godine, nakon što je raspisano javno nadmetanje, zaključen je Ugovor za izvođenje radova I faze koji se odnose na izvođenje hidrotehničkih instalacija (vodovod, atmosferska i fekalna kanalizacija) kao i na radove na izgradnji donjeg stroja.
- U 2016. godini započeti su radovi I faze i isti su završeni krajem oktobra 2016. godine. Nakon što je raspisano javno nadmetanje, zaključen je ugovor za izvođenje radova II faze koja obuhvata izgradnju gornjeg stroja i javne rasvjete. Zbog nepovoljnih zimskih vremenskih uslova radovi su odloženi za proljeće 2017. godine kada su radovi i završeni.
- U 2018. godini raspisan je tender za izvođenje radova na izgradnji pratećih sadržaja za potrebe šetališta na jalovištu, procijenjene vrijednosti 145.000€. Na prvom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda
- Opština Mojkovac je obezbijedila projektnu dokumentaciju za izgradnju pješačkog mosta-pasarele preko magistralnog puta Podgorica- Bijelo Polje.
- Krajem 2018. godine raspisan je poziv za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji pasarele. Procijenjena vrijednost radova je 1.800.000,00 €, a tehnički rok završetka radova je 7 mjeseci.
- U 2018. godini realizovano je 27.583,00 €







5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Status projekta: U toku

- Radovi na modernizaciji lokalnih puteva i izgradnji gradskih saobraćajnica izvode se u kontinuitetu i u skladu sa iskazanim potrebama lokalnih samouprava i dostavljenim listama prioriteta.
- U 2018. godini realizovano 4.359.340,81 €

5.3.1. Lokalni putevi

- U 2018. godini za projekte Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema planirano je 24 km lokalnih puteva. U 2018. godini planiran je nastavak radova započetih u 2017. godini , kao i izvođenje radova u skladu sa Kapitalnim budžetom i prioritetima lokalnih uprava.

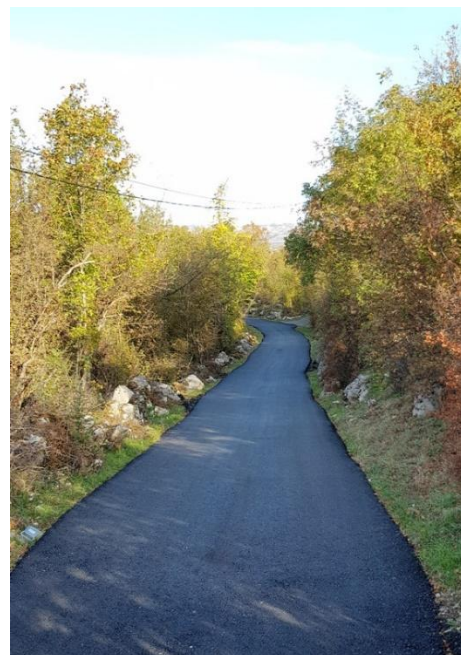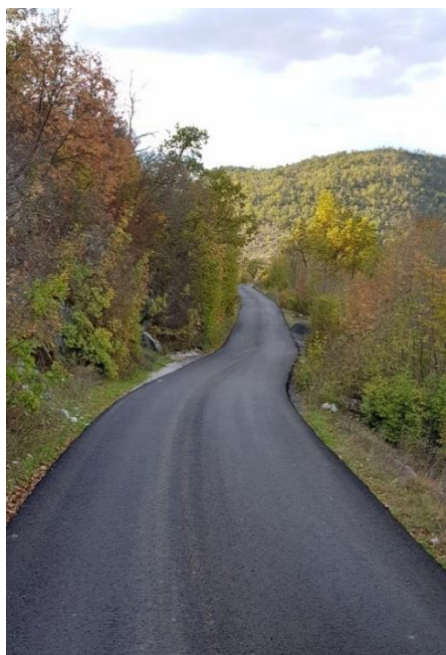

Lokalni putevi u opštini Andrijevića

Status projekta: Završeno

- Završeni su radovi na modernizaciji lokalnih puteva i to lokalni put u MZ Kralje u dužini od 500 m i lokalni put u MZ Bojoviće takođe u dužini od 500 m.
- U 2018.godini realizovano je 52.390,74 €.

Lokalni putevi u opštini Berane

Status projekta: U toku

- U 2017.godini ugovoreni su radovi na izgradnji donjeg stroja puta prema Rujištima u dužini od 2km i isti su u 2018. nastavljani i završeni. Vrijednost radova iznosi 227.493,06 €.
- U 2018. godini završeni su radovi na preostaloj dionici puta prema Rujištima. Vrijednost ovih radova iznosi 40.986,56 € . Krajem 2018.godine ugovoreni su radovi na sanaciji lokalnog puta u Štitarima. Izvođač je završio radove na donjem sloju tampona u dužini od 400 m i preostali su asfalterški radovi koji su zbog loših vremenskih uslova odloženi za proljeće. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30.463,75 €
- U 2018.godini utrošeno je 217.643,64 €

Lokalni putevi u opštini Bijelo Polje

Status projekta: U toku

- Završeni su radovi na modernizaciji 1,5km lokalnih puteva (obaveza iz 2017. godine). Vrijednost radova iznosi 69.696,00 €.
- U 2018.godini opština Bijelo Polje preuzela je , u skladu sa potpisanim Protokolom, aktivnosti na realizaciji projekta modernizacije na 1.5km lokalnih puteva. Do kraja 2018.godine nije odabran izvođač radova.
- U 2018.godini realizovano je 72.660,25 €.

Lokalni putevi u opštini Cetinje

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova potpisala je Protokol i Aneks Protokola sa Prijestonicom Cetinje kojim je definisano da Prijestonica u skladu sa zakonskom regulativom odabere Izvođača radova za modernizaciju lokalnih puteva , da zaključi Ugovor, obezbijedi stalni stručni nadzor i da do kraja 2018.godine realizuje ovaj projekat. Nakon sprovedene tenderske procedure izabran je Izvođač radova. Do sada je završeno 80% ugovorenih radova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 444.505,65 €

Lokalni putevi u opštini Danilovgrad

Status projekta: U toku

Lokalni put za Gostilje (1,2 km)

- Sproveden je postupak javne nabavke za izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Danilovgrad. i potpisan je ugovor. Izvođač je u decembru 2018.godine započeo sa radovima, ali su isti trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Lokalni putevi u MZ Spuž, Novo Selo i Martinići (2 km)

- Sproveden je postupak javne nabavke za izvođenje radova i potpisan je Ugovor.
- Direkcija javnih radova potpisala je 29.03.2018.godine Protokol sa opštinom Danilovgrad kojim je definisano da Opština Danilovgrad-Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad u

skladu sa zakonskom regulativom odabere obrađivača projektne dokumentacije i realizuje izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju lokalnog puta Danilovgrad-Spuž, preko Martinića (dionica Gorica-Burum 8,6 km). Radovi su trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 54.463,83 €

Lokalni putevi u opštini Gusinje

Status projekta: U toku

- Završeni su radovi na modernizaciji 1.5km puteva, I to : Višnjevo – 600 m; Vusanje – 370 m; Grnčar – 530 m
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 74.405,47 €

Lokalni putevi u opštini Kolašin

Status projekta: U toku

- Potpisan je ugovor za modernizaciju 1.5km lokalnih puteva u opštini Kolašin za koji je tender raspisan u 2017.godini, a vrijednost ugovora iznosi 64.128,81€. Radovi nisu započeti.
- Takođe, u oktobru 2018.godine dobijeni su od strane opštine prioriteti za 2018.godinu u dužini od 1km. Raspisano je javno nadmetanje I otvaranje ponuda je zakazano za 09.01.2019. godine.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

Lokalni putevi u opštini Mojkovac

Status projekta: U toku

- Završena je modernizacija 1km lokalnih puteva : Juškovića potok 350 m, Slatina 200 m, Bjelojevići 250 m I Žari 200m.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 47,547.10€

Lokalni putevi u opštini Nikšić

Status projekta:Završeno

- Direkcija javnih radova potpisala je 22.02.2018. godine Protokol i Aneks Protokola sa opštinom Nikšić kojim je definisano da opština preuzme aktivnosti na realizaciji projekta modernizacije 2 km lokalnih puteva u Nikšiću.Svi radovi su završeni.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 109.723,17 €.

Lokalni putevi u opštini Petnjica

Status projekta:Završeno

- Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 1,5 km koja je planirana za 2017.godinu.
- Od strane opštine dostavljena je lista prioriteta za 2018. godinu.
- U 2018. godini sprovedena je i procedura javne nabavke za izvođenje radova na modernizaciji 1,8 km lokalnih puteva u opštini Petnjica i isti su završeni krajem septembra.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 159.876,17 €

Lokalni putevi u opštini Plav

Status projekta: U toku

- U 2018. godini planirana je modernizacija 1.5km lokalnih puteva po prioritetima lokalne uprave.
- Raspisana je javna nabavka i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Radovi su trenutno obustavljeni zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 15.535,82 €

Lokalni putevi u opštini Pljevlja

Status projekta: Završeno

- Sa opštinom Pljevlja potpisan je Protokol 08. juna 2018.godine kojim je Opština preuzela aktivnosti na realizaciji projekta modernizacije 1km lokalnih puteva
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 43.862,94 €

Lokalni putevi u opštini Plužine

Status projekta: U toku

- U 2018.godini planirana je modernizacija 1 km lokalnih puteva u opštini Plužine.
- Do kraja 2018.godine opština Plužine nije dostavila listu prioriteta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Lokalni putevi u opštini Podgorica

Status projekta: U toku

- Završena je izrada Idejnog rješenja za projekat Pričelje- Brestica i isto je dostavljeno Upravi za vode i Željezničkoj infrastrukturi na mišljenje.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

Lokalni putevi u opštini Rožaje

Status projekta: U toku

- U 2018.godini planirana je modernizacija 1,5 km puteva po prioritetima lokalne uprave. Završeno je izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta prema MZ Kalače. Radovi na lokalnom putu prema Hurijama su obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova i isti će biti nastavljeni u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 61.172,34 €

Lokalni putevi u opštini Šavnik

Status projekta: Završeno

- Sa opštinom Šavnik potpisan je Protokol u 2017.godini kojim se Opština obavezuje da realizuje projekat modernizacije 1 km lokalnog puta Šavnik- Malinsko- Strug. Radovi se nisu mogli izvoditi u 2017.godini, ali su isti završeni u 2018.godini.
- U 2018.godini sproveden je i postupak javne nabavke za modernizaciju još 1 km lokalnog puta Borovac- Odrag u opštini Šavnik i potpisan ugovor sa Izvođačem. Svi radovi su završeni.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 101.528,55 €

Lokalni putevi u opštini Ulcinj

Status projekta: U toku

- U 2018.godini planirana je modernizacija 2,2 km lokalnih puteva u opštini Ulcinj na osnovu prioriteta dobijenih od strane opštine. Radovi na modernizaciji 1 km lokalnih puteva su završeni, a radovi na modernizaciji preostalih 1,2 km puteva realizovaće se u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 41.722,25 €

Lokalni putevi u opštini Žabljak

Status projekta: U toku

- U 2018. godini završeno je izvođenje radova na modernizaciji 1km lokalnih puteva po prioritetima lokalne uprave.
- Svi radovi su završeni.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 133.322,72 €

5.3.2. Gradske saobraćajnice

- U 2018. godini planiran je nastavak radova započetih u 2017. godini , kao i izvođenje radova u skladu sa Kapitalnim budžetom i prioritetima lokalnih uprava.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 3.054.606,91€.

Gradske saobraćajnice u opštini Andrijevica

Gradsko jezgro i ulica Branka Delečića

Status projekta: U toku

- U 2017. godini dostavljena je projektna dokumentacija za gradsko jezgro. Raspisano je javno nadmetanje i donešena je odluka za rekonstrukciju trotoara u ulici Branka Delečića i dijela saobraćajnice.
- U januaru 2018. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ulici Branka Delečića. Obzirom da je opština Andrijevica za 2018.godinu planirala izgradnju javne rasvjete, radovi na izradi trotoara su odloženi do završetka izgradnje javne rasvjete u ovoj ulici,osim dijela saobraćajnice.
- Krajem 2018.godine ugovoreni su i radovi na javnoj rasvjeti koji će se zbog nepovoljnih vremenskih uslova realizovati u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 85.793,40 €

Gradske saobraćajnice u opštini Bar

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Bar dostavila projektnu dokumentaciju za izgradnju pothodnika u Sutomoru, raspisano je javno nadmetanje na osnovu iste i krajem godine donešena je odluka o izboru Izvođača radova.
- U januaru 2018. godini potpisan je ugovor za izgradnju pothodnika u Sutomoru . Elaborat za izvođenje radova, zaštitu infrastrukturnih postrojenja i organizovanje željezničkog saobraćaja za vrijeme izgradnje pothodnika je proslijeđen ŽICG na saglasnost. Radovi će početi nakon dobijanja saglasnosti od strane ŽICG na projekat organizacije odvijanja željezničkog saobraćaja za vrijeme izgradnje.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Gradske saobraćajnice u opštine Berane

Status projekta: U toku

- **1.1. Obalska ulica s akružnim tokom od parka 6 do mosta Nika Strugara**
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji gradske saobraćajnice sa atmosferskom kanalizacijom za "Obalsku ulicu" sa kružnim tokom od parka do mosta "Nika Strugara".
- U 2018. godini radovi su završeni.
- **1.2. Izgradnja ulica kod pomoćnih terena Crpna stanica- OŠ »Vuk Karadžić«, L=413 m**
- U 2018. godini započet je postupak javne nabavke za Izgradnju ulica kod pomoćnih terena Crpna stanica- OŠ »Vuk Karadžić«, L=413 m

- Ugovoreni su radovi za izvođenje radova i stalni stručni nadzor. Radovi nisu započeti jer se nisu stekli uslovi za prijavu radova što je obaveza opštine Berane.
- U 2018. godini za radove na gradskim saobraćajnicama realizovana su sredstva u iznosu od 68.237,78 €

Gradske saobraćajnice u opštini Bijelo Polje

Status projekta: U toku

1.1. III Faza gradskog Trga

- Rekonstrukcija gradskog Trga u Bijelom Polju odvija se u tri faze. Opština Bijelo Polje sprovodila je realizaciju radova prve dvije faze i radovi su završeni, a Direkcija javnih radova preuzela je obavezu realizacije treće faze radova na rekonstrukciji gradskog Trga.
- Svi ugovoreni radovi III faze rekonstrukcije gradskog trga su završeni, vrijednost iznosi 229.793,16 €.

1.2. Gradska saobraćajnica u Resniku I faza

- U 2017. godini ugovoreni su radova I faze koji obuhvataju pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, atmosferske i fekalne kanalizacije.
- Radovi nisu izvođeni jer se nisu stekli uslovi za prijavu radova što je obaveza Opštine.

1.3. Gradska saobraćajnica u Resniku II faza

- Radovi II faze obuhvataju završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.
- U 2018. godini, nakon sprovedene procedure, donesena je odluka o izboru najpovoljnije ponude, Ponuđena cijena iznosi 274.000,00 € i u toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora. Ugovoren je stalni stručni nadzor.
- U 2018. godini ukupno su realizovana sredstva u iznosu od 343.540,61 €

Gradske saobraćajnice u opštini Cetinje

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je Ugovor za izgradnju trotoara naspram rezidencije Predsjednika na Njegoševoj ulici.
- Sa radovima će se otpočeti nakon dobijanja građevinske dozvole. Takođe, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je Ugovor za izgradnju prilazne saobraćajnice za objekat za socijalno ugrožene kategorije. Prijestonica Cetinje finansira izvođenje radova na vodovodu.
- Radovi su započeti, ali je gradilište trenutno konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 151.552,21 €

Gradske saobraćajnice u opštini Danilovgrad

Status projekta: U toku

- U 2018. godini sproveden je postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u MZ „Danilovgrad I”, „Danilovgrad II” i „Danilovgrad III”. Ugovor je potpisan i sa radovima je otpočeto.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

Gradske saobraćajnice u opštini Gusinje

Status projekta: U toku

- U 2018. godini planirana je rekonstrukcija Kosovske ulice, dužina 312 m, širina 2 x 2,75 m, sa pripadajućom infrastrukturom (atmosferska, TK i javna rasvjeta).

- Na prva dva javna nadmetanja nije bilo ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno po treći put. Procijenjena vrijednost iznosi 150.000
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Gradske saobraćajnice u opštini Kolašin

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završeni su radovi I faze na sanaciji gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalne uprave. Takođe, raspisano je javno nadmetanje za II fazu i donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ugovor je potpisan u januaru 2018.godine i u 2018. godini završeni su radovi II faze.
- Opština je dostavila prioritete za 2018. godinu . Raspisano je javno nadmetanje i otvaranje ponuda je zakazano za 11.01.2019. godine.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 56.821,43 €.

Gradske saobraćajnice u opštini Mojkovac

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju I faze "Nemanjića ulice", potpisan je ugovor i radovi su otpočeli. Završeni su radovi na polaganju instalacija fekalne kanalizacije, dijela atmosferske i vodovoda.
- U 2018. godini radovi na rekonstrukciji ulice Nemanjića su nastavljeni i isti su i završeni.
- Takođe, u 2018. godini završena je projektna dokumentacija za ulicu pored groblja I potpisan ugovor za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova I faze. Radovi su obustavljeni zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 446.273,44 €

Gradske saobraćajnice u opštini Nikšić

Status projekta: U toku

- U 2017.godini završena je rekonstrukcija saobraćajnice 13.jul u dužini od 1,2 km.
- Za 2018.godinu planiran je nastavak radova na rekonstrukciji bulevara, ali je opština Nikšić predložila da umjesto ove saobraćajnice, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, kandiduje rekonstrukciju neke druge saobraćajnice. Do kraja godine nije dostavljena lista prioriteta.
- U 2018.godini je realizovana su sredstva u iznosu od 4.997,30 €.



Gradske saobraćajnice u opštini Petnjica

Status projekta: U toku

- U 2017.godini, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju saobraćajnice u centru Petnjice i odabran izvođač radova.
- Radovi su, zbog loših vremenskih uslova odloženi za 2018. godinu.
- U 2018. godini Izvođač je uveden u posao, a radovi su obustavljeni zbog usaglašavanja projektne dokumentacije sa postojećim stanjem i neriješenim imovinsko pravnim odnosima.
- Direkcija javnih radova obaviještena je početkom novembra da je radove moguće izvoditi tek nakon izvršene izgradnje planiranog kolektora za fekalne kanalizacije na planirani sabirni kolektor pored rijeke koji nije predmet projekta I ugovora.
- Takođe u 2018. godini planirana je rekonstrukcija gradske saobraćajnice po prioritetima lokalne uprave u vrijednosti 150.000€. Nije dostavljena lista prioriteta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Gradske saobraćajnice u opštini Pljevlja

Status projekta: U toku

- U 2017.godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukcij ulice 2 u naselju Dolovi III.
- U aprilu 2018. godine potpisan je Ugovor za rekonstrukciju ulice 2 u naselju Dolovi III i radovi su završeni.
- U 2018. godini planirano je i raspisivanje javne nabavke radova za rekonstrukciju Omladinske ulice.
- S obzirom da Opština nije obezbijedila projektnu dokumentaciju, predloženo je da Direkcija javnih radova učestvuje u realizaciji projekta rekonstrukcije saobraćajnice i u skladu sa istim potpisan je Protokol.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 142.075,35 €

Gradske saobraćajnice u opštini Rožaje

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što su dostavljeni prioriteti od strane Opštine Rožaje, raspisano je javno nadmetanje na sanaciji gradskih saobraćajnica i odabran izvođač radova.
- Radovi su, zbog loših vremenskih uslova, odloženi za 2018. godinu.
- Radovi su nastavljani u maju 2018.godine . Završeni su radovi na tri saobraćajnice, a preostala je saobraćajnica Jukov potok gdje su radovi obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
- U 2018.godini raspisana je javna nabavka i potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalne uprave. U skladu sa tim ugovorom, završeni su radovi na asfaltiranju ulice prema Hurijama i započeti radovi na Sandžačkoj ulici.
- U cilju završetka svih radova, raspisano je javno nadmetanje za preostale radove koji su planirani za 2019.godinu.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 201.660,61 €.

Gradske saobraćajnice u opštini Podgorica

Status projekta U toku

- U 2017. godini, nakon što je Glavni grad Podgorica dostavio projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju "Cvijetne ulice" na Starom Aerodromu, raspisano je javno nadmetanje na osnovu iste i krajem godine donešena je odluka o izboru Izvođača radova. U 2018. godini radovi su ugovoreni i isti su završeni krajem oktobra.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 751.652,97 €.



Gradske saobraćajnice u opštini Šavnik

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, u skladu sa dostavljenom projektnom dokumentacijom, raspisano je javno nadmetanje za radove na rekonstrukciji saobraćajnice Mali most na rijeci Šavnik – magistralni put Šavnik – Žabljak (I faza) i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču.
- U januaru 2018. godine potpisan je ugovor i radovi I faze su završeni.
- Takođe, sproveden je postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova II faze i potpisan je Ugovor sa odabranim izvođačem. Svi radovi na saobraćajnici su završeni.
- U 2018. godini je realizovana su sredstva u iznosu od 551.378,82 €

Gradske saobraćajnice u opštini Ulcinj

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja odabran je izvođač radova I faze i potpisan je ugovor.
- Radovi nijesu otpočeli. U cilju pribavljanja građevinske dozvole u toku je usaglašavanje projektne dokumentacije u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i građenju objekata.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 89.495,63 €

Gradske saobraćajnice u opštini Žabljak

Status projekta: U toku


- U 2018. godini potpisan je ugovor za radove na nastavku ulice Baja Pivljanina u dužini od 140 m. Svi radovi su završeni.
- Takođe, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju ulice "Vojvode Mišića" i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču, a u 2018. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji. Čeka se građevinska dozvola.
- U 2018. godini raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju ulice od gradske tržnice do stadiona. i potpisan je ugovor za rekonstrukciju saobraćajnice. Izvođač je uveden u posao, ali su radova obustavljeni zbog loših vremenskih uslova.
- Takođe, Opština je uputila zahtjev za obezbjeđivanje neophodnih sredstava u iznosu od 100.240€ za eksproprijaciju zemljišta u privatnom vlasništvu na koji je MORiT i Ministarstvo finansija dalo saglasnost. U skladu sa tim potpisan je Protokol između Direkcije i Opštine Žabljak za prenos sredstava.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 134.129,16 €.



5.4. Rekonstrukcija mosta »Radovan Pavićević« na rijeci Zeti u Danilovgradu

Status projekta: završen

- U skladu sa potpisanim protokolom, Opština Danilovgrad je obezbijedila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti na osnovu koje je Direkcija javnih radova u 2017. godini raspisala javno nadmetanje i odabrala Izvođača radova.
- U 2017. godini realizovano je 12.691,00 €.
- U 2018. godini završeni su svi radovi na rekonstrukciji mosta »Radovan Pavićević« na rijeci Zeti i objekat je dobio upotrebnu dozvolu..
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.024.803,05 €.

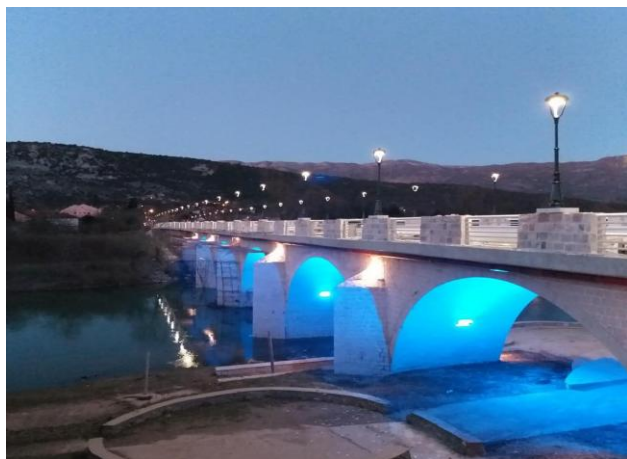

5.5. Izgradnja gradske pijace u Gusinju

Status projekta: U toku

- U opštini Gusinje planirana je izgradnja objekta gradske pijace ukupne bruto površine 763 m² i spratnosti P+Pk.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze na izgradnji gradske pijace u Gusinju i odabrala izvođača radova.
- U aprilu 2018. godine započelo je izvođenje radova (grubi građevinski radovi) i isti su završeni.
- U 2019. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova II faze.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 138.001,73 €.



5.6. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

Status projekta: U toku

- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na regulaciji korita rijeke Grnčar u Gusinju, Lim i Zlorečice u Andrijevi, Bojane u Ulcinju, regulaciji potoka u Petnjici i sanacija obaloutvrda u naselju Ambarine u Mojkovcu.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova, kao i sprovođenje aktivnosti na ostalim lokalitetima po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma

5.6.1. Regulacija potoka u Petnjici

- U 2017. godini, nakon što je Opština Petnjica dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu iste je raspisano javno nadmetanje na regulaciji potoka u Petnjici, odabran izvođač radova i zaključen ugovor.
- Radovi su izvođeni na čišćenju korita potoka, ali su isti obustavljeni i zbog loših vremenskih uslova i odloženi za 2018. godinu.
- U 2018.godini su završeni su radovi na taložnici i postavljanju cijevi u dužini od 200 m sa obradom terena na kompletnoj dionici. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa radova u dionici od 50 m su obustavljeni.
- U 2018.godini realizovano 127.645,22 €

5.2. Uređenje rijeke Svinjače(uliv u rijeku Taru) u opštini Kolašin

- Nisu sprovedene aktivnosti zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

5.3. Nastavak uređenja korita rijeke Grnčar u urbanom dijelu nizvodno od škole do mosta na ulasku u Gusinje

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinje dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu iste raspisano je javno nadmetanje za regulaciju korita rijeke Grnčar II faza, nizvodno od pješačkog mosta, odabran je izvođač radova i zaključen ugovor.
- U 2017. godini izvedeni su radovi na čišćenju korita i izradi zaštitnog zida na lijevoj obali rijeke Grnčar.
- U 2018.godini, nakon što su se stvorili povoljni uslovi, radovi su nastavljeni i isti su završeni.
- Takođe, u 2018.godini ugovoreni su radovi III faze i izvođač je uveden u posao. Gradilište je konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 132.421,12 €

5.6.4. Regulacija korita rijeke Zlorečice

Status projekta: U toku

- U toku je procedura potpisivanja ugovora za izvođenje radova i stalni stručni nadzor, nakon čega će se sprovesti aktivnosti za početak radova. Vrijednost najpovoljnije ponude iznosi 189.663,80 €

5.6.5. Regulacija korita Lima dionica B u Andrijevi

Status projekta: U toku

- U 2017. godini izvođeni su radovi na regulaciji rijeke Lim nizvodno od mosta Seoci. Izvođeni su radovi na iskopima i izradi nasipa, ali su isti obustavljeni zbog visokog vodostaja. Preostali su radovi na oblaganju kosina nasipa kamenom.
- U 2018.godini radovi su nastavljeni, a planirani rok završetka radova je prvi kvartal 2019.godine.
- U 2018. nije bilo utroška sredstava.



5.6.6 Regulacija korita rijeke Lim uzvodno od mosta u Zorićima u opštini Andrijevica

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za uklanjanje sprudova i izradu nasipa, na koje nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2018. godini sproveden je postupak za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i krajem avgusta je potpisan ugovor sa odabranim izvođačem. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 29.823,72 € i svi planirani radovi su završeni.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 22.068,26 €

5.7. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama

Status projekta: U toku

- Izgradnja regionalne stočne pijace planirana je u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim, koji se nalazi na regionalnom putu Berane - Rožaje.
- Kompleks stočne pijace u Beranama prostire se na površini od 3.352 m².
- Planirani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje, kao i površine pješačke i kolske komunikacije u okviru pijace. Kolski pristup lokaciji i objektu je obezbijeđen sa lokalne saobraćajnice sa jugozapadne strane, kao i pješački pristup koji je predviđen sa iste strane. U sklopu pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50m koja opslužuje sve sadržaje u okviru kompleksa. U sjevernom dijelu pijace predviđen je parking prostor sa 6 parking mjesta za kamione. Na lokaciji pored stočne pijace planiran je parking za posjetioce, odnosno novoprojektovana ulica parkinga širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- U 2017. godini nakon što je Opština Berane dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste pristupila raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje predmetnih radova i zaključila ugovor sa Izvođačem.
- U 2018. godini završena je izrada i revizija dopune projektne dokumentacije za objekat stočne pijace i pripadajućeg parkinga.
- U julu 2018. godine Izvođač je završio radove I faze koji su obuhvatali i radove na izradi parkinga za posjetioce na lokaciji pored stočne pijace.
- U 2019. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova II faze koji će obuhvatiti sve preostale radove koje je neophodno izvesti da bi se objekat stavio u funkciju.
- U 2018. godini realizovano je 223.722,18 €



5.8. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci- Njegnjevo u Bijelom Polju

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini nakon što je Opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje i potpisala ugovor za izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo.
- U avgustu 2018.godine radovi su započeti i isti su završeni u novembru.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 211.455,34 €



5.9. Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini nakon što je Opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje i potpisala ugovor za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na zaobilaznici u dužini cca 4.500 metara sa 106 stubnih mjesta sa 116 svjetiljki.
- U 2017. godini, izvođeni su radovi na polaganju instalacija javne rasvjete. Takođe, završena je i montaža stubova javne rasvjete.
- U 2018.godinis su radovi su nastavljani i završeni.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 124.479,80



5.10. Izgradnja gradske pijace u Rožajama

Status projekta: U toku



- Planirana je izgradnja gradske pijace ukupne bruto površine 1.370 m².
- Projektovana spratnost objekta je prizemlje i dva sprata. U prizemlju budućeg objekta planirani su sljedeći sadržaji: u prizemlju zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- U 2017. godini nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze. Radovi I faze obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije.
-
- U 2018.godini je potpisan je ugovor sa izvođačem radova. Do sada su završeni radovi na izradi armirano betonske konstrukcije objekta i zidanje fasadnih zidova u prizemlju i spratu objekta..
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 304.812,89 €

5.11. Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo u Gusinju

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je izradila projektnu dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju, u ukupnoj dužini od oko 10km.
- Projekat se realizuje fazno, u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- U prethodnom periodu završeni su hitni radovi na izgradnji dionice puta od Stanice policije do Vojnog sela.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na rijeci Vruji koja čini sastavni dio rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinja. Izvođač je uveden u posao, ali su radovi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa obustavljeni.
- U 2018. godini potpisan je Ugovor sa izvođačem radova koji je , nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa, pristupio izvođenju radova na saniranju postojeće saobraćajnice od grada prema Vojnom selu.
- Radovi su trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova i isti će biti nastavljani u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 150.000,00 €

5.12. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Plav dostavila projektnu dokumentaciju, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova I faze, odabran izvođač i potpisan ugovor.
- Radovi I faze na rekonstrukciji Prnjavorske ulice započeti su u 2018.godini i isti su završeni u septembru 2018.godine
- U toku je priprema tendera za izvođenje radova II faze kojom će biti obuhvaćeni svi radovi na završetku rekonstrukcije. Obaveza Opštine Plav je dopuna projektne dokumentacije u skladu sa postojećim stanjem na terenu i novim zakonom o planiranju prostora.
- Procijenjena vrijednost iznosi 300.000€.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 227,170.50€

5.13. Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav- Bogićevića

Status projekta: U toku

- U 2017. planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevića u Plavu.
- Obaveza Opštine Plav je da dostavi urbanističko-tehničke uslove. U aprilu 2018.godine dostavljen je Projektni zadatak i isti je vraćen Opštini na dopunu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- Od Opštine Plav je dobijen Projektni zadatak i urbanističko-tehnički uslovi dana 20.7.2018. godine, na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija. Projektnim zadatkom je promijenjen rang puta sa lokalnog na regionalni i nakon procedure izmjene Plana javnih nabavki zbog povećane vrijednosti radova, stvoreni su uslovi za raspisivanje tendera za izradu projekta. U toku je vrednovanje ponuda.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava .

5.14. Izgradnja pješačkog mosta u Haremima u opštini Berane

Status projekta: U toku

- Krajem 2018.godine Opština Berane je dostavila Direkciji javnih radova Projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove. U toku je priprema tendera za izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.15. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka, kao i izgradnju saobraćajnice za biznis zonu u opštini Mojkovac.
- U 2018.godini izrađena je projekta dokumentacija, raspisano javno nadmetanje i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču.
- Takođe, , u 2018. godini sproveden je i postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnice i zaključeni ugovori za izradu Glavnog projekta i vršenje revizije.
- Izrada projektne dokumentacije je u toku.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.492,00 €.

5.16. Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Sredstva planirana za 2018.godinu odnose se na izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i opremnje.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.17. Podrška u zapošljavanju OSI NA Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Za realizaciju ovog projekta Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 20.000,00 €. Od strane Prijestonice smo obaviješteni da projekat nije realizovan, a da je nedostajuća kompjuterska oprema nabavljena iz doniranih sredstava.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

5.18. Rekonstrukcija Studentskog trga na Cetinju

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za početak realizacije projekta.

5.19. Rekonstrukcija Trga i pijace na Njegušima na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje u skladu sa potpisanim protokolom koordinira aktivnostima na izradi projektne dokumentacije i izgradnju gradske pijace na Cetinju-Njegušima.
- U 2017. godini izvođeni su radovi na uređenju terena i grubom razvodu instalacija.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

5.20. Rekonstrukcija Njegoševog parka na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Za realizaciju ovog projekta Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 50.000,00 € .S obzirom da tehnička dokumentacija nije završena, od strane Opštine smo obaviješteni da su sredstva preusmjerena za projekat modernizacije Lokalnih puteva.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.21. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 12.06.2018.godine
- Nakon sprovedenih procedura javnih nabavki, zaključeni su ugovori i izvršena je isporuka dijela opreme.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 96.708,75 €.

5.22. Kupovina prostora za potrebe „Parking servis i održavanje objekata” za potrebe Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Raspisan je tender za kupovinu prostora, a procijenjena vrijednost javne nabavke je 120.000,00 €. Tenderska procedura je u toku.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

5.23. Izgradnja prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce (azil) na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 12.06.2018.godine
- Raspisana je javna nabavka za kupovinu lokacije sa objektom/ objektima, ali nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.24. Izgradnja/rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja za potrebe Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Prijestonica Cetinje za prioritetan objekat odabrala Izgradnju objekta kapele na Čevu. U skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, opština Cetinje je uputila zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma za sprovođenje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

5.25. Sanacija podvožnjaka I uređenja prostora od Ćipura do Vladinog doma na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Za realizaciju ovog projekta Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 45.000,00 € . Projekat nije realizovan zbog nedostatka tehničke dokumentacije od strane Opštine smo obaviješteni da su sredstva preusmjerena za projekat modernizacije Lokalnih puteva.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.26. Uređenje pješačke staze do Orlovog krša na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Za realizaciju ovog projekta Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 50.000,00 € . Projekat nije realizovan zbog nedostatka tehničke dokumentacije od strane Opštine smo obaviješteni da su sredstva preusmjerena za projekat modernizacije Lokalnih puteva.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.27. Uređenje pristupnog puta i osvjetljenje tvrđave na Žablaku Crnojevića na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine Za realizaciju ovog projekta Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 50.000,00 €. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa Projekat nije i od strane Opštine smo obaviješteni da su sredstva preusmjerena za projekat modernizacije Lokalnih puteva.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

5.28. Osvjetljenja “Ćipura” I “Biljarde” na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Za realizaciju ovog projekta, Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 45.000,00 €.

- Projekat nije realizovan zbog nedostatka tehničke dokumentacije od strane Opštine smo obaviješteni da su sredstva preusmjerena za projekat modernizacije Lokalnih puteva.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

5.29. Putni pravac Luštica 2 Monte Rose

Status projekta: U toku

- Nijesu stvoreni administrativni uslovi za početak realizacije projekta.

5.30. Izrada tehničke i druge dokumentacije za objekte za potrebe Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, u skladu sa Protokolom potpisanim 19.06.2018.godine
- Sprovedena je tenderska procedura i izabran projektant. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju ulica u gradskom području.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 22.627,00 €

6. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA

6.1. Rekonstrukcija energetskog bloka- trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon što je projektni zadatak dostavljen od strane Korisnika raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici
- U 2018. ugovor za izradu projektne dokumentacije i reviziju je potpisan i u toku je izrada projektne dokumentacije
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

6.2. Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš” i Dom zdravlja „Stara Varoš” u Podgorici

Status projekta: U toku

- Planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora, administraciju.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača Glavnog projekta u cilju kompletiranja projektne dokumentacije za potrebe privođenja namjeni i stavljanja u funkciju spratova ranije rekonstruisanih predmetnih objekata
- U martu 2018. godine, nakon izbora obrađivača Glavnog projekta, započeta je izrada projektne dokumentacije i završetak iste zavisi od usvajanja planske dokumentacije koja je stavljena van snage, nakon čega će se pristupiti reviziji iste.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

6.3. Rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore za potrebe Urgentnog bloka

Status projekta: U toku

- Nakon što Korisnik dostavi neophodnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova će započeti sa realizacijom ovog projekta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

Status projekta: U toku

- Dom za stare osobe u Podgorici projektovane je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata i ukupne bruto površine 11.230 m².
- Objekat je predviđen za boravak 270 korisnika, a pored smještajnih jedinica sadržaće dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, prostorije za upravu, medicinski blok, prateće tehničke prostorije. Objekat će sadržati odvojene cjeline za dementne korisnike i za korisnike koji su na dnevnom boravku.
- U 2015. godini usaglašen je projektni zadatak sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Glavnim gradom, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U toku 2016. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za izvođenje radova. Sa radovima se otpočelo krajem 2017. godine .
- U 2018.godini je nasatavljeno sa radovima i isti su se odvijali ugovorenom dinamikom.Do sada su završeni zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta i pokrivački radovi. .U toku su zidarski radovi u unutrašnjosti objekta, ugradnja spoljne bravarije i grubi razvod elektro i hidro instalacija.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 938.800,00 €.



7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Opština Nikšić koordinira izradu Glavnog projekta nakon čega će biti raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta.
- Realizacija ovog projekta planirana je fazno, pri čemu će se prva faza finansirati kroz RHP program, a druga faza kroz Kapitalni budžet.
- U 2018. godini Direkciji javnih radova je dostavljena projektna dokumentacija za radove I faze i ista je poslata CEB-u na saglasnost. Nakon dobijanja saglasnosti, početkom 2019.godine planirano je raspisivanje tendera.
- U 2019. godini planirano je i raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje II faze radova koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta, kao i početak i izvođenja istih. U toku je priprema tenderske dokumentacije.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

7.3. Kupovina zemljišta za potrebe izgradnje objekata u cilju rješavanja stambenih pitanja za potrebe Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje koordinira aktivnostima na realizaciji infrastrukturnih priključaka za potrebe stambenog objekta na Cetinju za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u skladu sa potpisanim Protokolom potpisanim 20.03.2018.godine.
- Izvršena je i realizacija dijela projekta za rješavanje stambenih pitanja za potrebe Prijestonice Cetinje u iznosu od 19.957,80 € koja se odnosi na kupovinu zemljišta.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 19.957,80 €



8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE

8.1. Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a

Status projekta: U toku

- Sredinom juna 2013. godine Administrativni odbor Razvojne banke Savjeta Evrope je odobrio kreditnu liniju za izgradnju dječjih vrtića u iznosu od 10 miliona eura, na osnovu čega je potpisan Ugovor o uslovima i načinu korišćenja kreditnih sredstava.
- Tokom realizacije projekta planirano je da Direkcija javnih radova bude jedinica za implementaciju projekta, Ministarstvo prosvjete u ulozi Agencije za implemetaciju projekta, a Ministarstvo finansija korisnik kredita.
- Iz sredstava kredita je planirana izgradnja 7 novih vrtića, i to: 4 u Podgorici i po jedan vrtić u Baru, Ulcinju i Pljevljima.
- U 2018.godini realizovano je 1.440.335,76 €

8.1.1. Vrtić u Podgorici

Status projekta:Završeno

- Izgradnja objekta vrtića na Starom Aerodromu u Podgorici predviđena je na uglu "Cvijetne ulice" i Ulice "Mirka Banjevića" u Podgorici.
- Objekat sadrži prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 3.000 m² i planiran je za boravak 375 djece.
- U objektu su predviđeni sljedeći sadržaji: radne soba za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, fiskulturna sala, biblioteka, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju i vešeraj za potrebe 3.000 djece, sa svim pratećim sadržajima. U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije.
- U 2017. godini, nakon završetka žalbene procedure kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, potpisan je ugovor o građenju i početkom 2017. godine započeli su radovi na izgradnji objekta i završeni krajem avgusta 2018.godine.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 879.417,74 €.





8.1.2. Vrtić u Baru

Status projekta: U toku

- Izgradnja objekta vrtića u Baru predviđena je u neposrednoj blizini osnovne škole.
- Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 2.960 m² i planiran je za boravak 370 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, sala za zajedničke aktivnosti, biblioteka, kuhinja sa svim pratećim prostorijama za cca 600 obroka, prostorije za trijažu i ostale tehničke prostorije.
- U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i isto je poništeno.
- U martu 2015. godine ponovno je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova, a nakon donošenja odluke o izboru izvođača radova koja je donijeta u julu 2015. godine, na istu je uložena žalba. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je proceduru vratila na ponovno vrednovanje, nakon čega je nova odluka donijeta u oktobru 2015. godine na koju je takođe uložena žalba.

- U 2016. godini, nakon dostavljanja Rješenja Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, izvršeno je ponovno vrednovanje pristiglih ponuda i javno nadmetanje je poništeno.
- U 2017. godini ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju i opremanje objekta. Donijeta je odluka o izboru najpovoljnije ponude i dostavljena je CEB-u na saglasnost.
- U 2018. godini planiran je početak radova na izgradnji objekta. Dobijena saglasnost CEB-a na odluku o izboru nadzora nad izvođenjem radova 03.10.2018. god.
- Nakon potpisivanja ugovori za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora, postavljen je kamen temeljac.
- Zbog problematike oko izbora lokacije za izgradnju, aktivnosti na gradilištu su obustavljene i odloženo je uvođenje izvođača u posao. Rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

8.1.3. Vrtić u Ulcinju

Status projekta: Nijesu provedene aktivnosti

- Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 978 m² i planiran je za boravak 123 djece.
- U drugoj polovini 2015. godine Opština Ulcinj je donijela odluku o ustupanju lokacije na kojoj će se graditi objekat.
- Ministarstvo prosvjete koordinira aktivnosti na administrativnim procedurama za prenos vlasništva nad zemljištem na kojem će biti izgrađen objekat i iste su u toku.
- Nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

8.1.4. Vrtić u Pljevljima

Status projekta: U toku



- Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima predviđena je u naselju Guke. Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², za smještaj 67 djece. U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslenu grupu, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije.
- U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 400 djece (tri obroka dnevno), koja će zadovoljiti potrebe na nivou JU „Eko bajka” u Pljevljima. U 2015. godini

raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba, a potom je i poništeno. U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta.

- Nakon okončanja procedure javne nabavke i ugovaranja posla, krajem 2017. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2018. godini, prema zahtjevu CEB-a izvršeno je korigovanje predmjera i predračuna radova u cilju smanjenja projektantske procjene, kao i usklađivanje projektne dokumentacije sa važećom zakonskom regulativom.
- U 2019. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak izvođenja istih.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

8.1.5. Vrtić u Bloku VI u Podgorici

Status projekta: U toku

- Izgradnja vrtića predviđena je u naselju Blok VI u Podgorici.
- Objekat će biti ukupne bruto površine 1.515 m² i planiran je za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajna kuhinja, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba, a potom je i poništeno.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI, a Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i na isto je uložena žalba. Nakon okončanja procedure javne nabavke, potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta, nakon čega se prisupilo usaglašavanju konkursnog Idejnog rješenja sa smjernicama za projektovanje koje propisuje CEB.
- U 2018. godini nakon usaglašavanja konkursnog Idejnog rješenja sa smjernicama za projektovanje koje propisuje CEB, Idejno rješenje je poslato državnom arhitekti na saglasnost od koga je ista dobijena.
- U toku je izrada Glavnog projekta, nakon čijeg će se završetka raspisati javno nadmetanje za izvođenje radova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 3.499,32 €.



8.1.6. Vrtić u Tuzima

Status projekta: U toku

- Projekat se finansira iz kredita Razvojne banke Savjeta Evrope-CEB
- Planirana je izgradnja objekta vrtića u Tuzima, na urbanističkoj parceli površine oko 5.600 m². Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektni zadatak u decembru 2015. godine, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U 2017. godini nakon okončanja procedure javnih nabavki za odabir obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, završena je revizija Glavnog projekta, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Projektovan je objekat prizemne spratnosti, bruto površine cca 1.400 m².
- Objekat će sadržati 11 radnih soba planiranih za 200 djece, multifunkcionalni prostor, kuhinju, prostorije za zaposlene kao i ostale prateće sadržaje. Šest soba će biti namijenjeno potrebama vrtića, a 5 radnih soba za dio jaslica.
- U maju 2018. godine, nakon završene procedure javnog nadmetanja, započeti su radovi na izgradnji vrtića.
- Završeni su zemljani radovi, radovi na izradi AB konstrukcije objekta, zidarski radovi i u toku su radovi na izradi krovnog pokrivača, spolje i unutrašnje bravarije, kao i grubom razvodu instalacija.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 557.418,70 €.



8.1.7. Rekonstrukcija Vrtića

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- Nakon dostavljanja neophodne dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete pristupiće se daljim aktivnostima koje se odnose na izradu tehničke dokumentacija za rekonstrukciju više vrtića po prioritetima Ministarstva prosvjete.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

8.2. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što su dostavljeni urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak od strane Korisnika, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta vrtića u Rožajama. Sa najpovoljnijim ponuđačem potpisan je ugovor i u 2018. godini je završena izrada Glavnog projekta i na isti je dobijeno pozitivno mišljenje revidenta.

- U 2018. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji vrtića. Na odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača uložena je žalba. Državna komisija je donijela odluku kojom se javna nabavka poništila u potpunosti. Krajem 2018.godine ponovno je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova.
- Tehnički rok završetka radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 10.640,00 €

8.3. Izgradnja vrtića u City kvartu

Status projekta: U toku

- U toku su aktivnosti na rješavanju imovinsko.-pravnih odnosa od strane Ministarstva prosvjete nakon čega će se pristupiti pribavljanju urbanističko tehničkih uslova, pripremi Projektnog zadatka i raspisivanju konkursa za izradu Idejno urbanističko arhitektonskog rješenja od strane nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

8.4. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Status projekta: U toku

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- U 2015. godini usaglašen je Projektni zadatak sa korisnicima objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, nakon čega je u septembru 2015. godine Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja, u 2017. godini potpisan je ugovor o izradi Glavnog projekta rekonstrukcije objekta i isti je završen početkom 2018. godine.
- Krajem 2018. godine, nakon završetka tenderske procedure, potpisan je Ugovor o reviziji Glavnog projekta i ista je u toku.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 70.124,45 €.

8.5. Izgradnja objekta Srednje stručne škole u Golubovcima, Gradska opština Golubovci

Status projekta: U toku

- Planirani objekat Srednje stručne škole u Golubovcima, ukupne bruto površine 5.480 m², sastojeće se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu su predviđene nastavne prostorije, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina do 500 gledalaca.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- U 2016. godini donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Srednje stručne škole u Golubovcima.
- Zaključkom Vlade br. 08-858 od 08. maja 2015. godine Direkcija javnih radova je zadužena da sprovede proceduru javnih nabavki za izgradnju novog antenskog stuba Radio-difuznog centra umjesto postojećeg koji se nalazi na lokaciji planiranog objekta. Nakon stvaranja administrativnih preduslova, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju novog antenskog stuba, potpisan je ugovor sa Izvođačem i radovi su počeli i završeni su u 2017. godini. Prema zaključku Vlade Crne Gore br: 08-2507 od 15.09.2016 godine. Direkcija javnih radova je zadužena da sredstvima iz Kapitalnog budžeta izmiri obaveze po osnovu poravnjanja u

postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava bivšim vlasnicima nepokretnosti na kojoj je planirana izgradnja škole. Postupak još uvijek nije završen zbog nepotpune dokumentacije koju trebaju dostaviti bivši vlasnici zemljišta

- Radovi na izgradnji objekta škole su otpočeli u januaru 2017. godine i isti su nastavljeni u 2018.godini.
- Do sada je završen veći dio građevinsko-zanatskih i instalerskih radova. Preostali su podopolagački i montažerski radovi, radovi na uređenju terena, kao i opremanje objekta naještajem.
- U 2019.godini planiran je nastavak i završetak radova na izgradnji objekta.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 2.200.267,73 €.



8.6. Izgradnja objekta Osnovne škole u Gukama, opština Pljevlja

Status projekta: Završeno

- Izgradnja Osnovne škole u Gukama u opštini Pljevlja realizuje se fazno.
- U 2011. godini je završena I faza radova koja je obuhvatila izgradnju Lamela „A” u okviru koje su učionice.
- U 2015. godini potpisan je Ugovor sa izvođačem radova za realizaciju II faze kojom je planirana izgradnja Lamela „B” – administrativni dio i Lamela „C” – fiskulturna sala.
- U 2016. godini, nakon pribavljanja građevinske dozvole, započelo se sa izvođenjem radova.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji II faze objekta i u toku je tehnički pregled. Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na opremanju lamela B i C.
- U 2018. godini završeni su svi radovi na opremanju objekta i spoljnih terena, kao i tehnički pregled objekta i izdata je upotrebna dozvola.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 110.448,84 €.



8.7. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Osnovne škole u Tološima u Podgorici

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- Planirana je izgradnja objekta osnovne škole za 1.200 učenika, na urbanističkim parcelama 4-2 i 4-4 u bloku 4, u zahvatu izmjenjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2“ u Podgorici.
- Na urbanističkoj parceli 4-4 planirana je izgradnja školskog objekta, dok je na urbanističkoj parceli 4-2 planirana izgradnja fiskulturne sale i otvorenih terena, uz mogućnost fazne izgradnje.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije bila dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini, dostavljeni su kompletirani urbanističko-tehničkih uslovi i Projektni zadatak od strane Ministarstva prosvjete, kada je u skladu sa novom zakonskom regulativom nadležnost za sprovođenje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja osnovne škole sa fiskulturnom salom u Tološima u Glavnom gradu Podgorica dodijeljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
- Nakon raspisivanja konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, pristupit će se raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za Osnovnu školu u Tološima, Glavni grad Podgorica, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 476,00 €

8.8. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a »Univerzitetski centar« u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon dostavljanja urbanističko-tehničkih uslova i Projektnog zadatka od strane Korisnika, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za rekonstrukciju toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica, odabrala obrađivača i potpisala ugovor za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije toplane, čija je izrada u toku.
- U toku je procedura usvajanje elaborata zaštite životne sredine.
- U 2019. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, sprovođenje procedure javnih nabavki za odabir izvođača radova, kao i početak izvođenja istih.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

8.9. Rekonstrukcija aneksa objekta Osnovne škole u Baću i Kalačama, u opštini Rožaje

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština Rožaje u skladu sa potpisanim Protokolom.
- Završeni su svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji aneksa objekta OŠ u Baću
- U 2018.godini realizovano je 9.882,00 €



Kalači

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština Rožaje u skladu sa potpisanim Protokolom.
- U 2018. godini opština Rožaje je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta OŠ u Kalačima i potpisala ugovor sa izvođačem radova. Završeni su radovi na novoizgrađenom dijelu objekta kao i ugradnja novih instalacija i opreme za grijanje u postojećem objektu škole.
- U 2018. godini realizovano je 97.359,76 €
- U 2019. godini planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.



8.10. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom

Sanacija klizišta objekta JPU „Naša radost” na Savini

Status projekta: U toku

- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini u opštini Herceg Novi.

- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na sanaciji klizišta, odabran je izvođač radova i potpisan ugovor, a nakon toga se otpočelo sa izvođenjem radova.
- U 2018. godini završeni su radovi na izradi potporne konstrukcije koju čine dva reda bušenih šipova prečnika 100cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5m.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 258.693,33 €



Sanacija klizišta objekta Osnovne škole „Milan Vuković“ na Savini

Status projekta: U toku

- U 2018. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehaničkim istraživanjima za objekat JU OŠ »Milan Vuković« u opštini Herceg Novi.

Rekonstrukcija objekta Osnovne škole »Milan Vuković« na Savini

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2018. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta jer nije usvojena opplanska dokumentacija.
- Nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, planirano je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projektnekonstrukcije objekta OŠ "Milan Vuković".

Rekonstrukcija postojećeg školskog objekta- Zdužbina porodica Bošković, Đurović I Laketić u naselju Srbina u Herceg Novom

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- U 2018. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta jer nije usvojena planska dokumentacija.
Nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, planirano je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za rekonstrukcija postojećeg školskog objekta - Zadužbina porodica Bošković, Đurović i Laketić u naselju Srbina u Herceg Novom, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

8.11. Izgradnja Osnovne i muzičke škole »Dušan Korać« u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- Osnovna škola i škola za Osnovno muzičko obrazovanje planirana je na lokaciji postojeće osnovne u Bijelom Polju.
- Objekat je projektovan kao savremeni i funkcionalni objekat, u skladu sa namjenom i ambijentom lokacije, spratnosti suteran, prizemlje i jedan sprat, ukupne bruto površine cca 5.500 m², za 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. U okviru osnovne škole planirane su sljedeći sadržaji: dvadeset učionica opšte namjene (površine min 60 m²) i šest kabineta za specijalne namjene sa pripremnim prostorijama, društvene višenamjenske prostorije, prostorija za cjelodnevni boravak, biblioteke, sale za fizičko vaspitanje sa potrebnim pratećim sadržajima, administrativne i ostale prateće sadržaje.
- Sadržaji Muzičke škole obuhvataju četiri učionice za grupnu nastavu, devet učionica za individualnu nastavu i četiri vježbaonice, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje. Planirano je da postojeći objekat Osnovne škole radi dok traje izgradnja planiranog novog objekta. Zbog toga je planiran novi objekat Osnovne i Muzičke škole na dijelu parcele koji je trenutno slobodan prostor, dok su na dijelu parcele gdje je postojeći objekat planirani sportski tereni i slobodne površine.
- Krajem 2017. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Nakon sprovedenih procedura javne nabavke i žalbenog postupka krajem oktobra 2018. godine donijeta je odluka o obustavljanju postupka jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda. Javno nadmetanje ponovno je raspisano u decembru 2018. godine i isto je u toku.
- U 2019. godini, nakon okončanja procedure javnih nabavki, planiran je početak izvođenja radova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 4.760,00 €.

8.12. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Osnovne škole u Rožajama



Status projekta: U toku

- Opština Rožaje sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2018. godini planirana je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.



8.13. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

Status projekta: U toku

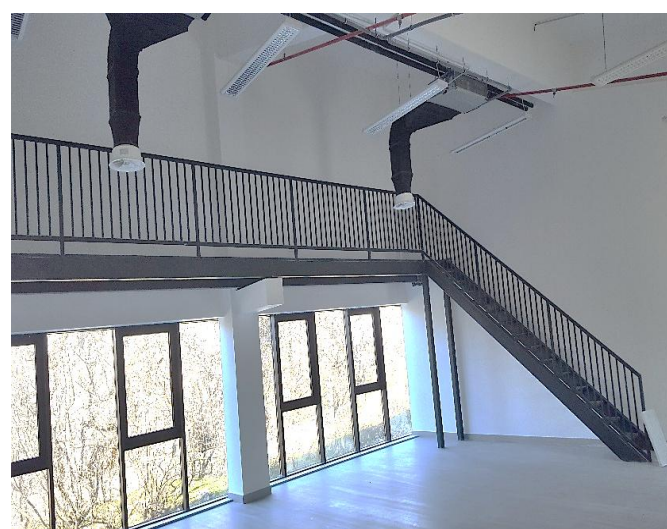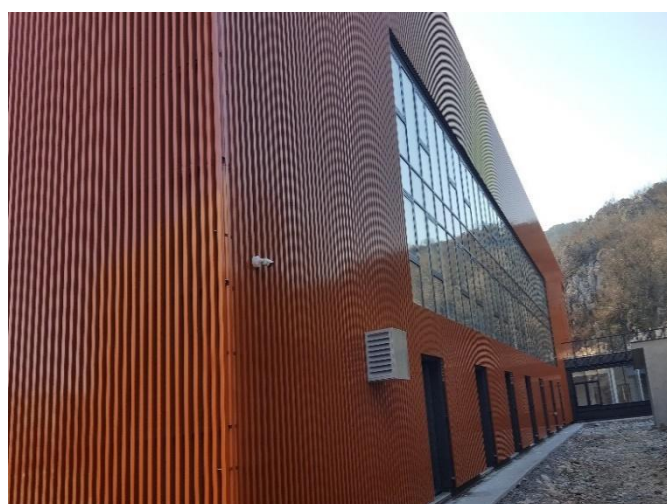


- Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet


likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok, ukupne bruto površine 4.980 m². Objekat zajedničkih kulturnih sadržaja je bruto površine 1.010 m² i obuhvata sljedeće: izložbene i multimedijalne prostore, knjižaru i administrativni blok sa pratećim sadržajima. Podzemna garaža je bruto površine 3.970 m², kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže je i energetske blok sa tehničkim prostorijama. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine, a nakon izgradnje infrastrukturnih priključaka stvorili su se uslovi za pokretanje procedure pribavljanja upotrebne dozvole.
- Direkcija javnih radova je, nakon završetka procedure javnog nadmetanja u aprilu 2015. godine potpisala Ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa. Navedeni radovi su završeni u 2017. godini i u narednom periodu planirane su aktivnosti na tehničkom prijemu objekta.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, kao sljedeća faza realizacije projekta planirana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Nakon završene procedure javnog nadmetanja Direkcija javnih radova je početkom oktobra 2015. godine potpisala Ugovor o građenju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti.
- Projektovana bruto površina objekta iznosi cca 5.100 m². Objekat je razuđene osnove različite spratnosti i sastoji se od prizemlja, jednog i dva sprata. Jedan dio objekta se zadržava kao revitalizovano nasljeđe industrijske arhitekture nekadašnjeg „Oboda”, dok ostalo predstavlja novoizgrađenu strukturu. Objekat je predviđen za održavanje nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, dizajna i fotografije. Krajem 2017. godine završeni su radovi na izgradnji Fakulteta likovnih umjetnosti.
- U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, raspisano je javno nadmetanje za opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena. U toku je vrednovanje ponuda.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

8.14. Rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju

Status projekta: U toku

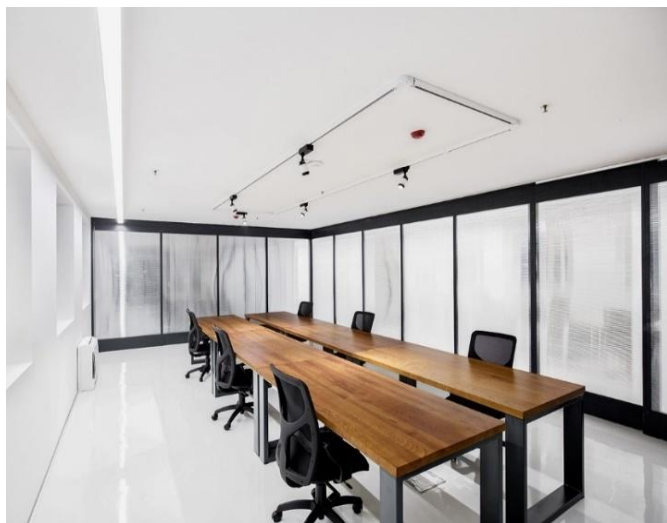

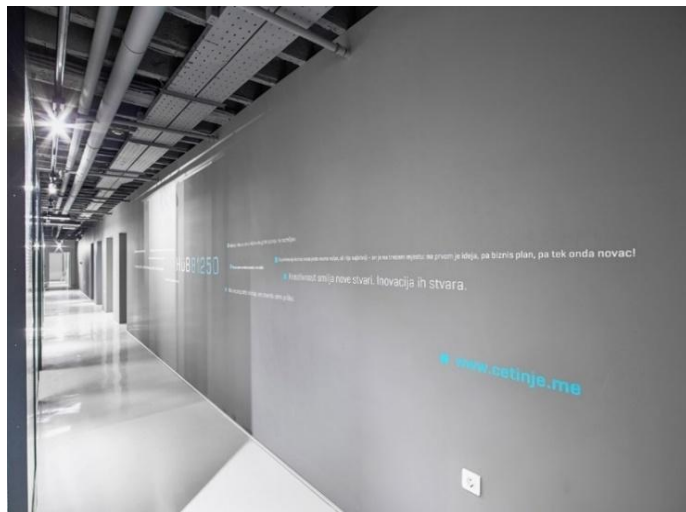

- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na izvođenju radova III faze rekonstrukcije i adaptacije objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju i isti su završeni.
- Prijestonica Cetinje je sprovodila sve aktivnosti na realizaciji projekta Komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, Cetinje u skladu sa Protokolom potpisanim 05.02.2018.godine
- Svi radovi na sanaciji objekta su završeni.
- U 2018.godini realizovano je 357.146,92 €.

8.15. Izgradnja sale za Osnovnu školu »Lovčenski partizanski odred« na Cetinju

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je 19.06.2018. godine potpisala Protokol sa Prijesticom
- Kapitalnim budžetom za 2018.godinu za Izradu projektne dokumentacije opredijeljeno je 10.000,00 €. Upućen je zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma za sprovođenje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

8.16. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Osnovne škole u Karabuškom polju u gradskoj opštini Tuzi


Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- U 2017. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane korisnika.
- Nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za Osnovnu školu u Karabuškom polju, Gradska Opština Tuzi, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

9.1. Ski centar „Kolašin 1600“ U Kolašinu

Status projekta: U toku

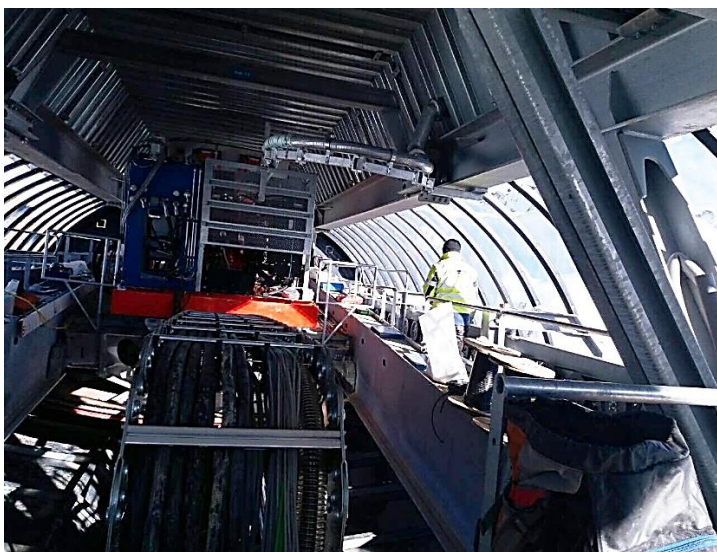

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 4 km ski staza i nabavka neophodne mehanizacije i opreme.
- Planirani rok završetka I faze je prva polovina 2019. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza (izgradnja akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje). Planirani rok završetka II faze je u 2020. godini.
- U 2018 godini planiran je završetak izgradnje puta Ski- rizort 1450- Ski- rizort 1600 sa parkingom za dnevne skijaše, završetak izgradnje žičare sa 4 km staza, završetak radova na vodosnadbijevanju bazne stanice, kao i nabavka neophodne mehanizacije.

Trafostanica 35/10 kV „Jezerine“

Status projekta: Završeno

- Projekat je realizovan po sistemu »Projektuj i izgradi«
- Svi radovi na projektu su završeni i izdata je upotrebna dozvola.. Vrijednost investicije iznosi cca 1.693.846,81€.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 7.860,06 €.

Bazna stanica

Status projekta: Završeno

- Projekat se realizuje u dvije faze.
- Završeno je izvođenje radova I i II faze radova na objektu.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.218.322,17 €.



Rekonstrukcija puta od ski centra »Kolašin 1450« do ski centra »Kolašin 1600«

Status projekta: U toku

- Završena je I faza radova koja se odnosila na zemljane radove, betonske i radove na odvodnjavanju trupa puta dužine 1.2km. Vrijednost radova I faze iznosi 777.385,73€.
- U 2016.godini ugovoreni su radovi II faze koji se odnose na zemljane radove, betonske i radove na odvodnjavanju trupa puta dužine 0.9km, kao i izgradnju gornjeg stroja i saobraćajne opreme i signalizacije za cjelokupnu saobraćajnicu.
- Radovi su započeti 2017.godine i isti su obustavljeni zbog zimskog perioda.
- U 2018. Godini nastavilo se sa izvođenjem radova , osim početnih 250m koji se povezuje na regionalni put Jezerine-Lubnice-Berane, čija je izgradnja u toku, a realizuje se preko Direkcije za saobraćaj. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa Direkcija za saobraćaj je izvršila pomjeranje projektovane trase saobraćajnice Berane-Lubnica, što je uslovalo da Direkcija javnih radova izvrši promjene dijela trase u zoni spajanja saobraćajnica. Sve ove promjene zahtijevaju i izmještanje četiri stuba dalekovoda što je obaveza CEDIS-a. Završena je izrada dopune projektne dokumentacije i CEDIS je sa premještanjem stubova otpočeo 07.08.2018.godine, a završio je u drugoj polovini septembra, nakon čega su stvoreni uslovi za izvođenje radova na ovom dijelu trase i za njihov završetak je potrebno dva mjeseca. Zbog pomjeranja projektovane trase, javila se potreba za izradom potpornih zidova.
- U 2018. godini raspisan je tender za I fazu izrade potpornih zidova procijenjene vrijednosti 450.000,00 € I vrednovanje ponuda je u toku.
- Radovi su trenutno obustavljeni zbog loših vremenskih uslova i biće nastavljani u 2019.godini
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.046.810,77 €



Izgradnja parking za dnevne skijaše sa kompletnom infrastrukturom uz Baznu stanicu

Status projekta: U toku

- U 2018.godini ugovoreni radova na izgradnji parking za dnevne skijaše su završeni.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 592.491,86€.

Izgradnja žičare- šestosjed K8/D6C

Status projekta: U toku

- Izgradnju žičare šestosjeda K8/D6C se realizuje po sistemu „Projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mm-Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom Glavnog projekta i izgradnju žičare, Glavnog projekta i izgradnju staza u dužini od 4 km i Glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i Glavnog projekta osnježavanja staza.
- Ugovorena vrijednost iznosi 8.979.740 €.
- Radovi na izgradnji žičare su završeni. Preostalo je funkcionalno ispitivanje u trajanju od 30 dana.
- U 2018.godini je realizovana su sredstva u iznosu od 1.288.188,79 €



Vodosnadbijevanje

Status projekta: U toku


- Radovi na izgradnji sistema vodosnadbijevanja bazne stanice izvodili su se dok su to dozvoljavali meteorološki uslovi. Većina radova je završena i obezbijđeno je vodosnadbijevanje bazne stanice. Preostali radova će se nastaviti u 2019.godini čim vremenski uslovi to budu dozvoljavali.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 76.925,38 €

Nabavka mehanizacije

- U 2018. godini potpisan je ugovor za nabavku mehanizacije. Isporučeni su jedan ratrak i dvoje motornih sanki.
- Ugovorena vrijednost iznosi 896.852,00 €.
- U 2018. godini, u skladu sa Zaključkom Vlade, realizovana su sredstva u iznosu od 448.426,00 €

9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

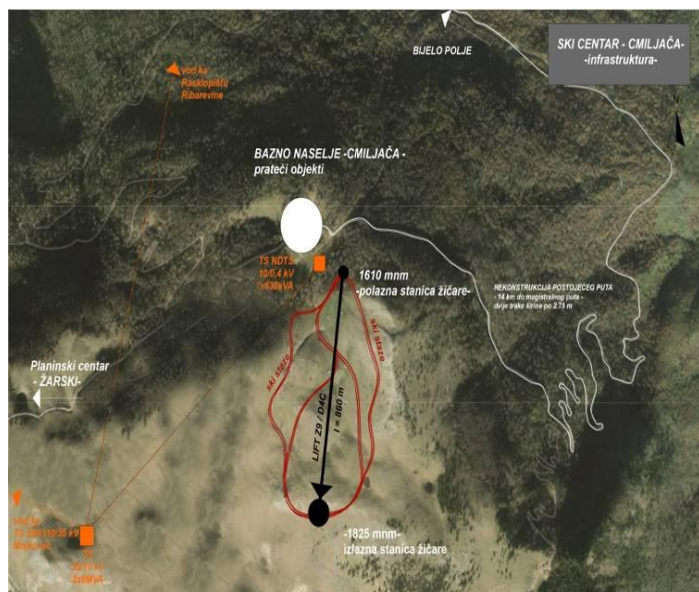

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Planirani rok završetka I faze je 2020. godina.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- Planirani rok završetka II faze je u 2022. godini.
- U 2018. godini planiran je završetak izgradnje dionice puta Ravna rijeka-Jasikovac sa jednim slojem asfaltnog zastora, probij puta od Jasikovca do Cmiljače. Raspisivanje javnog nadmetanja za izgradnju bazne stanice po principu "Projektuj i izgradi" sa početkom radova, izvođenje radova na primarnoj elektroenergetskoj infrastrukturi, izgradnje žičare po principu "Projektuj i izgradi", izvođenje radova na vodosnabdijevanju bazne stanice

I FAZA IZGRADNJE SKI CENTRA »CMILJAČA«

PUTNA INFRASTRUKTURA

Saobraćajnica Ravna Rijeka – Jasikovac –Cmiljača dužine 15.5 km

Projekat se realizuje po dionicama i fazno.

Dionica Ravna Rijeka – Jasikovac 5.5km

Status projekta: U toku

- Završeno je izvođenje radova na dionici Latinska Kosa-Jasikovac u dužini od 4.8km sa jednim slojem asfaltnog zastora,osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko pravni problemi u dužini od 350m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija. Vrijednost radova iznosi 735.174,83 €.
- Završeno je izvođenje radova na dionici puta Ravna rijeka - Latinska kosa u dužini 0.7km koji su se odnosili na izgradnji mosta na rijeci Ljubovidi sa prilaznim saobraćajnicama. Vrijednost izvedenih radova iznosi 782.000€.

- U 2018.godini planirana je sanacija klizišta na lokalitetu Latinska Kosa, procijenjene vrijednosti 180.000€. Na prvom tenderu nije bilo ponuda. Na drugom tenderu je izabran izvođača radova. U toku je procedura potpisivanja ugovora. Vrijednost najpovoljnije ponude iznosi 159.009,74 €
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 341.681,99 €.

Saobraćajnica Jasikovac-Cmiljača dužine 10 km

Status projekta: U toku

- U 2018. Godine započeti su radovi I i II faze ukupne dužine 5km koji se odnose na izvođenje zemljanih, betonskih i radova na odvodnjavanju trupa puta. Ugovorena vrijednost iznosi 2.907.046 €. Radovi su se u 2018.godini izvodili dok su to dozvoljavali vremenski uslovi. Gradilišta su trenutno konzervirana. Očekivani završetak radova je u drugoj polovini 2019.godine.
- Potpisan je ugovor za izvođenje radova III faze na preostalom dijelu saobraćajnice u dužini od 5km do Cmiljače.
- Ugovorena vrijednost iznosi 1.543.162,00 €.

Bazna stanica na lokalitetu Cmiljača

- Nakon što se stvore planski preduslovi za realizaciju projekta biće raspisano javno nadmetanje za izgradnju po principu “Projektuj i izgradi” objekta površine cca 800m². Procijenjena vrijednost iznosi 1.100.000€. Opština Bijelo Polje završila je izradu Programa privremenih objekata.
- Period realizacije je 2018.-2019.godina.

Primarna elektroenergetska infrastruktura - TS 35/10 “Cmiljača”

- Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 35kV za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“. Ugovorena vrijednost iznosi 880.982,11€. U toku su aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole.
- Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“– opremanje čelije 35kv “Ribarevina”. Ugovorena vrijednost iznosi 19.995,25€. Čeka se saglasnost CEDIS-a i Elektroprenosnog sistema CG.
- U 2018. godini ponovno je raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji elektorenergetske infrastrukture TS35/10. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.200.000,00 €
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 67.946,10€.

Vodozahvat

- Završena je izrada Hidrotehničke studije izvodljivosti i Glavni projekat vodosnabdijevanja bazne stanice. U 2018.godini je raspisan tender za izvođenje radova I isti je u toku. Procijenjena vrijednost iznosi 1.200.000€.
- Planirani završetak radova je 2019.godina.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 9.545,42

Nabavka žičare šestosjeda Z7

- Potpisan je ugovor za realizaciju projekta po principu “Projektuj-izgradi”. Vrijednost ugovora iznosi 7.988.888,88€.
- Završena je izrada Idejnog projekta I u toku je procedura za izbor revidenta.,
- Rok za završetak Idejnog projekta je 3 mjeseca od prihvatanja Idejnog rješenja.
- Rok završetka Glavnog projekta je 3 mjeseca od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja Komisije za reviziju Idejnog projekta.
- Raspisan je I tender za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom žičare I 3 km staza.
- Rok za izvođenje radova na izgradnji žičare i 3 km ski staza je 9 mjeseci od dana pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 879.924,10 €

9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2020. godine. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- Planirani rok završetka II faze je u 2022. godini.
- U 2018.godini planirano je izvođenje radova na putu Vragodo-Žarski katun, raspisivanje tendera za izvođenje radova na putu Mojkovac-Vragodo, završetak Idejnog projekta za izgradnju mosta na rijeci Tari i raspisivanje tendera po principu »projektuj i izgradi« za izgradnju mosta, raspisivanje tendera po principu »projektuj i izgradi« za izgradnju bazne stanice, raspisivanje tendera po principu »projektuj i izgradi« za izgradnju žičare i izradu Studje za vodosnabdijevanje ski centra.

I FAZA IZGRADNJE SKI CENTRA »ŽARSKI«

PUTNA INFRASTRUKTURA

Lokalni put Vragodo-Vrioca-Žarski katun 5.3km

Status projekta: U toku

- Projekat rekonstrukcije lokalnog puta Vragodo-Vrioca-Žarski katun realizuje se fazno.
- U 2015. godini završen je i revidovan Glavni projekat rekonstrukcije putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katunu dužini 5,3 km.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze
- U 2017. godini ugovoreni su radovi I faze koji se odnose na izvođenje zemljanih, betonskih i radova na odvodnjavanju trupa puta, a ugovorena vrijednost iznosi 1.132.133,88 €.
- Radovi su započeti 2017.godine.
- U 2018.godini raspisano je javno nadmetanje i ugovoreni su radovi II faze za preostale radove. Ugovorena vrijednost iznosi 1.878.449€. Za vrijeme izvođenja radova došlo je do pojave klizišta pa je trenutno u toku pregovarački postupak za dodatnu nabavku izvođenja radova na izgradnji potpornih zidova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 217.173,98 €.



Regionalni put Mojkovac-Vragodo-Lubnica (do granice sa opštinom Berane) 8.5km

Status projekta: U toku

- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije putnog pravca Regionalni put Mojkovac-Vragodo- Lubnica je završena i predata na reviziju. U međuvremenu je došlo do promjene trase puta na jednom dijelu I zbog toga se mora izvršiti izmjena projektne dokumentacije.
- Izmjenama projektne dokumentacije, kao i aktivnostima na realizaciji projekta nakon usvajanja projektne dokumentacije, koordiniraće Direkcija za saobraćaj.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 8.600,00 €

Most na rijeci Tari-povezivanje regionalnog sa magistralnim putem, cca L=220m

- U toku je izrada Idejnog projekta mosta na rijeci Tare sa povezivanjem magistralnog puta sa regionalnim. Vrijednost projekta iznosi 34.510€, a svim aktivnostima koordinira Direkcija za saobraćaj.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Bazna stanica

Status projekta: U toku

- Opština Mojkovac je izradila program privremenih objekata nakon čega će Direkcija javnih radova raspisati tender za izgradnju bazne stanice po principu Projektuj-Izgradi. Procijenjena vrijednost iznosi 1.500.000€. U toku je izrada Programa privremenih objekata od strane Opštine Mojkovac.
- Planirani period realizacije 2018.-2020.godina.

Primarna elektroenergetska infrastruktura

Status projekta: U toku

- Primarna elektroenergetska infrastruktura je u sklopu izgradnje ski centra Cmiljača.
- Sekundarna elektroenergetska infrastruktura se planira prilikom izgradnje Bazne stanice i žičare.

Vodozahvat

Status projekta: U toku

- Raspisan je tender za izradu Hidrotehničke studije izvodljivosti, procijenjene vrijednosti 40.000,00 € i procedura je u toku.
- Planirani rok završetka radova na izgradnji je 2019.godina.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka žičare šestosjeda

Status projekta: U toku

- U 2018. godini raspisan je tender za izgradnju žičare po principu „Projektuj i izgradi“ sa devet kilometara ski staza, a izgradnja je planirana za period 2019.-2020.godina..
- Procijenjena vrijednost iznosi 9.000.000 €.

9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Period realizacije je 2014. - 2023. godina. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih rješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekata, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra "Hajla", kao i nastavak izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta Rožaje – Štedin (7 km).

Planska dokumentacija

- U 2016. godini, shodno zaključku Vlade Crne Gore br. 08-3353 od 28. decembar 2016. godine, realizovan je prenos preostalih sredstava Opštini Rožaje za izradu Lokalne studije lokacije u iznosu od 549.118,88 €.
- Izradu planske dokumentacije sprovodi Opština Rožaje što je i preduslov za dalje aktivnosti na izgradnji ski centra.
- U 2017. godini Opština Rožaje je sprovela aktivnosti na izradi studije lokacije i ista je predata Ministarstvu održivog razvoja i turizma na usvajanje.
- U 2018. godini Studija lokacije za lokalitet Hajla je završena. Skupština opštine Rožaje usvojila je studiju lokacije na osnovu koje će preduzeće »Skijališta Crne Gore« pripremiti Projektni zadatak.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

Putna infrastruktura

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta rekonstrukcije putnog pravca Rožaje- Štedin realizuje se fazno.
- U 2014. godini završena je izrada Glavnog projekata rekonstrukcije putnog pravca Rožaje – Štedin u dužini 7,3km.
- U 2015. godini započeti su radovi na izgradnji I faze u dužini 850 m, uključujući sve pozicije radova, osim ugradnje habajućeg - završnog asfaltnog sloja.
- U 2016. godini nastavljeni su radovi I faze na izgradnji puta Rožaje- Štedim i isti su završeni. Takođe, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova II faze u dužini 2,2 km (zemljani radovi, odvodnjavanje i armirano-betonski zidovi). Potpisan je Ugovor o izvođenju radova, ali usled nepovoljnih vremenskih uslova Izvođač nije uveden u posao.
- U 2017. godini su otpočeli radovi II faze na izgradnji puta Rožaje –Štedin, odnosno proboja puta u dužini od 2,3km. Radovi su zbog loših vremenskih uslova obustavljeni i isti su odloženi za 2018. godinu.
- U 2018. godini nastavljeni su radovi II faze na izgradnji puta Rožaje –Štedim i radovi su u završnoj fazi. Ugovorena vrijednost iznosi 405.622,10€.
- Takođe, u 2018. godini sprovedena su javne nabavke za radove III I IV faze izgradnje putnog pravca Rožaje-Štedim. Nakon postupka javne nabavke, potpisani su ugovori sa kompanijom „Tofi“ iz Rožaja i radovi su zpočeti.
- Gradilišta su trenutno konzervirana zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.487.492,29 €



9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor na Žabljaku

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta Ski centra na lokalitetu "Savin kuk" na Žabljaku planirana je u periodu 2016-2021. godina. Realizacijom je obuhvaćena izrada studija, izrada i revizija Glavnih projekata i izvođenje radova.

Izgradnja ski staza dužine cca 1.5 km

Status projekta: U toku

- Projekat se realizuje po principu "Projektuj i izgradi". Vrijednost ugovora iznosi 142.681,00 €.
- Za početak izrade projektne dokumentacije bila je neophodna saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine obzirom da staze prolaze kroz II i III zonu zaštite Nacionalnih parkova.
- Nakon dobijanja saglasnosti za geodetsko snimanje u II i III zoni urađen je Glavni projekat.
- U toku su aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalnih parkova na promjeni granica zona zaštite kako bi se mogla izdati građevinska dozvola nakon čega će se pristupiti izvođenju radova na izgradnji predmetnih ski staza.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju cca 21 km staza

Status projekta: U toku

- U 2018. godini, nakon rješavanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, potpisan je ugovor u vrijednosti od 82.586,00€. U toku su aktivnosti na izradi Glavnog projekta.
- Planirani rok završetka je početak 2019. godine.

Izgradnja puta dužine 1.5km

Status projekta: Završeno

- Opština je obezbijedila projektну dokumentaciju u skladu sa Nacrtom Planske dokumentacije na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje.
- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova, ugovorena vrijednost iznosi 319.989,93 € i svi radovi su završeni.
- U 2018. godini je realizovano 223.988,14 €

Izgradnja parkinga za dnevne skijaše

Status projekta: Završeno


- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za modernizaciju postojećeg parkinga na lokalitetu Savin Kuk, izabran je izvođač radova i potpisan ugovor.
- Završeni su radovi na modernizaciji postojećeg parkinga za dnevne skijaše.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 98.931,85 €



Rekonstrukcija prilazne saobraćajnice dužine 5 km (Saobraćajnica Usjek-Motički gaj)

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji prilazne saobraćajnice.
- U 2018. godini izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice Usjek-Motički gaj je završena.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 19.540,00 €

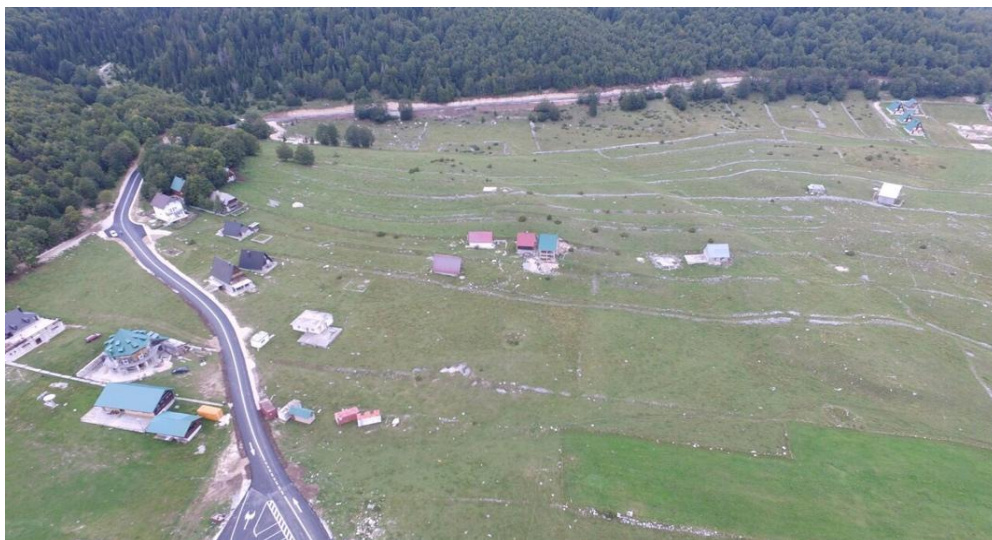


Izrada projektne dokumentacije za izgradnju “Suvog boba”

- Projektom koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U toku 2018.godine izrađena je projektna dokumentacija I u toku je revizija iste.
- Vrijednost ugovora iznosi 19.200,00 €.

Vodosnabdijevanje ski centra

Status projekta: U toku

- Ovim projektom planirano je izvođenje radova I faze na rekonstrukciji gradske vodovodne mreže, izgradnja akumulacionog jezera na lokalitetu Savin kuk i dovođenje vode sa Modrog jezera do akumulacionog jezera.
- Potpisan je Donatorski ugovor između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije (CMSR) u iznosu od 3.200.000€ kojim su definisana donatorska sredstva u iznosu do 900.000€.
- U 2018.godini isplaćen je avans u iznosu od 992.389€ i 60.120€ opštini Žabljak za eksproprijaciju zemljišta.
- U toku je izvođenje radova. Planirani rok završetka je 2019.godine.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.621.230,99 €

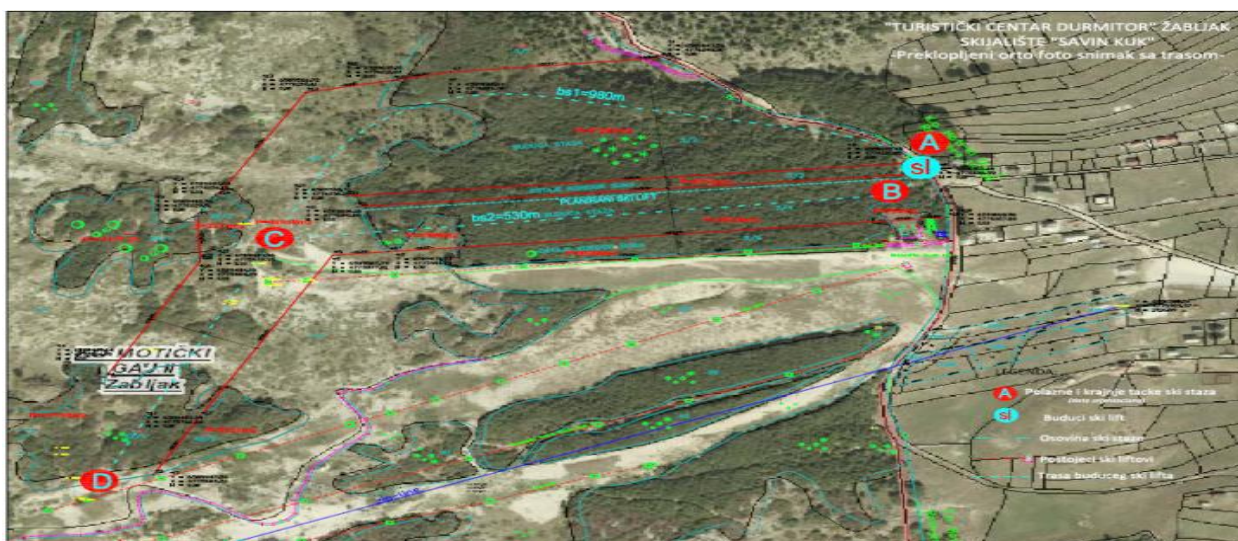

Nabavka žičare sa izgradnjom ski staza

Status projekta: U toku

- U 2017. raspisano je javno nadmetanje za Izradu Glavnog projekta i nabavku i ugradnju žičare i izvođenje radova na izgradnji 4km ski staza.
- U 2018.godini potpisan je ugovor za nabavku žičare sa izgradnjom 4 km ski staza po sistemu “Projektuj i izgradi”.
- Ugovorena vrijednost iznosi 8.788.888,88 €. U toku je izrada Glavnog projekta.
- U toku je procedura izbora revidenta projektne dokumentacije.
- Planirani završetak je u 2019.godini.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 675.482,50 €

Elektroenergetska infrastruktura

Status projekta: U toku

- U 2018.godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće elektroenergetske infrastrukture za ski centar. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 100.000€.
- Održan je sastanak sa CEDIS-om u cilju pripreme tendera za izradu projektne dokumentacije. Nakon završetka izrade projektne dokumentacije biće raspisan tender za izvođenje radova.
- U toku je usaglašavanje planske i projektne dokumentacije, kao I Projektnog zadatka sa CEDIS-om.

Osnježavanje ski staza

Status projekta: U toku

- U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izvođenje radova po principu Projektuj – Izgradi..
- Procijenjena vrijednost iznosi 1.200.000 €.

9.6. Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na izradi i reviziji planske, tehničke i projektne dokumentacije kao i izvođenje radova za objekte od javnog i opšteg interesa i objekata i infrastrukture za potrebe unapređenja turističke ponude, na projektima Venecijansko bijenale, Suvi bob na Žabljaku, Prethodna studija izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore-Virpazar, Žičara Kotor-Cetinje, Panoramske rute, Nabavka dva voza na električni pogon za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero, Revitalizacija Žugića luke u NP Durmitor, Modernizacija lokalnih puteva – put za Pržište, Izgradnja parkinga prema Crnom jezeru, Izmještanje puta prema Tepcima.
- U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekata.
- U 2018. godini je realizovana su sredstva u iznosu od 269.042,46 €

9.6.1. Izgradnja mosta od parkinga do hotela Durmitor do rampe za ulazak u Crno jezero

Status projekta: U toku

- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe za ulazak u Crno jezero .
- U aprilu 2018. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova i Izvođač radova je uveden u posao. Radovi su obustavljeni zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i zbog turističke sezone. . U toku je usklađivanje projektne dokumentacije.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

9.6.2. Izmještanje puta za Tepca

Status projekta: U toku

- U 2017. godini je, na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila opština Žabljak, raspisano javno nadmetanje, izabran izvođač radova i potpisan ugovor. Radovi su odloženi zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018. godini završeni su svi zemljani radovi, a trenutno je gradilište konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

9.6.3. Postavljanje turističke signalizacije na panoramskoj ruti “Durmitorski prsten” koja zahvata teritoriju opština Plužine i Žabljak

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- Nakon sprovedene procedure javnog nadmetanja sklopljen je ugovor za radove na postavljanju turističke signalizacije na panoramskoj ruti “Durmitorski prsten” i radovi su završeni.
- U toku je tender za izbor izvođača radova za postavljanje turističke signalizacije na Panoramskim rutama “Kruna Crne Gore” i “More i visine”, kao i rutama koje ih povezuju. Procijenjena vrijednost iznosi 230.000€.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 19.933,50 €

9.6.4. Izrada projektne dokumentacije za uređenje lokacija-objekata na panoramskoj ruti »Durmitorski prsten« u opštini Žabljak

Status projekta: U toku

- Realizaciju projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je naručilo izradu projektne dokumentacije I istu dostavilo Direkciji javnih radova u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za izvođenje radova. Kako dostavljena dokumentacija nije bila revidovana, pokrenut je postupak za izbor revidenta iste po kojem nije bilo prispjelih ponuda.
- Aktivnosti će se nastaviti u 2019.godini.

9.6.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Suvog boba na Žabljaku

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju suvog boba na Žabljaku na lokalitetu Savin Kuk.
- U 2017. godini započeta je izrada projektne dokumentacije
- U 2018.godini urađeno je idejno rješenje na koje su "Skijališta Crne Gore" dala saglasnost. U skladu sa idejnim rješenjem nastavljene su aktivnosti na izradi Glavnog projekta. Iste je izrađen i u toku je revizija.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

9.6.6. Izgradnja centra za posjetioce u opštini Žabljak

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova potpisala je 09.05.2018.godine Protokol sa JP Nacionalni parkovi Crne Gore kojim je Direkcija javnih radova u obavezi da odredi obrađivača projektne dokumentacije za Izgradnju centra za posjetioce.
- Od Nacionalnih parkova obaviješteni smo da se od realizacije projekta odustalo usled nedostatka odgovarajućeg zemljišta..
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

9.6.7. Park prirode u Šavniku

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- Direkcija javnih radova je 10.05.2018. potpisala Protokol sa opštinom Šavnik kojim je definisano da opština Šavnik u skladu sa zakonskom regulativom realizuje izradu projektne dokumentacije I izvođenje radova na izgradnji objekta Park prirode u Šavniku.
- U 2018. sprovedena je procedura odabira obrađivača projektne dokumentacije i ista je završena.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.6.8. Izrada planske dokumentacije u opštini Petnjica

Status projekta: U toku

- Opština Petnjica je, u skladu sa zakonskom procedurom, odabrala obrađivača planske dokumentacije I zaključila ugovor u vrijednosti od 78.540,00 €. Opština Petnjica izvršila je isplatu obrađivaču planske dokumentacije u iznosu od 25 % ugovorene vrijednosti.
- Direkcija javnih radova potpisala je 15. Marta 2018.godine Protokol sa opštinom Petnjica kojim je definisano opština Petnjica sprovede postupak izrade planske dokumentacije u skladu sa potpisanim Protokolom, U 2018.godini nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta i izrada planske dokumentacije je u završnoj fazi..
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 35.343,00 €.

9.6.9. Ali-Pašini izvori u Gusinju

Status projekta: Nijesu sprovedene aktivnosti

- U 2018. godini nisu stvoreni administrativni uslovi za početak aktivnosti na projektu.
- Prostor Ali pašinih izvora prepoznat je kao područje koje se predlaže za zaštićeno prirodno dobro te je neophodno izraditi Studiju zaštite.
- Nakon izrade studije zaštite, potrebno je da opština Plav dostavi Projektni zadatak i urbanističko- tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

9.6.10. Glavni projekat ZOO vrta sa CITIES centrom

Status projekta: U toku

- Planirana je izgradnja Centra za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja u svrhu zaštite rijetkih i ugroženih vrsta. Izgradnja je planirana u okviru DUP-a "Desna obala Lima" Izmjene i dopune, KO Donje Luge. Zoološki vrt je planiran na zelenoj površini cca 4,3 ha (bez prilazne saobraćajnice i priobalnog zaštitnog zelenila), u priobalnom dijelu zahvata Plana i na taj način izolovan od gradske buke, magistralne saobraćajnice, industrije.
- Kapacitet novoprojektovanog objekta zoo-vrta sa CITES centrom planiran je na osnovu trenutno dostupnih podataka o broju divljih životinja u zatočeništvu u Crnoj Gori, a to je cca. 140 životinja i približno 40 životinjskih vrsta
- Realizacija projekta planirana je fazno i to u I fazi planirana je izgradnja CITES centra sa prostorijama za zaposlene i u II fazi izgradnja ZOO vrta.
- Ukupna planirana površina kaveza za životinje je oko 4.000 m², od čega oko 300 m² zatvorenog prostora.
- U 2018. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije i u toku je izrada Idejnog rješenja.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.6.11. Prethodna studija izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore- Virpazar

Status projekta: Završeno

- U cilju valorizacije turističke ponude Crne Gore u 2017. godini ugovorena je izrada Prethodne studije izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore-Virpazar
- U 2018. godini Studija je završena i prihvaćena od strane recezenta.
- U 2018.godini realizovano je 2.495,00€.

9.6.12. Nabavka vozila (dva turistička voza) za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo- Biogradsko jezero

Status projekta: U toku


- U 2018.godini sproveden je otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dva turistička vozila za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo- Biogradsko jezero.
- Ugovor o javnoj nabavci zaključen je u julu 2018.godine, a ukupna vrijednost nabavke iznosi 549.757,78 €
- U 2018. Godini završena je izrada čelične konstrukcije voza, a u toku je montaža i završno bojenje.

- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 384.830,44 €



9.7. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

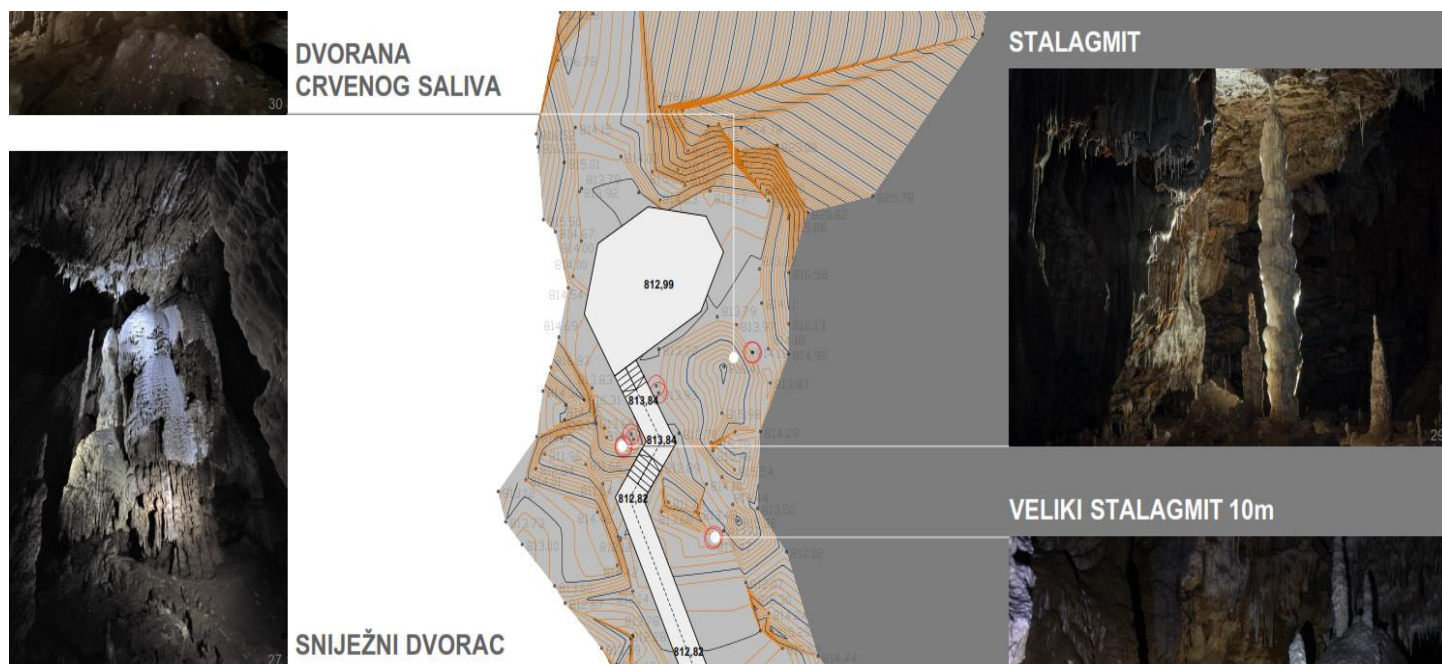

- Realizacija projekta “Valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju” planirana je u periodu 2015-2020. godina. Realizacijom je obuhvaćena izrada studija, raspisivanje konkursa, izrada i revizija Glavnih projekata i izvođenje radova.
- Završena je izrada prethodne Studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnim rješenjem uređenja dijela pećine i infrastrukturom do Đalovića pećine.
- Vrijednost Studije iznosi 110.000

Pristupni put Bistrica-Manastir “Podvrh”

Status projekta: U toku

- Projekat rekonstrukcije pristupnog puta Bistrica- Manastir Podvrh realizuje se fazno.
- Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova I faze, u dužini od 1.5km. Ugovorena vrijednost iznosi 673.323,06 €. Nakon pribavljanja građevinske dozvole izvođač je uveden je u posao 13.08.2018.godine.
- Radovi se izvode ugovorenim dinamikom. Završeno je preko 90% ugovorenih radova, a trenutno je gradilište konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- Ugovoreni su i radovi II faze u dužini od 4km sa rokom od 7 mjeseci, ugovorena vrijednost iznosi 2.579.858,13 €. Izvođač je uveden je u posao 10.09.2018.godine. Gotovo cijela trasa je iskrčena I probijena.. Trenutno je gradilište konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- Planirana realizacija projekta je 2018.-2019.godina.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od b 1.073.785,38 €



Pješačka staza

Status projekta: U toku

- Potpisan je Ugovor sa obrađivačem Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu kroz Đalovića klisuru od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad "Vražjim firovima". U toku je izrada Idejnog rješenja.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 8.817,90 €

Elektroenergetska infrastruktura

Status projekta: U toku

- Završena je izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine –Opremanje 35kV ćelije u TS 35/10kV "Nedakusi". Raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova. Procijenjena vrijednost je 35.000 €. U toku je tenderska procedura.
- Završena je revizija Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Trafostanica 35/10kV "Bistrica", vrijednost ugovora iznosi 10.585,05€.
- Završena je izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine –Dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica«. €. Raspisano je javno nadmetanje za radove I procedura je u toku.
- Planirani period relizacije je 2018.-2019.godina.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 28.285,05 €

Žičara

Status projekta: U toku

- Potpisan je ugovor za izgradnju žičare (gondola) dužine cca 1.700m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "Projektuj i izgradi". Izvođač radova je »Novi volvox« d.o.o Podgorica. Vrijednost ugovora iznosi 3.888.888,88 €. Rok za završetak Idejnog rješenja je 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora a rok za završetak Idejnog projekta je 3 mjeseca od prihvatanja Idejnog rješenja, rok završetka Glavnog projekta je 3 mjeseca od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja Komisije za reviziju Idejnog projekta,rok za izvođenje radova na izgradnji žičare i 3 km ski staza je 9 mjeseci od dana pribavljanja građevinske dozvole.
- U toku je revizija Idejnog projekta.
- Planirani period relizacije je 2018.-2019.godina.
- U 2018.godini realizovana su sredstvs u iznosu od 343.458,50 €

Unutrašnjost pećine

Status projekta: U toku

- U toku je izrada Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti pećine sa objektima na ulaznom platou.
- Početak radova je uslovljen završetkom izgradnje žičare.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 54.450,00 €.

Vodosnabdijevanje

Status projekta: U toku

- U 2018.godini započeta je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno – servisnih objekata u okviru aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Vrijednost ugovora iznosi 34.848,00 €. Idejno rješenje je izrađeno I usvojeno, a u skladu sa istim nije moguće nastaviti sa izradom Glavnog projekta dok se ne izvede I ne ispita istržni bunar u zoni manastira Podvrh što je planirano u 2019.godini. Istražni bunar je potrebno izvesti ispitatui I na drugoj strani klisure, u zoni ulaza u pećinu, što će tehnološki biti moguće tek nakon izgradnje žičare I stvaranja uslova za transport opreme I ljudstva.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 10.454,00 €.

Infrastrukturni objekti za potrebe pećine u Manastiru Podvrh i MZ Bistrici

Status projekta: U toku

- Završen je Konkurs za izradu sveobuhvatnog urbanističko – arhitektonskog Idejnog rješenja Đalovića pećine i klisura u zahvatu prostorno – urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.
- U 2018.godini planirana je izrada projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost iznosi 70.000€. Nakon izrade projektne dokumentacije raspisaće se tender za izvođenje radova. Procijenjena vrijednost iznosi 800.000€.
- Period realizacije 2018.-2019.godina.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.8. “Kuća voća” u Andrijevici

Status projekta: U toku



- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je završilo aktivnosti na sprovođenju Konkursa za izbor Idejnog arhitektonskog rješenja i potpisalo Ugovor za izradu Glavnog projekta objekta „Kuća voća” u opštini Andrijevice.
- Obaveza Ministarstva poljoprivrede bilo je dostavljanje Elaborata tehnologije proizvodnje, koji predstavlja neophodan ulazni podatak za izradu Glavnog projekta.
- Objekat “Kuća voća” u Andrijevici nalazi se na parceli br.823/3 KO Andrijevice, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevici, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Krašnice i Bandovića mosta. Bruto površina objekta Kuće voća” u Andrijevici je 1.636,27 m² i sastojace se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i Izložbeno prodajnog prostora, caffe bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta i započelo se sa aktivnostima za raspisivanje javnog nadmetanje za najpovoljnijeg izvođača radova. U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor

najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji objekta "Kuće voća" i potpisan je ugovor. Zbog loših vremenskih uslova radovi nijesu otpočeli.

- U aprilu 2018.godine, nakon stvaranja povoljnih vremenskih uslova, radovi su otpočeli.
- Do sada su završeni zemljani radovi, radovi na izradi betonske konstrukcije i potpornih zidova objekta proizvodnog pogona i bunkera, administrativno-edukativnog bloka i izložbeno prodajnog prostora i pješačkog mosta, radovi na zidanju pregradnih zidova, radovi na izradi izolacije, drenaže i zatrpavanju ukopnih zidova, kao i radovi na izradi razvoda instalacija vodovoda i8 kanalizacije.
- Gradilište je trenutno konzervirano zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 505.307,92 €.

9.9. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, u martu je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta rekonstrukcije-konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom.
- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja moraju biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog Glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- U skladu sa ovim zaključkom pripremljena je tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule.
- U junu 2018. godine raspisano je javno nadmetanja za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta šireg području Kanli Kule.
- Javno nadmetanje je poništeno jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda. Isto će biti raspisano u 2019. Godini.
- Procijenjena vrijednost izrade Glavnog projekta iznosi 300.000,00 €.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.10. Nacionalni parkovi

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na projektima: izgradnja kampa za mobilne kuće u NP Lovćen, Rekonstrukcija putne infrastrukture u NP Biogradska gora, Valorizaciju Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor i drugih projekata u okviru NP, Izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor, Stavljanje u funkciju motela Radovan luka sa izgradnjom trafostanice u MZ Tepca, Prilazna staza restoranu Biogradska Gora.

9.10.1. Parking za mobilne kućice na Cetinju

Status projekta: U toku

- U prethodnom periodu je više puta raspisivano javno nadmetanje za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi" i ista su poništena s obzirom da nije bilo zainteresovanih ponuđača. Javno nadmetanje ponovno je raspisano u novembru 2018. godine i isto je u toku.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.10.2. Rekonstrukcija bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno istraživačkog centra u Plavu

Status projekta: U toku

- Nacionalni parkovi koordiniraju svim aktivnostima na realizaciji projekta u skladu sa Protokolom potpisanim 09.05.2018. godine.
- Od strane Nacionalnih parkova smo obaviješteni da je do kašnjenja u realizaciji projekta došlo usled neblagovremenog usvajanja amandmana na Plan javnih nabavki od strane upravnog odbora JPNPCG
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.10.3. Kontrolno naplatni punktovi u NP Prokletije u Plavu

Status projekta: U toku

- Nacionalni parkovi koordiniraju svim aktivnostima na realizaciji projekta u skladu sa Protokolom potpisanim 09.05.2018. godine
- Od Nacionalnih parkova obaviješteni smo da je došlo do kašnjenja u realizaciji obaveze usled neblagovremenog usvajanja amandmana Plana javnih nabavki od strane JPNPCG.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.10.4. Revitalizacija Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, opština Pljevlja

Status projekta: U toku

- U 2017. godini na tri raspisana javna nadmetanja za izvođenje radova za rekonstrukciju objekata Centra za rafting u postojećim gabaritima nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon četvrtog tendera potpisan je ugovor za izvođenje radova, ugovorena vrijednost iznosi 106.350€.
- Gradilište je konzervirano zbog zimske sezone.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.10.5. Rampa na ulazu u NP Crno jezero

Status projekta: U toku

- Nacionalni parkovi koordiniraju svim aktivnostima na realizaciji projekta u skladu sa Protokolom potpisanim 09.05.2018. godine
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava

9.10.6. NP Biogradska gora u opštini Mojkovac

Rekonstrukcija putne infrastrukture u NP Biogradska gora

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji armirano betonskih cjevastih propusta na putnom pravcu Biogradska Gora – Vranjak.
- U 2018. godini odabran je Izvođač i potpisan Ugovor, a radovi su završeni u oktobru.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 32.271,59 €.

Izgradnja prilazne staze do restorana Biogradska Gora

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova potpisala je 09.05.2018. godine protokol sa JP “Nacionalni parkovi Crne Gore” kojim je definisano da Nacionalni parkovi u skladu sa zakonskom regulativom raspišu javno nadmetanje i odaberu izvođača radova za izgradnju pristupne staze do restorana Biogradska gora I isti realizuju do kraja 2018.godine.
- Tenderska procedura je sprovedena i potpisan je Ugovor u vrijednosti od 54.335,27 €.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Vodovodna mreža Ganovača

Status projekta: U toku

- Nacionalni parkovi koordiniraju svim aktivnostima na realizaciji projekta u skladu sa Protokolom potpisanim 09.05.2018. godine.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Parking na Kraljevom kolu

Status projekta: U toku

- U 2018. godini sproveden je postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije izgradnje i uređenja parkinga na lokaciji Kraljevo kolo, zaključen Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta. U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja javnih toaleta

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova potpisala je 09.05.2018. godine protokol sa JP “Nacionalni parkovi Crne Gore” kojim je definisano da Nacionalni parkovi u skladu sa zakonskom regulativom na prioritetnim lokacijama realizuju izgradnju naplatnih punktova.
- Nakon sprovedenih tenderskih procedura, zaključeni su ugovori i obaveze po Protokolu su realizovane.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 22.775,00 €

Adaptacija objekta na Kraljevom kolu

Status projekta: U toku

- Projekat se realizuje u skladu sa Protokolom potpisanim 09.05.2018.godine
- Kapitalnim budžetom za 2018.godinu opredijeljeno je 20.000,00 € za izradu projektne dokumentacije.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

9.11. Izgradnja objekta nacionalne »Kuće maslina« sa sjedištem u Baru

Status projekta: U toku



- Objekt »Kuća maslina«, spratnosti S+P+1, je objekt proizvodnog, edukativnog, turističkog i komercijalnog karaktera.
- U 2017. godini nakon dostavljanja Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova i Projektnog zadatka od strane Ministarstva poljoprivrede, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja, u 2018. godini potpisan je ugovor o izradi Glavnog projekta i završena je izrada I revizija istog.
- Krajem 2018.godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta.
- U 2019. godini planiran je početak i završetak izgradnje objekta.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 9.711,50 €

9.12. Dom revolucije u Nikšiću- rekonstrukcija i adaptacija

Status projekta: Završeno




- Realizacijom projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovelo je proceduru raspisivanja Konkursa za Idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije objekta Dom revolucije u Nikšiću, nakon čega je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U septembru 2018. godine su završeni svi planirani radovi.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 801.523,90 €.

9.13. Izgradnja objekta za izložbeni proctor na Cetinju

Status projekta: U toku

- U prethodnom periodu Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije prostora namijenjenog za smještaj ikone.
- U maju 2016. godine dostavljen je revidovani Glavni projekat na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje i izabran najpovoljniji izvođač radova.
- U 2017. godini potpisan je ugovor i nakon pribavljanja građevinske dozvole, izvođač je uveden u posao i u toku su usaglašavanja projektne dokumentacije sa postojećim stanjem. Od strane izvođača radova urađen je elaborat sa detaljima obrade ulaza u pećinu, koji je predat Upravi za zaštitu kulturnih dobara na saglasnost.
- U 2018. godini planirano je nastavak radova nakon dobijanja saglasnosti na Elaborat pripremnih radova od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koja do kraja 2018.godine nije izdata.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

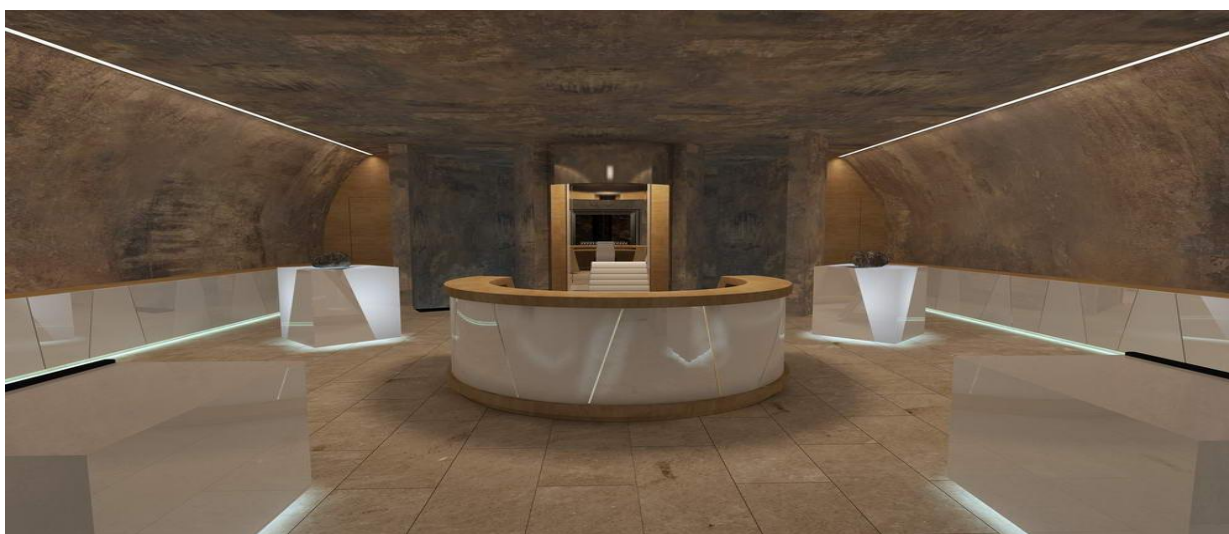

9.14. Izrada promotivnih sadržaja za unapređenje turističke ponude Prijestonice Cetinje

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje koordinira svim aktivnostima na realizaciji projekta na osnovu Protokola zaključenog 19.05.2018.godine.
- U cilju realizacije ovog projekta zaključena su tri Ugovora od kojih su dva realizovana u visini sredstava od po 7.741,00 € i 7.741,50 €. Vrijednost trećeg ugovora je 15.000,00 € i isti je u toku.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 14.883,00 €

PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

- U 2015. godini otpočela je realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj”, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture. Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12€, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja ovih sredstava za 2015. godinu
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od
- 2.511.412,49

10.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama- izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnadbijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018. godini, za finansiranje projekta obezbijedena su sredstva iz Kapitalnog budžeta.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.113.576,65 €.



Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane (PPOV Berane) – Lot 1 – FIDIC Žuta knjiga

Status projekta: U toku

- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2016. godine.
- U toku su radovi na izgradnji. Planiran rok završetka gradnje je prva polovina 2019. godine, nakon čega će uslijediti probni rad postrojenja.



Rekonstrukcija kanalizacione mreže u opštini Berane – Lot 2 – FIDIC Crvena knjiga

Status projekta: U toku



- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan 2016. godine. U toku su radovi na izgradnji. Planiran rok završetka izgradnje je prva polovina 2019. godine.
- Ugovor za reviziju Glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (Lot 1) i vršenje stručnog nadzora na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione mreže (Lot 2) potpisan je 2016. godine.

Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Beranama – FIDIC Crvena knjiga

Status projekta: U toku

- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, objekata na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2017. godine.
- U toku su radovi na izgradnji.
- Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova potpisan je 2017. godine.
- Planirani rok završetka radova je prva polovina 2019. godine.



10.2. Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju- izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2016. godini, potpisan je ugovor sa izvođačem radova po FIDIC Žutoj knjizi - "projektuj i izgradi". U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju, odabran izvođač radova i potpisan ugovor.



- U 2017. godini nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije i pribavljena građevinska dozvola izvođač je uveden u posao. Prilikom početka radova pojavio se problem dodatne količine otpada i nelegalno odloženih automobilskih guma. Nakon rješavanja navedenog problema od strane Prijestonice Cetinje, radovi su otpočeli i isti su u toku.
- U 2018. godini svi radovi su završeni i 18.06.2018.godine organizovana je svečanost povodom zatvaranja radova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 75.080,86 €



10.3. Sanacija odlagališta „Ćafe” u Baru- izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku


- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u Baru po FIDIC Žutoj knjizi – »projektuj i izgradi«. Krajem 2015. godine potpisan je Ugovor i započete aktivnosti na izradi Glavnog projekta. Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2016. godini završena je procedura javne nabavke i potpisan ugovor za konsultantske usluge za projekat „Ćafe” koje podrazumijevaju reviziju Glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Krajem 2016. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta, pribavljena građevinska dozvola i otpočelo se sa izvođenjem radova.
- Radovi su obustavljeni krajem septembra 2017. godine jer je nadzor doveo u pitanje kvalitet izvedenih radova. Dodatna ispitivanja pokazala su da su radovi na izradi gabionskog zida i nasipa izvedeni nezadovoljavajućim kvalitetom, pa se izvođač obavezao da dostavi inovirani Glavni projekat kako bi se mogla izvršiti sanacija i nastaviti sa radovima. Izvođač je početkom 2018. godine dostavio izmijenjeno projektno rješenje u odnosu na Glavni projekat, na koje Nadzor nije dao saglasnost.
- Kako je na osnovu svega navedenog bilo očigledno da Izvođač nema namjeru da završi radove u skladu sa sopstvenim Glavnim projektom I važećim standardima I propisima, donešena je odluka o raskidu ugovora I daljim koracima na završetku realizacije ovog projekta.
- Ugovor sa firmom “Mesogeos” iz Grčke formalno je raskinut 07.11.2018. godine I pokrenuta je procedura aktiviranja garancija.
- Nakon sagledavanja Glavnog projekta I cjelokupne prateće tehničke dokumentacije, zaključeno je da nije moguće završiti radove I pribaviti upotrebnu dozvolu do kraja 2018.godine.
- Direkcija javnih radova je angažovala advokatsku kancelariju kao pravnu pomoć oko daljih aktivnosti vezanih za potraživanja nakon raskida ugovora.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 33.325,47€

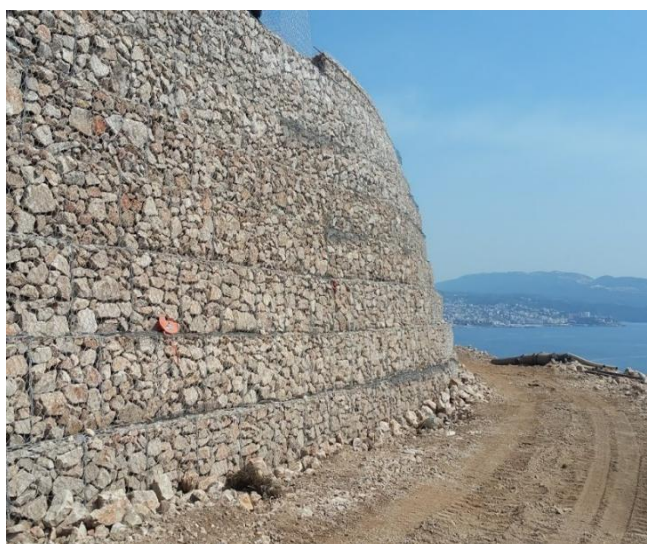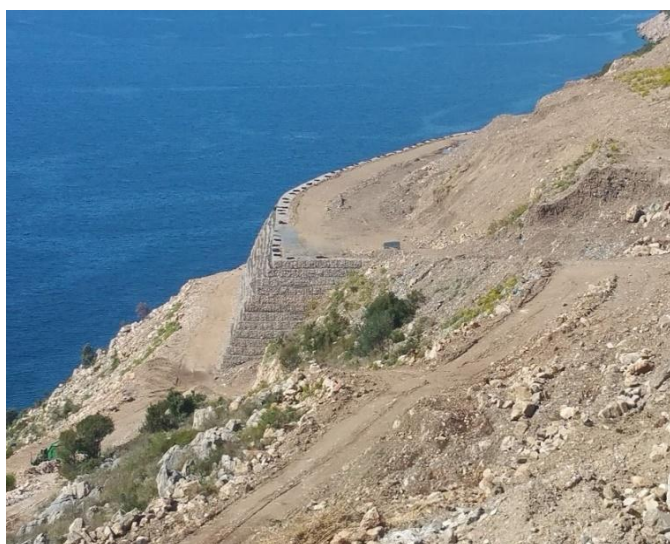

10.4. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar-Sutomore

Status projekta: U toku

- Rekonstrukcija dijela pruge „Virpazar – Sutomore” se realizuje u skladu sa pravilima Crvene FIDIC knjige.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji pruge u tunelu Sozina u dužini od 6 712m. Radovi su obuhvatali zamjenu postojećih drvenih pragova betonskim, zamjenu šina, zastorne prizme, kontaktne mreže i signalizacije kao i čišćenje postojećih drenažnih kanala i šina.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi.
- U 2018.godini nije bilo utroška sredstava.

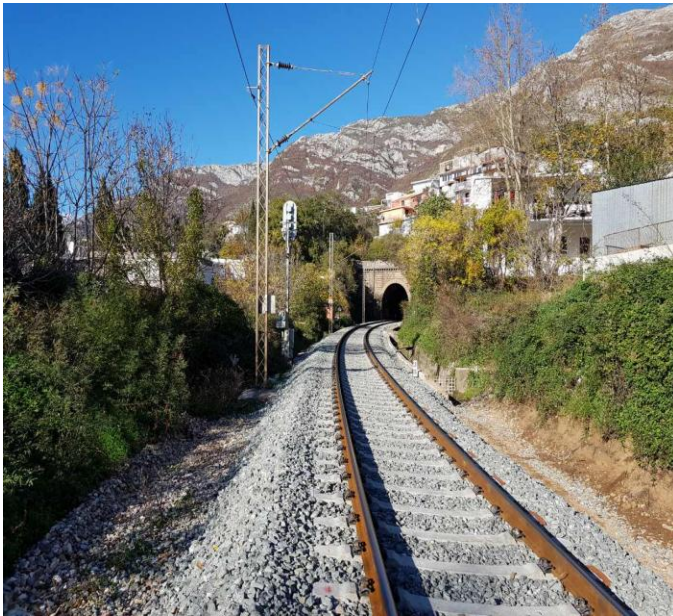

10.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice „Trebešica”- izrada projektne dokumentacije

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”. Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Nakon završenog postupka javne nabavke, krajem 2015. godine potpisan je Ugovor sa ponuđačem koji će projekat realizovati po Žutoj FIDIC knjizi po principu “projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za konsultantske usluge, koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, nakon dva neuspješna postupka, rezultiralo je potpisivanjem Ugovora u 2016. godini.

- Završena je izrada i revizija Glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine. Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme završeni su u kraćem roku od predviđenog čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U skladu sa IPA procedurama izdat je »taking-over » sertifikat , a nakon što korisnik ŽICG sprovede proceduru nabavke i ugradnje elektro-ormara završiće se procedura tehničkog prijema i pribavljanja upotrebne dozvole objekta nakon čega će isti biti predat Korisniku na upotrebu.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 33.330,18 €



10.6. Tehnička pomoć

Status projekta: U toku

- Projekti se finansiraju 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2015. godini, potpisan je Ugovor za jačanje kapaciteta Operativne strukture kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevod službenih dokumenata i realizacija istih je u toku.
- U 2016. godini potpisan je ugovor za usluge organizovanja Sektorskih monitoring odbora i implementaciju Komunikacionog akcionog plana i realizacija istih je u toku. U 2016. godini potpisan je Ugovor i realizovana je isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Operativne strukture. U 2016. godini potpisan je i ugovor “Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovođenja ugovora i FIDIC pravila”.
- U 2017. godini su potpisani i realizovani ugovori za nabavku IT opreme i službenog vozila.
- U 2017. godini potpisan je ugovor „Revizija Master planova za otpadne vode i priprema prvog Nacrta plana za implementaciju specifične direktive za Direktivu o komunalnim otpadnim vodama“. U toku je potpisivanje Adenduma br.2 kojim će biti definisan rok završetka ovog projekta za 15.12.2018.godine
- U 2017. godini potpisani su ugovori „Izrada strategije saobraćaja“, „Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije“, "Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije održivosti" i “Procedure implementacije ugovora za infrastrukturne projekte“ i isti su u potpunosti realizovani.
- U 2018. godini projekat „Revizija Master planova za otpadne vode i priprema prvog Nacrta plana za implementaciju specifične direktive za Direktivu o komunalnim otpadnim vodama“ uspješno je realizovan.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 179.029,81 €

10.7. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos- Trebešica

Status projekta: U toku

- Projekat se finansira iz sredstava IPA II-Nacionalni program 2014 i nacionalnog budžeta.
- Projektom je predviđena rekonstrukcija pruge od stanica Kos do stanica Trebešica u dužini cca 6,75 km. Rekonstrukcija obuhvata zamjenu zastorne prizme, drvenih pragova, šina i kontaktne mreže. Na ovoj sekciji postoji 7 mostova ukupne dužine 476m i 12 tunela ukupne dužine 4.372 m.
- Nakon završenih procedura javnih nabavki u decembru 2018.godine potpisani su ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom nad izvođenjem radova.
- U 2018.godini realizovana su sredstva u iznosu od 1.072.069,52 €.

10.8. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

Status projekta: U toku

- Ministarstvo prosvjete je napravilo spisak prioriternih škola za prilagođavanje i izabralo Konsultanta koji će da priprema tenderske dokumentacije za: ugovor o izradi Glavnih projekata i nadzoru nad izvođenjem radova, ugovor o reviziji i ugovor o izvođenju radova.
- Do sada su Konsultanti obišli lokacije prioriternih škola i izradili nacrt Projektinih zadataka sa fotodokumentacijom. Dostavljen je nacrt tenderske dokumentacije za izbor obrađivača Glavnog projekta I vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova I isti je vraćen Konsultantu na dorado. U toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije koja će nakon kompletiranja biti dostavljena DEU na saglasnost.. Javno nadmetanje za izvođenje radova biće realizovano po okančanju ugovora za usluge, kada će se jasno definisati predmjer radova koje je neophodno izvršiti da bi se

navedeni prioritetni objekti prilagodili za nesmetan pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.

10.9. Priprema projekata za sektore Zaštite životne sredine i klimatskih promjena

Status projekta: U toku

- Direkciji javnih radova u 2017.godini dostavljen je nacrt tenderske dokumentacije. Imenovan je Projekt menadžer. Tenderska dokumentacija je poslata Delegaciji I vraćena je sa komentarima. U toku su aktivnosti na korigovanju tenderske dokumentacije.

10.10. Podrška implementaciji I monitoring upravljanje otpadom

Status projekta: U toku

- Direkciji javnih radova u 2017.godini dostavljen je nacrt tenderske dokumentacije. Imenovan je Projekt menadžer. Tenderska dokumentacija je poslata Delegaciji na odobrenje.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane Delegacije objaviće se tenderska dokumentacija, a tenderski postupak će se sprovesti po međunarodnoj restriktivnoj proceduri.

10.11. Podrška implementaciji I monitoring upravljanje vodama

Status projekta: U toku

- Tenderska dokumentacija za projekat Podrška implementaciji i monitoring upravljanje vodama je objavljen 02.08.2018. godine. Tenderski postupak sprovodi se po međunarodnoj restriktivnoj proceduri.
- Rok za dostavljanje aplikacija bio je 08.10.2018. godine, nakon čega je Evaluaciona komisija utvrdila listu ponuđača koji su ispunili uslove tendera i izvještaj dostavila DEU na saglasnost.
- Izvještaj je od strane DEU vraćen na doradu, nakon čega su aplikantima poslali zahtjev za dostavljanje klarifikacija. Rok za dostavljanje klarifikacija je 03.01.2019. godine, nakon čega će Evaluaciona komisija pripremiti izvještaj o evaluaciji i ponovo dostaviti DEU na saglasnost.
- Po dobijanju saglasnosti, aplikanti koji su ispunili uslove tendera će biti pozvani da dostave ponude. Rok za dostavljanje ponude je 60 dana.
- Planiran početak implementacije je april 2019. godine.
- U 2018. godini nije bilo utroška sredstava.


**11. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
AUTOPUTA BAR- BOLJARE**

- Vlada Crne Gore je, na osnovu člana 12 Zakona o autoputu Bar – Boljare, (Sl. cg. 52/14) na sjednici od 14. maja 2015. godine donijela Odluku o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo. Sredstva za rad Komisije se obezbjeđuju u Kapitalnom budžetu Crne Gore. Visina nadoknade članovima Komisije se, shodno Internom pravilniku o raspodjeli finansijskih sredstava za rad Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar - Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, određuje proporcionalno učešću, odnosno oblasti u ukupnom tehničkom pregledu, kao i na osnovu stvarnog angažmana na pregledu radova na prijedlog predsjednika Komisije.
- U 2016. godini započete su aktivnosti na tehničkom pregledu radova na autoputu i to prije svega na mostu Moračica, tunelu Vjeternik i na privremenom i stalnom napajanju električnom energijom, kao i na ostalim objektima za koje je izdata građevinska dozvola.
- U 2017. godini izdate su sve građevinske dozvole i radova su otpočeli na svim dionicama.
- U 2018. godini realizovana su sredstva u iznosu od 707.815,53 € €

12. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

12.1. Dom starih u opštini Pljevlja

Status projekta: Završeno

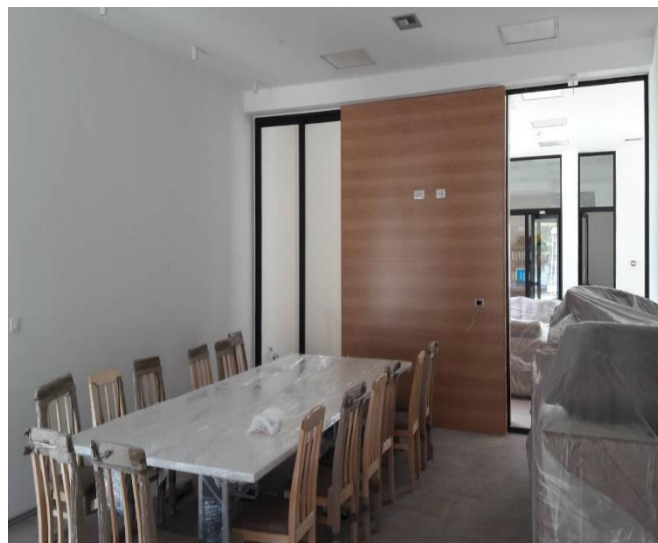

- Projektnom dokumentacijom je planirana izgradnja objekta Doma starih u Pljevljima spratnosti podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine 2.810 m².
- Objekat je predviđen za smještaj 68 lica. Pored 37 smještajnih jedinica, predviđen je kuhinjski blok, restoran, pošta, kancelarije, višenamjenska sala, ambulanta, komunikacije, kao i prateće tehničke prostorije.
- Sa radovima se započelo krajem maja 2016. godine.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na izgradnji i opremanju objekta.
- U 2018. godini završen je tehnički pregled objekta i isti je dobio upotrebnu dozvolu početkom aprila mjeseca.

12.2. Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici

Status projekta: U toku



- Projekat obuhvata izgradnju 12 stambenih objekata koji posjeduju podrum, prizemlje i dva sprata, ukupne bruto površine 10.408 m², sa ukupno 120 stambenih jedinica za smještaj 660 korisnika.
- Izvođenje radova je započelo krajem marta 2016. godine.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na 12 stambenih objekata i isti su nakon dobijanja upotrebne dozvole useljeni.
- Sredinom 2017. godine započelo se sa izgradnjom još pet stambenih objekata sa 51 stambenom jedinicom.
- Sredinom septembra 2018. godini završeni su svi radovi na objektima. Objekti su dobili upotrebnu dozvolu i isti su useljeni.

12.3. Stambeni objekti u Beranama

Status projekta: Završeno

- Projekat obuhvata izgradnju 4 stambena objekta, ukupne bruto površine cca 7.000 m², sa ukupno 94 stambene jedinice za smještaj 271 korisnika.
- Krajem 2016. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor.
- U 2017. otpočeli su radovi na izgradnji objekata.
- Krajem 2018. godine završeni su svi planirani radovi na izgradnji objekta. Dio radova na uređenju terena nije završen, jer isti zavisi od završetka radova na infrastrukturnom priključenju. U skladu sa Implementacionim ugovorom obezbjeđenje infrastrukturnih priključaka je obaveza opštine Berane.



Izveštaj sačinila:
Marija Glavatović

Saglasni:
Miomir Peruničić
Milica Bakić
Slobodan Vuković

Izveštaj odobrio:
Direktor
Rešad Nuhodžić

Podgorica, novembar 2018. godine
