



CRNA GORA
UPRAVA JAVNIH RADOVA

Izveštaj o realizaciji Zakona o budžetu za period
1.1.2020. - 30.9.2020. godine



Oktober 2020. godine

SADRŽAJ

SADRŽAJ.....	2
REZIME	9
REALIZACIJA PO OBJEKTIMA.....	63
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA.....	64
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA.....	64
<i>1.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici.....</i>	<i>65</i>
<i>1.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta palata pravde.....</i>	<i>65</i>
<i>1.3. Izgradnja objekta Državnog tužilaštva u Podgorici.....</i>	<i>68</i>
<i>1.4. Izgradnja Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.....</i>	<i>68</i>
<i>1.5. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti.....</i>	<i>69</i>
<i>1.6. Rekonstrukcija objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju.....</i>	<i>71</i>
<i>1.7. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici.....</i>	<i>72</i>
<i>1.8. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.....</i>	<i>75</i>
<i>1.9. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.....</i>	<i>76</i>
<i>1.10. Objekti za potrebe Državne revizorske institucije.....</i>	<i>77</i>
<i>1.11. Izgradnja objekta za potrebe MONSTAT-a.....</i>	<i>77</i>
<i>1.12. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac.....</i>	<i>77</i>
2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE.....	79
<i>2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici.....</i>	<i>80</i>
<i>2.3. Izvođenje radova, nabavka oprema i unapređenje objekata u funkciji kulture.....</i>	<i>82</i>
<i>2.4. Dogradnja objekta JU "Zahumlje" u Nikšiću.....</i>	<i>84</i>
<i>2.5. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" u Baru.....</i>	<i>85</i>
<i>2.6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture.....</i>	<i>86</i>
<i>2.7. Muzej savremene umjetnosti u Podgorici.....</i>	<i>86</i>
<i>2.8. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju.....</i>	<i>86</i>
<i>2.9. Rekonstrukcija kulturnog dobra Gradski bedem – ostaci Onogošta u Nikšiću.....</i>	<i>87</i>
<i>2.10. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju.....</i>	<i>87</i>
3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA.....	89

1. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	90
3.3. Izgradnja sportskih terena i sala	92
3.4. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	92
3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	93
3.6. Izgradnja školsko-sportske dvorane u Gusinju	94
3.7. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK "Sutjeska" u Nikšiću	95
96	
3.8. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	97
4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE	99
4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	100
4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	102
4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	106
4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja	107
4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	117
4.7. Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	117
4.8. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	118
5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	120
5.1 Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	121
5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora jalovišta u Mojkovcu	122
• Šetalište i uređenja prostora nekadašnjeg jalovišta u Mojkovcu	123
5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice)	124
5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju	138
5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	140
5.7. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	143
5.8. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	145
5.10. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje	146
5.11. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu	149
5.12. Rekonstrukcija puta Plav – Bogićevica, Plav	149
5.13. Lokalni put Ckla – granica Albanije, opština Bar	150
5.14. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu	150

5.15. Putni pravac Monte - Rose	152
5.16. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	152
5.17. Rekonstrukcija trga u Plavu	152
5.18. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar	153
6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA	155
6.1. Rekonstrukcija energetskog bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	156
6.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici	156
6.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	157
6.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu	157
6.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	157
6.6. Dom zdravlja u City kvartu	157
6.7. Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	157
6.8. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	158
7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA	160
7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici	161
7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću	163
7.3. Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići" u opštini Cetinje	164
7.4. Dom starih u Plavu	165
7.5. Dom starih u Rožajama	165
8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA	166
8.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a	167
8.1.1. Vrtić u Baru	167
8.1.2. Vrtić u Ulcinju	167
8.1.3. Vrtić u Pljevljima	167
8.1.4. Vrtić u Bloku VI, Podgorica	169
8.1.5. Rekonstrukcija predškolskih ustanova	170
8.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II	170
8.2.1 Vrtić u City kvartu, Podgorica	170
8.2.2. Vrtić na Zlatici, Podgorica	171
8.2.3. Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	171

8.2.4. Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica _____	171
8.2.5. Vrtić u Bijelom Polju _____	171
8.2.6. Vrtić u Beranama _____	171
8.2.7. Vrtić u Plavu _____	172
8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama _____	172
8.4. Osnovna škola u Igalu _____	173
8.5. Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica _____	173
8.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Tološima, Podgorica _____	174
8.7. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici _____	174
8.8. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom _____	174
8.9. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju _____	175
177	
8.10. Izgradnja Osnovne škole u Rožajama _____	177
8.11. Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje _____	177
8.12. OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju _____	178
8.13. Naučno-tehnološki park u Podgorici _____	178
8.14. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju _____	180
8.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a _____	181
8.15.1. Druga Gimnazija u Podgorici _____	182
8.15.2. Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici _____	182
8.15.3. Osnovna škola na Karabuškom polju, Tuzi _____	182
8.15.4. Osnovna škola u City kvartu, Podgorica _____	182
8.15.5. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici _____	183
8.15.6. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici _____	183
8.15.7. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru _____	183
8.16. Adaptacija objekata obrazovanja _____	183
9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	185
9.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin _____	186
9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju _____	195
9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac _____	201
9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama _____	208

9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor Žabljak _____	212
9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju _____	214
9.9. Objekat Kuća voća u Andrijevići _____	228
9.10. Objekat nacionalne Kuće maslina u Baru _____	229
230	
9.11. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom _____	231
9.12. Nacionalni parkovi _____	231
9.13. Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju _____	234
9.14. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1450 i Kolašin 1600 i osnježavanje staza ski centra Kolašin 1600 _____	234
10. ZAKON O PRIJESTONICI.....	235
11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA	239
11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama _____	240
241	
11.2. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju _____	241
11.3. Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru _____	242
11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos -Trebešica" _____	243
11.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne-vučne podstanice "Trebešica" _____	244
11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore _____	244
11.7. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem _____	244
11.8. Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija __	245
11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom _____	245
11.10. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama _____	246
11.11. Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija _____	246
11.12. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini _____	246
11.13. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama __	247
11.14. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom __	247
11.15. Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke _____	247
11.16. Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu _____	247

11.17. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	248
11.18. Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	248
11.19. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	248
11.20. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	248
11.21. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	249
11.22. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina	249
11.23. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	249
11.24. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	250
11.25. Komplex UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)	250
11.26. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	251
11.27. Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređenje veterinarske i fitosanitarne kontrole	251
11.28. Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	252
11.29. Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla	252
11.30. Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica-Golubovci	252
11.31. Strategija izvodljivosti intermodalnosti	252
11.32. Studija o ITS (Inteligent Transport sistem) u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju	252
11.33. Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve	252
11.34. Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja	253
11.35. Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU ACQUIS	253
11.36. Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu	253
11.37. Grant šema za energetska efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju	254
12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA	255

REZIME

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu Upravi javnih radova, kroz kapitalni budžet, opredijeljena su sredstva u iznosu od **87.030.000,00€**, od čega je 36.421.650,00€ iz budžetskih sredstava, 40.005.200,00€ iz kredita, 3.300,00€ donacija i 10.599.850,00€ IPA sredstva. U članu 10 Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja”.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu **75.584.620,91€**, od čega je 34.696.851,93€ iz budžetskih sredstava, 40.005.200,00€ iz kredita, 3.300,00€ donacija i 879.268,98€ IPA sredstva.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 171 projekta u okviru kojih se realizuju brojni podprojekti.

U periodu od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine Uprava javnih radova je zaključila **132** ugovora, čija vrijednost iznosi **57.202.898,74€**. U istom periodu raspisala je **25** javnih nadmetanja čija ukupna vrijednost iznosi **13.888.476,03€**.

U periodu od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 51.700.877,78€, od čega 26.597.229,01€ iz budžetskih sredstava, 23.161.634,58€ iz kreditnih sredstava i 1.942.014,19€ iz IPA fondova. Ukupan procenat realizacije je 68,4%, odnosno 88,01% imajući u vidu da se sredstva iz kredita izvršavaju u visini njihovog ostvarenja.

U istom periodu u 2019. godini, ukupno je utrošeno 30.911.427,28€.

Iznos sredstava utrošenih u tekućoj godini u odnosu na uporedni period u 2019. godini, uvećan je za skoro 67%.

Kroz predmetni Izvještaj o realizaciji za devet mjeseci tekuće godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava javnih radova ne može da utiče, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Vlada Crne Gore je na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela Odluku o izradi Kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata u avgustu 2018. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 057/18 od 10.08.2018.).

Predmetnom Odlukom je utvrđeno da projekti čija je realizacija otpočela u prethodnom periodu ne podliježu vrednovanju odnosno ocjenjivanju u skladu sa ovom odlukom i imaju prioritet u realizaciji. Uprava javnih radova, na osnovu izjašnjenja stručnog nadzora, planira sredstva za narednu budžetsku godinu, neophodna za kontinuiranu realizaciju već otpočetih projekata, u skladu sa ugovorenim obavezama. Pregled sredstava neophodnih za realizaciju već započetih projekata se dostavlja Ministarstvu finansija, koje navedene iznose koriguje u skladu sa budžetskom i fiskalnom politikom. Smanjivanjem prvobitno planiranog iznosa sredstva direktno se utiče na dinamiku realizacije projekata, a nerijetko se isti i dijele na faze čime se realizacija projekta usložnjava, a obim posla uvećava.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se u okviru obezbijeđenih sredstava u kapitalnom budžetu utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijeđeni ukupni iznosi neophodni za završetak projekta, čime bi se izbjeglo odloženo finansiranje projekata i skratili rokovi izgradnje.

Takođe, u skladu sa predmetnom Odlukom potrošačke jedinice kandiduju projekte za finansiranje, dostavljajući Obrsce koji sadrže podatke o pripremljenoj dokumentaciji i zrelosti samih projekata za realizaciju. Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava javnih radova nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020)), nisu dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim Ministarstvom održivog razvoja i turizma, sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava javnih radova ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručng nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog koji često dolazi do obustave radova od strane trećih lica.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se projekti kod kojih nije bilo aktivnosti na realizaciji isključe iz kapitalnog budžeta za narednu godinu.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti građenja i javnih nabavki, Uprava javnih radova sprovodi aktivnosti vezano za izgradnju objekata koji se realizuju kroz Zakon o budžetu Crne Gore, a koje pored ostalog podrazumijevaju i javno oglašavanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, kao i za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

Tokom realizacije određenih ugovora o građenju, u skladu sa svojim zakonskim obavezama vršioci stručnog nadzora Upravu javnih radova obavještavaju o uočenim propustima u projektnoj dokumentaciji, čije otklanjanje za posledicu ima pojavu viškova, nepredviđenih i naknadnih radova koje je neophodno izvesti kako bi izgrađeni objekti bili predati na upotrebu. Sama pojava dodatnih radova povećava i ugovorenu cijenu koštanja izgradnje, zbog čega je neophodno obezbijediti dodatna sredstva za realizaciju projekta kroz pregovarački odnosno otvoreni tenderski postupak. Imajući u vidu propuste projekatana i revidenata, Uprava javnih radova je kod nadležnog Direktorata za inspeksijske poslove i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma inicirala pokretanje više postupaka ukidanja licenci privrednim društvima i ovlašćenim inžinjerima u skladu sa Članom 139, stav 1, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektne dokumentacije sa lošim tehničkim rješenjima ugrožava i proces planiranja, kako neophodnih sredstava za realizaciju projekata, tako i dinamike izvođenja radova, što za posledicu ima uvećanje vrijednosti investicije i produžetak roka završetka radova.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se kroz zakonsku regulativu bliže utvrde uslovi za ukidanje licenci projektantima, revidentima i privrednim društvima koja se bave projektovanjem i revizijom tehničke dokumentacije, čime bi se i navedeni propusti prilikom izrade projektne dokumentacije adekvatno sankcionisali. Takođe, neophodno je zakonom

propisati obavezu projektantima i revidentima da nadoknade investitoru vrijednost radova koji su se naknadno izveli zbog propusta u tehničkoj dokumentaciji.

Nedovoljno kvalitetni elementi tenderske dokumentacije koji se od strane Korisnika kao nacrt dostavljaju Upravi javnih radova na dalje procesuiranje, kao i nedovoljno iskusni članovi u evaluacionim komisijama, delegirani od strane Korisnika, prolongiraju proceduru ugovaranja za projekte koji se finansiraju iz IPA fondova. Imajući u vidu i broj IPA projekata koji se u narednom periodu planiraju za realizaciju posredstvom Uprave javnih radova, potrebno je sistemski pristupiti reorganizaciji Operativne strukture uz dodatno zapošljavanje stručnog kadra kako bi se nadolazeće aktivnosti mogle adekvatno sprovesti.

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi javnih radova je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi. S toga je neophodno u okviru tekućeg budžeta planirati sredstva za povećanje zarada zaposlenih u Upravi javnih radova, koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2020. GODINU
01.01.2020. - 01.10.2020.

	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2020. GODINU			NAPOMENA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2020.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
1.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	397,000.00	6,911,063.91	7,308,063.91		175,612.65	6,875,099.79	7,050,712.44
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	32,000.00	1,250,000.00	1,282,000.00	Obaveza Ministarstva pravde i vanjskih poslova je bila da dostave ovjeren projektni zadatak i utu-e, nakon čega je UJR radova raspisala javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije i isto je u toku.	96.80	0.00	96.80
1.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta Palata pravde	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, kao i saglasnost Glavnog	19,393.60	0.00	19,393.60

					državnog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arh. konkursa, nakon čega će UJR radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije objekta palate pravde. U okviru podprojekta sprovedene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije adaptacije sudova u više gradova.			
1.3.	Izgradnja objekata državnog tužilaštva u Podgorici	115,000.00	10,000.00	125,000.00	Obaveza Ministarstva pravde i tužilaštva je da dostave ovjeren projektni zadatak i utu-e, kao i saglasnost Glavnog državnog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arh. konkursa, nakon	0.00	0.00	0.00

					čega će UJR radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
1.4.	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	10,000.00	623,000.00	633,000.00	Nakon što je jedini ponuđač na javnom nadmetanju za izvođenje radova II faze izgradnje predmetnog objekta odustao, MORT sprovodi aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerima koji učestvuju u finansiraju objekta, u cilju ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja na međunarodnom nivu u skladu sa PRAG pravilima.	0.00	133,000.00	133,000.00
1.5.	Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu	10,000.00	300,000.00	310,000.00	U toku je izrada i revizija projektne dokumentacije za prilagođavanje	0.00	0.00	0.00

	lica smanjene pokretljivosti				prioritetnih objekata.			
1.6.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	10,000.00	100,000.00	110,000.00	Radovi I faze su obustavljeni usled ometanja vlasnika stambene jedinice smještene u okviru objekta stanice. Za potrebe ugovaranja radova II faze obaveza MUP je kompletiranje projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja.	0.00	0.00	0.00
1.7.	Izgradnja kompleksa objekata sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izgradnja.	25,590.50	2,894,141.45	2,919,731.95
1.8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	10,000.00	3,088,063.91	3,098,063.91	U toku je izvođenje radova.	46,211.12	1,073,921.09	1,120,132.21

1.9.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	U toku je izvođenje radova.	78,481.33	2,774,037.25	2,852,518.58
1.10.	Izgradnja objekata za potrebe Državne revizorske institucije	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza DRI je da u saradnji sa MORT sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projekt zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	665.50	0.00	665.50
1.11.	Izgradnja objekta za potrebe Monstata	50,000.00	10,000.00	60,000.00	Prestaala potreba. U saradnji sa nadležnim institucijama Monstaat je sproveo proceduru kupovine objekta za svoje potrebe.	0.00	0.00	0.00

1.12.	Objekti za potrebe uprave ZIKS-a u Danilovgradu i Mojkovcu	120,000.00	10,000.00	130,000.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	5,173.80	0.00	5,173.80
2.	Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	168,000.00	770,000.00	938,000.00		9,100.00	415,888.87	424,988.87
2.1.	Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici	18,000.00	50,000.00	68,000.00	U toku je tehnički rpijem objekta.	0.00	0.00	0.00
2.2.	Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Nakon što je prvo javno nadmetanje poništeno jer nijedan ponuđač nije bio ispravan, nakon ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja i zaključivanja ugovora sa izvođačem i stručnim nadzorom, sa radovima se otpočelo u avgustu i isti su u toku.	0.00	0.00	0.00

2.3.	Izvođenje radova, nabavka opreme i uređenje objekata u funkciji razvoja kulture	10,000.00	275,000.00	285,000.00	Nakon što je prvo javno nadmetanje poništeno, nakon ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja za izbor isporučioća opreme za opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej na Cetinju, i zaključivanja ugovora sa isporučiocem, u septembru se otpočelo sa realizacijom ugovora.	400.00	0.00	400.00
2.4.	Izvođenje radova na dogradnji JU Zahumlje u Nikšiću	10,000.00	290,000.00	300,000.00	Radovi su završeni i objekta predat korisniku na upotrebu.	8,700.00	258,495.55	267,195.55
2.5.	Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" - Bar	5,000.00	115,000.00	120,000.00	Radovi su završeni i objekta predat korisniku na upotrebu.	0.00	157,393.32	157,393.32
2.6.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	45,000.00	0.00	45,000.00	Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje	0.00	0.00	0.00

					će UJR pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti (projektne zadatke, utu-e i sl.)			
2.7.	Muzej savremene umjetnosti u Podgorici	50,000.00	10,000.00	60,000.00	Obaveza DRI je da u saradnji sa MORT sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
2.8.	Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Radovi su obustavljeni dok Ministarstvo kulture u saradnji sa nadlženim institucijama ne usaglasi projektну dokumentaciju.	0.00	0.00	0.00

2.9.	Rekonstrukcija kulturnog dobra gradski bedemi - ostaci Onogošta u Nikšiću	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Nakon što revidovana projektna dokumentacija bude dostavljena, stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	0.00	0.00	0.00
2.10.	Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Nakon što revidovana projektna dokumentacija bude dostavljena, stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova i	0.00	0.00	0.00

					stručnog nadzora.			
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	110,000.00	1,970,000.00	2,080,000.00		85,093.62	2,836,111.66	2,921,205.28
3.1.	Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Kotor. UJR na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vrši prenos ugovorom definisanih sredstava.	0.00	0.00	0.00
3.2.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	U toku je izvođenje radova.	24,380.72	1,718,366.66	1,742,747.38
3.3.	Izgradnja sportskih terena	10,000.00	40,000.00	50,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovode se u skladu sa iskazanim prioritetima Ministarstva sporta. UJR nije dostavljena dokumentacija za potrebe	0.00	0.00	0.00

					realizacije ovog projekta.			
3.4.	Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	10,000.00	200,000.00	210,000.00	Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	8,379.00	0.00	8,379.00
3.5	Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	10,000.00	200,000.00	210,000.00	U toku je izvođenje radova.	12,100.00	881,092.72	893,192.72
3.6	Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Nakon usvajanja planske dokumentacije, obaveza Korisnika je da dostavi dokumentaciju UJR kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00

3.7	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	0.00	0.00	0.00
3.8	Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju	40,000.00	10,000.00	50,000.00	U toku je izvođenje radova.	40,233.90	236,652.28	276,886.18
4.	Projekti očuvanja životne sredine	360,800.00	1,107,100.00	1,467,900.00		147,716.18	2,767,318.40	2,915,034.58
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	179,000.00	10,000.00	189,000.00	U toku je izrada i revizija projektne dokumentacije.	67,284.98	0.00	67,284.98
4.2.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	30,000.00	350,000.00	380,000.00	U toku je izvođenje radova.	22,764.28	827,422.66	850,186.94
4.3.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	10,000.00	90,000.00	100,000.00	Svi ugovoreni radovi su završeni.	3,331.00	43,850.40	47,181.40
4.4.	Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja	21,800.00	300,000.00	321,800.00	U toku je izvođenje radova.	18,929.02	1,273,052.43	1,291,981.45
4.5.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	10,000.00	267,100.00	277,100.00	U toku je izvođenje radova.	13,664.50	309,934.20	323,598.70

4.6.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	90,000.00	10,000.00	100,000.00	U toku je sprovođenje mjera.	20,000.00	287,451.15	307,451.15
4.7.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	10,000.00	70,000.00	80,000.00	U toku je izvođenje radova.	1,742.40	25,607.56	27,349.96
4.8.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza MORTa i Opštine Plav je da dostave kompletiran i ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
5.	Izgradnja lokalne infrastrukture	281,000.00	3,023,000.00	3,304,000.00		126,458.40	7,587,873.10	7,714,331.50
5.1.	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	10,000.00	190,000.00	200,000.00	U toku je izvođenje radova.	10,564.49	187,578.43	198,142.92
5.2.	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	12,189.92	826,304.92	838,494.84

5.3.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	10,000.00	1,363,000.00	1,373,000.00	U toku je realizacija ugovora zaključenih između UJR i opština koje u skladu sa ugovorom sprovode aktivnosti na projektima, kao i ugovora koje je UJR u prethodnom zaključila u okviru projekta	88.379,72	4.980.537,42	5.068.917,14
5.3.1.	Lokalni putevi i gradske saobraćajnice				Aktivnosti sprovode opštine	48.863,94	3.968.994,84	4.017.858,78
5.3.1.1	Prijestonica Cetinje				Aktivnosti sprovodi Prijestonica.	0,00	563.000,00	563.000,00
5.3.1.2	Opština Berane				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.3	Opština Pljevlja				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.4	Opština Šavnik				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.5	Opština Gusinje				Aktivnosti sprovodi Opština	9.800,00	12.615,75	22.415,75
5.3.1.6	Opština Danilovgrad				Aktivnosti sprovodi Opština	17.662,46	182.109,78	199.772,24
5.3.1.7	Glavni grad Podgorica				Aktivnosti sprovodi Glavni grad	0,00	0,00	0,00
5.3.1.8	Opština Plav				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.9	Opština Andrijevica				Aktivnosti sprovodi Opština	3.000,00	260.982,39	263.982,39

5.3.1.10	Opština Rožaje				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	294.419,76	294.419,76
5.3.1.11	Opština Bijelo Polje				Aktivnosti sprovodi Opština	2.430,00	367.525,94	369.955,94
5.3.1.12	Opština Herceg Novi				Aktivnosti sprovodi Opština	653,40	49.725,16	50.378,56
5.3.1.13	Opština Petnjica				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	518.354,38	518.354,38
5.3.1.14	Opština Nikšić				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	661.190,85	661.190,85
5.3.1.15	Opština Mojkovac				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	89.677,34	89.677,34
5.3.1.16	Opština Kolašin				Aktivnosti sprovodi Opština	9.980,08	261.600,46	271.580,54
5.3.1.17	Opština Ulcinj				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.18	Opština Žabljak				Aktivnosti sprovodi Opština	1.950,00	84.546,27	86.496,27
5.3.1.19	Opština Bar				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.20	Opština Golubovci				Aktivnosti sprovodi Opština	3.388,00	148.017,44	151.405,44
5.3.1.21	Opština Plužine				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.22	Opština Tivat				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	0,00	0,00
5.3.1.23	Opština Tuzi				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	126.694,74	126.694,74
5.3.1.24	Opština Kotor				Aktivnosti sprovodi Opština	0,00	348.534,58	348.534,58
5.3.2.	Lokalni putevi i gradske saobraćajnice				Aktivnosti sprovodi UJR	39.515,78	1.011.542,58	1.051.058,36
5.3.2.1	Opština Rožaje				U toku je izvođenje radova	0,00	29.336,38	29.336,38
5.3.2.2	Opština Bijelo Polje				U toku je izvođenje radova	12.107,57	682.912,66	695.020,23
5.3.2.3	Opština Petnjica				U toku je izvođenje radova	0,00	2.733,54	2.733,54

5.3.2.4	Opština Kolašin				U toku je izvođenje radova	0,00	74.998,95	74.998,95
5.3.2.5	Opština Danilovgrad				U toku je izvođenje radova	48,40	0,00	48,40
5.3.2.6	Opština Berane				U toku je izvođenje radova	10.401,51	0,00	10.401,51
5.3.2.7	Opština Gusinje				U toku je izvođenje radova	14.146,45	88.188,58	102.335,03
5.3.2.8	Opština Žabljak				U toku je izvođenje radova	0,00	133.372,47	133.372,47
5.3.2.9	Prijestonica Cetinje				U toku je izvođenje radova	2.811,84	0,00	2.811,84
5.4.	Izgradnja gradske pijace u Gusinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Radovi su završeni i objekta predat korisniku na upotrebu.	0.00	0.00	0.00
5.5.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	36,000.00	145,000.00	181,000.00	U toku je izvođenje radova.	9,694.80	275,568.57	285,263.37
5.6.	Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tivtu	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Opštine Tivat je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
5.7.	Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	10,000.00	40,000.00	50,000.00	U toku je izvođenje radova.	848.16	0.00	848.16
5.8.	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Zbog novonastale situacije sa pandemijom	0.00	0.00	0.00

					virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.			
5.9.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	10,000.00	100,000.00	110,000.00	U toku je izvođenje radova.	0.00	135,177.22	135,177.22
5.9.	Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	10,000.00	310,000.00	320,000.00	U toku je izvođenje radova.	1,283.14	536,687.72	537,970.86
5.10.	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	2,167.63	246,557.10	248,724.73
5.11.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	90,000.00	10,000.00	100,000.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
5.12.	Lokalni put Ckla - granica Albanije, opština Bar	10,000.00	40,000.00	50,000.00	Nakon što Opština Bar izvrši prijavu radova, stvoriće se uslovi da UJR i stručni nadzor uvedu Izvođača u posao.	0.00	69,022.67	69,022.67
5.13.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu	10,000.00	340,000.00	350,000.00	U toku je izvođenje radova.	614.59	330,439.05	331,053.64
5.14.	Putni pravac Monte-Rose	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Opštine Herceg Novi je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene	0.00	0.00	0.00

					aktivnosti iz svoje nadležnosti.			
5.15.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	0.00	10,000.00	10,000.00	Obaveza Opštine Plav je da sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta, dok će UJR na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.	0.00	0.00	0.00
5.16.	Rekonstrukcija trga u Plavu	10,000.00	190,000.00	200,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	0.00	0.00	0.00
5.17.	Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru	20,000.00	230,000.00	250,000.00	Nakon što JP MD oslobodi lokaciju od privremenih objekata, stvoriće se uslovi da UJR i stručni nadzor uvedu Izvođača u posao.	715.96	0.00	715.96
6.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	170,000.00	960,000.00	1,130,000.00		10,668.00	59,702.55	70,370.55
6.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	10,000.00	500,000.00	510,000.00	U toku je usaglašavanje tehničkih rješenja projeknte dokumentacije sa Korisnikom.	0.00	0.00	0.00

6.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	20,000.00	400,000.00	420,000.00	U toku je procedura ponovnog izbor stručnog nadzora, s obzirom na to da je prethodno javno nadmetanje poništeno. Nakon što stručni nadzor bude odabran stvoriće se uslovi za uvođenje izvođača u posao.	484.00	0.00	484.00
6.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00

6.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" u Risnu	50,000.00	20,000.00	70,000.00	Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00
6.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40,000.00	10,000.00	50,000.00	Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00
6.6.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Ministarstvo zdravlja sprovodi	0.00	0.00	0.00

					aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.			
6.7.	Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Ministarstvo zdravlja sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00
6.8.	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Radovi na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore su završeni i	10,184.00	59,702.55	69,886.55

					objekat je predat na upotrebu Korisniku. Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.			
7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	50,000.00	50,000.00	100,000.00		61,517.66	4,031,268.21	4,092,785.87
7.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	31,338.86	2,655,519.59	2,686,858.45
7.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	30,178.80	1,375,748.62	1,405,927.42
7.3.	Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići", opština Cetinje	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U skladu sa obrazloženjem projekta, aktivnosti na realizaciji koordinira JU "Lovćen Bečići".	0.00	0.00	0.00
7.4.	Dom starih u Plavu	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Ministarstvo rada i socijalnog staranje je dostavilo revidovanu projektnu	0.00	0.00	0.00

					dokumentaciju. Nakon što Min. finansija potvrdi da su obezbjeđena sredstva za realizaciju projekta stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.			
7.5.	Dom starih u Rožajama	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Ministarstvo rada i socijalnog staranje sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Nakon što dokumentacija bude dostavljena, stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	0.00	0.00	0.00
8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	315,000.00	940,000.00	1,255,000.00		93,454.86	3,462,463.72	3,555,918.58

8.1.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a I	35,000.00	265,000.00	300,000.00	Opšti prihodi kredit 8.000,00	21,808.27	317,223.04	339,031.31
8.1.1.	Vrtić u Baru	10,000.00	5,000.00	15,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.1.2.	Vrtić u Ulcinju	5,000.00	50,000.00	55,000.00	Min. prosvjete je u saradnji sa MORT sprovelo proceduru arh. konkursa. Potrebno je da uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00

8.1.3.	Vrtić u Pljevljima	5,000.00	100,000.00	105,000.00	U toku je izvođenje radova.	1,004.40	0.00	1,004.40
8.1.4.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	5,000.00	100,000.00	105,000.00	U toku je izvođenje radova.	20,803.87	317,223.04	338,026.91
8.1.5.	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi neophodnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
8.2	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	35,000.00	35,000.00	70,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.	Vrtić u City kvartu	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.2.2.	Vrtić na Zlatici u Podgorici	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da	0.00	0.00	0.00

					dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
8.2.3.	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.2.4.	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta	0.00	0.00	0.00

					projektne dokumentacije.			
8.2.5.	Vrtić u Bijelom Polju	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.2.6.	Vrtić u Beranama	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.2.7.	Vrtić u Plavu	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da	0.00	0.00	0.00

					UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
8.3.	Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	13,799.70	701,582.01	715,381.71
8.4.	Osnovna škola u Igalu	10,000.00	5,000.00	15,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da u saradnji sa MORT sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.5.	Rekonstrukcija objekata Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	10,000.00	5,000.00	15,000.00	U toku je revizija projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00

8.6.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta OŠ u Tološima u Podgorici	50,000.00	10,000.00	60,000.00	Min. prosvjete je u saradnji sa MORT sprovelo proceduru arh. konkursa. Potrebno je da uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	31,333.33	0.00	31,333.33
8.7.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore, na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je revizija projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.8.	Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	55,000.00	95,000.00	150,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	0.00	30,894.63	30,894.63
8.9.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	10,891.46	1,337,176.91	1,348,068.37

8.10.	Izgradnja OŠ u Rožajama	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete i Opštine Rožaje je rješavanje imovinsko-prvanih odnosa.	0.00	0.00	0.00
8.11.	Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Bijelom Polju	10,000.00	30,000.00	40,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da u saradnji sa MORT sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.12.	OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje će UJR pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
8.13.	Naučno-Tehnološki park u Podgorici	10,000.00	50,000.00	60,000.00	U toku je izvođenje radova.	0.00	950,108.66	950,108.66

8.14.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu. Dalja fazna realizacija projekta sprovodiće se u skladu sa iskazanim perioritetima Korisnika.	15,622.10	125,478.47	141,100.57
8.15.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	35,000.00	105,000.00	140,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.15.1.	Druga Gimnazija u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.2.	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše	0.00	0.00	0.00

					javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
8.15.3.	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza ministarstva prosvjete je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.4.	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta	0.00	0.00	0.00

					projektne dokumentacije.			
8.15.5.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.6.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.7.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da	0.00	0.00	0.00

					UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
8.16.	Adaptacija objekata obrazovanja	5,000.00	280,000.00	285,000.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi neophodnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
9.	Unapređenje turističke ponude	2,065,000.00	7,011,100.00	9,076,100.00		1,394,966.12	15,983,482.23	17,378,448.35
9.1.	Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin	928,900.00	621,100.00	1,550,000.00	U toku je realizacija projekta.	29,267.82	3,631,841.27	3,661,109.09
9.2.	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	251,100.00	1,750,000.00	2,001,100.00	U toku je realizacija projekta.	940,790.55	1,461,450.91	2,402,241.46
9.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	225,000.00	1,500,000.00	1,725,000.00	U toku je realizacija projekta.	142,485.36	3,690,910.03	3,833,395.39
9.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	80,000.00	600,000.00	680,000.00	U toku je realizacija projekta.	40,334.98	2,040,554.10	2,080,889.08
9.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	70,000.00	1,000,000.00	1,070,000.00	Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva	36,620.15	263,093.00	299,713.15

					održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.			
9.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	150,000.00	1,400,000.00	1,550,000.00	U toku je realizacija projekta.	138,772.72	3,469,780.96	3,608,553.68
9.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je realizacija projekta.	0.00	997,900.00	997,900.00
9.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	50,000.00	50,000.00	100,000.00	U toku je realizacija projekta.	22,584.50	37,218.54	59,803.04
9.9.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevi	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	338.00	34,256.25	34,594.25
9.10.	Objekat nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	10,000.00	10,000.00	20,000.00	U toku je izvođenje radova.	11,393.12	313,246.77	324,639.89
9.11.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	240,000.00	10,000.00	250,000.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
9.12.	Nacionalni parkovi	10,000.00	40,000.00	50,000.00	U toku je realizacija projekta.	32,378.92	43,230.40	75,609.32

9.13.	Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju	20,000.00	10,000.00	30,000.00	Obaveza Opštine je da u saradnji sa MORTom razmotri potrebu raspisivanju konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.	0.00	0.00	0.00
9.14.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolšin 1450 i Kolašin 1600 i osniježavanje staza ski centra Kolašin 1600	10,000.00	0.00	10,000.00	Obaveza Korisnika je kompletiranje projektnog zadatka i utu-a, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	10,000.00	0.00	10,000.00
10	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	861,001.00	2,507,556.00	3,368,557.00		1,366,275.68	1,675,737.32	3,042,013.00
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	73,000.00	500,000.00	573,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	37,700.32	0.00	37,700.32
10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	500.00	5,000.00	5,500.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	408.10	0.00	408.10

10.3.	Sanacija odlagališta "Čafe" u Baru	100.00	224,856.00	224,956.00	U toku je priprema dokumentacije koja će biti poslata Tijelu za rješavanje sporova po ugovoru za radove koji je raskinut.	0.00	0.00	0.00
10.4.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos - Trebešica"	31,976.00	1,750,000.00	1,781,976.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	41,494.83	1,675,737.32	1,717,232.15
10.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	500.00	5,000.00	5,500.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	5,163.35	0.00	5,163.35
10.6.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	100.00	1,000.00	1,100.00	U toku je kompletiranje tenderske dokumentacije za izvođenje radova i stručni nadzor, a za čiju izradu je angažovan konsultant od strane Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja je sprovelo aktivnosti na izradi i reviziji	0.00	0.00	0.00

					projektne dokumentacije.			
10.7.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	13,000.00	20,000.00	33,000.00	Zavrena je izrda i revizija projektne dokumentacije. u toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije sa izor izvođača radova i stručnog nadzora.	12,778.80	0.00	12,778.80
10.8.	Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija	12,000.00	0.00	12,000.00	U toku je vrednovanja pristigli ponuda za konsultantske usluge.	17,638.76	0.00	17,638.76
10.9.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	3,200.00	0.00	3,200.00	U toku je javno nadmetanje za konsultantske usluge.	6,062.92	0.00	6,062.92
10.10.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	2,500.00	0.00	2,500.00	Implementacija ugovora sa konsultantom je u toku.	486,155.16	0.00	486,155.16
10.11.	Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat	0.00	0.00	0.00

					preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.			
10.12.	Jačanje kapaciteta, transpozicija ACQUI-ja planiranje u životnoj sredini	100.00	0.00	100.00	U toku je vrednovanja pristigli ponuda za konsultantske usluge.	0.00	0.00	0.00
10.13.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama	0.00	100.00	100.00	U toku je javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.14.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom	0.00	100.00	100.00	U toku je javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.15.	Nabavka opreme za horizontalnu podršku i izvještavanje i monitoring o životnoj sredini za podsektor kvalitet vazduha, i podsektor zaštite od buke	0.00	0.00	0.00	U toku je javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.16.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji evropskog mehanizma za civilnu zaštitu	0.00	0.00	0.00	U toku je javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00

10.17.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	100.00	100.00	200.00	U toku je javno nadmetanje za Grant.	0.00	0.00	0.00
10.18.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	100.00	100.00	200.00	Obaveza Ministarstva saobraćaja je da dostavi nacrt tenderske dokumentacije, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.19.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	100.00	100.00	200.00	U toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije sa Ministarstvom saobraćaja za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.20.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	700,000.00	0.00	700,000.00	Implementacija ugovora sa konsultantom je u toku.	733,463.96	0.00	733,463.96
10.21.	Tehnička podrška za pripremu investicionih	100.00	0.00	100.00	U toku je vrednovanja pristigli paplikacija za	0.00	0.00	0.00

	projekata u sektoru saobraćaja				konsultantske usluge.			
10.22.	Rekonstrukcija na željezičkoj pruzi Virpazar - Sutomore, u tunelu Sozina	14,000.00	0.00	14,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	13,828.12	0.00	13,828.12
10.23.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	8,425.00	0.00	8,425.00	U toku je procedura potpisivanja ugovora sa projektantom i stručnim nadzorom.	11,581.36	0.00	11,581.36
10.24.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	100.00	100.00	200.00	Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz kapitalnog budžeta.	0.00	0.00	0.00
10.25.	Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni obejekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)	100.00	100.00	200.00	Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz kapitalnog budžeta.	0.00	0.00	0.00
10.26.	Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	100.00	100.00	200.00	Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da	0.00	0.00	0.00

					UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.			
10.27.	Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređivanje veterinarske i fitosanitarne kontrole	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.28.	Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.29.	Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za	0.00	0.00	0.00

					predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.			
10.30.	Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica - Golubovci	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.31.	Strategija izvodljivosti intermodalnosti	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00

10.32.	Studija o ITS u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.33.	Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.34.	Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i	0.00	0.00	0.00

					saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.			
10.35.	Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU i ACQUIS	100.00	100.00	200.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.36.	Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu	0.00	0.00	0.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.36.1.	PPOV u Rožajama	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00

10.36.2.	Kanalizaciona mreža u Rožajama	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.36.3.	PPOV u Kolašinu	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.36.4.	Kanalizaciona mreža u Kolašinu	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje	0.00	0.00	0.00

					posljedica epidemije virusa COVID-19.			
10.36.5.	Kanalizaciona mreža u Mojkovcu	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.37.	Grant šema za energetska efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju	0.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
11.	Zakon o Prijestonici	655,100.00	4,321,900.00	4,977,000.00		168,976.88	2,072,655.82	2,241,632.70
11.1.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0.00	400,000.00	400,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	81.49	339,785.32	339,866.81

11.2.	Sanacija sportskih sala SRC Cetinje	15,100.00	22,000.00	37,100.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	12,890.73	0.00	12,890.73
11.3.	Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos"	55,000.00	545,000.00	600,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	13,557.50	98,820.59	112,378.09
11.4.	Rekonstrukcija Jabučke ulice i izgradnja II faze saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks	60,000.00	240,000.00	300,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	54,553.50	30,517.13	85,070.63
11.5.	Izgradnja staze sa atletskom stazom u naselju Humci	0.00	0.00	0.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.6.	Prihvatište za napuštene kućne ljubimce (azil)	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja	25,000.00	1,475,000.00	1,500,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	7,260.00	1,291,615.74	1,298,875.74
11.8.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	0.00	100,000.00	100,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	22,900.00	22,900.00

11.9.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	150,000.00	0.00	150,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	80,633.66	0.00	80,633.66
11.10.	Kupovina zemljišta za potrebe proširenja "Novog groblja"	130,000.00	0.00	130,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.11.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	5,000.00	15,000.00	20,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.12.	Unapređenje turističke ponude grada	20,000.00	80,000.00	100,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	77,890.88	77,890.88
11.13.	Kupovina lokacije za Lokandu	150,000.00	0.00	150,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.14.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	40,000.00	1,300,000.00	1,340,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	100,265.66	100,265.66
11.15.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju	0.00	139,900.00	139,900.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	110,860.50	110,860.50
12	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	575,000.00	5,000.00	580,000.00	U toku je realizacija.	293,436.06	0.00	293,436.06

	SVE UKUPNO	6,007,901.00	29,576,719.91	35,584,620.91		3,933,276.11	47,767,601.67	51,700,877.78
--	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

**1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA**

1.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

- Za potrebe smještaja administrativnih organa planirana je prenamjena već izgrađenog objekta na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića, koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Izgrađeni objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova, ukupne bruto površina cca 6.990 m².
- Završena je izrada projektnog zadatka, na osnovu kojeg će biti urađen Glavni projekat rekonstrukcije, u cilju prilagođavanja novoj namjeni, opremanja i uređenja lokacije za potrebe Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova.
- Javno nadmetanje za odabir obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je objavljeno 02.07.2020. godine. Isto je poništeno, a u toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje novog javnog nadmetanja za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.282.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 96,80 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.



1.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta palata pravde

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju i drugim opštinama po prioritetima. Takođe, sredstvima su obuhvaćene rekonstrukcija i izgradnja objekata Ministarstva pravde i Tužilaštva u Podgorici, kao i drugih objekata po prioritetima korisnika.
- Projektnom dokumentacijom za radove u objektima sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju planirano je poboljšanje energetske efikasnosti, formiranje

jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad, kao i prilagođavanje objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

- **Osnovni sud u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-326/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.

- **Osnovni sud u Nikšiću**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšići je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-324/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00 € za tekuće izdatke, od čega 1.790,80 € u 2020. godini.

- **Osnovni sud u Kotoru**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Kotoru raspisano je 19.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-1379/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.03.2019. godine, na iznos od 4.980,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820 €.

- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.980,00 € za tekuće izdatke, od čega 1.992,00 € u 2020. godini.

- **Osnovni sud u Beranama**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3283/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interforma" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.053,50 €.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i u toku je dorada projektne dokumentacije po primjedbama revizije. Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava.

- **Osnovni sud u Bijelom Polju**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3284/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interformom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.549,60 €.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i u toku je dorada projektne dokumentacije po primjedbama revizije. Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Vrhovni sud u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača za izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije je raspisano 26.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za izradu projekta postojećeg stanja objekta. Ugovor br. 01-1260/1 sa obrađivačem elaborata geodetskog snimanja lokacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.02.2019. godine, na iznos od 2.299,00 €.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta. Obaveza Vrhovnog suda i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi glavnog projekta.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.299,00 € za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos realizovan u 2020. godini.
- **Objekat Palate pravde**
- Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, kao i saglasnost glavnog gradskog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa, nakon čega će Uprava javnih radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

1.3. Izgradnja objekta Državnog tužilaštva u Podgorici

- Za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Tužilačkog savjeta – Sekretarijata, planirana je izgradnja novog objekta površine cca 12.000 m², na uglu Bulevara “Ivana Crnojevića” i Ulice “Vaka Đurovića”, u neposrednoj blizini već izgrađenog objekta za potrebe administrativnih organa.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na kompletiranju projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta.
- U skladu sa obavještenjem Ministarstva pravde, aktivnosti na raspisivanu javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije i revidenta će otpočeti nakon izrade Idejnog rješenja rekonstrukcije postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa koji se nalaze na istoj parceli i predlaganja varijantnih rješenja uređenja terena za cijelu parcelu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 125.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

1.4. Izgradnja Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-

italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.

- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50 €.
- Do sada je završena izrada armirno-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
- Nakon dobijanja smjernica od Ministarstva održivog razvoja i turizma pokrenuće se dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 633.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.094.302,71 € za tekuće izdatke, odnosno 2.856.428,57 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 4.286.503,42 €, od čega 133.000,00 € u 2020. godini.

1.5. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti

- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje sljedećih 6 objekata: zgradi Predsjednika Crne Gore, staroj zgradi Vlade u Podgorici, Upravi carina u Podgorici, zgradi državnih organa u Mojkovcu, Direkciji za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvu kulture na Cetinju.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 310.000 €.

- **Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64 €.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Do sada je završena izrada idejnog rješenja zgrade Stare Vlade Crne Gore u Podgorici i u toku je izrada glavnog projekta, dok je za zgradu Predsjednika Crne Gore završena izrada idejnog rješenja i isto je dostavljeno korisniku na saglasnost.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2229/1 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 8.107,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Do sada je završena izrada idejnog rješenja zgrade Uprave carina u Podgorici i u toku je izrada glavnog projekta, dok je za zgradu državnih organa u Mojkovcu u toku revizija projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju raspisano je 10.09.2019. godine.

Ugovor br. 01-334/20-944 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020, na iznos od 4.827,90 €.

- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju u toku je revizija projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

1.6. Rekonstrukcija objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412 m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
 - u suteranu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
 - u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
 - na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
 - u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
 - na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84 € .
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00 €.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi, osim fasade, zbog opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će Uprava javnih radova pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova, koji će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 110.000 €.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.617,60 € za tekuće izdatke, odnosno 238.898,37 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 242.515,97€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.



1.7. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos

od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar – inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „ Ing–invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00 €.
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02 €).
- Na realizaciji objekta magacina do sada realizovano 8.307,00 € za tekuće izdatke, odnosno 759.950,20 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 768.257,20 € od čega 388.752,06 € u 2020. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupaku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00 €.
- Ugovoreni radovi obuhvataju rušenje postojećih i izgradnju preostalih novih objekata smještajnog kompleksa SAJ i PJP na Zlatici (administrativno smještajni objekat, sportski objekat, objekat za dresuru pasa, garaže i drugi sadržaji).
- Do sada su završeni grubi građevinski radovi na administrativno smještajnom objektu „B“, radovi na izradi konstrukcije sportskog objekta, veći dio radova na objektu za dresuru pasa, završena je čelična konstrukcija i pokrivanje garaža, spoljašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i veći dio ograde oko kompleksa.
- U toku su radovi na izradi fasade, ugradnji spoljašnje bravarije i razvod instalacija na administrativno smještajnom objektu „B“, zidarski radovi na sportskom objektu, završni radovi na objektu za dresuru pasa, a nakon rušenja postojećeg objekta započeli su radovi na administrativno-smještajnom objektu „A”.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno 20.000 €, od čega 10.000 € za tekuće izdatke i 10.000 € za kapitalne izdatke.
- Na realizaciji projekta je do sada je utrošeno 266.674,15 € za tekuće izdatke, odnosno 2.573.622,27 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.840.296,62 €, od čega 2.919.731,95 € u 2020. godini.
- Prilikom izvođenja zemljanih radova na sportskom objektu, izvođač je utvrdio prisustvo visokonaponskih kablova koje je trebalo izmjestiti kako bi se nastavili radovi. Takođe, usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, na dijelu projektovane ograde obustavljena je izgradnja same ograde. Na lokaciji predviđenoj za izgradnju administrativno-smještajnog objekta „A”, postojeći objekat koji je predviđen za rušenje je oslobođen od ljudi i stvari od strane korisnika tek u avgustu tekuće godine, što će za posljedicu imati značajnije kašnjenje u odnosu na ugovoreni rok.



1.8. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici



- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
- Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00 €.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00 €.
- Do sada su završeni bušačko-minerski radovi u materijalu V i VI kategorije, mašinski iskop materijala u širokom otkopu za temelje objekta, sa utovarom i odvozom na deponiju, izrada sloja od tamponskog materijala, planiranje i valjanje, ispitivanje modula stišljivosti tamponskog sloja materijala ispod temeljne ploče TP-2, izrada tamponskog sloja ispod temeljnih traka i temelja samaca d=25 cm, izrada AB temelja za gradilišni kran;
- U toku je geodetsko obilježavanje i iskolčavanje osa objekta, armiranje stubova i zidnih platana, montaža oplata na stubovima i zidnim platnima, betoniranje stubova i zidnih platana, nasipanje tamponskim materijalom oko temelja samaca i trakastih temelja, iskop rova za fekalnu kanalizaciju, armiranje i betoniranje podne ploče iznad trakastih temelja i temelja samaca.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 3.098.063,91 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 89.240,72 € za tekuće izdatke, odnosno 975.857,18 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 1.065.097,90 €, od čega 1.120.132,21 € u 2020. godini.

1.9. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

- **Rekonstrukcija kompleksa kasarna “Masline” za potrebe Vojske Crne Gore**
- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane. Planirano je da se rekonstrukcija kompleksa odvija fazno.

- Ministarstvo odbrane je kroz prvu fazu realizacije obihvatilo rekonstrukciju dva postojeća objekta i to objekte M18 i M19 za potrebe logističkog bataljona i vojne policije.
- Ministarstvo odbrane je zaključilo ugovor sa izvođačem radova "Bemax" d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 2.970.291,19 € i sa vršiocem stručnog nadzora "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, vrijednosti 84.700,00 €.
- Do sada su završeni svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji objekta. U toku je izrada konačnog obračuna.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.500.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 78.481,33€ za tekuće izdatke, odnosno 2.774.037,25 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 2.852.518,58 € u 2020. godini.

1.10. Objekti za potrebe Državne revizorske institucije

- Obaveza Državne revizorske institucije i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi Glavnog projekta.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je u 2020. godini završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta i isti dostavila Korisniku.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 665,50 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

1.11 Izgradnja objekta za potrebe MONSTAT-a

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 60.000 €.
- U saradnji sa nadležnim institucijama MONSTAT je sproveo proceduru kupovine objekta za svoje potrebe.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

1.12. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac

- **Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu**





- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520 m², uz dodatnih 1135 m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.
 - Konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja je sprovelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine. Ugovor br. 01-8439/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing-invest“ d.o.o., Danilovgrad, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 86.817,50 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-523 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-impuls“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 8.954,00 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije izuzev u dijelu trafostanice.
 - U toku su aktivnosti na pribavljanju urbanističko-tehničkih uslova za izmiještanje dalekovoda i izgradnju nove trafostanice u okviru kompleksa.
 - Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
 - Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- **Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac**
 - U skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, Ministarstvo pravde sprovodi aktivnosti na izradi projekta “Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac”. Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.
 - Uprava javnih radova je, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovela procedure javnih nabavki i zaključila ugovore za izradu i reviziju geodetskih i geotehničkih podloga za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora u sjevernoj regiji – Opština Mojkovac.
 - Početkom 2020. godine završena je izrada geodetskih podloga, dok je u toku izrada Konačnog izvještaja o reviziji Elaborata o geotehničkim svojstvima terena.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 130.000 €.

2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE


2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici



- U objektu bivšeg Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², koji je rekonstruisan i nadograđen, biće smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- Ugovor br. 01-1410/1 sa obrađivačem glavnog projekta, Arhitektonskim fakultetom u Podgorici, je zaključen 25.05.2007. godine, na iznos od 105.300,00 €.
- Ugovor br. 01-60091 sa izvođačem, „Cijevna komerc” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2008. godine, na iznos od 8.681.607,07 €.
- Ugovor br. 01-2483/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 01.07.2010. godine, na iznos od 51.700,00 €.
- U 2017. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, postavljanju akustičnih panela i nabavci opreme za potrebe Crnogorske kinoteke. Ugovor br. 19/2-01-2174/1 sa izvođačem, „Simes inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 4.499.783,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-2079/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 18.05.2017. godine, na iznos od 99.999,99 €.
- Ugovor br. 01-3241/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 15.05.2019. godine, na iznos od 14.900,00 €.
- Izvođenje radova nastavljeno je i u 2018. i 2019. godini i isto je obuhvatilo i izgradnju nove trafostanice.
- Ugovor br. 01-1163/1 sa obrađivačem glavnog projekta trafostanice NDTS 10/0,4kV, „Ramel” d.o.o. Nikšić, je zaključen 22.02.2019. godine, na iznos od 3.478,75 €.
- Ugovor br. 01-1049/1 sa revidentom glavnog projekta trafostanice NDTS 10/0,4kV, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2019. godine, na iznos od 726 €.
- Ugovor br. 01-2785/1 sa stručnim nadzorom nad izvođenjem radova NDTS 10/0,4kV, „RMA” d.o.o. Nikšić, je zaključen 22.04.2019. godine, na iznos od 968,00 €.
- Do sada su završeni svi radovi, a u toku je tehnički prijem objekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 68.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 253.740,74 € za tekuće izdatke, odnosno 12.978.465,53 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 13.232.206,27 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na neusaglašenost i nekompletnost projektne dokumentacije.

2.2. Rekonstrukcija Dvorca kralja Nikole u Nikšiću

- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu su smješteni: zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv i depoi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66 €.
- U toku je izvođenje radova na rušenju i demontaži podnih i zidnih obloga, stolarije i oštećenih djelova krovne konstrukcije.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

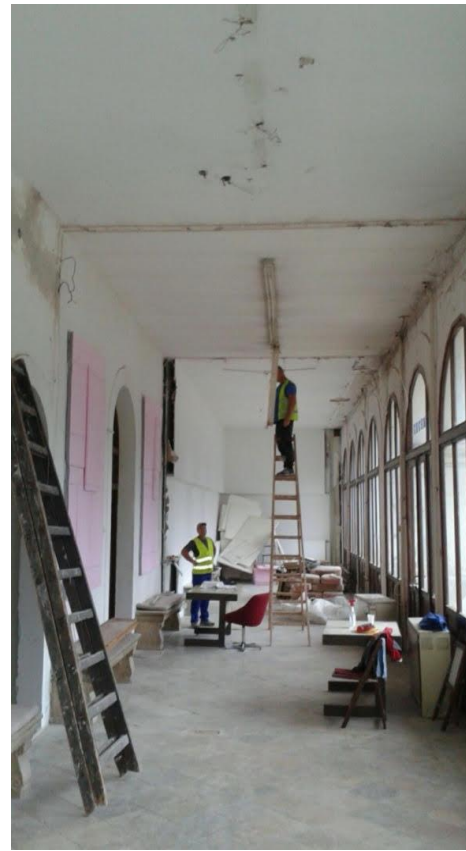

2.3. Izvođenje radova, nabavka oprema i unapređenje objekata u funkciji kulture

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za

objekte: Narodni muzej, JU Crnogorsko narodno pozoriše u Podgorici, Nacionalna biblioteka "Đurađ Crnojević", kulturno dobro "Tamnica Jusovača", Kuća crnogorske istorije i drugih objekata iz oblasti kulture. Projekti se finansiraju iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Riječ je o višegodišnjim projektima.

- Zakonom o budžetu za 2020. godine obezbijedeno je 285.000 €.

- **Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju**

- Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-7157/1 sa izvođačem, „Was design” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na

iznos od 206.000,01€.

- Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
- U toku su pripremne aktivnosti na početku izrade opreme.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a**

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Glavog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.950.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Glavnog grada je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja**

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Opštine Plužine, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 285.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca

stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- **Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)**
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.300.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Opštine Ulcinj je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioica stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

2.4. Dogradnja objekta JU "Zahumlje" u Nikšiću



- U prizemlju objekta projektovane su nove kancelarije, bina i sala, a na prvom spratu muška i ženska svlačionica, muzička soba, sala, prostorije za šivenje, kuhinja i klub, ukupne površine oko 318 m². Spratnost: prizemlje i sprat.
- Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Nikšić. Projektant glavnog projekta je „Lisina“ d.o.o. Nikšić, dok je revident glavnog projekta Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8178/1 sa izvođačem, „Tehnogradnja“ d.o.o. Pljevlja, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 283.568,66 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.09.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8030/1 sa

stručnim nadzorom, „Europrojekt“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 8.100,00 €.

- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno 300.000 €, od čega 10.000 € za tekuće izdatke i 290.000 € za kapitalne izdatke.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.700,00 € za tekuće izdatke, odnosno 282.603,93 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 291.3030,93 €, od čega 267.195,55 € u 2020. godini.

2.5. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja “Creativ Hubs” u Baru



- Kroz predmetnu kumulativnu poziciju sprovedene su aktivnosti na adaptaciji palate objekta br. 85 za potrebe uspostavljanja Creative Hub-a, Stari grad Bar.
- U prizemlju objekta, u prostoru nekadašnje konobe, organizovan je multifunkcionalni prostor koji treba da zadovolji informativnu, uslužnu i komercijalnu djelatnost. Osmišljen je kao prostor za druženje, odmor, prostor za kratke konsultacije, sastanke sa strankama, informativni pult i prodajni prostor. Na prvom spratu organizovan je radni prostor za primijenjeno vajarstvo. Na drugom spratu organizovan je kreativni prostor za umjetnike koji se bave fotografijom, grafikom, modelovanjem. Na trećem spratu organizovana je smještajna zona za umjetnike. Površina objekta je 221.11m². Spratnost: prizemlje i tri sprata.
- Projektну dokumentaciju je obezbjedilo Ministarstvo kulture. Projektant glavnog projekta je „ACEP“ d.o.o. Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8745/1 sa izvođačem, “Euromont stil” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.11.2019. godine, na

iznos od 256.630,83 €.

- Ministarstvo kulture raskinulo je ugovor sa nadzorom "Acep" d.o.o. Cetinje zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Novi ugovor sa nadzorom "Urbi pro" d.o.o. Podgorica Ministarstvo kulture je potpisalo 04.03.2020. godine.
- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 120.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 177.695,24 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 177.695,24 €, od čega 157.393,32 € u 2020. godini.
- Zbog prekoračenja ugovorenog roka od 32 dana, izvođaču su naplaćeni penali u skladu sa ugovorom, u iznosu od 78.935,59 €.


2.6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru. Riječ je o višegodišnjem projektu.
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi neophodnu dokumentaciju, urbanističko-tehničke uslove, projektne zadatke, idejna rješenja na osnovu kojih bi Uprava javnih radova pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 45.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

2.7. Muzej savremene umjetnosti u Podgorici

- Obaveza Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 60.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

2.8. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju

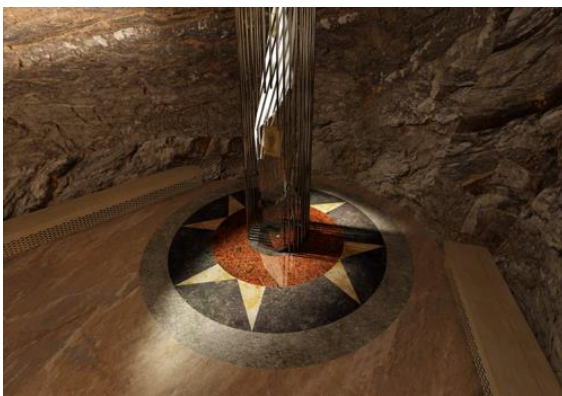

- Objekat se nalazi se na zahvatu DUP-UP-a Istorijsko jezgro- Cetinje. Bruto površina objekta je 635,98 m², i sastoji se od prizemlja i dvije eteže ukopane u zemlji. Objekat služi za kontemplaciju ikone Bogorodice Filermose. Nalazi se u pećini, s toga nije vidljiv spolja, niti sa jedne tačke grada, i ne nalazi se u vizuelnom i fizičkom konfliktu sa okolinom.
- Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta .
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7297/1 sa izvođačem, „Neimar inzenjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.12.2016. godine, na iznos od 1.594.839,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (za zemljane radove) je raspisano 26.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1915/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na uvođenju izvođača u posao u septembru 2019. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole od strane Prijestonice Cetinje, kao i izrada elaborata pripremnih radova od strane izvođača radova, ali su radovi obustavljeni zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 128.500 € za tekuće izdatke. Ukupno je realizovano 128.500 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na lokaciji, ugovoreni radovi su obustavljeni i urađen je elaborat pripremnih radova kojim su predviđeni radovi na zaštiti ulaza u pećinu. S obzirom na to da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dala saglasnost na elaborat pripremnih radova, Uprava javnih radova je obustavila dalje aktivnosti na realizaciji projekta dok se ne izvrši dopuna tehničke i druge dokumentacije potrebne za izvođenje radova, a čiji izradu sprovodi Ministarstvo kulture.

2.9. Rekonstrukcija kulturnog dobra Gradski bedem – ostaci Onogošta u Nikšiću

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zadužena je Uprava javnih radova da realizuje projekat “Valorizacija Gradskih bedema – ostataka Onogošta, izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa, I i II faza”.
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektну dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

2.10. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju

- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektну dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

- Zakonom o budžetu za 20250. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.


3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

1. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru



- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019. i 2020. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

3.2. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru

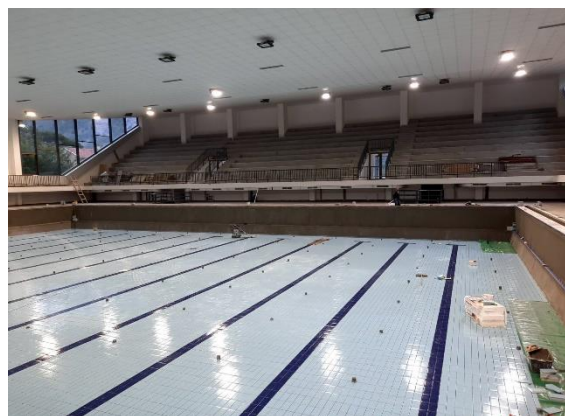



- Objekat bazena čija je rekonstrukcija u toku, nalazi se na katastarskoj parceli 237/1, KO Škaljari 1, površine cca 5.980 m², dok je bruto površina objekta 5.400 m².
- Na prizemnoj etaži objekta smještene su: četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorije VK „Primorac“ i tehničke prostorije. Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se: osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama. Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.
- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili: sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- Radovima II faze rekonstrukcije predviđeni su: svi radovi neophodni za stavljanje objekta u funkciju, odnosno radovi na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehničkim i splinker instalacijama, kao i instalacije bazenske tehnike, radovi na uređenju terena i opremanje objekta namještajem.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.07.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-3688/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 11.09.2014. godine, na iznos od 99.365,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.12.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-939/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhient“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2015. godine, na iznos od 9.945,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2016. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 24.06.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5422/1 sa izvođačem, „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.09.2016. godine, na iznos od 796.997,22 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 29.07.2017. godine. Ugovor br. 19/2-01-2636/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 16.641,28 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-841/1 sa izvođačem, „Neimar inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine,

na iznos od 3.480.077,34 €. Za dodatne radove ugovor br. 01-7111/1 od 20.09.2019. godine, na iznos od 159.994,74 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora II faze je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 01-1033/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.02.2019. godine, na iznos od 46.886,00 €.
- Do sada su završeni radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi drvene krovne konstrukcije i krovnog pokrivača .
- U toku su radovi na izradi cementne košuljice na šetnici bazena, gletovanje zidova i plafona, montaža rasvjete, izrada podne keramike i radovi na izradi fasade, montaža opreme i namještaja, kao i radovi na infrastrukturnim priključcima i uređenju terena.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.500.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.505,28 € za tekuće izdatke, odnosno 2.198.094,30 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 2.220.599,58 €, od čega 1.742.747,38 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na prolongiranje roka završetka radova zbog problema definisanja lokacije deponije za odlaganje gradilišnog otpada, propusta u projektnoj dokumentaciji i značajnog propadanja objekta, usljed neodržavanja, u periodu od izrade projektne dokumentacije do početka izvođenja radova. Takođe, rok završetka radova je prolongiran jer su se u prethodnom periodu radovi odvijali smanjenim intenzitetom, dijelom zbog neažurnosti izvođača radova (nedovoljan broj radne snage u odnosu na obim ugovorenih radova) i dijelom zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19.

3.3. Izgradnja sportskih terena i sala

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena u Šavniku, Rožajama, Beranama i Kolašinu. Riječ je o višegodišnjim projektima.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 50.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

3.4. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću



- Sportska sala je projektovana u krugu školskog centra „Tvrtko Bijelić“, u neposrednoj blizini školskog objekta, u Ulici „Narodne omladine“ u Nikšiću.

- Objekat sadrži: fiskulturnu salu sa gledalištem, planiranu za potrebe fakulteta i za sportska takmičenja - srednji nivo takmičenja, odnosno regionalna takmičenja, takmičenja lokalnih i malih klubova, trening i rekreaciju. Uz salu planirane su garderobe, spravarnica, kancelarije i druge pomoćne prostorije. Bruto površina objekta je 1.000 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2296/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.04.2019. godine, na iznos od 14.822,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.06.2017. godine. Ugovor br. 1904/18-17 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2018., na iznos od 2.450,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2020. godini.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 210.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.272,50 € za tekuće izdatke, dok kapitalnih izdataka nije bilo. Ukupno je realizovano 17.272,50 €, od čega 8.379,00 € u 2020. godini.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4829 sa obrađivačem glavnog projekta, „A12” d.o.o Podgorica, je zaključen 08.08.2018. godine, na iznos od 14.670 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano u januaru 2019. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922-1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 3.950,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8179/1 sa izvođačem, „Tehno-gradnja” d.o.o Pljevlja, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 1.626.827,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8230/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.10.2019. godine, na iznos od 48.400,00 €.
- Do sada su završeni radovi na temeljnoj konstrukciji, izrada glavnih AB stubova i nosača, zidarskim i pokrivačkim grubim radovima. Takođe, završeni su grubi građevinski radovi na objektu.
- U toku je montaža rešetkaste krovne konstrukcije na objektu i pokrivačkih radovi.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 210.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.100,00 € za tekuće izdatke, odnosno 881.092,72 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 893.192,72 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.



3.6. Izgradnja školsko-sportske dvorane u Gusinju

- Školsko-sportska dvorana u Gusinju je locirana u zahvatu Plana uređenja naselja Gusinje.
- Objekat je spratnosti visoko prizemlje; površine 2.180 m², sa sljedećim sadržajima: glavni ulaz sa biletarnicom i sanitarnim blokom, igralište za rukomet, košarku i odbojku, tribine za gledaoce kapaciteta 500 mjesta, prostorija za rekvizite, svlačionice za učenike i nastavnike sa toaletom i tuševima, kancelarije za zaposlene, kao i tehničke prostorije. Prostor dvorane je osim za razne vrste sportova planiran da se koristi i za druga dešavanja kao što su: koncerti, plesne večeri, plesna takmičenja, proslave i mnoga druga društvena dešavanja. U okviru parcele formirana je interna saobraćajnica, parking sa 70 parking mjesta za vozila i 4 parking mjesta za autobuse.

- Tehnička dokumentacija za predmetni objekat je izrađena i revidovana 2014. godine u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.
- U oktobru 2017. godine došlo je do promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti građevinarstva, u skladu sa kojim je neophodno prilagoditi tehničku dokumentaciju, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji.
- S obzirom na to da je Plan uređenja naselja Gusinja prestao da važi istekom vremena za koji je donijet, nakon usvajanja PUP-a od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, sagledaće se dalji koraci i procedure oko realizacije projekta izgradnje sportske dvorane u Gusinju.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

3.7. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK "Sutjeska" u Nikšiću

- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore - Uprave javnih radova, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000 €, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000 € biće obezbijeđena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem, "Roaming Montenegro" d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92 €.
- U toku je montaža čelične konstrukcije, zidarski radovi i grubi razvod elektro i mašinskih instalacija.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 188.896,83 € za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.





3.8. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju



- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Projekat se izvodi kroz nekoliko faza izgradnje: faza I – zapadna tribina sa pripadajućim uređenjem terena , faza II – sjeverna i južna tribina sa pripadajućim uređenjem terena i faza III – istočna tribina sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000 €, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave javnih radova. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000 €.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem , „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-

1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00 €.

- Do sada su završeni zemljani radovi na izgradnji tribina i završni radovi na izradi AB konstrukcije tribina.
- U toku su: zidanje fasadnih i pregradnih zidova od giter bloka, betonaža monolitnih djelova sjeverne tribine i betonaža tribina u dijelu VIP loža na istočnoj i zapadnoj tribini, izrada oplata i montaža armature za monolitizaciju sjeverne tribine, izrada oplata za atiku, oblaganje zidova fasadnim kamenom, izrada pregradnih gips-kartonskih zidova, završni radovi na čeličnoj konstrukciji zapadne tribine, spajanje segmenata glavnog nosača, montaža nosača i kosnika na istočnoj tribini, postavljanje rožnjača na istočnoj tribini, unutrašnji razvod hidrotehničkih instalacija na prizemlju zapadne tribine, kao i radovi na elektro instalacijama jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 50.000 €.
- Na realizaciji projekta na osnovu Zakona o budžetu do sada je utrošeno 87.415,00 € za tekuće izdatke, odnosno 2.265.129,50€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.352.544,50 €, od čega 276.886,18 € u 2020. godini .
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na to da je zbog promjena nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom, vršena je kontrola projekta konstrukcije, a sve u cilju izgradnje objekta koji je stabilan i bezbjedan za upotrebu, što je dodatno usporilo izvođenje radova. Takođe, zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji i lokacije koja i do danas nije kompletno oslobođena za nesmetano izvođenje radova, što je obaveza prijestonice Cetinje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom.

4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- U periodu od 2008. godine odvijaju se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u vezi sa rješavanjem trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države.
 - Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, studije vodosnabdijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, PPOV u Andrijevici, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije.
 - Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova i velike investicione vrijednosti, dio njih planiran je da se finansira kroz instrument predpristupne pomoći IPA programa, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
 - Koordinator ovih projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
 - Projekat se realizuje u kontinuitetu.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 189.000 €.
-
- **Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu**
- Dužina fekalne kanalizacione mreže iznosi 6 km.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.18.2018. godine, na iznos od 3.150,00 €.
 - Projektne dokumentacije je dijelom ispravljena po primjedbama revidenta.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 18.150,00 € za tekuće izdatke. Ukupno je realizovano 18.150,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
 - U toku revizije glavnog projekta došlo je do neslaganja između projektanta i revidenta o pitanju geodezije. U cilju rješavanja spora, Uprava javnih radova je angažovala arbitražu. S obzirom na to da izabrani arbitar u konačnom nije izjasnio o ovom pitanju, dalja realizacija ovog projekta će biti obustavljena.
-
- **Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama**
- Planirana je izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže opštine Rožaje, na osnovu projektne zadatka koji je dostavljen Upravi javnih radova od strane Opštine Rožaje.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta je raspisano 27.12.2019. godine.

- U toku je postupak potpisivanja ugovora sa obrađivačem glavnog projekta i revidentom.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

- **Izrada elaborata procjena uticaja na životnu sredinu - PPOV Rožaje**

- Planirana je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijska zona Zeleni u opštini Rožaje. Elaborat o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu izrađuje se za postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) u Rožajama, prema tehničkom rješenju definisanom u studiji izvodljivosti, a u skladu sa projektnim zadatkom koji je Upravi javnih radova dostavila Opština Rožaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača Elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu je raspisano 20.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2703 sa obrađivačem Elaborata, „Medix” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2020. godine, na iznos od 10.890 €.
- Izrada Elaborata je završena, a u toku je prevođenje istog na engleski jezik.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

- **Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu**



- U 2017. godini Uprava javnih radova je sprovedla aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Kolašin su kandidovali finansiranje projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja kroz IPA fond. Planirano je da se postrojenje gradi po principu "projektuj i izgradi" po pravilima Fidica, a kanalizaciona mreža na osnovu glavnog projekta za koji su u toku aktivnosti na pripremi projektnog zadatka. Nakon što projektni zadatak bude dostavljen, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Glavni projekat kanaliziranja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja**
- Predviđena je izrada Glavnog projekta kanaliziranja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, a koji se sastoji od tri podprojekta, i to:
 - Kanaliziranje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora u Donjem polju do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora,
 - Hidrotehnički tunel Belveder i
 - Odvođenje poplavnih voda od izlaznog portala tunela Belveder i prečišćenih otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do recipijenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 01.09.2015. godine. Ugovor br. 19/01-4873/1 sa obrađivačem glavnog projekta, konzorcijum „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad; „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica i „Lars fire” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2015. godine, na iznos od 198.420,60 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 01-3281/1 sa revidentom glavnog projekta, “Nik com” d.o.o Nikšić, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 7.444,54 €.
- Revizija glavnog projekta je završena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 158.736,48 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 158.736,48 €, od čega 59.526,18 € u 2020. godini.
- Radovi na kanaliziranju i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja su kandidovani za finansiranje kroz IPA fond.
- **Izrada Studije vodosnabdijevanja opštine Bar**
- Planirana je izrada studija vodosnabdijevanja Opštine Bar, a u skladu sa projektnim zadatkom dostavljenim Upravi javnih radova od strane Opštine Bar.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2955 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „E3” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 64.009,00 €.
- U toku je izrada studije u skladu sa ugovornim obavezama.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata sanacije postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore, kao i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 380.000 €.

- **Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu**

- Objekat je na lokaciji Marića luka u okviru radne zone bivšeg rudnika olova i cinka “Brskovo” u opštini Mojkovac. Ukupna površina lokacije iznosi 9.774,37 m². Predviđeni su sljedeći sadržaji: hala za tehnološku liniju reciklaže, upravna zgrada sa portirnicom, vaga i uređeni plato kao manipulativni prostor za saobraćaj kamiona, parking prostor i zaštitna ograda sa kapijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 05.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-541/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.02.2016. godine, na iznos od 32.963,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-07-7682/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.12.2016. godine, na iznos od 1.804,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1829/1 sa izvođačem, “Crnagoraput” a.d. Podgorica, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 1.940.117,48 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-3140/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos 42.400 €.
- Do sada su završeni građevinski radovi na portirnici, grubi građevinski radovi na sortirnici, uređenju terena, pristupni put do rezervoara za vodu i radovi na obalnoj utvrđi.
- U toku su radovi na sortirnici i radovi na rezervoaru.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 61.591,40 € za tekuće izdatke, odnosno 1.204.701,29 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.082.438,63 €, od čega 248.987,51 € u 2020. godini.
- Zbog promjene terena na lokaciji, uslovljene poplavama i bujičnim vodama, izvršena je dopuna projekta u skladu sa stanjem na terenu.



- **Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane**



- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00 €.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspeksijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.

- Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava javnih radova je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković“ pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava javnih radova navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlaštenog lica firme „Tošković“ ima elemenata krivičnog djela prevare.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.970,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 19.970,00 €, od čega 4.900,00 € u 2020. godini.

• **Transfer stanica u Andrijevići**

- Objekat transfer stanice u Andrijevići je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhiplan Crna Gora“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, „Inženjering put“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
- Završena je izgradnja pristupnog puta.
- U toku je izgradnja armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 33.320,00 € za tekuće izdatke, odnosno 57.037,75 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 90.357,75 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na dinamiku izvođenja radova. Nadzor smatra da će rok biti probijen zbog uslova na koje izvođač objektivno nije mogao uticati, a koji se odnose na otežano poslovanje usled situacije sa pandemijom COVID-19 virusa koja je uslovlila otežanu proizvodnju i uvoz specifične opreme.

• **Sanacija odlagališta Zakršnica**

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektne zadatke i isti dostavila Upravi javnih radova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00 €.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.424,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 17.424,00 €, od čega nije bilo realizacije u 2020. godini.

- **Transfer stanica u Pljevljima**

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Pljevlja su dostavili projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove neophodne za izradu glavnog projekta.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

- **Sanacija odlagališta u Plavu**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 12.10.2016. godine, vrijednost ugovora 250.000 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2018. godini završena je izrada glavnog projekta.
- Početak radova planiran je za jul 2018. godine, ali se radovi nijesu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Krajem 2018. godine Opština Plav je riješila sporove sa građanima, čime su se stvorili uslovi da se sa radovima započne u 2019. godini.
- U 2019. godini radovi su započeti čim su se za to stekli povoljni vremenski uslovi i završeni su krajem 2019. godine, osim ozelenjavanja, koji će se realizovati u 2020. godini, u skladu sa vegetativnim periodom planiranog rastinja.
- Ukupno je realizovano 118.560,01 €, od čega 4.940,00 € u 2020.godini.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Plav, kao i situacija sa pandemijom virusa COVID-19, zbog čega je u martu i aprilu mjesecu ove godine bilo ograničeno kretanje među državama i predstavnici Konzorcijuma izvođača iz Slovenije nijesu bili u mogućnosti da završe radove koji se odnose na hortikulturu, a koji se izvode u prolječnim mjesecima.

4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

- Direkcija javnih radova je u 2014. godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju, koja je u vezi s hidrotehničkim tunelom u Mojdežu, opština Herceg Novi. Projektnu dokumentaciju za I fazu radova izradila je firma „Geo T“ doo iz Podgorice, a revident projektne dokumentacije je „Grad Dark“ doo iz Podgorice.
- Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze.

- Radovi I faze su okončani u oktobru 2015. godine i podrazumijevali su sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350 m. Radovi su se odnosili na tunnelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela.
- Radovi II faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela, izradi betonskog čepa i vodonosnih vrata.
- Da bi se imao uvid u zatečeno stanje tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije II faze potrebno ga je u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Za ove radove javno nadmetanje je raspisano početkom 2016. godine, izabran je najpovoljniji ponuđač, ali je zbog žalbe postupak prolongiran.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.03.2018. godine.
- Ugovor br. 101-1560/1-3208/1 sa izvođačem, „Bi kod” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.06.2018. godine, na iznos od 275.716,65 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.11.2016. godine.
- Ugovor br. 101-1560/1-4650/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.08.2018. godine, na iznos od 5.831,00 €.
- Završeni su svi ugovoreni radovi.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 100.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 43.387,40 € za tekuće izdatke, odnosno 1.128.226,27 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.171.613,67 €, od čega 47.181,40 € u 2020. godini.



4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata izgradnje sistemima vodosnabdijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Andrijevića i drugim opštinama, po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 321.800 €.

- **Vodovod Krkori**

- Realizacija ovog projekta odvijala se fazno.
- U 2015. godini završena je rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na izvorištu Krkori, kao i izgradnja cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85 km.
- U 2016. i 2017. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda. Takođe, ugovoreno je i završeno opremanje hlorne stanice i spajanje vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom.
- U 2017. godini ugovoreno je izvođenje radova III faze koja obuhvata izgradnju 7 km primarnog cjevovoda od hlorne stanice ka gradu i dogradnju vodozahvatne građevine sa pratećom opremom.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača (III faza) je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor (III faza) br. 101-1560/1-4341/1 sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.11.2017. godine, na iznos od 478.496,27 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (III faza) je raspisano 26.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor (III faza) br. 101-1560/1-4972/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.08.2018. godine, na iznos od 6.400,00 €.
- Završeni su svi ugovoreni radovi.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 38.451,80 € za tekuće izdatke, odnosno 1.289.883,64 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.328.335,44 €, od čega 65.030,76 € u 2020. godini.



- **Rezervoar Gradiošnica i sistem vodosnabdijevanja u Tivtu**

- Planirana je fazna realizacija ovog projekta. Prva faza predstavlja izgradnju rezervoara "Gradiošnica".
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5167/1 sa izvođačem „Bauer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.08.2018. godine, na iznos od 546.660,46 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2528/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2018. godine, na iznos od 3.260,00 €.

- Završeni su svi ugovoreni radovi.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 546.143,31 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 546.143,31 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- **Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu**
 - Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
 - Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00 €.
 - Do sada su sprovedene aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradu tehničke dokumentacije i izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
 - U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije.
 - Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
 - **Izgradnja i unapređenje sistema vodosnabdijevanja Zaton, opština Bijelo Polje**
 - Ugovornom i projektnom dokumentacijom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji cjevovoda u dužini od cca 10 km, kao i radova na izmještanju postojeće trase vodovoda u dužini od cca 3 km, preko rijeke Lim.
 - Projektну dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 22.07.2019. godine. Ugovor br. 01-9181/1 sa izvođačem, "Indel Inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2019. godine, na iznos od 484.870,41 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1193 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2020. godine, na iznos od 9.777,00 €.
 - U toku realizacije projekta, utvrđeno je da stručni nadzor "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica nije ispunjavao ugovorne obaveze u smislu vršenja stalnog i svakodnevnog nadzora, pa je isti jednostrano raskinut od strane Uprave javnih radova i aktivirane su garancija banke i polisa osiguranja.
 - Novi ugovor br. 01-334/20-4270 sa stručnim nadzorom, "Sistem MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.06.2020. godine, na iznos od 7.258,79 €, na osnovu sprovedene procedure po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti.
 - Završeni su svi ugovoreni radovi.
 - U toku je izrada završnog izvještaja stručnog nadzora.
 - Na realizaciju projekta do sada je utrošeno 3.502,05 € za tekuće izdatke, odnosno 484.563,90 € za kapitalne izdatke
 - Ukupno je realizovano 488.065,92 €, kompletan iznos u 2020. godini.



- **Vodovod Šavnik**

- Izgradnja rezervoara na vodovodu u Šavniku obuhvataju: geodetske, hidrotehničke i zanatske radove. Takođe, obuhvaćeni su opremanje hidrostanice i izrada pristupnog puta za rezervoar.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Šavnik.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1145 sa izvođačem, „Temko” d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.02.2020. godine, na iznos od 489.037,62 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2947 sa stručnim nadzorom, „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.05.2020. godine, na iznos od 10.769,00 €.
- Izvođač je uveden u posao i realizovano je 30% ugovornih obaveza.
- Završeni su radovi na većem dijelu krakova vodovoda i započeti su radovi na pristupnom putu.
- U toku su mašinski, instalaterski i ostali radovi na kraku 4. Na rezervoaru „Turija” u toku je betoniranje sloja za izradu hidroizolacije temeljne ploče rezervoara.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.400 € za tekuće izdatke, odnosno 70.305,78 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 70.305,78 €, cjelokupan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da se radovi odvijaju usporenom dinamikom zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19.

- **Vodovod Čosovsko vrelo u Rožajama**



- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini Uprava javnih radova je izradila glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreni su i završeni radovi II faze, koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Ćosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni.
- U 2017. godini izvođeni su radovi III faze na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, sve dok su to dozvaljali vremenski uslovi. U 2018. godini radovi III faze su završeni.
- Takođe, u 2018. godini ugovoreno je za izvođenje radova IV faze, čime bi realizacija ovog projekta biti kompletirana.
- Glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Projektant je „Hydrogis” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6367/1 sa izvođačem radova, „Indel-inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2018. godine, na iznos od 397.845,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 19.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8142/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos od 4.600,00 €.
- Završeni su svi radovi predviđeni IV fazom za MZ Klanac, MZ Ramoviće i MZ Sređani.
- U toku je priprema za ispitivanje mreže.
- Na realizaciji IV faze do sad je utrošeno 397.845,50 € za kapitalne izdatke, odnosno 4.600,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 402.245,00 € u 2019. godini, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Rožaje, zbog čega se nije moglo naći adekvatno mjesto za smještaj buster stanice za vodovod MZ Sređani.

- **Vodovod u selu Ponari, Gradska opština Golubovci, Donja Zeta**

- Ponari su naselje u dijelu Donje Zete. Vodovod je zahvata dužinu 3.765 m, prečnika cijevi DN 110.
- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2369 sa izvođačem, “Kojo group” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 61.908,19 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 16.04.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postpuku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2910 sa stručnim nadzorom, “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 4.440,70 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.220,35 € za tekuće izdatke, odnosno 44.245,40 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 46.465,75 €, od čega 46.465,75 € u 2020. godini.

- **Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima**

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00 €.
- Do sada su završeni radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 41.499,99 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 77.360 € za tekuće izdatke, odnosno 278.950 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 356.314,50 €, od čega 282.584,50 € u 2020. godini.
- U toku realizacije projekta došlo je do pojave viškova radova koji se tiču fazonskih komada u cijevnoj galeriji, kao i količine ispune svih filterskih polja, usljed neusklađenosti radova ugovorenih predmjerom i predračunom i onih koje je bilo potrebno izvesti na licu mjesta. Uprava javnih radova je nakon prikupljanja potrebne dokumentacija i dobijanja saglasnosti od Ministarstva finansija, raspisala pregovarački postupak u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava kako bi se zatvorila funkcionalna tehnološka cjelina, a u svemu u skladu sa zahtjevima i potrebama krajnjeg korisnika DOO "Vodovod" Pljevlja i Opštine Pljevlja.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz insalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929 €.
- Do sada su završeni radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnjosti postrojenja.
- U toku je nabavka pumpi i porebnog materijala za njihovu ugradnju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.162 € za tekuće izdatke, odnosno 201.000,50 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 204.162,50€, od čega 204.162,50 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je izvođač radova utvrdio, a stručni nadzor potvrdio da projektnom dokumentacijom nijesu obuhvaćene pozicije elektro ormara i frekventnih regulatora za zavojne pumpe. Projektom nije obuhvaćena šema, na koji način treba da pumpe budu frekventno regulisane u odnosu na parametre mutnoće. U toku je rješavanje navedene problematike, u saradnji sa projektantom, revidentom i krajnjim korisnikom DOO „Vodovod“ Pljevlja i Opština Pljevlja.

4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistemi za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Šavnik, Rožaje, Žabljak, Bijelo Polje, Plav, Andrijevića, Petnjica, Cetinje, Mojkovac, Podgorica i Vranjina. Riječ je o višegodišnjem projektu.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 277.100 €.

• Kanalizaciona mreža na Vranjini

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00 €.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.833,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 8.833,00 €, kompletan iznos u 2020. godini.

• Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kovačka dolina, opština Žabljak

- Dužina fekalne kanalizacije na lokaciji Kovačke doline u opštini Žabljak je 886 m.

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je ponovo raspisano 06.06.2019. godine, nakon što je 2018. godine Državna komisija oborila odluku o izboru. Ugovor br. 01-6162/1 sa izvođačem, "Temko" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 228.701,33 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7564/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2018, na iznos 3.630,00 €.
 - U toku je polaganje cijevi fekalne kanalizacije, zatrpavanje, postavljanje revizionih okana i drugi radovi.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 67.802,76 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 67.802,76 €, pri čemu nije bilo realizacije u 2020. godini.
 - Na prolongiranje rokova izvođenja radova uticali su nepovoljni vremenski uslovi, novonastala situacija sa pandemijom virusa COVID-19, kao i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.
- **Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac**



- Dužina trase, čija je izgradnja dogovorena je 553,64 m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 05.08.2011. godine. Ugovor br. 01-474211 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2011. godine, na iznos od 19.460,00 €.

- Ugovor br. 01-780 između revidenta glavnog projekta, „Projectman” d.o.o Podgorica, i Opštine Mojkovac, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.210 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8029/1 sa izvođačem, „Konstruktor group” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 118.465,28 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01 – 334/20 – 522 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt ” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020, na iznos 4.833 €.
- U toku je izvođenje instalaterskih, zemljanih i asfaltnih radova, kao i polaganje cijevi fekalne kanalizacije DN 250 i DN 315.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.460,00 € za tekuće izdatke, odnosno 32.919,24 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 52.379,24 €, od čega 32.919,24 € u 2020. godini.
- Problematika koja je pratila radove je pojava nepredviđenih i dodatnih radova, zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.

• **Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik**

- U pitanju je linijski objekat sa sljedećim radovima: zemljani radovi, ugradnja kanalizacionih cijevi, izgradnja šahti, izvođenje priključaka na postojeće objekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.07.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-905/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2018. godine, na iznos od 7.140,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-156/1-1990/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 1.480,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6576/1 sa izvođačem, „Vukotić trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.09.2019. godine, iznos od 304 971,87 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6947/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2019. godine, na iznos od 7.450,00 €.
- U toku su završni radovi.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.212,00 € za tekuće izdatke, odnosno 226.793,15 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 226.793,15 €, od čega 166.084,36 € u 2020. godini.

• **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Andrijevica**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 738.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.

- Do sada su završene izrada i revizija glavnog projekta, a počele su aktivnosti na izvođenju radova.
 - Ukupno je realizovano 124.680,00 €, od čega 17.280,00 € u 2020. godini.
- **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica**
- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 450.075,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
 - CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
 - Do sada su završene izrada i revizija glavnog projekta, a počele su aktivnosti na izvođenju radova.
 - Ukupno je realizovano 66.782,00 €, od čega 4.375,00 € u 2020. godini.

4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, zaključen je Ugovor i Anex Ugovora između Uprave javnih radova i Opštine Pljevlja, na osnovu kojeg je Opština preuzela obaveze realizacije projekta za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 720.000,00 €, u 2020. godini, i to za:
 - Izradu i reviziju projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja;
 - Izradu i reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja Pljevalja od kapije Termoelektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima;
 - Eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje primarnog toplovoda;
 - Sprovođenje mjera energetske efikasnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 287.451,15 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 307.451,15 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

4.7. Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju infrastrukture za unapređenje postojeće mreže meteoroloških i hidroloških stanica i obuhvata IV faze.
- Tehničku dokumentaciju po kojoj se sprovode javna nadmetanja i izvode radovi obezbijedio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
- U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture I faze koja je obuhvatila 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica.
- U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture II faze koja je obuhvatila izgradnju 5 padavinskih i 5 hidroloških stanica, ugovoreni radovi za izvođenje radova III faze

koja obuhvata 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica i raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za izvođenje radova IV faze, koja obuhvata rekonstrukciju meteoroloških stanica u četiri opštine.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 24.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3673 sa izvođačem radova, „Hidro-građevinar“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 34.685,65 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 11.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanej ponuda u postupku nabevke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4468/1 sa stručnim nadzorom, „Kov atelje “ d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.06.2020. godine, na iznos od 1.815,00 €.
- Završeni su svi ugovoreni radovi III faze i u toku je prikupljanje potrebnih saglasnosti za početak radova IV faze.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 80.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 15.002,10 € za tekuće izdatke, odnosno 183.462,92 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 198.465,02 €, od čega 27.349,96 € u 2020. godini.
- S obzirom na to da se dio radova izvodi u koritama rijeka, moguće ih je izvoditi kada je najniži vodostaj, što uslovljava duže rokove za završetak ugovorenih radova.



4.8. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je dostavljena Studija izvodljivosti i nacrt projektnog zadatka.
- U toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljenog kompletiranog i ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova,

Uprava javnih radova će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

5.1 Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu

- Rekonstrukcija Ribarske ulice obuhvata radove na saobraćajnici dužine od cca 540 m, sa dvije kolovozne trake širine po 2,75 m i jednostranim trotoarom, izradu vodovoda, fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
- Revidovanu projektnu dokumentaciju obezbijedila je Opština Plav. Obradivač glavnog projekta je „Ding” d.o.o. Podgorica, a revident „Geotechnics, projects & consultings” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7772/1 sa izvođačem, „PUTEVI BAR” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 299.689,94 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-7460/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 11.500,00 €.
- Do sada su završeni radovi na saobraćajnici i ugrađena oba sloja asfalta.
- U toku su radovi na rasvjeti i elektroinstalacijama ulice.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.564,49 € za tekuće izdatke, odnosno 187.578,43 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 198.142,92 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa više puta je dolazilo do obustave radova, usljed ometanja mještana.



5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora jalovišta u Mojkovcu

- Izgradnja pasarele



- Izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta - pasarele preko magistralnog puta Podgorica - Bijelo Polje, u opštini Mojkovac izvodi se fazno. Planirana je izgradnja glavnog mosta širine 7 m i ukupne dužine 62,65 m i prelazi preko glavne magistrale Podgorica – Bijelo Polje, kao i preko pješačko-biciklističke staze. Silazna rampa je širine 5 m i dužine 176,66 m i nalazi se na kraju mosta. Kružni dio pasarele, koji se nalazi na nekadašnjem jalovištu, sadržaće “zeleni trg”, kao i lift nosivosti osam osoba. II faza radova se odnosi na hidro i elektro instalacijama, izgradnja podnih fontana, potpornih zidova i žardinjera, kao i postavljane kamenih ploča na stepenište na ulazu u pasarelu od grada, ograde, rasvjete i drvenih klupa.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor I faze br. 01-2080/1 sa izvođačem, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.03.2019. godine, na iznos od 980.920,10 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 20.02.2020. godine. Ugovor II faze br. 01-334/20-2911 sa izvođačem, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 1.199.075,63 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I i II faze je raspisano 19.03.2019. godine. Ugovor I i II faze br. 01-3662/1 sa stručnim nadzorom, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 24.805 €.
- Do sada su završeni radovi I faze, koji su obuhvatali sve neophodne radove na izradi armirano-betonske konstrukcije mosta, kao i dio radova na izradi instalacija jake struje i vodovoda i kanalizacije. Od radova II faze završeno je betoniranje temelja, zidova, krovnih ploča podnih fontana, betoniranje kaskadnih žardinjera na brdu, ugradnja kamene rigole na „C” u sloju podložnog betona obrada fasadnih zidova pranim kulirom, nabavka i postavljane armature podne fontane, kaskadne žardinjere i temelj ograde, instalacije zemljenja i gomobrana.
- U toku je iskop za temelje hidro objekta, podnih fontana, kanala, temelja lifta, potpornih zidova i žardinjera na stazi u tlu II i II kategorije, izrada sloja tampona od šljunka debljine 20cm ispod temelja hidro objekta, betoniranje temelja i zida potpornog zida, betonske ploče za tehničke prostore ispod rampe.
- Na realizaciji I faze projekta je utrošeno 6.201,25 € za tekuće izdatke, odnosno 908.458,79 € za kapitalne izdatke.
- Na realizaciji II faze projekta do sada je utrošeno 394.253,19 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno na realizaciji I faze je realizovano 914.660,04 €, od čega 156.368,36 € u 2020. godini.
- Ukupno na realizaciji II faze je realizovano 394.253,19 €, od čega 394.253,19 € u 2020. godini.
- **Šetalište i uređenja prostora nekadašnjeg jalovišta u Mojkovcu**
 - Radovi na izgradnji pratećeg sadržaja šetališta pored rijeke Tare obuhvataju izgradnju pješačkih staza sa pratećom rasvjetom u okviru bivšeg prostora jalovišta u Mojkovcu.
 - Projektu dokumentaciju (glavni projekat i revizija) obezbijedila je Opština Mojkovac.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 03.10.2018. godine. Ugovor br. 01-5066/1 sa izvođačem, „Temko” d.o.o. Nikšić, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos 154.303,13 €.
 - Ugovor br. 01-5699/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos 2.980 €.
 - Radovi su završeni krajem 2019. godine, a tehnički prijem izvedenih radova završen je u 2020. godini.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.384 € za tekuće izdatke i 141.738,83 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 144.122,83 €, pri čemu nije bilo utrošenih sredstava u 2020. godini.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice)

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
 - Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2020. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Naime, u 2020. godini Uprava javnih radova je sa opštinama zaključila ugovore u određenom iznosu za realizaciju projekata u okviru programa "Izgradnja lokalne infrastrukture", i to za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
 - Projekti za koje je Uprava javnih radova zaključila ugovore za projektantima, revidentima, izvođačima radova i stručnim nadzorom prije potpisivanja predmetnih ugovora, ostaju u nadležnosti Uprave.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.373.000 €.
- **Lokalni putevi i gradske saobraćajnice**
 - **Opština Berane**
 - U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 350,000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
 - Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 232.992,58 €.



Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izgradnja ulica kod pomoćnih terena, Crpna stanica - OŠ Vuk Karadžić, L = 413m

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Berane.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.08.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.08.2018. godine.
- Ugovor br. 1010-1560/1-6634/1 sa izvođačem, „Nikola” d.o.o. Berane, je zaključen 19.10.2018. godine, na iznos od 188.472,89 €.
- Ugovor br. 1010-1560/1-7434 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.11.2018. godine, na iznos od 4.850 €.
- Na realizaciji projekta u 2020. godini nije bilo aktivnosti.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Berane, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

• Opština Pljevlja

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada nijesu trošena sredstva.

• Opština Šavnik

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada nijesu trošena sredstva.

• Opština Gusinje

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 22.415,75 €.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Lokalni put Gusinje-Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- U toku je dorada projektne dokumentacije po primjedbama revidenta.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
- Prolongiranje početka izrade projektne dokumentacije je nastupilo usljed nepovoljnih vremenskih uslova za geodetsko snimanje trase.

Lokalni put Gusinje-Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09 €.
- U toku je usaglašavanje idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

Rekonstrukcija Kosovske ulice

- Radovi se odnose na rekonstrukciju gradske saobraćajnice u dužini od 330 m.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Gusinje. Obradivač glavnog projekta je “Ding” d.o.o. Podgorica, a revident „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-890/1 sa izvođačem, „Temko” d.o. o. Nikšić, je zaključen 13.02.2019. godine, na iznos od 143.760,64 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6221/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 6.900,00 €.
- Do sada su završeni radovi na fekalnoj kanalizaciji i elektro radovima, izradi trotoara i pripremi podloge za asfalterne radove.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 95.000,00 € za kapitalne izdatke i 5.000,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 100.000 €, od čega 90.000,00 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta je neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.



- **Opština Danilovgrad**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 199.772,24 €.

Rekonstrukcija lokalnog puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.
- Obradivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93 €.

- U toku su pripremni radovi, odnosno preuzimanje tačaka operativnog poligona od strane projektanta i početak izvođenja.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
- Izvođač je uveden u posao, ali se radovi ne odvijaju, jer nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Danilovgrad.



- **Opština Podgorica**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 1.500.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada nijesu trošena sredstva.

- **Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom u okviru Glavnog grada – Golubovci za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 151,405,44 €.

- **Opština Andrijevica**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 263.982,39 €.

- **Opština Rožaje**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 294.419,76 €.

- **Opština Bijelo Polje**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 500.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 369.955,94 €.

Realizuju se projekti:

Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik je Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00 €.
- Izvođač radova je uveden u posao, ali se radovi odvijaju usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji uslovljavaju da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 63.986,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 63.986,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na dijelu trase, a koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje.



Rekonstrukcija puta Srđevac-Lozna-Sipanje

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00 €.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 246.198,30 € za kapitalne izdatke na ime ugovorom definisanog avansa.
- Ukupno je realizovano 246.198,30 €, od čega 246.198,30 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

Gradska saobraćajnica u Resniku

I faza

- Prva faza radova obuhvatila je pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži. U ovoj fazi ugovorena je i modernizacija saobraćajnice u industrijskoj zoni.
- Revidovanu projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2054/1 sa izvođačem, „Konstruktor” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.03.2020. godine, na iznos od 184.571,74 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2083/1 sa stručnim nadzorom, „Kov atelje” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.03.2020. godine, na iznos od 4.356,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 160.000,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 3.000,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 163.000,00 €, kompletan iznos u 2020. godini.
- Krajem 2018. godine započeti su radovi I faze koji su se izvodili uz prolongiranje usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nedostataka u projektnoj dokumentaciji.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na neusaglašenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješene imovinsko-pravne odnose koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje.

II faza

- Radovi II faze obuhvatili su završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.

- Revidovanu projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 21.02.2018. godine. Ugovor br. 01-6941/1 sa izvođačem, „Tehnoput-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2019. godine, na iznos od 274.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5775/1 sa stručnim nadzorom, „Projectman“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 7.865,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 267.341,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 7.865,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 283.000,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na neusaglašenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješene imovinsko-pravne odnose koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje.



Gradska saobraćajnica - raskrsnica Mojkovačke ulice i bivše magistrale

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-210 sa obrađivačem glavnog projekta, „BMR Baošić“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 6.902,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-811/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 2.360,00 €.
- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla.
- U cilju dobijanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju, Opština Bijelo Polje je preduzela aktivnosti obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova za izmještanje 10kV kabla. Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Opštine Bijelo Polje, Uprava javnih radova će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za završetak projektne dokumentacije.

• **Opština Petnjica**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 520.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 518.354,48 €.

• **Opština Nikšić**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 500.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 499.899,97 €.

• **Opština Mojkovac**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 370.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 89.677,34 €.

Rekonstrukcija gradske saobraćajnice pored groblja

I faza

- Projektom je predviđena rekonstrukcija ulice u centru grada, kojom se, sjeverno od groblja, povezuje Valjevska ulica i Ulica junaka mojkovacke bitke sa magistralnim putem M2, uz obezbjeđenje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje sa postojećom fekalnom i kanalizacionom mrežom.

- Izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu Internog pravila za postupanje Ministarstva održivog razvoja i turizma, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male nabavke, je raspisan 18.07.2017. godine.
- Ugovor br. 101-1560/1-4291/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 23.07.2018. godine, na iznos od 4.920,00 €. (I i II faza)
- Reviziju glavnog projekta je vršio "Građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" a.d. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-6903/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 248.704,24 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-6549/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.10.2018. godine, na iznos od 6.050,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.365 € za tekuće izdatke, odnosno 227.195,68 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 237.560,68 €, pri čemu nije bilo utroška u 2020. godini.
- Radovi su završeni 2019. godine, i u toku je izrada konačnog obračuna radova.

Rekonstrukciji gradske saobraćajnice pored groblja

II faza

- Projektom je predviđena rekonstrukcija ulice u centru grada, kojom se, sjeverno od groblja, povezuje Valjevska ulica i Ulica junaka mojokovačke bitke sa magistralnim putem M2, uz obezbjeđenje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje sa postojećom fekalnom i kanizacionom mrežom.
 - Izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu Internog pravila za postupanje Ministarstva održivog razvoja i turizma, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male nabavke, je raspisan 18.07.2017. godine.
 - Ugovor br. 101-1560/1-4291/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 23.07.2018. godine, na iznos od 4.920,00 € (I i II faza).
 - Glavni projekat je revidovao "Građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" a.d. Podgorica.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.06.2019. godine. Ugovor br. 01-5905/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.08.2019. godine, na iznos od 116.978,41 €.
 - Izbor stručnog nadzora putem malih nabavki od 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-5904/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.08.2019. godine, na iznos od 3.150,00 €.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 115.374,92 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 115.374,92 €. Utroška sredstava u 2020. godini nije bilo.
 - Radovi su završeni 2019. godine, i u toku je izrada konačnog obračuna radova.
- **Opština Kotor**
 - U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu

od 700.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 348.534,58 €.

• **Opština Kolašin**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 271.580,54 €.

Sanacija gradskih saobraćajnica u Kolašinu

- Projektom je obuhvaćeno struganje postojećeg asfalta i presvlačenje novim asfaltom devet ulica u Kolašinu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8585/1 sa izvođačem, "Bemax" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 134.862,97 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-9113/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.12.2018. godine, na iznos od 4.625,00 €.
- Radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 134.799,69 € za kapitalne izdatke. Preostala je isplata u iznosu od 4.625 € za stručni nadzor.
- Ukupno je realizovano 134.799,69 €, pri čemu nije bilo utroška u 2020. godini.
- U toku je izrada konačnog izvještaja.

• **Opština Ulcinj**

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u urbanoj cjelini Stari grad Ulcinj

- Revidovanim projektom je obuhvaćena rekonstrukcije ulica u starom gradu u Ulcinju, sa izmjenom atmosferske i fekalne kanalizacije, instalacija jake i slabe struje i popločavanjem ulica. Ovaj projekat obuhvata I fazu rekonstrukcije, što podrazumijeva rekonstrukciju dvije ulice, sa pratećom infrastrukturom. Korisnik je opština Ulcinj.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6733/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "VOIP" d.o.o. Ulcinj, je zaključen 24.12.2015. godine, na iznos od 24.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-

01-800/2 sa revidentom glavnog projekta, "Urban studio" d.o.o Podgorica, je zaključen 24.02.2016. godine, na iznos od 4.900,00 €.

- Međutim, kako se radovi nijesu počeli izvoditi, a u međuvremenu se promijenio Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, reviziju je trebalo ponovo uraditi u skladu sa novim Zakonom. Prethodni revident nije imao potrebne licence po novom zakonu, pa je imenovan drugi revident. Ugovor br. 01-3037/1 sa revidentom glavnog projekta, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 4.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5318/1 sa izvođačem, "MONTAL DSD" d.o.o. Podgorica i "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2017. godine, na iznos od 474.189,14 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-92/1 sa stručnim nadzorom, "Nik Com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 9.520,00 €.
- Sprovedene su pripremne aktivnosti i pregovori kako bi se izvođaču radova omogućio početak izvođenja. Zbog propusta pri izradi tehničke dokumentacije, faza pripreme projektne dokumentacije je dugo trajala, rađena je izmjena projekta i ponovna revizija.
- Izvođač radova je uveden u posao 14.02.2020. godine, međutim, nije mogao da obezbijedi potrebnu dokumentaciju za početak, pa radovi nijesu počeli.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.300,00 € za tekuće izdatke, odnosno 94.837,83 € za kapitalne izdatke na ime ugovorom definisanog avansa.
- Ukupno je realizovano 129.137,83 €, pri čemu nije bilo utroška u 2020. godini.
- Izvođač radova nije obezbijedio produženje avansne garancije, niti garancije za dobro izvođenje radova. Konzorcioni partner "Ramel" d.o.o. je izašao iz zajedničkog posla. Kako je Opština Ulcinj zainteresovana da se ovaj projekat ipak realizuje, predstavnici Opštine su pružili dodatnu stručnu pomoć, kako bi se stvorili uslovi za nastavak izvođenja radova.

• **Opština Bar**

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izgradnja pješačkog pothodnika u željezničkoj stanici Sutomore

- Projektom je obuhvaćena izrada pješačkog prolaza ispod pruge na željezničkoj stanici u Sutomoru, kao i izrada stepeništa i nadstrešnice, kako bi se omogućio siguran prelazak putnika od naseljenog dijela do objekta stanice.
- Izradu projekta je donacija China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch opštini Bar na osnovu sporazuma.
- Izbor revidenta glavnog projekta je obezbijedila Opština Bar, šoping metodom od 18.08.2016. godine. Revident glavnog projekta je "Nik com" d.o.o. Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-318/1 sa izvođačem, "BI KOD" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.01.2018. godine, na iznos od 294.311,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 02.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1375/1 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 21.03.2018. godine, na iznos od 4.961,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.09.2020. godine, po yahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.. Ugovor br. 01-334/20-8277/1

sa stručnim nadzorom, Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 12.100,00 €.

- Izvođač radova nije zvanično uveden u posao, mada su rađene aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije.
- Na realizaciji ovog projekta do sada nijesu utrošena sredstva.
- S obzirom na to da se radovi izvode u neposrednoj blizini pružnog kolosjeka, Željeznica Crne Gore je imala dodatne zahtjeve o pitanju angažovanja stručnog kadra specifičnih mašina, kao i dodatnih troškova obustave željezničkog saobraćaja. Svi navedeni zahtjevi nijesu bili obuhvaćeni revidovanom projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane Opštine Bar, niti su ugovoreni od strane Uprave javnih radova sa izvođačem radova. Imajući u vidu i problematiku izvođača radova da obezbijedi provizorijum, duži vremenski period nakon potpisivanja ugovora u otežanim uslovima usljed pandemije izazvane virusom COVID-19, kao i imajući u vidu da je stručni nadzor odustao od posla, aktivnosti na realizaciji ugovora su prolongirane do ponovnog ugovaranja stručnog nadzora. Sredinom oktobra zaključen je ugovor sa novim vršiocem stručnog nadzora.

- **Opština Žabljak**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 450.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 86.596,27 €.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Rekonstrukcija Ulice Vojvode Mišića

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Žabljak.
- Ugovor br. 101-1560/1-252/1 sa izvođačem radova, "Intermost" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.01.2018. godine, na iznos od 193.220,63 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-2103/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.04.2018 godine, na iznos od 2.320,50 €.
- Do sada su završeni radovi na instalacijama puta. Preostali su asfalterski radovi.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 135.000,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 2.000,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 135.000,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na ovom gradilištu odnosi se na izvođenje nepredviđenih radova u od strane opštine na putnom pravcu, usljed čega je izvođač privremeno obustavio radova zbog preklapanja istih. Sa radovima će se nastaviti nakon što Opština završi započete radove.
-

Asfaltiranje dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka

- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3432 od 02.07.2020. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za izvođenje radova i vršenje stručnog

nadzora u toku asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka, u iznosu od 240.000,00 €.

- Ugovor br. 01-334/20-5652 sa Opštinom Žabljak je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 240.000,00 €.

- **Opština Plužine**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada nijesu trošena sredstva.

- **Opština Herceg Novi**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 50.378,56 €.

- **Opština Tuzi**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 126.694,74 €.

- **Prijestonica Cetinje**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Prijesticom Cetinje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 563.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 563.000,00 €.

5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju

- Objekat gradske pijace u Gusinju je ukupne bruto površine 763 m², spratnosti prizemlje i potkrovlje. U prizemlju objekta su planirani sljedeći sadržaji: zelena pijaca, mliječna pijaca, mokri čvor, mokri čvor za invalide, kotlarnica i kancelarija. Prostor u potkrovlju predviđen je

za komunalnu službu i službu zaštite i spašavanja. Obje ove službe imaju poseban hodnik i poseban ulaz.

- Za potrebe komunalne službe projektovan je zaseban hodnik, mokri čvor i 4 kancelarije. Za potrebe službe zaštite i spašavanja projektovan je zaseban hodnik, garderoba, mokri čvor, 2 kancelarije, kuhinja sa trpezarijom, dnevni boravak, spavaća soba i učionica.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze (grubi građevinski radovi i pokrivanje krova) i odabrala izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5492/1 sa izvođačem, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.12.2017. godine, na iznos od 134.660,13 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1407/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2018. godine, na iznos od 3.391,50 €.
- U aprilu 2018. godine započelo je izvođenje radova I faze, koji su završeni.
- U 2019. godini je raspisano javno nadmetanje i potpisan ugovor za izvođenje radova II faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5067/1 sa izvođačem, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 476.804,15 €.
- Radovi II faze obuhvatili su građevinsko-zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije jake i slabe struje, termotehničke instalacije, radove na izradi infrastrukturnih priključaka i opremanje objekta.
- Svi radovi II faze su završeni.
- Završen je tehnički pregled objekta, nakon čega je predat korisniku na upotrebu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.974,70 € za tekuće izdatke, odnosno 534.260,49 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 547.235,19 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.





5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Radi se o višegodišnjem projekatu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popče, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice, Grnčar i Svinjače.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- Zakonom o bužetu za 2020. godnu obezbijedeno je 181.000 €.
- **Nastavak uređenja korita rijeke Grnčar u urbanom dijelu nizvodno od škole do mosta na ulasku u Gusinje**
 - Uređenje korita rijeke Grnčar realizuje se fazno.
 - Završeni su radovi I i II faze, a u 2019. godini završeni su i radovi III faze.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača (IV faza) je raspisano 09.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6992/1 sa izvođačem, „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 139.816,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (IV faza) je raspisano 17.07.2019. godine. Ugovor br.01-7062/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 6.292,00 €.
 - U septembru 2019. godine počelo se sa radovima IV faze uređenja korita rijeke Grnčar.
 - U toku su završni radovi. Završetak radova je planiran za kraj 2020. godine.
- **Regulacija korita rijeke Zlorečice**
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Andrijevića.
 - Nakon što je izvođač sa kojim je zaključen ugovor 2018. godine odustao od posla, u 2019. godini ponovno je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na regulaciji korita rijeke Zlorečice.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-835 sa izvođačem, „Vukotić trejd” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.02.2020. godine, na iznos od 218.830,61 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.07.2018. godine. Ugovor br. 01-334/20-5421/1 sa stručnim nadzorom, „DING” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 3.570 €.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Korigovani glavni projekat je dostavljen izvođaču u septembru 2020. godine, ali zbog loših vremenskih uslova izvođač radova nije uveden u posao.

• **Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici**

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420 €.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

• **Uređenje korita rijeke Ibar**



- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obrađivač glavnog projekta je „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođačem, „Vukotić-trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00 €.
- Radovi u okviru I faze završeni su 15.10.2019. godine.

- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- U toku je vrednovanje ponuda za izbor izvođača II faze radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.500,00 € za tekuće izdatke, odnosno 422.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 425.500,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.

• **Sanacija puta Han Garančića - Opasanica**

- Predmetni put se nalazi u opštini Podgorica, u blizini naselja Veruša. Projektom je obuhvaćena sanacija potpornih zidova u koritu rijeke i izgradnja novih zidova radi stabilizacije kosina korita rijeke, asfaltiranje dijela puta i oblaganje kanala u centru Opasanice. Korisnik je Glavni grad Podgorica - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.
- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zaključila je ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o Podgorica i revidentom JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6121/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2019. godine, na iznos od 429.066,25 €.
- Na otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za izbor stručnog nadzora br. 01-167/19 od 24.07.2019. godine se nije niko javio, pa je putem nabavke male vrijednosti od 02.08.2019. godine, sa "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, sklopljen ugovor za vršenje nadzora u trajanju od mjesec dana. Ugovor br. 01-6172/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 2.000,00 € i u trajanju mjesec dana od dana potpisivanja ugovora.
- Nakon obustave radova i zimskog perioda, putem nabavke male vrijednosti iz marta 2020. godine, izabran je stručni nadzor "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, za vršenje nadzora do primopredaje radova. Ugovor br. 01-334/20-3022 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.840,00 €, do primopredaje radova.
- S obzirom da je u toku radova došlo je do pojave viška radova u odnosu na projektovane, sproveden je pregovarački postupak za obezbjeđenje dodatnih sredstava. Ministarstvo finansija nije odobrilo pregovarački postupak. Takođe, sprovedene su aktivnosti na izmjeni projekta vezano za poboljšanje sloja asfalta i izmjenu detalja kod oblaganja korita kanala kamenom.
- Završena je izgradnja novih potpornih zidova i sanirani su postojeći zidovi u koritu rijeke (izuzeće zid Z4).
- U toku je izrada betonskog kanala za odvod površinskih voda, izrada rigola, nasipanje tampona i priprema za asfalt.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.800,00 € za tekuće izdatke, odnosno 349.939,51 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 351.739,51 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Prilikom sanacije postojećih zidova, utrošena je za veća količina betona nego što je predviđeno projektom, jer su radovi izvedeni po preporuci geologa, nakon izlaska na lice mjesta. Ministarstvu finansija upućen je zahtjev za odobrenje dodatnih sredstava, međutim

pregovarački postupak nije odobren. U toku je izmjena glavnog projekta i raspisano je novo javno nadmetanje. Takođe, stručni nadzor je dostavio naručiocu dopis sa predlogom da se preispita projektovana debljina asfalta od 6 cm, zbog konstantnog prolaza teretnih vozila, zbog čega asfalt projektovan na ovakav način ne predstavlja trajno rješenje. Očekuje se odgovor projektanta



5.6. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tivtu

- Obaveza Opštine Tivat je da dostavi dokumentaciju nakon čega će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti iz svoje andležnosti.
- Zakonom o bužetu za 2020. godinu obezbijedeno je 10.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

5.7. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama



•



- Regionalna stočna pijaca nalazi se u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim na regionalnom putu Berane - Rožaje. Kompleks se prostire se na površini od 3.352 m².
- Projektovani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje. U okviru pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50 m koja opslužuje sve sadržaje kompleksa. Predviđen je parking prostor sa šest mjesta za kamione. Pored stočne pijace izgrađen je parking za posjetioce sa pristupnom saobraćajnicom širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- U julu 2018. godine izvođač radova je, na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Berane, započeo radove I faze koji su obuhvatali i izgradnju parkinga za posjetioce. Radovi su završeni krajem 2018. godine.
- U 2019. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova II faze, kako bi se objekat stavio u funkciju.
- Radovi II faze su završeni.
- U toku je tehnički pregled objekta.
- Na osnovu dostavljene dopune projektne dokumentacije od Opštine Berane, raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji javne rasvjete u okviru kompleksa stočne pijace i priključenju na elektroenergetsku mrežu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača objavljeno je 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3174/1 sa izvođačem, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 32.771,21 €.
- Ugovor br. 01-334/20-5208 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.07.2020. godine, na iznos od 1.452,00 €.
- Izgradnja javne rasvjete je u toku.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 50.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 13.757,84 € za tekuće izdatke, odnosno 290.517,19 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 304.275,03 €, od čega 848,16 € u 2020. godini.

5.8. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila opština Bijelo Polje.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

5.9. Izgradnja gradske pijace u Rožajama



- Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su radovi I faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.

- Izvođač radova je do sada završio sve grube građevinske radove, instalaterske radove, zidarske radove, molersko-farbarske radove i radove na spuštenim plafonima.
- U toku su završni radovi na objektu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 110.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.000,00 € za tekuće, odnosno 740.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 752.000,00 €, od čega 135.177,22 € u 2020. godini.
- U toku je usaglašavanje projektne dokumentacije II faze radova koji će biti obuhvaćeni novim tenderom uređenja terena i opremanja namještajem, čime će svi radovi na izgradnji objekta biti završeni.

5.10. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje



- Projektну dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju je obezbijedila Uprava javnih radova.
- Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- Nakon što je završena I faza, u toku je izvođenje radova II faze.

- Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radova, asfaltnih radova i elektro instalacije.
- Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfaltnih radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 320.000 €.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
- Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatalo hidrotehničke, elektro i asfaltnih radove.
- U toku su radovi na otklanjanju nedostataka po izvještaju nadzornog organa.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 600.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 600.000,00 €, od čega 350.000,00 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Plav, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

II faza



- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
- Završeni su radovi na probouju puta u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.
- U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltnih radova u dužini od 3 km.
- Na realizaciji projekta do sada utrošeno 350.000,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 10.000,00 € za tekuće izdatke.

- Ukupno je realizovano 360.000,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Plav.
- **Most na rijeci Vruji u Gusinju**
 - Most na Vruji u Gusinju ima ukupnu dužinu sa krilima obalnih oporaca 40,10 m, dok ukupna širina, zajedno sa ivičnim vijencima i ogradom, iznosi 10,44 m.
 - Obradivač glavnog projekta je „CDS project“ d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-492/1 sa izvođačem, „IGP Fidiya“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020.godine, na iznos od 399.312,02 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5417/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 9.559,00 €.
 - Izvođač je uveden u posao i završeni su pripremni radovi.
 - Završeni su radovi na obalnim oporcima-osloncima, kao i njihovo betoniranje sa krilnim zidovima.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 150.000,00 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 154.000,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
 - Opština Gusinje je preuzela obavezu pripremnih radova na pripremi oslonaca za pokretni most, kao i njegovu montažu, što je bio uslov za početak radova.



- **Saobraćajnica od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji**

- Dužina saobraćajnice od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji je 470 m.
- Javno nadmetanje za izbor obradivača glavnog projekta je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01 – 8583/1 sa obradivačem glavnog projekta, „DING“ d.o.o. Podgorica, je raspisan 08.11.2019. godine, na iznos od 7.502,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-

8653/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt d.o.o. Podgorica", je raspisan 11.11.2019. godine, na iznos od 2.412,00 €.

- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.914,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

5.11. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu

- Rekonstrukcija Prnjavorske ulice izvodi se u dvije faze, na osnovu projektne dokumentacije koju je obezbjedila Opština Plav.
- Radovi I faze završeni su 2018. godini.
- Radovi II faze izvode se na putu u dužini od 600 m, sa svim pratećim elementima gradske saobraćajnice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6373/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 28.08.2019. godine, na iznos od 399.985,78 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 25.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6559/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.09.2019. godine, na iznos od 4.300,00 €.
- Izvođač je počeo sa radovima 03.09.2019. godine. Radovi su izvođeni po dinamičkom planu i završeni su 05.05.2020. godine
- U toku su aktivnosti Opštine Plav na tehničkom prijemu radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 666.047,16 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 666.047,16 €, od čega 248.724,73 € u 2020. godini.
- U toku izvođenja radova izvođač radova je u više navrata bio prinuđen da obustavlja radove zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa čije rješavanje je obaveza Opštine Plav.



5.12. Rekonstrukcija puta Plav – Bogićevica, Plav

- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o., je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos 9.440,70 €.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 100.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Prolongiranje početka izrade projektne dokumentacije je nastupilo usljed nepovoljnih vremenskih uslova za geodetsko snimanje trase.

5.13. Lokalni put Ckla – granica Albanije, opština Bar

- Izgradnja puta u dužini od 1,4 km, sa dvije saobraćajne trake širine 2x2,75m, sa ivičnim trakama 2x0,25m i bankinama širine 1m, ivičnjacima, asfaltnim kolovoznim zastorom debljine 6+4cm, saobraćajnom opremom i signalizacijom. Odvodnja je riješena rigolama širine 0,5m, i kanalima. Za odvod vode kroz trup puta, predviđeni su cjevasti propusti. Korisnik je opština Bar.
- Opština Bar zaključila je ugovore sa obrađivačem glavnog projekta "Put inženjering" d.o.o. Podgorica i revidentom "Kov atelje" d.o.o. Nikšić.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2228/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 690.226,70 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2896 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 14.400,00 €.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 50.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Izvođaču radova su predate tačke operativnog poligona, ali izvođač nije uveden u posao jer Opština Bar nije stvorila zakonske preduslove za uvođenje izvođača u posao.

5.14. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu

- **Izgradnja trafostanice NDTs 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka**
- Realizacija projekta obuhvata izgradnju trafostanice NDTs 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka, kao i izgradnju saobraćajnice za Biznis zonu u opštini Mojkovac.
- U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija trafostanice i infrastrukturnog priključka i saobraćajnice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za NDTs 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-8559//1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 89.243,04 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4801

sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950 €.

- Završeni svi radovi na objektu osim ispitivanja za koje je potrebno da obezbijedi uslove CEDIS.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 350.000 €.
- Na realizaciji projekta za NDTs do sada utrošeno 1.492,00 € za tekuće izdatke.



• **Izgradnja saobraćajnice**

- Saobraćajnica za Biznis zonu je 760 m dužine.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta saobraćajnice je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101 – 1560/1 – 5669/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2018. godine, na iznos od 14.690 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 24.10.2018. godine. Ugovor br. 101 – 1560/1 – 7482 / 1 sa revidentom glavnog projekta, "Preduzeće za građevinski Nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 14.11.2018. godine, na iznos od 2.420,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5704/1 sa izvođačem, "IGP Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.08.2019. godine, na iznos od 825.499,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5872/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.08.2019. godine, na iznos od 17.460,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku je izrada konačnog izvještaja i konačnog obračuna radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 350.000 €.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.224,20 € za tekuće izdatke, odnosno za 744.042,57 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 788.642,43 €, od čega 331.053,64 € u 2020. godini.



5.15. Putni pravac Monte - Rose

- Obaveza Opštine Herceg Novi je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

5.16. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu

- Obaveza opštine je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava javnih radova na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

5.17. Rekonstrukcija trga u Plavu

- Usljed nedostatka javnih površina u Plavu, određena je lokacija za izgradnju gradskog trga u vidu prenamjene dijela školskog dvorišta u javnu površinu. Projektним rešenjem se predviđa uklapanje postojećeg zdravog i visokodekorativnog zelenila, a stabla planirana za uklanjanje se nadoknađuju sadnjom novih sadnica visokodekorativnih vrsta. Ukupna površina uređenja platoa je 3.308 m².

- Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Plav. Projektant je "Plan plus" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4417/1 sa izvođačem, "LD Gradnja" d.o.o. Nikšić, je zaključen 21.06.2019. godine, na iznos od 496.299,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 12.06.2019. godine. Ugovor br. 01-4666/1 sa stručnim nadzorom, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku su aktivnosti na tehničkom prijemu objekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.800,00 € za tekuće izdatke, odnosno 404.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 505.000,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.



5.18. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar

- Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze. Zahvat obuhvata cca 4.800 m² šetališta sa pratećim sadržajima.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo JP Morsko dobro Crne Gore. Projektant glavnog projekta je "Arhitektonski studio AIM" d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je "Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU" d.o.o. Podgorica.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4063 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 968.383,36 €, od čega će Opština Bar obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000,00 €, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore predvidjelo je iznos od 425.000,00 €, a Uprava javnih radova obezbijediti iznos od 443.383,36 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 17.20.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2501 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 26.299,35€.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 250.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 715,96 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na prolongiranje roka početka radova, s obzirom na to da je obaveza JP Morsko dobro da sa šetališta ukloni montažne privremene objekte sa čijim vlasnicima ima ugovore o korišćenju.



6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA

6.1. Rekonstrukcija energetskog bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32 €.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 510.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nemogućnost da se korisnik i projektant usaglasa oko načina rješavanja rekonstrukcije energetskog bloka trafostanice i pomoćnog izvora napajanja. Naime, kako je u pitanju Klinički centar Crne Gore potrebno je obezbijediti neprekidno napajanje električnom energijom. Nakon prilagođavanja odgovora i jedne i druge strane, izrađeno je prihvatljivo tehničko rješenje. Pojava pandemije izazvane virusom COVID-19 je dodatno usporila dinamiku izrade projektne dokumentacije.

6.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici

- Adaptacijom objekata planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-970/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 26.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidentom glavnog projekta je raspisano 01.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560//1-8834/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.12.2018. godine, na iznos od 6.240,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4658 sa izvođačem, "IGP Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.06.2020. godine, na iznos od 995.797,64 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Nakon žalbenog roka i odluke o komisije za kontrolu postupka o poništenju postupka, u toku su aktivnosti na ugovaranja vršioca stručnog nadzora po proceduri jednostavnih nabavki.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 420.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 33.224,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 33.224,00 €, od čega 484,00 € u 2020. godini.

- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na prolongiranje početka izvođenja radova, dok se ne zaključi ugovor sa stručnim nadzorom. Nakon što stručni nadzor bude odabran stvoriće se uslovi za uvođenje izvođača u posao.

6.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici

- Ministarstva zdravlja je krajem juna 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

6.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 70.000 €.

6.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 50.000 €.

6.6. Dom zdravlja u City kvartu

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

6.7. Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

6.8. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici



- Rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra realizovana je fazno. Kroz I fazu realizacije izvedeni su radovi na stavljanju u funkciju dijela objekta namijenjenog za potrebe Centra za genetiku i imunologiju (CMGI), kao i adaptacija dijela prostora Dnevne bolnice. Kroz II fazu na objektu su izvođeni radovi na spoljnjem uređenju ulaza u prostor CMGI, kao i opremanje kancelarijskih prostora, konferencijske sale, kabineta direktora, prostorija za medicinsko osoblje, kao i pojedinih prostorija u Dječjoj bolnici.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.04.2019. godine (I faza), odnosno 18.12.2019. godine (II faza).
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 06.08.2019. godine (I faza). Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (II faza) je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.
- Ugovor (I faza) br. 01-5233/1 sa izvođačem, "Refena" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.07.2019. godine, na iznos od 256.537,65 €.
- Ugovor (II faza) br. 01-334/20-4064 sa izvođačem, "Refena" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 39.873,13 €.
- Ugovor (I faza) br. 01-5805/1 sa stručnim nadzorom, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.08.2019. godine, na iznos od 9.700,00 €.
- Ugovor (II faza) br. 01-334/20-4559 sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.06.2020. godine, na iznos od 900,00 €.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.700,00 € za tekuće izdatke, odnosno 296.202,55 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 305.902,55 €, od čega 69.886,55 € u 2020. godini.
- Svi radovi su završeni i dio objekta na kojem su izvođeni radovi je predat korisniku na upotrebu.

7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

- Dom starih nalazi se na urbanističkoj parceli br. 33, u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Konik - Stari Aerodrom III" u Podgorica. Ukupna bruto površina objekta iznosi 11.225 m². Objekat je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata. Predviđen je za boravak 270 korisnika smještenih u: 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana. Pored smještajnih jedinica objekat sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, medicinski blok i prateće tehničke prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3108/1 sa izvođačem, „IGP Fidiija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2017. godine, na iznos od 8.787.071,48 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača na ugradnji liftova je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9982/1 sa izvođačem na ugradnji liftova, „IGP Fidiija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2019. godine, na iznos od 329.308,71 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5270/1 sa stručnim nadzorom, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 18.12.2017. godine, na iznos od 119.836,00 €.
- Do sada su završeni grubi građevinski radovi sa izradom krovne konstrukcije i pokrivanjem objekta, ugradnja spoljne bravarije i unutrašnje stolarije, keramičarski, podopolagački, bravarski i gipsarski radovi, razvod hidro, elektro i termotehničkih instalatalacija.
- U toku je uređenje terena, molersko-farbarski radovi i montaža namještaja i opreme.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 190.340,70 € za tekuće izdatke, odnosno 8.567.162,44 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 8.757.503,14 €, od čega 2.686.858,45 € u 2020. godini.
- Zbog nedostataka i neusaglašenosti u glavnom projektu urađene su i revidovane izmjene projektne dokumentacije što je za posljedicu imalo pojavu viškova i nepredviđenih radova u vrijednosti od 400.000 €. S obzirom na to da je zahtjev za davanje prethodne saglasnosti o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje odbijen od strane Ministarstva finansija, raspisano je novo javno nadmetanje. Donešena je odluka i u toku je žalbeni rok.





7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću

- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Dom starih je obuhvaćen PUPom opštine Nikšić – GUR, i nalazi se na katastarskoj parceli br. 4521/1 KO Nikšić.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti.
- Novoprojektovani smještajni objekti su spratnosti podrum, prizemlje, sprat i mansard (Po+P+1+M). Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Zaključkom Vlade Crne Gore od 20.02.2014. godine, broj: 08-282/3, zadužena je Agencija za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić, da sprovede aktivnosti na izradi projektne i planske dokumentacije za potrebe Regionalnog stambenog programa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine.
- Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
- Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
- Do sada su završeni pripremni radovi, rušenje i demontaža, AB radovi, zidarski i tesarski radovi. Pri kraju su limarski, keramičarski i fasaderski radovi.
- U toku su montažerski, bravarski i stolarski radovi. Podopolagački jos nijesu počeli. Spoljašnji vodovod i kanalizacija su završeni. Unutrašnji radovi vodovoda i kanalizacije su završeni, osim sanitarije. U toku je nabavka sanitarije. Izvode se radovi na spoljašnjem uređenju. Razvod jake i slabe struje je završen. Takođe, radi se elektro galanterija i ormari, kao i rasvjeta. Oprema kuhinje i vešeraja je montirana. Ostala oprema je u fazi nabavke. Mašinske instalacije u toku izrada razvoda.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.178,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.375.748,62 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.405.926,62€, od čega 1.405.927,42 € u 2020. godini.
- Uprava javnih radova je 29.09.2020. godine uputila Ministarstvu finansija zahtjev za davanje prethodne saglasnosti o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje. Tokom izvođenja radova nadzorna služba je uočila određene nedostatke i propuste u projektu, što je očekivano s obzirom na to da se radi o rekonstrukciji starih i dotrajalih objekata i projektant nije u mogućnosti da tokom izrade projektne dokumentacije sagleda obim svih potrebnih radova. Uočeni nedostaci ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao i na promjenu fasada objekta, ali utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta. Uočeni nedostaci za posljedicu imaju pojavu viškova, nepredviđenih i dodatnih radova. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 235.000 €.

- U toku je procedura pribavljanja mišljenja o ispunjenosti uslova od strane Ministarstva finansija, nakon čega će naručilac sprovesti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
- Izvođač je, takođe, tokom izvođenja naišao na određene neusaglašenosti faza i greške u projektu što je dodatno usporilo radova i zahtijevalo dopune projektne dokumentacije. Takođe, izvođenje radova II faze direktno uslovljava završetak radova I faze koji se realizuju u okviru RHP-a, a čiji završetak je planiran u januaru 2021. godine.



7.3. Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU “Lovćen Bečići” u opštini Cetinje

- JU “Lovćen Bečići”, kao krajnji korisnik, koordinira aktivnostima na realizaciji projekta.

- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

7.4. Dom starih u Plavu

- Ministarstva zdravlja je sredinom juna 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat, nakon čega je Uprava javnih radova uputila zahtijev ministarstvu.
- Na osnovu zahtjeva Uprave javnih radova Ministarstvu finansija, projekat je uvršten u Plan javnih nabavki za 2020. godinu, ali nije dobijena potvrda od Ministarstva finansija da su obezbijeđena finansijska sredstva. Nakon dobijanja svih potrebnih saglasnosti Uprava javnih radova će pokrenuti procedure javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg izvođača i vršioca stručnog nadzora.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

7.5. Dom starih u Rožajama

- Obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranje je da u saradnji sa Opštinom dostavi Upravi javnih radova projektnu dokumentaciju na osnovu koje bi se pristupilo raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA

8.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na raspisivanje javnih konkursa za izbor najboljih urbanističko-arhitektonskih idejnih rješenja, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a, a učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a.

8.1.1. Vrtić u Baru

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 15.000 €.

8.1.2. Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta Glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 55.000 €.

8.1.3. Vrtić u Pljevljima



-



- Ministarstvo održivog razvoja i turizma u 2016. godini je raspisalo konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Uprava javnih radova je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja ugovorila izradu Glavnog projekta.
- U 2019. godini, nakon što je završena izrada i revizija glavnog projekta, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa CEB procedurama. Kako na javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda to je nakon provjere procijenjene projektantske vrijednosti ista uvećana.
- Ponovo je raspisano javno nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima u toku je u naselju Guke. Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², projektovane za smještaj 67 djece. U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. Projekat je finansiran iz kredita Razvojne Banke Savjeta Evrope – CEB.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 12.07.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6854/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.11.2016. godine, na iznos od 7.854,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano od strane Ministarstva prosvjete.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.01.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4557/1 sa izvođačem, "Tehno gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 19.06.2020. godine, na iznos od 1.048.956,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 04.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4186/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 29.500,00 €.
- Završeno je čišćenje terena, skidanje humusa mašinskim putem i odvoz viška na deponiju, iskop zemlje V i VI kategorije za temelje objekta i odvoz materijala na deponiju.
- U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije temelja.
- Zakona o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 105.000 €.
- Na realizaciji projekta do je utrošeno 1.004,40 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na postojanje podzemnih i nadzemnih instalacija koji nijesu obuhvaćeni glavnim projektom.

8.1.4. Vrtić u Bloku VI, Podgorica



- Vrtić se nalazi na urbanističkoj parceli UP 11, u Bloku VI u Podgorici, površine 3.185 m². Objekat će biti ukupne bruto površine 1.568 m² i spratnosti: suteran, prizemlje i jedan sprat, planiran za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za djecu uzrasta jaslica i uzrasta vrtića, višenamjenski prostor (otvoreni hol), prostor za trijažu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djeteta, kancelarije i zbornica, čajna kuhinja, perionica, tehničke i ostale prateće prostorije. Cjelokupan program boravka predškolske djece, sa zajedničkim prostorom i neophodnim medicinskim sadržajima je organizovan u prizemlju, a sprat je namijenjen prostoru jaslica. Sve prostorije su prirodno ventilisane, zeleni krov sprječava pregrijavanje objekta u toplijem dijelu godine, a u hladnom periodu gubitak toplote, dok solarni paneli omogućavaju iskorišćavanje sunčeve energije za zagrijavanje.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je sprovelo aktivnosti na raspisivanju i sprovođenju konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja koje je Upravi javnih radova dostavljeno da na osnovu istog sprovede tendersku proceduru za odabir projektanta i revidenta glavnog projekta.

- Ugovor br. 19/2-01-2500/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2017. godine, na iznos od 22.598,10 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-3405/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 19.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3949/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 1.992.689,56 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.03.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4185/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 59.500,00 €.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta.
- U toku je zidanje fasadnih i pregradnih zidova objekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godine obezbijeđeno je 105.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.803,87 € za tekuće izdatke, odnosno 317.223,04 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 341.526,23 €, od čega 338.026,91 € u 2020. godini.

8.1.5. Rekonstrukcija predškolskih ustanova

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnih konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za u opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete.
- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi neophodnu dokumentaciju, nakon čega će Uprava javnih pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti iz nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za objekte: vrtić u City kvartu, vrtić na Zlatnici, vrtić na Tuškom putu, vrtić na Starom aerodromu, vrtić u Bijelom Polju, vrtić u Beranama i vrtić u Plavu. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a, a učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

8.2.1 Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.2. Vrtić na Zlati, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.3. Vrtić na Tuškom putu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.4. Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.5. Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.6. Vrtić u Beranama

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.2.7. Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.

8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama



- Objekat je projektovan kao savremeno i funkcionalno zdanje, kapaciteta oko 100 djece, ukupne bruto površine 1.120 m². Imaće devet prostorija namijenjenih za dnevni boravak djece, od kojih četiri za jaslice, prostorije za vaspitače, kuhinju, administrativni blok, multifunkcionalni prostor sa garderoberima, višenamjensku salu i ostale prateće sadržaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3611/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.10.2017. godine, na iznos od 24.500,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisan 07.12.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-979/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i

istraživanje u oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 3.500,00 €.

- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2949/1 sa izvođačem, "Tofi" d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.05.2019.godine, na iznos od 1.504.617,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 04.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6102/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.10.2019. godine, na iznos od 24.210,00 €.
- Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.
- Završeni svi grubi građevinski radovi, instalaterski, pokrivački, molersko-farabarski radovi i uređenje terena.
- U toku je montaža opreme za ventilaciju i sprinkler sistema.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 15.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno i 1.150.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.165.000,00 €, od čega 715.381,71 € u 2020. godini.

8.4. Osnovna škola u Igalu

- Obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma je da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovede konkurs i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Igalu.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 15.000 €.

8.5. Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-912/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 09.03.2017. godine, na iznos od 116.874,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6754/1 sa revidentom glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. iz Nikšića, je zaključen 23.10.2018. godine, na iznos od 8.330,00 €.
- Završen je glavni projekat i predat na reviziju, koja je u toku.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 15.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 93.499,26 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 93.499,26 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na ovom projektu nastupila je zbog izmjene zakonske regulative, usljed koje je bilo neophodno naknadno izraditi idejno rješenje i pribaviti saglasnot glavnog gradskog arhitekta. Idejno rješenje je izrađeno i proslijeđeno Univerzitetu Crne Gore radi pribavljanja

saglasnosti. S obzirom na to da je glavni gradski arhitekta zatražio izmjenu jednog segmenta idejnog rješenja, u toku je postupanje projektanta po istom.

8.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Tološima, Podgorica

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 60.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 31.333,33 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

8.7. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici

- Izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta rekonstrukcije toplane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00 €.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradu tehničke dokumentacije.
- U toku je izrada završnog izvještaja revizije.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika na ovom projektu nastupila je zbog izmjene zakonske regulative, usljed koje je bilo neophodno naknadno izraditi idejno rješenje i pribaviti saglasnot glavnog gradskog arhitekta. Idejno rješenje je izrađeno i proslijeđeno Univerzitetu Crne Gore radi pribavljanja saglasnosti.

8.8. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom

- Projektom sanacije klizišta na Savini, za potrebe izgradnje i rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom, planirana je realizacija više potprojekata u skladu sa prioritetima Ministarstva prosvjete.

- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije u 2018. godini završeni su radovi na sanaciji ovog klizišta, a koji su obuhvatili izradu potporne konstrukcije sa dva reda bušenih šipova prečnika 100 cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5 m.
- U 2016. godini završeni su hitni sanacioni radovi na objektu JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehaničkim istraživanjima za objekat JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- U aprilu 2020. godine isplaćena su sredstva za preostale radove, nakon što je Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, preuzelo aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
- Zakonom o budžetu za 2020. godine obezbijeđeno je 150.000 € .
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 103.613,33 € za tekuće izdatke, odnosno 933.551,14 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.037.164,47 €, od čega 30.894,63 € u 2020. godini.

8.9. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju





- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00 €.
- Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi drvene krovne konstrukcije i krovnog pokrivača.
- U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije pasarele koja je predviđena kao pješačka staza uz objekat, izrada bravarije, gips kartonskih pregradnih zidova, zidarski i izolaterski radovi i grubi razvod elektro i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 14.652,50 € za tekuće izdatke, odnosno 2.537.965,72 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.552.618,22 €, od čega 1.348.068,37 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciju po pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je i upućen zahtjev Ministarstvu finansija za pregovrački postupak.

8.10. Izgradnja Osnovne škole u Rožajama

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje.
- Obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva prosvjete je rješavanje imovisko-pravnih odnosa.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.



8.11. Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje

- Po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti od 24.09.2019. godine i u skladu sa ponudom za izradu geodetske podloge od 26.09.2019. godine, za potrebe

sp provođenja konkurs za idejno rješenje fiskulturne sala OŠ "Pavle Žižić" u Bijelom Polju izrađen je geodetski snimak lokacije.

- Ponuda br. 01-7298/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Geodeting” d.o.o. Bijelo Polje, od 26.09.2019. godine na iznos od 484,00 €.
- Do sada je završena izrada geodetske podloge.
- U toku su aktivnosti korisnika objekta i nadležnih ministarstava u vezi sa pripremom dokumentacije za raspisivanje konkursa za idejno rješenje. Nakon što bude dostavljeno prvonagrađeno idejno rješenje, ovjeren projektni azdatak i urbanističko-tehnički uslovi, Uprava javnih radova će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 40.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 484,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

8.12. OŠ “Lovćenski partizanski odred” na Cetinju

- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.13. Naučno-tehnološki park u Podgorici

- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 3 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je Ministarstvo nauke. Projekant glavnog projekta je “Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je “Ing-impuls” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00 €.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine.
- U toku su zidarski, montažni radovi, betonski, radovi na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija termotehnike.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 60.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 950.108,66 € za kapitalne izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- Usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, kao i propusta u projektnoj dokumentaciji, došlo je do pojave značajnih viškova i naknadnih radova. Stručni nadzor i izvođač radova ne mogu da se usaglase oko jediničnih cijena za naknadne radove, pa će u cilju rješavanja navedene problematike biti organizovana arbitraža ili će se pokrenuti aktivnosti na raspisivanju nove tenderske procedure za izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova.



8.14. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
 - Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
 - U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekata, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
-
- **Kotlarnica i infrastrukturni priključci za potrebe Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju**
 - Ugovor br. 19/2-01-1360/1 sa izvođačem , “Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2015. godine, na iznos od 833.225,47 €.
 - Ugovor br. 19/2-01-2893/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2015. godine, na iznos od 22.850,00 €.
 - Svi radovi su završeni, izdata je upotrebna dozvola i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
 - U toku su završne aktivnosti na izradi konačnog obračuna.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.850,00 € za tekuće izdatke, odnosno 833.136,53 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 855.986,53 €, od čega 49.682,74€ u 2020. godini.
-
- **Izvođenje radova na uređenju terena dijela Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti i opremanja Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju**
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1162/2 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 22.02.2019. godine, na iznos od 1.195.302,33 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8611/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 24.200,00 €.
 - Završeni su svi radovi, izdata je upotrebna dozvola i izvršena primopredaja objekta korisniku.

- U toku su završne aktivnosti na izradi konačnog obračuna.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.200,00 € za tekuće izdatke, odnosno 995.243,39 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.019.443,39 €, od čega 87.919,23€ u 2020. godini.

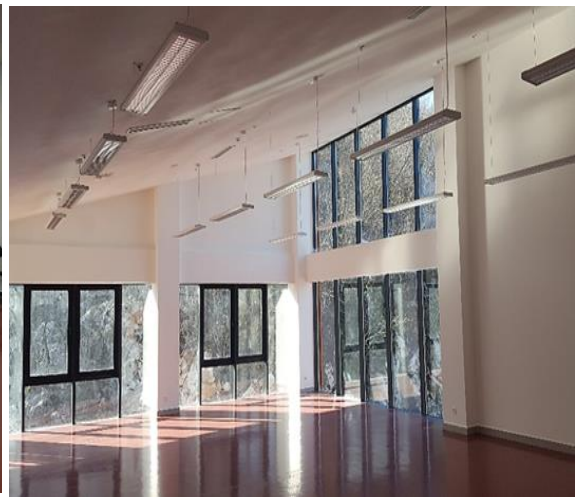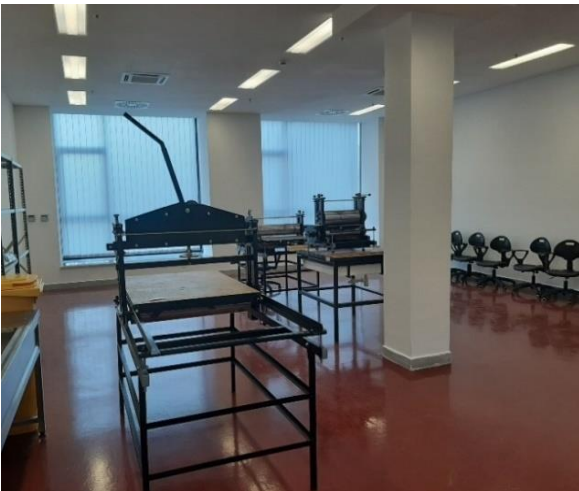

8.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a

- Riječ o višegodišnjem projektu, a sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja,

izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova za objekte: Druga Gimnazija u Podgorici, OŠ na Zabjelu u Podgorici, OŠ u City kvartu u Podgorici, OŠ Karabuško polje u Tuzima, Vrtić na Zabjelu, Vrtić u Kotoru, Vrtić u naselju Momišići u Podgorici, adaptaciju i opremanje osnovnih srednjih stručnih škola i ostalih objekata po prioritetu Ministarstva prosvjete.

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

8.15.1. Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.15.2. Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.15.3. Osnovna škola na Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada i ovjera projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, nakon čega će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.15.4. Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.

8.15.5. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.

8.15.6. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.

8.15.7. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 20.000 €.

8.16. Adaptacija objekata obrazovanja

- Radi se o višegodišnjem projektu, a sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama: Podgorica, Plav, Nikšić, Cetinje, Pljevlja i Herceg Novi. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Rebalansom budžeta za 2020. godinu Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa Ministarstvom finansija, na osnovu definisanih prioriteta, prepoznalo i obezbijedilo potrebna sredstva za izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama Podgorica, Nikšić i Rožaje. U okviru navedenog projekta predviđena je adaptacija postojećeg objekta u okviru KBC-a u Podgorici za potrebe vrtića, adaptaciju Područne ustanove JU OŠ "Ivan Vušović" u Miločanima, opština Nikšić, kao i adaptacija postojećeg objekta JU OŠ u Dacićima, opština Rožaje. Krajem septembra 2020. godine, Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektnu dokumentaciju za predmetna tri projekta. Obaveza Ministarstva prosvjete je da obezbijedi reviziju projektne dokumentacije za objekat u krugu KBC-a i objekat OŠ Dacići.

- Uprava javnih radova je pokrenula procedure pripreme tenderske dokumentacije za adaptaciju škole u Miločanima, koja je prepoznata kao prioritetan projekat. Takođe, u toku su pripremne aktivnosti na izradi tenderske dokumentacije za OŠ Dacići, nakon čega će se pristupiti pripremnim aktivnostima na izradi tenderske dokumentacije za objekat u krugu KBC-a.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 285.000 €.

9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

9.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice sa pratećim sadržajima, primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza (izgradnja sistema vodosnabdijevanje, akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje).
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.550.000 €.

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, I faza

- Projektom je predviđena rekonstrukcija puta u dužini od 2,3km, što obuhvata zemljane radove, asfalterse radove, ugradnju saobraćajne opreme i signalizacije i postavljanje 10kV kablova. Izvođenje radova se realizuje u dvije faze.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50 €
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 17.08.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5819/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.11.2015. godine, na iznos od 777.385,73 €.
- Izbor stručnog nadzora izvršen je neposrednim sporazumom, na osnovu ponude br. 19/2-01-2073/2 od 20.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2492/2 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.05.2016. godine, na iznos od 4.988 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.489,2 € za tekuće izdatke, odnosno 738.362,94€ za kapitalne izdatke.
- Nakon završetka radova druge faze biće izvršen tehnički prijem za kompletan put. Takođe, nije izrađen konačni obračun, jer su radovi ugovoreni po starom zakonu.

- **Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, II faza**

- Radovi II faze obuhvataju preostali dio zemljanih radova, asfalterse radove i saobraćajnu opremu i signalizaciju na cijeloj dužini trase puta od 2,3km, kao i postavljanje 10kV kablova.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50 €,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5753/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 1.331.618,01 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.04.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00 €.
- Završena je izgradnja saobraćajnice i ugrađena oba sloja asfalta.
- U toku su radovi na postavljenju putarske mreže za zaštitu kosina.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.595,30 € za tekuće izdatke, odnosno 1.307.627,74€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.337.223,04 €, od čega nije bilo realiacije u 2020. godini.
- U cilju uklapanja trase puta sa trasom Lubnice-Jezerine, došlo je do pomjeranja projektovane trase, što je za posljedicu imalo dodatne količine iskopa u odnosu na projektovane, kao i izradu potpornih konstrukcija kojima će se izvršiti stabilizacija kosine na mjestu gdje je došlo do pomjeranja. Na osnovu izvještaja o geotehničkoj strukturi terena, urađen je novi projekat za izradu potpornih konstrukcija, kao i za dio puta ispred potpornih zidova, u dužini od 180 m.

Završetak ovih radova je zavisio od izgradnje I i II faze potpornih konstrukcija, pa je isti nekoliko puta produžavan.

U toku je izrada konačnog obračuna radova.



Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, I faza (PR8-PR14)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski resorta "Kolašin 1450" do Ski resorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a drugu fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija je rađen kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta (I i II faza) raspisano je 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institutom za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695 € (za I i II fazu).
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta “Kolašin 1450” do Ski rezorta “Kolašin 1600” (za I i II fazu) je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta “Kolašin 1450” do Ski rezorta “Kolašin 1600” (za I i II fazu), sa projektantom, “Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2376/1 sa izvođačem, "Akropolis" d.o.o. Nikšić, je zaključen 09.04.2019. godine, na iznos od 392.255,31 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 17.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01-812/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 8.730,00 €.
- Nakon sprovedenih geoloških istraživanja i izrade Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena, u julu 2018. godine, urađen je projekat izrade potpornih konstrukcija. Uvođenjem izvođača radova u posao, ustanovljena je neusaglašenost projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, pa je u avgustu 2019. godine napravljena izmjena projektne dokumentacije.
- Radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.898,62 € za tekuće izdatke, odnosno 386.518,19 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 395.416,81 €, od čega 9.570,76 € u 2020. godini.
- Stručni nadzor sprovodi aktivnosti na izradi konačnog izvještaja.

Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450- Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, II faza (PR1-PR8)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski resorta “Kolašin 1450” do Ski resorta “Kolašin 1600”, napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a II fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija rađen je kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta (I i II faza) raspisano je 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta, JU „Institutom za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine na iznos od 695 € (za I i II fazu).
- Ugovoru o izradi projektne dokumentacije zaključen je sa “GeoT” d.o.o Podgorica.

- Javno nadmetanje za izbor dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" (za I i II fazu) je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" (za I i II fazu), sa projektantom, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5068/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 488.835,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-9975/1 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2019. godine, na iznos od 7.865,00 €.
- Nakon sprovedenih geoloških istraživanja i izrade Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena, u julu 2018. godine, urađen je projekat izrade potpornih konstrukcija. Uvođenjem izvođača radova u posao, ustanovljena je neusaglašenost projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, pa je u avgustu 2019. godine napravljena izmjena projektne dokumentacije.
- Radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.310,70 € za tekuće izdatke, odnosno 488.831,35 € za kapitalne izdatke.
- S obzirom na to da je urađena izmjena projektne dokumentacije, došlo je do prekoračenja ugovorenih količina radova. Upućen je zahtjev Ministarstvu finansija za obezbjeđenjem dodatnih sredstava i odobren je pregovarački postupak. Nakon što budu završeni radovi po pregovaračkom postupku, stručni nadzor će završiti izvještaj za obje faze.
- **Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, potporne konstrukcije, II faza - pregovarački postupak**
- Zbog izmjene prvobitne trase puta, javila se potreba za izradom potpornih konstrukcija. Ugovor se odnosi na naknadne radove i višak radova, ugovorenih po pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja, kojim je odobrena izmjena dopune glavnog projekta. Projekat konstrukcije za "Via projekt" d.o.o Podgorica, koji je radio glavni projekat izrade puta, radio je "GeoT" d.o.o. Podgorica. Izmjena projekta i dopuna izmjene, na koju se odnosi ovaj projekat, je povjerena projektantu osnovnog projekta, odnosno "GeoT" d.o.o. Podgorica, bez raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmjene dopune glavnog projekta je raspisano 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta, JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695,00 €.
- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera. Ugovor br. 01-334/20-1977/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 72.989,38 €.

- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera za izbor izvođača radova. Ugovor br. 01-334/20-3179 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 1.149,50 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 695,00 € za tekuće izdatke, odnosno 46.809,96 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 47.504,96 €, od čega 46.809,96 € u 2020. godini.
- U toku postavljanja putarske mreže za zaštitu kosina, izvođač radova je obavijestio naručioca i stručni nadzor da je na kosini iza zida, došlo do pojave ozbiljne pukotine. Stručni nadzor je dao svoje mišljenje u kojem nije mogao jasno potvrditi ozbiljnost deformacije, već je predložio angažovanje geologa. Zahtjev za dostavljenje stručnog mišljenja je upućen projektantu i revidentu.
U toku je izrada konačnog obračuna radova.



- **Izvođenje asfaltnih radova u toku rekonstrukcije puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600 - II faza, (PR1 - PR14)**
- Dio puta ispred potpornih zidova, u dužini od oko 180m koji je predmet projekta, je dio puta prema skijalištu "Kolašin 1600", koji je zbog izmjene trase pomjeren. Projektom je obuhvaćena izrada tampona, asfalta, rigola, na dijelu ispred potpornih zidova.
- Obradivač izmjene glavnog projekta je "Via projekt" d.o.o. Podgorica.
- Ugovor br. 01-9846/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.12.2019. godine, na iznos od 605,00 €.


- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9394/1 sa izvođačem , "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 69.920,19 €.
 - S obzirom da je ovaj dio puta bio obuhvaćen osnovnim ugovorom, nije raspisivano javno nadmetanje za usluge vršenja stručnog nadzora, već je nadzor koji je angažovan za izgradnju II faze puta Kolašin 1600, vršio stručni nadzor nad ovim projektom. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00 €.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni.
 - U toku su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za dokazivanje opravdanosti izvođenja asfaltnog sloja koji nije ugrađen po projektu.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 605,00 € za tekuće izdatke, odnosno 8.506,57 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 9.111,57 €, pri čemu nije utroška sredstava u 2020. godini.
 - U toku je izrada konačnog obračuna radova.
- **Vodosnabdijevanje uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Kolašin 1600**
 - Objekat vodosnabdijevanja čine: 3 kaptaze, rezervoar kapaciteta 80 m³ i cjevovod dužine 2700 m. Objekat je u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, KO Smrčje, opština Kolašin.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6426/1 sa obrađivačem glavnog projekta, Konzorcijum „HydroGis System” d.o.o. Podgorica, „Jawel Crna Gora” d.o.o. Danilovgrad, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2015. godine, na iznos od 19.635,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 13.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-850/1 sa revidentom glavnog projekta, „Virmont” d.o.o. Bar, je zaključen 26.02.2016. godine, na iznos od 4.890,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.07.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6460/1 sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2016. godine, na iznos od 181.443,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1917/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.808,00 €.
 - Završeni su svi radovi na vodosnabdijevanju uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600”.
 - U toku su aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.809,80 € za tekuće izdatke, odnosno 138.057,14 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 164.866,94 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
 - Problematika na realizaciji projekta odnosi se na probleme sa korisnicima katuna na ovom području koji su osporavali radove na izgradnji kaptaze sa izvorišta katuna Krvnik, zbog čega se kasnilo sa realizacijom projekta.

- **Trafostanica 35/10 kV Jezerine**
 - Projekat je realizovan po principu „projektuj i izgradi“.
 - Svi radovi na projektu su završeni 2017. godine.
- **Žičara K8**



- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mnm-Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.
 - Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni i objekat je u februaru 2019. godine pušten u funkciju.
- **Ski staze uz žičaru K8**
 - Projekat se realizuje po principu “projektuj i izgradi”. Ukupna dužina ski staza iznosi 6 km.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova je raspisano 01.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7567/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.197.900,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8054/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2901 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 4.477,00 €.
 - Do sada su sprovede i završene aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije.
 - Radovi su u završnoj fazi.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.526,20 € za tekuće izdatke, odnosno 960.715,80 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 968.242,00 € od čega 663.927,00 € u 2020. godini.
- **Žičara K7 - povezivanje Kolašin 1450 - Kolašin 1600**
 - Prostornim planom posebne namjene “Bjelasica i Komovi” predviđena je izgradnja isklopive šestosjedne žičare K7 čijom izgradnjom će se povezati skijališta “Kolašin 1450” i “Kolašin 1600”. Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 26.03.2019. godine.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.04.2019. godine.
 - Ugovor br. 01-6450/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, konzorcijum „Doppelmayr – Kolašin”, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 8.998.000 €.
 - Ugovor br. 01-7065/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 79.000 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.12.2019. godine.
 - Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00 €.
 - Do sada su sprovede aktivnosti na izradi idejnog rješenja i glavnog projekta.
 - U toku su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 71.100,00 € za tekuće izdatke, odnosno 2.830.578,08 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 2.901.578,08 € od čega 2.033.430,08 € u 2020. godini.

- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore.

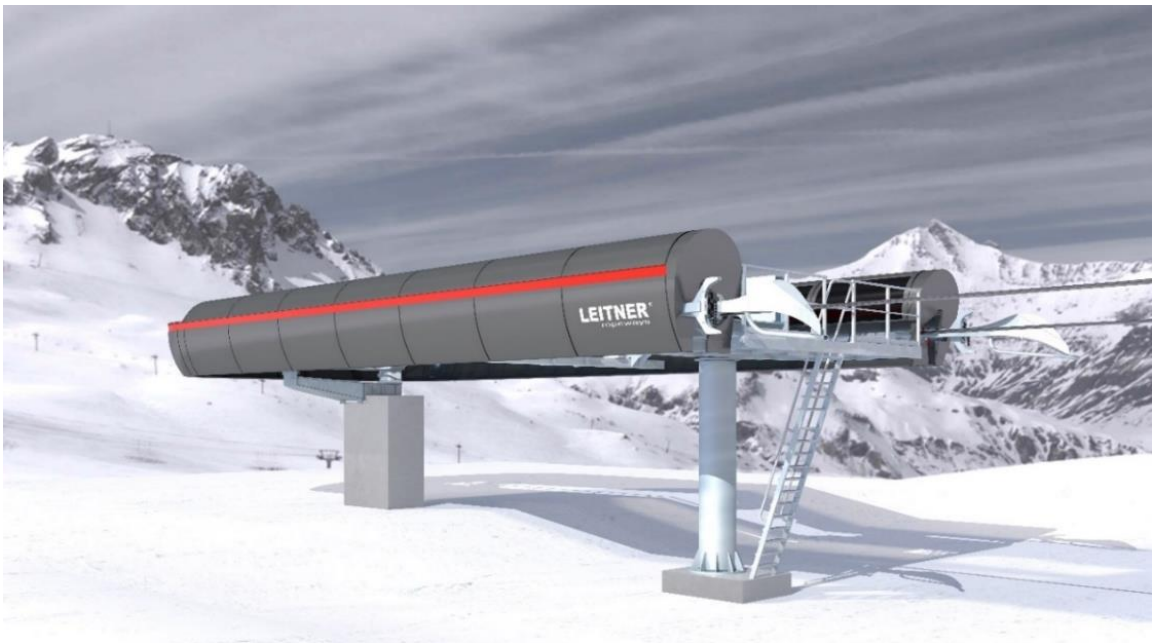

- **Ski staze uz žičaru K7**

- Projekat se realizuju po principu “projektuj i izgradi”. Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa

obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00 €.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije.
- U toku su zemljani radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.794,80 € za tekuće izdatke, odnosno 810.964,87 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 827.759,67 € od čega 827.759,67 € u 2020. godini.

9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 2.001.100 €.

• Ravna Rijeka - Jasikovac 5,5 km

- Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko - pravni problemi u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.
- Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.
- Ugovor br. 01-334/20-2897 sa izvođačem radova, “Konstruktor” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 192.801,00 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-5972/1 sa stručnim nadzorom, “Projectman” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.09.2018. godine, na iznos od 4.990,00 €.
- Završena je izgradnja potpornog zida. Preostali su završni radovi na tamponiranju na ovom dijelu puta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 160.000,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 3.500,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 163.500,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

• Jasikovac - Cmiljača 10 km

- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km.

- U završnoj fazi je izvođenje III faze radova koji obuhvataju zemljane radova i potporne konstrukcije, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvođenja radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.04.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-2798/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 22.07.2014. godine, na iznos od 19.635 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 20.11.2014. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-5127/2 sa revidentom glavnog projekta, „Simm inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.11.2014. godine, na iznos od 3.000,00 €.

III faza

- Radovima III faze obuhvaćeni su zemljani radovi u dužini od 3 km, potporni zidovi i propust na kompletnoj dužini trase.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 04.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5915/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.09.2018. godine, na iznos od 1.543.162,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 20.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6943 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 15.780,00 €.
- Završeni su radovi na proboju puta, izradi potpornih zidova i izradi propusta.
- U toku je tamponiranje na cijeloj trasi puta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.310.000,00 €, od čega 115.000,00 € u 2020. godini.
- Radovi na ovoj fazi se odvijaju otežano zbog pojave klizišta i neusklađenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.



- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača**

- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00 €.
- Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta.
- U toku je izvođenje zemljanih radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.381,00 € za tekuće izdatke, odnosno 176.400,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 187.781,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Primarna elektroenergetska infrastruktura**

- **Izgradnja trafostanice „Cmiljača“ 35/10 kV**

- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojkovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2728/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Izvršena je nabavka elekto opreme koja je predviđena za izgradnju predmetne trafostanice.
- U toku su završni radovi na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 23.958 € za tekuće izdatke, odnosno 796.358,62 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 796.358,62 €, od čega 715.338,45 € u 2020. godini.



Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS Ribarevine 110/35 kV

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3090/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 19.995,25 €.


- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5418/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 2.970,00 €.
- Sprovede su aktivnosti na dobijanju saglasnosti na projekat i saglasnosti za priključenja na elektroenergetsku mrežu od strane CEDIS-a. Izvršena je prijava adaptacije predmetne trafostanice, te shodno tome, u narednom periodu se očekuje uvođenje izvođača u posao.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00 €.
 - Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase.
 - U toku je izmjena projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da je predmetni dalekovod u fazi izmjene projektne dokumentacije. Izvođač radova nije u mogućnosti da ugovorom obezbijedi predviđene stubove. Naime, proizvođač stubova kojeg je izvođač dao u ponudi, zbog finansijskih problema, otišao je u stečaj. Shodno tome, izvođač radova se obratio Upravi javnih radova sa zahtjevom za izmjenu projektne dokumentacije u vidu promjene proizvođača stubova, te ponudio proizvođača stubova koji će isporučiti stubove istih ili boljih karakteristika od onih koji su predviđeni ponudom. Nakon dopisa od strane nadzorne službe, koja je saglasna da je razlog za izmjenu projektne dokumentacije opravdan, u saradnji sa projektantom predmetnog projekta, krenulo se u izmjenu projektne dokumentacije. Nakon urađene izmjene projektne dokumentacije, ista će biti prosljeđena na reviziju.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača**
 - Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekata na lokaciji planinskog centra "Cmiljača" sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800 m'.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel Inženjerong” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00 €.
- Za početak radova se čeka zapisnik o pozitivnom inspekcijskom pregledu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 18.458,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 18.458,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- U toku je pribavljanje neophodnih saglasnosti na glavni projekat, nakon čega će se stvoriti uslovi za uvođenje izvođača u posao.

- **Nabavka žičare šestosjed Z7**

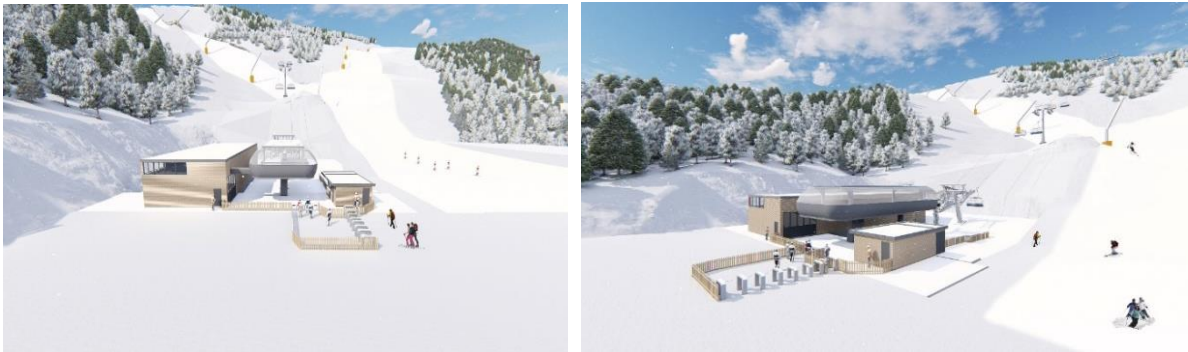

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvo” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00 €.
- Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza.
- Završeni su radovi na montaži stubova, polazne i dolazne stanice žičare.
- U toku je izgradnja 3 km ski staza.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 53.006,92 € za tekuće izdatke, odnosno 6.891.676,00 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 6.944.682,92 €, od čega nije bilo realizacije u 2020. godini.
 - U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.
- **Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski**
 - Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00 €.
 - U toku je postupak potpisivanja ugovora sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
 - Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
 - Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 1.725.000 €.
- **Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza**
 - Put se nalazi u opštini Mojkovac. Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanje 10 kV kabla, a asfalterški radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
 - Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00 €.
 - Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00 €.
- Sprovedene su aktivnosti na rješavanju problema koji su nastali u toku izvođenja radova, a u cilju nastavka radova na izgradnji puta.
- Do sada su završeni zemljani radovi na probouju II faze puta, izrada potpornih konstrukcija i pločasti propusti.
- Radovi po ovom Ugovoru se trenutno ne izvode, jer su preostali radovi na izradi gornjeg stroja puta, koji se ne mogu izvoditi dok se ne riješe problemi nastali tokom izvođenja radova- navedeni u problematici.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.183,00 € za tekuće izdatke, odnosno 706.531,03 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 730.714,03 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Dio trase od PR 180 do PR200, odnosno spoj I i II faze izgradnje puta, nije izveden zbog neriješenih imovinsko-pravnih pitanja koji su u nadležnosti Opštine. Za sanaciju izvedenih kosina na I i II fazi trase puta, raspisani su novi tenderi - potporne konstrukcije I i II faze-na I fazi trase puta i potporne konstrukcije III faze-na II fazi trase puta. Izrada potpornih konstrukcija I faze je završena, za potporne konstrukcije II faze radovi su u toku. a za III fazu potpornih konstrukcija, u toku je tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Problematika se odnosi i na zahtjeve mještana, kojima projektom nije omogućen prilaz imanjima, kao i neriješeni imovinski odnosi sa vlasnikom imanja kod katuna. Da bi se ova pitanja riješila, upućen je zahtjev Opštini Mojkovac da precizno definiše zahtjeve mještana.



• **Izgradnja puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije), II faza**

- Nakon izgradnje I faze puta, došlo je do obrušavanja kosina koje su urađene po projektu i do pojave klizišta. Izrađen je projekat sanacije kosina na I fazi puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8027/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2018. godine, na iznos od 4.985,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta nije raspisano, već je ugovor zaključen na osnovu ponude ponuđača. Ugovor br. 440/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 26.06.2019. godine, na iznos od 2.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 09.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7557/1 sa izvođačem, "Eko reciklaža" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 967.990,50 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.09.2019. godine, ali je poništeno. Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom, "Kov atelje" d.o.o. Nikšića, na osnovu dostavljene ponude, na rok od 2 mjeseca. Nakon toga, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti, od 10.03.2020. godine, izabran je stručni nadzor do kraja realizacije projekta. Ugovor br. 01-7462/1 sa stručnim nadzorom, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, je zaključen 01.10.2019 godine na iznos od 4.900,50 €. Ugovor br. 01-334/20-2500 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, projects & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 14.883,00 €.
- Sprovedene su aktivnosti na izradi i reviziji tehničke dokumentacije, aktivnosti za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i stručnog nadzora i izvođač je uveden u posao.
- Završeni su radovi na zidovima od prvog do osmog.
- U toku su radovi na izradi zida 9 i aktivnosti u vezi sa rješavanjem problema oko ostavljanja pristupa imanjima mještana.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.385,70 € za tekuće izdatke, odnosno 534.803,18 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 547.188,88 €, od čega 534.803,18 € u 2020. godini.
- S obzirom na veliku dužinu potpornih konstrukcija, mještani nijesu dozvolili da se zidovi izvedu po projektu i obratili su se Opštini Mojkovac sa zahtjevom da im se ostavi pristup imanjima. U toku izvođenja radova, na zidovima 7 i 8 ostavljeni su otvori koji će biti tretirani budućim projektom, za što je dobijena saglasnost projektanta i revidenta.



- **Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac**
- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2020. godine.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine.
 - Ponude za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i stručnog nadzora su otvorene, u toku je postupak donošenja odluke.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.932,50 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- **Izvođenje radova na izgradnji izmijenjene trase puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m**
 - Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50 €.
 - U toku je izrada projektne dokumentacije. Nakon dostave glavnog projekta, slijedi revizija projekta i javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- **Regionalni put Mojkovac-Vragodo-Lubnica dužine 8,5 km**
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije - geodetsko snimanje dionice puta Mojkovac – Vragodo, cca 8km je raspisano 18.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8441/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 8.954,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije - saobraćajne trase dionice puta Mojkovac-Vragodo cca 8 km, je raspisano 04.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8478/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2020. godine, na iznos od 14.520,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta Glavnog projekta dijela puta Mojkovac-Vragodo, cca 8km je raspisano 16.06.2020.godine. Ugovor br. 01-334/20-5422/1 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam-Ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 5.989,50 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.474,00 € za tekuće izdatke.
 - Ukupno je realizovano 24.474,00 € , od čega 2.904,00 € u 2020. godini.
 - Dalje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava za saobraćaj.
- **Most na rijeci Tari- povezivanje regionalnog sa magistralnim putem cca L=220 m**
 - Mosta na rijeci Tari lociran je na KO Podbišće i KO Bjelojevići u opštini Mojkovac.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog projekta je raspisano 09.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4846/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Preduzeće za građevinski

nadzor i laboratorijaska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 06.12.2017. godine, na iznos od 34.510,00 €.

- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta je raspisano 04.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8440/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 14.520,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog i idejnog projekta je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-9374/1 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam-Ing" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 8.000,00 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 49.030,00 € za tekuće izdatke.
 - Ukupno je realizovano 49.030,00 €, od čega 16.708,00 € u 2020. godini.
 - Dalje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava za saobraćaj.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski “**
 - Donešena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja “Žarski”.
 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga će Uprava javnih radova sprovesti proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe Ski centra Žarski**
 - Lokacija objekta je na prostoru Ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi”. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Naš Mojkovac" iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00 €.
 - Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta.
 - U toku je izrada temeljne konstrukcije.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.776,00 € za tekuće izdatke, odnosno 272.838,80 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 280.614,80€, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4**



- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta.

- U toku su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 23.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 3.241.469,40 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 3.264.496,40 €, od čega 2.392.996,15 € u 2020. godini.
 - Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore.
- **Ski staze uz žičaru Z4**
 - Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - U toku je eksproprijacija.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 617.402,50 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 617.402,50 €, od čega 142.477,50 € u 2020. godini.
 - Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Skijališta Crne Gore.
- **Adaptacija objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu**
 - Projektom dokumentacijom planirana je adaptacija dijela postojećeg objekta koji je u vlasništvu Opština Mojkovac, a za potrebe Skijališta Crne Gore.
 - Poslovni prostor se sastoji od ulaznog hodnika, stepeništa, toaleta, portirnice i čajne kuhinje u prizemlju. Na spratu se nalazi veliki centralni hodnik sa osam prostorija raspoređenih oko njega. Površina objekta iznosi 188,90 m². Spratnost objekta je prizemlje i sprat.
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedio korisnik. Obrađivač glavnog projekta je “INGrad” d.o.o. Podgorica.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8027/1 sa izvođačem radova, „Konstruktor group” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 134.475,97 €.
 - Javno nadmetanje za stručnog nadzora je raspisano 10.06.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-7558/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 5.989,50 €.
 - Na objektu su završeni svi radova, izuzev završnih radova na elektroinstalacijama i funkcionalne probe izvedenih instalaterskih radova.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.114,54 € za tekuće izdatke, odnosno 91.769,51 € za kapitalne izdatke.

- Ukupno je realizovano 94.884,05 €, od čega 78.220,37 € u 2020. godini.
- Obaveza Opštine Mojkovac je da obezbijedi priključenje objekta, što se očekuje do kraja septembra tekuće godine, čime će se nastaviti i završiti radovi na objektu.

9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 680.000 €.
- **Putna infrastruktura**

Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje – Štedim



- Realizacija projekta rekonstrukcije putnog pravca Rožaje - Štedim realizuje se fazno.
- Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 7,2 km, a preostalo je izvođenje asfaltnih radova na kompletnoj dionici, čime će projekat biti završen.
- Projekat obuhvata rekonstrukciju kompletne dionice puta, kao i izgradnju saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije sa regulisanom odvodnjom i izgradnjom potpornih konstrukcija.
- Ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.
- Ugovor sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.

II faza

- Druga faza obuhvata radove u dužini od 2,2 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 20.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-3885/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.07.2016. godine, na iznos od 405.622,10 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora II faze je raspisano 13.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-4140/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.08.2016.godine, na iznos od 6.000,00 €.
- Do sada su završeni svi radovi po ugovoru za ovu fazu, osim dijela puta koji je sporan zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- U toku su aktivnosti za nastavak radova na dijelu puta koji je bio sporan za izvođenje radova.
- Na realizaciji projekta za II fazu je utrošeno 399.265,21 €.
- Radovi na projektu za ovu fazu nijesu u potpunosti završeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na terenu, koje su u nadležnosti Opštine Rožaje.

III faza

- Treća faza obuhvata radove u dužini od 1,4 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača III faze je raspisano 19.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 585.629,58 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora III faze je raspisano 23.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1588/1-1948/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 5.180,00 €.
- Do sada su završeni radovi po projektu i ugovoru za ovu fazu.
- U toku su aktivnosti na tehničkom prijemu radova.
- Na realizaciji projekta za III fazu je utrošeno 585.629,27 €.
- Ukupno je realizovano 585.629,27 € , od čega 13.500 € u 2020. godini.

IV faza

- Četvrta faza obuhvata radove u dužini od 1,6 km.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 02.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3089/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 870.491,22 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 11.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3277/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Do sada su završeni svi radovi po Ugovoru za IV fazu radova.
- U toku su aktivnosti na tehničkom prijemu radova.
- Na realizaciji projekta za IV fazu je utrošeno 870.490,00 €.
- Ukupno je realizovano 870.490,00 €, od čega 10.000,00 € u 2020. godini.

V faza

- Peta faza obuhvata dužinu puta od 1 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 14.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4381/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 20.06.2019. godine, na iznos od 1.090.903,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 31.05.2019. godine. Ugovor br. 01-5373/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.07.2019. godine, na iznos od 12.600,00 €.
- Do sad su završeni svi radovi po ugovoru za IV fazu radova na ovom projektu.
- U toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.090.900,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 12.600,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.103.000,00 €, od čega 80.000,00 € u 2020. godini.

• **Žičara**

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim”. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon” d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja ski staza i idejnog rješenja i glavnog projekta izgradnje isklopive šestosjedne žičare.
- Prijavljeni su radovi 07.09.2020. godine od strane korisnika i izgradnja je u toku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 32.670 € za tekuće izdatke, odnosno 2.238.500 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.271.170,00 €, od čega 1.671.170,00 € u 2020. godini.

- Aktuelna epidemiološka situacija sa pandemijom virusa COVID-19 u zemlji i regionu je značajno usporila sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta, naročito o pitanju uvoza specijalizovane opreme.



- **Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"**



- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.
- Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00 €.
- U toku su aktivnosti na izradi idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na usaglašavanje izrađenog idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je obaveza Opštine Rožaje i Skijališta Crne Gore.

- **Elektroenergetska infrastruktura**

- U toku je priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za napajanje ski centra "Hajla", koja će se realizovati po principu "projektuj i izgradi". U prethodnom periodu komisija za pripremu tenderske dokumentacije je u saradnji sa Opštinom Rožaje, kao i predstavnicima CEDIS-a, održala više radnih sastanaka, koji su za cilj imali izradu projektnog zadatka, definisanje tehničkih uslova, tehničkih specifikacija.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.

9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor Žabljak

- Realizacija projekta Ski centra na lokalitetu "Savin kuk" na Žabljaku planirana je fazno.
- Radi se o višegodišnjem projekatu. Sredstva planirana Zakonom o budžetom za 2020. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije, izgradnju cjevovoda od Modrog jezera do Savinog kuka, pravljenje akumulacije za vještačko osniježavanje na skijalištu i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.070.000 €.


- **Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ski staze dužine cca 1,5 km**

- Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi".
- U oktobru 2017. godine završena je izrada Glavnog projekta.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalni parkovi sprovode aktivnosti na izmjenama granica zona zaštite, što je neophodno da bi se stvorili uslovi za izdavanje građevinske dozvole.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

- **Izgradnja žičare i 4 km staza**

- Planirana je izgradnja šestosjedne žičare i 4km ski staza, na lokaciji „Savin kuk" u opštini Žabljak. Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4587/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.07.2018. godine, na iznos od 8.788.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-3360/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2019. godine, na iznos od 12.750,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1817/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 54.208,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i nabavka opreme.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 36.481,98 € za tekuće izdatke, odnosno 5.914.873,25 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 5.951.355,23 €, od čega 240.487,98 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-115 od 20.06.2019. godine, Uprava javnih radova obaviještena da se do donošenja finalnih preporuka UNESCO-a obustavlja izgradnja šestosjedne žičare i 4 km ski staza na lokalitetu „Savin kuk“ u opštini Žabljak.

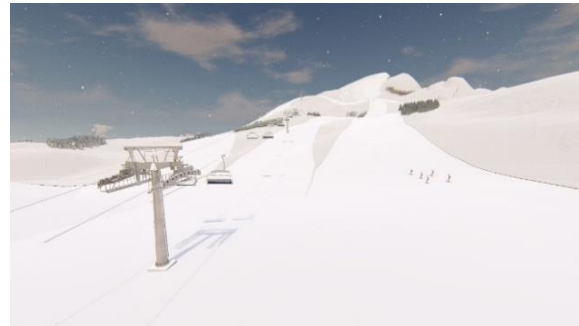

- **Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice Usjek-Motički gaj, dužine cca 5km**

- U 2018. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je predata opštini u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radovi na rekonstrukciji puta su ugovoreni i sa istima će se otpočeti kada se za to stvore uslovi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8292/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” a.d. Podgorica, je zaključen 28.10.2019. godine, na iznos od 1.799.297,81 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8106/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 34.485,00 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Suvog boba**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1309/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2017. godine, na iznos od 19.200,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-933/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.07.2017. godine, na iznos od 2.915,00 €.
- Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije su obustavljene.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Elektroenergetska infrastruktura**

- U 2020. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće elektoenergetske infrastrukture za ski centar, za koji je potrebno kompletirati projektni zadatak.
- Nakon završetka projektne dokumentacije planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitiring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 1.550.000 €.
- **Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu**
- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
 - U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
 - Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m².
 - Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50 €.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor sa stručnim nadzorom druge faze još nije zaključen, jer je vrednovanje ponuda u toku.
- Radovi I faze su u toku. Sa radovima II faze će se otpočeti nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 275.165,76 € za tekuće izdatke, odnosno 744.042,57 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.019.208,33 €, od čega 750.325,83 € u 2020. godini.



- **Pristupni put Bistrica- Manastir Podvrh**

- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.

- Radovi na ovom projektu se izvode u fazi zemljanih radova, potpornih konstrukcija, polaganja elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.



II faza – radovi, pregovarački postupak

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.10.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.
- Ugovor br. 01-7895/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2019. godine, na iznos od 4.961 €.
- Ugovor br. 01-8156/1 sa revidentom glavnog projekta, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 2.964,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.08.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.09.2019. godine.
- Ugovor br. 01-8028/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 379.997,75 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-1932/1 sa stručnim nadzorom, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 15.000 €.
- Završeni su svi radovi po ugovoru.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 379.997,75 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 379.997,75 €, od čega 54.000,00 € u 2020. godini.


II faza – signalizacija

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 08.08.2019. godine.
- Ugovor br. 01-5921/1 sa obrađivačem projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. je zaključen 08.08.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.07.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.07.2019. godine.
- Ugovor br. 01-7112/1 sa izvođačem, „Alfaprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.09.2019. godine, na iznos od 238.250,70 €.
- Ugovor br. 01-6470/1 sa stručnim nadzorom, „Ing impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 4.890,00 €.
- Završeni su svi radovi po ugovoru.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.890,00 € za tekuće izdatke, odnosno 238.25.000 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 243.500,00 €, od čega 225.000,00 € u 2020. godini.

II faza – radovi

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.10.2017. godine.
 - Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 24.11.2017. godine.
 - Ugovor br. 101-1560/1-4210/1 sa izvođačem, „Crnogoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2017. godine, na iznos od 2.579.858,13 €.
 - Ugovor br. 101-1560/1-1932/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 15.000 €.
 - Do sada su završeni svi radovi po Ugovoru za ovu fazu radova.
 - U toku su aktivnosti na konačnom izvještaju i konačnom obračunu.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.220.000,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 10.000,00 € tekuće izdatke.
 - Ukupno je realizovano 2.230.000 €, od čega 190.585,00 u 2020. godini.
- **Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”**
 - Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793 m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine.
 - Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946 €.
 - Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502 €.
 - Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
 - Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
 - U toku je pribavljanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje.
 - Obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma je da u saradnji Opštinom Bijelom Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.



- **Elektroenergetska infrastruktura**

- Za potrebe elektro napajanja kompleksa "Đalovića pećine" ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS Bistrica do buduće TS Manastir Podvrh, kao i TS Manastir Podvrh.

Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS "Nedakuse" 35/10 kV

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.06.2018. godine. Ugovor br. 01-3178/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 29.760,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4800 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950,00 €.
- Dobijena je saglasnost na projekat i saglasnost za priključenja na elektroenergetsku mrežu od strane CEDIS-a. U narednom periodu se očekuje uvođenje izvođača u posao.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV

- Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine.
- Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500 €.
- Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00 €.
- Do sada su završeni građevinski, elektro i hidro radovi.
- U toku je uređenje terena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.021,35 € za tekuće izdatke, odnosno 1.147.225,50 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.147.225,50 €, od čega 1.060.762,41 € u 2020. godini.

- U toku je rješavanje problematike upojnog bunara. Projektant je dao rješenje koje nije u skladu sa postojećim stanjem terena, zbog visokog nivoa podzemnih voda. Takođe, pokrenuta je procedura pregovaračkog postupka zbog radova koji su predviđeni projektom, a nijesu definisani predmjerom radova u tenderskoj dokumentaciji.



Izgradnja 35 kV dalekovoda Nedakuse-Bistrica

- Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00 €.
- Dobijena je građevinska dozvola i završeno je krčenje šume i niskog rastinja.
- U toku je revizija izmjenjene projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 209.908,45 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 212.908,45 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na polongiranje procedure izdavanja građevinske dozvole. Naime, proizvođač stubova kojeg je izvođač dao u ponudi, nije mogao da obezbjedi proizvodnju, distribuciju i montažu stubova u ugovorenom roku. Nakon protoka određenog vremena od potpisivanja ugovora, ne krivicom izvođača, a izjašnjenjem nadzorne službe, koja je saglasna da je razlog za izmjenu projektne dokumentacije opravdan, u saradnji sa projektantom predmetnog projekta, krenulo se u izmjenu projektne dokumentacije. Nakon urađene izmjene projektne dokumentacije, ista će biti prosljeđena na reviziju.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave javnih radova. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00 €.
- Završeno je polaganje kablovske infrastrukture.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 68.606,29 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 71.606,29 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



• **Žičara**

- Planirana je izgradnja i opremanje žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu "projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00 €.
- Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije.

- Završena je izgradnja pristupnih puteva i betoniranje temelja stubova sa ugradnjom ankera osim temelja stuba br. 7.
- U toku je obezbjeđivanje uslova za nastavak montaže stubova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 77.468,00 € za tekuće izdatke, odnosno 3.329.799,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.407.267,00 €, od čega 405.831,88 € u 2020. godini.
- Kašnjenje montaže stubova uzrokovano je nemogućnošću dolaska ovlašćenih montera zbog novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19. Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.



- **Vodosnabdijevanje**

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbjediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018., na iznos od 34.848,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00 €.
- U toku je izrada glavnog projekta.

- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje, koje je proslijeđeno Opštini Bijelo Polje na saglasnost. Naime, opština je dostavila izjašnjenje u kom navodi da je saglasna sa predloženom varijantom kojom je snabdijevanje vodom objekata na ulazu u pećinu planirano dovodom vode sa postojećeg vodovoda iz MZ Korita, tj. sela Đalovići; međutim, predložena varijanta za snabdijevanje vodom objekata na polaznoj žičari stanice, kojom je planiran dovod vode iz bunara kod Manastira Podvrh, prema mišljenju opštine, je neracionalna i potrebno je razmotriti varijantu vodosnabdijevanja sa izvorišta iz sela Mokri lug, lokalitet Velja bara. U skladu sa tim, dogovoreno je da projektant definiše sve preduslove za realizaciju projekta na ulazu u pećinu, kao i da argumentovano obrazloži predloženo rješenje snabdijevanja vodom na polaznoj žičari stanice, nakon što Opština Bijelo Polje sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta iz sela Mokri lug za vodosnabdijevanja objekta na polaznoj žičari stanice.
- **Izgradnja objekta vizitiring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom**
 - Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75 m².
 - U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „PermonTE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00 €.
 - U toku je revizija glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.



- **Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o., Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o., Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00 €.
 - Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50€ za tekuće izdatke.
 - Ukupno je realizovano 6.453,50 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da izvođač nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice iz razloga što je usljed velikih padavina kiša nivo rijeke narastao i time je odloženo izvođenje radova sve dok se ne steknu povoljni vremenski uslovi.
- **Rekonstrukcija lokalnog puta Bistrica-Mojstir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima**
 - Veza mosta sa lokalnim putem Bistrica-Mojstir planirana je izgradnjom pristupne saobraćajnice mostu na katastarskoj parceli br. 461/1 KO Bistrica, u dužini od oko 170 m dok je veza sa putem Bistrica-Manastir Podvrh planirana izgradnjom saobraćajnice preko katastarske parcele br. 1/5/2, KO Kostenica, ukupne dužine oko 80 m.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-521 sa obrađivačem glavnog projekta, „Optimus projekt” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 15.888,51 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 14.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2715/1 sa revidentom glavnog projekta, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 4.410,45 €.
 - U toku je revizija glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekta do nije bilo utroška sredstava.

9.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Kaskade su definisane modulom za dvosmjerno parkiranje automobila na svakoj etaži. Ukupna površina objekta je cca 48.000

m², a površina I faze koja je predmet ugovora je cca 20.000 m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta iskopa temeljne jame (I faza) i izvršena prijava građenja za navedene radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godine obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 997.900,00 € za kapitalne izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



9.8. Turistička infrastruktura- izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izrada replike prve štamparije na Balkanu - štamparije Crnojevića, izgradnja komunalne infrastrukture područja Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama, Info centra u Mojkovcu, Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala

Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", rekonstrukcija tvrđava i postavljanje spomen obilježja "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru, uređenje spomen parka "Knjaževac" u Andrijevici, Planinarski dom na lokalitetu "Štavna" Andrijevica, valorizacija kanjona "Nevidio". Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeno je 100.000 €.

- **Izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru**

- Projektom je predviđena detaljna rekonstrukcija kompletne unutrašnjosti palate, koja će obuhvatiti zamjenu svih drvenih elemenata od poda do plafona, uključujući ugradnju novog stepeništa od hrastovine, postavljanje kamenih ploča prilagođenih postojećoj arhitekturi i radove na termo-tehničkim instalacijama.
- Objekat će sadržati namjenske staklene vitrine za čuvanje eksponata, moderan alarmni sistem, a predviđeno je i opremanje inventarom neophodnim za rad kustosa. Spratnost: P+1, površina objekta je 135 m².
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo Ministarstvo kulture.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1567 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 06.03.2020. godine, na iznos od 91.499,99 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5588/1 sa stručnim nadzorom, „Enforma“ d.o.o. Kotor, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 4.500,00 €.
- U toku su pripreme aktivnosti za početak radova.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utoška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na to da pregledom tehničke dokumentacije i ugovorenog predmjera radova izvođač radova i nadzorni organ konstatovali su da postoje određeni nedostaci i neusaglašenosti zbog kojih nije moguće izvoditi radove. Usaglašavanje navedene problematike je u toku, kako bi se stvorili neophodni uslovi za početak izvođenja radova.



- **Venecijansko bijenale**

- Uprava javnih radova vrši prenos sredstava za potrebe finansiranja projekata "Venecijansko bijenale", a na osnovu ovjerene dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- Odlukom Vlade Crne Gore, br. 07-183 od 23.01.2020. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 98.500,00 €, od čega je realizovano 22.499,80 € u 2020. godini.

- **Centar za prihvatilište životinja sa CITES liste u Beranama**

- Opština Berane je preuzela aktivnosti na realizaciji Idejnog rješenja i Glavnog projekta Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama.
- Opština Berane je obavijestila Upravu javnih radova da je raskinula ugovor sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta iz razloga što obrađivač projektne dokumentacije nije izvršavao ugovorene obaveze u ugovorenom roku. Opština Berane će u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma preuzeti aktivnosti za sprovođenje javnog konkursa za odabir idejnog arhitektonskog rješenja.


- **Postavljanje spomen obilježja "Lesendro"**



- Kulturno dobro tvrđava Lesendro se nalazi na katastarskoj parceli br. 436, KO Vranjna.
- Površina koju zahvata zona nepokretnog kulturnog dobra iznosi 2481,35 m². Predložena zaštićena okolina kulturnog dobra obuhvata u cjelosti katastarsku parcelu 436, ukupne površine 2481,35 m². Cjelokupna zona zahvata iznosi 6774,64 m². Pripremni radovi obuhvataju poslove tehničke prirode koji treba da omoguće nesmetani rad angažovanim radnicima na realizaciji postavljanju spomen-obilježja Braniocima Lesendra 1843.
- Pripremni radovi podrazumijevaju:
 - obezbjeđivanje opreme za čišćenje zidova od zelenila i rastinja, vodom - mlazom pod pritiskom,
 - nabavku i pozicioniranje materijala i alata za izvođenje radova.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo Ministarstvo kulture. Na osnovu iste, Uprava javnih radova je po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti izabrala najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora.
- Ugovor br. 01-334/20-5589/1 sa izvođačem, "Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 7.985,56 €.
- U toku je procedura potpisivanja ugovora za vršenje stalnog stručnog nadzora.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Uređenje spomen parka „Knjaževac”**

- Opština Andrijevica je za potrebe uređenja spomen parka „Knjaževac” izradila projektnu dokumentaciju za koju je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- Radovi na sanaciji parka obuhvataju adaptaciju trotoara u parku Knjaževac, platoa ispred crkve u parku, ograde oko parka, dječijeg igrališta i ugradnju mobilijara (igrališta, klupa i kanti za otpad).
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1048/1 sa izvođačem, „Hiperling” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.02.2020. godine, na iznos od 343.647,26 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je sprovedeno po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-3314/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 10.285,00 €.
- Izvođač radova je uveden u posao, ali su radova obustavljeni usljed ometanja građana.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Andrijevica, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

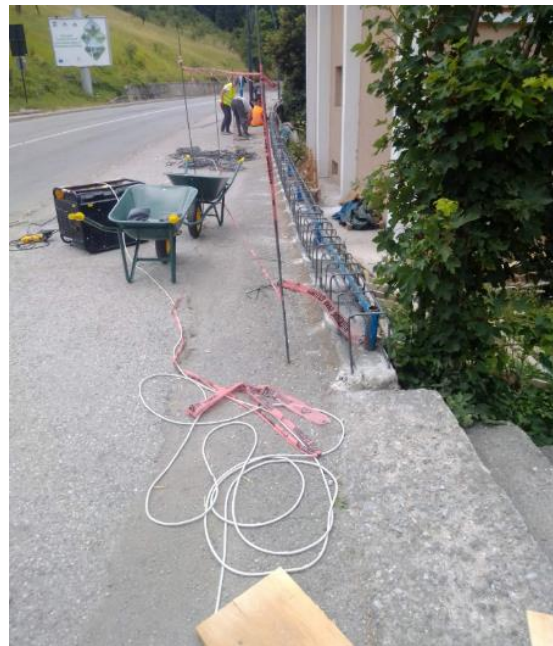

- **Izrada projektne dokumentacije za uređenje lokacija-objekata na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“ u opštini Žabljak**

- Realizaciju projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je naručilo izradu projektne dokumentacije i istu dostavilo Upravi javnih radova u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za izvođenje radova. Kako dostavljena dokumentacija nije bila revidovana, sproveden je postupak za izbor revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-810/1

sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 3.360 €.

- Završena je revizija projektne dokumentacije.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

9.9. Objekat Kuća voća u Andrijevići

- Objekat “Kuća voća” u Andrijevići nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevića, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevići, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojće se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffè bara i magacinskog prostora (naslijedeni vojni bunker) 153,82 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine. Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00 €.
- Završeni su zemljani radovi, radovi na izradi betonske konstrukcije potpornih zidova objekta, proizvodnog pogona i bunkera, administrativno-edukativnog bloka, izložbeno-prodajnog prostora i pješačkog mosta, radovi na montaži čelične krovne konstrukcije, pokrivanju proizvodnog pogona sendvič panelima, radovi na zidanju pregradnih zidova, radovi na izradi izolacije, drenaže i zatrpavanju ukopanih zidova, radovi na izradi razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i radovi na grubom razvodu elektroinstalacija jake i slabe struje na Edukativnom objektu.
- U toku su montažni radovi, radovi na izradi razvoda elektro i termotehničkih instalacija.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.491,00 € za tekuće izdatke, odnosno 534.209,87 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 568.700,87 €, od čega 34.594,25 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Takođe, dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Izmjena glavnog projekta je prouzrokovala pojavu značajnog broja naknadnih i nepredviđenih radova, za što je bilo neophodno sprovesti proceduru pregovaračkog postupka, u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava u maksimalnom iznosu od 15% od osnovne vrijednosti ugovora. Navedeno je prouzrokovalo i prolongiranje roka za izvođenje

radova. Takođe, za dodatne viškove i naknadne radove koji su posljedica nedostataka, izmjena i propusta u projektnoj dokumentaciji, bilo je neophodno pokrenuti otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova, procijenjene vrijednosti 305.000,00 €.


Za potrebe izgradnje trafostanice koja nije obuhvaćena revidovanim glavnim projektom, urađena je projektna dokumentacija, ista je revidovana, ali građevinska dozvola nije izdata usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a što je u nadležnosti Opštine Andrijevice i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Nakon pribavljanja građevinske dozvole za objekat trafostanice biće pokrenut otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova, procijenjene vrijednosti 115.000,00 €.



9.10. Objekat nacionalne Kuće maslina u Baru

- Lokacija objekta nacionalne "Kuće maslina" sa proizvodno-edukativnom namjenom nalazi se u Starom Baru, na kat. parceli br. 1075/2. Objekat je spratnosti Su+P+1 (suteran, prizemlje i sprat), ukupne bruto građevinske površine 1087,92 m². Objekat sadrži sljedeće sadržaje: prostor za proizvodnju maslinovog ulja, prostor za degustaciju i prodaju proizvoda i prostor za edukaciju i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 18.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-93/1 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 6.961,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3733/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2018. godine, na iznos od 2.750,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena 2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 05.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7456/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 994.134,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-7773/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 49.600,00 €.
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije objekta.
- U toku su zidarski i fasaderski radovi, kao i razvod elektro i hidrotehničkih instalacija.
- Zakonom o budžetu za 2020. godine obezbijeđeno je 20.000 €.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 33.335,35 € za tekuće izdatke, odnosno 694.389,35 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 727.714,70 €, od čega 324.639,89 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova usljed novonastale situacije sa pojavom pandemije virusa COVID-19, kao i nedostacima u projektnoj dokumentaciji zbog čega će biti upućen zahtjev Ministarstvu finansija za davanje prethodne saglasnosti o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje. Uočeni nedostaci od strane nadzorne službe za posljedicu imaju pojavu viškova, nepredviđenih i dodatnih radova. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 50.000 €.
- U toku je procedura pribavljanja mišljenja o ispunjenosti uslova od strane Ministarstva finansija, nakon čega će naručilac sprovesti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

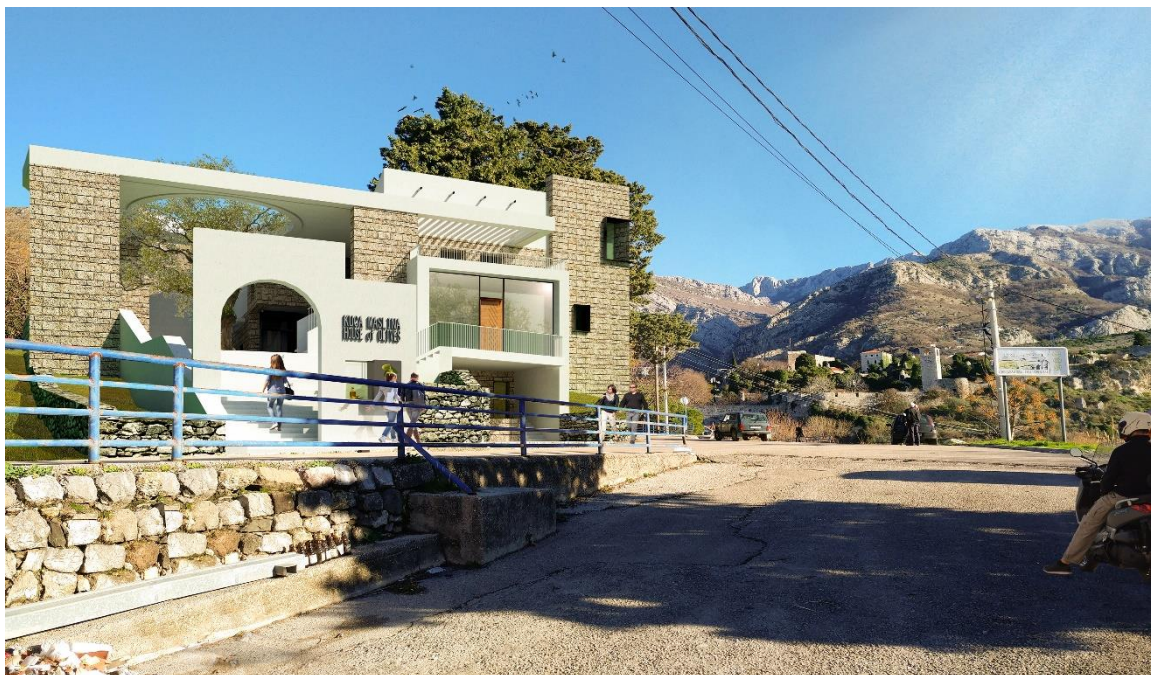

9.11. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00 €.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
- U toku je izrada geomehaničkog elaborata.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 250.000 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 50.190,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 50.190,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

9.12. Nacionalni parkovi

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izgradnja parkinga i saobraćajnice na lokaciji Kraljevo kolo, vodovodna mreža Ganovača, put za Hridsko jezero, Rekonstrukcija Vojne karaule u Plavu, izgradnja infrastrukture za mobilehome “Lovćen”, izgradnja saobraćajne, komunalne i elektro infrastrukture u nacionalnim parkovima, kao i ostali objekti i infrastruktura uključujući sanacione radove na Ulcinjskoj Solani.

- Zakonom o bužetu za 2020. godinu obezbijeno je 50.000 €.
- **Parking na Kraljevom kolu**
 - Na lokaciji Kraljevo kolo u Nacionalnom parku Biogradska gora, bruto površine 18.000 m², predviđena je izgradnja i uređenje parking prostora za vozila posjetilaca Biogradskog jezera, kao i prostora za smještaj dva turistička voza koji će saobraćati na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero.
 - Ugovor br. 101-1560/1-7344/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Geotechnics, projects & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.11.2018. godine, na iznos 14.979,00 €.
 - Ugovor br. 01-809/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos 4.350,00 €.
 - Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta, uključujući i izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i geomehaničkog elaborata.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.065,20 € za tekuće izdatke.
 - Ukupno je realizovano 10.065,20 €, od čega 8.987,88 € u 2020. godini.
 - Do produžetka roka završetka izrade projekt došlo je usljed prolongiranja procedure izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i promjene nadležnosti u izdavanju saglasnosti na elaborat.



- **Izgradnja parking prostora duž saobraćajnice od mosta kod hotela Durmitor do rampe na ulazu u Nacionalni park**
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.10.2017. godine. Ugovor br. 1010-1560/1-1649/1 sa izvođačem, "Flemer Stone - AG" d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.04.2018. godine, na iznos od 134.991,45 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2101/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.04.2018. godine, na iznos od 1.368,00 €.
- U 2018. godini radovi su obustavljeni zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu, kao i potrebe da se izvrši dopuna projektne dokumentacije za nedostajuću infrastrukturu. Obaveza Opštine Žabljak je da kompletira projektnu dokumentaciju.
- S obzirom na to da su građani zahtjevali obustavu radova, dalje aktivnosti na realizaciji projekta nijesu sprovedene.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Izgradnja nedostajuća infrastruktura od hotela Durmitor do Crnog jezera**

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.03.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.03.2019. godine.
- Predmetni projekat je uslovljen realizacijom projekta izgradnje parking prostora duž saobraćajnice od mosta kod hotela Durmitor do rampe na ulazu u Nacionalni park. S obzirom na to da je navedeni projekat obustavljen, obustavljene su aktivnosti i na ovom projektu.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

- **Revitalizacija Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, opština Pljevlja**



- U 2017. godini na tri raspisana javna nadmetanja za izvođenje radova za rekonstrukciju objekata Centra za rafting u postojećim gabaritima nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon četvrtog tendera potpisan je ugovor za izvođenje radova.
- Revidovani glavni projekat su obezbijedili Nacionalni parkovi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.6.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6248/1 sa izvođačem, „Adria-internacional” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 08.10.2018. godine, na iznos od 106.350,10 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-7134/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 2.11.2018. godine, na iznos od 4.449,00 €.
- Radovi su završeni 2019. godine. Obaveza Nacionalnih parkova da završi tehnički prijem.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.449,00 € za tekuće izdatke, odnosno 95.585,47 € za kapitalne izdatke.

- Ukupno je realizovano 100.034,47 €, od čega 11.606,57 € u 2020. godini.
- **Rekonstrukcija bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno-istraživačkog centra**
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

9.13. Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju

- U okviru uređenja Alipašinih izvora, a isti su prepoznati kao sekundarni turistički centar sa sadržajima za turističku valorizaciju, predviđene su sljedeće intervencije u prostoru: izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza po obodu vodenog kompleksa i uređenje pješačkog trga, rekonstrukcija pješačkih mostova preko vodotoka, izgradnja informativnog pulta, sprovođenje odgovarajuće rasvjete u vodenoj zoni i oko izvorišta, čišćenja i uređenja vodotoka, uređenje i formiranje nove zelene zone, opremanje prirodnog prostora potrebnim mobilijarom: klupe, informativne table, korpe za otpad i sl.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 12.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-2856/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „AE Studio” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.04.2019. godine, na iznos od 3.509,00 €.
- Izrađeno je idejno arhitektonsko rješenje.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 30.000 €.
- Ukupno je realizovano 3.509,53 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je obaveza Opštine Plav da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma razmotri potrebu raspisivanju konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

9.14. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1450 i Kolašin 1600 i osnježavanje staza ski centra Kolašin 1600

- 01.10.2020. godine izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Projekat će se realizovati po principu "projektuj i izgradi".
- Obaveza Opštine Kolašin je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.000,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

10. ZAKON O PRIJESTONICI

- Uprava javnih radova je sa Prijestonicom Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

10.1. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 400.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 339.866,81 €.

10.2. Sanacija sportskih sala SRC Cetinje

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 37.100.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 12.890,73 €.

10.3. Rekonstrukcija Ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje Gipos

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 600.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 112.378,09 €.

10.4. Rekonstrukcija Jabučke ulice i izgradnja II faze saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 300.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 85.070,63 €.

10.5. Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.6. Prihvatište za napuštene kućne ljubimce (azil)

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 10.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.7. Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.500.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 1.298.875,74 €.

10.8. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 22.900,00 €.

10.9. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 150.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 80.633,66 €.

10.10. Kupovina zemljišta za potrebe proširenja Novog groblja

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 130.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.11. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 20.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti, iz razloga što još nije urađena izmjena plana.

10.12. Unapređenje turističke ponude grada

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 91.855,88 €.

10.13. Kupovina lokacije za Lokandu

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 150.000 €.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 1.340.000 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 100.265,66 €.

10.15. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 139.900 €.
- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 110.860,50 €.

11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
 - U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
 - U 2018. i 2019. godini, za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.
 - Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 573.000 €.
-
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50 €.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

- **Kanalizaciona mreža**

- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.608.304,72 €, dok je ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50 €.
- Radovi su završeni.

- **Unapređenje sistema vodosnabdijevanja**



- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, objekata na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2017. godine, sa izvođačem radova “PNP Perošević” d.o.o. Berane, na iznos od 880.927,04 €, dok je ugovor za vršenje stručnog nadzora zaključen sa “Beohidro” Beograd, na iznos od 78.750,00 €.
- Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.
- Preostala je izrada konačnog obračuna radova i utvrđivanja preostalih obaveza investitora i izvođača.

11.2. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju



- Realizacija projekta je obuhvatila izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ na Cetinju. Projekat se realizovao u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju – Žuta knjiga.
- Projekat se finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj“, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Ugovor sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj“, d.o.o. Slovenija, je zaključen 20.12.2016. godine, na iznos od 1.562.735,50 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 1.643.444,85 €.
- Ugovor sa revidentom glavnog projekta i stručnim nadzorom, „Garnets Consulting“ a.s., je zaključen 08.09.2016. godine, na iznos od 165.000,00 €.
- U 2017. godini, nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije i pribavljena građevinska dozvola, izvođač je uveden u posao. Prilikom početka radova pojavio se problem dodatne količine otpada i nelegalno odloženih automobilskih guma. Nakon rješavanja navedenog problema od strane Prijestonice Cetinje, radovi su otpočeli. U 2018. godini svi radovi su završeni.
- Uputrebna dozvola je izdata od strane Prijestonice Cetinje 31.07.2020. godine.
- Potvrda o dobrom izvršenju posla je izdata od strane stručnog nadzora 19.08.2020. godine i poslata je kranjem korisniku MORiT-u, o čemu je obaviještena i DEU.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 5.500 €.

11.3. Sanacija odlagališta “Ćafe” u Baru

- Projekat se realizovao po principu „projektuj i izgradi“ kroz dva ugovora: Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.“ iz Grčke i Ugovor o reviziji Glavnog projekta i nadzoru nad izvođenjem radova sa firmom „INGOB“ iz Austrije. Ukupna ugovorena vrijednost za realizaciju ovog projekta iznosila je 3.817.896 €.
- Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.“ iz Grčke je raskinut 07.11.2018. godine.
- Nakon raskida ugovora, Uprava javnih radova je, u skladu sa FIDIC procedurama, uputila firmi „Mesogeos“ prijedlog za „amicable settlement“ sa procjenom potraživanja po više osnova. Tim povodom, predstavnici firme „Mesogeos“ su se obavezali da urade novo tehničko rješenje i dostave finansijsku ponudu za završetak radova. Ponuda je pristigla 15.09.2020. godine i poslata na mišljenje ostalim članovima Operativne strukture.
- Ukoliko ponuda firme „Mesogeos“ oko nastavka radova ne bude prihvaćena, Uprava javnih radova će zatražiti od „Tijela za rješavanje sporova“ (DAB), što je u ovom slučaju ugovorna obaveza Konzorcijuma „INGOB-C&E“ iz Austrije koji je vršio reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova, da donese odluku o zahtjevu Uprave javnih radova za naknadu štete.
- Takođe, u skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-309 od 17.01.2019. godine, u 2019. godini je pripremljen Projektni zadatak za raspisivanje javnog nadmetanja po principu „projektuj i izgradi“ i isti je potpisan od strane Opštine Bar u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
- Zahtjevi za aktiviranje avansne garancije i garancije za dobro izvršenje ugovora, nakon potpisivanja od strane EU Delegacije, poslata su osiguravajućem društvu „Siguria“ sa Kosova, koje je izdalo garancije. Kako je „Siguria“ odbila da plati zahtijevana potraživanja, Uprava javnih radova je ugovornu i ostalu dokumentaciju u vezi sa garancijom, prosljedila

Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore u cilju pokretanja sudskog spora radi prinudne naplate, u smislu čl. 53 Zakona o državnoj imovinu.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 224.956 €.



11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici “Kos – Trebešica”



- Projekat se finansira iz sredstava IPA II-Nacionalni program 2014. i nacionalnog budžeta.
- Projektom je predviđena rekonstrukcija pruge od stanica Kos do stanica Trebešica u dužini cca 6,75 km. Rekonstrukcija obuhvata zamjenu zastorne prizme, drvenih pragova, šina i kontaktne mreže. Na ovoj sekciji postoji 7 mostova ukupne dužine 476 m i 12 tunela ukupne dužine 4.372 m.
- Nakon završenih procedura javnih nabavki u decembru 2018. godine potpisani su ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom nad izvođenjem radova. Ugovor sa izvođačem radova, “Štrabag” Austrija, zaključen je na iznos od 5.379.205,22 €, dok je sa stručnim nadzorom, “Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica, zaključen na iznos od 237.295,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predate korisniku na upotrebu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 1.781.976 €.

11.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne-vučne podstanice “Trebešica”

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”. Projekat je finansiran 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Ugovor br. 19/2-01-6074/1 sa izvođačem, „Simens” d.o.o. Beograd, je zaključen 03.12.2015. godine, na iznos od 3.408.897,93 €.
- Ugovor br. 19/2-01-1679/1 sa stručnim nadzorom, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.04.2016. godine, na iznos od 145.000,00 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 72.499,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine. Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme su završeni, čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U skladu sa FIDIC procedurama krajem 2018. godine izdat je „taking-over” sertifikat. Nakon što je korisnik ŽICG sproveo proceduru nabavke i ugradnje elektro-ormara nastavljena je procedura tehničkog prijema i objekat predat na korišćenje.
- U 2020. godini pribavljena je upotrebna dozvola.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 5.500 €.

11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra. Obaveza Ministarstva zdravlja je bila da uskladi glavni projekat sa važećom zakonskom regulativom.
- Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa CFCU vodilo proces ugovaranja eksperta za pripremu tenderske dokumentacije.
- Tenderska dokumentacija je u fazi usaglašavanja od strane Ministarstva zdravlja.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane EU Delegacije, pristupiće se raspisivanju javnih nadmetanja za izvođenje radova i stručni nadzor.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 1.100 €.

11.7. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

Ovaj projekat obuhvata izradu glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Uprava javnih radova ima ulogu implementacione agencije za aktivnost koja predviđa jedan infrastrukturni projekat, i koja se tiče uključivanja marginalizovanih grupa u obrazovni sistem. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

1. Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 sa obrađivačem glavnog projekta i stručnim nadzorom, „Entasis” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00 €.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi javnih radova.

2. Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za građevinarstvo” a.d. Podgorica, je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00 €.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

3. Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera

- Ministarstvo je u obavezi da dostavi nacrt tenderske dokumentacije UJR nakon revizije glavnog projekta. Po dobijanju saglasnosti od DEU na tendersku dokumentaciju, UJR će sprovesti tendersku proceduru.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 33.000 €.

11.8. Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- Nakon završetka evaluacionog procesa, Evaluacioni izvještaj o odabiru kandidata u uži izbor poslat je DEU na odobrenje i isti je odobren.
- Pozivna pisma, zajedno sa tenderskom dokumentacijom, poslata su kompanijama koje su ušli u uži izbor.
- U toku je evaulacija pristiglih ponuda.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 12.000 €.

11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na upravljanje otpadom iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Cilj ovog projekta je da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva održivog razvoja i turizma i ostalih korisnika

za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.

- U toku je javno nadmetnje.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 3.200 €.

11.10. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede. Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Vrijednost ugovora je 2.399.500,00 €. Aneks ugovora je potpisan 16.06.2020. godine.
- Aneks ugovora se odnosi na:
 - povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2 .
 - reviziju člana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Do sada su sprovede aktivnosti: održana (3) tri sastanka Upravnog odbora na kojima su usvojeni: Početni izvjestaj i prvi šestomjesečni izvještaj koji obuhvata period do 31.05.2020. godine. Sprovođenje aktivnosti se odvija relativno u rokovima, s obzirom na to da su neke aktivnosti pomjerene zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, ali to nema uticaja na krajnji rok .
- Za ovaj projekat je vezan i jedan ugovor o nabavci opreme.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 479.900,00 €.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na usporavanje aktivnosti zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, tj. na ograničenje putovanje određenog broja eksperata, ali se redovno pratila situacija i ažurirao plan rada, tako da za sada nema većih izazova u sprovođenju projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 2.500 €.

11.11. Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.12. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na oblast zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Svrha ovog ugovora je da podrži proces transpozicije i razvija institucionalni kapacitet za strateško planiranje, sprovođenje pravnih regulativa u

oblasti životne sredine, u skladu sa akcionim planom o životnoj sredini i klimatskim akcijama 2018. - 2020. godina.

- U toku je evaluacija pristiglih ponuda za konsultanske usluge.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100 €.

11.13. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede. Opšti cilj projekta je nabavka opreme da se obezbijedi podršku Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine.
- U toku je javno nadmetnje.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100 €.

11.14. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Poziv za najavu tendera je objavljen 23.03.2020. godine.
- Nakon što je tenderska dokumentacija dva puta odbijena, raspisano je javno nadmetanje za koje je rok za dostavljanje ponuda 09.11.2020. godine.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 100 €.

11.15. Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke

- Predmet ugovora je snabdijevanje, isporuka, istovar, instalacije, raspakivanja, montaže i ugradnje IT opreme i softvera za sva tri Lot-a paketa, kao i testiranje IT opreme i softvera uz pružanje tehničke podrške i obuke krajnjim primaocima u Crnoj Gori.
- U toku je javno nadmetnje.

11.16. Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu

- Predmet ugovora je snabdijevanje, isporuka, istovar, ugradnja, naručivanje, od strane izvođača opreme u 5 (pet) Lot-ova za institucije Civilne zaštite u Crnoj Gori DDP.
- U toku je javno nadmetnje.

11.17. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i projekat se odnosi na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- Nakon odobrenja Izvještaja evaluacije sažetaka od strane DEU, Uprava javnih radova je uputila pozivna pisma aplikantima.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.

11.18. Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju

- Obaveza Ministarstva saobraćaja i pomorstva je da dostavi nacrt tenderske dokumentacije čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova raspiše javno nadmetanje za nabavku opreme.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.

11.19. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za nabavku opreme. Kako nije bilo uspješnih ponuđača, tender je poništen. Objavljena je Najava tendera i ponovo pokrenuta tenderska procedura. Pripremljene su tehničke specifikacije i istraživanja tržišta od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva i krajnjeg korisnika - Uprave za pomorsku sigurnost. Očekuje se mišljenje DEU na tendersku dokumentaciju.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.

11.20. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor je potpisan 20.11.2019. godine. Vrijednost ugovora iznosi 3.659.900,00 €, a rok realizacije projekta je 48 mjeseci, odnosno do novembra 2023. godine.
- U toku je implementacija ugovora sa konsultantom.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 700.000 €.

11.21. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja.
- U toku je evaluacija pristiglih ponuda za predmetne konsultantske usluge.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 100 €.

11.22. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina

- Ugovor sa izvođačem, „STRABAG“ AG Austija, je zaključen 23.12.2016. godine, na iznos od 4.083.891,36 €. Anex ugovora je potpisan 13.10.2017. godine. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 4.190.245,73 €.
- Ugovor sa stručnim nadzorom, „Institut za građevinarstvo“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.12.2016. godine, na iznos od 134.000,00 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 138.281,18€.
- Svi ugovoreni radovi na projektu su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 14.000 €.

11.23. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 215.000 €.
- Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:
 - **Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
 - Na prvi tenderski postupak nije pristigla niti jedna ponuda i samim tim je i poništena.
 - Na drugi tenderski postupak pristigla je jedna ponuda koja nije bila ispravna, tako da je tenderska procedura ponovo poništena.
 - Nakon sprovedene treće procedure ugovaranja u toku je potpisivanja ugovora sa projektantom i stručnim nadzorom.
- **Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
- U 2019. godini tenderska dokumentacija je pripremljena i odobrena od strane EU Delegacije, i javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije će se objaviti, nakon potpisivanja ugovora za izradu glavnog projekta.

- **Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
- Ugovarač za izradu glavnog projekta je po projektom zadatku dužan da izradi tendersku dokumentacije za radove, nakon čega će se raspisati javno nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 8.425 €.

11.24. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa

- Projekatom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, čiju proceduru sporovodi Korisnik u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, je poništen.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću i Kotoru revizija projektne dokumentacije je završena, dok je za Osnovne sudove u Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju u toku revizija glavnog projekta. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz budžetskih sredstava.
- Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacрта tenderskih dokumentacija od strane Ministarstva pravde, Uprava javnih radova će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.

11.25. Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)

- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520 m², uz dodatnih 1135 m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.
- Konkurs za izbor idejnog arhitektonskog rješenja je sprovelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije objekata i uređenja kompleksa i ista se finansira iz budžetskih sredstava.
- U toku su aktivnosti na pribavljanju urbanističko-tehničkih uslova za izmiještanje dalekovoda i izradu projektne dokumentacije nove trafostanice u okviru kompleksa.
- Na realizaciji projekta do sada nijesu trošena sredstva.
- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.



11.26. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite

- **Rekonstrukcija bivšeg pograničnog punkta Božaj**
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 200 €.

11.27. Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređenje veterinarske i fitosanitarne kontrole

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.28. Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.29. Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.30. Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica-Golubovci

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.31. Strategija izvodljivosti intermodalnosti

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.32. Studija o ITS (Inteligent Transport sistem) u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.33. Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.34. Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.35. Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU ACQUIS

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.36. Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu

PPOV u Rožajama

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Rožajama

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

PPOV u Kolašinu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Kolašinu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Mojkovcu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.37. Grant šema za energetska efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA

- Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije za tehnički pregled autoputa. U skladu sa Odlukom, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori koji se realizuju u kontinuitetu.
