




Podgorica, Januar 2025. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2024. GODINU

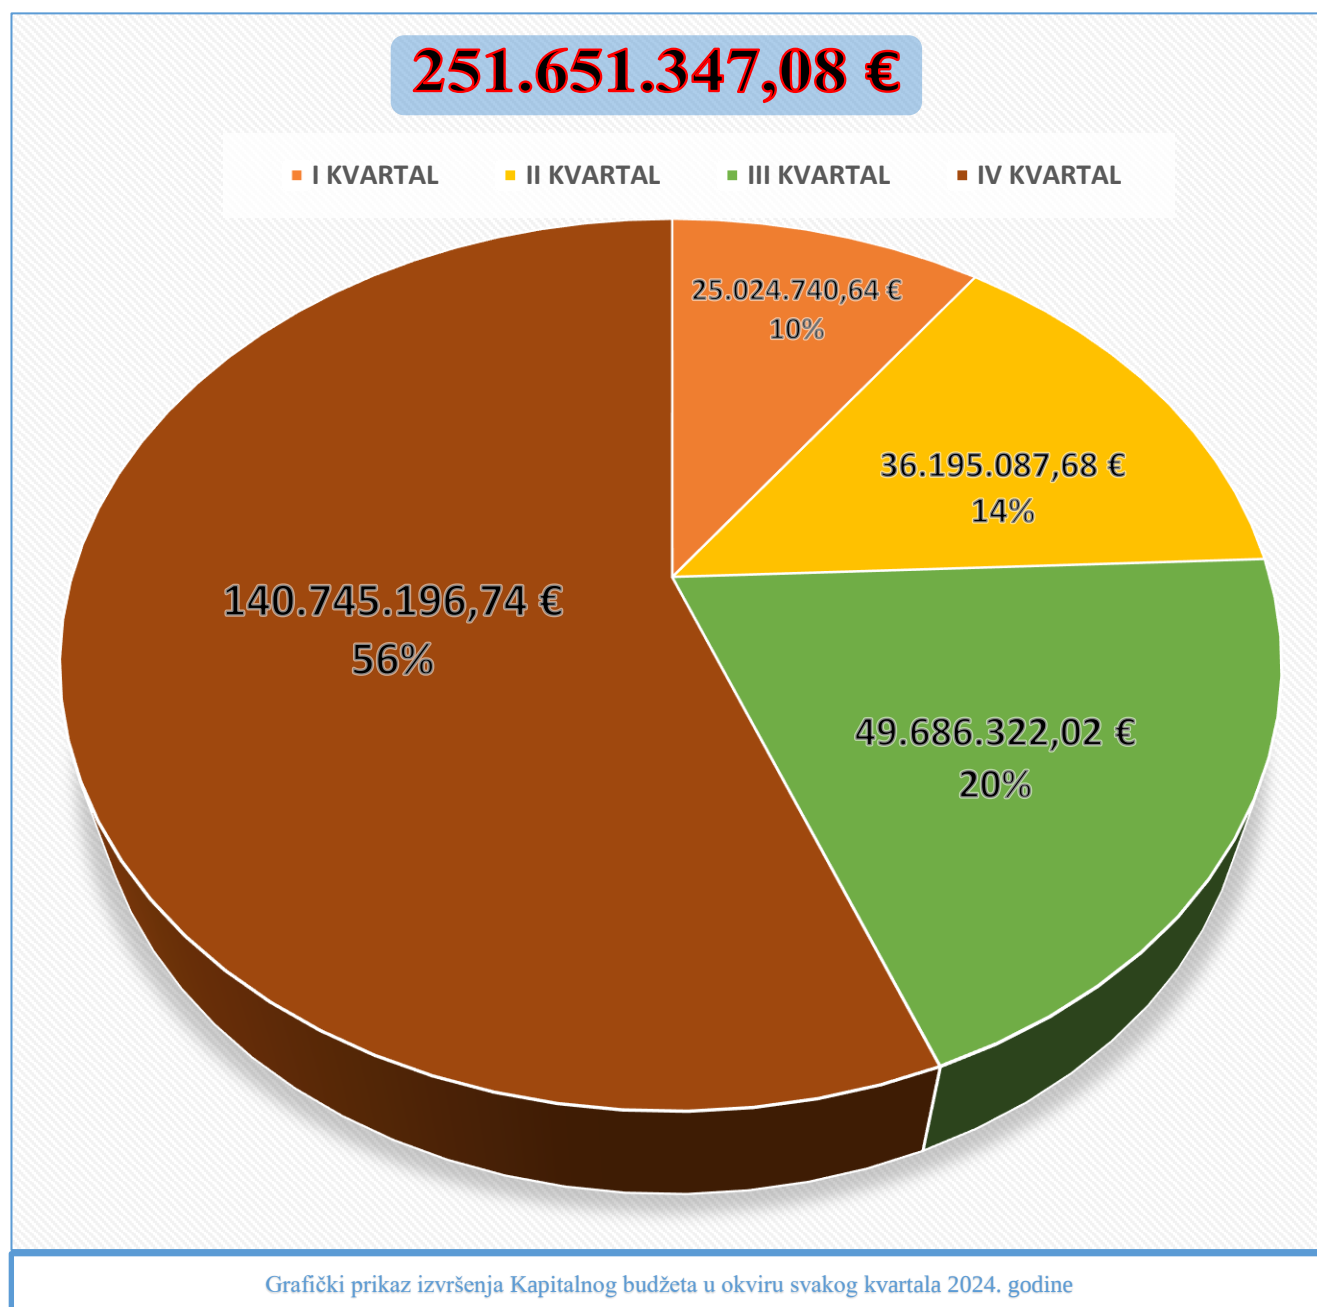

GRADIMO CRNU GORU - 251,65 mil.€ potrošeno u 2024. godini



Ministarstvo finansija je u sklopu svojih nadležnosti, a u saradnji sa implementacionim jedinicama Upravom za kapitalne projekte i Upravom za saobraćaj, u toku 2024. godine sprovedo niz aktivnosti na unapređenju procesa planiranja i upravljanja kapitalnim projektima koji se realizuju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore.

Vlada Crne Gore je u januaru oformila „Savjet za javne investicije“, kojim predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore, uz učešće resornih ministara i ključnih institucija u realizaciji kapitalnih projekata. Na ovaj način stvoren je novi institucionalni okvir za unapređenje javnih investicija, efikasniju koordinaciju i realizaciju aktivnosti u dijelu kapitalnih projekata i drugih projekata infrastrukturnog razvoja, kao i na praćenju realizacije kapitalnih projekata planiranih godišnjim Zakonom o budžetu.

Vlada Crne Gore je na prijedlog Ministarstva finansija u martu donijela „Odluku o izradi kapitalnog budžeta“, koja je stupila na snagu 19. aprila 2024. godine. Navedenim aktom su unaprijeđene procedure izrade kapitalnog budžeta i jasno definisani uslovi kojima kandidovani kapitalni projekat može da uđe u proceduru vrjednovanja i uključivanja u finansiranje iz kapitalnog budžeta države. Takođe, jasno definisan način izbora i rada Komisije za ocjenjivanje projekata, koja vrši evaluaciju dostavljene dokumentacije od strane potrošačkih jedinica, kao i priprema Listu prioriternih projekata u skladu sa kriterijumima iz Odluke.

U cilju razvoja procesa planiranja i koordinacije javnih investicija Ministarstvo finansija je u okviru nadogradnje već postojeće informacione sistemske aplikacije za upravljanje budžetom (BMIS) uspješno kreiralo „Registar kapitalnih projekata koji se finansiraju iz državnog budžeta“, u okviru kojeg imamo jasan pregled trenutnog statusa implementacije svakog projekata pojedinačno (Prilog 1).

Shodno navedenom, postignut je veći nivo transparentnosti u praćenju i koncipiranju politika daljeg podsticanja javnih investicija, a ujedno i omogućen efikasniji monitoring i izvještavanje o implementaciji kapitalnih i drugih investiciono razvojnih projekata, kako bi se dodatno osiguralo djelotvorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima u srednjem roku, a sve u cilju ispunjavanja brojnih preporuka iz PIMA izvještaja.

Uspostavljene nove procedure monitoringa i efikasniji rad implementacionih jedinica su doveli do rekordnog ostvarenja Kapitalnog budžeta na kraju četvrtog kvartala 2024. godine godine od čak 106% (251,6 mili.€) izvršenja u odnosu na Zakonom planirani iznos sredstava (237 mili.€), odnosno za čak 33% (62,6 mili.€) veći procenat uzvršenja u odnosu na plaćeni iznos u 2023. godini (189 mili.€).

Shodno zaključku 11 Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa osme sjednice, održane 27. decembra 2023. godine, Ministarstvo finansija je pripremilo Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta za treći kvartal 2024. godine, kojeg kvartalno u toku tekuće fiskalne godine dostavlja Vladi Crne Gore na usvajanje i radi daljeg izvještavanja Skupštine Crne Gore.


REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA ZA ČETVRTI KVARTAL 2024. GODINE

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Službeni list CG", br. 86/24) za **Kapitalni budžet** su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **237.012.958,82 €**, što je za 3 miliona eura manje nego inicijalnim Zakonom. Navedeno umanjene se odnosi na projekte sa potprograma „13 025 K01 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane“, a u korist uvećanja za isti iznos tekućeg budžeta Ministarstva odbrane za potrebe plaćanja ugovorene vojne opreme (patrolnih brodova), a sve u cilju dostizanja NATO standarda od minimalnog izdvajanja za odbranu od 2% BDP-a.

Imajući u vidu da je za izgradnju dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice ugovoren kreditni aranžman, koji podrazumijeva i značajan iznos donacija, te da je već započet postupak tenderskih procedura po strogim pravilima EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj), opredijeljeni iznos za avansno plaćanje odabranom izvođaču radova (10 posto od ugovorene vrijednosti), a koji je inicijalnim Zakonom o budžetu planiran na iznos od 50 miliona eura neće biti potreban do kraja tekuće godine, pa je usvojenim „Rebalansom“ izvršena realokacija sredstava potrebnih za realizaciju drugih kapitalnih projekata čija realizacija se odvija brže od planirane dinamike potrošnje, čime je došlo do značajnog uvećanja ukupno opredijeljenih sredstava Upravi za kapitalne projekte na uštrb kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj.


U 2024. GODINI za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore **potrošeno je 251.651.364,90 €** ili 106% od ukupno planiranog iznosa „Rebalansom“, od čega je 29,03 mil.€ plaćeno iz kredita, 12,60 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti) i 0,28 mil.€ iz donacije Evropske banke za stručni nadzor nad realizacijom projekata koji se finansiraju iz njihovih kredita.

Grafik 1: Pregled izvršenja Kapitalnog budžeta u 2024. po svim izvorima finansiranja

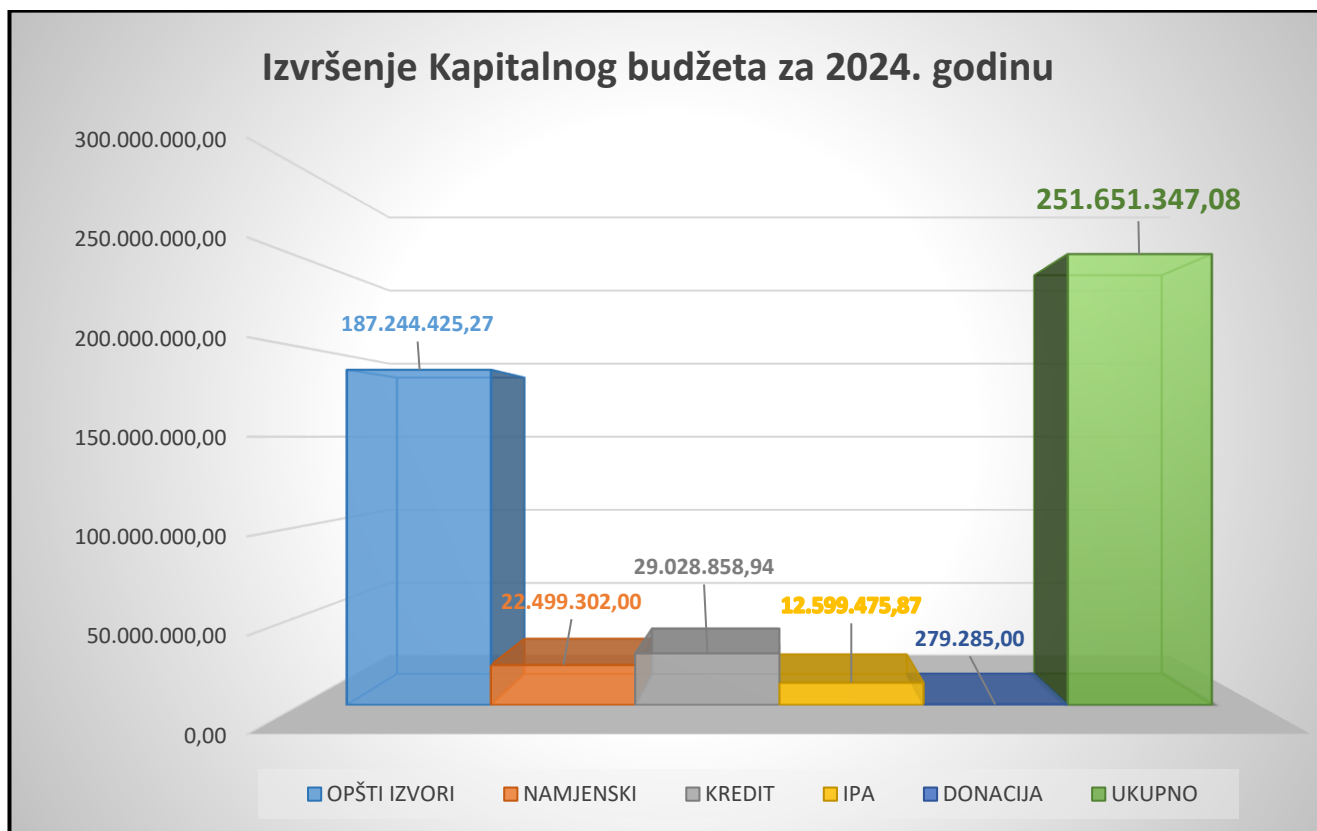

Dakle, imajući u vidu da je u 2023. godinu potrošeno 189,02 mil.€ odnosno 94% od zakonom planiranih (200,66 mil.€.), znatno bolja dinamika izvršenja za sva četiri kvartala tekuće godine je dovela do značajno veće potrošnje u apsolutnom iznosu za čak 62,63 mil.€.

Grafik 2: Uporedni prikaz ukupnog izvršenja Kapitalnog budžeta u 2024. i 2023. godini

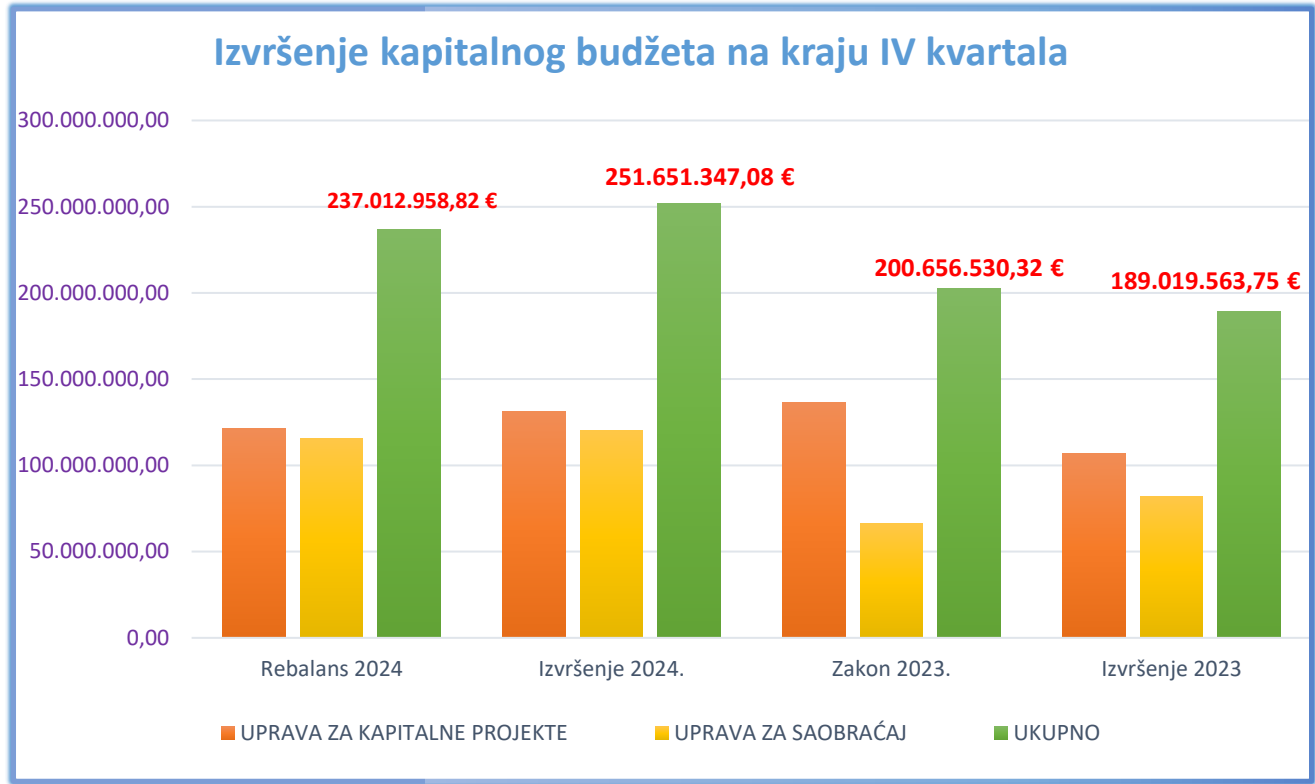

Posmatrajući samo potrošnju iz budžetskih sredstava (opšti i namjenski prihodi) bez iznosa opredijeljenih za autoput, ista je na ukupnom iznosu od 178,37 mil.€ ili 91% od ukupno planiranog iznosa bez autoputa nakon usvojenog „Rebalansa“ (196,74 mil.€), što je za 21,99 mil.€ (14%) više nego u uporednom periodu prošle godine (156,38 mil.€).

Tabela 1: Izvršenje Kapitalnog budžeta po upravama i izvorima finansiranja za 2024. i 2023. godinu

POTROŠAČKA JEDINICA	IZVOR FINASIRANJA	ZAKON 2024	Rebalans 2024	IV Q 2024.		IV Q 2023	
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE	BUDŽET	92.275.041,07	121.275.045,07	113.718.371,19	94%	96.204.915,68	72%
	KREDIT	4.498,28	4.496,28	4.996.081,77		1.451.885,40	
	IPA	21.091,67	21.091,67	12.599.475,87		9.419.421,23	
	DONACIJA	9,12	7,12	0,00		0,00	
	UKUPNO	92.300.640,14	121.300.640,14	131.313.928,83	108%	107.076.222,31	80%
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	BUDŽET	57.469.088,68	75.469.088,68	64.652.282,71	86%	60.174.457,34	91%
	KREDIT	5.340,00	5.340,00	24.032.777,17		19.111.686,31	
	DONACIJA	1.890,00	1.890,00	279.285,00		208.980,00	
	AUTOPUT	90.236.000,00	40.236.000,00	31.373.073,37	78%	2.448.217,79	71%
	UKUPNO	147.712.318,68	115.712.318,68	120.337.418,25	104%	81.943.341,44	124%
UKUPNO	svi izvori	240.012.958,82	237.012.958,82	251.651.347,08	106%	189.019.563,75	94%
Ukupno sa autoputem	BUDŽET	239.980.129,75	236.980.133,75	209.743.727,27	89%	158.827.590,81	79%
Ukupno bez autoputa	BUDŽET	149.744.129,75	196.744.133,75	178.370.653,90	91%	156.379.373,02	78%

Analizirajući uporedni prikaz iz gornje tabele uočljivo je i veće izvršenje iz kreditnih sredstava koje je u 2024. godini bilo za 8,46 mil.€ više nego prethodne. Navedeno plaćanje se odnosi na šest projekata čija realizacija se odvija utvrđenom dinamikom i to: „Izgradnja OŠ Vladimir Nadzor u Podgorici“ (1,7 mil.€), „Izgradnja vrtića u Baru“ (0,5 mil.€) i „Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz EIB-a“ (2,7 mil.€), koje realizuje Uprava za kapitalne projekte; odnosno „Rekonstrukcija magistralnog puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane“ (15 mil.€), „Izgradnja regionalnog puta Lubnice-Jezerine“ (4,8 mil.€) i „Izgradnja bulevara Tivat-Jaz“ (3,7 mil.€), koje realizuje Uprava za saobraćaj.

Takođe, primjetna je i veća realizacija IPA projekata čije plaćanje se vrši preko Uprave za kapitalne projekte. Tako je u 2024. godini potrošeno 3,18 mil.€ više nego prethodne godine. Navedeno plaćanje se dominantno odnosi na sljedeće projekte:

- „Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG“ (završen projekat);
- „Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija“ (završen projekat);
- „Radovi na izgradnji operativnog centra“ (završen projekat);
- „Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta“ (završen projekat);
- „Kompleks UIKS-a u Danilovgradu“ (realizacija u toku);
- „Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija“ (sprovodi se u kontinuitetu).“

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte**, za sprovođenje **254 projekta** (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 1.476,15 mil.€, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu (Rebalans), opredijeljeno je **121,3 mil.€**, što je 51% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2024. godinu.

Na kraju 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte **plaćeno je ukupno 131,31 mil.€**, odnosno 108% od ukupno planirane sume „Rebalansom“, što je za 24,24 miliona više u odnosu na 2023. godinu kada je plaćeno 107,08 mil.€ (80% od ukupno planirane za 2023. godinu). Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 113,72 mil.€ ili 94% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 5,00 mil.€, a iz EU donacija 12,60 mil.€ (IPA projekti).

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za saobraćaj** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **115,71 mil.€** (49% od ukupno planiranog), od čega je za sprovođenje **77 projekata**, ukupne procijenjene vrijednosti 962,10 mil.€, opredijeljeno **75,47 mil.€** (32%), dok je za **Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica**, čija je procijenjena vrijednost 605 mil.€, opredijeljeno **40,24 mil.€** što je 17% od ukupnog Kapitalnog budžeta.

U 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj **plaćeno je 120,34 mil.€**, odnosno 104% od ukupno planirane sume, što je za 38,39 miliona više nego prethodne godine kada je plaćeno 81,94 mil.€ (124% od ukupno planirane za 2023. godinu). Od navedenog, iz budžetskih sredstava (opšti i namjenski prihodi) potrošeno je ukupno 96,02 mil.€ od čega 28,52 mil.€ za potrebe eksproprijacije, dok je iz kredita plaćeno 24,03 mil.€ što je za oko 4,92 miliona više nego prethodne godine.

Dodatno, iznos od **22.499.302,00 €** koji je u 2024. godini prihodovan po osnovu posebnog „**Programa ekonomskog državljanstva**“, a shodno članu 18 Zakona o budžetu Crne Gore, uplaćen je na namjenskom depozitnom računu sa kojeg će se dalje vršiti uplate za rješavanje eksproprijacije druge dionice autoputa od Mateševo do Andrijevice, shodno pravosnažnim rješenjima.

- ✓ U dijelu realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta, **nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevice**, aktivnosti utvrđenom dinamikom sprovodi „Monteput DOO“, shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu i potpisanim sporazumom sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom saobraćaja. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za predmetnu dionicu u 2024. godini je plaćeno je 27,36 mil.€ od čega 22,49 mil.€ iz namjenskih prihoda od „ekonomskog državljanstva“.

U skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Monteput“ je okončao pretkvalifikacioni postupak kao dio tenderske procedure koja se odvija po standardima EBRD-a, za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo - Andrijevice. Na osnovu evaluacije koju je sprovedla Komisija definisana je lista od četiri ponuđača (tri konzorcijuma i jedna kompanija) koje su prošle pretkvalifikaciju (od ukupno osam prijavljenih), i za iste se čeka odobrenje EBRD-a nakon čega će uslijediti javni poziv za dostavljanje ponuda prijavljenima koji su prošli fazu pretkvalifikacionog postupka.

U toku je javni poziv za izbor inženjera/nadzornog organa za vršenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova, kao i za podršku upravljanju projektom - izbor konsultanta (PIU), u skladu sa FIDIC-ovim uslovima, kao i primjenjivim pravnim propisima Crne Gore. Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor nadzornog organa, objavljen je u avgustu i u definisanom roku prijavilo se 14 kompanija.

U toku je evaluacija prijava, nakon čega će se definisati lista kompanija koje su prošle pretkvalifikaciju i nakon odobrenja liste od strane EBRD-a, sprovede se druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača za izbor nadzornog organa nad projektovanjem i izgradnjom autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevice.



- U 2024. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 251,65 mil.€ ili 106% od ukupno planiranog iznosa „Rebalansom“, odnosno 62,63mil.€ više nego u istom periodu prošle godine. Od navedenog iznosa iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 113,72 mil.€, iz kredita 29,03 mil.€, dok je 12,60 mil.€ plaćeno iz EU donacija (IPA projekti) i 0,28 mil.€ iz donacije Evropske banke.
- Za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte plaćeno je ukupno 131,31 mil.€ ili 108% od ukupno planirane sume, odnosno 24,24 miliona više nego prošle godine. Od navedenog iznosa 113,71 mil.€ je plaćeno iz budžetskih sredstava, 5,00 mil.€ iz kredita, a 12,60 mil.€ iz EU donacija.
- Za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je ukupno 120,34 mil.€ ili 104% od ukupno planirane sume, odnosno 38,39 miliona više nego prošle godine. Od navedenog iznosa iz budžetskih sredstava plaćeno je 96,02 mil.€, dok je iz kredita plaćeno 24,03 mil.€. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa iz budžetskih sredstava u 2024. godini je plaćeno je 28,52 mil.€, od čega je 27,36 mil.€ za drugu dionicu autoputa, od kojih je 22,49 mil.€ iz namjenskih prihoda po osnovu programa „ekonomskog državljanstva“.
- U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monteput DOO“ je u 2024. godini završio pretkvalifikacioni proces za izbor izvođača radova i stručnog nadzora izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a i FIDIC-ovim uslovima, kao i pravnim propisima Crne Gore. U toku je evaluacija prijava i odobrenje liste od strane EBRD-a, nakon čega će se sprovesti druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Prilog 1: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata u okviru Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj, odobrenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE (programski kod 40903) - realizovane aktivnosti u 2024. godine

Rb	Programski kod i naziv kapitalnog projekta	Procijenjena vrijednost	Zakon za 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje u 2024.
1	11 052 K01 002 - Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup licima smanjene pokretljivosti	2.850.000,00	8.900,89	2.757.276,55	0,00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti obustavljene zbog nepotpune tehničke dokumentacije u vezi sa objektom pod zaštitom kulturnih dobara.				
2	11 052 K02 001 - Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije	1.000.000,00	8.908,01	7.430,36	7.430,36
	Realizovane aktivnosti se dnose na isplatu zaključenih ugovora za izvršene usluge.				
3	12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	38.000.000,00	23.900,00	263.306,94	25.947,24
	Uprava je ugovorila izradu i reviziju tehničke dokumentacije trafostanice i vodosnadbijevanja objekta zatvora i završila izradu i reviziju projektne dokumentacije regulacije korita Tare. Obaveza Opštine Mojkovac je putna infrastruktura. Ministarstvo pravde je ugovorilo izradu projektne dokumentacije objekta, za koju je Uprava ugovorila posao revizije.				
4	12 024 K01 004 - Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	1.000.000,00	708.900,00	5.110.214,13	1.686.351,60
	Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. U 2024. godini zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
5	12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	14.000.000,00	1.368.773,50	13.809.971,09	4.592.597,63
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Zbog izmještanja dalekovoda na privatnom zemljištu, radovi na izgradnji će biti obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, čije rješavanje je u nadležnosti Ministarstva pravde.				
6	13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe MUP-a i stanice Policije u Gusinju	650.000,00	25.900,00	627.868,98	0,00
	Završeni radovi I faze, osim dijela uređenja fasade. MUP je dopunilo projektnu dokumentaciju i rješilo eksproprijaciju. Nakon ponovljenog tendera zaključen ugovor sa izvođačem radova i nadzorom.				
7	13 024 K01 002 - Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	9.700.000,00	8.900,00	9.155.641,06	134.197,24
	Završena je izgradnja kompleksa i objekti su predati korisniku na upotrebu. Završeno plaćanje po konačnom obračunu i okončanoj situaciji, osim objekta magacina.				
8	13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	12.000.000,00	10.000,00	6.485.246,73	0,00
	Nakon što bude dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva odbrane, Uprava će sprovesti tenderske procedure iz svoje nadležnosti.				
9	13 025 K01 002 - Izgradnja objekta za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, aerodrom "Knjaz Danilo"	3.500.000,00	540.000,00	2.960.256,33	1.686.251,45
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni i u toku je priprema za tehnički pregled objekta. Na zahtjev Ministarstva odbrane koje je dostavilo dokumentaciju za izmještanje toplovođa za potrebe funkcionisanja objekta, Uprava je raspisala tender za izbor izvođača radova na kojem nije bilo pristiglih ponuda, pa je isto ponovljeno.				
10	13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice u kasarni "13.jul"	3.200.000,00	916.000,00	2.257.854,12	1.155.783,45
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Završetak objekta je prolongiran zbog potrebe za ugovaranjem nepredviđenih radova koji su proistekli iz propusta i nedostataka u projektnoj dokumentaciji, koju je UKP dostavilo Ministarstvo odbrane. U toku je usaglašavanje dokumentaciju u cilju utvrđivanja ukupnog obima posla i neophodnih procedura za završetak izgradnje.				
11	13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	6.850.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula tenderske procedure. Nadležnost Ministarstva odbrane da u saradnji sa RDC riješi izmještanje antenskog repetitora sa vrha "Zekova glava".				
12	13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	12.000.000,00	4.070.000,00	11.721.852,80	5.508.841,97
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
13	13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	1.100.000,00	90.000,00	766.057,97	78.239,81
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su obustavljeni zbog nepredviđenih okolnosti u postojećem stanju objekta. Dopunjena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane dostavljena je u avgustu i u toku je utvrđivanje ukupnog obima posla u odnosu na ugovorene radove.				
14	13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima	1.200.000,00	560.000,00	1.184.921,58	521.495,00
	Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
15	13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa", Pljevlja	1.750.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	U toku je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
16	13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	5.460.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
	U toku je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
17	15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin	40.000.000,00	3.400.000,89	36.397.784,76	3.878.731,77
	Dva Ski lifta tipa "Sidro" i "Tanjir" - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Radovi su u završni i u toku je tehnički pregled. <u>Rekonstrukcija Ski staze</u> - Na dva javna nadmetanja za izbor izvođača radova nije bilo ponuda. <u>Bob na šinama</u> - Prvo javno nadmetanje je poništeno.				

18	15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	49.000.000,00	1.835.000,89	19.072.618,01	57.980,56
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - U toku je ponovljena tenderska procedura za izgradnju dalekovoda Ribarevine-Cmiljača. <u>Žičara i ski staze</u> - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Bazna stanica</u> - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su obustavljeni do utvrđivanja nove lokacije bazne stanice. Obaveza Ministarstva turizma je da dosatvi inovirane projektne zadatke za Baznu stanicu i garažu za ratrake. <u>Putna infrastruktura</u> - U toku je ponovljena tenderska procedura za izgradnju dionice Jasikovac - Cmiljača po principu "projektuj i izgradi". <u>Vodosnabdjevanje</u> - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog neriješene eksproprijacije. Uprava je izvršila dopunu projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Opština rješava problem eksproprijacije.				
19	15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	29.500.000,00	1.335.000,89	18.899.173,09	246.815,77
	<u>Žičara</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Bazna stanica</u> - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog porasta cijena. U toku je po treći put ponovljen tender. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. <u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju TS "Bazna stanica Žarski" i TS "Z4" sa kablovskim vodom. <u>Putna infrastruktura</u> - Završena projektna dokumentacija za završetak svih radova na trasi Vragodo-Vrioci-Žarski katun. Zaključen ugovor sa izvođačem radova i stručnog nadzora za poslednju dionicu puta. Radovi koji su ugovoreni su obustavljeni zbog neriješene eksproprijacije koja je u ndaležnosti Opštine Mojkovac. <u>Vodosnabdjevanje</u> - Raspisan je poziv za izbor projektanta i revidenta Glavnog projekta vodosnabdjevanja prve faze uslužno servisnih objekata na lokaciji planinskog centra "Žarski" na Bjelasici u dužini L= 1800.				
20	15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32.000.000,00	5.082.000,89	24.153.765,46	6.044.702,00
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - zaključeni ugovori sa projektantom i izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". <u>Žičara</u> - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Završetak radova uslovljen završetkom elektroenergetske infrastrukture. <u>Bazna stanica</u> - Nadležno ministarstvo sprovodi proceduru konkursnog rješenja u saradnji sa Glavnim državnim arhitektom. <u>Ski staze</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. <u>Putna infrastruktura</u> - Ugovoreni radovi su završeni. <u>Vodosnabdjevanje</u> - potpisan ugovor sa obrađivačem studije. <u>Haube</u> - zaključen je ugovor sa dobavljačem opreme.				
21	15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	19.000.000,00	539.250,89	15.084.263,71	354.772,00
	<u>Ski poligon</u> - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi" i svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku.				
22	15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32.000.000,00	3.010.000,89	25.950.323,62	1.504.849,73
	<u>Elektroenergetska infrastruktura</u> - zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju trafostanice i priključnog kabla za povezivanje objekta Vizitoring centra. Rasposan poziv za izgradnju 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice na lokalitetu Đalovića pećina po principu "projektuj i izgradi". <u>Žičara</u> - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. <u>Objekti na ulazu u pećinu i unutrašnjost pećine</u> - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. <u>Putna infrastruktura</u> - realizovan ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za put Gubavač - Bistrica za I fazu, dok je za nastavak radova zaključen ugovor sa izvođačem radova, a procedura zaključivanja ugovora za stručni nadzor je u toku. <u>Vodosnabdjevanje</u> - zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti na projektovanju su obustavljene zbog stanja na terenu koje nije u skladu sa projektnim zadatkom. Opština Bijelo Polje je dostavila inovirani projektni zadatak za vodosnabdjevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno-servisnih objekata na prijemno-ulaznom punktu. <u>Vizitoring centar</u> - radovi na izgradnji su završeni i objekat je predat Ministarstvu. Da bi se stavio u funkciju potrebno je da se završi elektroenergetska infrastruktura. Obaveza Ministarstva turizma je da od Agencije za zaštitu životne sredine pribavi neophodnu dozvole za nastavak radova na izgradnji objekata ispred pećine i uređenju same pećine.				
23	15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	30.000.000,00	1.780.000,89	11.947.046,92	953.880,07
	Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta i izvođenje radova I faze po principu "projektuj i izgradi". Urađen je glavni projekat. Uprava je ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice. Za nastavak izgradnje objekta II i III faze potrebno je da nadležno Ministarstvo turizma pribavi saglasnost Glavnog državnog arhitekta na idejno rješenje.				
24	15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	5.000.000,00	498.950,00	4.147.103,19	441.496,32
	Oština Šavnik realizuje projekat "Valorizaciji kanjona Nevidio" u skladu sa zaključenim ugovorom. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta i izvođenje radova I faze po principu "projektuj i izgradi"				
25	15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevi	2.600.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Raskinut ugovor sa izvođačem radova kojem su zbog prolongiranja rokova naplaćeni penali. Aktivnosti na realizaciji projekta su obustavljene zbog problematike koja se odnosi na proizvodni procese. Ministarstvo poljoprivrede treba da Upravi dostavi tehnološki elaborat u skladu sa kojim će se ugovoriti preostali radovi na završetku objekta.				
26	15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	5.500.000,00	97.900,00	1.458.672,90	346.132,59
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su bili obustavljeni zbog turističke sezone, a uzimajući u obzir lokaciju objekta. Radovi se ne izvode usled neriješene eksproprijacije, potrebe izmještanja podzemnih instalacija i potrebe da se uskladi projekat dokumentacija sa dodatnim zahtjevima nadležne institucije za zaštitu kulturnih dobara. Nadležnost Opštine da riješi probleme.				
27	15 019 K01 013 - Hidrotehnička infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i 1450 sa osnježavanjem	25.000.000,00	1.780.000,89	9.493.660,00	4.142.341,70
	Potpisan je aneks ugovora sa izvođačem. Završena je izrada i revizija Glavnog projekta i izvođač je uveden u posao za faze na kojima su riješeni imovinsko pravni odnosi. Obaveza Opštine je rješavanja eksproprijacije na preostalim fazama bez kojih se objekat ne može staviti u funkciju, kao i spora sa dijelom građana koji su protestima usporavali dosadašnju dinamiku radova.				

28	15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	12.000.000,00	53.900,89	34.200,00	0,00
	Ugovorena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta puta Cmiljača-Žarski i izrada istog je u toku. Obaveza Ministarstva turizma je da dostavi Upravi projektni zadatak i UT uslove za postavljanje žičare koja će povezati dva ski centra, a koja je prethodno bila planirana za montažu na Ski centru "Dumitor" i koja je lagerovana od strane "Skijališta doo".				
29	15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	12.500.000,00	1.390.000,89	12.106.155,12	0,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Idejno rješenje je dostavljeno revidentu i Opštini H.Novi radi davanja saglasnosti na usvojenu trasu.				
30	15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak	260.000,00	231.400,00	0,00	0,00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
31	15 019 K01 029 - Eko-katun Rujišta, Andrijevica	258.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
32	15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	7.000.000,00	852.000,00	102.000,00	101.949,00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Zaključen ugovor za izradu i reviziju Glavnog projekta izgradnje sportske hale.				
33	15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Realizovane aktivnosti za izradu glavnih i konzervatorskih projekata, idejnih rješenja, revizija, elaborata i CBA za žičaru Kotor-Lovćen, II faza.				
34	15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	1.000.000,00	850.000,00	702.000,00	700.296,45
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Izgradnja II faze objekta za potrebe socijalnog stanovanja - realizacija od VI do XII privremene situacije i vršenje usluga stručnog nadzora.				
35	15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	3.000.000,00	900.000,00	1.358.206,00	1.354.728,70
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Nabavku opreme za: DOO "Komunalno", DOO "Vodovod i kanalizaciju", Turističku organizaciju Prijestonice i JPU "Zagorka Ivanović". Nabavka električnog vozila za penzionere, nabavka video nadzora, predajnika i prateće opreme za DOO Lokalni javni emiter "RTV Cetinje". Urađena je implementacija smart parking sistema.				
36	15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	12.950.000,00	900.000,00	211.000,00	210.960,76
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ugovoreno: Nabavka materijala za izgradnju III faze vodovodne mreže (realizacija druge privremene situacije); Izgradnja vodovoda u selima Gornjeg Ceklina; Sanacija starog rezervoara za vodu Koritnik; Nabavka vodomjera za DOO "Vodovod i kanalizacija"; Izgradnju hlorne stanice "Višnjica".				
37	15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada	300.000,00	400.000,00	500.000,00	498.470,00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Organizovane kulturno-turističke manifestacije: "Novogodišnja priča 2023", "Maj u hiljadu boja 2024", "Ljeto u Prijestonici" i "Dječiji grad".				
38	15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	3.500.000,00	2.090.000,00	2.561.394,00	2.515.815,90
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Rekonstrukcija i izgradnja ulica: IV Proleterske, Hercegovačke, Pavla Rovinskog, uređenje parkinga uz ulicu Novice Cerovića, uređenje terena kod zgrade Solidarnosti, parkinzi ispred zgrade S57 i naselja Gruda, uređenje naselja Đure Petrovića, adaptacija kanalizacionih i atmosferskih kolektora u naseljima "Gipos", "4. Jul" i "Predgrađe", regulisanje Borovičkog potoka, uređenje nekadašnjeg Riječkog pazara, eksproprijacija za potrebe rekonstrukcije Vodovodnog sistema, hortikulturno uređenje grada i usluge vršenja stručnog nadzora.				
39	15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	3.000.000,00	700.000,00	1.650.000,00	1.649.516,10
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Asfaltirano je 80.678m ² puta, probijeno je 11.8km puteva na ruralnom području Prijestonice, kao i usluge vršenja stručnog nadzora.				
40	15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	500.000,00	548.000,00	759.000,00	758.053,05
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Realizovane adaptacije objekta na Ljetnjoj pozornici i Palate Đukanovića, kuće sa spomen pločom u kojoj je poginuo Marko Mašanović, krovnog pokrivača i kotlarnice u JPU "Zagorka Ivanović", zamjena parketa i rasvjete u dvorani sportskog centra, izgradnja dječijih igrališta i sportskih terena kao i usluge vršenja stručnog nadzora.				
41	15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	11.000.000,00	609.000,00	10.605.137,15	559.000,00
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Zaključen ugovor sa izvođačem dodatnih radova koji je uveden u posao. U toku je nabavka opreme i pripremni radovi na terenu za igru.				
42	15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	2.450.000,00	660.000,00	110.000,00	106.233,51
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Realizovana prva privremena situacija.				
43	15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	11.100.000,00	30.000,00	18.000,00	17.157,80
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Zaključen ugovor za izradu idejnog i konzervatorskog projekta. Izvršeno iskopavanje temelja starog hotela "Lokanda".				
44	15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	2.000.000,00	120.000,00	90.000,00	89.128,60
	Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Urađen je Glavni projekat rekonstrukcije "Njegosevog parka" i parka "13.Jul" kao i Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za iste.				
45	16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i karantinske jedinice za bille	100.000,00	20.425,00	0,00	11,13
	Implementacija ugovora o uslugama koji podrazumijeva izrade tehničke i tenderske dokumentacije je u toku. Po završetku ovih aktivnosti očekuje se raspisivanje tendera za izvođača radova.				
46	17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	2.600.000,00	179.705,00	2.117.457,58	219.231,17
	Sva oprema je isporučena i sistem je pušten u rad. U toku je garantni period.				

47	17 019 K02 004 - Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1.200.000,00	1.001,00	941.474,00	0,00
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je završen.				
48	17 019 K02 005 - Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU	3.670.000,00	76.500,00	3.659.900,00	645.793,83
	U periodu 2023 godine završene su sve aktivnosti na projektu, osim finalnih izvještaja, te je iz tog razloga rok produžen do 09.01.2024. godine. Implementacija projekta je završena.				
49	17 019 K02 006 - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	2.510.000,00	275.850,47	1.981.040,00	932.817,57
	U toku je implementacija projekta. Idejna rješenja su gotova za sve crne tačke za sub projekat Roads i za sve dionice koje se tiču sub projekta Railways i radi se na izradi glavnih projekata. Za jedan od dva podprojekta koji se odnosi na Željezničku infrastrukturu, neophodno je formirati revizionu komisiju koja bi izvršila reviziju tehničke dokumentacije.				
50	17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	1.500.000,00	218.670,70	2.522.635,02	414.011,12
	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je završen.				
51	17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	20.000.000,00	15.285.001,00	19.685.890,34	17.869.589,71
	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovode opštine. Ugovori sa Opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo Ministarstvo finansija do nivoa ukupne procijenjene vrijednost od 20 mil.				
52	17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	10.000.000,00	408.900,00	3.182.353,58	1.175.346,02
	Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za izgradnju obaloutvrdnog zida rijeke Ibar i radovi su u toku.				
53	17 020 K04 007 - Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	12.000.000,00	93.450,00	117.379,37	3.448,50
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
54	17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose	15.000.000,00	955.000,00	10.520.424,10	102.026,84
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su započeti na dijelu trase gdje je Opština Hereceg Novi riješila imovinsko pravne odnose.				
55	17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	1.600.000,00	8.900,89	1.273.933,23	0,00
	Radovi su završeni i plaćeni za prvu fazu. Preostala je realizacije II faze tj nastavak radova na pristupnim saobraćajnicama koje realizuje Opština Plav.				
56	17 020 K04 012 - Izgradnja trga i šetališta u Sutormu, Opština Bar	7.950.000,00	445.000,00	1.893.034,38	556.098,30
	Zaključen je trojni ugovor o realizaciji projekta. Aktivnosti na ugovaranju radova je sprovodio JP Morsko dobro Crne Gore. Svi radovi su završeni i plaćeni.				
57	17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića	5.900.000,00	890.000,89	3.961.744,61	3.115.500,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Danilovgrad.				
58	17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna	8.350.000,00	8.900,89	2.483.583,02	0,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi se ne izvode zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.				
59	17 020 K04 015 - Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	2.500.000,00	445.000,00	2.500.000,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.				
60	17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	6.200.000,00	1.390.000,00	5.400.000,00	1.086.683,15
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.				
61	17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje	3.500.000,00	222.500,89	1.073.530,26	195.539,37
	Radovi I faze su ugovoreni i čeka se da Opština Gusinje riješi eksproprijaciju. Za II fazu raskinut ugovor sa projektantom i revidentom usljed izmjene Projektnog zadatka i UT uslova.				
62	17 020 K04 029 - Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	5.700.000,00	2.635.000,00	3.480.000,00	2.257.279,39
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.				
63	17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod mag. puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, Bar	1.300.000,00	8.900,00	11.495,00	0,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi se ne izvode jer je potrebno da Opština Bar obezbijedi odobrenje za građenje na koje je prethodno uložena žalba.				
64	17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	2.800.000,00	8.900,00	1.359.527,78	289.716,76
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi će otpočeti kada se stvore povoljni vremenski uslovi.				
65	17 020 K04 047 - Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	820.000,00	360.450,89	369.041,89	151.213,61
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.				
66	17 020 K04 050 - Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	3.400.000,00	1.745.000,00	3.504.226,86	1.740.549,32
	Realizaciju projekta sprovodi Opština. U 2022. godini ugovoreno 114.226,86 €. Aneksom I ugovora iz 2023. godine ugovoreno je 1,645 mil.€, a Aneksom II i III iz 2024. ugovoreno je 1,745 mil.€.				
67	17 020 K04 055 - Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen	1.950.000,00	8.900,00	1.750.724,80	84.458,00
	Radovi su završeni i plaćeni po okončanoj situaciji.				
68	17 020 K04 056 - Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen	4.500.000,00	453.900,00	3.125.607,39	262.605,08
	Radovi su završeni i plaćeni po okončanoj situaciji.				

69	17 020 K04 059 - Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ul. Dušana Vujoševića do ul. Vuka Karadžića u Beranama	700.000,00	445.000,89	579.631,45	141.429,58
	Zaključen ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
70	17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	10.000.000,00	53.400,89	357.016,55	139.176,62
	Zaključeni su ugovori za izradu i reviziju projektne dokumentacije. Revizija je u toku.				
71	17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	6.000.000,00	578.500,00	2.884.018,86	4.450,00
	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije sprovodila je Opština Nikšić. Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Opštine Nikšić izvođač će biti uveden u posao.				
72	17 020 K04 062 - Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	2.000.000,00	873.000,00	623.000,00	480.730,02
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.				
73	17 020 K04 064 - Glavna ulica u Gusinju	1.400.000,00	364.900,00	1.402.215,64	364.900,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
74	17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju	3.600.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
75	17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	6.000.000,00	489.500,00	0,00	0,00
	Opština Nikšić je sprovodila izradu projektne dokumentacije. Opština priprema tender za izbor izvođača radova i relizuje aktivnosti. Obaveza Opštine je rešavanje imovinsko pravnih odnosa.				
76	17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete - Komani	4.000.000,00	364.900,00	2.292.552,56	1.420.079,87
	Završeni su i plaćeni radovi na izgradnji lokalnog puta I i II faze. Aktivnosti na izgradnji javne rasvjete u skladu sa zaključenim ugovorom sprovodi Glavni grad.				
77	17 020 K04 092 - Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	4.000.000,00	699.500,00	820.000,00	655.000,00
	Aktivnosti na realizaciji I faze sprovodi Opština. U toku je ponovno raspisivanje poziva za izbor izvođača radova II faze.				
78	17 020 K04 099 - Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	15.000.000,00	275.900,00	0,00	0,00
	Glavni grad sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
79	17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	800.000,00	328.450,00	780.987,99	260.788,36
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Završeni i plaćeni radovi za I fazu. Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze.				
80	17 020 K04 102 - Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	1.700.000,00	44.500,89	0,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Danilovgrad.				
81	17 020 K04 113 - Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje	120.000,00	106.800,89	106.800,89	91.329,25
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Bijelo Polje.				
82	17 020 K04 114 - Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	1.500.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.				
83	17 020 K04 119 - Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću	2.500.000,00	1.023.000,00	2.500.000,00	621.944,24
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Nikšić. Radovi su u toku.				
84	17 020 K04 120 - Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	300.000,00	226.950,00	226.950,00	207.236,07
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Nikšić.				
85	17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva	3.250.000,00	949.450,00	3.250.000,00	1.437.674,81
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Budva.				
86	17 020 K04 140 - Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	160.000,00	142.400,00	160.000,00	125.224,34
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Danilovgrad.				
87	17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L - 29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	500.000,00	89.000,00	200.000,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Nikšić.				
88	17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	2.500.000,00	672.800,00	2.224.772,32	686.698,12
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač uveden u posao i radovi su u toku.				
89	17 020 K04 147 - Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane	840.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
90	17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	7.600.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				

91	17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	385.000,00	118.900,00	5.445,00	0,00
	Zaključen ugovor sa stručnim nadzorom. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.				
92	17 020 K04 150 - Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	3.500.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.				
93	17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturuom u naselju Breza, Kolašin	4.950.000,00	8.900,00	82.280,00	0,00
	Zaključen ugovor sa stručnim nadzorom. Na raspisanom javnom nadmetanju za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovljeni poziv. Problem neriješena eksproprijacija.				
94	17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	660.000,00	566.800,00	609.709,62	532.705,74
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom i izvođač je uveden u posao. Radovi su u toku.				
95	17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobracajnice u Plavu - II faza	1.100.000,00	1.289.800,00	997.810,59	932.718,47
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom i izvođač je uveden u posao. Radovi su u toku.				
96	17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	2.100.000,00	808.900,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
97	17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima	1.950.000,00	133.500,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i nadzora.				
98	17 020 K04 156 - Lokalni put u MZ Šekular, Berane	200.000,00	102.000,00	102.755,62	102.755,38
	Svi radovi su završeni i plaćeni po okončanoj situaciji.				
99	17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, Budva	870.000,00	329.300,00	534.639,78	0,00
	Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Budva uspješno je sproveden tendera i zaključen ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom Izvođač ne može biti uveden u posao zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji koje je prijavio izvođač i nadzor, a na šta je investitoru ukazivala i Uprava.				
100	17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	7.500.000,00	93.450,00	0,00	0,00
	Glavni grad Podgorica priprema dokumentaciju za rekonstrukciju objekta. Nakon što ista bude dostavljena, UKP će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
101	17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	150.000,00	136.600,00	144.399,60	140.866,27
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni za prvu fazu projekta.				
102	17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	110.000,00	107.900,00	105.776,91	105.775,04
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni i plaćeni po okončanoj situaciji.				
103	17 020 K04 162 - Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti	840.000,00	178.000,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
104	17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	12.000.000,00	595.800,00	595.800,00	83.900,00
	Opština Tuzi završila aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.				
105	17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću	2.500.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	Opština Nikšić sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
106	17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima	450.000,00	364.900,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti raspisati tendera za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
107	17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti	2.700.000,00	356.000,89	68.728,00	0,00
	Opština Tuzi je završila aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zaključen ugovor sa stručnim nadzorom. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.				
108	17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	4.500.000,00	178.000,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje tendera.				
109	17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu	3.800.000,00	609.500,00	3.077.795,24	600.000,00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku. Nakon što se stvore povoljni vremenski uslovi izvođač će nastaviti posao.				
110	17 020 K04 169 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti	4.500.000,00	40.050,00	0,00	0,00
	Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
111	18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	14.500.000,00	2.112.503,56	15.204.394,84	3.822.720,70
	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu. Preostala plaćanja po okončanoj situaciji. Objekat se finansira iz kapitalnog budžeta i kroz donacije.				
112	18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta	10.000.000,00	48.950,00	9.525.409,44	25.291,27
	Zaključen ugovor za izradu GP na zatvaranju privremenog skladišta otpada u Bakovićima, Kolašin i pokrenut tender za Izradu GP za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Begluci I i II, Gusinje.				

113	18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	15.000.000,00	58.900,00	1.972.664,02	3.104,37
	U toku je izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje.				
114	18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	15.000.000,00	1.335.001,89	1.799.508,03	48.326,42
	EPCG je potpisala ugovor po principu "ključ u ruke" za izradu projektne dokumentacije primarnog toplovoda u dužini od cca 6km i izgradnju prve faze u dužini od cca 2,3km. Uprava je pokrenula javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za II i III fazu toplifikacije. Uprava i Opština su zaključile ugovor za radove adaptacije postojeće kotlarnice.				
115	18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	2.500.000,00	8.900,00	810.000,00	0,00
	Opština Plav sprovodi aktivnosti na kompletiranju projektnog zadatka.				
116	18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	11.000.000,00	756.500,00	9.888.572,03	561.352,16
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku su radovi.				
117	18 003 K01 017 - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	500.000,00	284.800,00	5.916,90	0,00
	Zaključen ugovor za reviziju GP. Na tender za izvođača radova i nadzora nije bilo ponuda. Obaveza nadležnog Ministarstva da dostavi dopunu dokumentacije kako bi se pokrenulo ponovni tender.				
118	18 003 K01 021 - Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	900.000,00	8.900,00	732.032,56	256.861,83
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Svi radovi su završeni i plaćeni po okončanim situacijama.				
119	18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zooškim vrtom, Berane	19.000.000,00	44.500,00	0,00	0,00
	Ministarstvo je u saradnji sa Opštinom raspisalo arhitektonski konkurs. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, UKP će pokrenuti tender za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.				
120	18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa pješačkom stazom	5.700.000,00	445.000,00	1.728.801,00	0,00
	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Tuzi. Potpisan Anex I Ugovora koji se odnosi na izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Rujele i izgradnju pješačke staze.				
121	18 003 K01 035 - Vodosnabdijevanje Pljevalja	11.000.000,00	890.000,00	8.045.488,04	2.160.000,07
	Za projekte Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ" i Rekonstrukcija glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ-Grad sa povratnim cjevovodom, ma osnovu dostavljenog Glavnog projekta od strane Opštine, Uprava je zaključila ugovore sa izvođačem i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
122	18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	2.500.000,00	8.900,00	33.154,00	0,00
	Završeno idejno rješenje i u toku je projektovanje. Kašnjenje u izradi tehničke dokumentacije zbog izmjene urbanističko - tehničkih uslova od strane Opštine Pljevlja.				
123	18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	2.000.000,00	222.500,89	30.489,58	400,00
	Završena je I faza radova. Nastavak aktivnosti u skladu sa dostavljenim prioritetima.				
124	18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica	200.000,00	193.450,00	174.499,88	34.899,98
	Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je usaglašavanje količine vode koja se zahvata sa vodoizvorišta sa koncesionarem.				
125	18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	3.000.000,00	445.000,00	2.987.019,31	968,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom nakon ponovljenog tendera. Radovi u toku.				
126	18 003 K01 049 - Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4.000.000,00	8.900,00	3.150,00	0,00
	Zaključen ugovor o reviziji. Upravi nije dostavljena potrebna dokumentacija kako bi mogla pokrenuti dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
127	18 003 K01 050 - Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu	3.100.000,00	8.900,00	5.082,00	0,00
	Zaključen je ugovor za reviziju projektne dokumentacije.				
128	18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	6.900.000,00	198.900,00	216.450,43	187.551,56
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
129	18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje	550.000,00	363.900,00	0,00	0,00
	Nakon što je Opština dostavila izmijenjenu tehničku dokumentaciju, Uprava je raspisala javni poziv za izbor izvođača radova. Tender u toku.				
130	18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	600.000,00	525.100,00	216.559,00	135.585,30
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
131	18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	390.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi je dostavljena dokumentacija i raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova.				
132	18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	10.000.000,00	44.500,00	272.734,00	0,00
	Zaključeni su ugovori sa projektantom i revidentom Glavnog projekta. U toku je izrada projektne dokumentacije.				
133	18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici	500.000,00	189.000,00	164.788,69	68.903,91
	Potpisani su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač uveden u posao i radovi su u toku.				
134	18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane	5.200.000,00	8.900,89	4.946.131,14	0,00
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.				

135	18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	700.000,00	138.900,00	9.546,90	0,00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
136	18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	10.000.000,00	48.950,89	0,00	0,00
	Raspisani su pozivi za javna nadmetanja za izradu studija.				
137	18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	5.000.000,00	1.661.000,00	4.371.820,05	1.526.546,93
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova. Radove nije moguće završiti dok Opština Mojkovac ne definiše novu lokaciju za odlaganje otpada.				
138	18 003 K01 062 - Izgradnja transfer stanice u Andrijevići	850.000,00	692.500,00	738.856,78	648.082,58
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za II fazu - završetak radova. U toku je izvođenje radova. Obaveza Opštine je da obezbijedi elektro-energetsko napajanje objekta.				
139	18 003 K01 063 - Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica	350.000,00	182.450,00	286.793,94	183.327,59
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi su završeni.				
140	18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	4.500.000,00	500.500,00	915.703,62	118.140,10
	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrica sa vodoizvorišta Banjice, II faza - zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Opština Bijelo Polje je u obavezi da uradi dopunu projektne dokumentacije.				
141	18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4.520.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
142	18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	4.800.000,00	18.900,00	7.139,00	0,00
	Završena je izrada projektne dokumentacije. UKP je izvršila dopunu projektne dokumentacije u skladu sa Eurokodovima. Za dalju realizaciju čeka se da Opština Petnjica riješi eksproprijaciju.				
143	18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	2.150.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Obaveza Opštine Žabljak je da dostavi projektnu dokumentaciju usklađenu sa Eurocodovima, nakon čega će Uprava pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
144	18 003 K01 068 - Unaprjeđenje vodovodnog sistema "Višnjica" i "Velja Gora", Prijestonica Cetinje	1.500.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Prijestonica Cetinje je odustala od realizacije projekta.				
145	18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnabdijevanja	10.000.000,00	867.800,00	866.404,50	385.491,86
	Izgradnja vodovoda Razvršje (I faza) u opštini Žabljak – zaključeni ugovori sa izvođačem i nadzorom, radovi u toku. Izgradnja vodovoda i rezervoara u selu Goransko u opštini Plužine – u toku je ponovljen tender za radove i nadzor. Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik I faza - zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom i u toku je izvođenje radova. Rekonstrukcija PPOV Meljine, Herceg Novi - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izmještanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u zahvatu LSL "Donji Talum", Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane - u toku je priprema dokumentacije za raspisivanje tendera. Adapatacija vodovodne mreže u naseljima Gornji i Donji Mliješ u Tuzima - raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača i nadzora.				
146	18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	13.700.000,00	60.050,00	12.556.166,77	0,00
	Završen projekat.				
147	18 003 K02 003 - Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	3.880.000,00	403.596,46	3.234.000,00	556.156,66
	U toku su finalne aktivnosti na realizaciji ugovora.				
148	18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	2.500.000,00	93.392,39	2.399.500,00	651.158,31
	U toku su finalne aktivnosti na realizaciji ugovora.				
149	18 003 K02 011 - Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine	751.000,00	2.700,00	731.217,51	0,00
	Ugovor je završen.				
150	18 003 K02 012 - Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija	1.000.000,00	211.800,00	0,00	0,00
	Projekat je podijeljen na tri zasebna ugovora, radi lakše realizacije. U toku je proces ugovaranja. Raspisane su odgovarajuće javne nabavke.				
151	18 003 K02 013 - Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	500.000,00	76.500,00	1.290.000,00	517.071,89
	Zaključen ugovor i realizacija aktivnosti je u toku. Projekat se finansira iz kredita i kroz donacije.				
152	18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	1.800.000,00	902.800,00	0,00	0,00
	Proces ugovaranja je u toku.				
153	19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	1.000.000,00	270.000,00	797.707,12	0,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođač radova ima poteškoća sa nabavkom previđenih taktilnih traka.				

154	19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	10.000.000,00	933.901,78	4.671.473,46	273.754,64
	Zaključen je ugovor za izvođenje radova na sanaciji krova OŠ "Đašo Pavičić" u Sutorini, HN. Zaključen ugovor za izvođenje radova za adaptaciju školskog dvorišta JU SEŠ "Mirko Vešović" Podgorica. Adaptacija sistema grijanja JUOŠ "18.Oktobar" Bioče, JUOŠ "Polica" Berane, JUOŠ "Zarija Vujošević" Zeta, JUOŠ "Kekec" Sutomore, JUOŠ "Vojin Popović" Drezga, JUSSŠ "Mirko Vešović" Podgorica - u toku tender za izbor izvođača radova i nadzor. Adaptacija krova vrtića JPU "Vukosava Ivanović" Bar - u toku tender za izbor izvođača radova i nadzor. Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JUOŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama - u toku tender za izbor izvođača radova i nadzor. Adaptacija školskog dvorišta JU SEŠ "Mirko Vešović" - u toku tender za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
155	19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	10.000.000,00	63.901,78	1.828.290,61	9.488,19
	Završena je izrada i revizija GP za adaptaciju fiskulturne sale tri srednje srednje stručne škole u Podgorici (elektro, građevinska i hemijska). U toku je tender za izbor izvođača radova i stručni nadzor				
156	19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica	7.000.000,00	134.501,78	9.425,90	0,00
	Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Ministarstva, raspisan je tender za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije. Zaključeni ugovori i u toku izrada projektne dokumentacije.				
157	19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica	1.600.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
158	19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	2.000.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
159	19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica	1.600.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
160	19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	3.800.000,00	68.901,78	61.044,50	27.225,00
	Završena je izrada glavnog projekta, u toku je revizija.				
161	19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	1.600.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
162	19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	1.100.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
163	19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	2.000.000,00	8.901,78	2.397.730,13	41.750,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
164	19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	7.200.000,00	44.501,78	3.304.372,72	683.669,87
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Završena je izrada i revizija projekta. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor za I fazu izgradnje. Na zahtjev Ministarstva prosvjete otvaranje ponuda je prolongirano do usaglašavanja konstrukcije finasiranja sa CEB-om. Zaključen ugovor sa izvođačem radova.				
165	19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	2.600.000,00	44.501,78	49.109,72	0,00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je racionalizacija i revizija projekta jer prvobitni projekat prevazilazi procijenjenu vrijednost iz budžeta.				
166	19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20.500.000,00	44.501,78	9.136.903,58	18.812,69
	Završena je izgradnja Fakulteta likovnih umjetnosti, kotlarnice i infrastrukturnih priključaka, kao i objekta Zajedničkih sadržaja sa podzemnom garažom u kompleksu za šta je preostalo plaćanje.				
167	19 032 K04 014 - Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	8.000.000,00	8.901,78	7.332.743,16	0,00
	Svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.				
168	19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	6.500.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
169	19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	6.500.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
170	19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	12.000.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	U toku je javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.				
171	19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	3.000.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
172	19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija vrtića na Zabjelu u PG	3.600.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
173	19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstr. i nadogradnja vrtića u Kotoru	1.600.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				

174	19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	2.500.000,00	8.901,78	0,00	0,00
	Od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
175	19 032 K04 022 - Rekonstrukcija toplane Univerziteta CG na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1.100.000,00	8.901,78	852.837,87	67.364,80
	Svi radovi su završeni i plaćeni po okončanim situacijama.				
176	19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	15.000.000,00	695.000,00	1.379.338,34	965.020,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
177	19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	1.000.000,00	68.950,00	69.938,00	26.620,00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
178	19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	6.235.000,00	2.360.000,00	4.179.983,98	2.166.903,77
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku. Raspisano javno nadmetanje za izvođenje završnih radova i opremanje objekta i isto je u toku.				
179	19 032 K04 027 - Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću	20.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	UCG je sprovodio aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i nadzor. U toku je tender za adaptaciju postojećeg objekta.				
180	19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	650.000,00	267.000,00	0,00	0,00
	Korisnik Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kako bi se raspisalo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
181	19 032 K04 029 - Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	7.100.000,00	890.000,00	6.967.177,01	2.365.064,10
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Radovi u toku.				
182	19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	5.760.000,00	1.110.000,00	4.811.651,47	1.720.057,17
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. U toku su radovi.				
183	19 032 K04 031 - Renoviranje OŠ "Boško Radulović" - Komani	1.750.000,00	48.950,00	350.396,58	7.899,60
	Završeni su svi planirani radovi na adaptaciji škole i na uređenju terena.				
184	19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić	500.000,00	445.000,00	499.596,90	0,00
	Nakon ponovljenog poziva za javno nadmetanje zaključen je ugovor sa isporučiocem opreme.				
185	19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru	300.000,00	304.600,00	276.031,25	0,00
	Nakon trećeg javnog nadmetanja zaključeni su ugovori za izvođača radova i stručnog nadzora.				
186	19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, Opština Bar	1.550.000,00	627.000,00	1.196.590,33	659.799,61
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
187	19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	2.600.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda i u toku je ponovljeni poziv.				
188	19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevici	3.500.000,00	48.950,00	32.246,50	0,00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je racionalizacija projektne dokumentacije jer prvobitni projekat prevazilazi procijenjenu vrijednost iz budžeta.				
189	19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	10.000.000,00	358.950,00	34.721,40	25.168,00
	U toku je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.				
190	19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	2.500.000,00	95.950,00	51.013,60	18.550,00
	Zaključen je ugovor sa obrađivačem projektne dokumentacije. U toku je revizija projekta.				
191	19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	4.854.404,00	17.800,00	7.214.452,26	3.008.697,50
	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova. Projekat se finansira iz kredita i kroz donacije.				
192	19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - Donje luge, Berane	5.500.000,00	438.000,00	365.235,83	73.088,31
	Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
193	19 032 K04 055 - Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	1.400.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	U toku su javna nadmetanja za izbor izvođača i stručnog nadzora.				
194	19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	2.050.000,00	17.800,00	0,00	0,00
	Završene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije kojima koordinira Opština Nikšić. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
195	19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoi", Podgorica	2.000.000,00	8.900,00	2.831.400,00	10.043,98
	Zaključeni ugovori za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". U toku je izrada projektne dokumentacije.				

196	19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	3.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
197	19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	6.700.000,00	1.600.000,00	5.584.452,10	2.330.672,00
	Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor. Svi radovi su završeni.				
198	19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	5.000.000,00	8.900,00	114.627,73	0,00
	Nakon ponovljenog poziva za javno nadmetanje za izradu sportskog terena pod Golubinjom u Pljevljima zaključen je ugovor sa izvođačem radova.				
199	19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	6.000.000,00	8.900,00	4.713.850,05	0,00
	Zaključeni su ugovori za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Opština Herceg Novi imenovala revidenta. U toku je revizija projekta.				
200	19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	4.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Na dva raspisana javna nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovljeni poziv za javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
201	19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru	4.500.000,00	17.800,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
202	19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama	5.200.000,00	441.400,00	4.825.882,70	1.499.786,62
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Izvođenje radova u toku.				
203	19 038 K01 010 - Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru	18.250.000,00	17.800,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti dalje aktivnosti. Potrebno je da nadležno Ministarstvo u saradnji sa Glavnim državnim arhitektom raspiše arhitektonski konkurs.				
204	19 038 K01 011 - Olimpijska kuća u Podgorici	4.200.000,00	17.800,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti dalje aktivnosti. Potrebno je da nadležno Ministarstvo u saradnji sa Glavnim državnim arhitektom raspiše arhitektonski konkurs.				
205	19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti	1.000.000,00	178.000,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija. Na raspisano javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda. U toku je ponovno raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
206	19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici	13.000.000,00	905.000,00	11.258.553,58	4.565.893,51
	Zaključeni su ugovori sa izvođačima radova i stručnim nadzorom za radove na objektu i trafostanici. Svi radovi su završeni. Preostalo je plaćanje po okončanoj situaciji.				
207	19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	2.300.000,00	645.890,00	1.018.332,17	623.554,09
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
208	19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	2.500.000,00	559.850,00	43.802,00	0,00
	Nakon ponovljenog poziva za javno nadmetanje, zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Na tender za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda i isti je ponovljen.				
209	20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	3.000.000,00	401.000,00	1.769.478,25	468.646,61
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za osnovne i dodatne radove. Svi radovi su završeni u toku je izrada konačnog izvještaja nadzora i pregled objekta od konzervatorskih ustanova.				
210	20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	5.000.000,00	543.350,00	234.462,31	19.057,50
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za rekonstrukciju Doma kulture u Tuzima.				
211	20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić	5.000.000,00	912.000,00	3.192.111,13	850.886,63
	Na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila Opština Nikšić i nakon sprovedene tenderske procedure, zaključen je Ugovor sa Izvođačem radova. Usluge Stručnog nadzora obezbijedila Opština kao donaciju. Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom. Radovi i opremanje objekta specijalizovanom opremom su završeni. Svi ugovoreni radovi su završeni. Objekat je predat korisniku.				
212	20 021 K01 021 - Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	2.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti aktivnosti za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
213	20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldre u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	1.800.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Opština sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Nakon što ista bude dostavljena, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
214	20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	330.000,00	243.000,00	26.559,00	17.000,00
	Završena je izrada projektne dokumentacije. Na dva javna nadmetanja nije bilo pristiglih ponuda. U toku je treći poziv za javno nadmetanje.				
215	20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	3.800.000,00	299.800,00	0,00	0,00
	Na raspisana dva javna nadmetanja za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda. U toku je treći poziv za javno nadmetanje.				
216	20 021 K01 030 - Scensko opremanje sale JU "Centar za kulturu Danilovgrad"	360.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
217	20 021 K01 031 - Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	750.000,00	133.500,00	0,00	0,00
	No na ponovljeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora nije bilo pristiglih ponuda. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane Ministarstva kulture.				

218	20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	20.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
219	21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja KCCG u PG	850.000,00	445.000,00	742.995,25	0,00
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. U toku su aktivnosti na usaglašavanju projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i potrebama korisnika u periodu izvođenja radova.				
220	21 011 K01 003 - Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	8.500.000,00	1.646.000,00	7.314.390,10	2.450.543,49
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u završnoj fazi. Preostala su finalna plaćanja po okončanim situacijama.				
221	21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu	3.200.000,00	534.000,00	2.180.413,21	230.392,57
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Zaključen je ugovor za izvođenje dodatnih radova zbog izmjene projektne dokumentacije. Zaključeni su ugovori za nabavku opreme.				
222	21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40.000.000,00	89.000,00	38.694.602,10	0,00
	Ministarstvo zdravlja i OB Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za Idejno arhitektonsko rješenje objekta koje je dostavljeno Upravi, kao i Projektni zadatak sa predlogom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Nakon uspješnog tendera zaključen je ugovor sa izvođačem radova. U toku je izrada projektne dokumentacije.				
223	21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica	21.000.000,00	44.500,00	365.950,00	88.865,18
	Ministarstvo zdravlja i DZ PG su u saradnji sa Ministarstvom ekologije sproveli konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje. Zaključen je ugovor sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije.				
224	21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	2.100.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Uprava nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
225	21 011 K01 008 - Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	38.000.000,00	8.900,00	307.010,78	0,00
	Ministarstvo zdravlja i KCCG u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što Upravi bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti. U prethodnom periodu završeni su radovi na dijelu objekta za potrebe prostora laboratorije za potrebe Centra za genetiku i imunologiju kao i radovi na adaptaciji prostora za potrebe Dnevne bolnice.				
226	21 011 K01 009 - Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog, Nikšić	4.100.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
227	21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	2.400.000,00	445.000,00	422.290,00	422.290,00
	Zaključen je ugovor i isporučen multislajski skener (CT) za potrebe KCCG, dok je poništena prartija za nabavku MRI za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić.				
228	21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	15.000.000,00	292.005,34	111.560,79	48.400,00
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Projektant je konstatovao da je potrebno ukloniti postojeći objekat i predložio totalnu rekonstrukciju u postojećim gabaritima i za isto je dobijena saglasnost KCCG, pa je produžen rok za izradu GP. Za inovirano Idejno rješenje koje je od strane KCCG poslato glavnom državnom arhitekti dobijena je saglasnost.				
229	21 011 K01 012 - Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	825.000,00	195.800,00	540.420,70	36.559,82
	U toku je zaključivanje ugovora sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u toku.				
230	21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	800.000,00	445.000,00	425.859,47	0,00
	Nakon ponovljenog tenderskog postupka zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su ubrzo obustavljeni usljed nekompletne projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva zdravlja i JZU Dom zdravlja, koji sprovode aktivnosti na dopuni i doradi projektne dokumentacije što će rezultirati raspisivanjem dodatnih javnih nabavki za dodatne radove.				
231	21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	3.000.000,00	445.000,00	1.308.601,58	240.763,11
	Na prvi tender nije bilo pristiglih ponuda. Nakon ponovljenog javnog poziva donešena je odluka o izboru najpovoljnije ponude. Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i u toku je izvođenje radova.				
232	21 011 K01 016 - Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	15.000.000,00	139.000,00	108.955,66	46.794,93
	Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. U toku je izrada projektne dokumentacije.				
233	21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane	740.000,00	97.900,00	535.524,29	68.665,14
	Radovi su završeni. Objekat je predat korisniku na upotrebu.				
234	21 011 K01 018 - Adaptacija Doma zdravlja Budva	1.300.000,00	178.000,00	15.651,35	400,00
	Raspisana su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora. Donesene su odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uložena žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova. Po rješenju Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki postupak je poništen. Ponovo je raspisan novi javni poziv za izbor izvođača radova.				
235	21 011 K01 021 - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	920.000,00	441.000,00	1.132.734,26	424.435,39
	Radovi su završeni. Objekat je predat korisniku na upotrebu. Zaključeni realizovani ugovori se odnose na: Rekonstrukciju zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Opšte bolnice u Beranama (879.022,61 €) i izvođenje radova na adaptaciji dijela zgrade suterena za neurologiju i infektivno odjeljenje Opšte bolnice u Beranama, za potrebe Poliklinike i fizikalne medicine (253.711,65 €).				

236	21 011 K01 026 - Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju	4.200.000,00	53.900,00	30.571,89	30.571,89
	Nakon što bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, Uprava će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
237	21 011 K01 027 - Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi	400.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
238	21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	360.000,00	358.400,00	358.160,00	0,00
	Nakon drugog javnog nadmetanja za nabavku opreme zaključen je ugovor sa dobavljačem.				
239	21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	780.000,00	780.000,00	652.495,44	651.995,44
	Nakon drugog tendera zaključen ugovor sa dobavljačem opreme za banku matičnih ćelija. Ugovor se realizuje po 9 partija, od čega je za 6 završena realizacija. Od nabavke opreme po jednoj partiji korisnik je odustao, dok je ponovljen poziv za nabavku opreme za preostale dvije partije.				
240	21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	800.000,00	445.000,00	21.780,00	0,00
	Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom i izvođačem radova, koji je uveden u posao na objektima u Beranama, Nikšiću, Baru i Budvi. U Bijelom Polju očekuje se od strane Minszastva zdravlja definisanje nastavka aktivnosti. Problemi sa neusaglašenošću projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta.				
241	21 011 K01 031 - Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	750.000,00	445.000,00	0,00	0,00
	U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
242	21 011 K01 032 - Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	3.900.000,00	445.000,00	3.802.304,00	0,00
	UKP je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i KCCG krajem 2023. raspisalo javno nadmetanje za nabavku linearnog akceleratora za i u toku je realizacija ugovora.				
243	21 011 K01 033 - Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonantologiju Instituta za bolesti djece	5.500.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
244	21 011 K01 034 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	5.000.000,00	409.000,00	700.767,14	18.536,37
	Adaptacija terasa na paviljonima bolnice u Brezoviku – Po drugi put raspisan tender i u toku je vrednovanje ponuda; Izgradnju novog Urgentnog centra i dnevne bolnice OB Berane – Upravi nije dostavljena dokumentacija; Rekonstrukciju operacionog bloka OB Berane - javno nadmetanje za izbor izvođača radova je poništeno; Opšta bolnica Bijelo Polje – Po drugi put je raspisan tendera za izbor izvođača radova za rekonstrukciju krova; Dječiji dispanzer u Nikšiću - U toku je ponovno raspisivanje tendera; Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić – Po drugi put raspisan tender.				
245	21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	9.500.000,00	1.027.967,82	8.828.218,22	6.748.883,80
	Radovi su završeni. Objekat je predate korisniku na upotrebu.				
246	21 011 K02 002 - Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	2.100.000,00	83.199,98	2.089.343,77	403.693,31
	Radovi su završeni. Objekat je predate korisniku na upotrebu.				
247	21 011 K02 004 - Radovi na izgradnji operativnog centra	2.200.000,00	6.137,50	2.193.991,25	673.023,85
	Radovi su završeni. Objekat je predate korisniku na upotrebu.				
248	22 025 K01 002 - Izgradnja Doma starih u Nikšiću	2.880.000,00	89.000,00	2.797.596,01	0,00
	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.				
249	22 025 K01 007 - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1.700.000,00	404.000,00	1.659.873,74	608.611,17
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.				
250	22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	1.000.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Upravi nije dostavljana dokumentacija kako bi mogla pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.				
251	22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Herceg Novi	1.200.000,00	267.000,00	903.154,10	285.866,67
	Zaključeni ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
252	22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu	4.150.000,00	534.000,00	3.476.133,36	1.030.771,84
	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.				
253	22 025 K01 011 - Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica	7.500.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	U toku su pripremne aktivnosti na utvrđivanju lokacije i izradi projektnog zadatka.				
254	22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	1.450.000,00	8.900,00	0,00	0,00
	Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručni nadzor.				
UKUPNO		1.476.148.404,00	121.300.640,14	617.743.103,77	131.313.928,83

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ (programski kod 41003) - realizovane aktivnosti u 2024. godine

Rb	Naziv i kod projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu	Procijenjena vrijednost	Zakon 2024.	Ugovorena vrijednost	Izvršenje
1	17 020 K01 002 - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina U decembru je potpisan Amandman 4 za radove. Objekat pušten u privremeni rad. U toku je procedura pribavljanja upotrebne dozvole.	67.800.000,00	8.425.426,68	64.152.576,35	10.289.157,26
2	17 020 K01 003 - Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka Projekat je završen. Predat je konačan izvještaj stručnog nadzora.	890.000,00	38.359,00	696.617,09	127.247,23
3	17 020 K01 004 - Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići Nakon što je sa prvobitnim izvođačem raskinut ugovor i novog tendera, zaključen je ugovor i isplaćen je avans. Završeni asfalterški radovi u dva bitonoseća sloja i na temeljima stubova mostova.	10.500.000,00	1.837.850,00	7.697.497,53	2.573.071,26
4	17 020 K01 006 - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i BP Evaulacija u toku. Realizovana sredstva se odnose na deponovana sredstva na posebnom računu za potrebe rješavanja eksproprijacije.	20.000.000,00	89.890,00	89.000,00	89.000,00
5	17 020 K01 009 - Rekonstrukcija magist puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova Završeni radovu i u toku je tehnički pregled.	33.500.000,00	11.150.000,00	19.647.707,05	12.088.737,59
6	17 020 K01 010 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od Juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda regionalnog vodovoda.	66.000.000,00	2.225.890,00	58.454.879,18	4.590.235,43
7	17 020 K01 011 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi na pojedinim dionicama.	35.950.000,00	89.890,00	35.866.656,29	15.113.341,78
8	17 020 K01 014 - Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi na pojedinim dionicama.	39.500.000,00	4.170.267,00	35.601.016,09	4.363.399,01
9	17 020 K01 016 - Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza Gotov glavni projekat i u toku je priprema tenderske procedure za izbor izvođača. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog nemogućnost kompletiranja elaborata eksproprijacije.	15.600.000,00	418.300,00	168.190,00	124.593,64
10	17 020 K01 017 - Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor Nije bilo aktivnosti u posmatranom periodu jer se čeka HIA studija uticaja puta na zaštićeno područje Kotora. Izvršenja se odnose na isplatu po Rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara.	40.000.000,00	48.950,00	4.992,10	4.992,10
11	17 020 K01 018 - Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac – V1ragodo Priprema tenderske dokumentacije je u toku. Za objekat nije izdata građevinska dozvola jer projektna dokumentacije nije u skladu sa Zakonom.	13.400.000,00	1.375.050,00	13.200.961,20	1.846,41
12	17 020 K01 019 - Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica NK-Kuside i NK-Jasenovo Polje Izvođenje radova na predmetnoj dionici je u toku. Neriješeni imovinski pravni odnosi su usporavali izvođenje radova u ugovorom definisanim rokovima.	7.100.000,00	3.886.360,00	6.902.975,56	3.763.647,68
13	17 020 K01 021 - Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Problem sa izmjenom elaborata eksproprijacije zbog izmjena u katastru nepokretnosti.	48.885.000,00	925.600,00	14.768,84	14.768,84
14	17 020 K01 022 - Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute Potpisan ugovor o izvođenju radova i za stručni nadzor. U toku je izvođenje radova koje se odvija planiranom dinamikom izvršenja.	12.500.000,00	1.806.700,00	12.189.540,00	1.499.424,89
15	17 020 K01 024 - Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta CT - Čevo, CT - Njeguši Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi u dužini od oko 200m.	36.000.000,00	1.375.050,00	2.969.275,98	1.577.318,72
16	17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva Završeni radovi na investicionom presvlačenju za sekcije: Podgorica, Nikšić, Berane, Pljevlja i Kotor. Završeni radovi za asfaltiranje dionica: Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine, Podgorica – Božaj, Debeli brijeg – Kotor i Lipci - Grahovo - Vilusi. Za radove je ukupno potrošeno 6.025.929,99 eura, a za usluge stručnog nadzor 10.843,60 eura.	8.000.000,00	2.705.600,00	6.068.478,40	6.036.773,59
17	17 020 K01 027 - Putni prelazi Realizacija aktivnosti u planiranom obimu se očekuje u IV kvartal tekuće godine. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju projekta čiju realizaciju prati Uprava za željeznice.	800.000,00	180.937,00	21.427,10	21.427,10
18	17 020 K01 028 - Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva Realizovane aktivnosti se odnose: na isplatu naknada po Rješenjima za Jedinicu za implementaciju projekata koji se finansiraju iz kredita EIB i EBRD; na troškove advokatskih usluga po osnovu rješenja sudova i privremenih zastupnika; na isplate po rješenjima Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; na isplate po rješenjima Uprave za katastar i državnu imovinu; tehnički pregledi izvedenih radova i izrada projekata elaborata i revizija istih, UTU uslovi; na isplate po osnovu eksproprijacije nepokretnosti za projekte koje su već završeni i iz ranijeg su perioda; na sanaciju klizišta Donje luge, adaptaciju regionalnog puta Mateševo-Andrijevića, prevoj Trešnjevika i dionice Vuksan Lekaj-Dušiće i Vuksan Lekaj - Hoti. Za jedinicu za implementaciju projekata je potrošeno 170.520,66 eura, za advokatske i notarske usluge 33.118,18 eura, za izvedene radove 1.001.234,99 eura, za stručni nadzor 382950,04 eura i za eksproprijaciju 146.902,90 eura.	4.900.000,00	1.173.040,00	1.734.726,17	1.734.726,17

19	17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari	7.600.000,00	72.090,00	143.034,10	114.694,00
	Priprema odluke za proglašenje javnog interesa za nepokretnosti iz elaborata eksproprijacije potrebne za realizaciju projekta.				
20	17 020 K01 032 - Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin	6.500.000,00	453.900,00	6.431.746,80	904.758,75
	Radovi su izvršeni u potpunosti. Pribavljena upotrebna dozvola.				
21	17 020 K01 035 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska	2.300.000,00	542.900,00	600.000,00	0,00
	U toku je priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova, za II fazu.				
22	17 020 K01 036 - Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice	20.600.000,00	1.530.800,00	0,00	0,00
	U toku tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i stručnog nadzora. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su shodno sporazumu obaveza Glavnog grada.				
23	17 020 K01 037 - Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir	20.600.000,00	119.890,00	89.000,14	73.847,39
	Izrada tehničke dokumentacije je završena. Pozitivno revidovan Glavni projekat.				
24	17 020 K01 040 - Stručni nadzor za rekonstrukcije mag. puteva: PV-Mihajlovića, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje	3.000.000,00	1.780,00	1.492.960,00	279.285,00
	Nadzor je vršen na projektu Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane.				
25	17 020 K01 041 - Stručni nadzor za: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz	3.000.000,00	420.000,00	2.488.905,00	364.535,37
	Stručni nadzor je izvođen nad projektom Tivat - Jaz i Rožaje Špiljani.				
26	17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna	1.100.000,00	356.000,00	0,00	0,00
	Tenderska procedura još nije završena od 30. avgusta kada je bilo otvaranje pristiglih ponuda.				
27	17 020 K01 043 - Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	58.000.000,00	996.800,00	420.309,99	0,00
	Nije bilo realizovanih aktivnosti, još uvijek nije donijet prostorni plan.				
28	17 020 K01 045 - Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)	4.750.000,00	9.790,00	0,00	0,00
	Nije bilo aktivnosti jer se čeka da se potpiše Međudržavni ugovor između Crne Gore i Albanije.				
29	17 020 K01 046 - Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju	4.075.000,00	9.790,00	0,00	0,00
	Priprema dokumentacije se vrši od strane organa BiH, koje učestvuju u ovom međudržavnom projektu. Problemi sa procjenom uticaja na životnu sredinu i neriješenom eksproprijacijom.				
30	17 020 K01 048 - Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na Cijevni do Šipčanika	14.500.000,00	449.450,00	0,00	0,00
	Nije bilo aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izbor Izvođača radova zbog ne riješenih imovinsko - pravnih odnosa od strane opštine Tuzi.				
31	17 020 K01 056 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Jasenovo polje-Vidrovan	4.800.000,00	1.797.800,00	4.707.402,30	3.496.835,14
	Izvođenje radova na predmetnoj dionici je završeno i plaćeno po okončanim situacijama.				
32	17 020 K01 057 - Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka	18.000.000,00	99.680,00	150.400,00	16.120,00
	Raskinut prvobitni ugovor o reviziji i formirana je nova reviziona komisija i predata geodezija na reviziju.				
33	17 020 K01 058 - Rekonstrukcija tunela Vrmac	9.330.000,00	48.950,00	5.445,00	5.445,00
	Postavljeni repери za geodetsko praćenje i vrše se kontrolna mjerenja. Sredstva u 2024.godini su utrošena za usluge osmatranja pomjeranja u Tunelu Vrmac.				
34	17 020 K01 063 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	15.000.000,00	31.150,00	88.850,30	0,00
	Potpisan ugovor za projektovanje.				
35	17 020 K01 065 - Izrada rasvjete u tunelu "KLjuč" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin	300.000,00	89.890,00	239.789,63	182.707,85
	Zvršeni radovi. Nakon dostavljanja izvještaja nadzornog organa biće dostavljena i okončana situacija na završno plaćanje.				
36	17 020 K01 066 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen	631.000,00	209.150,00	0,00	0,00
	Pokrenuta je javna nabavka za izbor projektanta.				
37	17 020 K01 067 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva	6.200.000,00	1.845.000,00	471.303,71	421.508,18
	Ugovorena vrijednost za radove i nadzor iznosi 471.303,71 eura i od toga je realizovano za izvođenje radova 288.737,21 eura, dok je preostali dio potrošen na reviziju tehničke dokumentacije.				
38	17 020 K01 068 - Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica "Budoš" - DG	37.000.000,00	1.343.900,00	55.338,56	54.730,12
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Sredstva su utrošena na usaglašavanje Glavnog projekta sa eurokodovima, reviziju tehničke dokumentacije, premije osiguranja				
39	17 020 K01 069 - Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, II faza Bajička ulica	1.530.000,00	622.110,00	1.837.568,93	1.212.281,83
	Izvođenje radova je završeno. U toku je tehnički pregled izvedenih radova, nakon čega će se dostaviti okončana situacija za isplatu zadržanih sredstava po ugovoru.				
40	17 020 K01 070 - Uvodnje Intelligentnih transportnih sistema (ITS)	1.520.000,00	538.450,00	0,00	0,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.				

41	17 020 K01 072 - Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica - Bioča	11.620.000,00	8.900,00	11.341.126,29	1.159.934,03
	U toku je usaglašavanje Glavnog projekta sa Eurokodovima. Potpisan ugovor za izvođenje radova, plaćena avansna situacija. Radovi u toku.				
42	17 020 K01 073 - Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate	12.140.000,00	1.405.310,00	10.908.919,28	2.953.687,81
	Zaključen je ugovor za projektovanje i izvođenje radova. Radovi u toku.				
43	17 020 K01 076 - Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-10, dionica Tomaševo-Pavino polje	1.215.000,00	963.350,00	1.196.922,32	1.195.872,93
	Radovi su u cjelosti završeni i isplaćeni po okončanim situacijama.				
44	17 020 K01 078 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han	5.100.000,00	453.900,00	6.655,00	0,00
	Završena je tehnička dokumentacija od strane Opštine Pljevlja, u toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova.				
45	17 020 K01 079 - Rekonstrukcija magistralnog puta PŽ-NK-DG, dionica Zaborje-Jasenovo polje	16.000.000,00	2.031.150,00	14.972.054,15	3.622.703,88
	Izabran izvođač radova, potpisan ugovor i isplaćen avans. Radovi su se izvodili na prvih 5km trase. Zastoj u izvođenju zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.				
46	17 020 K01 081 - Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi	6.613.000,00	588.290,00	0,00	0,00
	Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Tuzi.				
47	17 020 K01 082 - Rekonstrukcija M-11 Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“	18.000.000,00	454.790,00	0,00	0,00
	Priprema tenderske procedure za izvođača radova i stručnog nadzora. U toku je izmjena projektne dokumentacije od strane Opštine Tivat a po zahtjevu CEDIS-a.				
48	17 020 K01 083 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-1, dionica Sutomore - ulaz u Baru	19.230.000,00	97.900,00	0,00	0,00
	Izrada tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar.				
49	17 020 K01 091 - Izgradnja tunela „Lokve“	20.000.000,00	97.900,00	0,00	0,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izradu tehničke dokumentacije. Čeka se dobijanje urbanističko-tehničkih uslova od nadležnog ministarstva.				
50	17 020 K01 092 - Unapređenje baze putnih podataka	830.000,00	373.800,00	15.415,40	12.740,00
	Potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci za usluge na izradi referentnog sistema državnih puteva Crne Gore.				
51	17 020 K01 094 - Izgradnja puta Plav - Bogićevica	32.000.000,00	98.790,00	0,00	0,00
	Izrada projektne dokumentacije u nadležnosti Uprave za kapitalne investicije.				
52	17 020 K01 095 - Rekonstrukcija Tunela "Budoš" na magistralnom putu M-3, Nikšić-Danilovgrad	10.640.000,00	97.900,00	0,00	0,00
	Izrada tehničke dokumentacije kako bi se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.				
53	17 020 K01 096 - Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane - Riđani	5.340.000,00	143.290,00	0,00	0,00
	U decembru je raspisan tender za izbor izvođača radova.				
54	17 020 K02 001 - Obilaznica Rožaje, II faza	33.650.000,00	970.100,00	0,00	0,00
	Ni na ponovljenom pozivu za javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda.				
55	17 020 K02 002 - Rekonstrukcija magistralnog puta PG-NK, dionica Cetinjski semafori – Komanski Most	4.500.000,00	102.350,00	6.223,63	6.223,63
	Završeni radovi na 1km trase. Raskinut ugovor sa izvođačem. Radovi na preostalom dijelu od 700m nije moguće izvoditi do završetka izrade izmjene planske dokumentacije i rješavanja eksproprijacije. Sredstva koja su utrošena u 2024.godini se odnose na plaćanje stručnog nadzora za radove koje su se izveli u ranijem periodu.				
56	17 020 K02 007 - Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić	25.231.000,00	9.790,00	14.426.334,46	912.776,54
	Završena je izrada tehničke dokumentacije sa izmjenama koje sprovodi Glavni grad, čija obaveza je i rješavanje eksproprijacije, nakon čega će izabrani izvođač radova biti uveden u posao. Sklopljen je ugovor za izvođenje radova u decembru o plaćena avansna situacija.				
57	17 020 K02 008 - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na putu Berane - Grnčar	305.000,00	304.340,00	301.028,91	301.007,94
	Svi radovi završeni i plaćeni po okončanoj situaciji, za I fazu projekta.				
58	17 020 K03 001 - Autoput Bar-Boljare	605.000.000,00	40.236.000,00	31.373.073,37	31.373.073,37
	Pokrenut je postupak eksproprijacije i donijeta su rješenja o zabilježbama na nepokretnostima. U toku je saslušanje vlasnika nepokretnosti pred Upravom za nekretnine PJ Kolašin i PJ Andrijevica. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na plaćanje obaveza za završenu dionicu autoputa, kao i za eksproprijaciju za novu dionicu, advokatske i nostarske usluge.				
59	17 020 K05 003 - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica	350.000,00	153.080,00	9.801,00	0,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Problemi sa projektnom dokumentacijom i usaglašavanjem po Eurokodovima.				
60	17 020 K05 004 - Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	800.000,00	372.020,00	0,00	0,00
	Nije bilo ponuda na tenderu u julu tekuće godine i objavljen je novi javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača.				
61	17 020 K05 005 - Sanacija klizišta Brvenica na regionalnom putu Pljevlja-Gradac	350.000,00	264.330,00	0,00	0,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Usaglašavanje tehničke dokumentacije sa Eurokodovima.				

62	17 020 K05 007 - Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica	1.400.000,00	117.035,00	1.332.063,07	443.538,18
	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.				
63	17 020 K05 008 - Sanacija klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac	330.000,00	117.124,00	615.554,04	115.492,66
	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.				
64	17 020 K05 009 - Sanacija klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjelaha	125.000,00	146.150,00	143.373,26	136.771,27
	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.				
65	17 020 K05 010 - Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina	804.000,00	623.000,00	20.267,50	200,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova.				
66	17 020 K05 012 - Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin	1.430.000,00	364.900,00	24.079,00	2.047,36
	Tender za izbor izvođača poništen, jer nije bilo ponuda. Objavljen je novi. U toku je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.				
67	17 020 K05 014 - Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina	3.540.000,00	2.670,00	3.400,00	3.400,00
	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije.				
68	17 020 K05 015 - Sanacija kritične tačke Sokolovina na putu Đurđevića Tara-Mojkovac	10.700.000,00	5.343.190,00	10.668.563,17	3.270.238,72
	Izvođenje radova u toku u skladu sa ugovorenim dinamikom.				
69	17 020 K05 016 - Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na putu Žabljak-Šavnik	2.060.000,00	245.640,00	11.253,00	1.200,00
	Zaključen ugovor za projektovanje. Predat na reviziju geološki elaborat.				
70	17 020 K05 018 - Sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar –Ulcinj	1.440.000,00	898.900,00	860,00	860,00
	Raspisan tender za izbor izvođača radova, nije bilo ponuda. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije po rješenju Ministarstva kapitalnih aktivnosti.				
71	17 020 K05 019 - Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj	852.000,00	549.130,00	860,00	860,00
	Na ponovljenom tenderu za izbor izvođača nije bilo ponuda. Realizovane aktivnosti u proteklom periodu se odnose na reviziju tehničke dokumentacije po rješenju Ministarstva kapitalnih aktivnosti.				
72	17 020 K05 020 - Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na putu Šćepan polje-Plužine	2.110.000,00	75.650,00	33.600,00	0,00
	Završena tenderska procedura za izbor projektanta i potpisan ugovor o izradi glavnog projekta. U toku izrada glavnog projekta.				
73	17 020 K05 022 - Sanacija klizišta „Dobrakovo	5.515.000,00	3.814.600,00	5.386.946,60	3.435.328,65
	U toku je redovno izvođenje radova na predmetnoj dionici.				
74	17 020 K05 023 - Sanacija klizišta na putu Mateševo-Kolašin	1.300.000,00	449.450,00	1.269.042,67	249.003,95
	Radovi su izvršeni u potpunosti i pribavljanje je upotrebne dozvole. Završen tehnički pregled i dobijen pozitivan izvještaj.				
75	17 020 K05 024 - Sanacija mosta „Bare Kraljske“	780.000,00	48.950,00	0,00	0,00
	Izvršena privremena sanacija kroz program održavanja magistralnih i regionlanih puteva, te se u narednom periodu neće raditi ovaj projekat.				
76	17 020 K05 025 - Sanacija kosine „Galev krš“ na regionalnom putu Đurđevića Tara -Mojkovac	1.650.000,00	48.950,00	0,00	0,00
	Nije bilo aktivnosti zbog nedostavljanja urbanističko tehničkih uslova.				
77	17 020 K05 026 - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac	1.380.000,00	48.950,00	0,00	0,00
	Uspješno okončan tender za izradu tehničke dokumentacije i u toku je faza potpisivanja ugovora.				
78	17 020 K05 027 - Sanacija kosina na regionalnom putu R-24 Buča - Lubnice	1.110.000,00	78.320,00	0,00	0,00
	Priprema tenderske dokumentacije sa ciljem izrade tehničke dokumentacije. Čekaju se Urbanističko tehnički uslovi od nadležnog ministarstva.				
UKUPNO		1.567.101.000,00	115.712.318,68	388.770.756,51	120.337.418,25
