



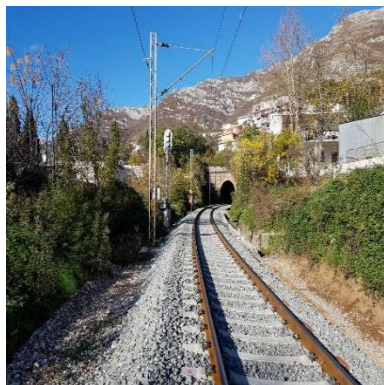

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA**

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA

Za period od 01. 01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine

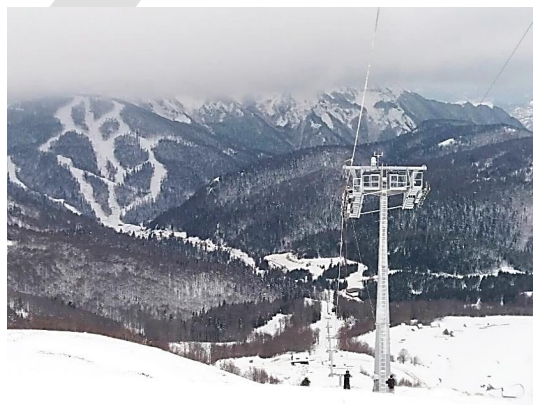

SADRŽAJ

REZIME	6
TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA.....	19
REALIZACIJA PO OBJEKTIMA	39
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA.....	40
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA	
1.1. Izgradnja objekta CANU-a u Podgorici	41
1.2. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	41
1.3. Adaptacija prostora u objektu "Limenska"- zgrada MUP-a CG u Podgorici	42
1.4. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi	42
1.5. Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju	44
1.6. Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova	45
1.7. Izgradnja administrativnog objekta u Petnjici	47
1.8. Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici	48
1.9. Zgrada Skupštine Crne Gore u Podgorici	49
1.10. Rekonstrukcija administrativne zgrade organa lokalne uprave u Andrijevići	50
1.11. Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju	50
1.12. Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici	51
2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE	52
2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola	53
2.2. Rekonstrukcija objekta Centra kulture u Pljevljima	54
2.3. Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	55
2.5. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	57
2.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Centra savremene umjetnosti u Podgorici	57
2.7. Opremanje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	57
2.8. Rekonstrukcija objekta Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	57
2.9. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta	58
3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA.....	59
3.1. Izgradnja objekta Sportske dvorane u Beranama	60
3.4. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru	63
3.5. Rekonstrukcija objekta Doma učenika u Kolašinu	64
3.6. Izgradnja Sportskih terena i sala	64
3.7. Izgradnja sportske sale u Nikšiću	65
3.8. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	65
3.9. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	66
4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE.....	67
4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	68
4.2. Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada	71
4.3. Sanacija deponije na Žabljaku	72
4.5. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	73
4.6. Vodosnabdijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin) gradska opština Tuzi	76
4.7. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	77
4.8. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	78
4.9. Spajanje rijeke Bojane sa kanalom Port Milena u Ulcinju	78
4.10. Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih instalacija za prostor Veliki Pijesak i Utjeha	78
4.11. Postrojenje za prečišćavanje opadnih voda, tretman mulja i ostataka otpada u Podgorici	78
4.12. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	78
4.13. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini	78
4.14. Sanacija odlagališta u Plavu	79
4.15. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	79
4.16. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica – Radetina u Rožajama	79
5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	80

5.1. Rekonstrukcija "Ribarske" ulice u Plavu	81
5.2. Rekonstrukcija ulice "Đeda Vojvodića" u Beranama	81
5.3. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu -II faza	82
5.4. Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice i izvođenje radova	83
5.5. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	83
5.6. Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti u Danilovgradu	90
5.7. Izgradnja gradske pijace u Gusinju i na Cetinju-Njeguši	90
5.8. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	90
5.9. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	91
5.10. Izrada Glavnog projekta i geotehnička ispitivanja za rekonstrukciju puta Bar -Tuđemili -Virpazar, u naselju Kosovići u Baru	92
5.11. Izgradnja infrastrukture za odigravanje MOSI igara u Pljevljima	92
5.12. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	92
5.14. Radovi na produženju obale na Gatu V u Luci Bar	93
5.15. Izgradnja javne garaže na Žabljaku	93
5.16. Izgradnja gradske pijace u Rožajama	93
5.17. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo u Gusinju	93
5.18. Izgradnja sjeverne zaobilaznice "Limski most-Rudopolje-Skič-Korito" u Plavu	94
5.19. Rekonstrukcija Pmjavorske ulice u Plavu	94
5.20. Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica	94
5.21. Uređenje užeg gradskog centra u Plavu	94
5.22. Uređenje korita rijeke Ibar	94
6. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA	95
6.1. Rekonstrukcija prostora za HLA (Humani Leukocitni Antigeni - Tipizacija tkiva) laboratoriju i HLA tipizaciju u Crnoj Gori u Podgorici	96
6.2. Rekonstrukcija energetskog bloka-trafo stanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	96
6.3. Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	96
7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA	97
7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici	98
7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću	99
7.3. Izgradnja objekta i potrebne infrastr. za objekte za soc. ugrožene kategorije stanovništva	99
8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE	100
8.1. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	101
8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	106
8.4. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta OŠ u Karabuškom polju, Tuzi	107
8.5. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta UCG u Podgorici	107
8.6. Izgradnja objekta srednje stručne škole u Golubovcima, Gradska opština Golubovci	108
8.7. Izgradnja objekta OŠ u Gukama, Pljevlja	109
8.9. Izgradnja infrastr. priključaka za potrebe Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama	110
8.10. Izgradnja OŠ u Sukobinu u Ulcinju	112
8.11. Rekonstrukcija toplane UCG na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici	112
8.12. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Igalu u Herceg Novom	112
8.13. Rekonstrukcija aneksa objekta O.Š. u Baču u Rožajama	112
8.14. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	112
8.16. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	115
8.17. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja osnovne škole u Rožajama	115
9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE.....	116
9.1. Ski centar „Kolašin 1600“ u Kolašinu	117
9.2. Ski centar na lokalitetu Čmiljača u Bijelom Polju	120
9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski u Mojkovcu	122

9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama	123
9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor na Žabljaku	123
9.6. Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	125
9.7. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	127
9.8. Izmještanje ikone Bogorodice Filermose na Cetinju	129
9.9. Izgradnja apartmana i restorana u NP „Biogradska gora” u Kolašinu	129
9.10. “Kuća Voća” u Andrijevići	131
9.11. Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	131
9.12. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	132
9.13. Nacionalni parkovi	132
9.14. Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor	133
9.15. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja nacionalnih “Kuća vina” u Podgorici i Baru	133
9.16. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja nacionalne “Kuća maslina” sa sjedištem u Baru	133
9.17. Dom revolucije u Nikšiću- rekonstrukcija i adaptacija	134
9.18. Ski centar Vučje - izgradnja akumulacionog jezera u Nikšiću	134
10. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA	135
10.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	136
10.3. Sanacija odlagališta „Čađe” u Baru	139
10.4. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar-Sutomore	140
10.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice „Trebešica”	140
10.7. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos - Trebešica	142
10.8. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	142
11. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA BAR – BOLJARE.....	143
11.1. Državna komisija za tehnički pregled autoputa Bar-Boljare prioritetne dionice Smokovac – Uvač - Mateševo	144
12. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	145
11.1. Dom starih u Pljevljima	146
12.2. Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici	146
	147

REZIME

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu utvrđen je Kapitalni budžet Direkcije javnih radova u iznosu od 58.878.600€.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Kapitalni budžet umanjen je za 12.500.000 €.


Zaključcima Vlade Crne Gore br. 07-3634 od 30.11.2017. i br. 07-3754 od 07.12.2017. godine, odobreno je preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova u iznosu od 2.000.000 € sa Programa: Unapređenje turističke ponude na potrošačku jedinicu Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcije za saobraćaj na program Izdaci za lokalnu infrastrukturu.

Takođe, Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-4145 od 28. decembra 2017. godine odobreno je preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstva finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkciju javnih radova u iznosu od 4.933.933,39 € na program: Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova.

Nakon izvršenih izmjena, sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2017. godinu iznosila su 49.312.533,39 € .

Svi projekti Kapitalnog budžeta, kao što je definisano Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom opredijeljena su sredstva na sledeći način:

SREDSTVA OBEZBIJEĐENA REBALANSOM KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2017. GODINU

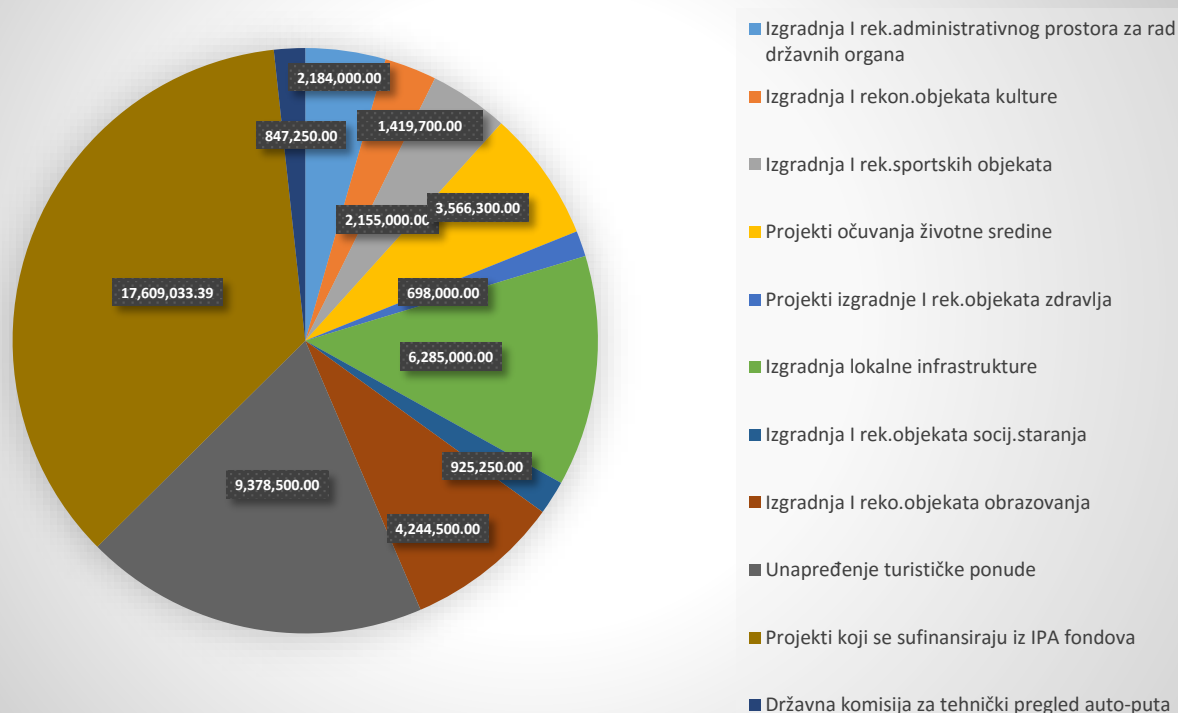

Realizacija Kapitalnog budžeta

	Obezbijeđeno (€)	Realizovano (€)	Realizacija (%)
Ukupna sredstva obezbijedena Kapitalnim budžetom	49.312.533,39	50.280.153,79	102
Sredstva obezbijedena za realizaciju IPA projekata	17.609.033,39	18.420.517,95	105
Sredstva obezbijedena za realizaciju kapitalnih projekata	31.703.500,00	31.856.300,24	101

Sredstva realizovana iz Kapitalnog budžeta (€)	50.280.153,79
Sredstva realizovana kroz RHP program (€)	4.409.418,21
Sredstva realizovana kroz CEB program (€)	1.671.057,71
Ukupna sredstva realizovana od strane DJR (€)	56.357.294,11

Direkcija javnih radova sprovodi aktivnosti na realizaciji 76 projekata koji se finansiraju iz sljedećih izvora:

- opšti prihod - 55 projekata,
- opšti prihod uz sufinansiranje - donacije stranih Vlada i organizacija - 6 projekta,
- bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa, kreditnih sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda - 1 projekat,
- bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa, uz sufinansiranje iz opštih prihoda - 7 projekta,
- kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope, uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a - 7 projekata - projekti Dječijih vrtića (projekat izgradnje Dječijeg vrtića u Zagoriču u Podgorici je završen u 2016. godini).

U članu 12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

1. Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciona mreža i vodosnabdijevanje

2. Kredit Razvojne banke Savjeta evrope (CEB) za projekte:

- Dječiji vrtić na Starom aerodromu u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Baru,
- Dječiji vrtić u Ulcinju,
- Dječiji vrtić u Pljevljima,
- Dječiji vrtić u Bloku VI u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Tuzima,
- Rekonstrukcija vrtića.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu u članu 14 propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

1. Donacije stranih Vlada i organizacija:

- Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici
- Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP na Cetinju
- Sanacija deponije na Žabljaku
- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini
- Sanacija odlagališta u Plavu
- Izgradnja O.Š. u Sukobinu, Ulcinj


2. Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa:

- Za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja, sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada, projekte željezničke infrastrukture i projekte iz oblasti tehničke pomoći.


Prilikom izrade Kapitalnog budžeta vođeno je računa o ravnomjernom regionalnom razvoju zbog čega je akcenat stavljen na realizaciju projekata u sjevernom dijelu Crne Gore.

U 2017. godini sredstva iz Kapitalnog budžeta za 2017.godinu utrošena su po regionima na sledeći način:

Sredstva utrošena po regionima

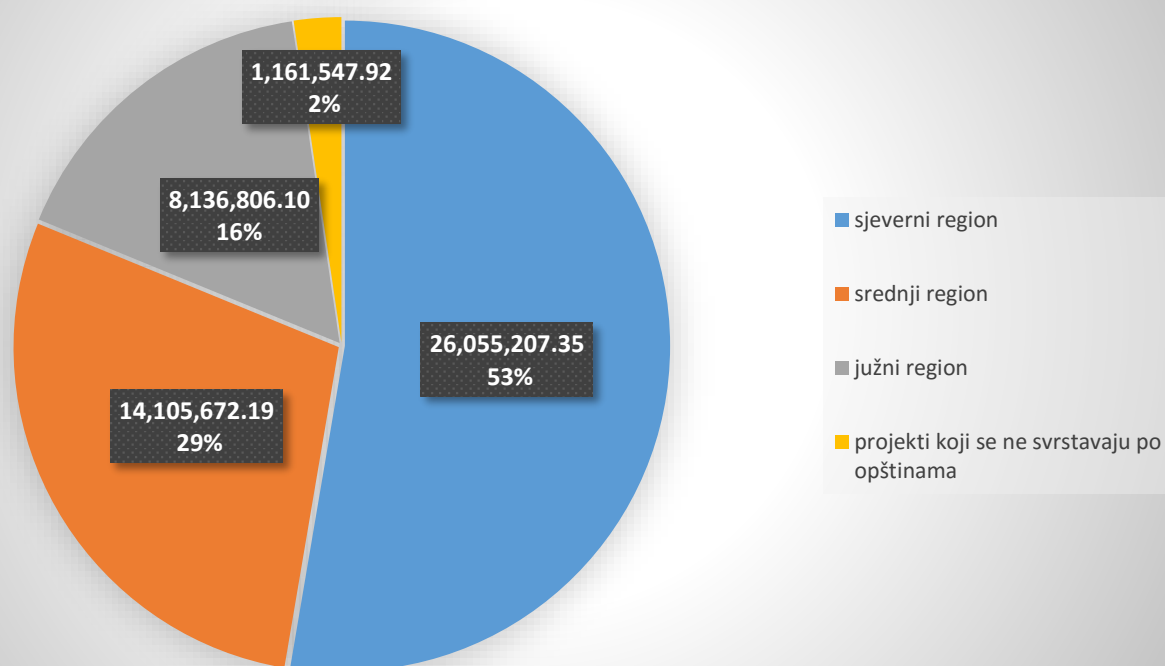


PRIKAZ UTROŠENIH SREDSTAVA PO OPŠTINAMA U 2017.GODINI

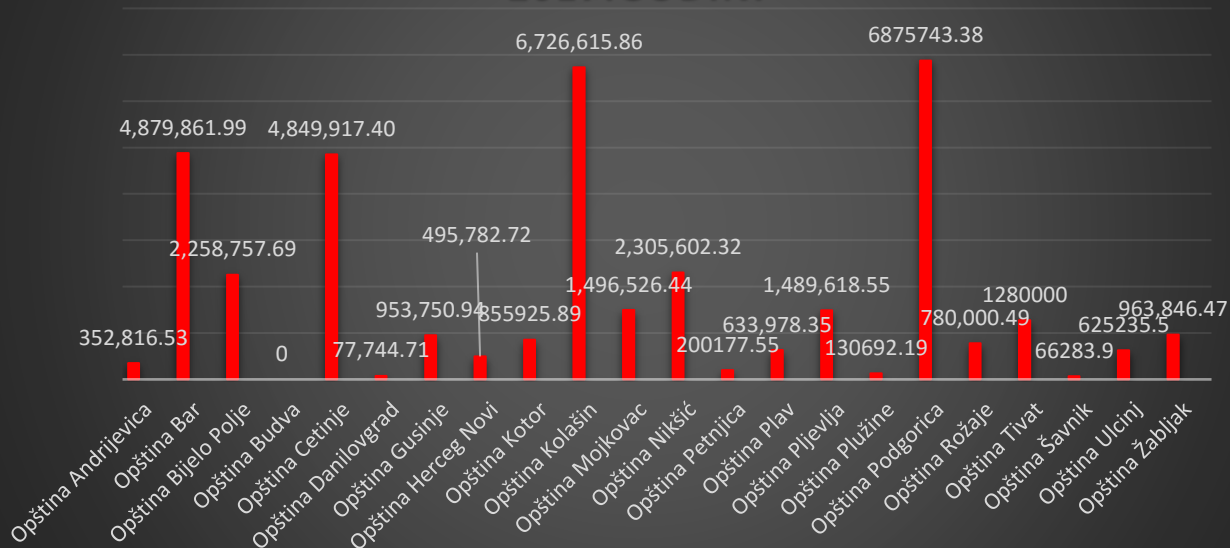

	UKUPNA PLAĆANJA PO OPŠTINAMA	REALIZOVANO OD 01.01. DO 31.12.2017. godine(€)
1.	Opština Andrijevica	352,816.53
2.	Opština Bar	4,879,861.99
3.	Opština Berane	10,002,142.39
4.	Opština Bijelo Polje	2,258,757.69
5.	Opština Budva	0
6.	Opština Cetinje	4,849,917.40
7.	Opština Danilovgrad	77,744.71
8.	Opština Gusinje	953,750.94
9.	Opština Herceg-Novi	495,782.72
10.	Opština Kotor	855,925.89
11.	Opština Kolašin	6,726,615.86
12.	Opština Mojkovac	1,496,526.44
13.	Opština Nikšić	2,305,602.32
14.	Opština Petnjica	200,177.55
15.	Opština Plav	633,978.35
16.	Opština Pljevlja	1,489,618.55
17.	Opština Plužine	130,692.19
18.	Opština Podgorica	6,875.743,38
19.	Opština Rožaje	780,000.49
20.	Opština Tivat	1,280,000.00
21.	Opština Šavnik	66,283.90
22.	Opština Ulcinj	625,235.50
23.	Opština Žabljak	963,846.47
	Projekti IPA-e koji se ne svrstavaju po opštinama, a odnose se na usluge i robe	1,096,485.67
	Projekti KB koji se ne svrstavaju po opštinama	65,062.25
	Državna komisija za tehnički pregled autoputa	817,584.61
	UKUPNO realizovano u 2017.:	50,280.153,79

Ukupan broj projekata i podprojekata koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta, uključujući i projekte iz kumulativnih pozicija iznosi 248.

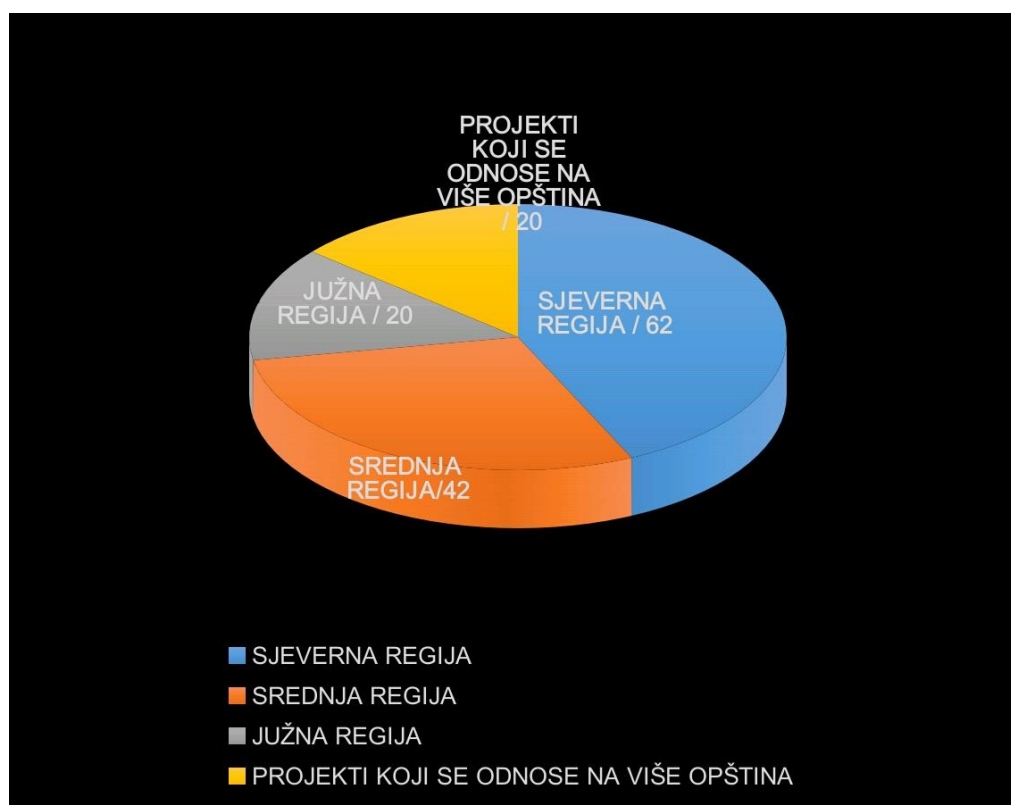

Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlaštenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava u 2017. godini donijela sljedeće Zaključke koji se odnose na rad Direkcije javnih radova:

1. Zaključak br. 07-2514 od 27. jula 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova planira sredstva u Kapitalnom budžetu za 2018. godinu u iznosu do 1.395.000.00 €, u 2019. godini, sredstva u iznosu do 1.500.000,00 € i u 2020. godini sredstva u iznosu do 1.500.000,00 €, na ime kofinansiranje projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju.

2. Zaključak br. 07-3458 od 16. novembra 2017. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2985, od 5. oktobra 2017.godine i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane, Opština Ulcinj. Zadužuje se Direkcija javnih radova da u tekućoj godini, kapitalnim budžetom obezbijedi sredstva za navedene aktivnosti u iznosu od 200.000,00€

3. Zaključak br. 07-3634/2 od 30. novembra 2017. godine

1. Vlada je usvojila Informacije o sprovođenju Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2631, od 31.08.2017. godine, sa sjednice od 24.08.2017.godine.

2. Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u iznosu od 1.000.000,00€, i to:

- s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova (organizacioni kod 41501)

Sa Programa: 826 – Unapređenje turističke ponude

Sa pozicije 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od 1.000.000,00€

Na potrošačku jedinicu Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj (organizacioni kod 41001)

na Program: 761- Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

na poziciju: 4411 – Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, u iznosu od 1.000.000,00€

4. Zaključak br.: 07-3761 od 7. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da uštede sa Programa : 812-Projekti očuvanja životne sredine, s pozicije 4412-izdaci za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 650.000,00 € i Programa 806- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata s pozicije 4413-Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 630.000,00 € prenese opštini Tivat za realizaciju projekta izgradnje lokalnog puta MR1 u opštini Tivat.

5. Zaključak br. 07-3762 od 14. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da sa Programa 812- Projekti očuvanja životne sredine sa izdatka 4412-Izdaci za lokalnu infrastrukturu izvrše prenos sredstava na žiro račun Opštine Plav u iznosu od 500.000,00 €

6. Zaključak br. 07-3763 od 14. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da s Programa: 812 – Projekti očuvanja životne sredine sredstva u iznosu 43.568, 01€ i s Programa. 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture, sa izdataka: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu sredstava u iznosu od 55.994, 00€, prenese na žiro račun Opštine Rožaje.

7. Zaključak br. 07-3764 od 14. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da sa Programa: 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture, sa izdatka: 4412 – Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu, sredstva u iznosu od 70.000,00€ prenese na žiro račun Opštine Gusinje.

8. Zaključak br. 07-3765 od 14. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da s Programa,: 818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva sa izdataka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte izvrši prenos sredstava na žiro račun Izvođača radova „Unipred“ d.o.o. Bijelo Polje, po Ugovoru br. 406-3/2016-15, od 26.07.2016. godine, zaključenim s Opštinom Pljevlja u iznosu do 387.500,00€, a na osnovu ovjerenih i dostavljenih situacija od strane Opštine Pljevlja.

9. Zaključak br. 07-4016 od 21. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da iz ušteda po Programu: 41501-819- Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja“, projekat „Izgradnja doma starih u Podgorici“, s pozicije: 4413- Izdaci za građevinske objekte, sredstva u iznosu od 349.801,00€, prenese na žiro račun Opštine Pljevlja.

10. Zaključak br. 07-4017 od 21. Decembra 2017. godine

Vlada je usvojila informaciju o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekata izgradnje novog cjevovoda na putu Vladimir Krute – Ulcinj.

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da iz ušteda po program 41501-812 - „Projekti očuvanja životne sredine“, projekat „Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja“, s pozicije 4413 – izdaci za građevinske objekte, sredstva u iznosu od 256.850,00€, prenese na žiro račun Opštine Ulcinj.

11. Zaključak br. 07-4078 od 25. decembra 2017. godine

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da, shodno odredbama člana 46 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, iz uštede na drugim programima, u iznosu od 1.958.000,00 € može plaćati obaveze prema Izvođačima radova za projekte iz Programa: Unapređenje turističke ponude(programski kod 41501-826) i izgradnja lokalne infrastrukture (programski kod 41501-810) i to:

S Programa: Unapređenje turističke ponude (programski kod 41501-826) sredstva u ukupnom iznosu od 975.000,00 € i to sa pozicije 4413- Izdaci za građevinske objekte u iznosu 700.000,00 € i sa pozicije 4147-Izdaci za konsultantske usluge i projektovanje u iznosu od 275.000,00 €

S Programa: Projekti očuvanja životne sredine(programski kod 41501-812) sredstva u ukupnom iznosu od 409.000,00 € i to sa pozicije 4413-Izdaci za građevinske objekte

S Programa Izgradnje lokalne infrastrukture (programski kod 41501-810) sredstva u ukupnom iznosu od 574.000,00 € i to sa pozicije 4413-Izdacio za građevinske objekte u iznosu od 494.000,00 € i s apozicije 4147- Izdaci za konsultantske usluge i projektovanje u iznosu od 80.000,00 €

12. Zaključak br. 07-4079 od 25. decembra 2017. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da sredstva opredijeljena u okviru Programa: Izrada, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture (programski kod 41501-805) za projekat Rekonstrukcija objekta „ Dvorac Kralja Nikole“ u Bikšiću, sa pozicije: 4147- Izdaci za konsultantske usluge i projekte u iznosu od 5. 000,00 € i sa pozicije: 4413 – Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 125.000,00 €, prenese na žiro račun Opštine Nikšić.

13. Zaključak br. 07-4145 od 28. decembra 2017. godine

1. Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava, u iznosu 4.933.933,39 eura I to:

- s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija (organizacioni kod 40501) s Programa: Upravljanje budžetom (programski kod 1711) sa izdataka: 4162-Kamate nerezidentima, tako što se umanjuju za iznos od 4.933.933.398 eura
- na potrošačku jedinicu Ministarstvo održivog razvoja i turizma (organizacioni kod 41501)
- na Direkciju javnih radova
- na Program: Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova (programski kod 829)
- na izdatak: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu, tako što se sredstva uvećavaju za iznos: 4.434.744,78 eura
- na izdatak: 4149 – Ostale usluge, tako što se sredstva uvećavaju za iznos 88.743,38 eura.

2. Zadužuje se Direkcija javnih radova da iz preusmjerenih sredstava izvrši dospjele obaveze po osnovu Ugovora zaključenih u okviru IPA komponente III OP Regionalni razvoj.

14. Zaključak br. 07-4148 od 28. decembra 2017. godine

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direkcije javnih radova da, shodno odredbama člana 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, iz uštede na drugim programima, u iznosu do 1.238.000,00 €, može plaćati obaveze prema izvodjaču radova za projekat Ski centar „Kolašin 1600“ iz Programa: 41501-826 Unapredjenje turističke ponude, I to:

S Programa: 818 – izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja sa izdatka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte, iznos od 327.000,00 €

S Programa: 819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja sa izdatka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte, iznos od 331.000,00€

S Programa: 821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja sa izdataka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte, iznos od 343.000,00€ sa izdataka: 4147 – Konsultantske usluge, projekti i studije, iznos od 237.000,00€

Kroz Kapitalni budžet Direkcija javnih radova realizuje i projekte obuhvaćene Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj“ koji se finansiraju 85% iz EU fondova i 15% iz Kapitalnog budžeta, kao i projekte Regionalnog stambenog programa – RHP koji nijesu finansijski prepoznati kroz Kapitalni budžet s obzirom na to da se finansiraju kroz fond osnovan pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora.

Crna Gora je krajem aprila 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj“, a u decembru 2014. godine je potpisan finansijski sporazum, što je stvorilo uslove da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture.

U 2015. godini otpočelo se sa realizacijom projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj“ i na osnovu dokumentacije dostavljene od strane korisnika i nadležnih institucija, Direkcija javnih radova je pristupila pripremi tenderske dokumentacije i raspisivanju međunarodnih javnih nadmetanja u skladu sa PRAG pravilima. Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12 €, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja sredstava za koja je krajnji rok bio 31. decembar 2015. godine.

Zajednički regionalni program o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljena lica (Regionalni stambeni program – RHP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Cilj regionalne inicijative je da doprinese rješavanju produžene raseljenosti najugroženijih izbjeglica i raseljenih lica nakon konflikta 1991.-1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori iz 1999. godine, između ostalog kroz pružanje trajnih stambenih rješenja.

Razvojna Banka Savjeta Evrope (CEB - Council of Europe Development Bank) je za RHP osnovala fond pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora. U svojstvu finansijske institucije, CEB između ostalog isplaćuje investicione grantove za subvencije iz sredstava RHP fonda Partnerskim zemljama za finansiranje potprojekata u sklopu Stambenih projekata za zemlju koji ispunjavaju određene kvalifikacione kriterijume, a nakon odluke Skupštine donatora.

Prema potpisanom Implementacionom sporazumu, čija revizija predstoji u narednom periodu, RHP u Crnoj Gori ima za cilj da obezbijedi dugotrajno rješenje stambenog pitanja za 1.177 izbjeglih porodica (6.063 osoba), koje su prema kriterijima UNHCR prepoznate kao najranjivije. Doprinos Crne Gore ogleda se prvenstveno u dodjeli zemljišta i obezbjeđivanju primarne infrastrukture.

Procijenjeni troškovi Programa:

- Ukupna vrijednost projekta: 27.696.000 eura;
- Donatorska sredstva: (85 %), tj. 23.542.000 eura;
- Kontribucija države (Ministarstvo i opštine): (min 15%), tj. 4.154.000 eura (kroz obezbjeđivanje lokacije, infrastrukture, tehničko-projektne dokumentacije);

Vlada Crne Gore je na sjednici od 9. aprila 2015. godine umjesto PROCON-a zadužila Direkciju javnih radova, da u saradnji sa menadžerskim timom Ministarstva rada i socijalnog staranja, implementira Regionalni stambeni program.

Sporazumom o implementaciji o donaciji definisano je da se sve procedure u okviru ovog programa sprovode u skladu sa Vodičem za nabavku dobara, radova i usluga Banke za razvoj Savjeta Evrope i Priručnikom za nabake.

U prethodnom periodu Direkcija javnih radova je završila aktivnosti na izgradnji stambenog objekta u Nikšiću sa 62 stambene jedinice, kao i radove na izgradnji 12 stambenih objekata sa 120 stambenih jedinica na lokaciji Kamp Koniku u Podgorici. Za realizovane objekte pribavljena je upotrebna dozvola i objekti su predati korisnicima na upotrebu.

U toku su radovi na izgradnji 5 stambenih objekata sa 51 stambenom jedinicom na lokaciji Kamp Konik u Podgorici.

U toku je infrastrukturno priključenje i priprema za tehnički pregled objekta Doma za stara lica u Pljevljima sa 37 smještajnih jedinica.

U toku je izgradnja 4 stambena objekta u Beranama sa 94 stambene jedinice.

Zaključno sa 31.decembrom 2017. godine Direkcija javnih radova je u okviru RHP programa realizovala 4.409.418,21 €.

Direkcija javnih radova je , zaključno sa 31.12.2017. godine , sprovela 176 postupaka javnog otvaranja ponuda i sklopila 163 ugovora i to:

- 70 ugovora za izvođenje radova
- 56 ugovora za vršenje stručnog nadzora
- 13 ugovora za izradu projektne dokumentacije
- 8 ugovora za reviziju projektne dokumentacije
- 14 ugovora za vršenje usluga
- 2 ugovora za nabavku opreme

Od navedenih ugovora 9 ugovora sklopljeno je u okviru IPA III programa i to:

- 1 ugovor za izvođenje radova
- 1 ugovor za vršenje stručnog nadzora
- 5 ugovora za usluge
- 2 ugovora za opremanje

Ukupna vrijednost svih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.2017. godine zaključno sa 31.12.2017. godine iznosi 51.456.213.85 €.



Direkcija javnih radova je zaključno sa 31.12.2017. godine, objavila 267 postupaka javnih nabavki čija ukupna vrijednost iznosi 82.768.500,00 €.




Jedan od problema sa kojima se Direkcija javnih radova suočava prilikom realizacije Kapitalnog budžeta jeste i dostavljanje nepotpune dokumentacije od strane korisnika budžeta neophodne za stvaranje uslova za kandidovanje projekta za finansiranje iz Kapitalnog budžeta (neizrađena planska i projektna dokumentacija, nedostatak saglasnosti i građevinskih dozvola, neobezbijedena lokacija, neriješeni imovinsko – pravni odnosi, i dr.)

U 2017. godini kroz Kapitalni budžet obezbijedena su sredstva u ukupnom iznosu od 49.312.533,39 € od čega je do 31.12.2017. godine realizovano 50.276.818,17 € što iznosi 101,95 % Kapitalnog budžeta.


Realizacija KB na 30.06.2017.

9,68%

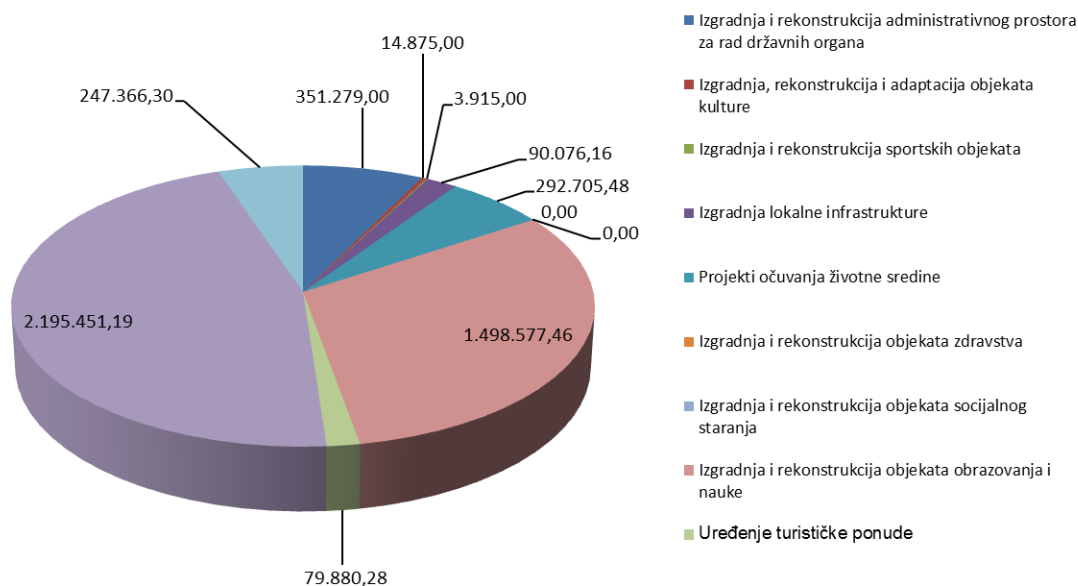

REALIZACIJA KB NA 31.12.2017.GODINE

101,95%

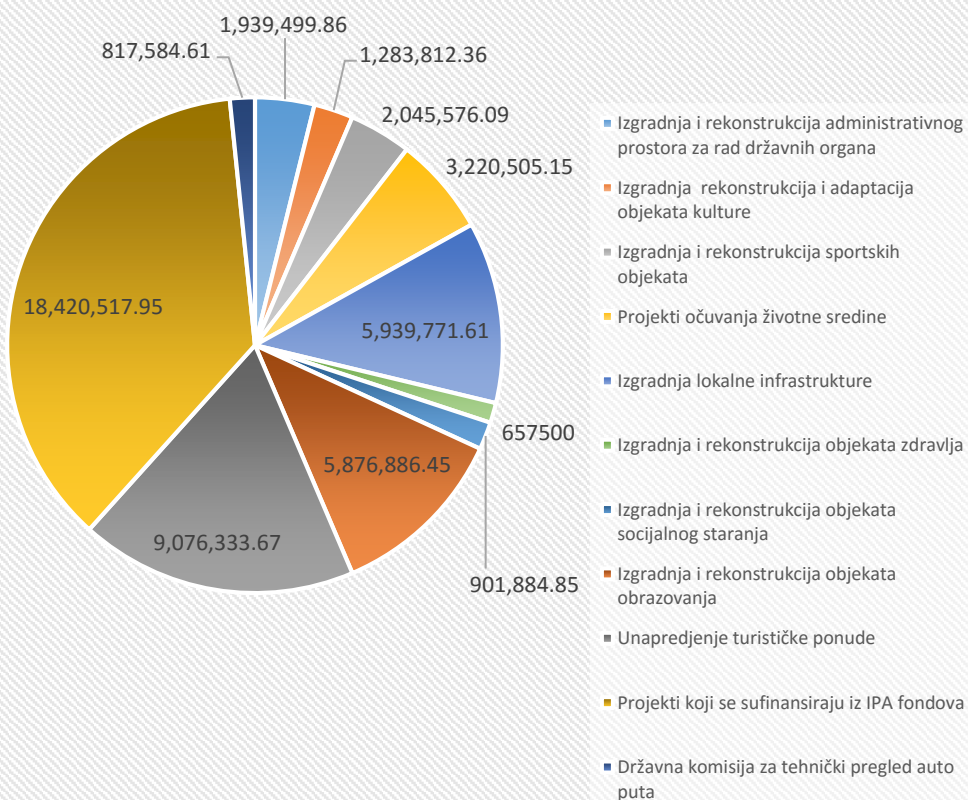


Tabelarni prikaz potrošnje sredstava po programima


PROGRAM	KAPITALNI BUDŽET (EUR)	REALIZACIJA Stanje na 30.06.2017.	Realizacija u odnosu na godišnji KB (%)	REALIZACIJA Stanje na 31.12.2017.	Realizaci ja u odnosu na godišnji KB (%)
1	2	3	4	5	6
Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	2.184.000	351.279	16	1.939.499,86	89
Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	1.419.700	14.875	1	1.384.093,55	97
Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	2.155.000	3.915	0,2	2.045.576,09	95
Izgradnja lokalne infrastrukture	6.285.000	90.076,16	1,5	5.939.771,61	94
Projekti očuvanja životne sredine	3.566.300	292.705,48	8,2	3.220.505,15	90
Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	698.000	0	0	657.500	94
Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	925.250	0	0	901.884,85	97
Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke	4.244.500	1.498.577,46	35	5.876.886,45	138
Uređenje turističke ponude	9.378.500	79.880,28	0,8	9.076.333,67	97
Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	17.609.033,39	2.195.451,19	13	18.420.517,95	104
Državna komisija za auto put Bar- Boljare	847.250	247.366,30	29	817.584,61	96
UKUPNO	49.312.533,39	4.774.125,87	10	50.280.153,79	102

GRAFIČKI PRIKAZ REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2015.,2016. I 2017.GODINU


REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA 2015.GODINE




REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA 2016.GODINE



REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA 2017.GODINE

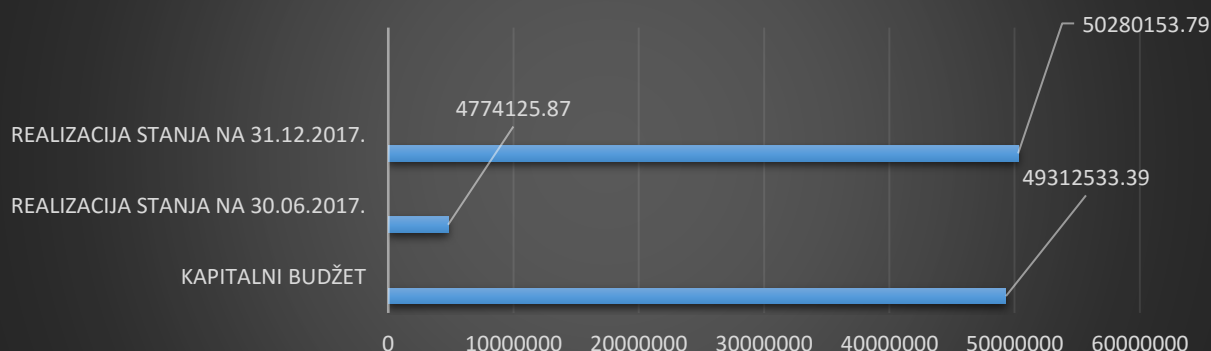

PROCENTUALNI PRIKAZ REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2015.,2016. I 2017. GODINU



TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA
za period od 01. 01. 2017. god. do 31.12.2017. godine

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2017. GODINU			Izvori finansiranja	REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2017.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	262.000,00	1.922.000,00	2.184.000,00		126.481,94	1.813.017,92	1.939.499,86
1.1.	Izgradnja objekta CANU-a u Podgorici	45.000,00	5.000,00	50.000,00	Opšti prihodi Donacija 1,000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Opšti prihodi Donacija 1,000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Adaptacija prostora u objektu "Limenka" - zgrada MUP-a CG u Podgorici	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
1.4.	Akcionni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	55.000,00	1.080.000,00	1.135.000,00	Opšti prihodi	41.634,24	1.079.826,73	1.121.460,97
1.5.	Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju	15.000,00	170.000,00	185.000,00	Opšti prihodi	5.982,88	169.961,50	175.944,38
1.6.	Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Krenzi i Zoganjama	10.000,00	110.000,00	120.000,00	Opšti prihodi	4403,00	273.842,17	278.245,17
1.7.	Izgradnja administrativnog objekta u Petnjici	10.000,00	154.000,00	164.000,00	Opšti prihodi	5.287,50	110.024,75	115.312,25
1.8.	Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici	50.000,00	0,00	50.000,00	Opšti prihodi	42.338,06	0,00	42.338,06
1.9.	Zgrada Skupštine Crne Gore u Podgorici	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Opšti prihodi	0,00	19.032,66	19.032,66
1.10.	Rekonstrukcija administrativne zgrade organa lokalne uprave u Andrijevi	2.000,00	48.000,00	50.000,00	Opšti prihodi	1904,00	35.877,99	37.781,99
1.11.	Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju	5.000,00	125.000,00	130.000,00	Opšti prihodi	493,85	124.452,12	124.945,97

1.12.	Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici	40.000,00	0,00	40.000,00	Opšti prihodi	24.438,41	0,00	24.438,41
2	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	124.000,00	1.295.700,00	1.419.700,00		100.281,19	1.283.812,36	1.384.093,55
2.1.	Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici	45.000,00	845.700,00	890.700,00	Opšti prihodi	44.999,99	844.639,85	889.639,84
2.2.	Rekonstrukcija objekta Centra kulture u Pljevljima	0,00	220.000,00	220.000,00	Opšti prihodi	0,00	219.647,29	219.647,29
2.3.	Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR- a na Žabljaku	2.000,00	95.000,00	97.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	2.000,00	94.525,22	96.525,22
2.4.	Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP na Cetinju	50.000,00	5.000,00	55.000,00	Opšti prihodi	44.625,00	0,00	44.625,00
2.5.	Rekonstrukcija objekta "Zetski dom" na Cetinju	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
2.6.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Centra savremene umjetnosti u Podgorici	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
2.7.	Opremanje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
2.8.	Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	5.000,00	125.000,00	130.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	5.000,00	125.000,00	130.000,00
2.9.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta	7.000,00	0,00	7.000,00	Opšti prihodi	3.656,20	0,00	3.656,20
3	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	135.500,00	2.019.500,00	2.155.000,00		43.800,43	2.001.775,66	2.045.576,09
3.1.	Izgradnja objekta Sportske dvorane u Beranama	50.000,00	334.500,00	384.500,00	Opšti prihodi	16.584,11	333.569,79	350.153,90
3.2.	Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00

3.3.	Izgradnja i rekonstrukcija fudbalskih terena	10.000,00	210.000,00	220.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	4.760,00	196.891,39	201.651,39
3.4.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena u Kotoru	20.000,00	800.000,00	820.000,00	Opšti prihodi	21.391,27	796.698,57	818.089,84
3.5.	Rekonstrukcija objekta Doma učenika u Kolašinu	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
3.6.	Izgradnja sportskih terena i sala	10.000,00	45.000,00	55.000,00	Opšti prihodi	0,00	44.615,91	44.615,91
3.7.	Izgradnje sportske sale u Nikšiću	20.000,00	0,00	20.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
3.8.	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska U Nikšiću	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	10.500,00	0,00	10.500,00	Opšti prihodi	1.065,05	0,00	1.065,05
3,10	Lokalni put MR-Tivat Odluka Vlade	0,00	630.000,00	630.000,00	Opšti prihodi	0,00	630.000,00	630.000,00
4	Projekti očuvanja životne sredine	681.000,00	2.885.300,00	3.566.300,00		379.405,85	2.841.099,30	3.220.505,15
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje	350.000,00	510.000,00	860.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	347.491,58	508.167,20	855.658,78
4.2.	Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada	86.000,00	110.000,00	196.000,00	Opšti prihodi	3.200,00	106.904,05	110.104,05
4.3.	Sanacija deponije na Žabljaku	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	1.481,55	0,00	1.481,55
4.4.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	20.000,00	0,00	20.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
4.5.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	50.000,00	600.000,00	650.000,00	Opšti prihodi	9.163,00	592.010,14	601.173,14
4.6.	Vodosnadbijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin), Gradska opština Tuzi u Podgorici	10.000,00	200.000,00	210.000,00	Opšti prihodi	5.355,00	200.000,00	205.355,00

4.7.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	50.000,00	300.000,00	350.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0,00	297.190,78	297.190,78
4.8.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	50.000,00	455.300,00	505.300,00	Opšti prihodi	10.148,72	453.827,13	463.975,85
4.9.	Spajanje rijeke Bojane sa kanalom Port Milena, Ulcinj	0,00	5.000,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
4.10.	Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih instalacija za prostor Veliki Pijesak i Utjeha, Ulcinj	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
4.11.	Postrojenje za prečišćavanje opadnih voda, tretman mulja i zbrinjavanje ostataka otpada u Podgorici	0,00	5.000,00	5.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.13.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini	10.000,00	25.000,00	35.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	30,50	15.250,00	15.280,50
4,14	Sanacija odlagališta u Plavu	10.000,00	25.000,0	35.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	35,50	17.750,00	17.785,50
4.15.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	10.000,00	0,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
4.16.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina, Rožaje	20.000,00	0,00	20.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
4,17	Lokalni put MR-Tivat Odluka Vlade	0,00	650.000,00	650.000,00	Opšti prihodi	0,00	650.000,00	650.000,00
5	Izgradnja lokalne infrastrukture	255.000,00	6.030.000,00	6.285.000,00		185.951,07	5.753.820,54	5.939.771,61
5.1.	Rekonstrukcija "Ribarske ulice" u Plavu	0,00	64.000,00	64.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.2.	Rekonstrukcija ulice "Đeda Vojvodića" u Beranama	10.000,00	291.000,00	301.000,00	Opšti prihodi	8.261,86	290.573,15	298.835,01
5.3.	Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu II faza	10.000,00	238.000,00	248.000,00	Opšti prihodi	5.517,25	237.841,20	243.358,45

5.4.	Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice i izvođenje radova	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.5.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	85.500,00	4.227.000,00	4.315.500,00	Opšti prihodi	81.127,59	4.170.561,48	4.251.689,07
5.5.1.	Lokalni putevi km	35.000,00	1.526.000,00	1.561.000,00	Opšti prihodi	31.559,70	1.511.287,66	1.542.847,36
5.5.2.	Gradske saobraćajnice	53.500,00	2.701.000,00	2.754.500,00	Opšti prihodi	49.567,89	2.659.273,82	2.708.841,71
5.5.2.1	Gradske saobraćajnice u Bijelom Polju	13.000,00	300.000,00	313.000,00	Opšti prihodi	12.993,91	298.254,99	311.248,90
5.5.2.2	Gradske saobraćajnice u Plavu	1.000,00	50.000,00	51.000,00	Opšti prihodi	0,00	45.383,92	45.383,92
5.5.2.3	Gradske saobraćajnice u Andrijevici	1.000,00	70.000,00	71.000,00	Opšti prihodi	800,00	67.398,93	68.198,93
5.5.2.4	Gradske saobraćajnice u Pljevljima	0,00	126.000,00	126.000,00	Opšti prihodi	0,00	125.506,62	125.506,62
5.5.2.5	Gradske saobraćajnice u Šavniku	1.000,00	4.000,00	5.000,00	Opšti prihodi	416,50	0,00	416,50
5.5.2.6	Gradske saobraćajnice u Cetinju	5.000,00	984.000,00	989.000,00	Opšti prihodi	4.720,00	983.688,90	988.408,90
5.5.2.7	Gradske saobraćajnice u Nikšiću	18.000,00	1.055.000,00	1.073.000,00	Opšti prihodi	17.388,08	1.054.812,96	1.072.201,04
5.5.2.8	Gradske saobraćajnice u Ulcinju	0,00	10.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.5.2.9	Gradske saobraćajnice u Baru	2.000,00	1.000,00	3.000,00	Opšti prihodi	1.142,00	0,00	1.142,00
5.5.2.10	Gradske saobraćajnice u Podgorici	7.000,00	1.000,00	8.000,00	Opšti prihodi	6.677,40	0,00	6.677,40
5.5.2.11	Gradske saobraćajnice u Danilovgrad	0,00	15.000,00	15.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.5.2.12	Gradske saobraćajnice u Žabljaku	3.000,00	42.000,00	45.000,00	Opšti prihodi	2.930,00	41.333,45	44.263,45
5.5.2.13	Gradske saobraćajnice u Beranama	0,00	0,00	0,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.5.2.14	Gradske saobraćajnice u Kolašinu	0,00	43.000,00	43.000,00	Opšti prihodi	0,00	42.894,05	42.894,05

5.5.2.15	Gradske saobraćajnice u Mojkovcu	2.500,00	0,00	2.500,00	Opšti prihodi	2.500,00	0,00	2.500,00
5.5.2.16	Gradske saobraćajnice u Rožajama	0,00	0,00	0,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.5.2.17	Gradske saobraćajnice u Petnjici	0,00	0,00	0,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.6.	Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti u Danilovgradu	13.000,00	55.000,00	68.000,00	Opšti prihodi	12.691,00	0,00	12.691,00
5.7.	Izgradnja gradske pijace u Gusinju i Njegušima	13.000,00	242.000,00	255.000,00	Opšti prihodi	12.156,20	241.854,56	254.010,76
5.8.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	7.000,00	417.000,00	424.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	6.761,50	416.961,99	423.723,49
5.9.	Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	4.998,00	0,00	4.998,00
5.10.	Izrada Glavnog projekta i geotehnička ispitivanja za rekonstrukciju puta Bar -Tudemili - Virpazar, u naselju Kosovići, Bar	3.500,00	0,00	3.500,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.11	Izgradnja infrastrukture za odigravanje MOSI igara u Pljevljima	45.000,00	163.000,00	208.000,00	Opšti prihodi	44.457,67	130.251,95	174.709,62
5.12.	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	3.000,00	89.000,00	92.000,00	Opšti prihodi	0,00	88.653,64	88.653,64
5.13.	Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju	6.000,00	9.000,00	15.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.14.	Radovi na produženju obale na Gat V u Luci Bar	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.15.	Izgradnja javne garaže na Žabljaku	1.000,00	5.000,00	6.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.16.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	10.000,00	7.000,00	17.000,00	Opšti prihodi	9.980,00	0,00	9.980,00
5.17.	Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	1.000,00	182.000,00	183.000,00	Opšti prihodi	0,00	177.122,57	177.122,57
5.18.	Izgradnja sjeverne zaobilaznice "Limski most-Rudopolje-Skič-Korito" u Plavu	5.000,00	9.000,00	14.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00

5.19.	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.20.	Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.21.	Uređenje uzeg gradskog centra u Plavu	10.000,00	0,00	10.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
5.22.	Uređenje korita rijeke Ibar	4.000,00	12.000,00	16.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
6	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	40.000,00	658.000,00	698.000,00		0,00	657.500,00	657.500,00
6.1.	Rekonstrukcija prostora za HLA (Humani Leukocitni Antigeni - Tipizacija tkiva) laboratoriju i HLA tipizaciju u Crnoj Gori, Podgorica	5.000,00	6.000,00	11.000,00	Opšti prihodi	0,00	5.948,81	5.948,81
6.2.	Rekonstrukcija energetskog bloka TS i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore	0,00	0,00	0,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
6.3.	Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	15.000,00	264.500,00	279.500,00	Opšti prihodi	0,00	264.055,76	264.055,76
6.4	Zaključak Vlade 07- 3765- Dom culture - Pljevlja	20.000,00	387.500,00	407.500,00	Opšti prihodi	0,00	387.495,43	387.495,43
7	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	25.000,00	900.250,00	925.250,00		4.950,00	896.934,85	901.884,85
7.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	10.000,00	810.250,00	820.250,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0,00	807.389,85	807.389,85
7.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću	10.000,00	0,00	10.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Izgradnja objekta i potrebne infrastrukture za objekte za socijalno ugrožene kategorije stanovništva	5.000,00	90.000,00	95.000,00	Opšti prihodi	4.950,00	89.545,00	94.495,00
8	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	483.500,00	3.761.000,00	4.244.500,00		514.842,03	5.362.044,42	5.876.886,45

8.1.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	45.000,00	1.080.000,00	1.125.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	42.536,31	1.077.651,86	1.120.188,17
8.2.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a	35.500,00	324.000,00	359.500,00	Opšti prihodi kredit 8.000,00	70.356,07	1.934.812,61	2.005.168,68
8.2.1.	Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	4.000,00	321.000,00	325.000,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	17.139,62	1.934.812,64	1.951.952,23
8.2.2.	Vrtić u Baru	2.000,00	500,00	2.500,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3.	Vrtić u Ulcinju	2.000,00	500,00	2.500,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4.	Vrtić u Pljevljima	2.000,00	500,00	2.500,00	Opšti prihodi kredit 2.000,00	12.654,00	0,00	12.654,00
8.2.5.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	11.500,00	500,00	12.000,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	27.350,83	0,00	27.350,83
8.2.6.	Vrtić u Tuzima	5.000,00	500,00	5.500,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	16.547,24	0,00	16.547,24
8.2.7.	Rekonstrukcija Vrtića	9.000,00	500,00	9.500,00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	0,00	0,00	0,00
8,3	Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	248.000,00	343.000,00	591.000,00	Opšti prihodi	247.710,00	343.000,00	590.710,00
8.4.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi, Podgorica	0,00	1.000,00	1.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
8.5.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	23.500,00	0,00	23.500,00	Opšti prihodi	23.374,81	0,00	23.374,81
8.6.	Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica	4.000,00	820.000,00	824.000,00	Opšti prihodi	3.727,20	819.005,73	822.732,93
8.7.	Izgradnja objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja	8.000,00	151.000,00	159.000,00	Opšti prihodi	7.130,83	150.187,04	157.317,87
8.8.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica	0,00	1.000,00	1.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00

8.9.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za potrebe Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama	19.500,00	209.000,00	228.500,00	Opšti prihodi	19.023,00	208.318,30	227.341,30
8.10.	Izgradnja O.Š. u Sukobinu, Ulcinj	0,00	100.000,00	100.000,00	Opšti prihodi	0,00	100.000,00	100.000,00
8.11.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	0,00	1.000,00	1.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
8.12.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Igalu, Herceg Novi	0,00	1.000,00	1.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
8.13.	Rekonstrukcija aneksa objekta O.Š. u Baču, Rožaje	10.000,00	74.000,00	84.000,00	Opšti prihodi	9.484,62	73.139,73	82.624,35
8.14.	Sanacija klizišta na Savini za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata, Herceg Novi	70.000,00	376.000,00	446.000,00	Opšti prihodi	69.663,57	375.929,15	445.592,72
8.15.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju	14.000,00	280.000,00	294.000,00	Opšti prihodi	13.500,00	280.000,00	293.500,00
8.16.	Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korac" u Bijelom Polju	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00
8.17.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja osnovne škole u Rožajama	1.000,00	0,00	1.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Unapređenje turističke ponude	948.500,00	8.430.000,00	9.378.500,00		929.479,29	8.146.854,38	9.076.333,67
9.1.	Ski centar "Kolašin 1600", Kolašin	365.000,00	4.731.000,00	5.096.000,00	Opšti prihodi	360.798,93	4.730.049,00	5.090.847,93
9.2.	Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje	60.000,00	707.000,00	767.000,00	Opšti prihodi	58.801,11	706.332,96	765.134,07
9.3.	Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	5.000,00	1.163.000,00	1.168.000,00	Opšti prihodi	4.000,00	1.162.858,19	1.166.858,19
9.4.	Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	5.000,00	210.000,00	215.000,00	Opšti prihodi	3.259,41	203.680,74	206.940,15
9.5.	Ski centar na lokalitetu Durmitora, Žabljak	115.500,00	318.000,00	433.500,00	Opšti prihodi	114.674,99	95.996,98	210.671,97

9.6.	Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	18.000,00	50.000,00	68.000,00	Opšti prihodi	17.498,00	25.000,00	42.498,00
9.7.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	74.000,00	780.000,00	854.000,00	Opšti prihodi	73.530,76	777.545,45	851.076,21
9.8.	Izmještanje ikone bogorodice Filarmose na Cetinju	5.000,00	0,00	5.000,00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00
9.9.	Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin	6.000,00	55.000,00	61.000,00	Opšti prihodi	5.883,32	54.521,57	60.404,89
9.10.	Izgradnja objekta "Kuća voća" u Andrijevići	1.000,00	0,00	1.000,00	Opšti prihodi	700,27	0,00	700,27
9.11.	Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	0,00	5.000,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
9.12.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	51.000,00	5.000,00	56.000,00	Opšti prihodi	50.190,00	0,00	50.190,00
9.13.	Nacionalni parkovi	6.000,00	290.000,00	296.000,00	Opšti prihodi	5.275,00	289.416,94	294.691,94
9.14.	Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor, Žabljak	0,00	5.000,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
9.15.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalnih "Kuća vina" sa sjedištem u Podgorici i Baru	0,00	5.000,00	5.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
9.16.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	4.000,00	0,00	4.000,00	Opšti prihodi	0,00	0,00	0,00
9.17.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivšeg "Doma revolucije" u Nikšiću	228.000,00	1.000,00	229.000,00	Opšti prihodi	227.587,50	0,00	227.587,50
9.18.	Izgradnja akumulacionog jezera za potrebe Ski-centra "Vučje" u Nikšiću	5.000,00	105.000,00	110.000,00	Opšti prihodi	2.380,00	101.452,55	103.832,55
10	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	2.272.188,61	15.336.844,78	17.609.033,39		1.916.287,77	16.504.230,18	18.420.517,95
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	529.188,61	7.764.744,78	8.293.933,39	IPA 8.048.201,60 Opšti prihodi 1.681.698,40 Kredit 100,00	459.418,59	7.864.459,82	8.323.878,41

10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	165.000,00	255.000,00	420.000,00	IPA 1.575.000,00 Opšti prihodi 1.345.000,00	132.263,90	1.420.388,92	1.552.652,82
10.3.	Sanacija odlagališta "Cafe" u Baru	289.000,00	766.000,00	1.055.000,00	IPA 2.501.750,00 Opšti prihodi 553.250,00	159.407,10	404.644,28	564.051,38
10.4.	Rekonstrukcija željezničke prugei Virpazar - Sutomore	135.000,00	3.911.000,00	4.046.000,00	IPA 3.864.100,00 Opšti prihodi 681.900,00	124.423,05	4.190.245,56	4.314.668,61
10.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice "Trebešica"	87.000,00	2.535.100,00	2.622.100,00	IPA 2.228.785,00 Opšti prihodi 393.315,00	36.250,00	2.532.531,06	2.568.781,06
10.6.	Tehnička pomoć	1.007.000,00	100.000,00	1.107.000,00	IPA 1.051.450,00 Opšti prihodi 185.550,00	1.004.525,13	91.960,54	1.096.485,67
10.7.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos - Trebešica	50.000,00	0,00	50.000,00	IPA 945.000,00 Opšti prihodi 105.000,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	10.000,00	5.000,00	15.000,00	IPA 7.500,00 Opšti prihodi 7.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	842.250,00	5.000,00	847.250,00	Opšti prihodi	814.073,10	3.511,51	817.584,61
SVE UKUPNO		6.068.938,61	43.243.594,78	49.312.533,39		5.015.552,67	45.264.601,12	50.280.153,79

TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA PO OBJEKTIMA
za period od 01. 01. 2017. god. do 31.12.2017. godine

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2017.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	126,481.94	1,813,017.92	1,939,499.86
1.1.	Izgradnja objekta CANU-a u Podgorici	0.00	0.00	0.00
1.2.	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	0.00	0.00	0.00
1.3.	Adaptacija prostora u objektu "Limenka"- zgrada MUP-a CG u Podgorici	0.00	0.00	0.00
1.4.	Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	41,634.24	1,079,826.73	1,121,460.97
1.5.	Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju	5,982.88	169,961.50	175,944.38
1.6.	Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Krenzi i Zoganjama	4,403.00	273,842.17	278,245.17
1.7.	Izgradnja administrativnog objekta u Petnjici	5,287.50	110,024.75	115,312.25
1.8.	Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici	42,338.06	0.00	42,338.06
1.9.	Zgrada Skupštine Crne Gore u Podgorici	0.00	19,032.66	19,032.66
1.10.	Rekonstrukcija administrativne zgrade organa lokalne uprave u Andrijevići	1,904.00	35,877.99	37,781.99
1.11.	Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju	493.85	124,452.12	124,945.97
1.12.	Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici	24,438.41	0.00	24,438.41
2	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	100,281.19	1,671,307.79	1,771,588.98
2.1.	Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici	44,999.99	844,639.85	889,639.84
2.2.	Rekonstrukcija objekta Centra kulture u Pljevljima	0.00	607,142.72	607,142.72
2.3.	Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	2,000.00	94,525.22	96,525.22

2.4.	Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP na Cetinju	44,625.00	0.00	44,625.00
2.5.	Rekonstrukcija objekta "Zetski dom" na Cetinju	0.00	0.00	0.00
2.6.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Centra savremene umjetnosti u Podgorici	0.00	0.00	0.00
2.7.	Opremanje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	0.00	0.00	0.00
2.8.	Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	5,000.00	125,000.00	130,000.00
2.9.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta	3,656.20	0.00	3,656.20
3	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	43,800.43	1,371,775.66	1,415,576.09
3.1.	Izgradnja objekta Sportske dvorane u Beranama	16,584.11	333,569.79	350,153.90
3.2.	Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru	0.00	0.00	0.00
3.3.	Izgradnja i rekonstrukcija fudbalskih terena	4,760.00	196,891.39	201,651.39
3.4.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena u Kotoru	21,391.27	796,698.57	818,089.84
3.5.	Rekonstrukcija objekta Doma učenika u Kolašinu	0.00	0.00	0.00
3.6.	Izgradnja sportskih terena i sala	0.00	44,615.91	44,615.91
3.7.	Izgradnje sportske sale u Nikšiću	0.00	0.00	0.00
3.8.	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska U Nikšiću	0.00	0.00	0.00
3.9.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	1,065.05	0.00	1,065.05
4	Projekti očuvanja životne sredine	379,405.85	1,737,272.17	2,116,678.02
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje	347,491.58	508,167.20	855,658.78
4.2.	Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada	3,200.00	106,904.05	110,104.05
4.3.	Sanacija deponije na Žablaku	1,481.55	0.00	1,481.55
4.4.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	0.00	0.00	0.00
4.5.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	9,163.00	592,010.14	601,173.14

4.6.	Vodosnadbijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin), Gradska opština Tuzi u Podgorici	5,355.00	200,000.00	205,355.00
4.7.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	0.00	297,190.78	297,190.78
4.8.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	10,148.72	0.00	10,148.72
4.9.	Spajanje rijeke Bojane sa kanalom Port Milena, Ulcinj	0.00	0.00	0.00
4.10.	Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih instalacija za prostor Veliki Pijesak i Utjeha, Ulcinj	0.00	0.00	0.00
4.11.	Postrojenje za prečišćavanje opadnih voda, tretman mulja i zbrinjavanje ostataka otpada u Podgorici	0.00	0.00	0.00
4.12.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	2,500.00	0.00	2,500.00
4.13.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini	30.50	15,250.00	15,280.50
4.14.	Sanacija odlagališta u Plavu	35.50	17,750.00	17,785.50
4.15.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	0.00	0.00	0.00
4.16.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica- Radetina, Rožaje	0.00	0.00	0.00
5	Izgradnja lokalne infrastrukture	185,951.07	7,605,449.67	7,791,400.74
5.1.	Rekonstrukcija "Ribarske ulice" u Plavu	0.00	0.00	0.00
5.2.	Rekonstrukcija ulice "Đeda Vojvodića" u Beranama	8,261.86	298,715.99	306,977.85
5.3.	Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu II faza	5,517.25	237,841.20	243,358.45
5.4.	Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice i izvođenje radova	0.00	0.00	0.00
5.5.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	81,127.59	4,599,979.39	4,681,106.98
5.5.1.	Lokalni putevi km	31,559.70	1,576,315.02	1,607,874.72
5.5.2.	Gradske saobraćajnice	49,567.89	3,023,664.37	3,073,232.26
5.6.	Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti u Danilovgradu	12,691.00	0.00	12,691.00
5.7.	Izgradnja gradske pijace u Gusinju I Njegušima	12,156.20	241,854.56	254,010.76
5.8.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	6,761.50	440,479.37	447,240.87

5.9.	Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	4,998.00	0.00	4,998.00
5.10.	Izrada Glavnog projekta i geotehnička ispitivanja za rekonstrukciju puta Bar - Tuđemili -Virpazar, u naselju Kosovići, Bar	0.00	0.00	0.00
5.11	Izgradnja infrastrukture za odigravanje MOSI igara u Pljevljima	44,457.67	130,251.95	174,709.62
5.12.	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	0.00	88,653.64	88,653.64
5.13.	Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju	0.00	110,551.00	110,551.00
5.14.	Radovi na produženju obale na Gat V u Luci Bar	0.00	0.00	0.00
5.15.	Izgradnja javne garaže na Žabljaku	0.00	0.00	0.00
5.16.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	9,980.00	0.00	9,980.00
5.17.	Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	0.00	177,122.57	177,122.57
5.18.	Izgradnja sjeverne zaobilaznice "Limski most-Rudopolje-Skič-Korito" u Plavu	0.00	0.00	0.00
5.19.	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav	0.00	0.00	0.00
5.20.	Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	0.00	0.00	0.00
5.21.	Uređenje uzeg gradskog centra u Plavu	0.00	0.00	0.00
5.22.	Uređenje korita rijeke Ibar	0.00	0.00	0.00
5.23.	Lokalni put MR - Tivat	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
6.00	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	0.00	5,948.81	5,948.81
6.1.	Rekonstrukcija prostora za HLA (Humani Leukocitni Antigeni - Tipizacija tkiva) laboratoriju i HLA tipizaciju u Crnoj Gori, Podgorica	0.00	5,948.81	5,948.81
6.2	Rekonstrukcija energetskog bloka TS i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore	0.00	0.00	0.00
6.3.	Privođenje namjeni novoizgrađenih dijelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	0.00	0.00	0.00
7	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	4,950.00	216,133.85	221,083.85
7.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	0.00	126,588.85	126,588.85

7.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću	0.00	0.00	0.00
7.3.	Izgradnja objekta i potrebne infrastrukture za objekte za socijalno ugrožene kategorije stanovništva	4,950.00	89,545.00	94,495.00
8	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	277,842.03	5,019,044.42	5,296,886.45
8.1.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	42,536.31	1,077,651.86	1,120,188.17
8.2.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a	73,691.69	1,934,812.61	2,008,504.30
8.3.	Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	10,710.00	0.00	10,710.00
8.4.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi, Podgorica	0.00	0.00	0.00
8.5.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	23,374.81	0.00	23,374.81
8.6.	Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica	3,727.20	819,005.73	822,732.93
8.7.	Izgradnja objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja	7,130.83	150,187.04	157,317.87
8.8.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica	0.00	0.00	0.00
8.9.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za potrebe Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama	19,023.00	208,318.30	227,341.30
8.10.	Izgradnja O.Š. u Sukobinu, Ulcinj	0.00	100,000.00	100,000.00
8.11.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	0.00	0.00	0.00
8.12.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Igalu, Herceg Novi	0.00	0.00	0.00
8.13.	Rekonstrukcija aneksa objekta O.Š. u Baču, Rožaje	9,484.62	73,139.73	82,624.35
8.14.	Sanacija klizišta na Savini za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata, Herceg Novi	69,663.57	375,929.15	445,592.72
8.15.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju	13,500.00	280,000.00	293,500.00
8.16.	Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	5,000.00	0.00	5,000.00
8.17.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja osnovne škole u Rožajama	0.00	0.00	0.00

9	Unapređenje turističke ponude	1,166,479.29	9,316,909.14	10,483,388.43
9.1.	Ski centar "Kolašin 1600", Kolašin	597,798.93	5,900,103.76	6,497,902.69
9.2.	Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje	58,801.11	706,332.96	765,134.07
9.3.	Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	4,000.00	1,162,858.19	1,166,858.19
9.4.	Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	3,259.41	203,680.74	206,940.15
9.5.	Ski centar na lokalitetu Durmitora, Žabljak	114,674.99	95,996.98	210,671.97
9.6.	Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	17,498.00	25,000.00	42,498.00
9.7.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	73,530.76	777,545.45	851,076.21
9.8.	Izmještanje ikone bogorodice Filarmose na Cetinju	4,900.00	0.00	4,900.00
9.9.	Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin	5,883.32	54,521.57	60,404.89
9.10.	Izgradnja objekta "Kuća voća" u Andrijevi	700.27	0.00	700.27
9.11.	Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	0.00	0.00	0.00
9.12.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	50,190.00	0.00	50,190.00
9.13.	Nacionalni parkovi	5,275.00	289,416.94	294,691.94
9.14.	Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor, Žabljak	0.00	0.00	0.00
9.15.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalnih "Kuća vina" sa sjedištem u Podgorici i Baru	0.00	0.00	0.00
9.16.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	0.00	0.00	0.00
9.17.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivšeg "Doma revolucije" u Nikšiću	227,587.50	0.00	227,587.50
9.18.	Izgradnja akumulacionog jezera za potrebe Ski-centra "Vučje" u Nikšiću	2,380.00	101,452.55	103,832.55
10	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	1,916,287.77	16,504,230.18	18,420,517.95
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	459,418.59	7,864,459.82	8,323,878.41
10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	132,263.90	1,420,388.92	1,552,652.82
10.3.	Sanacija odlagališta "Cafe" u Baru	159,407.10	404,644.28	564,051.38

10.4.	Rekonstrukcija željezničke pruge Virpazar - Sutomore	124,423.05	4,190,245.56	4,314,668.61
10.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice "Trebešica"	36,250.00	2,532,531.06	2,568,781.06
10.6.	Tehnička pomoć	1,004,525.13	91,960.54	1,096,485.67
10.7.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos - Trebešica	0.00	0.00	0.00
10.8.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	0.00	0.00	0.00
11	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	814,073.10	3,511.51	817,584.61
	Sve ukupno	5,015,552.67	45,264,601.12	50,280,153.79

REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA

1.1. Izgradnja objekta CANU-a u Podgorici

Status projekta: Nije bilo aktivnosti



- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 63 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića.
- Objekat je bruto površine 6.990 m² i sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova.
- U novoprojektovanoj zgradi CANU-a je planirano: 70 kancelarija, 7 sala za sastanke, 2 laboratorije akademskog kluba, čitaonice, 3 depoa, 2 arhive, kao i ostale prateće tehničke prostorije.
- Radovi na izgradnji objekta započeti su krajem 2010. godine.
- U periodu do 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, radovi na oblaganju fasadnih zidova cijepanim kamenom, radovi na izradi ventilirajuće kamene fasade i polustrukturalnih fasada, kao i radovi na grubom razvodu vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.
- U 2014. godini radovi se nisu izvodili i gradilište je bilo konzervirano.
- U 2015. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova u okviru obezbijeđenih sredstava i izvođeni su keramičarski radovi, montažni radovi, kao i radovi na izradi elektroinstalacija.
- U 2016. godini nije bilo aktivnosti.
- U 2017. godini planiran je nastavak radova na izgradnji u skladu sa prenamjenom objekta, nakon što se Korisnik (Viši sud, Upravni sud i Sekretarijat Sudskog savjeta) izjasni po pitanju neophodnih sadržaja i pripremi Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta u skladu sa prenamjenom.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planirana je izrada projektne dokumentacije prenamjene objekta i nastavak izvođenja radova za potrebe novog korisnika.

1.2. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

Status projekta: U toku



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko–italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica. Objekat sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi 10.020m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m².
- Izgradnja objekta se realizuje fazno. I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena. Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Izvođenje radova je otpočelo krajem 2012. godine i do kraja 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze. U cilju nastavka izvođenja radova na izgradnji objekta, u toku su aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- Krajem 2017. godini raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. U toku je vrednovanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Raspisivanjem javnog nadmetanja koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom životne sredine kopna i mora Republike Italije i projektantskim timom.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je, nakon završetka procedure javnih nabavki, početak izvođenja radova II faze.

1.3. Adaptacija prostora u objektu "Limenka"- zgrada MUP-a CG u Podgorici

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini, bilo je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova III faze adaptacije administrativnog objekta "Limenka"- zgrada MUP-a CG u Podgorici, a koja se odnosi na adaptaciju suterena i II sprata objekta.
- Sredinom 2017. godine prestala je potreba Ministarstva unutrašnjih poslova za adaptacijom prostora u objektu "Limenka".
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

1.4. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritetno prilagođavanje u Opštinama Podgorica, Nikšić i Berane.
- U prethodnom periodu završena je izrada i revizija Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- U 2016. godini završeni su svi radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici, Osnovni sud u Podgorici i Ekonomski fakultet u Podgorici.
- U 2017. godini raspisana su javna nadmetanja i završeni radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Dom zdravlja u Beranama, Opšta bolnica u Beranama, Dom zdravlja u Nikšiću i Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik u Nikšiću.
- U 2017. godini realizovano je 1.121.460,97 €
- U 2018. godini planirano je izvođenje i završetak radova na objektima Ministarstva finansija u Podgorici i JZU Opšta Bolnica u Nikšiću.

Ministarstvo finansija u Podgorici

- Potpisan je ugovor za izvođenje radova sa najpovoljnijim ponuđačem. U toku su pripremni radovi na objektu.

Dom zdravlja u Beranama

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, otpočelo se sa radovima koji su obuhvatili prilagođavanje sanitarnih čvorova, dogradnju lifta, izradu rampi, postavljenje taktilnih traka i oznaka na Brajevom pismu, označavanje parking mjesta.
- Svi radovi na objektu su završeni i izvršena je primopredaja istih.

Opšta bolnica u Beranama

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, otpočelo se sa radovima koji su obuhvatili prilagođavanje sanitarnih čvorova, prilagođavanje po jedne sobe na svim odeljenjima, ugradnja vertikalne podizne platforme na ulazu, postavljanje taktilnih traka i oznaka na Brajevom pismu, označavanje parking mjesta.
- Svi radovi na objektu su završeni i izvršena je primopredaja istih.

JZU Opšta bolnica u Nikšiću

- Radovi na objektu su započeti u 2016. godini i obustavljeni na zahtjev Korisnika zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem i velikog obima radova sa kojima Korisnik nije bio saglasan.
- Nakon više sastanaka održanih na objektu dogovreno je da se izvrši dopuna projektne dokumentacije i uskladi sa stvarnim stanjem na objektu.
- U skladu sa primjedbama i sugestijama Korisnika, projektant je dopunio projektnu dokumentaciju i na istu je dobijena saglasnost čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova na objektu.

JZU Bolnica za plućne bolesti – Brezovik u Nikšiću

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, započelo se sa izvođenjem radova na prilagođavanju objekta. Radovi obuhvataju građevinsko zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija jake i slabe struje, mašinskim instalacijama.
- Svi radovi na objektu su završeni.

JZU Dom zdravlja u Nikšiću

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, započelo se sa izvođenjem radova na prilagođavanju objekta. Radovi obuhvataju građevinsko zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija jake i slabe struje, mašinskim instalacijama.
- Svi radovi na objektu su završeni i izvršena je primopredaja istih.







1.5. Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije za potrebe administrativnog objekta sprovodi Opština Gusinje.
- Predviđena bruto površina objekta iznosi 1.130 m² i spratnosti prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju objekta, na prvom i drugom spratu predviđeni su kancelarijski prostori sa pratećim sanitarnim prostorijama, dok su na poslednjoj etaži predviđeni sljedeći sadržaji: skupštinska sala za 30 odbornika, prostorija za prevodioce, prostorija za novinare, multifunkcionalna sala i sanitarni blok.
- U prethodnom periodu, prije formiranja Opštine Gusinje, Opština Plav je sprovodila aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg objekta i realizovala grube građevinske radove.
- Opština Gusinje je raspisala javno nadmetanje i potpisala Ugovor za izvođenje građevinsko-zanatskih radova, radova na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkih instalacija. Izvođenje ugovorenih radova je otpočelo u 2015. godini i isti su završeni u 2016. godini.
- Sredstva realizovana u 2016. godini predstavljaju učešće Vlade Crne Gore - Direkcije javnih radova u finansiranju projekta.
- U 2017. godini su nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta. Opština Gusinje je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisala ugovor za izvođenje preostalih radova za stavljanje objekta u funkciju.
- Do sada su izvedeni pripremni radovi na izradi fasade, kao i nabavka materijala za izradu iste. Radovi su trenutno obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2017. godini realizovano je 175.944,38 €.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova na objektu.

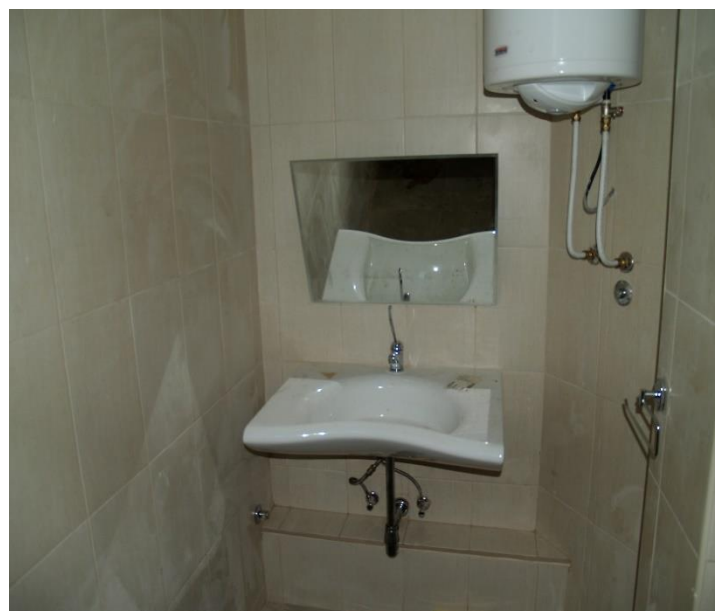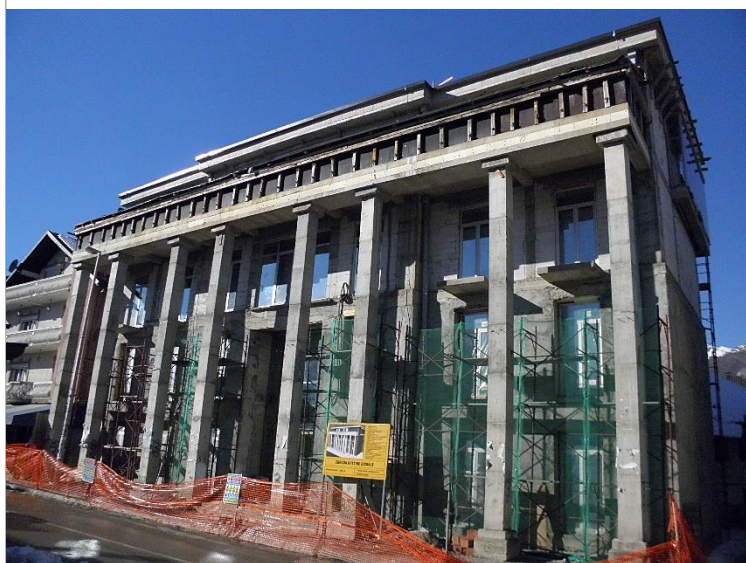

1.6. Rekonstrukcija objekata stanice Policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova u Gusinju, Krenzi i Zoganjama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini realizovano je 278.245,17€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova na objektima.

Gusinja

- U 2016. godini Direkcija javnih radova je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze na adaptaciji poslovnog prostora za potrebe stanice policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova. Radovi I faze obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama na objektu.
- U 2017. godini izabran je izvođač radova i potpisan je ugovor.
- Završeni su radovi na rušenju i demontaži. U toku su izolaterski radovi, kao i radovi na montaži spoljašnje stolarije. Radovi se odvijaju usporenom dinamikom zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze adaptacije objekta u Gusinju, nakon čega će Direkcija javnih radova pristupiti pripremi tenderske dokumentacije za ove radove koji obuhvataju uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka i opremanje objekta namještajem.




Krenza i Zoganje

- Radovi na objektima u Krenzi i Zoganjama završeni su krajem 2016. godine
- U 2017. godini, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na zamjeni krovnog pokrivača na objektu u Krenzi, izabran najpovoljniji izvođač radova i radovi su završeni u obimu od 90%.

1.7. Izgradnja administrativnog objekta u Petnjici

Status projekta: Završeno

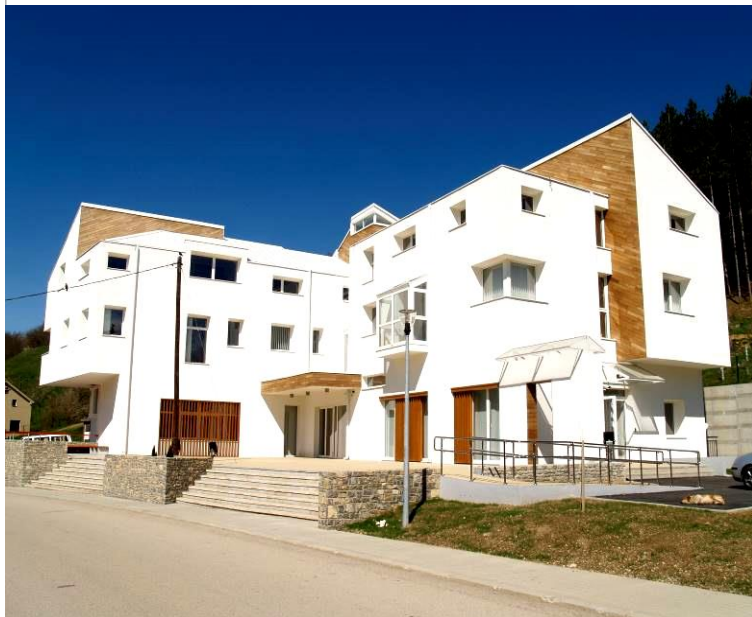

Projekat je obuhvatio izgradnju i opremanje administrativnog objekta Opštine Petnjica, bruto površine 1.760 m².

- Objekat sadrži suteran, prizemlje, sprat i potkrovlje. U suterenu je smješten garažni prostor sa osam parking mjesta. U prizemlju objekta su šalter sala za opštinske službe sa dvije kancelarije, sala za sastanke Skupštine kapaciteta oko 60 mjesta i sala za vjenčanja i druge manifestacije. Na prvom spratu su smještene: kancelarije predsjednika, podpredsjednika, tehničkog sekretara, glavnog administratora, multifunkcionalna sala za sastanke i osam kancelarija. U potkrovnom prostoru je smješteno 14 kancelarija. Uz kancelarije su organizovani prateći pomoćni i tehnički sadržaji.
- U 2015. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i opremanju objekta.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova.
- Svi radovi na izgradnji i opremanju objekta završeni su u ugovorenom roku.
- Završena je procedura tehničkog prijema, pribavljena upotrebna dozvola i objekat je u martu 2017. godine predat korisniku na upotrebu.
- U 2017. godini realizovano je 115.312,25 €.

1.8. Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe Korisnika.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi oko 5.350 m².
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta kompleksa objekata SAJ i PJP na Zlatici.
- U 2017. godini nakon što je završena procedura kod Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje revizije projektne dokumentacije, završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i na osnovu iste pristupilo se raspisivanju javnih nadmetanja za fazno izvođenje radova na izgradnji objekata kompleksa u skladu sa prioritetima korisnika. U okviru I faze raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji objekta magacina sa opremanjem.
- U 2017. godini realizovano je 42.338,06 €.
- U 2018. godini planirano je, nakon okončanja procedure javne nabavke, ugovaranje radova na izgradnji objekta magacina sa opremanjem, kao i magacina municije i trafostanice.



1.9. Zgrada Skupštine Crne Gore u Podgorici

Status projekta: Završeno

- U 2011. godini stručni tim Direkcije javnih radova je izradio Studiju mogućih rješenja za obezbjeđenje prostora za rad Skupštine Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, na osnovu koje je donešen Zaključak Vlade o izboru lokacije Nove zgrade Skupštine Crne Gore.
- U 2012. godini stručni tim je u saradnji sa predstavnicima Skupštine, izradio Projektni zadatak u dijelu definisanja budućeg kapaciteta i prostornih sadržaja objekta Skupštine, a u skladu sa Zaključkom Vlade br. 03-7377/3 od 29.12.2011. godine, kojim je definisano raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja na izabranoj lokaciji i to u dvije varijante: a) rekonstrukcija i adaptacija stare zgrade Vlade u Ulici Jovana Tomaševića i izgradnja novog objekta u neposrednoj blizini, i b) rušenje postojećeg i izgradnja novog objekta na istoj urbanističkoj parceli. Nakon stvaranja planskih pretpostavki i definisanja površine zahvata lokacije na kojoj se predviđa izgradnja buduće zgrade Skupštine Crne Gore, stvorile se uslovi za dalju realizaciju aktivnosti na ovom projektu.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u postojećoj zgradi Skupštine koji se odnose na sanaciju krovne lanterne, enterijerske radove u plenarnoj sali, zamjenu prozora i sanaciju fasade.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi na postojećem objektu Skupštine.
- U 2017. godini realizovano je 19.032,66 €.



1.10. Rekonstrukcija administrativne zgrade organa lokalne uprave u Andrijevici

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na adaptaciji objekta za potrebe organa lokalne uprave u opštini Andrijevica, izabran izvođač radova i radovi koji su obuhvatali zamjenu krovnog pokrivača, dijela krovne konstrukcije i gromobranskih instalacija završeni su u potpunosti.
- U 2017. godini realizovano je 37.781,99€.



1.11. Rekonstrukcija skupštinske sale u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- Novoprojektovanim rješenjem adaptacije prostora skupštinske sale koja se nalazi u objektu Opštine Bijelo Polje, predviđena je nova organizacija prostora koja se ogleda u postavljanju atrijumskog načina sjedenja, sa polukružnim poslaničkim pultovima u četiri stepenasto postavljena reda, što omogućava jasan pregled svih aktivnosti u sali.
- Predviđen je, takođe, konferencijski sistem koji omogućava nesmetano održavanje sjednica lokalnog parlamenta, glasanje sa prikazom rezultata glasanja na odgovarajućim displejima i razne vidove prezentacija. Sala ima ukupno 70 mjesta za odbornike i 4 mjesta za stolom predsjedavajućeg. Sala je opremljena i potrebnim brojem radnih mjesta za predstavnike medija, kao i za potrebe skupštinskih službi.
- Nakon što je opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju i ista dopunjena od strane Direkcije javnih radova, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje predmetnih radova, potpisan je ugovor i radovi su u toku.
- U 2017. godini realizovano je 124.945,97€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.



1.12. Nadgradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta CANU-a u Podgorici

Status projekta: U toku


- Planirana je rekonstrukcija postojećeg objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Beogradskoj ulici u Podgorici.
- U skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika pripremljen je projektni zadatak i isti je dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalju proceduru raspisivanja konkursa čiji će rezultati biti implementirani u plansku dokumentaciju.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 5.000 m² i u objektu su planirani sljedeći sadržaji: biblioteka, galerija, depo i ostali administrativni i naučni sadržaji.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, sprovelo je konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nadgradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta CANU-a. Konkursno rješenje biće sastavni dio planske dokumentacije na osnovu koje će se izdati UTU-i za izgradnju predmetnog objekta.
- U 2017. godini realizovano je 24.438,41€.
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg obrađivača Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog konkursnog idejnog rješenja.



2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE

2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola u Podgorici

Status projekta: U toku

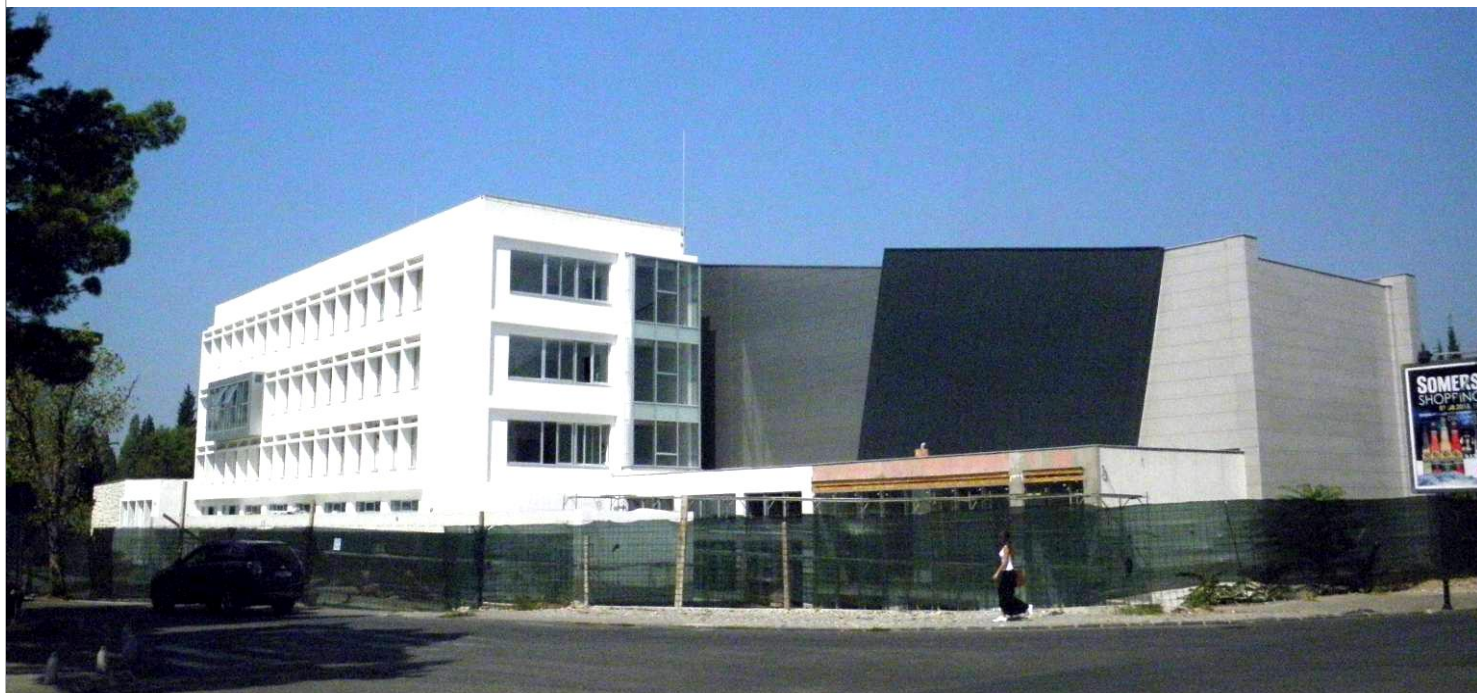



- U toku je rekonstrukcija i dogradnja bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², u kojem će nakon završetka radova biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteke i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola.
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, kao i za radove na opremanju objekta.
- U 2017. godini, nakon završetka tenderske procedure, potpisan je ugovor sa izvođačem radova II faze.

- U toku je izvođenje radova na izradi scenske tehnike, mehanike, postavljanju akustičnih panela i nabavci opreme za potrebe Crnogorske kinoteke.
- U 2017. godini realizovano je 889.639,84€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova na objektu.

2.2. Rekonstrukcija objekta Centra kulture u Pljevljima

Status projekta: Završeno

- Projekat rekonstrukcije objekta Doma kulture u Pljevljima realizuju Opština Pljevlja, Ministarstvo kulture u koordinaciji sa Direkcijom javnih radova.
- U 2011. godini su završeni svi građevinski instalaterski radovi na rekonstrukciji objekta, a u 2012. godini su završeni ugovoreni enterijerski radovi koji su se odnosili na dvoranu i prateće sadržaje.
- Početkom 2016. godine Opština Pljevlja je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje preostalih zanatskih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju biblioteke, muzeja, galerije i depoa u sklopu objekta. Sa izvođenjem radova otpočelo se u oktobru 2016. godine.
- Krajem 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi i u toku su aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole.
- Ukupna učešće Vlade Crne Gore iznosi do 650.000 €.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3765 od 14. decembra 2017. godine zadužilo se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da s Programa, : 818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva sa izdataka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte izvrši prenos sredstava na žiro račun Izvođača radova „Unipred“ d.o.o. Bijelo Polje, po Ugovoru br. 406-3/2016-15, od 26.07.2016. godine, zaključenim s Opštinom Pljevlja u iznosu do 387.500,00 €, a na osnovu ovjerenih i dostavljenih situacija od strane Opštine Pljevlja.
- U 2017. godini ukupno je realizovano 607.142,72 €.

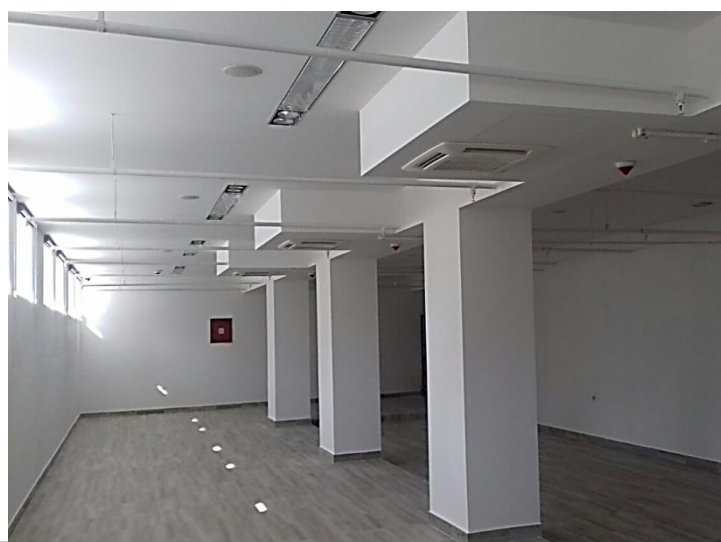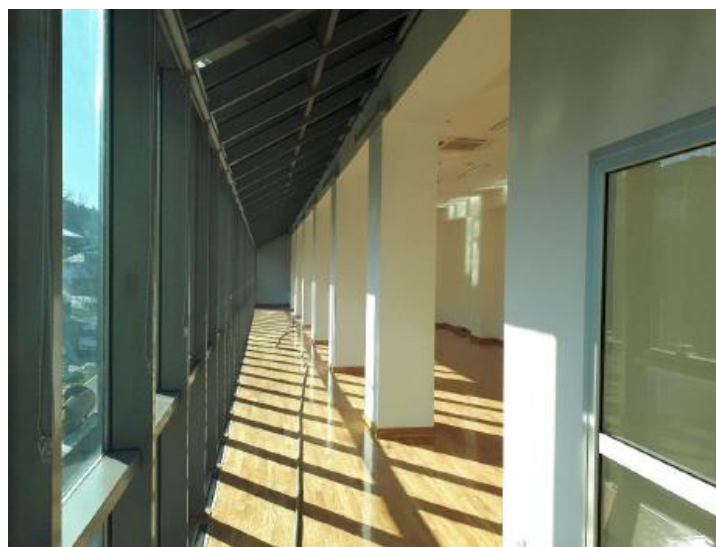

2.3. Uređenje terena oko spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku

Status projekta: U toku

- U 2016. godini izvođeni su radovi na sanaciji spomenika, dogradnji ograde oko lokacije i izgradnji postolja za spomenične biste i svi planirani radovi na rekonstrukciji spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku su završeni.
- U 2017. godini završeno je izvođenje radova na izgradnji šetališta sa rasvjetom i mobilijarom i izabran izvođač radova za izgradnju I faze radova na izgradnji parkinga između kapele i spomenika.
- U 2017. godini realizovano je 96.525,22 €.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova I faze, ugovaranje i završetak radova II faze na izgradnji parkinga.



2.4. Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP na Cetinju

Status projekta: Završeno

- Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br.08-1927/4 od 02.08.2013. godine Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je zadužen da pristupi izradi konzervatorskog projekta restauracije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju. Takođe, na osnovu Zaključka Vlade br. 08-2014/2 od 1. avgusta 2014. godine izvršen je transfer sredstava Prijestonici Cetinje na ime kofinansiranja projekta.
- U avgustu 2014. godine, u skladu sa Kapitalnim budžetom, Direkcija javnih radova je nakon završene procedure javnog nadmetanja potpisala Ugovor za vršenje revizije Glavnog projekta.
- Ugovorom o realizaciji predmetnog objekta zaključenim u novembru 2014. godine između Ministarstva finansija Crne Gore, Prijestonice Cetinje, UNDP-a (Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori) i Direkcije javnih radova, definisana je obaveza UNDP-a da sprovede postupak javne nabavke za izbor izvođača radova u skladu sa procedurama UNDP-a. Istim Ugovorom propisana je obaveza Direkcije javnih radova da shodno zakonskoj proceduri izvrši izbor nadzornog organa nad izvođenjem radova na objektu, kao i da izvrši prenos sredstava Prijestonici i UNDP-u.
- Krajem marta 2015. godine Direkcija javnih radova je, nakon završene procedure javnog nadmetanja, potpisala Ugovor o vršenju poslova stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji objekta.
- Sredinom oktobra 2015. godine završena je izrada projektne dokumentacije, a nakon završenog međunarodnog javnog nadmetanja, UNDP je potpisao Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta.
- Sa radovima koje koordinira UNDP otpočelo se krajem novembra 2015. godine.
- Rebalansom budžeta za 2016. godinu obezbijedena su nedostajuća sredstva i krajem decembra 2016. godine u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore 08-437 od 17. marta 2016. godine i br. 08-3276 od 15. decembra 2016. godine, izvršen je transfer sredstava od strane Direkcije javnih radova prema UNDP-u za nastavak radova.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na rekonstrukciji objekta i pribavljena je upotrebna dozvola.
- U 2017. godini realizovano je 44.625,00€.



2.5. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju

Status projekta: Niiesu sprovedene aktivnosti

- Aktivnosti na izradi projekta dokumentacije rekonstrukcije objekta Zetski dom na Cetinju sprovodi JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" Cetinje.
- Nakon što Korisnik dostavi revidovanu projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova će pristupiti pripremi tenderske dokumentacije i raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

2.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Centra savremene umjetnosti u Podgorici

Status projekta: Niiesu sprovedene aktivnosti

- Planirana je realizacija projekta izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici.
- Obaveza Korisnika, Centra savremene umjetnosti Crne Gore je da zajedno sa Glavnim gradom opredjeli lokaciju za izgradnju muzeja i pripremi Projektni zadatak, nakon čega bi se pristupilo raspisivanju Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

2.7. Opremanje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju

Status projekta: U toku

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja i opreme neophodne za rad Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju i isto je poništeno s obzirom da nije bilo ispravnih ponuda.
- U 2017. godini je ponovno raspisano javno nadmetanje. Donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i na istu je uložena žalba.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

2.8. Rekonstrukcija objekta Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Dvorac kralja Nikole u Nikšiću je izgrađen 1900. godine, površine je 2.970 m² i sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja. U objektu su smješteni Zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv i depoi.
- U toku je izrada Glavnog konzervatorskog projekta rekonstrukcije koju sprovodi Opština Nikšić i nakon završetka istog, Direkcija javnih radova će raspisati javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje predmetnih radova.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-4079 od 25. decembra 2017. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova je bila zadužena da sredstva opredijeljena u okviru Programa: Izrada, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture (programski kod 41501-805) za projekat Rekonstrukcija objekta „Dvorac Kralja Nikole“ u Nikšiću, sa pozicije: 4147- Izdaci za konsultantske usluge i projekte u iznosu od 5. 000,00 € i sa pozicije: 4413 – Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 125.000,00 €, prenese na žiro račun Opštine Nikšić za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije predmetnog objekta.
- U 2017. godini realizovano je 130,000,00 €.
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

2.9. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe Crnogorskog narodnog pozorišta

Status projekta: U toku


- U 2017. godini sklopljen je ugovor za izvođenje radova na adaptaciji „Male scene“ CNP.
- Radovi na adaptaciji prostora za potrebe „Male scene“ obuhvataju građevinsko-zanatske radove, nabavku namještaja i teleskopskih tribina, nabavku i montažu scenskog osvjetljenja i nabavku i montažu audio i video sistema. Površina prostora koji se adaptira je 170 m².
- U 2017. godini urađeni su radovi na rušenje i pripremni radovi.
- U 2017. godini realizovano je 3.656,20 €.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak izvođenja ugovorenih radova na rekonstrukciji objekta.



3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

3.1. Izgradnja objekta Sportske dvorane u Beranama

Status projekta: U toku

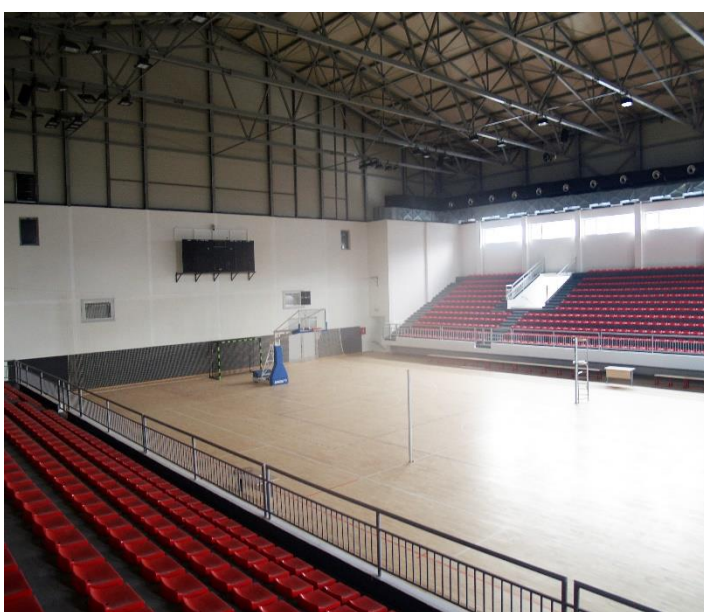

- Objekat sportske dvorane u Beranama smješten je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa u neposrednoj blizini gradskog stadiona.
- Projektovana bruto površina Sportske dvorane iznosi 5.350 m² i planirana je za održavanje međunarodnih rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica i drugih sportskih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 1.535 mjesta.


- U objektu su planirani i ostali sadržaji: fitnes centar, teretana, ambulanta, administrativni sadržaji, kafe restoran, lokali, svlačionice sa sanitarnim čvorom, prostorije za televizijski prenos, novinare i režiju, kao i tehnički i prateći sadržaji.
- Realizacija ovog objekta odvijala se fazno, u skladu sa dinamikom obezbjeđenja finansijskih sredstava.
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u 2008. godine i odvijale su se usporenom dinamikom i sa prekidima usled usaglašavanja projektne dokumentacije.
- U prethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali grube građevinske radove na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta.
- Radovi II faze koji se odnose na nastavak i završetak radova na objektu započeti su sredinom 2014. godine.
- Završeni su radovi na montaži čelične konstrukcije, krovnih i fasadnih panela, spoljne bravarije, kao radovi na izradi keramike, malterisanju, montaža tribinskih sjedišta i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija, molersko-farbarski i gipsarski radovi, isporuka namještaja i sportske opreme.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje preostalih radova za stavljanje objekta u funkciju i izabran je Izvođač radova. Svi radovi na izgradnji i opremanju objekta završeni su krajem 2017. godine, kada je započeta i procedura tehničkog prijema u cilju pribavljanja upotrebne dozvole.
- U 2017. godini realizovano je 350.153,90€.

3.2. Izgradnja objekta Sportske dvorane u Kotoru

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno Ugovoru o relizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, od 16.11.2011.godine, zaključen između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade CG preko Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €, od cega je realizovano do kraja 2016. godine 1.518.838,87 €.
- Projekat izgradnje Sportske dvorane realizuje Opština Kotor i Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora, a sufinansira Vlada Crne Gore.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima.
- U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije. U 2017. godini odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- Ukupno učešće Vlade Crne Gore iznosi cca 4.450.000 €.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.



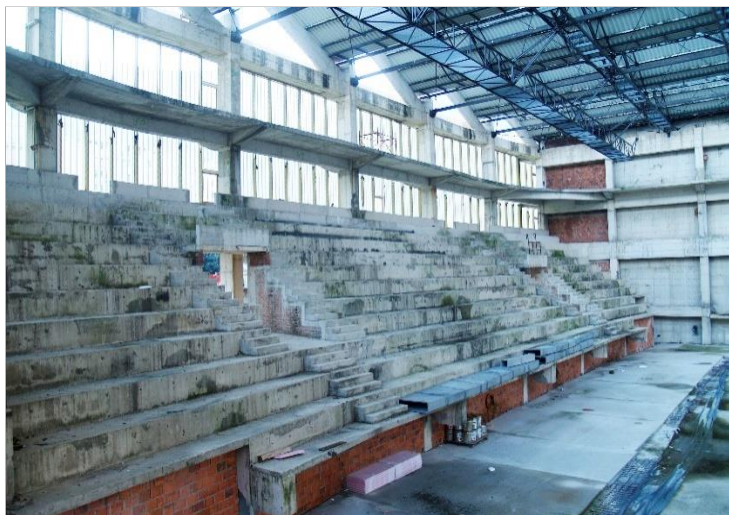

3.3. Izgradnja i rekonstrukcija fudbalskih terena

Status projekta: U toku

U 2017. godini realizovano je 201.651,39€

Fudbalski stadion na Cetinju

- Zaključkom Vlade Crne Gore od 26. decembra 2014. godine Fudbalski savez Crne Gore je zadužen da sprovede postupak odabira Izvođača radova, kao i da zajedno sa Prijesticom Cetinje obezbijedi učešće u finansiranju. Preostala sredstva će biti obezbijedena kroz Kapitalni budžet, u skladu sa mogućnostima, kao učešće Vlade Crne Gore u sufinansiranju projekta.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-2514 od 27. jula 2017. godine zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova planira sredstva u Kapitalnom budžetu za 2018. Godinu u iznosu do 1.395.000,00 €, u 2019. godini, sredstva u iznosu do 1.500.000,00 € i u 2020. godini sredstva u iznosu do 1.500.000,00 €, na ime kofinansiranja projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju.
- U 2016. završena je izrada i revizija Glavnog projekta kojom je kordinirala Prijestonica Cetinje.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja izabran je najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova i isti su započeti u novembru.
- U 2018. godini planiran je nastavak radova na izgradnji objekta.



Pomoćni fudbalski teren na Žabljaku

- U prethodnom periodu izrađena je projektna dokumentacija i završeni pripremni radovi za ugradnju vještačke trave pomoćnog fudbalskog terena na Žabljaku.
- U 2016. godini je raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji vještačke podloge.
- U 2017. godini, završeni su svi radovi.
- Takođe, u okviru izgradnje stadiona planirana je sanacija odnosno adaptacija i opremanje postojećeg objekta.

- U skladu sa potpisanim protokolom, Opština Žabljak je preuzela aktivnosti na adaptaciji i opremanju postojećeg objekta.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na adaptaciji objekta.



3.4. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru

Status projekta: U toku



- Planirana je rekonstrukcija zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru, bruto površine cca 5.400m².
- Na prizemnoj etaži su smještene četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa zasebnim svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorije VK „Primorac” i tehničke prostorije.
- Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama.
- Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.
- U 2016. godini je završena procedura javnog nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze i potpisan ugovor sa izvođačem radova.
- Radovi I faze obuhvataju rušenja i demontaže, sanaciju armirano-betonske konstrukcije, sanaciju čelične konstrukcije, dogradnju objekta, krovopokrivačke radove i instalacije uzemljenja i gromobrana.
- Na zahtjev Korisnika početak radova je odložen za mart 2017. godine.
- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za II fazu radova, koji obuhvataju sve neophodne radove za stavljanje plivališta u funkciju. Donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, na koju je uložena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2017. godini realizovano je 818.089,84 €.
- U 2018. godini planirano je ugovaranje, početak i završetak radova II faze.

3.5. Rekonstrukcija objekta Doma učenika u Kolašinu

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Opština Kolašin bila je u obavezi da dostavi neophodnu dokumentaciju, kako bi se otpočelo sa aktivnostima na realizaciji projekta.
- Kako Opština Kolašin nije dostavila neophodnu dokumentaciju u 2017. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

3.6. Izgradnja Sportskih terena i sala

Status projekta: U toku

- U 2017. godini realizovano je 44.615,91 €.
- U 2018. godini planirano je nastavak aktivnosti.

Šavnik

- Nakon što je Opština Šavnik završila izradu projektne dokumentacije Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji sportskog terena i donešena odluka o odabiru izvođača radova.

Andrijevića

- Raspisano je javno nadmetanje za izgradnju sportskog terena sa tribinama u opštini Andrijevića. Uložena je žalba na odluku o dodjeli ugovora kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.

Rožaje

- Izvođenje radova na izgradnji sportskog terena sa tribinama je obustavljeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Cetinje

- Prijestonica Cetinje koordinira aktivnostima koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za sanaciju sportske sale na Cetinju i sanaciju parketa i krova sale.



3.7. Izgradnja sportske sale u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Planirana je izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta sportske sale koji je lociran u krugu školskog centra „Tvrtko Bijelić“, u neposrednoj blizini školskog objekta, u ulica Narodne omladine u Nikšiću.
- Objekat sadrži fiskulturnu salu sa gledalištem, planiranu za potrebe fakulteta i za sportska takmičenja- srednji nivo takmičenja, odnosno regionalna takmičenja, takmičenja lokalnih i malih klubova, trening i rekreaciju.
- Planirana bruto površina objekta je 1.000 m². Uz objekat se nalazi anex gdje su planirane garderobe, spravarnica, kancelarije i druge pomoćne prostorije.
- Na osnovu prethodno izrađenog Idejnog rješenja raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta za izgradnju predmetnog objekta. Na odluku o izboru uložena je Žalba pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon ugovaranja izrade projektne dokumentacije, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova, kao i početak izvođenja istih.

3.8. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekta koordinira Opština Nikšić koja je u predhodnom periodu izradila Idejno rješenje i isto usaglasila sa Fudbalskim savezom Crne Gore.
- U toku je procedura ugovaranja izrade Glavnog projekta od strane Opštine Nikšić.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planirano je, nakon što opština dostavi projektu dokumentaciju, ugovaranje i početak izvođenja radova.

3.9. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je raspisano javno nadmetanje, potpisan je ugovor sa najpovoljnijim obrađivačem projektne dokumentacije.
- Orađivač projektne dokumentacije je izradio ldejno rješenje i isto je dostavljeno gradskom arhitekti na saglasnost.
- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima.
- U 2017. godini realizovano je 1.065,05 €.
- U 2018. godini je planiran završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, nakon čega će se raspisati javno nadmetanje za izvođenje radova.



4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE


4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

Status projekta: U toku

- U prethodnom periodu, počev od 2008. godine, odvijale su se, a i dalje su u toku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i za izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za njihovu realizaciju iz domaćih izvora nedostatna, planirana je realizacija ovih projekata kroz instrument predpristupne pomoći IPA III „Regionalni razvoj”, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- Koordinator projekta izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Dokumentacija izrađena u prethodnom periodu koristila se u pregovorima oko kreditnih sredstava sa Evropskom investicionom bankom, kao i za razradu operativnog plana za korišćenje predpristupnih IPA fondova, čija realizacija je otpočela tokom 2015. godine.
- U 2017. godini realizovano je 855.658,78 €.

Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije odlagališta Vasove Vode u Beranama

- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje i izvršen izbor obrađivača Glavnog projekta sanacije postojećeg odlagališta "Vasove Vode" u Beranama.
- U 2016. godini izvedeni su radovi na hitnim sanacionim mjerama koji su obuhvatili zacjevljenje Lučkog potoka.
- U 2017. godini završen je i revidovan Glavni projekat, potpisan je ugovor za izvođenje radova i isti su u toku.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova .

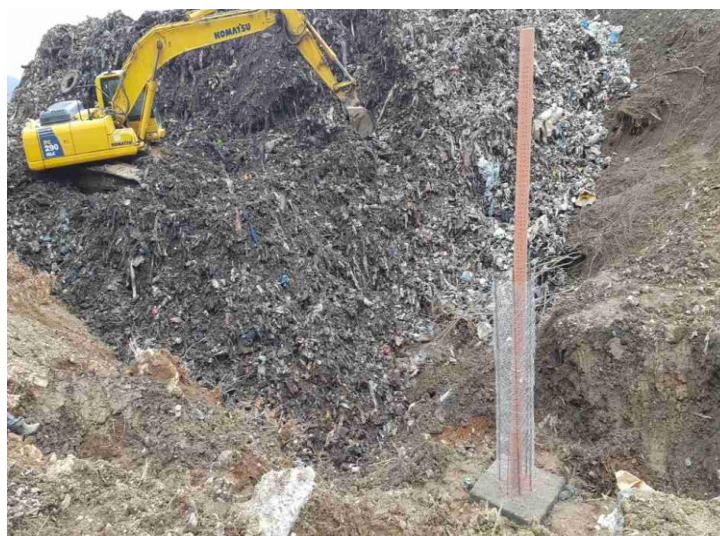

Glavni projekat kanalizisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja

- U prethodnom periodu ugovorena je izrada Glavnog projekta za kanalizisanje i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, izrađena prethodna hidrotehnička studija i ista je proslijeđena u julu 2016. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
- Potrebno je da Ministarstva održivog razvoja i turizma i Prijestonica usvoje studiju, odnosno da se izjasne o predloženim varijantama, kako bi se mogle nastaviti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za objekte u funkciji odvođenja otpadnih i atmosferskih voda.
- U 2018. godini planirano je da se nakon završetka izrade konačne verzije hidrotehničke studije u skladu sa istom nastave aktivnosti na izradi Glavnih projekata za objekte za kanalizisanje i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja.

Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu

- Direkcija javnih radova je raspisala u 2016. godini javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za obrađivača projektne dokumentacije i ugovorena izrada Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Idejnog projekta.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.



Glavni projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica,

Bogiševac u Pljevljima

- Direkcija javnih radova je raspisala u 2016. godini javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za obrađivača projektne dokumentacije i ugovorila njenu izradu.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat za rekonstrukciju i izgradnju kanizacionog sistema u naseljima Podbišće,

Juškovića potok i Ambarine u Mojkovacu

- Direkcija javnih radova je raspisala u 2016. godini javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za obrađivača projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovacu.
- Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donijela je rješenje kojim je usvojena Žalba i postupak vraćen na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku donijeto je rješenje o izboru najpovoljnije ponude protiv koga je takođe uložena Žalba pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2018. godini planirana je izrada projektne dokumentacije nakon okončanja postupka javne nabavke koje je u toku.

Glavni projekat za natkrivanje izvorišta "Bolje sestre" i izrada i revizija projektne i tehničke dokumentacije vodovodne i kanizacione mreže u naseljima crnogorskog primorja

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat za odvođenje atmosferskih voda sa područja Ulcinjskog polja

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat rezervoara Bistrica u Bijelom Polju (Sanacija postojeće kaptaze i izgradnja nove kaptaze na izvorištu Bistrica

- Opština Bijelo Polje je dostavila projekat. Nakon raspisanog javnog nadmetanja ugovoreni su radovi i isti su otpočeli.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova.

Glavni projekat cjevovoda za vodosnabdijevanja od naselja Pruška do Dobrakova u Bijelom Polju

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat rekonstrukcije tranzitne vodovodne mreže u Bijelom Polju

- Nije bilo aktivnosti.

Eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Bijelom Polju

- Izvršen transfer sredstava u skladu sa Protokolom u iznosu od 50.000€.

Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže za naselja na Cetinju

- Nije bilo aktivnosti.

Izmjene i dopune Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Rožajama

- Izrada projekta je u završnoj fazi.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.



4.2. Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada

Status projekta: U toku

Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima u skladu sa kojima se realizuju projekti na sanaciji postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore, kao i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta.

- U 2017. godini realizovano je 110.104,05€.

Glavni projekat transfer stanica u Mojkovacu

- U 2017. godini izrađen je glavni projekat i revizija istog je u završnoj fazi.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat transfer stanica u Andrijevici

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat transfer stanica u Plužinama

- U 2017. godini izrađen je glavni projekat i u toku je revizija istog.
- U 2018. godini planirane su aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat transfer stanica i Glavni projekat sanacije neuređenog odlagališta Zauglina u Šavniku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnih projekata transfer stanica i Glavni projekat sanacije neuređenog odlagališta Zauglina u Šavniku.
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, potpisan ugovor i radovi su otpočeli.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Glavni projekat transfer stanica u Beranama

- U 2017. ugovorena je izrada Glavnog projekta i ista je u toku.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i aktivnosti na realizaciji projekta, u skladu sa prioritetima koje odredi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat transfer stanica u Bijelom Polju

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat transfer stanica na Cetinju

- Nije bilo aktivnosti.

Glavni projekat transfer stanica u Pljevljima

- Nije bilo aktivnosti.

4.3. Sanacija deponije na Žabljaku

Status projekta: Završeno

- U 2015. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učešćem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora.
- Projekat je realizovan po sistemu „projektuj i izgradi“. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2015. godine.
- U 2016. godini nastavljene su aktivnosti, izrađena je i revidovana projektna dokumentacija i započeti su radovi koji su većinom završeni do kraja godine.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi uključujući i ozelenjavanje.
- Reviziju i stručni nadzor finansirala je Vlada Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova.
- U 2017. godini realizovano je 1.481,55 €.



4.4. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu u Herceg Novom

Status projekta: U toku



- Direkcija javnih radova je u 2014.godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju koja je u vezi s hidrotehničkim tunelom u Mojdežu, opština Herceg Novi. Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze.
- Radovi I faze podrazumijevali su sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350 m. Radovi su se odnosili na tunelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela.
- Radovi II faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela.
- Da bi se imao uvid u zatečeno stanje postojećeg tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije II faze, potrebno je isti u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Za ove radove raspisano je javno nadmetanje početkom 2016. godine, izabran je najpovoljniji ponuđač, ali je zbog žalbe tenderski postupak još u toku. Procijenjena vrijednost ovih radova je 286.000 €, a rok za završetak radova je 70 dana od dana uvođenja izabranog izvođača u posao. Radovi se mogu izvoditi samo u sušnom periodu, kada je nivo podzemnih voda u tunelu najniži.
- U 2018. godini, nakon okončanja javnog nadmetanja, planiran je početak i završetak radova i ugovornje i izrada projektne dokumentacije.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.


4.5. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda

Status projekta: U toku

- U 2017. godini odvijale su se aktivnosti na izgradnji vodovodnih sistema u više opština u Crnoj Gori. Izvođeni su radovi na vodovodu Krkori u Andrijevići III faza, vodovodu u Gusinju, Gradiošnici i vodovodu u Tivtu, Herceg Novom, Žablaku i vodovodu Lovnica u Rožajama III faza.
- Zaključkom Vlade br. 07-4017 od 21.12.2017 Vlada je usvojila informaciju o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekata izgradnje novog cjevovoda na putu Vladimir Krute – Ulcinj.
Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da iz ušteda po program 41501-812 - „Projekti očuvanja životne sredine”, projekat „Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja”, s pozicije 4413 – izdaci za građevinske objekte, sredstva u iznosu od 256.850,00€, prenese na žiro račun Opštine Ulcinj.
Navedena sredstva su prenešena na žiro-račun Opštine Ulcinj.
- Zaključkom Vlade br. 07-3763 od 14.12.2017. godine zadužilo se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da s Programa: 812 – Projekti očuvanja životne sredine sredstva u iznosu 43.568, 01€ i s Programa: 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture, sa izdataka: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu sredstva u iznosu od 55.994, 00€, prenese na žiro račun Opštine Rožaje, te su ista prenešena.
- U 2017. godini realizovano je 601.173,14€.

Vodovod Krkori u Andrijevici III faza

- U 2015. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodozahvata i izgradnji hlorne stanice na izvorištu Krkori, kao i radovi na izgradnji cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85 km.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radova na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda. Takođe, raspisano je javno nadmetanje i ugovoreno izvođenje radova na opremanju hlorne stanice i spajanju vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom. Ovi ugovoreni radovi završeni su u 2017. godini.
- Takođe, u 2017. godini, raspisano je i javno nadmetanje i ugovoreno je izvođenje radova III faze koja obuhvata izgradnju 7 km primarnog cjevovoda od hlorne stanice ka gradu i dogradnju vodozahvatne građevine sa pratećom opremom. Sa radovima će otpočeti kada se steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova III faze.

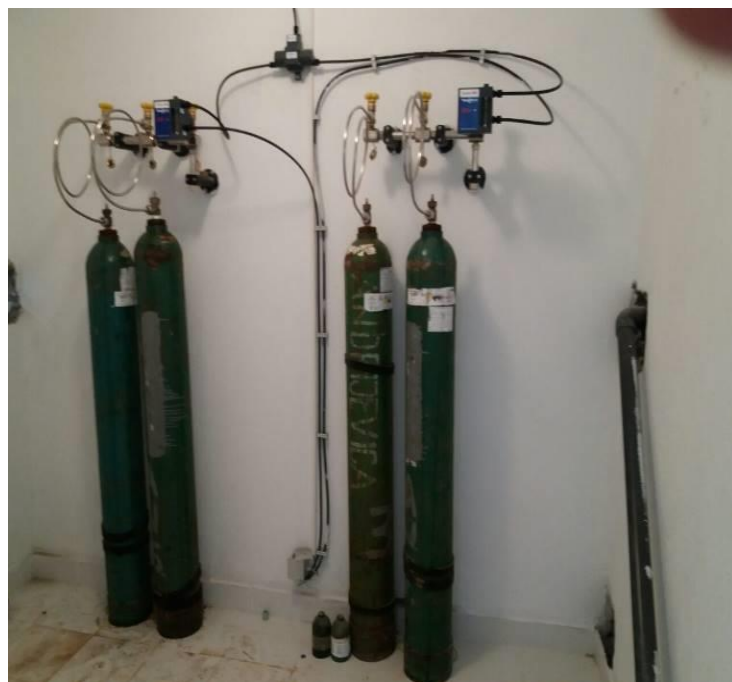

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u Gusinju

- U 2017. godini, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova i donijeta odluka o izboru izvođača radova.
- U 2018. godini planira se početak i završetak izvođenja radova.

Rezervoar "Gradiošnica" i sistem vodosnadbijevanja u Tivtu

- U toku je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju rezervoara Gradiošnica I.
- U 2018. godini nakon završetka postupka javnih nabavki i ugovaranja posla, planiran je početak i završetak izvođenja radova na izgradnji rezervoara, što predstavlja I fazu realizacije projekta.
- U 2018. godini takođe planirano je raspisivanje javnog nadmetanja, ugovaranje i početak radova na izgradnji dovodnih i odvodnih cjevovoda rezervoara, što predstavlja II fazu realizacije projekta.


Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u Herceg Novom

- Nije bilo aktivnosti.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na Žabljaku

- Direkcija javnih radova je sprovela aktivnosti na izradi Glavnog projekta I faze rekonstrukcije vodovodne mreže i isti je dostavljen Opštini Žabljak, pri čemu su Opština Žabljak i Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovali realizaciju projekta kroz saradnju sa CMSR-om.


- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i CMSR su potpisali donatorski ugovor za realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji I faze vodovodne mreže Žabljaka, kao i za aktivnosti na dovođenju vode iz Modrog jezera, po sistemu "projektuj- izgradi", u cilju poboljšavanja vodosnabdijevanja i unapređenja turističke ponude.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

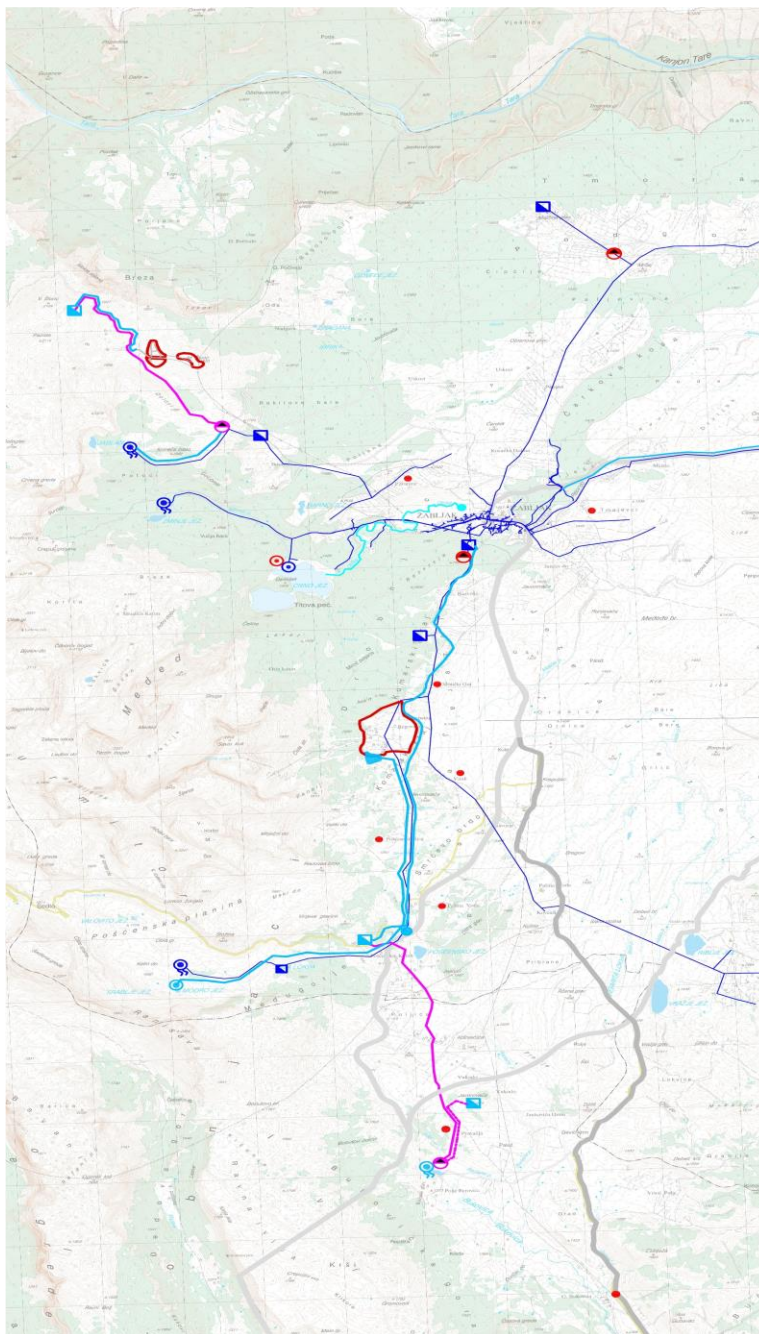

*Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže
Startegija vodosnabdijevanja opštine žabljak*

Vodovod Lovnica-izgradnja vodovodnog sistema na ruralnom području opštine Rožaje - III faza

- U 2015. godini Direkcija javnih radova je izradila Glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreno je izvođenje radova II faze koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Ćosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni.
- U 2017. godini ugovoreno je izvođenje radova za izgradnju primarnog cjevovoda za MZ Donja Lovnica i MZ Klanac što predstavlja III fazu realizacije projekta. Radovi III faze su započeli i izvođeni su radovi na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, dok su to dozvaljali vremenski uslovi.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova III faze.

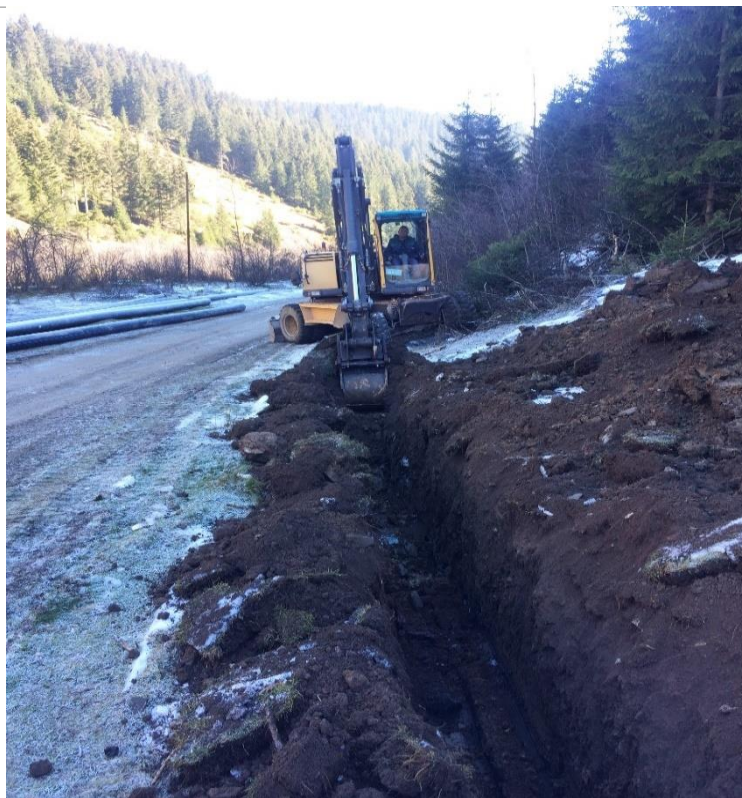

4.6. Vodosnabdijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin) gradska opština Tuzi

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je ugovor i nakon što je Gavni grad Podgorica pribavio građevinsku dozvolu, krajem godine započeti su radovi na izgradnji vodovoda u MZ Hoti, Gradska opština Tuzi, na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze.
- Takođe, u 2017. godini, u koordinaciji sa "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica ugovoreni su i radovi na izgradnji rezervoara Skorać, što predstavlja II fazu realizacije ovog projekta i sa istima će se otpočeti kad se stvore povoljni vremenski uslovi.
- U 2017. godini realizovano je 205.355,00 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova II faze.



4.7. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda

Status projekta: U toku

Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima u skladu sa kojima se realizuju projekti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sistema za odvođenje otpadnih voda.

- U 2017. godini realizovano je 297.190,78€.

Izgradnja kanalizacionog kolektora i uređenje korita rijeke Ibar u urbanoj gradskoj zoni Rožaja-I faza

- U prethodnom periodu posredstvom Direkcije javnih radova urađen je Glavni projekat I faze kanalizacionog kolektora koji obuhvata istovremeno i uređenje korita rijeke Ibar u urbanoj gradskoj zoni. U pitanju je višegodišnji projekat, a realizaciju projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja.
- U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača na izgradnji kanalizacionog kolektora i uređenje korita rijeke Ibar u urbanoj gradskoj zoni Rožaja -I faza.
- U 2018. godini. nakon završetka procedure javnih nabavki i ugovaranja posla, planiran je početak izvođenja radova I faze.

Glavni projekat izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacione mreže DUP-a "Šavnik-Jug" i "Šavnik- Sjever"

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Šavnik su dostavili projektni zadatak i UTU-e u junu 2017. godine, nakon čega su otpočele aktivnosti na pripremi dokumentacije za objavljivanje javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacione mreže DUP-a "Šavnik-Jug" i "Šavnik- Sjever" i isto je u toku. Na odluku o izboru izvođača radova uložena je žalba kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2018. godini. nakon završetka procedure javnih nabavki i ugovaranja posla, planirana je izrada i revizija projektne dokumentacije kao i izvođenje radova u skladu sa istom.

Sanacija ponora na Cetinju

- U 2017. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Prijestonica Cetinje su završili asktivnosti na izradi projektne dokumentacije,nakon čega je raspisano javno nadmetanje, izabran izvođač radova, radovi su započeli i isti su u toku
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak ugovorenih radova.



4.8. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

Status projekta: U toku

- U 2016. godini sprovedene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije toplane i gradskog toplovoda i kupovini briketa kao jednoj od mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima.
- Projektom je koordinirala Opština Pljevlja.
- U skladu sa potpisanim Protokolom Opština Pljevlja je bila zadužena za izradu projektne dokumentacije toplane i magistralnog toplovoda za povezivanje sa kotlarnicom u Skerlićevoj ulici, kao i za reviziju istog. Krajem 2016. godine projektna dokumentacija je završena, nakon čega je Opština Pljevlja raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova koje je poništeno.
- Direkcija javnih radova je krajem 2017. godine raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze i isto je u toku.
- U 2017. godini realizovano je 463.975,85 €.
- U 2018. godini, nakon završetka procedure javnih nabavki i ugovaranja posla, planiran je početak izvođenja radova.

4.9. Spajanje rijeke Bojane sa kanalom Port Milena u Ulcinju

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta je planirana u saradnji EIB-A, Ministarstva finansija, MORIT-a i Procon-a
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

4.10. Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih instalacija za prostor Veliki Pijesak i Utjeha u Baru

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nijesu sprovedene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

4.11. Postrojenje za prečišćavanje opasnih voda, tretman mulja i zbrinjavanje ostataka otpada u Podgorici

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekta koordiniraju Glavni grad i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

4.12. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekta koordinira Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
- Nakon što su završene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, raspisano je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg Izvođača radova i isto je u toku.
- U 2017. godini realizovano je 2.500,00 €.

4.13. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učešćem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi”. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- Reviziju i nadzor finansira Vlada Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2017. godini realizovano je 15.280,50 €.

- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

4.14. Sanacija odlagališta u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učećem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi”. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- Reviziju i nadzor finansira Vlada Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova.
- Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi.
- U 2017. godini realizovano je 17.785,50 € .
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

4.15. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

Status projekta: U toku

- Opština Plav koordinira realizacijom projekta. U toku je izrada Projektnog zadatka za izradu Studije izvodljivosti.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije.

4.16. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica – Radetina u Rožajama

Status projekta: U toku

- Projektnu dokumentaciju je dostavila Opština Rožaje, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova I faze.
- Na odluku o izboru izvođača radova uložena je žalba kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon okončanja postupka javnih nabavki, planirano je ugovaranje i izvođenje radova I faze, kao i raspisivanje javnog nadmetanja, ugovaranje i realizovanje radova II faze.

5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

5.1. Rekonstrukcija "Ribarske" ulice u Plavu

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2015. godini završena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Ribarske ulice u opštini Plav i zaključen je Ugovor za izvođenje radova.
- U 2016. godini dobijena je građevinska dozvola od strane Opštine Plav, ali usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa izvođač nije mogao biti uveden u posao.
- U 2017. godini, obzirom da nijesu rješeni imovinsko-pravni odnosi, početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice je odložen za 2018. godinu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.2. Rekonstrukcija ulice "Đeda Vojvodića" u Beranama

Status projekta: Završeno

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje i ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Đeda Vojvodića" u opštini Berane.
- U 2016. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda i glavnog fekalnog kolektora, nakon čega je gradilište usled zimskog perioda konzervirano do proljeća 2017. godine.
- U 2017. godini radovi su nastavljani i završeni.
- U 2017. godini realizovano je 298.835,01 €.



5.3. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu -II faza

Status projekta: Završeno

- U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija za potrebe izgradnje šetališta pored rijeke Tare od strane Opštine Mojkovac.
- Krajem 2015. godine nakon što je raspisano javno nadmetanje, zaključen je ugovor za izvođenje radova I faze koji se odnose na izvođenje hidrotehničkih instalacija (vodovod, atmosferska i fekalna kanalizacija) kao i na radove na izgradnji donjeg stroja.
- U 2016. godini započeti su radovi I faze i isti su završeni krajem oktobra 2016. godine.
- U 2016. godini nakon što je raspisano javno nadmetanje, zaključen je ugovor za izvođenje radova II faze koja obuhvata izgradnju gornjeg stroja i javne rasvjete. Zbog nepovoljnih zimskih vremenskih uslova radovi su odloženi za proljeće 2017. godine
- U 2017. godini radovi su započeti i isti su završeni.
- U 2017. godini realizovano je 243.358,45 €.



5.4. Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice i izvođenje radova

Status projekta: U toku



- U 2017. godini nakon dostavljanja projektnog zadatka, raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Mojковаčke ulice i magistralnog puta M 21 u Bijelom Polju, odabran obrađivač projektne dokumentacije, ugovor zaključen i izrada projektne dokumentacije je u toku.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije.

5.5. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

- U 2017. godini realizovano je 4.251.689,07€.

Status projekta: U toku

5.5.1. Lokalni putevi

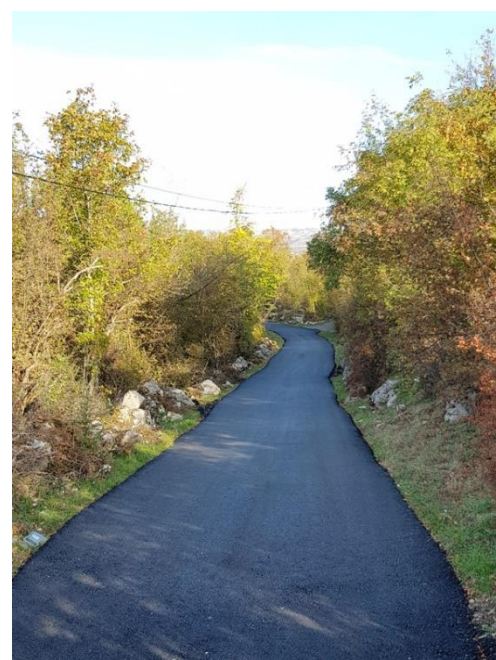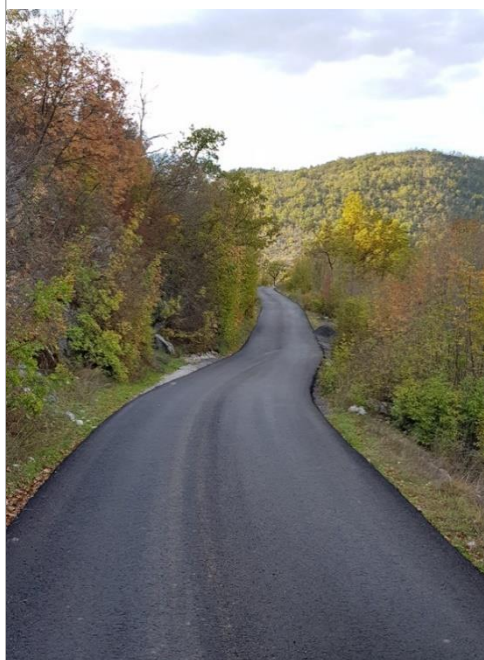

- U 2017. godini za projekte Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema planirano je 24 km lokalnih puteva, a budžetom je obezbijeđeno 500.000 €. Od planiranih radova završena je modernizacija lokalnih puteva u opštinama: Žabljak 1 km, Andrijevica 1km, Berane 1 km, Cetinje 1,5 km, Danilovgrad 1 km, Gusinje 1,5 km, Mojkovac 1,5 km, Nikšić 2 km, Plav 1,5 km, Plužine 1 km, Podgorica 2 km, Rožaje 1,5 km i Ulcinj 1 km.
- Takođe, u 2017. godini završeni su i radovi na modernizaciji lokalnih puteva koji su ugovoreni u 2016. godini i to u opštinama Andrijevica, Kolašin, Žabljak, Berane, Plužine, Petnjica, Ulcinj i Bijelo Polje.
- Od planiranih radova u 2017. godini preostalo je izvođenje radova u opštinama Bijelo Polje 1,5 km, Kolašin 1 km, Petnjica 1,5km, Šavnik 1 km i Berane 2 km.
- U toku su aktivnosti na izradi Glavnog projekta Brestica-Pričelje, u opštini Podgorica.
- U 2017. godini realizovano je 1.542.847,36€.
- U 2018. godini planiran je nastavak radova započetih u 2017. Godini, kao i izvođenje radova u skladu sa Kapitalnim budžetom i prioritetima lokalnih uprava.
- Zaključkom Vlade Crne Gore br.07-3761 od 7. decembra 2017. godine zaduženo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Direkcija javnih radova da uštede sa Programa : 812-Projekti očuvanja životne sredine, s pozicije 4412-izdaci za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 650.000,00 € i Programa 806- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata s pozicije 4413-Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 630.000,00 € prenese opštini Tivat za realizaciju projekta izgradnje lokalnog puta MR1 II faza u opštini Tivat.
- U toku je izvođenje radova na putu MR1 I faza u skladu sa sklopljenim ugovorom između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i "Luštica development".
- U 2017. godini realizovano je 1.280.000,00 € prenosom sredstava na žiro račun Opštine Tivat.

5.5.2. Gradske saobraćajnice

- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica po prioritetima koje su odredile lokalne uprave u skladu sa kapitalnim budžetom i u to u opštinama: Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje (Bajova i Njegoševa ulica), Kolašin, Mojkovac (Nemanjića ulica), Petnjica, Pljevlja, Podgorica (Cvjetna ulica), Rožaje, Šavnik (uređenje centra grada), Ulcinj (kaldrma u Starom gradu), Žabljak (ulica Baja Pivljanina, Vojvode Mišića), Plav, Andrijevica i Berane.
- Takođe u 2017. godini završeni su i radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica započetih u 2016. godini i to u Opštinama Žabljak, Bijelo Polje, Andrijevica, Pljevlja, Cetinje i Nikšić.
- U 2017. godini realizovano je 2.708.841,71€.
- U 2018. godini planiran je nastavak radova započetih u 2017. godini, kao i izvođenje radova u skladu sa Kapitalnim budžetom i prioritetima lokalnih uprava.

5.5.2.1. Gradske saobraćajnice u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- Krajem 2016. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u centralnoj gradskoj zoni za koje nije bilo pristiglih ponuda. U 2017. godini, ponovo je raspisano javno nadmetanje, potpisan je ugovor i radovi su zbog nepovoljnih vremenskih uslova odloženi za 2018. godinu.
- Radovi na izradi fekalne i atmosferske kanalizacije u nastavku ulice Lenke Jurišević su završeni.
- U 2017. godini ugovoreni su radovi na izradi prilaza na Mojkovačkoj ulici II faza i isti su završeni.
- Takođe, u 2017. godini raspisano je i javno nadmetanje za rekonstrukciju ulice Resnik, I faza, donešena odluka o najpovoljnijem izvođaču radova.
- U 2017. Godini realizovano je 311.248,90 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice Resnik.

5.5.2.2. Gradske saobraćajnice u Plavu

Status projekta: Završeno

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u opštini Plav, shodno prioritetima lokalne uprave. Nakon što je potpisan Ugovor o izvođenju radova i izvođač uveden u posao. Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2017. godini realizovano je 45.383,92 €.

5.5.2.3. Gradske saobraćajnice u Andrijevici

Status projekta: U toku

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u opštini Andrijevica, shodno prioritetima lokalne uprave. Nakon što je potpisan Ugovor o izvođenju radova i izvođač uveden u posao završeni su radovi na polaganju hidrotehničkih i elektroinstalacija, betonski ivičnjaci i trotoari, dok se asfaltni radovi nijesu mogli izvoditi usljed nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2017. godini radovi su nastavljani i isti su završeni.

Gradsko jezgro i ulica Branka Deletića

- Dostavljena je projektna dokumentacija za gradsko jezgro. Raspisano je javno nadmetanje i donešena je odluka za rekonstrukciju trotoara u ulici Branka Deletića.
- U 2017. godini realizovano je 68.198,93 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.



5.5.2.4. Gradske saobraćajnice u Pljevljima - rekonstrukcija

Status projekta: U toku

- U 2016. godini u skladu sa prioritetima Opštine Pljevlja zaključen je ugovor o građenju za rekonstrukciju ulice u naselju "Potrica", ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova izvođač nije uveden u posao.
- U 2017. godini radovi su započeti i isti su završeni.
- Raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za rekonstrukciju ulice 2 u naselju Dolovi III.
- U 2017. godini realizovano je 125.506,62 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.



5.5.2.5. Gradske saobraćajnice u Šavniku

Status projekta: U toku

- U skladu sa dostavljenom projektnom dokumentacijom raspisano je javno nadmetanje za radove na rekonstrukciji saobraćajnice Mali most na rijeci Šavnik – magistralni put Šavnik –Žabljak (I faza) i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču.
- U 2017. godini realizovano je 416,50 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.6. Gradske saobraćajnice na Cetinju

Status projekta: U toku

- Krajem 2015. godine Prijestonica Cetinje je dostavila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju "Bajove ulice", nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze.
- U 2016. godini potpisan je ugovor za radove I faze i do kraja 2016. godine završeni su radovi na priključnoj saobraćajnici- Hercegovačka ulica i otpočeti su radovi na hidrotehničkim i telekomunikacionim instalacijama.
- Krajem 2016. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze.
- U 2017. godini završeni su radovi I i II faze. Raspisano je javno nadmetanje za radove III faze i isti su završeni.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za izgradnju trotoara naspram rezidencije Predsjednika na Njegoševoj ulici. Radovi nijesu izvođeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2017. godini realizovano je 988.408,90€
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na izgradnji trotoara.



5.5.2.7. Gradske saobraćajnice u Nikšiću

Status projekta: Završeno

- U 2016. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova za nastavak rekonstrukcije Bulevara „13. Jul” u Nikšiću u dužini od 1.200 m, potpisan je Ugovor o građenju i radovi su započeti u oktobru.
- U 2017. godini radovi su nastavljani i isti su završeni.
- U 2017. godini realizovano je 1.072.201,04 €.



5.5.2.8. Gradske saobraćajnice u Ulcinju

Status projekta: U toku

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova I faze na rekonstrukciji kaldrme u Starom gradu na koji nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2017. godini nakon ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja odabran je izvođač radova i potpisan je ugovor. Radovi nijesu otpočeli zbog nepribavljanja građevinske dozvole.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.9. Gradske saobraćajnice u Baru

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Bar dostavila projektnu dokumentaciju za izgradnju pothodnika u Sutomoru, raspisano je javno nadmetanje na osnovu iste i krajem godine donešena je odluka o izboru Izvođača radova.
- U 2017. godini realizovano je 1.142,00 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.10. Gradske saobraćajnice u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Glavni grad Podgorica dostavio projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju "Cvjetne ulice" na Starom Aerodromu, raspisano je javno nadmetanje na osnovu iste i krajem godine donešena je odluka o izboru Izvođača radova.
- U 2017. godini realizovano je 6.677,40 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.11. Gradske saobraćajnice u Danilovgradu



Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nijesu izvođeni radovi na gradskim saobraćajnicama.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.5.2.12. Gradske saobraćajnice na Žabljaku

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ulice "Baja Pivljanina" - I faza i isti su zbog loših vremenskih uslova odloženi za 2017. godinu.
- U 2017. godine ugovoreni radovi su nastavljani i završeni.
- Raspisano je javno nadmetanje za radove II faze na Bajovoj ulici i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju ulice "Vojvode Mišića" i donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču.
- U 2017. godini realizovano je 44.263,45 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulica.

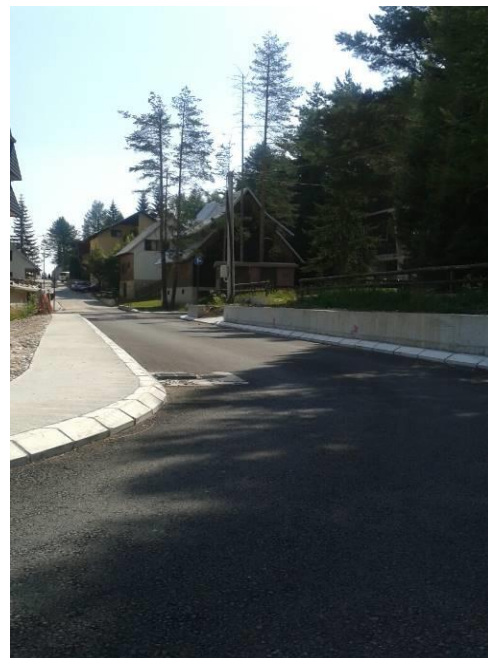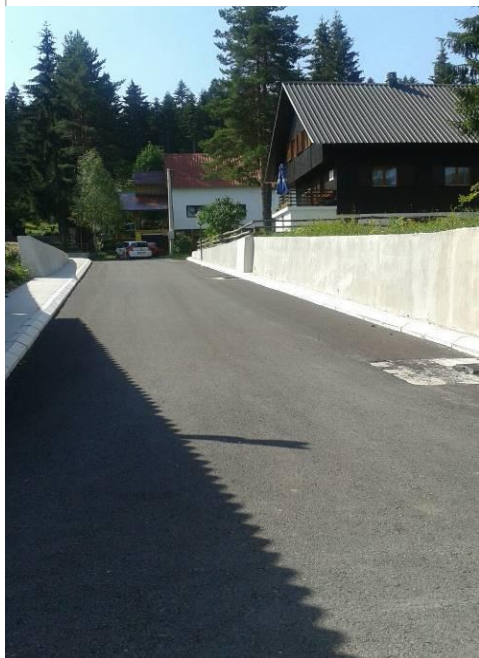

5.5.2.13. Gradske saobraćajnice u Beranama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji gradske saobraćajnice sa atmosferskom kanalizacijom za "Obalsku ulicu" sa kružnim tokom od parka do mosta "Nika Strugara".
- Radovi su odloženi zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.14. Gradske saobraćajnice u Kolašinu

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završeni su radovi I faze na sanaciji gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalne uprave. Takođe, raspisano je javno nadmetanje za II fazu i donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Zbog loših vremenskih uslova radovi II faze su odloženi za 2018. godinu.
- U 2017. godini realizovano je 42.894,05 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.15. Gradska saobraćajnica u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju "Nemanjića ulice", potpisan je ugovor i radovi su otpočeli. Završeni su radovi na polaganju instalacija fekalne kanalizacije, dijela atmosferske i vodovoda.
- U 2017. godini realizovano je 2.500,00 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.



5.5.2.16. Gradska saobraćajnica u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što su dostavljeni prioriteti od strane Opštine Rožaje, raspisano je javno nadmetanje na sanaciji gradskih saobraćajnica i odabran izvođač radova.
- Radovi su, zbog loših vremenskih uslova, odloženi za 2018. godinu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.5.2.17. Gradska saobraćajnica u Petnjici

Status projekta: U toku

- U skladu sa dostavljenom dokumentacijom raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju saobraćajnice u centru Petnjice i odabran izvođač radova.
- Radovi su, zbog loših vremenskih uslova odloženi za 2018. godinu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji ulice.

5.6. Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti u Danilovgradu

Status projekta: U toku

- U skladu sa potpisanim protokolom, Opština Danilovgrad je obezbijedila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju mosta "Radovan Pavićević" na rijeci Zeti na osnovu koje je Direkcija javnih radova u 2017. godini raspisala javno nadmetanje i odabrala Izvođača radova.
- U 2017. godini realizovano je 12.691,00 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

5.7. Izgradnja gradske pijace u Gusinju i na Cetinju-Njeguši

Status projekta: U toku

- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na izgradnji gradske pijace u Gusinju i na Njegušima, opština Cetinje.
- U 2017. godini realizovano je 254.010,76 €.

Gusinja

- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinja dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze na izgradnji gradske pijace u Gusinju i odabrala izvođača radova.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova I faze, kao i ugovaranje i izvođenje II faze radova.

Cetinje - Njeguši

- Prijestonica Cetinje u skladu sa potpisanim protokolom koordinira aktivnostima na izradi projektne dokumentacije i izgradnju gradske pijace na Cetinju-Njegušima.
- U 2017. godini izvođeni su radovi na uređenju terena i grubom razvodu instalacija.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

5.8. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

Status projekta: U toku

- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na regulaciji korita rijeke Grnčar u Gusinju, Lim i Zlorečice u Andrijevici, Bojane u Ulcinju i regulaciji potoka u Petnjici.
- U 2017. godini realizovano je 423.723,49 €.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Regulacija korita rijeke Lima dionica B u Andrijevici

- U 2017. godini izvođeni su radovi na regulaciji rijeke Lim nizvodno od mosta Seoci.
- Izvođeni su radovi na iskopima i izradi nasipa. Preostali su radovi na oblaganju kosina nasipa kamenom.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.



Uklanjanje sprudova u koritu rijeke Lim sa izradom obaloutvrde uzvodno od mosta u Zorićima, Andrijevisa

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za uklanjanje sprudova i izradu nasipa, na koje nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2018. godini planirano je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, kao i izvođenje istih.

Regulacija korita rijeke Zlorečice

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i odabran izvođač radova, ali zbog loših vremenskih uslova radovi su odloženi.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Regulacija potoka u Petnjici

- U 2017. godini, nakon što je Opština Petnjica dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu iste raspisano je javno nadmetanje na regulaciji potoka u Petnjici, odabran izvođač radova i zaključen ugovor.
- Radovi su izvođeni na čišćenju korita potoka, ali su isti obustavljeni i zbog loših vremenskih uslova i odloženi za 2018. godinu.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Uređenje korita rijeke Grnčar II faza

- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinje dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu iste raspisano je javno nadmetanje za regulaciju rijeke Grnčar II faza, nizvodno od pješačkog mosta, odabran je izvođač radova i zaključen ugovor.
- U 2017. godini izvedeni su radovi na čišćenju korita i izradi zaštitnog zida na lijevoj obali rijeke Grnčar.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Desni rukavac rijeke Bojane

- **Zaključak br. 07-3458 od 16. novembra 2017. godine**
- Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2985, od 5. oktobra 2017. godine i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane, opština Ulcinj. Zadužuje se Direkcija javnih radova da u tekućoj godini, kapitalnim budžetom obezbijedi sredstva za navedene aktivnosti u iznosu od 200.000,00€
- U 2017. godini, u skladu sa zaključkom Vlade prenešena su sredstva izvođaču radova za izvođenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane u vrijednosti od 200.000,00 €.

5.9. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama

Status projekta: U toku

- Izgradnja regionalne stočne pijace planirana je u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim, koji se nalazi na regionalnom putu Berane - Rožaje.
- Kompleks stočne pijace u Beranama prostire se na površini od 3.352 m².
- Planirani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje, kao i površine pješačke i kolske komunikacije u okviru pijace. Kolski pristup lokaciji i objektu je obezbijeđen sa lokalne saobraćajnice sa jugozapadne strane, kao i pješački pristup koji je predviđen sa iste strane. U sklopu pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50m koja opslužuje sve sadržaje u okviru kompleksa. U sjevernom dijelu pijace predviđen je parking prostor sa 6 parking mjesta za kamione. Na lokaciji pored stočne pijace planiran je parking za posjetioce, odnosno novoprojektovana ulica parkinga širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- U 2017. godini nakon što je Opština Berane dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste pristupila raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje predmetnih radova i zaključila ugovor sa Izvođačem.

- U 2017. godini radovi su započeli, ali su zbog loših vremenskih uslova isti obustavljeni i odloženi za 2018. godinu.
- U 2017. godini realizovano je 4.998,00 €.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

5.10. Izrada Glavnog projekta i geotehnička ispitivanja za rekonstrukciju puta Bar -Tuđemili - Virpazar, u naselju Kosovići u Baru

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom na to da strane Opštine Bar nijesu dostavljene urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.11. Izgradnja infrastrukture za odigravanje MOSI igara u Pljevljima

Status projekta: Završeno

- Realizacijom projekta koordinirala je Opština Pljevlja u skladu sa potpisanim Protokolom. Svi radovi na izgradnji infrastukturi za potrebe MOSI igara su završeni.
- U 2017. godini realizovano je 174.709,62 €.

5.12. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje i potpisala ugovor za izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo.
- U 2017. godini realizovano je 88.653,64 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

5.13. Izgradnja javne rasvjete na zaobilaznici u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Bijelo Polje dostavila projektnu dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje i potpisala ugovor za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na zaobilaznici u dužini cca 4.500 metara sa 106 stubnih mjesta sa 116 svjetiljki.
- U 2017. godini, izvođeni su radovi na polaganju instalacija javne rasvjete od čega je završeno 85% radova. Takođe, završena je i montaža 25 stubova javne rasvjete.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.



5.14. Radovi na produženju obale na Gat V u Luci Bar

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije sproveo je Korisnik i Opština Bar.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.15. Izgradnja javne garaže na Žabljaku

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini Opština Žabljak je sprovodila aktivnosti na usaglašavanju idejnog arhitektonskog rješenja javne garaže ukupne bruto površine cca 4.390 m², spratnosti prizemlje i tri sprata sa ukupno 80 parking mjesta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.16. Izgradnja gradske pijace u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je Opština Rožaje dostavila projektну dokumentaciju, Direkcija javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze i u toku je vrednovanje ponuda.
- Planirana je izgradnja gradske pijace ukupne bruto površine 1.370 m².
- Projektovana spratnost objekta je prizemlje i dva sprata. U prizemlju budućeg objekta planirani su sljedeći sadržaji: u prizemlju zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- Radovi I faze obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije.
- U 2017. godini realizovano je 9.980,00€.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova I faze, kao i ugovaranje i izvođenje radova II faze kojom bi se objekat stavio u funkciju.



5.17. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo u Gusinju

Status projekta: U toku

- Direkcija javnih radova je izradila projektну dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju, u ukupnoj dužini od oko 10km.
- Projekat se realizuje fazno, u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- U prethodnom periodu završeni su hitni radovi na izgradnji dionice puta od Stanice policije do Vojnog sela.
- U 2017. godini planiran je nastavak radova od Vojnog sela prema Gusinju, u dužini od 1,2 km, za koje je raspisano javno nadmetanje, odabran izvođač radova i zaključen ugovor.

- U skladu sa ugovorom isplaćen je avans, a radovi su zbog loših vremenskih uslova odloženi za 2018. godinu.
- Takođe u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na rijeci Vruji koji čini sastavni dio rekonstrukcije puta Plav- Vojno selo - Gusinje. Donešena je odluka o najpovoljnijem izvođaču radova.
- U 2017. godini realizovano je 177.122,57€.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na rekonstrukciji puta.

5.18. Izgradnja sjeverne zaobilaznice "Limski most-Rudopolje-Skič-Korito" u Plavu

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini planirana je izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova. S obzirom da Opština Plav nije dostavila urbanističko-tehničke uslove i Projektni zadatak nije bilo aktivnosti na ovom projektu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.19. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon sto je Opština Plav dostavila projektnu dokumentaciju, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova I faze, odabran izvođač i potpisan ugovor.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova I faze, kao i ugovarenje i izvođenje radova II faze koja predstavlja preostale radove za završetak rekonstrukcije ulice.

5.20. Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica

Status projekta: U toku

- U 2017. planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica u Plavu.
- Nakon sto je Opština Plav dostavila urbanističko-tehničke uslove i Projektni zadatak, isti su vraćeni Opštini na dopunu.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak izvođenja radova.

5.21. Uređenje užeg gradskog centra u Plavu

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini planirano je izvođenje radova na uređenju užeg gradskog centra u Plavu.
- S obzirom da Opština Plav nije dostavila projektnu dokumentaciju, nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

5.22. Uređenje korita rijeke Ibar

Status projekta: U toku

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova i donešena je odluka o najpovoljnijem izvođaču radova. Na donešenu odluku uložena je žalba za koju je u toku procedura kod Državne komisija za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na uređenju korita rijeke Ibar.

6. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA

6.1. Rekonstrukcija prostora za HLA (Humani Leukocitni Antigeni - Tipizacija tkiva) laboratoriju i HLA tipizaciju u Crnoj Gori u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što je projektna dokumentacija dostavljena od strane Korisnika dopunjena i dorađena, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova na adaptaciji postojećeg prostora u okviru Kliničko-bolničkog centra u Podgorici, namjenjenog za smještaj opreme za HLA laboratoriju i HLA tipizaciju. pristupila izradi tenderske dokumentacije. Nakon završenog javnog nadmetanja i potpisivanja ugovora, Kliničko- bolnički centar Crne Gore se izjasnio da odustaje od projekta usled prostorno-organizacione problematike.
- U 2017. godini realizovano je 5.948,81 € .

6.2. Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon što je projektna dokumentacija dostavljena od strane Korisnika dopunjena i dorađena, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i vrednovanje ponuda je u toku.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planirano je ugovaranje i početak i završetak izrade projektne dokumentacije, ugovaranje i početak izvođenja radova.

6.3. Privođenje namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici

Status projekta: U toku

- U cilju stavljanja u funkciju sprata objekata Doma zdravlja "Stara Varoš" u okviru istog potrebno je organizovati: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" organizovanjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora, administraciju.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača Glavnog projekta u cilju kompletiranja projektne dokumentacije za potrebe privođenja namjeni i stavljanja u funkciju spratova ranije rekonstruisanih predmetnih objekata. U toku je vrednovanje ponuda.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2017. godini sa ove pozicije realizovano je 264.055,76 € (Sredstva preusmjerena Zaključkom Vlade br. 07-4148).
- U 2018. godini, nakon izbora obrađivača Glavnog projekta, planirana je završetak izrade projektne dokumentacije kao i izvođenje radova.

7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

Status projekta: U toku

- Dom za stare osobe u Podgorici projektovane je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata, ukupne bruto površine 11.230 m².
- Objekat je predviđen za boravak 270 korisnika, a pored smještajnih jedinica sadržaće dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, prostorije za upravu, medicinski blok, prateće tehničke prostorije. Objekat će sadržati odvojene cjeline za dementne korisnike i za korisnike koji su na dnevnom boravku.
- U 2015. godini usaglašen je projektni zadatak sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Glavnim gradom, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U toku 2016. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje i potpisan je ugovor za izvođenje radova. Sa radovima se otpočelo krajem 2017. godine i isti su u toku. Završeni su radovi na rasčišćavanju lokacije i širokom otkopu.
- U 2017. godini realizovano je 807.389,85 €.
- U 2018. godini planiran je nastavak izvođenja radova.



7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Opština Nikšić koordinira izradu Glavnog projekta nakon čega će biti raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji objekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak izvođenja istih.

7.3. Izgradnja objekta i potrebne infrastrukture za objekte za socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Status projekta: U toku




- Prijestonica Cetinje koordinira aktivnostima na realizaciji infrastrukturnih priključaka za potrebe stambenog objekta na Cetinju za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u skladu sa potpisanim Protokolom.
- Obaveza Direkcije javnih radova je obezbjeđenje sredstava u iznosu do 100.000,00 €. Takođe, obaveza Direkcije javnih radova je i izgradnje pristupne saobraćajnice.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za radove na izgradnji pristupne saobraćajnice, odabran izvođač i zaključen ugovor. Radovi se nijesu izvodili zbog procedure pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2017. godini realizovano je 94.495,00 €.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova na saobraćajnici.



8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE

8.1. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

Status projekta: U toku

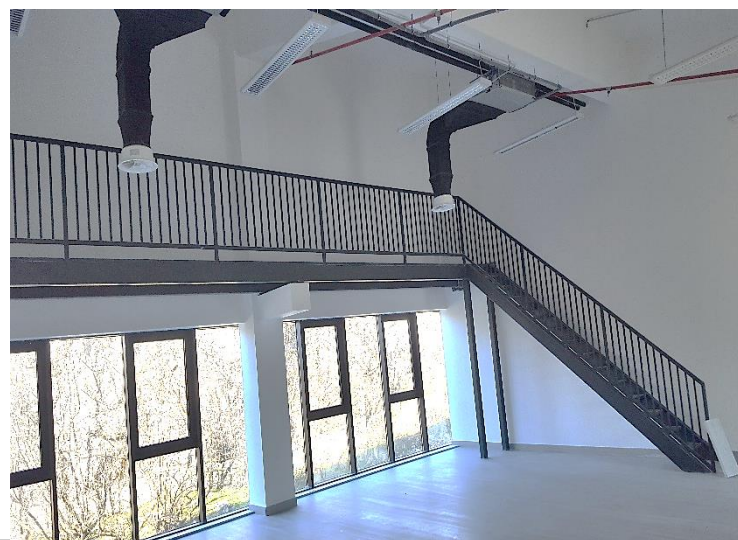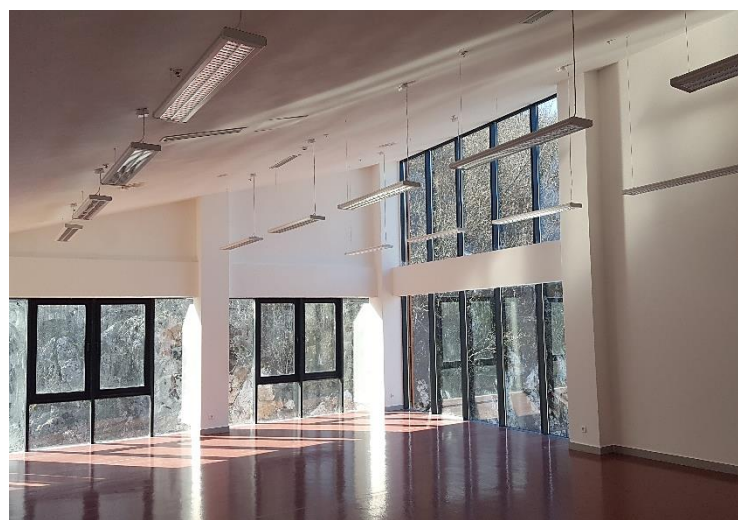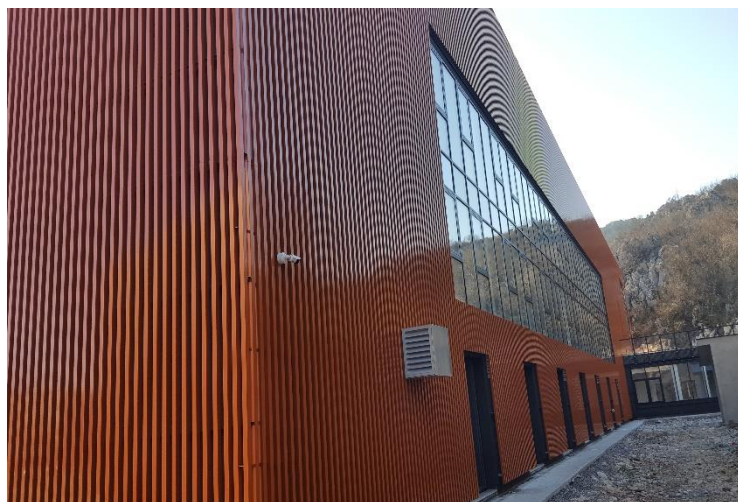

- Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod“. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha.
- U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Bruto površina kompleksa iznosi 22.086 m².
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok, ukupne bruto površine 4.980 m². Objekat zajedničkih kulturnih sadržaja je bruto površine 1.010 m² i obuhvata sljedeće: izložbene i multimedijalne prostore, knjižaru i administrativni blok sa pratećim sadržajima. Podzemna garaža je bruto površine 3.970 m², kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže je i energetske blok sa tehničkim prostorijama.
- Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine, a nakon izgradnje infrastrukturnih priključaka stvorili su se uslovi za pokretanje procedure pribavljanja upotrebne dozvole.
- Direkcija javnih radova je, nakon završetka procedure javnog nadmetanja u aprilu 2015. godine potpisala Ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa. Navedeni radovi su završeni u 2017. godini i u narednom periodu planirane su aktivnosti na tehničkom prijemu objekta.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, kao sljedeća faza realizacije projekta planirana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Nakon završene procedure javnog nadmetanja Direkcija javnih radova je početkom oktobra 2015. godine potpisala Ugovor o građenju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Projektovana bruto površina objekta iznosi cca 5.100 m². Objekat je razučene osnove različite spratnosti i sastoji se od prizemlja, jednog i dva sprata. Jedan dio objekta se zadržava kao revitalizovano nasljeđe industrijske arhitekture nekadašnjeg „Oboda“, dok ostalo predstavlja novoizgrađenu strukturu. Objekat je predviđen za održavanje nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, dizajna i fotografije. U 2017. godini završeni su radovi na izgradnji Fakulteta likovnih umjetnosti.
- U 2017. godini realizovano je 1.120.188,17 €.
- U 2018. godini planirano je u cilju stavljanja objekta u funkciju, raspisivanje javnog nadmetanja za opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena, a u skladu sa sredstvima koja budu obezbjeđena.

8.2. Dječiji vrtići iz kredita CEB-a –izgradnja i rekonstrukcija

Status projekta: U toku

- Sredinom juna 2013. godine Administrativni odbor Razvojne banke Savjeta Evrope je odobrio kreditnu liniju za izgradnju dječijih vrtića u iznosu od 10 miliona eura, na osnovu čega je potpisan Ugovor o uslovima i načinu korišćenja kreditnih sredstava.
- Tokom realizacije projekta planirano je da Direkcija javnih radova bude jedinica za implementaciju projekta, Ministarstvo prosvjete u ulozi Agencije za implemetaciju projekta, a Ministarstvo finansija korisnik kredita.
- Iz sredstava kredita je planirana izgradnja 7 novih vrtića, i to: 4 u Podgorici i po jedan vrtić u Baru, Ulcinju i Pljevljima.
- U 2017. godini realizovano je 2.005.168,68 €.

8.2.1. Vrtić na Starom Aerodromu u Podgorici

Status projekta: U toku



- Izgradnja objekta vrtića na Starom Aerodromu u Podgorici predviđena je na uglu "Cvjetne ulice" i Ulice "Mirka Banjevića" u Podgorici.
- Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 3.000 m² i planiran je za boravak 375 djece.
- U objektu su predviđeni sljedeći sadržaji: radne soba za jaslenu grupu, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, fiskulturna sala, biblioteka, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 3.000 djece (tri obroka dnevno) i koja će zadovoljiti potrebe na nivou Javne ustanove "Đina Vrbica", kao i vešeraj za potrebe 3.000 djece, sa svim pratećim sadržajima.
- U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije.
- U 2017. godini, nakon završetka žalbene procedure kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, potpisan je ugovor o građenju i početkom 2017. godine započeli su radovi na izgradnji objekta.
- U toku je izrada fasade i izvođenje zanatskih radova u objektu.

- Takođe, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izgradnju trafostanice neophodne za puštanje objekta u funkciju.
- U 2017. godini realizovano je 1.948.616,61€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

8.2.2. Vrtić u Baru

Status projekta: U toku

- Izgradnja objekta vrtića u Baru predviđena je u neposrednoj blizini osnovne škole.
- Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 2.960 m² i planiran je za boravak 370 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, sala za zajedničke aktivnosti, biblioteka, kuhinja sa svim pratećim prostorijama za cca 600 obroka, prostorije za trijažu i ostale tehničke prostorije.
- U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i isto je poništeno.
- U martu 2015. godine ponovno je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova, a nakon donošenja odluke o izboru izvođača radova koja je donijeta u julu 2015. godine, na istu je uložena žalba. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je proceduru vratila na ponovno vrednovanje, nakon čega je nova odluka donijeta u oktobru 2015. godine na koju je takođe uložena žalba.
- U 2016. godini, nakon dostavljanja Rješenja Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, izvršeno je ponovno vrednovanje pristiglih ponuda i javno nadmetanje je poništeno.
- U 2017. godini ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju i opremanje objekta u toku je vrednovanje dostavljenih ponuda.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je, nakon okončanja procedure javnih nabavki, početak radova na izgradnji.

8.2.3. Vrtić u Ulcinju

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 978 m² i planiran je za boravak 123 djece.
- U drugoj polovini 2015. godine Opština Ulcinj je donijela odluku o ustupanju lokacije na kojoj će se graditi objekat.
- Ministarstvo prosvjete koordinira aktivnosti na administrativnim procedurama za prenos vlasništva nad zemljištem na kojem će biti izgrađen objekat i iste su u toku.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta.

8.2.4. Vrtić u Pljevljima

Status projekta: U toku

- Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima predviđena je u naselju Guke.
- Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², za smještaj 67 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 400 djece (tri obroka dnevno), koja će zadovoljiti potrebe na nivou JU „Eko bajka” u Pljevljima.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba, a potom je i poništeno.

- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta.
- Nakon okončanja procedure javne nabavke i ugovaranja posla, krajem 2017. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2017. godini realizovano je 12.654,00 €.
- U 2018. godini, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak izvođenja istih.



8.2.5. Vrtić u Bloku VI u Podgorici

Status projekta: U toku

- Izgradnja vrtića predviđena je u naselju Blok VI u Podgorici.
- Objekat će biti ukupne bruto površine 1.515 m² i planiran je za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajna kuhinja, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba, a potom je i poništeno.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI, a Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i na isto je uložena žalba.
- Nakon okončanja procedure javne nabavke, potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta, nakon čega se prisupilo usaglašavanju konkursnog Idejnog rješenja sa smjernicama za projektovanje koje propisuje CEB.
- U 2017. godini realizovano je 27.350,83 €.
- U 2018. godini, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak izvođenja istih.



8.2.6. Vrtić u Tuzima

Status projekta: U toku

- Planirana je izgradnja objekta vrtića u Tuzima, na urbanističkoj parceli površine oko 5.600 m².
- Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektni zadatak u decembru 2015. godine, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U 2017. godini nakon okončanja procedure javnih nabavki za odabir obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, završena je revizija Glavnog projekta i u toku je procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- Projektovan je objekat prizemne spratnosti, bruto površine cca 1.400 m². Objekat će sadržati 11 radnih soba planiranih za 200 djece, multifunkcionalni prostor, kuhinju, prostorije za zaposlene kao i ostale prateće sadržaje. Šest soba će biti namijenjeno potrebama vrtića, a 5 radnih soba za dio jaslica.
- Takođe, u 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2017. godini realizovano je 16.547,24 €.
- U 2018. godini, nakon okončanja procedure javnog nadmetanja, planirano je ugovaranje izvođenja radova, kao i početak izvođenja istih.



8.2.7. Rekonstrukcija vrtića

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Nakon dostavljanja neophodne dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete pristupiće se daljim aktivnostima koje se odnose na izradu tehničke dokumentacija za rekonstrukciju više vrtića po prioritetima Ministarstva prosvjete.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon što su dostavljeni urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak od strane Korisnika, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta vrtića u Rožajama. Sa najpovoljnijim ponuđačem potpisan je ugovor i izrada projektne dokumentacije je u toku.
- U 2017. godini realizovano je 590.710,00 €.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje i početak izvođenja radova.



8.4. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za Osnovnu školu u Karabuškom polju, Gradska Opština Tuzi, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

8.5. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2015. godini usaglašen je Projektni zadatak sa korisnicima objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, nakon čega je u septembru 2015. godine Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja, u 2017. godini potpisan je ugovor o izradi Glavnog projekta rekonstrukcije objekta i u toku je izrada istog.
- U 2017. godini realizovano je 23.374,81 .
- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta.

8.6. Izgradnja objekta srednje stručne škole u Golubovcima, Gradska opština Golubovci

Status projekta: U toku



- Planirani objekat Srednje stručne škole u Golubovcima, ukupne bruto površine 5.480 m², sastojeće se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu su predviđene nastavne prostorije, prostorije za upravo, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina do 500 gledalaca.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- U 2016. godini donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Srednje stručne škole u Golubovcima.
- Zaključkom Vlade br. 08-858 od 08. maja 2015. godine Direkcija javnih radova je zadužena da sprovede proceduru javnih nabavki za izgradnju novog antenskog stuba Radio-difuznog centra umjesto postojećeg koji se nalazi na lokaciji planiranog objekta. Nakon stvaranja administrativnih preduslova, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju novog antenskog stuba, potpisan je ugovor sa Izvođačem i radovi su počeli i završeni su u 2017. godini.
- Prema zaključku Vlade Crne Gore br: 08-2507 od 15.09.2016 godine. Direkcija javnih radova je zadužena da sredstvima iz Kapitalnog budžeta izmiri obaveze po osnovu poravnjenja u postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava bivšim vlasnicima nepokretnosti na kojoj je planirana izgradnja škole. Postupak je u toku.
- U skladu sa Zaključkom Vlade br. 08-3041 od 8. decembar 2016. Godine, izvršen je prenos sredstava po osnovu poravnjenja u postupku oduzetih imovinskih prava bivšim vlasnicima nepokretnosti.
- Radovi na izgradnji objekta škole su otpočeli u januaru 2017. godine i isti su u toku. Do sada su završeni zemljani radovi i radovi na izradi temeljne konstrukcije, a armirano –betonski radovi su u završnoj fazi.
- U 2017. godini realizovano je 822.732,93€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

8.7. Izgradnja objekta OŠ u Gukama, Pljevlja

Status projekta: U toku

- Izgradnja Osnovne škole u Gukama u opštini Pljevlja realizuje se fazno.
- U 2011. godini je završena I faza radova koja je obuhvatila izgradnju Lamele „A” u okviru koje su učionice.
- U 2015. godini potpisan je Ugovor sa izvođačem radova za realizaciju II faze kojom je planirana izgradnja Lamele „B” – administrativni dio i Lamele „C” – fiskulturna sala.
- U 2016. godini, nakon pribavljanja građevinske dozvole, započelo se sa izvođenjem radova.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji II faze objekta i u toku je tehnički pregled. Takođe, u toku je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na opremanju lamele B i C.
- U 2017. godini realizovano je 157.317,87 €.
- U 2018. godini planiran je početak aktivnosti na opremanju objekta i završetak istih.





8.8. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Tološima u Podgorici


Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Planirana je izgradnja objekta osnovne škole za 1.200 učenika, na urbanističkim parcelama 4-2 i 4-4 u bloku 4, u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2“ u Podgorici.
- Na urbanističkoj parceli 4-4 planirana je izgradnja školskog objekta, dok je na urbanističkoj parceli 4-2 planirana izgradnja fiskulturne sale i otvorenih terena, uz mogućnost fazne izgradnje.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije bila dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini, dostavljeni su kompletirani urbanističko-tehničkih uslovi i Projektni zadatak od strane Ministarstva prosvjete, kada je u skadu sa novom zakonskom regulativom nadležnost za sprovođenje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja osnovne škole sa fiskulturnom salom u Tološima u Glavnom gradu Podgorica dodjeljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja što je nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, pristupit će se raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za Osnovnu školu u Tološima, Glavni grad Podgorica, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

8.9. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za potrebe Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama

Status projekta: Završeno

- Obaveza Opštine Berane je bila da sprovede aktivnosti na obezbjeđenju svih infrastrukturnih priključaka i izgradnji kotlarnice za potrebe Univerzitetskog centra.
- S obzirom da Opština Berane nije izvršila svoje obaveze, Direkcija javnih radova je u cilju stavljanja objekta Univerzitetskog centra u funkciju, a čija je rekonstrukcija i opremanje završeno u 2014. godini, predložila Polikliničkom centru da se postojeći prostor kotlarnice u okviru Poliklinike iskoristi za potrebe oba objekta. Na ovaj način riješeno je pitanje Planske dokumentacije koja ne predviđa izgradnju novog objekta kotlarnice.
- Nakon dobijanja saglasnosti od strane Polikliničkog centra, Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izgradnju infrastrukturnih priključaka i rekonstrukciju kotlarnice. Prvo javno nadmetanje u 2016. godini je poništeno jer nije bilo ispravnih ponuda, a nakon drugog javnog nadmetanja, u junu 2017. godine potpisan je Ugovor i izvođač je uveden u posao.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima. Takođe, završeni su i sanacioni radovi na Univerzitetskom centru i pribavljena je upotrebna dozvola.
- U 2017. godini realizovano je 227.341,30 €.

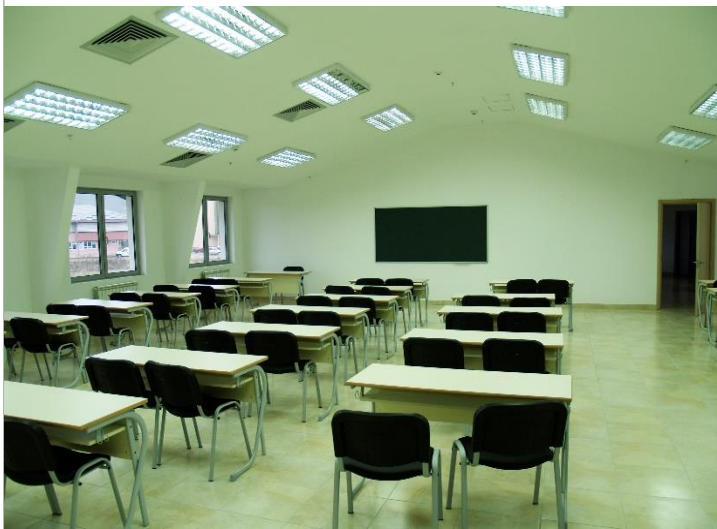

8.10. Izgradnja OŠ u Sukobinu u Ulcinju

Status projekta: U toku

- Protokolom br. 19/2-01-2733/1 od 25.06.2015. godine, zaključenim 09. juna 2015. godine između Dijaspore SAD, Opštine Ulcinj, Direkcije javnih radova i Ministarstva prosvjete Crne Gore, definisana je obaveza Direkcije javnih radova da, kroz sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, učestvuje u finansiranju školskog objekta u iznosu od jedne trećine njegove vrijednosti odnosno 100.000,00 €.
- Anexom I Memoranduma zaključenog 09.06.2015. godine konstatovano je da je Opština Ulcinj potpisala Ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i opremanju školskog objekta područne ustanove u MZ Sukobin OŠ »Bedri Elezaga«, u Vladimiru. Istim Anexom I Direkcija javnih radova se obavezala da izvrši prenos sredstava u ukupnom iznosu do 100.000 € na posebni žiro-račun Opštine Ulcinj za realizaciju ovog projekta.
- U 2017. godini realizovano je 100.000,00 €.

8.11. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon dostavljanja urbanističko-tehničkih uslova i Projektnog zadatka od strane Korisnika, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za rekonstrukciju toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica, odabrala izvođača i potpisala ugovor za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije toplane, čija je izrada u toku.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, sprovođenje procedure javnih nabavki za odabir izvođača radova, kao i početak izvođenja istih.

8.12. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Igalu u Herceg Novom

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija, urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak nijesu bili dostavljeni od strane Korisnika.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

8.13. Rekonstrukcija aneksa objekta O.Š. u Baću u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2017. godini aktivnosti je sprovodila Opština Rožaje u skladu sa potpisanim Protokolom.
- Izabran je izvođač radova i radovi su u završnoj fazi.
- U 2017. godini realizovano je 82.624,35 €.



8.14. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom

Status projekta: U toku

- U 2017. godini realizovano je 445.592,72€

Adaptacija objekta JU OŠ "Milan Vuković"

- U 2016. godini nakon okončanja procedure javnih nabavki, ugovoreni su radaovi na zamjeni rasvjetnih tijela, adaptaciji sanitarnih prostorija, zamjeni dijela fasadne bravarije, izradi mokrog čvora za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, zamjena krovnog pokrivača na muzičkoj sali.
- U 2017. godini svi ugovoreni radovi su završeni.

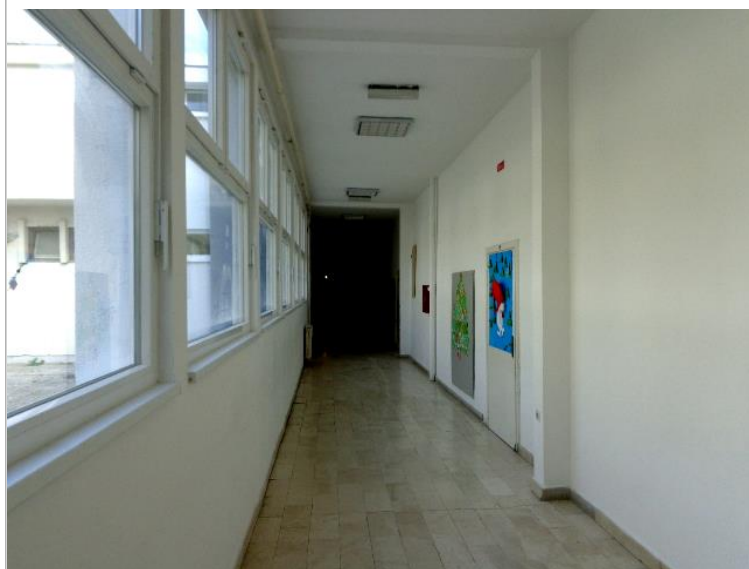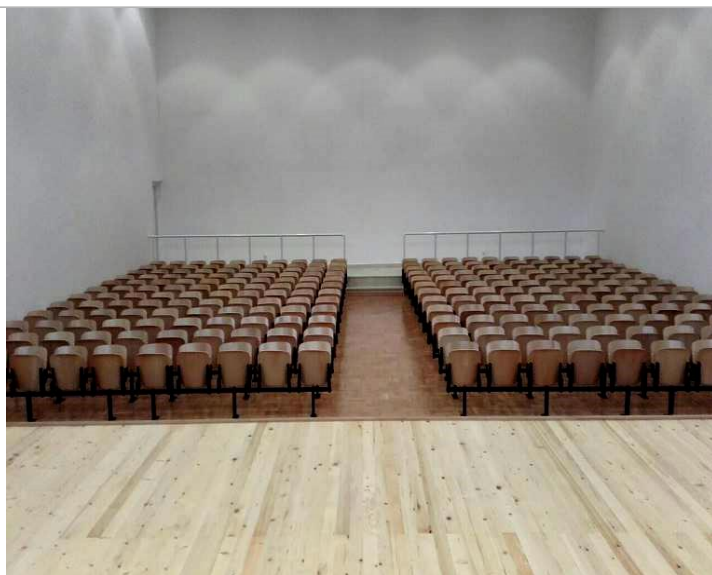

Sanacija klizišta objekta JPU „Naša radost“ na Savini

- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini u opštini Herceg Novi.
- Sanaciono rješenje klizišta-kosine na parceli vrtića JPU "Naša Radost" na Savini, Herceg Novi se sastoji od potporne konstrukcije koju čine dva reda bušenih šipova prečnika 100cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5m.
- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na sanaciji klizišta, odabran izvođač radova i potpisan ugovor te se otpočelo se sa izvođenjem radova.
- Završeni su pripremni i zemljani radovi, a u toku su radovi na bušenju i betoniranju šipova.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.



Sanacija klizišta objekta OŠ „Milan Vuković“ na Savini

- U 2017. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehničkim istraživanjima za objekat JU OŠ »Milan Vuković« u opštini Herceg Novi.
- U 2018. godini, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak izvođenja istih.

Rekonstrukcija objekta OŠ „Milan Vuković“ na Savini

- Nakon završetka Glavnog projekta sanacije klizišta pristupiće se izradi projektnog zadatka u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije objekta OŠ "Milan Vuković".
- U 2018. godini, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za obrađivača projektne dokumentacije.




Rekonstrukcija postojećeg školskog objekta - Zadužbina porodica Bošković, Đurović i Laketić u naselju Srbina u Herceg Novom

- U 2018. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta za rekonstrukcija postojećeg školskog objekta - Zadužbina porodica Bošković, Đurović i Laketić u naselju Srbina u Herceg Novom, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

8.15. Rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju

Status projekta: U toku

- Prijestonica Cetinje koordinira aktivnostima na rekonstrukciji i adaptaciji objekta.
- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na izvođenju radova III faze rekonstrukcije i adaptacije objekta za potrebe uspostavljanja Biznis inkubatora na Cetinju i isti su završeni.
- U 2017. godini realizovano je 293.500,00 €.
- U 2018. godini preostalo je plaćanje preostalih obaveza za izvedene radove.

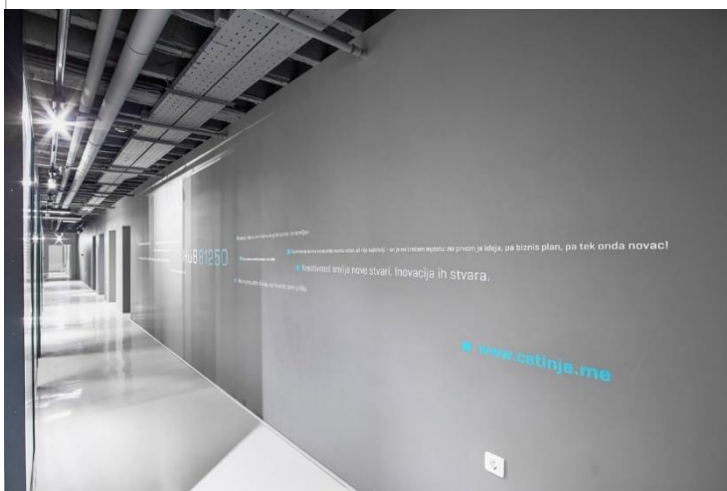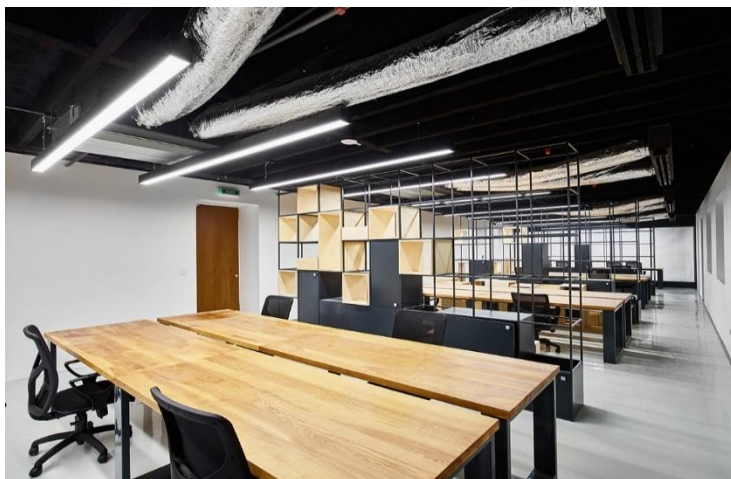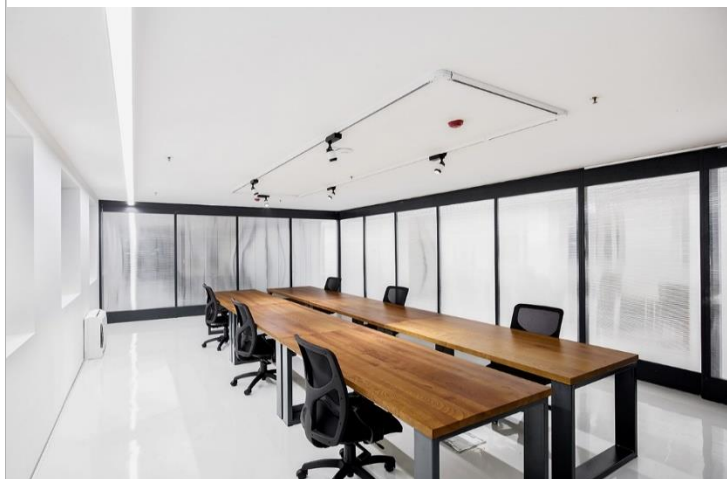

8.16. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- Osnovna škola i škola za Osnovno muzičko obrazovanje planirana je na lokaciji postojeće osnovne u Bijelom Polju.
- Objekat je projektovan kao savremeni i funkcionalni objekat, u skladu sa namjenom i ambijentom lokacije, spratnosti suteran, prizemlje i jedan sprat, ukupne bruto površine cca 5.500 m², za 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. U okviru osnovne škole planirane su sljedeći sadržaji: dvadeset učionica opšte namjene (površine min 60 m²) i šest kabineta za specijalne namjene sa pripremnim prostorijama, društvene višenamjenske prostorije, prostorija za cjelodnevni boravak, biblioteke, sale za fizičko vaspitanje sa potrebnim pratećim sadržajima, administrativne i ostale prateće sadržaje.
- Sadržaji Muzičke škole obuhvataju četiri učionice za grupnu nastavu, devet učionica za individualnu nastavu i četiri vježbaonice, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje. Planirano je da postojeći objekat Osnovne škole radi dok traje izgradnja planiranog novog objekta. Zbog toga je planiran novi objekat Osnovne i Muzičke škole na dijelu parcele koji je trenutno slobodan prostor, dok su na dijelu parcele gdje je postojeći objekat planirani sportski tereni i slobodne površine.
- Krajem 2017. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
- U 2017. godini realizovano je 5.000,00 €.
- U 2018. godini, nakon okončanja procedure javnih nabavki, planiran je početak izvođenja istih.

8.17. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja osnovne škole u Rožajama




Status projekta: U toku

- Opština Rožaje sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini planirana je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije.

9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

9.1. Ski centar „Kolašin 1600” u Kolašinu

Status projekta: U toku

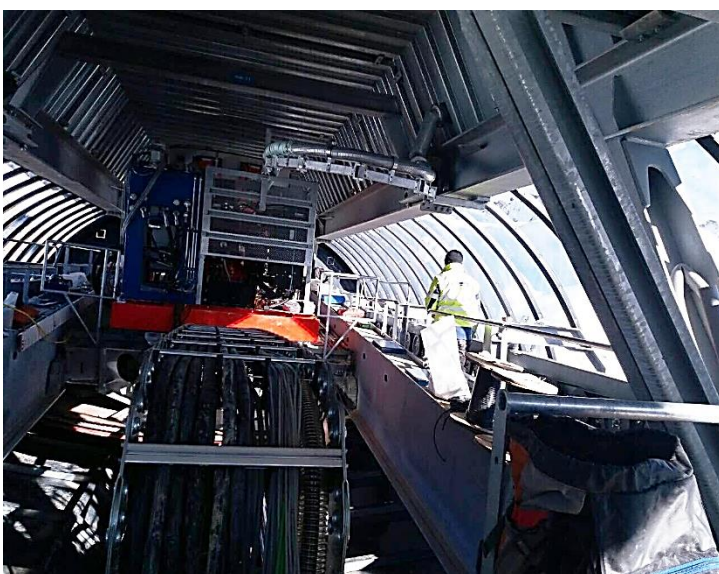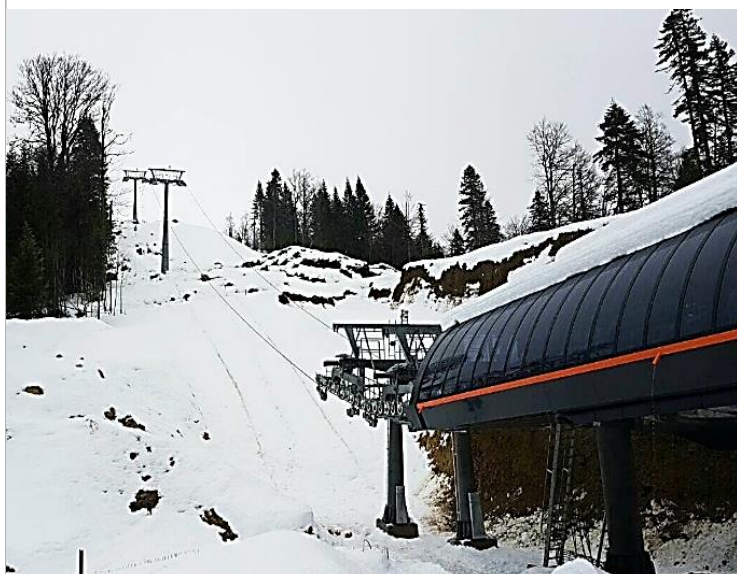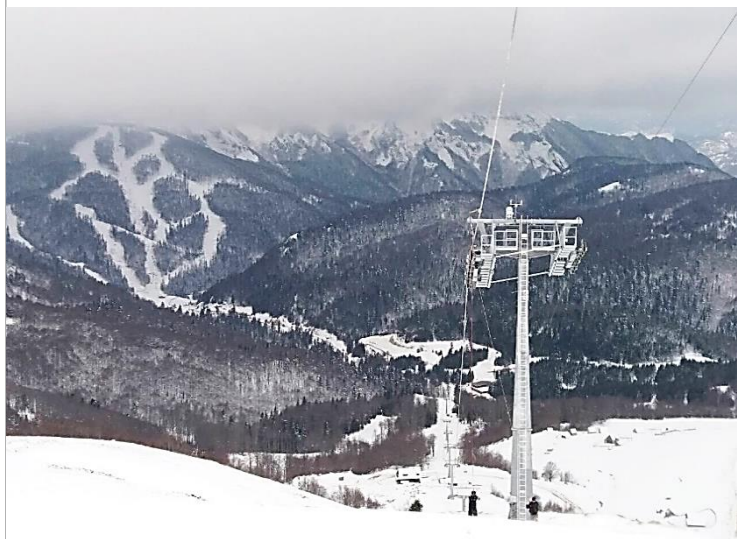



- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 4 km ski staza i nabavka neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2018. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza (izgradnja akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje). Planirani rok završetka II faze je u 2020. godini.
- U 2017. godini realizovano je 5.090.847,93 €.

Trafostanica 35/10 kV "Jezerine"

- Krajem 2014. godine potpisan je Ugovor za izgradnju primarne trafostanice 35/10kV na lokaciji Jezerine po principu „projektuj i izgradi”.
- U 2015. godine, nakon završetaka glavnog projekta, otpočelo je izvođenje radova I faze i isti su završeni u 2016. godini.
- U cilju stavljanja opreme pod napon i trafostanice u funkciju u skladu sa uslovima nadležne institucije, potpisan je ugovor sa izvođačem radova na priključenju predmetne trafostanice na elektrodistributivnu mrežu.
- U 2017. godini radovi su završeni i okončana je procedura tehničkog pregleda. U koordinaciji sa EPCG potpisan je Protokol u kome su definisane pojedinačne obaveze svih strana. U sklopu obaveza iz predmetnog protokola CEDIS je izvršio priključenje TS 35/10 kV Jezerine na dalekovod 35kV „Mušovića rijeka – Zekova glava“. U sklopu istog protokola CEDIS vrši fizičko obezbjeđenje objekta do sredine februara 2018. godine. Od većih obaveza preostalo je da CEDIS završi projektovanje i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke na 35kV strani, što je uslov za priključenje TS Jezerine podzemnim kablom na mHe „Mušovića rijeka“. Obaveza CEDIS- a za završetak svih radova je 15. septembar 2018. godine.

Bazna stanica

- Krajem 2014. godine potpisan je Ugovor za izgradnju bazne stanice po principu „projektuj i izgradi”, koji je obuhvatio izradu Glavnog projekta i izvođenje radova I faze, koja obuhvata izgradnje grubih građevinskih radova i razvod instalacija.
- U 2015. godini izvođeni su pripremni radovi.
- U 2016. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova I faze.
- Takođe u 2016. godini je raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze koja obuhvata preostale zanatske radove, instalaterske radove i opremanje objekta i uređenje terena.

- U 2017. godini završeno je izvođenje radova I faze i započeli su radovi II faze.
- U 2018. godini planiran je završetak izgradnje i opremanja objekta.

Rekonstrukcija puta od ski centra „Kolašin 1450” do ski centra „Kolašin 1600”

- U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju lokalnog puta od ski centra „Kolašin 1450” do ski centra „Kolašin 1600” u dužini od cca 2 km.
- U 2016. godini nakon okončanja procedure javnih nabavki izabran je izvođač radova I faze na rekonstrukciji puta koja se odnosi na izvođenje zemljanih radova, potpornih zidova i armirano - betonskih cjevastih propusta za dio trase u dužini 1,1 km. Radovi I faze su započeti nakon pribavljanja upotrebne dozvole.
- Takođe, u 2016. godini zaključen je ugovor za radove II faze koji se odnose na izvođenje zemljanih radova, potpornih zidova i armirano - betonskih cjevastih propusta za dio trase u dužini 0,9 km, kao i preostalih radova na završetku rekonstrukcije kompletnog puta.
- U 2017. godini završeni su radovi I faze i započeti su radovi II faze. Od radova II faze završeno je izvođenje zemljanih radova u dužini od 0,6 km.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Izgradnja parkinga za dnevne skijaše

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova za izgradnju parkinga za dnevne skijaše, odabran je izvođač i potpisan ugovor.

U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Izgradnja žičare - šestosjed K8/D6C


- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju žičare šestosjeda K8/D6C po sistemu „Projektuj i izgrad” na lokalitetu Kolašin 1600mm -Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom Glavnog projekta za izgradnju staza u dužini od 4 km i Glavnog projekta osnježavanja staza i akumulacionog jezera i isto je poništeno.
- Krajem 2015. godine ponovljen je postupak javnog nadmetanja.
- U 2016. godini, nakon što je rok otvaranja ponuda više puta odlagan zbog uložених žalbi, procedura javne nabavke je završena i u oktobru je potpisan Ugovor za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji isklupive šestosjedne žičare K8, sa puštanjem u rad, ski staza u neposrednoj blizini žičare K8 u ukupnoj dužini od cca 4 km, projektovanje staza predviđenih Detaljnom razradom Kolašin 1600 i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje na lokalitetu Kolašin 1600 u opštini Kolašin.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta za izgradnju žičare. U junu mjesecu su započeti pripremni radovi. Do sada je završena izgradnja polazne i izlazne stanice, izgradnja svih stubova i postavljena su čelična užad, što ukupno iznosi oko 80% svih radova.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.

Vodosnabdijevanje

- U 2015. godini završena je izrada Studije izvodljivosti vodosnabdijevanja ski centra „Kolašin 1600”, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice.
- U 2016. godini završena je izrada Glavnog projekta i ugovoreni radovi na vodosnadbijevanju bazne stanice.
- U 2017. godini započeta je procedura pribavljanja građevinske dozvole i ista je u toku.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

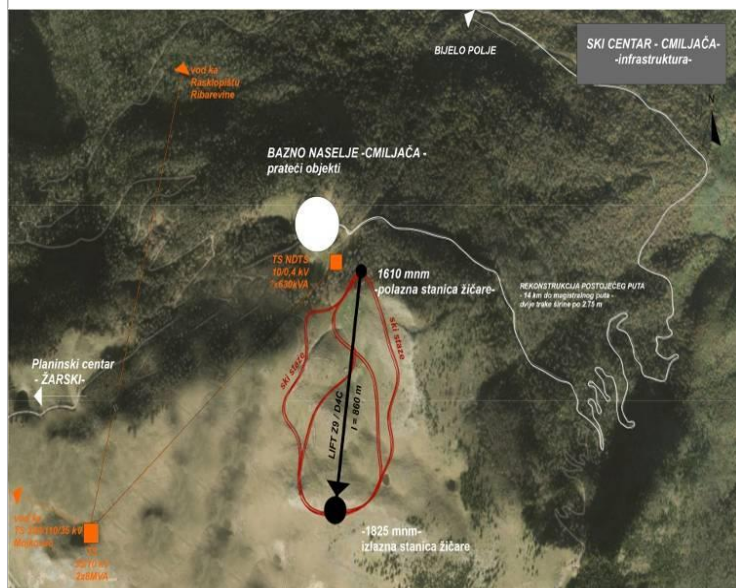

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka radova I faze je kraj 2020. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka radova II faze je u 2022. godini.
- U 2017. godini realizovano je 765.134,07 €.

Rekonstrukcija puta Ravna rijeka – Jasikovac

- U prethodnom periodu završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5,5 km i izvođenje radova na dionici od Latinske kose do Jasikovca u dužini 4,8 km, osim na dijelu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa (350m) i klizišta na lokaciji Latinska kosa (200m).
- U 2016. godini izabran je izvođač radova za izgradnju mosta na rijeci Ljuboviđi sa prilaznim saobraćajnicama.
- U 2017. godini, nakon dobijanja građevinske dozvole otpočelo se sa izvođenjem radova na izgradnji mosta na rijeci Ljuboviđi, isti su završeni i izdata je upotrebna dozvola.

- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju preostalog dijela puta od magistrale, uključujući priključak na magistralu do Latinske kose u dužini 500 m, izabran je izvođač radova i potpisan ugovor. Sa radovima sa nije moglo otpočeti, s obzirom na to da je u toku procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Rekonstrukcija puta Jasikovac-Cmiljača

- U prethodnom periodu urađena je projektna dokumentacija za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 10km.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji puta u dužini od 1,2 km, koji se odnose na radove donjeg stroja, odvodnjavanju trupa puta i izradu armirano-betonskih zidova.
- U 2017. godini donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača radova i potpisan ugovor za rekonstrukciju I faze u dužini od 1,2 km. Sa radovima sa nije moglo otpočeti, s obzirom na to da je u toku procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje i potpisan ugovor za izvođenje radova II faze u dužini od 3.6km. Sa radovima sa nije moglo otpočeti, s obzirom na to da je u toku procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova I i II faze.

Vodosnabdijevanje

- U 2015. godini potpisan je Ugovor za izradu Prethodne Studije vodosnabdijevanja za lokalitet Cmiljača.
- U 2016. godini nastavljena je i završena izrada Studije i raspisano javno nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice.
- U 2017. godini potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice za lokalitet „Cmiljača“ i isti je završena i predat na reviziju.
- U 2018. godini planiran je završetak projektne dokumentacije, ugovaranje i početak izvođenja radova.

Elektroenergetska infrastruktura- TS 35/10 "Cmiljača"

- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta izgradnje TS 35/10 "Cmiljača" i nakon okončanja žalbenog postupka, u 2016. godini izabran je obrađivač projektne dokumentacije.
- U 2017. godini završena je izrada Glavnog projekta na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova koje je u toku.
- U 2018. godini planiran je početak izvođenja radova.

Izgradnja žičare Z7

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje po sistemu "projektuj-izgradi" za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju žičare sa izradom Glavnog projekta ski staza i sistema za osnježavanja i izvođenje radova na izgradnji 3km ski staza i postavljanju žičare. Na tom javnom nadmetanju za nabavku nove žičare šestosjed na lokalitetu „Cmiljača“ nije bilo ponuda.
- U 2017. ponovljeno je javno nadmetanje, a otvaranje ponuda je zakazano u 2018. godini.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak radova.

9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski u Mojkovcu

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka radova I faze je kraj 2020. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka radova II faze je u 2022. godini.
- U 2017. godini realizovano je 1.166.858,19 €.

Lokalni put Vragodo-Vrioca-Žarski katun

- U 2015. godini završen je i revidovan Glavni projekat rekonstrukcije putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katunu dužini 5,3 km.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova I faze.
- U 2017. godini izabran je izvođač radova I faze za rekonstrukciju putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katun u dužini 2,2 km i radovi su započeti u avgustu mjesecu. I faza radova odnosi se na izvođenje zemljanih, betonskih i radova na odvodnjavanju trupa puta. Do sada su završeni radovi na proboju i 40% armirano-betonskih radova.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje i potpisan ugovor za izvođenje radova II faze koji se odnose na izvođenje zemljanih, betonskih i radova na odvodnjavanju trupa puta u dužini 3,1 km, kao i završetak svih preostalih radova na rekonstrukciji čitavog puta. Radovi nijesu izvođeni zbog procedure pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2018. godini planiran je nastavak radova I faze i početak i završetak radova I i II faze.

Regionalni put Mojkovac-Vragodo

- U 2016. godini potpisan je Ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta za izradu regionalnog puta Mojkovac- Vragodo dužine 8,5 km.
- U 2017. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije i ista je u završnoj fazi.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izradu idejnog projekta mosta na rijeci Tari koji povezuje magistralni put M2 sa regionalnim putem Mojkovac-Vragodo-Lubnice, potpisan ugovor i izrada projektne dokumentacije je u toku.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak radova.

Bazna stanica

- Projektom izgradnje bazne stanice koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini nijesu se stvorili uslovi za raspisivanje javnog nadmetanja za izgradnju bazne stanice po sistemu „projektuj-izgradi“.
- U 2018. godini planiran je nastavak realizacije projekta.

9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Period realizacije je 2014. - 2023. godina. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2017. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, Idejnih rješenja, Studija, Idejnih projekata, Glavnih projekta, investicionih elaborata i ostale projektne i tehničke dokumentacije za potrebe Ski centra "Hajla", kao i nastavak izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta Rožaje – Štedin (7 km).
- U 2017. godini realizovano je 206.940,15 €.

Planska dokumentacija

- U 2016. godini, shodno zaključku Vlade Crne Gore br. 08-3353 od 28. decembar 2016. godine realizovan je prenos preostalih sredstava Opštini Rožaje za izradu Lokalne studije lokacije u iznosu od 549.118,88 €.
- Izradu planske dokumentacije sprovodi Opština Rožaje što je i preduslov za dalje aktivnosti na izgradnji ski centra.
- U 2017. godini Opština Rožaje je sprovela aktivnosti na izradi studije lokacije i ista je predata Ministarstvu održivog razvoja i turizma na usvajanje.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Putna infrastruktura

- U 2014. godini završena je izrada Glavnog projekata rekonstrukcije putnog pravca Rožaje – Štedin u dužini 7,3km.
- U 2015. godini započeti su radovi na izgradnji I faze u dužini 850 m, uključujući sve pozicije radova, osim ugradnje habajućeg - završnog asfaltnog sloja.
- U 2016. godini nastavljeni su radovi I faze i isti su završeni. Takođe, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova II faze u dužini 2,2 km (zemljani radovi, odvodnjavanje i armirano-betonski zidovi). Potpisan je Ugovor o izvođenju radova, ali usled nepovoljnih vremenskih uslova Izvođač nije uveden u posao.
- U 2017. godini su otpočeli radovi II faze na izgradnji puta Rožaje –Štedin, odnosno proboja puta u dužini od 2,3km. Radovi su zbog loših vremenskih uslova obustavljeni i isti su odloženi za 2018. godinu.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova III faze, izabran izvođač radova i potpisan ugovor. Sa završetkom radova III faze biće završena rekonstrukcija puta Rožaje-Štedin u dužini 4.8km bez asfaltnog zastora.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak II faze radova, kao i početak i završetak radova III faze.

9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor na Žabljaku

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2017. godinu odnose se na izradu i reviziju planske dokumentacije, tehničke i projektne dokumentacije, i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektrenergetskih, telekomunikacionih i hidrotehničkih infrastruktura, vodozahvata i akumulacija, pristupnih puteva i saobraćajnica, prilaznih saobraćajnica sa parking prostorom, baznih stanica i pratećih objekata, ski staza, žičara i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Period realizacije projekta je 2014. - 2020. godina.
- U 2017. godini realizovano je 210.671,97 €.

Izgradnja 1,5 km ski staza

- Na dijelu skijališta „Savin kuk” koji se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Durmitor” - opština Žabljak, predviđena je izrada projektne dokumentacije na nivou Idejnog rješenja i Glavnog projekta i izgradnja dvije nove ski staze u dužini 1,5 km.

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi" i potpisan ugovor.
- U 2017. godini, nakon procedure pribavljanja saglasnosti za izradu geodetske podloge u II i III zoni zaštite Nacionalnih parkova, završena je izrada i revizija Glavnog projekta. U toku su aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalnih parkova na promjeni granica zaštite nacionalnih parkova u cilju dobijanja dozvola za izvođenje radova.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Projektovanje 21 km ski staza

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju 21 km ski staza.
- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja izabran je projektant i uložena je žalba na odluku o izboru Državnoj komisiji za kontrolu javnih nabavki po treći put. Dokumentacija se nalazi u Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2018. godini planiran je nastavak realizacije projekta.

Izgradnja prilaznog puta dužine 1,5 km

- U 2016. godini urađena je projektna dokumentacija za 1,5 km prilaznog puta i raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova u dužini od 1,5 km.
- U 2017. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova i izvršena isplata ugovorenog avansa. Radovi nijesu izvođeni zbog procedure dobijanja građevinske dozvole.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Izgradnja parkinga za 300 vozila

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za modernizaciju postojećeg parkinga na lokalitetu Savin Kuk, izabran je izvođač radova i potpisan ugovor.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Rekonstrukcija prilazne saobraćajnice dužine 5 km

- U 2016. godini ugovorena je izrada Glavnog projekta prilazne saobraćajnice od magistralnog puta do skijališta "Savin kuk" u dužini od 5 km.
- Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje i početak izvođenja radova.

Vodosnabdjevanje

- U 2016. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg obrađivača Strategije razvoja vodosnabdjevanja opštine Žabljak.
- U 2017. godini Studija vodosnabdjevanja je izrađena i pribavljena je saglasnost Opštine Žabljak na istu. Opština Žabljak je uradila Idejni projekat za izgradnju cjevovoda Modro jezero - Savin Kuk i izgradnju vještačkog akumulacionog jezera.
- Potpisan je donatorski ugovor za realizaciju ovog projekta između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije (CMSR), kojim su obezbjeđena donatorska sredstva u iznosu od 900.000 €. CMSR je u skladu sa donatorskim ugovorom izabrao izvođača radova po sistemu "projektuj-izgradi" i isti su u toku.
- Vlada Crne Gore kroz Kapitalni budžet finansira reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i početak radova.

Nabavka žičare sa izgradnjom ski staza

- U 2017. raspisano je javno nadmetanje za Izradu Glavnog projekta i nabavku i ugradnju žičare i izvođenje radova na izgradnji 4km ski staza. Otvaranje ponuda je zakazano u 2018. godini.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak radova.

9.6. Turistička infrastruktura, izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na izradi i reviziji planske, tehničke i projektne dokumentacije kao i izvođenje radova za objekte od javnog i opšteg interesa i objekata i infrastrukture za potrebe unapređenja turističke ponude, na projektima Venecijansko bijenale, Suvi bob na Žabljaku, Prethodna studija izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore-Virpazar, Žičara Kotor-Cetinje, Panoramske rute, Nabavka dva voza na električni pogon za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero, Revitalizacija Žugića luke u NP Durmitor, Modernizacija lokalnih puteva - Javorje, Izgradnja parkinga prema Crnom jezeru, Izmještanje puta prema Tepcima.
- U 2017. godini realizovano je 42.498,00€.

Venecijansko bijenale

- Izvršena su plaćanja u skladu sa obavezama iz prethodne godine.

Suvi bob na Žabljaku

- U 2016. godini potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju suvog boba na Žabljaku na lokalitetu Savin Kuk.
- U 2017. godini započeta je izrada projektne dokumentacije i urađeno je idejno rješenje na koje je Turistički centar "Durmitor" dao saglasnost. U skladu sa idejnim rješenjem nastavljeni su radovi na izradi Glavnog projekta.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak izrade projektne dokumentacije.

Prethodna studija izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore-Virpazar

- U cilju valorizacije turističke ponude Crne Gore u 2017. godini ugovorena je izrada Prethodne studije izvodljivosti revitalizacije i turističke valorizacije uskotračne željezničke pruge Bar-Sutomore-Virpazar i u toku je izrada iste.
- Na prvu dostavljenu verziju studije recenzent nije dao pozitivno mišljenje. U toku su ispravke po primjedbama recenzenta.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak izrade studije.

Žičara Kotor-Cetinje

- U prethodnom periodu formirana je komisija za raspisivanje javnog nadmetanja po principu "projektuj i izgradi, finansiraj, upravljaj, prenesi".
- U 2017. godini na ponovljeno javno nadmetanje pristigla je jedna ponuda i donešena je odluka o izboru.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na praćenju projekta.

Panoramske rute

- Plan turističke signalizacije za Panoramske rute u Crnoj Gori je urađen i usvojen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini raspisano je i u toku je javno nadmetanje za izvođenje radova na postavljanju turističke signalizacije na panoramskoj ruti Durmitorski prsten.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta uređenja lokacija-odmorišta na panoramskoj ruti Durmitorski prsten na koje nije pristigla ni jedna ponuda.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i završetak izvođenja radova na postavljanju turističke signalizacije.

Nabavka dva voza na električni pogon za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero

- Projekat se realizuje u saradnji sa UNDP.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za nabavku vozića. Otvaranje je zakazano u 2018. godini.
- U 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

Revitalizacija Žugića luke u NP Durmitor

- Realizuje se kroz poseban projekat "Nacionalni parkovi".

Modernizacije lokalnih i pristupnih puteva

Put za Javorje

- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje, izabran izvođač radova, potpisan ugovor i završeni su radovi na modernizaciji 2,2 km lokalnog puta prema Javorju.

Izmještanje puta za Tepca



- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje, izabran izvođač radova i potpisan ugovor. Radovi nijesu izvođeni zbog loših vremenskih uslova.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

Izgradnja parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe za ulazak u Crno jezero

- U 2017. godini je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe za ulazak u Crno jezero i vrednovanje ponuda je u toku.
- U 2018. godini planiran je početak i završetak radova.

9.7. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

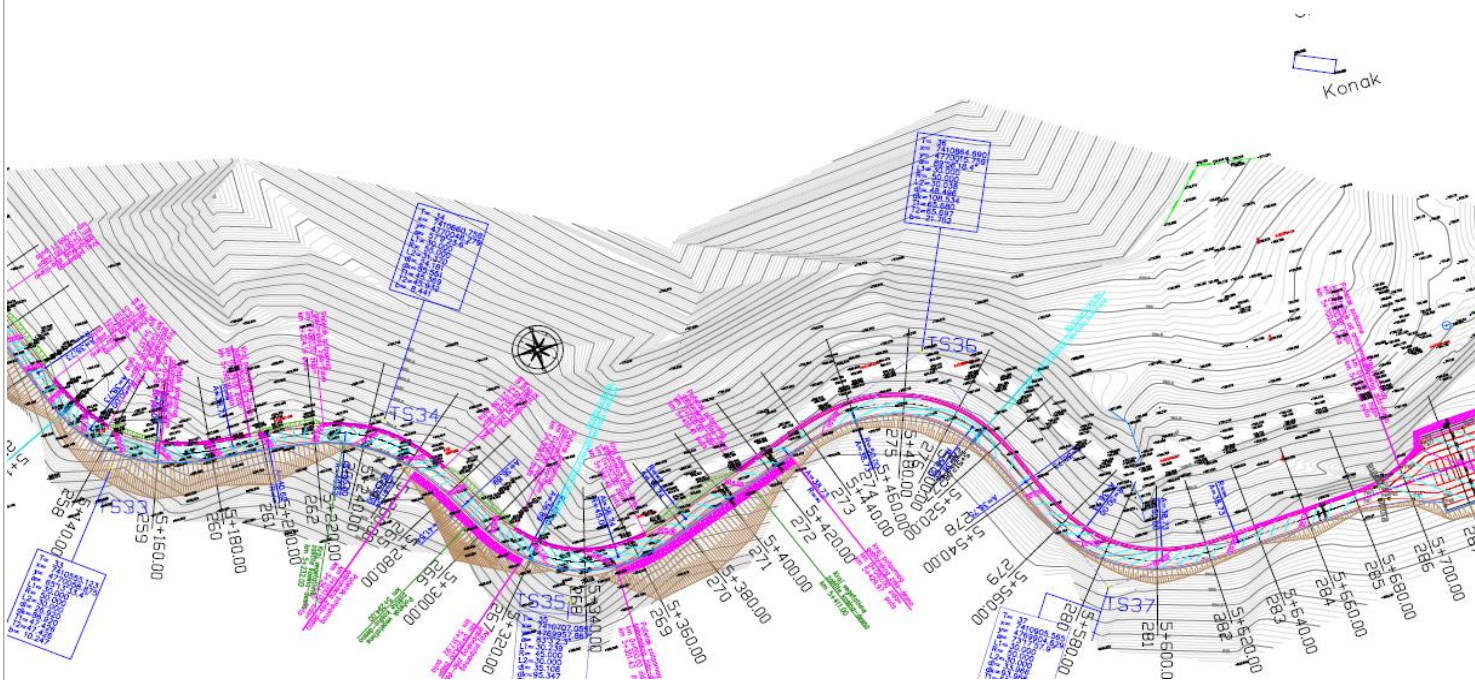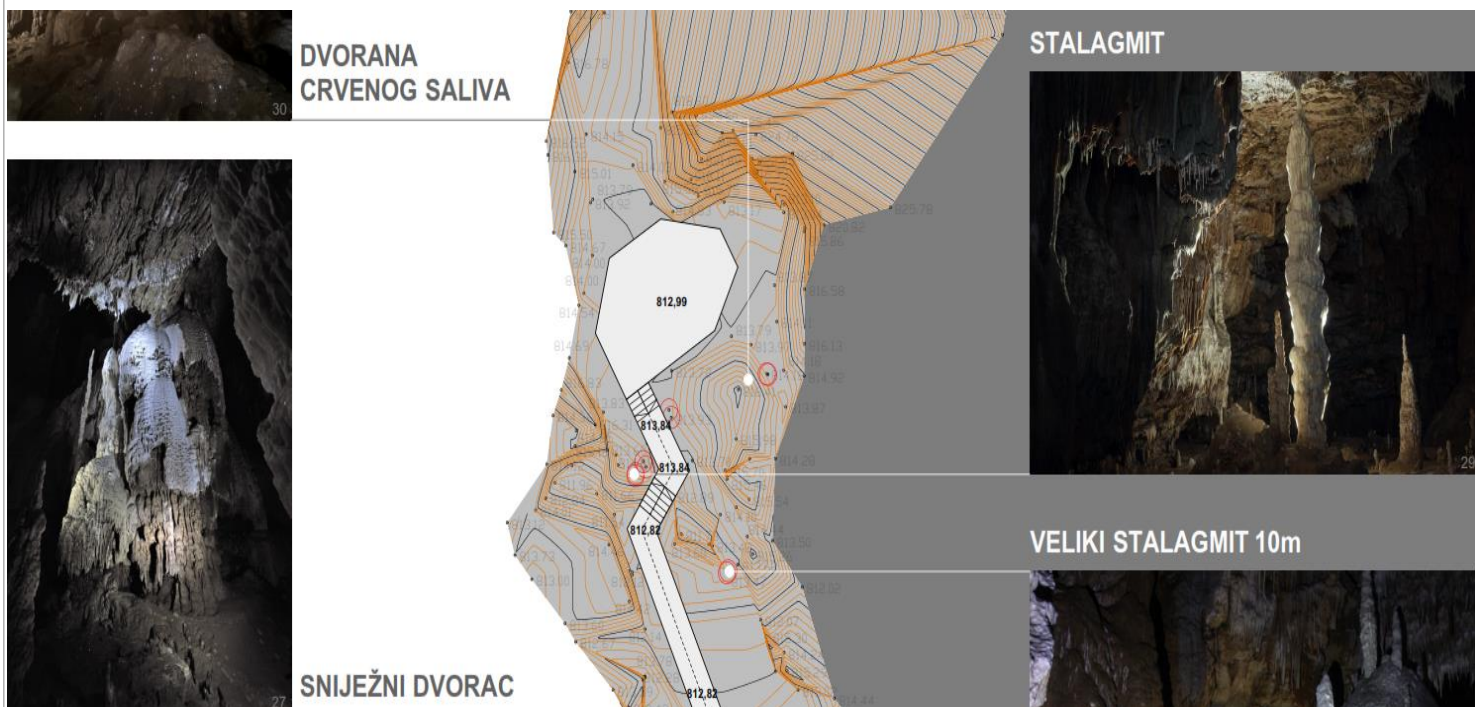

- U 2017. godini nastavljene su aktivnosti na ugovaranju i izvođenju radova na rekonstrukciji puta Bistrica-manastir Podvrh, ugovaranju i izradi tehničke dokumentacije pješačke staze do Đalovića pećine uz kanjon Bistrice, ugovaranju i izradi tehničke dokumentacije i izvođenju radova na izgradnji primarne elektrenergetske infrastrukture za potrebe Đalovića pećine, ugovaranju i izradi tehničke dokumentacije unutrašnjosti Đalovića pećine, ugovaranju i izradi tehničke dokumentacije za infrastrukturne objekte za potrebe valorizacije pećine, ugovaranju i izradi tehničke dokumentacije sistema za vodosnabdijevanje za infrastrukturalne objekte, kao i ugovaranju nabavke i ugradnje žičare dužine cca 1.700m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "projektuj i izgradi".
- U prethodnom periodu završena je izrada prethodne Studije izvodljivosti za infrastrukturu do Đalovića pećine.
- Na osnovu izrađene Studije raspisano je javno nadmetanje i u 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta saobraćajnice Bistrica-Manastir Podvrh, u dužini od 5.5km i izrada istog je završena.

- Takođe, u 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu prethodne Studije izvodljivosti uređenja unutrašnjosti pećine i ista je završena.
- Raspisivanjem Konkursa za izradu sveobuhvatnog urbanističko – arhitektonskog Idejnog rješenja Đalovića pećine i klisura u zahvatu prostorno – urbanističkog plana kordinirala je Opština Bijelo Polje i isti je završen u 2016. godini.

Put Bistrica –Manastir Podvrh 5,5km

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova I faze na rekonstrukciji puta od Bistrice do Manastira Podvrh, u dužini 1,5 km.
- U 2017. godini, poslije više uložених Žalbi na tendersku dokumentaciju, donijeta je Odluka o poništavanju postupka i javno nadmetanje je ponovo raspisano za radove I faze.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze koji se odnose na izvođenje svih preostalih radova i potpisan je ugovor. U skladu sa ugovorom isplaćen je avans. Radovi nijesu izvođeni zbog procedure pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2018. godini planirano je izvođenje radova I i II faze.

Đalovića pećina

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti pećine sa ulaznim platoom. Nakon rješavanja žalbenog postupka radovi su ugovoreni u izradu projektne dokumentacije je u toku.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije.

Staza do Đalovića pećine

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze do pećine. Na donešenu odluku uložena je žalba kod Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak radova.

Elektroenergetska infrastruktura

- U 2017. godini u sklopu rješavanja pitanja primarne elektroenergetske infrastrukture, raspisana su tri javna nadmetanja za izradu projektne dokumentacije za koje je tenderska procedura u toku:
 - izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Opremanje 35kV čelije u TS 35/10kV “Nedakusi
 - izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Trafostanica 35/10kV “Bistrica
 - izrada Glavnog projekta elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine – Dalekovod 35kV “Nedakusi – Bistrica.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije, ugovaranje i početak radova.

Vodosnabdijevanje

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije vodosnabdijevanja Đalovića pećine na osnovu izrađene Studije izvodljivosti za infrastrukturu do Đalovića pećine. Otvaranje ponuda planirano je za 2018. godinu.
- U 2018. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak radova.
- U 2017. godini realizovano je 851.076,21€.

9.8. Izmještanje ikone Bogorodice Filermose na Cetinju

Status projekta: U toku



- U prethodnom periodu Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije prostora namijenjenog za smještaj ikone.
- U maju 2016. godine dostavljen je revidovani Glavni projekat na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje i izabran najpovoljniji izvođač radova.
- U 2017. godini potpisan je ugovor i nakon pribavljanja građevinske dozvole, izvođač je uveden u posao i u toku su usaglašavanja projektne dokumentacije sa postojećim stanjem. Od strane izvođača radova urađen je elaborat sa detaljima obrade ulaza u pećinu, koji je predat Upravi za zaštitu kulturnih dobara na saglasnost.
- U 2017. godini realizovano je 4.900,00.
- U 2018. godini planirano je nastavak i završetak radova.

9.9. Izgradnja apartmana i restorana u NP „Biogradska gora” u Kolašinu

Status projekta: U toku

- Objekti za apartmanski smještaj i restoran se nalaze u zahvatu Prostornog plana posebne namjene NP Biogradska gora.
- Projektnu dokumentaciju je obezbjedilo JP “Nacionalni parkovi”.
- U 2017. godini realizovano je 60.404,89 € .

Izgradnja restorana





- Objekat restorana je spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 350 m².
- U objektu su organizovani sljedeći sadržaji: restoranska sala sa pratećim šankom, kuhinja sa pratećim tehničkim prostorijama, kancelarija, magacin pića i hrane, kotlarnica i ostali prateći sadržaji.
- U pethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali izvođenje grubih građevinskih radova, krovopokrivačkih radova i radova na izradi fasadne bravarije. Takođe, potpisan je Ugovor o izvođenju radova II faze, koji obuhvataju sve preostale građevinsko-zanatske i instalaterske radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju (osim opremanja).
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radovi II faze i potpisan je ugovor za izvođenje radova III faze, kojom je obuhvaćeno opremanje objekta namještajem.
- U 2017. godini nastavljeni su radovi na izgradnji i opremanju objekta i isti su završeni. Takođe, dobijena je i upotrebna dozvola.

Izgradnja apartmana

- Objekat apartmana je planirane spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 578 m².
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: sobe, apartmani, recepcije, restoran, kuhinja, kafe i kotlarnica.

- Krajem 2014. godine raspisano je javno nadmetanje i donešena odluka o odabiru izvođača radova za radove I faze koja se odnosi na grube građevinske radove.
- Obaveza JU "Nacionalni parkovi" je pribavljanje građevinske dozvole, što je uslov za početak radova.
- Nakon dostavljanja građevinske dozvole od strane JU "Nacionalni parkovi" pristupiće se daljim aktivnostima na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije pribavljena građevinska dozvola te nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.

9.10. "Kuća Voća" u Andrijevi

Status projekta: U toku



- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je završilo aktivnosti na sprovođenju Konkursa za izbor Idejnog arhitektonskog rješenja i potpisalo Ugovor za izradu Glavnog projekta objekta „ Kuća voća” u opštini Andrijevice. Obaveza Ministarstva poljoprivrede bilo je dostavljanje Elaborata tehnologije proizvodnje, koji predstavlja neophodan ulazni podatak za izradu Glavnog projekta.
- Bruto površina objekta „ Kuća voća” u Andrijevi površine je cca 1.500 m² i sastojće se iz proizvodnih pogona, edukativno-poslovnog dijela i izložbeno-prodajnih prostora sa kafeterijom.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta i započelo se sa aktivnostima za raspisivanje javnog nadmetanje za najpovoljnijeg izvođača radova.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji objekta "Kuća voća" i potpisan je ugovor. Zbog loših vremenskih uslova radovi nijesu otpočeli.
- U 2017. godini realizovano je 700,27 €.
- U 2018. godini planiran je početak radova.

9.11. Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta bivšeg zatvora u opštini Kotor.
- U 2017. godini nije dostavljena projektna dokumentacija od strane Korisnika te nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

9.12. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, u martu je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta rekonstrukcije-konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom.
- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko se provjerama stabilnosti utvrdi konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima. Sva projektna rješenja moraju biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog Glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- U skladu sa ovim zaključkom pripremljena je tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule.
- U 2017. godini realizovano je 50.190,00 €
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izradu i reviziju sanacije klizišta šireg područja Kanli Kule.

9.13. Nacionalni parkovi

Status projekta: U toku

- Realizacijom projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2017. godini sprovedene su aktivnosti na projektima: izgradnja kampa za mobilne kuće u NP Lovćen, Rekonstrukcija putne infrastrukture u NP Biogradska gora, Valorizaciju Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor i drugih projekata u okviru NP, Izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor, Stavljanje u funkciju motela Radovan luka sa izgradnjom trafostanice u MZ Tepca, Prilazna staza restoranu Biogradska Gora.
- U 2017. godini realizovano je 294.691,94 €.

Izgradnju kampa za mobilne kuće u NP Lovćen

- U 2017. godini po treći put je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova po principu "projektuj i izgradi", na koje nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, kao i početak i završetak radova.

Rekonstrukciju putne infrastrukture u NP Biogradska gora

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji armirano betonskih cjevastih propusta na putnom pravcu Biogradska Gora – Vranjak. Vrednovanje ponuda je u toku.
- U 2018. godini planirano je ugovoravanje, početak i završetak radova.

Valorizaciju Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor i drugih projekata u okviru NP

- U 2017. godini po treći put raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova za rekonstrukciju objekata Centra za rafting i vodenice u postojećim gabaritima i isto je u toku.
- U 2018. godini planirano je ugovoravanje, početak i završetak radova.

Izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor

- Aktivnosti na realizaciji sprovode JU Nacionalni parkovi. U skladu sa propisanim protokolom Direkcija javnih radova je vršila isplatu sredstava za izvedene radove.

- Svi radovi su završeni i u toku je tehnički pregled objekta.

Stavljanje u funkciju motela Radovan luka sa izgradnjom trafostanice u MZ Tepca

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje, odabran izvođač i potpisan ugovor za izvođenje radova na polaganju elektro energetskog kablo od trafostanice u Radovan luci do motela, kao i postavljanje trafostanice u MZ Tepca.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.

Prilazna staza restoranu Biogradska Gora

- Aktivnosti na realizaciji sprovode JU Nacionalni parkovi. U skladu sa propisanim protokolom Direkcija javnih radova je vršila isplatu sredstava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prilazne staze do restorana Biogradska Gora.
- Izrada projektne dokumentacije je završena.
- U 2018. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova kao i početak i završetak istih.

9.14. Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Realizaciju projekta kordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Planirana je izrada projektne dokumentacija i izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor, a na osnovu Idejnog rješenja i koncepta predstavljenog u okviru crnogorskog paviljona na Venecijanskom bijenalu.
- U 2017. godini nijesu dostavljeni urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Korisnika, nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma je raspisivanje konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta, na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

9.15. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalnih "Kuća vina" sa sjedištem u Podgorici i Baru

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

Kuća vina sa sjedištem u Baru

- Obaveza Korisnika je da pribavi urbanističko-tehničke uslove i Projektni zadatak, a kako isti nisu dostavljeni to u 2017. godini nisu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

Kuća vina sa sjedištem u Podgorici

- Obaveza Korisnika je da pribavi urbanističko-tehničke uslove i Projektni zadatak, a kako isti nisu dostavljeni to u 2017. godini nisu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

9.16. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekata nacionalne "Kuća maslina" sa sjedištem u Baru

Status projekta: U toku

- U 2017. godini nakon dostavljanja urbanističko-tehničkih uslova i Projektnog zadatka od strane Ministarstva poljoprivrede, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije, potpisan je ugovor i izrada Glavnog projekta je u toku.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

- U 2018. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje, početak i završetak radova.

9.17. Dom revolucije u Nikšiću- rekonstrukcija i adaptacija

Status projekta: U toku



- Realizacijom projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovelo je proceduru raspisivanja Konkursa za Idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije objekta Dom revolucije u Nikšiću, nakon čega je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- Takođe, nakon usaglašavanja fazne realizacije projekta, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze i isto je u toku. I faza radova obuhvata radove na raščišćavanju objekta, uklanjanju dijela čelične konstrukcije, uređenju dijela prostora unutar objekta i radove na uređenju terena.
- U 2017. godini realizovano je 227.587,50 €.
- U 2018. godini planirano je ugovaranje, nastavak i završetak radova I faze.

9.18. Ski centar Vučje - izgradnja akumulacionog jezera u Nikšiću

Status projekta: Završeno

- U 2015. godini nakon što je Opština Nikšić dostavila projektnu dokumentaciju raspisano je javno nadmetanje za izvođača radova na izgradnji akumulacionog jezera za ski-centar Vučje, odabran izvođač radova i potpisan ugovor. Radovi nijesu izvođeni obzirom da Opština Nikšić nije izvršila pripremne radove.
- U 2016. godini nije bilo aktivnosti jer projekat nije bio uključen u Kapitalni budžet.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Nikšić završila sve pripremne radove, izvođač je uveden u posao i završio sve ugovorene radove.
- U 2017. godini realizovano je 103.832,55 €.

10. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

- U 2015. godini otpočela je realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj”, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture. Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12€, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja ovih sredstava za 2015. godinu.

10.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- Projekat se do kraja 2017. godine finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće. U 2018. godini, za finansiranje projekta obezbijedena su sredstva iz kredita EIB u visini od 3.230.443,54 €.
- U 2017. godini realizovano je 8.323.878,41€

Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane (PPOV Berane) – Lot 1 – FIDIC Žuta knjiga

- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2016. godine.
- U toku su radovi na izgradnji. Radovi se odvijaju dinamikom koja je sporija od predviđene.

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u opštini Berane – Lot 2 – FIDIC Crvena knjiga

- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan 2016. godine. U toku su radovi na izgradnji. Radovi se odvijaju dinamikom koja je sporija od predviđene.
- Ugovor za reviziju Glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (Lot 1) i vršenje stručnog nadzora na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione mreže (Lot 2) potpisan je 2016. godine.

Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Beranama – FIDIC Crvena knjiga

- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, objekata na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2017. godine. U toku su radovi na izgradnji.
- Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova potpisan je 2017. godine.
- U 2018. godini planiran je nastavak izvođenja radova.



10.2. Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2016. godini, potpisan je ugovor sa izvođačem radova po FIDIC Žutoj knjizi - “projektuj i izgradi”.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju, odabran izvođač radova i potpisan ugovor.
- U 2017. godini nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije i pribavljena građevinska dozvola izvođač je uveden u posao. Prilikom početka radova pojavio se problem dodatne količine otpada i nelegalno odloženih automobilskih guma. Nakon rješavanja navedenog problema od strane Prijestonice Cetinje, radovi su otpočeli i isti su u toku.
- U 2017.godini realizovano je 1.552.652,82€.
- U 2018. godini planiran je nastavak i završetak radova.



10.3. Sanacija odlagališta „Čafe” u Baru – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku


- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Čafe” u Baru po FIDIC Žutoj knjizi - "projektuj i izgradi". Krajem 2015. godine potpisan je Ugovor i započete aktivnosti na izradi Glavnog projekta.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2016. godini završena je procedura javne nabavke i potpisan ugovor za konsultantske usluge za projekat „Čafe” koje podrazumijevaju reviziju Glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta, pribavljena građevinska dozvola i otpočelo se sa izvođenjem radova.
- Radovi su obustavljeni početkom oktobra 2017. godine jer je nadzor doveo u pitanje kvalitet pojedinih pozicija izvedenih radova. Urađeni su dodatni laboratorijski testovi koji su pokazali da su radovi na izradi gabionskog zida i nasipa izvedeni nezadovoljavajućim kvalitetom, pa se izvođač obavezao da dostavi inovirani Glavni projekat kako bi se mogla izvršiti sanacija i nastaviti sa radovima.
- U 2017. godini realizovano je 564.051,38€
- U 2018. planiran je nastavak i završetak radova.



10.4. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar-Sutomore

Status projekta: Završeno

- Rekonstrukcija dijela pruge „Virpazar – Sutomore” se realizuje u skladu sa pravilima Crvene FIDIC knjige.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2017. godini završeni su svi ugovoreni radovi.
- U 2017. godini realizovano je 4.314.668,61€

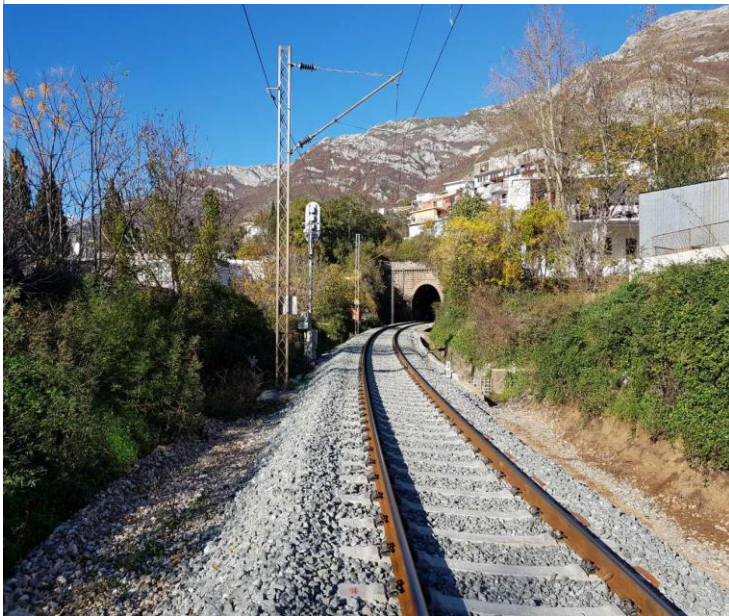

10.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice „Trebešica” – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Nakon završenog postupka javne nabavke, krajem 2015. godine potpisan je Ugovor sa ponuđačem koji će projekat realizovati po Žutoj FIDIC knjizi po principu “projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za konsultantske usluge, koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, nakon dva neuspješna postupka, rezultiralo je potpisivanjem Ugovora u 2016. godini.
- Završena je izrada i revizija Glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine. Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme završeni su u kraćem roku od predviđenog čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U 2017. godini realizovano je 2.568.781,06 €.



10.6. Tehnička pomoć

Status projekta: U toku

- Projekti se finansiraju 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2015. godini, potpisan je Ugovor za jačanje kapaciteta Operativne strukture kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevod službenih dokumenata i isti je realizovan.
- U 2016. godini potpisan je ugovor za usluge organizovanja Sektorskih monitoring odbora koji je i realizovan, dok je ugovor za implementaciju Komunikacionog akcionog plana u toku.
- Takođe u 2016. godini su potpisani i u potpunosti realizovani ugovori “Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Operativne strukture” i “Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovođenja ugovora i FIDIC pravila”.
- U 2017. godini su potpisani i realizovani ugovori za nabavku IT opreme i službenog vozila.
- U 2017. godini potpisan je ugovor „Revizija Master planova za otpadne vode i priprema prvog Nacrta plana za implementaciju specifične direktive za Direktivu o komunalnim otpadnim vodama”.
- U 2017. godini potpisani su ugovori „Izrada strategije saobraćaja“, „Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije“, “Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije održivosti” i “Procedure implementacije ugovora za infrastrukturne projekte” i isti su u potpunosti realizovani.
- U 2017. godini realizovano je 1.096.485,67€

10.7. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima Kos - Trebešica

Status projekta: U toku

- Projekat se finansira 90% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 10 % predstavlja nacionalno učešće.
- U toku je priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rehabilitaciji dijela pruge Kos-Trebešica, kao i izbor nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.
- U 2018. godini, planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova i ugovaranje istih.

10.8. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

Status projekta: U toku

- Projekat se odnosi na prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za upotrebu licima sa invaliditetom.
- U 2017. godini nije bilo utroška sredstava.

11. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA BAR – BOLJARE

11.1. Državna komisija za tehnički pregled autoputa Bar-Boljare prioritete dionice Smokovac – Uvač - Mateševo i dr.

Status projekta: U toku


- Vlada Crne Gore je, na osnovu člana 12 Zakona o autoputu Bar – Boljare, (Sl. CG. 52/14) na sjednici od 14. maja 2015. godine donijela Odluku o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioriteta dionica Smokovac-Uvač-Mateševo. Sredstva za rad Komisije se obezbjeđuju u Kapitalnom budžetu Crne Gore. Visina nadoknade članovima Komisije se, shodno Internom pravilniku o raspodjeli finansijskih sredstava za rad Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar - Boljare, prioriteta dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, određuje proporcionalno učešću, odnosno oblasti u ukupnom tehničkom pregledu, kao i na osnovu stvarnog angažmana na pregledu radova na prijedlog predsjednika Komisije.
- U 2016. godini započete su aktivnosti na tehničkom pregledu radova na autoputu i to prije svega na mostu Moračica, tunelu Vjeternik i na privremenom i stalnom napajanju električnom energijom, kao i na ostalim objektima za koje je izdata građevinska dozvola.
- U 2017. godini izdate su sve građevinske dozvole i radova su otpočeli na svim dionicama.
- U 2017. godini realizovano je 817.584,61€.

12. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

11.1. Dom starih u Pljevljima

Status projekta: Završeno

- U toku je izgradnja objekta Doma starih u Pljevljima spratnosti podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine 2.810 m².
- Objekat je predviđen za smještaj 68 lica. Pored 37 smještajnih jedinica, predviđen je kuhinjski blok, restoran, pošta, kancelarije, višenamjenska sala, ambulanta, komunikacije, kao i prateće tehničke prostorije.
- Sa radovima se započelo krajem maja 2016. godine.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na izgradnji i opremanju objekta. U toku je izrada infrastrukturnih priključaka što je obaveza opštine Pljevlja, kao i priprema objekta za tehnički pregled.
- U 2018. godini planirano je stavljanje objekta u funkciju i pribavljanje upotrebne dozvole.

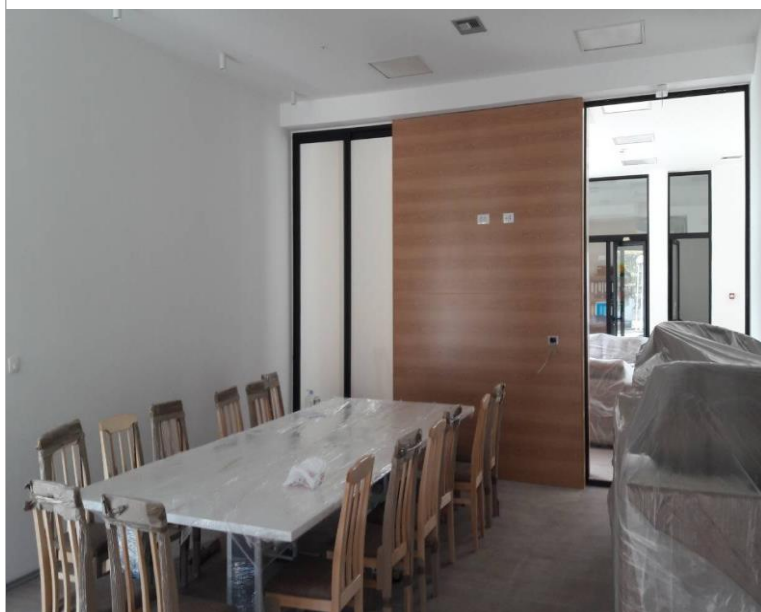


12.2. Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici

Status projekta: U toku

- Projekat obuhvata izgradnju 12 stambenih objekata koji posjeduju podrum, prizemlje i dva sprata, ukupne bruto površine 10.408 m², sa ukupno 120 stambenih jedinica za smještaj 660 korisnika.
- Izvođenje radova je započelo krajem marta 2016. godine.
- U 2017. godini završeni su svi radovi na 12 stambenih objekata i isti su nakon dobijanja upotrebne dozvole useljeni.
- Sredinom 2017. godine započelo se sa izgradnjom još pet stambenih objekata sa 51 stambenom jedinicom.
- U 2018. godini planiran je završetak radova na objektima.



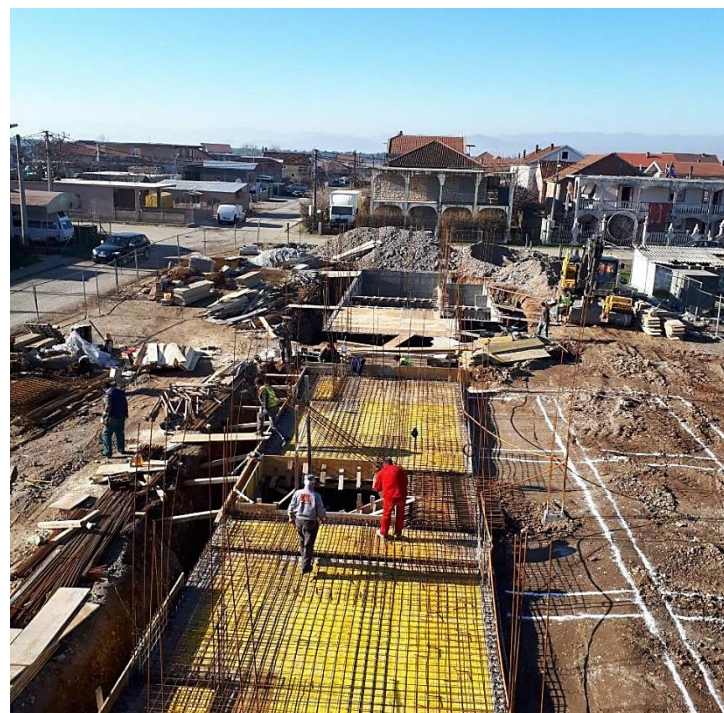

12.3. Stambeni objekti u Beranama

Status projekta: U toku

- Projekat obuhvata izgradnju 4 stambena objekta, ukupne bruto površine cca 7.000 m², sa ukupno 94 stambene jedinice za smještaj 271 korisnika.
- Krajem 2016. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor.
- U 2017. otpočeli su radovi na izgradnji objekata i isti su u toku.
- U 2018. godini planiran je završetak radova na objektima.



Izveštaj sačinili i obradili:

Miomir Peruničić
Maja Đurović
Milica Bakić
Slobodan Vuković
Marija Glavatović
Aleksandra Božović
Izveštaj odobrio:

Direktor
Almer Kalač

Podgorica, januar 2018. godine
