



**CRNA GORA
UPRAVA JAVNIH RADOVA**

**Izvještaj o realizaciji Zakona o budžetu Crne Gore za
period 1.1.2020. - 31.12.2020. godine**



Januar 2021. godine

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
REZIME	10
PRILOG BROJ 1.....	17
PRILOG BROJ 2.....	76
REALIZACIJA PO OBJEKTIMA.....	77
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA	78
<i>1.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici.....</i>	<i>79</i>
<i>1.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta palata pravde</i>	<i>79</i>
<i>1.3. Izgradnja objekta Državnog tužilaštva u Podgorici</i>	<i>82</i>
<i>1.4. Izgradnja Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.....</i>	<i>82</i>
<i>1.5. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti.....</i>	<i>83</i>
<i>1.6. Rekonstrukcija objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju</i>	<i>84</i>
<i>1.7. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici</i>	<i>86</i>
<i>1.8. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.....</i>	<i>88</i>
<i>1.9. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.....</i>	<i>89</i>
<i>1.10. Objekti za potrebe Državne revizorske institucije.....</i>	<i>90</i>
<i>1.11 Izgradnja objekta za potrebe MONSTAT-a</i>	<i>90</i>
<i>1.12. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac</i>	<i>90</i>
2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE.....	92
<i>2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici.....</i>	<i>93</i>
<i>2.2. Rekonstrukcija Dvorca kralja Nikole u Nikšiću</i>	<i>95</i>
<i>2.3. Izvođenje radova, nabavka oprema i unapređenje objekata u funkciji kulture.....</i>	<i>96</i>
<i>2.4. Dogradnja objekta JU "Zahumlje" u Nikšiću</i>	<i>97</i>
<i>2.5. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" u Baru.....</i>	<i>98</i>
<i>2.6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture</i>	<i>99</i>
<i>2.7. Muzej savremene umjetnosti u Podgorici.....</i>	<i>99</i>
<i>2.8. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju.....</i>	<i>100</i>
<i>2.9. Rekonstrukcija kulturnog dobra Gradski bedem – ostaci Onogošta u Nikšiću</i>	<i>101</i>

2.10. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju.....	101
3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA	102
3.1. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	103
3.2. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru	103
3.3. Izgradnja sportskih terena i sala.....	105
3.4. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.....	106
3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	106
3.6. Izgradnja školsko-sportske dvorane u Gusinju.....	108
3.7. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK "Sutjeska" u Nikšiću.....	108
3.8. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju.....	110
4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE.....	112
4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje.....	113
4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada.....	115
4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	120
4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja	121
4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	128
4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	131
4.7. Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	131
4.8. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	132
5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	133
5.1 Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu.....	134
5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora jalovišta u Mojkovcu.....	135
5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice).....	136
5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju.....	150
5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka.....	151
5.6. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tivtu	154
5.7. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	154
5.8. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju.....	156
5.9. Izgradnja gradske pijace u Rožajama.....	156
5.10. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje.....	157

5.11. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu	160
5.12. Rekonstrukcija puta Plav – Bogičevica, Plav	160
5.13. Lokalni put Ckla – granica Albanije, opština Bar	161
5.14. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu.....	161
5.15. Putni pravac Monte - Rose.....	163
5.16. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu.....	163
5.17. Rekonstrukcija trga u Plavu	163
5.18. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar	164
6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA.....	166
6.1. Rekonstrukcija energetskog bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	167
6.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja “Nova varoš” i Doma zdravlja “Stara varoš” u Podgorici.....	167
6.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici.....	168
6.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu.....	168
6.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima.....	168
6.6. Dom zdravlja u City kvartu	169
6.7. Rekonstrukcija objekta stare bolnice “Danilo I” na Cetinju	169
6.8. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	169
7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA.....	171
7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici.....	172
7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću.....	173
7.3. Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU “Lovćen Bečići” u opštini Cetinje	175
7.4. Dom starih u Plavu.....	175
7.5. Dom starih u Rožajama.....	175
8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA.....	176
8.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a	177
8.1.1. Vrtić u Baru.....	177
8.1.2. Vrtić u Ulcinju	177
8.1.3. Vrtić u Pljevljima	177
8.1.4. Vrtić u Bloku VI, Podgorica.....	179
8.1.5. Rekonstrukcija predškolskih ustanova.....	180

8.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II.....	180
8.2.1 Vrtić u City kvartu, Podgorica	180
8.2.2. Vrtić na Zlatici, Podgorica	180
8.2.3. Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	181
8.2.4. Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica.....	181
8.2.5. Vrtić u Bijelom Polju.....	181
8.2.6. Vrtić u Beranama	181
8.2.7. Vrtić u Plavu	181
8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	182
8.4. Osnovna škola u Igalu	183
8.5. Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica.....	184
8.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Tološima, Podgorica	184
8.7. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a “Univerzitetski centar” u Podgorici	184
8.8. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	185
8.9. Izgradnja Osnovne i muzičke škole “Dušan Korać” u Bijelom Polju	185
8.10. Izgradnja Osnovne škole u Rožajama.....	187
8.11. Fiskulturna sala OŠ “Pavle Žižić” u Njegnjevu, opština Bijelo Polje	187
8.12. OŠ “Lovčenski partizanski odred” na Cetinju.....	187
8.13. Naučno-tehnološki park u Podgorici.....	188
8.14. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	189
8.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a.....	191
8.15.1. Druga Gimnazija u Podgorici	191
8.15.2. Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici.....	191
8.15.3. Osnovna škola na Karabuškom polju, Tuzi.....	192
8.15.4. Osnovna škola u City kvartu, Podgorica.....	192
8.15.5. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici.....	192
8.15.6. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici.....	192
8.15.7. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	192
8.16. Adaptacija objekata obrazovanja	193
9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	195
9.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin	196

9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju	205
9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac.....	212
9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama	220
9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor Žabljak.....	225
9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	227
9.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	239
9.8. Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	240
9.9. Objekat Kuća voća u Andrijevici	243
9.10. Objekat nacionalne Kuće maslina u Baru	245
9.11. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom	247
9.12. Nacionalni parkovi	247
9.13. Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju	250
9.14. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1450 i Kolašin 1600 i osnježavanje staza ski centra Kolašin 1600	250
10. ZAKON O PRIJESTONICI.....	251
11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA.....	254
11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.....	255
11.2. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju	256
11.3. Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru	257
11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos –Trebešica".....	258
11.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne-vučne podstanice "Trebešica"	259
11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	259
11.7. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	260
11.8. Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija	260
11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom.....	261
11.10. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	261
11.11. Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija.....	262
11.12. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini	262
11.13. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	262
11.14. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	263

11.15. Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke	263
11.16. Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu.....	263
11.17. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija.....	264
11.18. Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	264
11.19. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	264
11.20. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	265
11.21. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja.....	265
11.22. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina	265
11.23. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju.....	265
11.24. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa.....	266
11.25. Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)	267
11.26. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	268
11.27. Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređenje veterinarske i fitosanitarne kontrole	268
11.28. Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja.....	268
11.29. Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla	268
11.30. Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica-Golubovci	268
11.31. Strategija izvodljivosti intermodalnosti.....	269
11.32. Studija o ITS (Intelligent Transport sistem) u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju	269
11.33. Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve.....	269
11.34. Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja	269
11.35. Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU ACQUIS.....	269
11.36. Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu.....	269
11.37. Grant šema za energetske efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju.....	270

12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA	271
--	------------

REZIME

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu Upravi javnih radova, kroz kapitalni budžet, opredijeljena su sredstva u iznosu od **87.030.000,00€**, od čega je 36.421.650,00€ iz budžetskih sredstava, 40.005.200,00€ iz kredita, 3.300,00€ donacija i 10.599.850,00€ IPA sredstva.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu **75.519.895,60€**, od čega je 33.776.851,93€ iz budžetskih sredstava, 40.860.474,69€ iz kredita, 3.300,00€ donacija i 879.268,98€ IPA sredstva.

U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 73.776.032,37€, od čega 30.797.026,77€ iz budžetskih sredstava, 40.856.974,69€ iz kreditnih sredstava i 2.122.030,91€ iz IPA fondova. Ukupan procenat realizacije je 98% imajući u vidu da se sredstva iz kredita izvršavaju u visini njihovog ostvarenja.

U istom periodu u 2019. godini, ukupno je utrošeno 62.060.035,63€.

Iznos sredstava utrošenih u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, uvećan je oko 19 %.

Dodatno, zaključno sa 31.12.2020. godine, Upravi javnih radova su dostavljene situacije/računi ugovarača u iznosu od preko 4.700.000€, a koje nijesu plaćene u 2020. godini, s obzirom na to da su obaveze prevazilazile iznose opredjeljene Zakonom o budžetu Crne Gore za predmetne projekte. Uprava javnih radova je, shodno članu 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti pripremila Informaciju o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2020. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte i istu dostavila Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je dalo pozitivno mišljenje na predmetnu Informaciju, međutim za istu nije donešena odluka na sjednici Vlade Crne Gore.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 171 projekta u okviru kojih se realizuju brojni podprojekti.

U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine Uprava javnih radova je zaključila **139** ugovora, čija vrijednost iznosi **58.207.828,20€**. U istom periodu raspisala je **41** javno nadmetanje čija ukupna vrijednost iznosi **18.095.206,60€**.

Kroz Izvještaj o realizaciji za 2020. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Međutim, i pored visokog procenta realizacije budžetskih sredstava uložениh u kapitalne projekte u 2020. godini, brojni su problemi sa kojima se susreće Uprava javnih radova, a na koje ukazujemo kroz predmetni Izvještaj kako bi se moglo pristupiti njihovom sistemskom rješavanju.

Naime, realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava javnih radova ne može da utiče, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Vlada Crne Gore je na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela Odluku o izradi Kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata u avgustu 2018. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 057/18 od 10.08.2018.).

Predmetnom Odlukom je utvrđeno da projekti čija je realizacija otpočela u prethodnom periodu ne podliježu vrednovanju odnosno ocjenjivanju u skladu sa ovom odlukom i imaju prioritet u realizaciji. Uprava javnih radova, na osnovu izjašnjenja stručnog nadzora, planira sredstva za narednu budžetsku godinu, neophodna za kontinuiranu realizaciju već otpočetih projekata, u skladu sa ugovorenim obavezama. Pregled sredstava neophodnih za realizaciju već započetih projekata se dostavlja Ministarstvu finansija, koje navedene iznose koriguje u skladu sa budžetskom i fiskalnom politikom. Smanjivanjem prvobitno planiranog i neophodnog iznosa sredstva direktno se utiče na dinamiku realizacije projekata, a nerijetko se isti dijele na faze čime se realizacija projekata usložnjava, a obim posla uvećava. Takođe, prolongiranje finansiranja može proizvesti i pravne posledice koje proističu iz ugovornih obaveza koje Uprava javnih radova ima prema izvršiocima.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se u okviru obezbijedenih sredstava, Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijedeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost i odloženo finansiranje projekata, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi i troškovi izgradnje.

Takođe, u skladu sa predmetnom Odlukom potrošačke jedinice kandiduju projekte za finansiranje, dostavljajući Obrsce koji sadrže podatke o pripremljenoj dokumentaciji i zrelosti samih projekata za realizaciju. Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava javnih radova nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020)), nisu dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom, sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava javnih radova ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog koji često dolazi i do obustave radova od strane trećih lica.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se kod izbora kapitalnih projekata uvedu dodatni eliminatorni uslovi koji će obezbijediti da Zakonom o budžetu budu obuhvaćeni samo projekti čiji su Korisnici već sa kandidovanjem projekata dostavili svu neophodnu i validnu dokumentaciju, na osnovu koje će Uprava javnih radova sa početkom naredne budžetske godine pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji samog projekta.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti građenja i javnih nabavki, Uprava javnih radova sprovodi aktivnosti vezano za izgradnju objekata koji se realizuju kroz Zakon o budžetu Crne Gore, a koje pored ostalog podrazumijevaju i javno oglašavanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, kao i za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

Tokom realizacije određenih ugovora o građenju, u skladu sa svojim zakonskim obavezama vršioci stručnog nadzora Upravu javnih radova obavještavaju o uočenim propustima u projektnoj dokumentaciji, čije otklanjanje za posledicu ima pojavu viškova, nepredviđenih i

naknadnih radova koje je neophodno izvesti kako bi izgrađeni objekti bili predati na upotrebu. Sama pojava dodatnih radova povećava i ugovorenu cijenu koštanja izgradnje, zbog čega je neophodno obezbjediti dodatna sredstva za realizaciju projekta kroz pregovarački odnosno otvoreni tenderski postupak. Imajući u vidu propuste projekatana i revidenata, Uprava javnih radova je kod nadležnog Direktorata za inspeksijske poslove i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma inicirala pokretanje više postupaka ukidanja licenci privrednim društvima i ovlašćenim inženjerima u skladu sa Članom 139, stav 1, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektna dokumentacija sa lošim tehničkim rješenjima ugrožava i proces planiranja, kako neophodnih sredstava za realizaciju projekata, tako i dinamike izvođenja radova, što za posledicu ima uvećanje vrijednosti investicije i produžetak roka završetka radova.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se kroz zakonsku regulativu bliže utvrde uslovi za ukidanje licenci projektantima, revidentima i privrednim društvima koja se bave projektovanjem i revizijom tehničke dokumentacije, čime bi se i navedeni propusti prilikom izrade projektne dokumentacije adekvatno sankcionisali. Takođe, neophodno je zakonom propisati obavezu projektantima i revidentima da nadoknade nastalu štetu investitoru.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava javnih radova ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017).

Takođe, bilo je planirano da Uprava realizuje i projekte iz Godišnjeg akcionog programa 2019, kako za sektor saobraćaja, tako i za sektor životne sredine, međutim, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za ove projekte preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćen ovim programima je 26.

Uprava javnih radova na mjesečnom nivou priprema dinamičke planove realizacije svih projekata u kojima blagovremeno i kontinuirano ukazuje na projekte čija je realizacija ugrožena i iste dostavlja Kancelariji za evropske integracije, Ministarstvu finansija, kao i nadležnim ministarstvima na komentar, upoznavanje i preduzimanje adekvatnih aktivnosti na nivou IPA strukture.

U fazi ugovaranja projekata, a koja je u ovom trenutku aktuelna na projektima čiju realizaciju sprovodi Uprava javnih radova, ključan je kvalitet tenderske dokumentacije, prvenstveno tehničkih specifikacija koji su sastavni dio tenderske dokumentacije, a koje najčešće pripremaju korisnici (ministarstva) u saradnji sa konsultantima i dostavljaju Upravi javnih radova na dalje postupanje.

Nedovoljno kvalitetno obrađene tehničke specifikacije najčešće rezultiraju velikim brojem pitanja potencijalnih ponuđača. Za pojedine projekte koji se realizuju kroz navedene programe, propusti/nejasnoće u tehničkim specifikacijama su u krajnjem doveli do poništenja tenderskih postupaka.

Evaluacione komisije čine članovi sa pravom glasa, a koji su uvijek predstavnici korisnika (ministarstava), i predsjednik i sekretar, koji nemaju pravo glasa i predstavnici su Uprave javnih radova. Iskusni članovi Evaluacione komisije, koji ažurno i posvećeno rade na vrednovanju ponuda su ključni za uspješan završetak evaluacionog procesa. Iz izvještaja DEU kojima se odbijaju evaluacioni izvještaji komisija za određene projekte, zaključuje se da komisija nije prihvatila i nije postupala u skladu sa komentarima DEU, što je dovelo do prolongiranja procesa evaluacije i u krajnjem isticanja rok za ugovaranje projekta.

Uprava javnih radova, sa zanemarljivo malim brojem zaposlenih u odnosu na ukupan broj IPA zaposlenih u operativnoj strukturi, ažurno i posvećeno radi na sprovođenju svih koraka i procedura, u skladu sa svojim nadležnostima, stavljajući se na raspolaganju članovima komisije.

Uprava javnih radova nema mandat da utiče na rad drugih institucija i zaposlenih u tim institucijama, prvenstveno članova komisije, iako direktno utiču na dinamiku i kvalitet realizacije projekta kod ove Uprave.

Po pitanju navedene problematike, na zahtjev Uprave javnih radova, održano je više sastanaka na najvišem nivou kako bi se kod upravljačke strukture uticalo da kroz svoje aktivnosti obezbjedi proces rada svih uključenih u realizaciju IPA projekata.

Pritisci na Upravu javnih radova koji se ponavljaju krajem svake godine kako bi se ispoštovali rokovi za ugovaranje, rokovi za završetak realizacije projekta ili povlačenje sredstava i time nadomjestilo izgubljeno vrijeme, ne predstavljaju sistemsko rješenje problema. Uprava javnih radova je uvijek spremna da svojim dodatnim anagožavnjem pokuša nadomjestiti vrijeme koje je izgubljeno na realizaciji projekta od perioda programiranja, pripreme od strane korisnika, a kasnije u postupku javne nabavke, iako je već u trenutku raspisivanja tendera za određene projekte bilo očito da su svi dinamički rokovi minimalni i da je ugovaranje u roku ugroženo.

Pitanje programiranja po kojem se Upravi javnih radova, kao specijalizovanoj ustanovi za infrastrukturne projekte, dodjeljuje realizacija projekata koji se ugovaraju kroz GRANT tip ugovora je krajnje upitno, a na šta je svim relevantnim institucijama više puta skrenuta pažnja.

Pored navedenih, tekućih pitanja, Uprava javnih radova je u prethodnom periodu brojnim dopisima, molbama i zahtjevima urgirala kod upravljačke strukture da se razmotri reorganizacija IPA strukture u samoj Upravi. Zvaničan pokušaj Uprave javnih radova tokom 2016. godine da se kroz sistematizaciju izdvoji sektor za implementaciju IPA projekata na čijem jačanju bi se sistemski radilo, je bio oštro kritikovan i odbijen. Kao rezultat ovakvog postupanja, danas u Upravi imamo situaciju da su IPA službenici raspoređeni po svim sektorima baveći se raznoraznim poslovima iz djelokruga Uprave. Preopterećenost složnim procesom rada rezultira kontinuiranim odlaskom zaposlenih koji se vrlo teško nadomjesti, naročito imajući u vidu da je proces obuke dugotrajan.

Otežavajuća okolnost je i to što je Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za IPA službenike obezbjeđen dodatak na osnovnu zaradu, ali se istom, zbog prethodno stečenih prava, predmetni dodatak ne obezbjeđuje inženjerskom kadru u Upravi javnih radova. Nažalost i pored toga što je ukazano na navedeni propust, po tom pitanju ni dvije godine kasnije ništa nije preduzeto.

Prijedlog Uprave javnih radova je da se kroz reorganizaciju čitave IPA operativne strukture unaprijedi rad svih uključenih na IPA projektima od programiranja, preko

pripreme ulaznih podataka i dokumentacije od strane krajnjih korisnika, korisnika, ministarstava čime će se unaprijediti kvalitet dokumentacije koja se dostavlja Upravi javnih radova, a koja će uz neophodnu reorganizaciju moći postizati očekivane rezultate.

Već sada ukazujemo na činjenicu da pored toga što je u Upravi javnih radova inženjerski kadar deficitaran, ni na tržištu rada nema zainteresovanih inženjera koji bi u uslovima koje može obezbjediti Uprava bili zainteresovani za odgovoran i uskospecijalizovan posao projekt menadžera na infrastrukturnim projektima koji se realizuju u skladu sa složenim FIDIC i PRAG pravilima. Ovo pitanje je ključno za dalju efikasnu realizaciju IPA programa, naročito imajući u vidu broj projekata koji uskoro dolaze na realizaciju. Napomenućemo da Uprava javnih radova, kao specijalizovana Uprava ima skoro stopostotnu realizaciju svih drugih programa u Kapitalnom budžetu, a da je za bolju realizaciju IPA programa neophodna reorganizacija rada IPA sektora kako u samoj Upravi, tako i u sveukupnoj upravljačkoj i operativnoj strukturi.

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi javnih radova je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi. S toga je neophodno u okviru tekućeg budžeta planirati sredstva za povećanje zarada zaposlenih u Upravi javnih radova, koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

Prilozi:

- Tabela prikaz potrošnje sredstava (Prilog broj 1);**
- Realizacija po projektima (Prilog broj 2).**

Zaključci i preporuke nadležnim institucijama:

- ❖ Da se u okviru obezbijeđenih sredstava, Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijeđeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost i odloženo finansiranje projekata, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi i troškovi izgradnje.
- ❖ Da se kod izbora kapitalnih projekata uvedu dodatni eliminatorni uslovi koji će obezbijediti da Zakonom o budžetu budu obuhvaćeni samo projekti čiji su Korisnici već sa kandidovanjem projekta dostavili svu neophodnu i validnu dokumentaciju, na osnovu koje će Uprava javnih radova sa početkom naredne budžetske godine pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji samog projekta.
- ❖ Da se kroz zakonsku regulativu bliže utvrde uslovi za ukidanje licenci projektantima, revidentima i privrednim društvima koja se bave projektovanjem i revizijom tehničke dokumentacije, čime bi se propusti prilikom izrade projektne dokumentacije, a koji rezultiraju nepredviđenim i naknadnim radovima adekvatno sankcionisali. Takođe, neophodno je zakonom propisati obavezu projektantima i revidentima da nadoknade nastalu štetu investitoru.
- ❖ Da se kroz reorganizaciju IPA operativne strukture unaprijedi rad svih uključenih na IPA projektima od programiranja, preko pripreme ulaznih podataka i dokumentacije od strane krajnjih korisnika, korisnika, ministarstava čime će se unaprijediti kvalitet dokumentacije koja se dostavlja Upravi javnih radova, a koja će uz neophodnu reorganizaciju moći postizati očekivane rezultate.
- ❖ Da se pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi javnih radova sistemski rješava uz povećanje zarada zaposlenih koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

UPRAVA JAVNIH RADOVA:

Rešad Nuhodžić, direktor

Maja Delić, pomoćnica direktora
Sektora za planiranje i tehničku pripremu

Seid Dacić, pomoćnik direktora
Sektora za realizaciju i monitoring

Milica Bakić, pomoćnica direktora
Sektora za ugovoranje i kontrolu kvaliteta dokumenata

Skender Šarkinović, pomoćnik direktora
Sektora za finansijske i računovodstvene poslove

Dragana Babović, pomoćnica direktora
Sektora za pravne poslove i ljudske resurse

PRILOG BROJ 1

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2020. GODINU
01.01.2020. - 31.12.2020.

	Naziv projekta	OPREDJELJENA SREDSTVA IZ OPŠTIH PRIHODA, DONACIJA I KREDITA, NAKON PREUSMJERAVANJA ZA 2020. GODINU			NAPOMENA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2020.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
1.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	396,900.00	8,475,462.38	8,872,362.38		326,195.07	8,474,962.38	8,801,157.45
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	2,000.00	0.00	2,000.00	Obaveza Ministarstva pravde i vanjskih poslova je bila da dostave ovjeren projektni zadatak i utu-e, nakon čega je UJR radova raspisala javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije i u toku je vrednovanje ponuda.	96.80	0.00	96.80
1.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta Palata pravde	40,000.00	0.00	40,000.00	Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e,	36,455.50	0.00	36,455.50

	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	10,000.00	133,000.00	143,000.00	<p>proceduru arh. konkursa, nakon čega će UJR radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.</p> <p>Nakon što je jedini ponuđač na javnom nadmetanju za izvođenje radova II faze izgradnje predmetnog objekta odustao, MORT sprovodi aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerima koji učestvuju u finansiranju objekta, u cilju ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja na međunarodnom nivou u skladu sa PRAG pravilima.</p>	0.00	133,000.00	133,000.00
--	---	-----------	------------	-------------------	--	------	------------	-------------------

1.5.	Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti	15,000.00	0.00	15,000.00	Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije za prilagođavanje 5 od 6 prioritetnih objekata.	12,934.90	0.00	12,934.90
1.6.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	10,000.00	0.00	10,000.00	Radovi I faze su obustavljeni usljed ometanja vlasnika stambene jedinice smještene u okviru objekta stanice. Za potrebe ugovaranja radova II faze obaveza MUP je kompletiranje projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja.	0.00	0.00	0.00
1.7.	Izgradnja kompleksa objekata sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici	50,000.00	3,550,698.47	3,600,698.47	U toku je izgradnja.	36,057.65	3,550,424.74	3,586,482.39
1.8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	60,000.00	1,949,263.91	2,009,263.91	U toku je izvođenje radova.	53,993.84	1,949,222.36	2,003,216.20

1.9.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore	80,000.00	2,842,500.00	2,922,500.00	U toku je izvođenje radova.	78,481.33	2,842,315.28	2,920,796.61
1.10.	Izgradnja objekata za potrebe Državne revizorske institucije	10,000.00	0.00	10,000.00	Obaveza DRI je da u saradnji sa MORTom sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	665.50	0.00	665.50
1.11.	Izgradnja objekta za potrebe Monstata	4,900.00	0.00	4,900.00	Prestaala potreba. U saradnji sa nadležnim institucijama Monstaata je sproveo proceduru kupovine objekta za svoje potrebe.	0.00	0.00	0.00

1.12.	Objekti za potrebe uprave UIKS-a u Danilovgradu i Mojkovcu	110,000.00	0.00	110,000.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	107,509.55	0.00	107,509.55
2.	Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	98,000.00	770,000.00	868,000.00		16,659.94	442,366.23	459,026.17
2.1.	Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici	18,000.00	50,000.00	68,000.00	Svi ugovoreni radovi su završeni.	0.00	0.00	0.00
2.2.	Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	10,000.00	30,000.00	40,000.00	U toku je izvođenje radova.	7,559.94	26,477.36	34,037.30
2.3.	Izvođenje radova, nabavka opreme i uređenje objekata u funkciji razvoja kulture	10,000.00	205,000.00	215,000.00	Nakon što se prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja oslobodi od čuvanog inventara i završe radovi na rekonstrukciji objekta, izvođač će pristupiti ugradnji opreme.	400.00	0.00	400.00

2.4.	Izvođenje radova na dogradnji JU Zahumlje u Nikšiću	10,000.00	290,000.00	300,000.00	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.	8,700.00	258,495.55	267,195.55
2.5.	Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" - Bar	5,000.00	165,000.00	170,000.00	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.	0.00	157,393.32	157,393.32
2.6.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	15,000.00	0.00	15,000.00	Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje će UJR pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti (projektne zadatke, utu-e i sl.)	0.00	0.00	0.00
2.7.	Muzej savremene umjetnosti u Podgorici	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Obaveza Ministarstva kulture je da u saradnji sa MORTom sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da	0.00	0.00	0.00

2.8.	Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	5,000.00	5,000.00	10,000.00			UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije. Radovi su obustavljeni dok Prijestonica Cetinje u saradnji sa nadležnim institucijama ne usaglasi projektnu dokumentaciju.	0.00	0.00	0.00			0.00
2.9.	Rekonstrukcija kulturnog dobra gradski bedemi - ostaci Onogošta u Nikšiću	5,000.00	5,000.00	10,000.00			Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Nakon što revidovana projektna dokumentacija bude dostavljena, stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	0.00	0.00	0.00			0.00

2.10.	Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Nakon što revidovana projektna dokumentacija bude dostavljena, stvoriće se uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	0.00	0.00	0.00
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	136,355.86	4,639,087.23	4,775,443.09		134,055.86	4,598,757.23	4,732,813.09
3.1.	Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	0.00	10,000.00	10,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Kotor. UJR na osnovu dostavljene ovjerene situacije vrši prenos ugovorom definisanih sredstava.	0.00	0.00	0.00

3.2.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru	31,000.00	2,164,000.00	2,195,000.00	U toku je izvođenje radova.	30,944.76	2,163,226.34	2,194,171.10
3.3.	Izgradnja sportskih terena	0.00	10,000.00	10,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovode se u skladu sa iskazanim prioritetima Ministarstva sporta. UJR nije dostavljena dokumentacija za potrebe realizacije ovog projekta.	0.00	0.00	0.00
3.4.	Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	9,000.00	8,087.23	17,087.23	Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	8,379.00	0.00	8,379.00
3.5	Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	31,000.00	1,082,000.00	1,113,000.00	U toku je izvođenje radova.	30,008.00	1,081,059.71	1,111,067.71

3.6	Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Nakon usvajanja planske dokumentacije, obaveza Korisnika je da dostavi dokumentaciju UJR kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
3.7	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	U toku je izvođenje radova.	0.00	430,560.07	430,560.07
3.8	Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju	65,355.86	924,000.00	989,355.86	989,355.86	U toku je izvođenje radova.	64,724.10	923,911.11	988,635.21
4.	Projekti očuvanja životne sredine	456,119.89	3,586,598.36	4,042,718.25	4,042,718.25		452,813.87	3,586,098.36	4,038,912.23
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	126,000.00	37,250.00	163,250.00	163,250.00	U toku je izrada i revizija projektne dokumentacije.	125,297.75	37,237.08	162,534.83
4.2.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	50,000.00	1,155,750.00	1,205,750.00	1,205,750.00	U toku je izvođenje radova.	49,657.62	1,155,749.71	1,205,407.33

4.3.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	3,500.00	43,800.00	47,300.00	Svi ugovoreni radovi su završeni.	3,331.00	43,850.40	47,181.40
4.4.	Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja	60,800.00	1,439,000.00	1,499,800.00	U toku je izvođenje radova.	60,074.78	1,438,965.72	1,499,040.50
4.5.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	61,000.00	500,100.00	561,100.00	U toku je izvođenje radova.	60,694.94	499,732.17	560,427.11
4.6.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	150,000.00	354,998.36	504,998.36	U toku je sprovođenje mjera.	149,994.68	354,848.78	504,843.46
4.7.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	4,000.00	55,700.00	59,700.00	U toku je izvođenje radova.	3,763.10	55,714.50	59,477.60
4.8.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	819.89	0.00	819.89	Obaveza MORTa i Opštine Plav je da dostave kompletiran i ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmjetanje za izbor obrađivača i revidenta projektna dokumentacije.	0.00	0.00	0.00

5.	Izgradnja lokalne infrastrukture	237,826.26	10,377,520.99	10,615,347.25		219,091.75	10,377,020.99	10,596,112.74
5.1.	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	20,226.26	187,380.00	207,606.26	Radovi su završeni i u toku je tehnički prijem.	16,166.71	187,578.43	203,745.14
5.2.	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu	13,000.00	826,310.00	839,310.00	Svi ugovoreni radovi su završeni.	12,189.92	826,304.92	838,494.84
5.3.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	159,600.00	7,068,455.99	7,228,055.99	U toku je realizacija ugovora zaključenih između UJR i opština koje u skladu sa ugovorom sprovode aktivnosti na projektima, kao i ugovora koje je UJR u prethodnom zaključila u okviru projekta	153,370.57	7,067,954.76	7,221,325.33
5.3.1.	Lokalni putevi i gradske saobraćajnice				Aktivnosti sprovode opštine	108,958.62	6,263,749.26	6,372,707.88
5.3.1.1	Prijestonica Cetinje				Aktivnosti sprovodi Prijestonica.	0.00	563,000.00	563,000.00
5.3.1.2	Opština Berane				Aktivnosti sprovodi Opština	0.00	232,992.58	232,992.58
5.3.1.3	Opština Pljevlja				Aktivnosti	0.00	48,833.28	48,833.28

5.3.1.4	Opština Šavnik						0.00	199,590.23	199,590.23
5.3.1.5	Opština Gusinje						29,374.57	26,228.79	55,603.36
5.3.1.6	Opština Danilovgrad						17,710.86	182,812.74	200,523.60
5.3.1.7	Glavni grad Podgorica						0.00	400,000.00	400,000.00
5.3.1.8	Opština Plav						2,541.00	31,351.57	33,892.57
5.3.1.9	Opština Andrijevica						4,000.00	292,079.39	296,079.39
5.3.1.10	Opština Rožaje						0.00	323,363.93	323,363.93
5.3.1.11	Opština Bijelo Polje						25,699.91	739,030.25	764,730.16
5.3.1.12	Opština Herceg Novi						653.40	134,910.06	135,563.46
5.3.1.13	Opština Petnjica						0.00	521,087.92	521,087.92
5.3.1.14	Opština Nikšić						0.00	661,190.85	661,190.85
5.3.1.15	Opština Mojkovac						0.00	104,627.13	104,627.13
5.3.1.16	Opština Kolašin						12,400.08	362,172.76	374,572.84
5.3.1.17	Opština Ulcinj						0.00	0.00	0.00
5.3.1.18	Opština Žabljak						4,796.30	529,372.02	534,168.32
5.3.1.19	Opština Bar						0.00	0.00	0.00
5.3.1.20	Opština Golubovci						1,800.00	152,957.63	154,757.63
5.3.1.21	Opština Plužine						0.00	199,991.54	199,991.54

5.3.1.22	Opština Tivat							Aktivnosti sprovodi Opština	0.00	0.00	0.00
5.3.1.23	Opština Tuzi							Aktivnosti sprovodi Opština	9,982.50	163,569.10	173,551.60
5.3.1.24	Opština Kotor							Aktivnosti sprovodi Opština	0.00	394,587.49	394,587.49
5.3.2.	Lokalni putevi i gradske saobraćajnice							Aktivnosti sprovodi UJR	44,411.95	804,205.50	848,617.45
5.3.2.1	Opština Cetinje							U toku je izvođenje radova	1,405.92	0.00	1,405.92
5.3.2.2	Opština Berane							U toku je izvođenje radova	10,401.51	0.00	10,401.51
5.3.2.3	Opština Gusinje							U toku je izvođenje radova	16,517.30	133,338.96	149,856.26
5.3.2.4	Opština Rožaje							U toku je izvođenje radova	0.00	5,885.85	5,885.85
5.3.2.5	Opština Bijelo Polje							U toku je izvođenje radova	11,531.30	517,746.27	529,277.57
5.3.2.6	Opština Mojkovac							U toku je izvođenje radova	3,150.00	13,861.95	17,011.95
5.3.2.7	Opština Žabljak							U toku je izvođenje radova	0.00	133,372.47	133,372.47
5.4.	Izgradnja gradske pijace u Gusinju	4,000.00	10.00	4,010.00				Radovi su završeni i objekta predat korisniku na upotrebu.	3,726.80	0.00	3,726.80
5.5.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	14,000.00	379,700.00	393,700.00				U toku je izvođenje radova.	13,766.80	379,693.27	393,460.07
5.6.	Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tivtu	1,000.00	10.00	1,010.00				Obaveza Opštine Tivat je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene	0.00	0.00	0.00

5.7.	Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	1,000.00	71,450.00	72,450.00	aktivnosti iz svoje nadležnosti.	848.16	71,428.53	72,276.69
5.8.	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	500.00	10.00	510.00	Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00
5.9.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	4,000.00	181,750.00	185,750.00	Radovi I faze su završeni i isti nijesu obuhvatili opremanje objekta.	3,989.47	181,732.43	185,721.90
5.10.	Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	12,000.00	929,475.00	941,475.00	U toku je izvođenje radova.	11,535.14	929,470.79	941,005.93
5.11.	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav	3,000.00	246,560.00	249,560.00	Radovi su završeni i u toku je tehnički prijem radova.	2,167.63	246,557.10	248,724.73
5.12.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevića, Plav	500.00	10.00	510.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
5.13.	Lokalni put Ckla - granica Albanije, opština Bar	1,000.00	69,030.00	70,030.00	Nakon što Opština Bar izvrši prijavu radova, stvorice se uslovi da UJR i	0.00	69,022.67	69,022.67

								stručni nadzor uvedu izvođača u posao.				
5.14.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu	1,000.00	417,300.00	418,300.00		Svi radovi su završeni.	614.59	417,278.09	417,892.68			
5.15.	Putni pravac Monte-Rose	1,000.00	10.00	1,010.00		Obaveza Opštine Herceg Novi je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00			
5.16.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	0.00	20.00	20.00		Obaveza Opštine Plav je da sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta, dok će UJR na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.	0.00	0.00	0.00			
5.17.	Rekonstrukcija trga u Plavu	1,000.00	20.00	1,020.00		Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	0.00	0.00	0.00			
5.18.	Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru	1,000.00	20.00	1,020.00		U toku je izvođenje radova.	715.96	0.00	715.96			

6.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	30,000.00	960,000.00	990,000.00		11,568.00	170,396.16	181,964.16
6.1.	Rekonstrukcija energetskeg bloka- trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	8,000.00	450,000.00	458,000.00	U toku je usaglašavanje tehničkih rješenja projektno dokumentacije sa Korisnikom.	0.00	0.00	0.00
6.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	5,000.00	400,000.00	405,000.00	U toku je izvođenje radova.	484.00	110,693.61	111,177.61
6.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	1,000.00	10,000.00	11,000.00	Ministarstvo zdravlja provodi aktivnosti na izradi i reviziji projektno dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00

6.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu	1,000.00	20,000.00	21,000.00	Ministarstvo zdravlja provodi aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, radovi na izgradnji objekta su isključeni iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.	0.00	0.00	0.00
6.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pijevljima	1,000.00	10,000.00	11,000.00	Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
6.6.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	1,000.00	5,000.00	6,000.00	Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje	0.00	0.00	0.00

							nadležnosti.					
6.7.	Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	1,000.00	5,000.00	6,000.00			Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00		0.00
6.8.	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	12,000.00	60,000.00	72,000.00			Radovi na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore su završeni i objekat je predat na upotrebu Korisniku.	11,084.00	59,702.55	70,786.55		
7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	80,578.32	4,501,717.49	4,582,295.81				78,959.82	4,501,117.49	4,580,077.31		
7.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	40,000.00	3,125,867.49	3,165,867.49			U toku je izvođenje radova.	39,727.38	3,125,368.87	3,165,096.25		
7.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću	40,000.00	1,375,750.00	1,415,750.00			U toku je izvođenje radova.	39,232.44	1,375,748.62	1,414,981.06		
7.3.	Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići", opština Cetinje	378.32	0.00	378.32			U skladu sa obrazloženjem projekta, aktivnosti na realizaciji	0.00	0.00	0.00		

								da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.	152,350.13	5,574,463.42	5,726,813.55
8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	156,300.53	5,575,263.42	5,731,563.95				Opšti prihodi kredit 8.000,00	52,048.27	980,357.32	1,032,405.59
8.1.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a I	52,450.53	980,893.42	1,033,343.95				Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.			
8.1.1.	Vrtić u Baru	100.00	10.00	110.00					0.00	0.00	0.00
8.1.2.	Vrtić u Ulcinju	100.00	10.00	110.00				Min. prosvjete je u saradnji sa MORT sprovelo proceduru arh. konkursa. Potrebno je da uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni	0.00	0.00	0.00

8.2.5.	Vrtić u Bijelom Polju	100.00	10.00	110.00	100.00	10.00	110.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6.	Vrtić u Beranama	100.00	10.00	110.00	100.00	10.00	110.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00

8.2.7.	Vrtić u Plavu	100.00	10.00	110.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.3.	Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	17,000.00	875,150.00	892,150.00	Radovi su završeni i u toku je završno ispitivanje izvedenih instalacija.	16,947.00	875,142.31	892,089.31
8.4.	Osnovna škola u Igalu	500.00	10.00	510.00	Obaveza Min. prosvjete je da u saradnji sa MORTom sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonagrađeno idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za	0.00	0.00	0.00

8.7.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore, na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	8,650.00	10.00	8,660.00	Izrada i revizija projektne dokumentacije je završena i u toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača i stručnog nadzora.	8,620.00	0.00	8,620.00
8.8.	Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	500.00	30,900.00	31,400.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	428.47	30,894.63	31,323.10
8.9.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	16,500.00	1,933,800.00	1,950,300.00	U toku je izvođenje radova.	16,460.96	1,933,791.10	1,950,252.06
8.10.	Izgradnja OŠ u Rožajama	100.00	10.00	110.00	Obaveza Min. prosvjete i Opštine Rožaje je rješavanje imovinsko-prvnih odnosa.	0.00	0.00	0.00
8.11.	Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Bijelom Polju	100.00	10.00	110.00	Obaveza Min. prosvjete je da u saradnji sa MORTom sprovede proceduru arh. konkursa, a potom uz prvonađeno	0.00	0.00	0.00

								idejno rješenje dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.					
8.12.	OŠ "Lovćenski partizanski odred" na Cetinju	100.00	10.00	110.00				Obaveza Min. prosvjete je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje će UJR pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00		0.00
8.13.	Naučno-Tehnološki park u Podgorici	10,900.00	1,628,800.00	1,639,700.00				U toku je izvođenje radova.	10,890.00	1,628,799.59	1,639,689.59		
8.14.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	16,000.00	125,500.00	141,500.00				Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu. Dalja fazna realizacija projekta sprovodiće se u skladu sa iskazanim perioritetima Korisnika.	15,622.10	125,478.47	141,100.57		

8.15.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	700.00	70.00	770.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.15.1.	Druga Gimnazija u Podgorici	100.00	10.00	110.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.2.	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	100.00	10.00	110.00	Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
8.15.3.	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuži u Podgorici	100.00	10.00	110.00	Obaveza ministarstva prosvjete je riješavanje imovinsko-	0.00	0.00	0.00

8.15.4.	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	100.00	10.00	110.00				0.00	0.00	0.00		
8.15.5.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	100.00	10.00	110.00				0.00	0.00	0.00		

8.15.6.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	100.00	10.00	110.00	izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije. Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00				0.00
8.15.7.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	100.00	10.00	110.00	izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije. Obaveza Min. prosvjete je da dostavi ovjeren projektni zadatak i utu-e, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00				0.00

8.16.	Adaptacija objekata obrazovanja	100.00	10.00	110.00	Min. prosvjete je dostavilo neophodnu dokumentaciju i UJR je pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
9.	Unapređenje turističke ponude	1,723,623.97	24,392,388.21	26,116,012.18		1,714,924.15	24,391,688.21	26,106,612.36
9.1.	Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin	68,070.00	4,390,888.21	4,458,958.21	U toku je realizacija projekta.	68,069.51	4,390,832.43	4,458,901.94
9.2.	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	1,041,921.00	2,587,600.00	3,629,521.00	U toku je realizacija projekta.	1,041,920.09	2,587,581.60	3,629,501.69
9.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	197,400.00	6,465,500.00	6,662,900.00	U toku je realizacija projekta.	197,390.03	6,465,417.97	6,662,808.00
9.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	80,960.00	3,864,900.00	3,945,860.00	U toku je realizacija projekta.	80,952.16	3,864,834.39	3,945,786.55
9.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	36,630.00	263,100.00	299,730.00	Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetu Izvršavaju misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine	36,620.15	263,093.00	299,713.15

9.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	204,310.00	4,685,000.00	4,889,310.00	Nacionalnog parka Durmitor.	204,302.10	4,684,925.06	4,889,227.16
9.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijašišta u Kolašinu	50.00	997,900.00	997,950.00	U toku je realizacija projekta.	0.00	997,900.00	997,900.00
9.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	27,250.00	98,800.00	126,050.00	U toku je realizacija projekta.	27,239.86	98,760.96	126,000.82
9.9.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevici	5,340.00	38,500.00	43,840.00	U toku je izvođenje radova.	5,337.00	38,433.92	43,770.92
9.10.	Objekat nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	11,400.00	914,700.00	926,100.00	U toku je izvođenje radova.	11,393.12	914,683.91	926,077.03
9.11.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	50.00	100.00	150.00	U toku je izrada projektne dokumentacije.	0.00	0.00	0.00
9.12.	Nacionalni parkovi	41,710.00	85,300.00	127,010.00	U toku je realizacija projekta.	41,700.13	85,224.97	126,925.10
9.13.	Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju	50.00	100.00	150.00	Obaveza Opštine je da u saradnji sa MORTom razmotri potrebu raspisivanju konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.	0.00	0.00	0.00

9.14.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1450 i Kolašin 1600 i osmiježavanje staza ski centra Kolašin 1600	8,482.97	0.00	8,482.97	Obaveza Korisnika je kompletiranje projektnog zadatka i utu-a, čime će se stvoriti uslovi da UJR raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.	10,000.00	0.00	10,000.00
10	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	2,109,056.72	2,507,555.00	4,616,611.72		1,661,540.75	1,817,596.42	3,479,137.17
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	150,000.00	500,000.00	650,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	96,293.15	100,819.33	197,112.48
10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtjeljka" na Cetinju	50,000.00	5,000.00	55,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu. U toku je priprema dokumentacije koja će biti poslata Tijelu za rješavanje sporova po ugovoru za radove koji je raskinut.	16,908.10	41,039.77	57,947.87
10.3.	Sanacija odlagališta "Čafo" u Baru	10,000.00	224,855.00	234,855.00		505.48	0.00	505.48

10.4.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos - Trebešica"	100,000.00	1,750,000.00	1,850,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	41,494.83	1,675,737.32	1,717,232.15
10.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	15,000.00	5,000.00	20,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	5,163.35	0.00	5,163.35
10.6.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	10,000.00	1,000.00	11,000.00	Ministarstvo zdravlja je sprovelo aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije. U toku je odobrenje tenderske dokumentacije za izvođenje radova i stručni nadzor od strane DEU, a za čiju izradu je Ministarstvo zdravlja angažovalo konsultanta.	0.00	0.00	0.00
10.7.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	100,000.00	20,000.00	120,000.00	Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. u toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije	44,437.80	0.00	44,437.80

									sa izbor izvođača radova i stručnog nadzora.				
10.8.	Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	21,101.44	0.00	Implementacija ugovora sa konsultantom je u toku.	21,101.44	0.00	21,101.44	
10.9.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	7,794.35	0.00	U toku je procedura poništenja tendera.	7,794.35	0.00	7,794.35	
10.10.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	667,998.25	0.00	Implementacija ugovora sa konsultantom je u toku.	667,998.25	0.00	667,998.25	
10.11.	Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00	
10.12.	Iačanje kapaciteta, transpozicija ACQUija planiranje u životnoj sredini	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	U toku je procedura poništenja tendera.	0.00	0.00	0.00	

10.13.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama	1,056.72	100.00	1,156.72	U toku je realizacija ugovora.	0.00	0.00	0.00
10.14.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom	1,000.00	100.00	1,100.00	U toku je realizacija ugovora.	0.00	0.00	0.00
10.15.	Nabavka opreme za horizontalnu podršku i izvještavanje i monitoring o životnoj sredini za podsektor kvalitet vazduha, i podsektor zaštite od buke	1,000.00	0.00	0.00	U toku je realizacija ugovora.	0.00	0.00	0.00
10.16.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji evropskog mehanizma za civilnu zaštitu	1,000.00	0.00	0.00	U toku je realizacija ugovora.	0.00	0.00	0.00
10.17.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	1,000.00	100.00	1,100.00	U toku je realizacija ugovora za Grant.	0.00	0.00	0.00

10.18.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	1,000.00	100.00	1,100.00	Objavljena je najava o raspisivanju tendera za nabavku opreme i usluge,	0.00	0.00	0.00
10.19.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1,000.00	100.00	1,100.00	U toku je javno nadmetanje za nabavku opreme.	0.00	0.00	0.00
10.20.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	800,000.00	0.00	800,000.00	Implementacija ugovora sa konsultantom je u toku.	733,463.96	0.00	733,463.96
10.21.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	1,000.00	0.00	1,000.00	U toku je javno nadmetanje za konsultantske usluge.	0.00	0.00	0.00
10.22.	Rekonstrukcija na željezičkoj pruzi Virpazar - Sutomore, u tunelu Sozina	50,000.00	0.00	50,000.00	Radovi su završeni i objekta je predat korisniku na upotrebu.	13,828.12	0.00	13,828.12
10.23.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	20,000.00	0.00	20,000.00	U toku je javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije.	12,551.92	0.00	12,551.92
10.24.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	1,000.00	100.00	1,100.00	Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije	0.00	0.00	0.00

10.25.	Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni obejekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)	1,000.00	100.00	1,100.00	Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz kapitalnog budžeta.	0.00	0.00	0.00
10.26.	Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	1,000.00	100.00	1,100.00	Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da UJR pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.	0.00	0.00	0.00
10.27.	Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređivanje veterinarske i fitosanitarne kontrole	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00

10.28.	Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravije bilja	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.29.	Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.30.	Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica - Golubovci	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su	0.00	0.00	0.00

10.33.	Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.34.	Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00
10.35.	Iačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU i ACQUIS	1,000.00	100.00	1,100.00	U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su	0.00	0.00	0.00

								na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.				
10.36.	Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu	5,000.00	0.00	5,000.00				IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00
10.36.1.	PPOV u Rožajama	1,000.00	0.00	0.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00
10.36.2.	Kanalizaciona mreža u Rožajama	1,000.00	0.00	1,000.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i	0.00	0.00	0.00	0.00

								saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.				
10.36.3.	PPOV u Kolašinu	1,000.00	0.00	1,000.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00
10.36.4.	Kanalizaciona mreža u Kolašinu	1,000.00	0.00	1,000.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00
10.36.5.	Kanalizaciona mreža u Mojkovcu	1,000.00	0.00	1,000.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni	0.00	0.00	0.00	0.00

								projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.				
10.37.	Grant šema za energetske efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju	1,000.00	0.00	1,000.00				U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zakon o Prijestonici	1,255,100.00	3,721,900.00	4,977,000.00					1,100,766.39	3,403,084.13	4,503,850.52	
11.1.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0.00	530,000.00	530,000.00				Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	81.49	450,512.48	450,593.97	
11.2.	Sanacija sportskih sala SRC Cetinje	20,000.00	0.00	20,000.00				Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	12,890.73	0.00	12,890.73	

11.3.	Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos"	55,000.00	497,000.00	487,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	46,382.50	495,027.27	541,409.77
11.4.	Rekonstrukcija Jabučke ulice i izgradnja II faze saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks	60,000.00	34,000.00	150,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	54,553.50	30,517.13	85,070.63
11.5.	Izgradnja staze sa atletskom stazom u naselju Humci	0.00	0.00	0.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.6.	Prihvatilište za napuštene kućne ljubimce (azil)	45,100.00	49,900.00	50,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	48,273.01	48,273.01
11.7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja	25,000.00	1,786,000.00	1,700,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	18,331.50	1,785,458.23	1,803,789.73
11.8.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	0.00	335,000.00	500,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	36,600.00	222,380.00	258,980.00
11.9.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	250,000.00	0.00	250,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	174,035.05	0.00	174,035.05

11.10.	Kupovina zemljišta za potrebe proširenja "Novog groblja"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.11.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	0.00	0.00
11.12.	Unapređenje turističke ponude grada	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	7,891.62	97,588.86	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	7,891.62	97,588.86	105,480.48
11.13.	Kupovina lokacije za Lokandu	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	750,000.00	0.00	750,000.00
11.14.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	133,327.15	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	133,327.15	133,327.15
11.15.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi prijestonica.	0.00	140,000.00	140,000.00
12	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	575,000.00	5,000.00	580,000.00	5,000.00	580,000.00	569,555.62	0.00	U toku je realizacija.	569,555.62	0.00	569,555.62
	SVE UKUPNO	7,254,861.55	69,512,493.08	76,767,354.63	69,512,493.08	76,767,354.63	6,438,481.35	67,337,551.02		6,438,481.35	67,337,551.02	73,776,032.37

Realizacija tekućeg budžeta 31.12.2020.

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)	Realizovano (%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
BUDGET	415061921	4111	385,963.58	382,589.05	3,374.53	99.13
BUDGET	415061921	4112	51,377.52	50,654.84	722.68	98.59
BUDGET	415061921	4113	137,006.34	135,019.20	1,987.14	98.55
BUDGET	415061921	4114	48,522.54	47,839.67	682.87	98.59
BUDGET	415061921	4115	7,698.59	7,582.93	115.66	98.50
BUDGET	415061921	4124	720.00	216.00	504.00	30.00
BUDGET	415061921	4125	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
BUDGET	415061921	4127	9,120.00	9,120.00	0.00	100.00
BUDGET	415061921	4131	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00
BUDGET	415061921	4133	1,800.00	1,762.77	37.23	97.93
BUDGET	415061921	4134	200.00	0.00	200.00	0.00
BUDGET	415061921	4135	900.00	0.00	900.00	0.00
BUDGET	415061921	4139	450.00	433.66	16.34	96.37
BUDGET	415061921	4141	15,000.00	7,844.50	7,155.50	52.30
BUDGET	415061921	4142	2,193.00	2,192.56	0.44	99.98
BUDGET	415061921	4143	5,200.00	5,199.99	0.01	100.00
BUDGET	415061921	4144	900.00	0.00	900.00	0.00
BUDGET	415061921	4146	6,869.00	102.85	6,766.15	1.50
BUDGET	415061921	4147	12,000.00	646.39	11,353.61	5.39
BUDGET	415061921	4148	4,500.00	444.80	4,055.20	9.88
BUDGET	415061921	4149	6,550.00	6,543.88	6.12	99.91
BUDGET	415061921	4153	11,900.00	11,893.47	6.53	99.95
BUDGET	415061921	4161	1.00	0.00	1.00	0.00
BUDGET	415061922	4171	10,036.00	8,670.44	1,365.56	86.39
BUDGET	415061921	4191	9,900.00	5,569.53	4,330.47	56.26
BUDGET	415061921	4192	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
BUDGET	415061921	4193	1,556.00	1,555.18	0.82	99.95
BUDGET	415061921	4194	795.00	709.68	85.32	89.27
BUDGET	415061921	4196	0.00	0.00	0.00	0.00
BUDGET	415061921	4199	2,708.00	2,707.90	0.10	100.00
BUDGET	415061921	4415	5,803.00	5,802.23	0.77	99.99
BUDGET	415061921	4416	1,283.33	1,100.00	183.33	85.71
BUDGET	415061921	4630				
			751,302.00	447,554.36	47,901.38	93.62

**Realizacija kapitalnog budžeta po stavkama izdataka
31.12.2020.**

Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506804	4144	500.00	0.00	500.00
BUDGET	41506804	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506804	4147	392,800.00	326,001.47	66,798.53
BUDGET	41506804	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506804	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506804	4199	3,000.00	193.60	2,806.40
BUDGET	41506804	4413	6,910,563.91	6,910,563.91	0.00
BUDGET	41506804	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506804	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506804	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506804	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506804	4147	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506804	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506804	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506804	4413	1,564,398.47	1,564,398.47	0.00
KREDIT	41506804	4415	100.00	0.00	100.00
			8,872,362.38	8,801,157.45	71,204.93

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506805	4127	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506805	4144	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506805	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506805	4147	95,100.00	16,259.94	78,840.06
BUDGET	41506805	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506805	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506805	4199	2,000.00	400.00	1,600.00
BUDGET	41506805	4413	769,500.00	442,366.23	327,133.77
BUDGET	41506805	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506805	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506805	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506805	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506805	4147	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506805	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506805	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506805	4413	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506805	4415	100.00	0.00	100.00

			868,000.00	459,026.17	408,973.83
Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506806	4144	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506806	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506806	4147	107,700.00	107,700.00	0.00
BUDGET	41506806	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506806	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506806	4199	1,500.00	0.00	1,500.00
BUDGET	41506806	4412	40,000.00	0.00	40,000.00
BUDGET	41506806	4413	1,929,500.00	1,929,470.00	30.00
BUDGET	41506806	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506806	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506806	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506806	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506806	4147	26,355.86	26,355.86	0.00
KREDIT	41506806	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506806	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506806	4413	2,669,287.23	2,669,287.23	0.00
KREDIT	41506806	4415	100.00	0.00	100.00
			4,775,443.09	4,732,813.09	42,630.00
Izgradnja lokalne infrastrukture					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506810	4144	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506810	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506810	4147	194,200.00	194,200.00	0.00
BUDGET	41506810	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506810	4191	33,000.00	17,242.69	15,757.31
BUDGET	41506810	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506810	4199	3,000.00	822.80	2,177.20
BUDGET	41506810	4412	2,762,300.00	2,762,300.00	0.00
BUDGET	41506810	4413	340,000.00	340,000.00	0.00
BUDGET	41506810	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506810	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506810	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506810	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506810	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506810	4147	6,826.26	6,826.26	0.00
KREDIT	41506810	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506810	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506810	4412	7,274,720.99	7,274,720.99	0.00

KREDIT	41506810	4413	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506810	4415	100.00	0.00	100.00
			10,615,347.25	10,596,112.74	19,234.51
Projekti ocuvanja zivotne sredine					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506812	4144	2,000.00	245.22	1,754.78
BUDGET	41506812	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506812	4147	315,500.00	315,500.00	0.00
BUDGET	41506812	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506812	4191	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506812	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506812	4199	2,500.00	1,748.76	751.24
BUDGET	41506812	4412	1,106,300.00	1,106,300.00	0.00
BUDGET	41506812	4413	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506812	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506812	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506812	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506812	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506812	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506812	4147	3,267.00	3,267.00	0.00
KREDIT	41506812	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506812	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506812	4412	2,124,949.58	2,124,949.58	0.00
KREDIT	41506812	4413	354,848.78	354,848.78	0.00
KREDIT	41506812	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506812	4134	129,994.68	129,994.68	0.00
KREDIT	41506812	4149	2,058.21	2,058.21	0.00
			4,042,718.25	4,038,912.23	3,806.02
Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506818	4144	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4147	27,100.00	10,600.00	16,500.00
BUDGET	41506818	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4191	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4199	2,000.00	968.00	1,032.00
BUDGET	41506818	4412	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506818	4413	959,200.00	170,396.16	788,803.84
BUDGET	41506818	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506818	4147	100.00	0.00	100.00

DONACIJA	41506818	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506818	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506818	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4147	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4412	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4413	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506818	4415	100.00	0.00	100.00
			990,000.00	181,964.16	808,035.84

Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506819	4144	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506819	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506819	4147	48,200.00	48,200.00	0.00
BUDGET	41506819	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506819	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506819	4199	1,000.00	181.50	818.50
BUDGET	41506819	4412	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506819	4413	49,200.00	49,200.00	0.00
BUDGET	41506819	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506819	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506819	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506819	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506819	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506819	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506819	4147	30,578.32	30,578.32	0.00
KREDIT	41506819	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506819	4412	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506819	4413	4,451,917.49	4,451,917.49	0.00
KREDIT	41506819	4415	100.00	0.00	100.00
			4,582,295.81	4,580,077.31	2,218.50

Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506821	4144	1,000.00	0.00	1,000.00
BUDGET	41506821	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506821	4147	109,700.00	109,700.00	0.00
BUDGET	41506821	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506821	4191	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506821	4196	100.00	0.00	100.00

BUDGET	41506821	4199	3,500.00	1,149.60	2,350.40
BUDGET	41506821	4412	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506821	4413	939,200.00	939,200.00	0.00
BUDGET	41506821	4415	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506821	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506821	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506821	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506821	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506821	4147	41,500.53	41,500.53	0.00
KREDIT	41506821	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506821	4199	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506821	4412	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506821	4413	4,635,263.42	4,635,263.42	0.00
KREDIT	41506821	4415	100.00	0.00	100.00
			5,731,563.95	5,726,813.55	4,750.40
Unapredenje turisticke ponude					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506826	4144	3,000.00	138.17	2,861.83
BUDGET	41506826	4146	11,100.00	10,828.71	271.29
BUDGET	41506826	4147	485,300.00	483,570.37	1,729.63
BUDGET	41506826	4149	100.00	84.70	15.30
BUDGET	41506826	4191	40,000.00	36,178.23	3,821.77
BUDGET	41506826	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506826	4199	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
BUDGET	41506826	4412	4,643,400.00	4,643,400.00	0.00
BUDGET	41506826	4413	2,367,000.00	2,367,000.00	0.00
BUDGET	41506826	4416	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506826	4147	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506826	4412	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506826	4413	100.00	0.00	100.00
DONACIJA	41506826	4415	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506826	4147	150,913.20	150,913.20	0.00
KREDIT	41506826	4196	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506826	4199	8,210.77	8,210.77	0.00
KREDIT	41506826	4412	6,236,060.74	6,236,060.74	0.00
KREDIT	41506826	4413	11,131,227.77	11,131,227.77	0.00
KREDIT	41506826	4415	13,999.70	13,999.70	0.00
			26,116,012.18	26,106,612.36	9,399.82
Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova					
Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506829	4144	3,000.00	3,000.00	0.00

BUDGET	41506829	4146	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506829	4147	751,738.02	327,920.90	423,817.12
BUDGET	41506829	4149	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506829	4191	95,000.00	71,702.15	23,297.85
BUDGET	41506829	4196	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506829	4199	100.00	0.00	100.00
BUDGET	41506829	4411	813,000.00	812,028.42	971.58
BUDGET	41506829	4412	332,650.00	141,859.10	190,790.90
BUDGET	41506829	4413	135,900.00	0.00	135,900.00
BUDGET	41506829	4415	357,500.00	0.00	357,500.00
IPA	41506829	4147	1,258,322.01	1,258,322.01	0.00
IPA	41506829	4411	868,000.00	863,708.90	4,291.10
IPA	41506829	4412	1.00	0.00	1.00
IPA	41506829	4413	5.00	0.00	5.00
IPA	41506829	4415	400.00	0.00	400.00
KREDIT	41506829	4412	100.00	0.00	100.00
KREDIT	41506829	4144	90.21	90.21	0.00
KREDIT	41506829	4146	127.96	127.96	0.00
KREDIT	41506829	4199	377.52	377.52	0.00
			4,616,611.72	3,479,137.17	1,137,474.55

Drzavna komisija za tehnicki pregled autoputa Bar - Boljare

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506830	4131	3,000.00	0.00	3,000.00
BUDGET	41506830	4147	572,000.00	569,555.62	2,444.38
BUDGET	41506830	4415	5,000.00	0.00	5,000.00
			580,000.00	569,555.62	10,444.38

Razvojni projekti Prijestonice Cetinje

Izvor sredstava	Programski kod	Izdatak	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
BUDGET	41506832	4144	100.00	81.49	18.51
BUDGET	41506832	4147	270,000.00	222,091.58	47,908.42
BUDGET	41506832	4199	985,000.00	878,593.32	106,406.68
BUDGET	41506832	4412	2,687,900.00	2,470,799.93	217,100.07
BUDGET	41506832	4413	534,000.00	432,284.20	101,715.80
BUDGET	41506832	4415	500,000.00	500,000.00	0.00
BUDGET	41506832	4419	0.00	0.00	0.00
			4,977,000.00	4,503,850.52	473,149.48
			76,767,354.63	73,776,032.37	2,991,322.26

Realizacija kapitalnog budžeta po izvorima prihoda 31.12.2020				
Izvor prihoda	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)	Realizacija (%)
1	2	3	4=(2-3)	5
<i>OPŠTI PRIHODI</i>	33,776,851.93	30,797,026.77	2,979,825.16	91.18
<i>KREDIT</i>	40,860,474.69	40,856,974.69	3,500.00	99.99
<i>DONACIJE</i>	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
<i>IPA</i>	2,126,728.01	2,122,030.91	4,697.10	99.78
UKUPNO	76,767,354.63	73,776,032.37	2,991,322.26	96.10

Realizacija kapitalnog budžeta iz opštih prihoda - po programima 31.12.2020.	Planirano (€)	Realizovano (€)	Preostalo (€)	Realizovano (%)
1	2	3	4=(2-3)	5
<i>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</i>	7,307,263.91	7,236,758.98	70,504.93	99.04
<i>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</i>	867,200.00	459,026.17	408,173.83	52.93
<i>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</i>	2,079,200.00	2,037,170.00	42,030.00	97.98
<i>Izgradnja lokalne infrastrukture</i>	3,333,000.00	3,314,565.49	18,434.51	99.45
<i>Projekti ocuvanja zivotne sredine</i>	1,426,900.00	1,423,793.98	3,106.02	99.78
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</i>	989,000.00	181,964.16	807,035.84	18.40
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</i>	99,000.00	97,581.50	1,418.50	98.57
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke</i>	1,054,000.00	1,050,049.60	3,950.40	99.63
<i>Unapređenje turističke ponude</i>	8,575,100.00	8,566,200.18	8,899.82	99.90
<i>Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova</i>	2,489,188.02	1,356,510.57	1,132,677.45	54.50
<i>Državna komisija za tehnički pregled autoputa Bar - Boljare</i>	580,000.00	569,555.62	10,444.38	98.20
<i>Razvojni projekti Prijestonice Cetinje</i>	4,977,000.00	4,503,850.52	473,149.48	90.49
UKUPNO	33,776,851.93	30,797,026.77	2,979,825.16	91.18

<i>Realizacija kapitalnog budžeta po programima ukupno (svi izvori prihoda) 31.12.2020.</i>	<i>Planirano (€)</i>	<i>Realizovano (€)</i>	<i>Preostalo (€)</i>	<i>Realizovano (%)</i>
1	2	3	4=(2-3)	5
<i>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</i>	8,872,362.38	8,801,157.45	71,204.93	99.20
<i>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</i>	868,000.00	459,026.17	408,973.83	52.88
<i>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</i>	4,775,443.09	4,732,813.09	42,630.00	99.11
<i>Izgradnja lokalne infrastrukture</i>	10,615,347.25	10,596,112.74	19,234.51	99.82
<i>Projekti ocuvanja zivotne sredine</i>	4,042,718.25	4,038,912.23	3,806.02	99.91
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</i>	990,000.00	181,964.16	808,035.84	18.38
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</i>	4,582,295.81	4,580,077.31	2,218.50	99.95
<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke</i>	5,731,563.95	5,726,813.55	4,750.40	99.92
<i>Unapredenje turisticke ponude</i>	26,116,012.18	26,106,612.36	9,399.82	99.96
<i>Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova</i>	4,616,611.72	3,479,137.17	1,137,474.55	75.36
<i>Drzavna komisija za tehnicki pregled autoputa Bar - Boljare</i>	580,000.00	569,555.62	10,444.38	98.20
<i>Razvojni projekti Prijestonice Cetinje</i>	4,977,000.00	4,503,850.52	473,149.48	90.49
UKUPNO	76,767,354.63	73,776,032.37	2,991,322.26	96.10

PRILOG BROJ 2

REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

**1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA**

1.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

- Za potrebe smještaja administrativnih organa planirana je prenamjena već izgrađenog objekta na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića, koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Izgrađeni objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova, ukupne bruto površina cca 6.990 m².
- Završena je izrada projektnog zadatka, na osnovu kojeg će biti urađen Glavni projekat rekonstrukcije, u cilju prilagođavanja novoj namjeni, opremanja i uređenja lokacije za potrebe Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova.
- Javno nadmetanje za odabir obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta objavljeno 02.07.2020. godine je poništeno, a novo javno nadmetanje je objavljeno 28.10.2020. godine, ponude su otvorene 01.12.2020. godine i u toku je postupak vrednovanja.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 96,80 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.



1.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta palata pravde

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju i drugim opštinama po prioritetima. Takođe, sredstvima su obuhvaćene rekonstrukcija i izgradnja objekata Ministarstva pravde i Tužilaštva u Podgorici, kao i drugih objekata po prioritetima korisnika.
- Projektnom dokumentacijom za radove u objektima sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju planirano je poboljšanje energetske efikasnosti, formiranje jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad, kao i prilagođavanje objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

- **Osnovni sud u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-326/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00 € za tekuće izdatke, od čega 1.790,80 € u 2020. godini.

- **Osnovni sud u Nikšiću**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-324/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00 € za tekuće izdatke, od čega 1.790,80 € u 2020. godini.

- **Osnovni sud u Kotoru**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Kotoru raspisano je 19.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-1379/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.03.2019. godine, na iznos od 4.980,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.980,00 € za tekuće izdatke, od čega 1.992,00 € u 2020. Godini.

- **Osnovni sud u Beranam**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke

male vrijednosti. Ugovor br. 01-3283/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interforma" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.053,50 €.

- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.053,50 € za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos realizovan u 2020. godini.

• **Osnovni sud u Bijelom Polju**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3284/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interformom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.549,60 €.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.549,60 za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos realizovan 2020. godini.

• **Vrhovni sud u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača za izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije je raspisano 26.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za izradu projekta postojećeg stanja objekta. Ugovor br. 01-1260/1 sa obrađivačem elaborata geodetskog snimanja lokacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.02.2019. godine, na iznos od 2.299,00 €.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta. Obaveza Vrhovnog suda i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.299,00€ za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos realizovan u 2020. godini.

• **Objekat Palate pravde**

- Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, kao i saglasnost glavnog državnog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa, u koliko je projekat predmet donacije, nakon čega će Uprava javnih radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

1.3. Izgradnja objekta Državnog tužilaštva u Podgorici

- Za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Tužilačkog savjeta – Sekretarijata, planirana je izgradnja novog objekta površine cca 12.000 m², na uglu Bulevara “Ivana Crnojevića” i Ulice “Vaka Đurovića”, u neposrednoj blizini već izgrađenog objekta za potrebe administrativnih organa.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na kompletiranju projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta.
- U skladu sa obavještenjem Ministarstva pravde, aktivnosti na raspisivanu javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije i revidenta će otpočeti nakon izrade Idejnog rješenja rekonstrukcije postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa koji se nalaze na istoj parceli i predlaganja varijantnih rješenja uređenja terena za cijelu parcelu.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

1.4. Izgradnja Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegro–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.

- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50 €.
- Do sada je završena izrada armirno-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
- Nakon dobijanja smjernica od Ministarstva održivog razvoja i turizma odnosno nadležnog ministarstva pokrenuće se dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijeđeno je 633.000,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.094.302,71 € za tekuće izdatke, odnosno 2.856.428,57 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 4.286.503,42 €, od čega 133.000,00 € u 2020. godini.

1.5. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti

- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.934,90 € za tekuće izdatke.
- **Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici**
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, „Entasis” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64 €.
 - Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.

- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Stare Vlade Crne Gore u Podgorici, dok je za zgradu Predsjednika Crne Gore završena izrada idejnog rješenja i isto je dostavljeno Upravi za imovinu na saglasnost.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2229/1 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 8.107,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Uprave carina u Podgorici, kao i revizija glavnog projekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.107,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju raspisano je 10.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-944 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020, na iznos od 4.827,90 €.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00 €, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju završena je revizija projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.827,90 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

1.6. Rekonstrukcija objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine

412 m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.

- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
 - u suterenu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
 - u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
 - na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
 - u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
 - na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00 €.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će se stvoriti uslovi za završetak radova I faze i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze koja će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.617,60€ za tekuće izdatke, odnosno 238.898,37€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 242.515,97€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.



1.7. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlati, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlati.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „ Ing–invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00 €.
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02 €).
- Na realizaciji objekta magacina do sada realizovano 8.307,00 € za tekuće izdatke, odnosno 759.950,20 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 768.257,20 € od čega 388.752,06€ u 2020. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupaku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00 €.
- Ugovoreni radovi obuhvataju rušenje postojećih i izgradnju preostalih novih objekata smještajnog kompleksa SAJ i PJP na Zlatici (administrativno smještajni objekat, sportski objekat, objekat za dresuru pasa, garaže i drugi sadržaji).
- Do sada su završeni grubi građevinski radovi, pokrivački radovi, ugradnja spoljašnje bravarije i grubi razvod instalacija u administrativno smještajnom objektu „B”, grubi građevinski radovi, pokrivački radovi i ugradnja spoljašnje bravarije na sportskom objektu, veći dio radova na objektu za dresuru pasa, završena je čelična konstrukcija i pokrivanje garaža, spoljašnje instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i veći dio ograde oko kompleksa.
- U toku su radovi na izradi fasade, izolaterski radovi, keramičarski radovi i gletovanje unutrašnjih zidova na administrativno smještajnom objektu „B”, razvod instalacija u sportskom objektu, izrada trim staze, a nakon rušenja postojećeg objekta započeli su radovi na administrativno-smještajnom objektu „A”.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. U toku je vrednovanje ponuda.
- Na realizaciji projekta je do sada je utrošeno 277.141,30 € za tekuće izdatke, odnosno 3.229.905,76 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.507.047,06 €, od čega 3.186.235,34 € u 2020. godini.
- Prilikom izvođenja zemljanih radova na sportskom objektu, izvođač je utvrdio prisustvo visokonaponskih kablova koje je trebalo izmjestiti kako bi se nastavili radovi. Takođe, usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, na dijelu projektovane ograde obustavljena je izgradnja same ograde. Na lokaciji predviđenoj za izgradnju administrativno-smještajnog objekta „A”, postojeći objekat koji je predviđen za rušenje je oslobođen od ljudi i stvari od strane korisnika u avgustu tekuće godine, što za posljedicu ima prolongiranje ukupnog roka završetka radova.
- Do pojave nepredviđenih radova došlo je usljed nedostataka u projektnoj dokumentaciji koji se odnose na neusaglašenost predmjera i predračuna radova i grafičkih priloga što za posljedicu ima I značajnije povećanje količina pojedinih pozicija radova, koje je neophodno izvesti kako bi se kompleks stavio u funkciju. Otvorenom javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, oграда oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.





1.8. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici



- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
- Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00 €.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00 €.
- Do sada su završeni bušačko-minerski radovi i mašinski iskop za temeljnu konstrukciju objekta.
- U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije i izrada hidroizolacije ukopanih zidova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 97.015,44 € za tekuće izdatke, odnosno 1.851.158,45 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 1.948.173,89 €, od čega 1.905.103,89 € u 2020. godini.

1.9. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

- **Rekonstrukcija kompleksa kasarna “Masline” za potrebe Vojske Crne Gore**
 - Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane. Planirano je da se rekonstrukcija kompleksa odvija fazno.
 - Ministarstvo odbrane je kroz prvu fazu realizacije obihvatilo rekonstrukciju dva postojeća objekta i to objekte M18 i M19 za potrebe logističkog bataljona i vojne policije.
 - Ministarstvo odbrane je zaključilo ugovor sa izvođačem radova “Bemax” d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 2.970.291,19 € i sa vršiocem stručnog nadzora “Inženjering put” d.o.o. Podgorica, vrijednosti 84.700,00 €.
 - Završeni su svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji objekta.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 78.481,33€ za tekuće izdatke, odnosno 2.842.315,28 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 2.920.796,61 € od čega kompletan iznos u 2020. godini.

1.10. Objekti za potrebe Državne revizorske institucije

- Obaveza Državne revizorske institucije i nadležnog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi Glavnog projekta.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je u 2020. godini završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta i isti dostavila Korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 665,50 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

1.11 Izgradnja objekta za potrebe MONSTAT-a

- U saradnji sa nadležnim institucijama MONSTAT je sproveo proceduru kupovine objekta za svoje potrebe.
- Na realizaciji projekata nije bilo utroška sredstava.

1.12. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac

- **Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu**
- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520m², uz dodatnih 1135m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.
- Konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja je sproveo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine. Ugovor br. 01-8439/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing-invest“ d.o.o., Danilovgrad, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 86.817,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-523 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-impuls“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 8.954,00 €.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije objekata kompleksa.
- U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izmiještanje dalekovoda i izgradnju nove trafostanice u okviru kompleksa.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.



- **Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac**
- U skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, Ministarstvo pravde sprovodi aktivnosti na izradi projekta "Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac". Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.
- Uprava javnih radova je u skladu sa svojim nadležnostima, sprovela procedure javnih nabavki, zaključila i realizovala ugovore za izradu i reviziju geodetskih i geotehničkih podloga za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora u sjevernoj regiji – Opština Mojkovac.

2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE


2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici

- U objektu bivšeg Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², koji je rekonstruisan i nadograđen, biće smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- Ugovor br. 01-1410/1 sa obrađivačem glavnog projekta, Arhitektonskim fakultetom u Podgorici, je zaključen 25.05.2007. godine, na iznos od 105.300,00 €.
- Ugovor br. 01-60091 sa izvođačem, „Cijevna komerc” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2008. godine, na iznos od 8.681.607,07 €.
- Ugovor br. 01-2483/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 01.07.2010. godine, na iznos od 51.700,00 €.
- U 2017. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, postavljanju akustičnih panela i nabavci opreme za potrebe Crnogorske kinoteke. Ugovor br. 19/2-01-2174/1 sa izvođačem, „Simes inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 4.499.783,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-2079/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 18.05.2017. godine, na iznos od 99.999,99 €.
- Ugovor br. 01-3241/1 sa stručnim nadzorom, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 15.05.2019. godine, na iznos od 14.900,00 €.
- Izvođenje radova nastavljeno je i u 2018. i 2019. godini i isto je obuhvatilo i izgradnju nove trafostanice.
- Ugovor br. 01-1163/1 sa obrađivačem glavnog projekta trafostanice NDTS 10/0,4kV, „Ramel” d.o.o. Nikšić, je zaključen 22.02.2019. godine, na iznos od 3.478,75 €.
- Ugovor br. 01-1049/1 sa revidentom glavnog projekta trafostanice NDTS 10/0,4kV, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2019. godine, na iznos od 726 €.
- Ugovor br. 01-2785/1 sa stručnim nadzorom nad izvođenjem radova NDTS 10/0,4kV, „RMA” d.o.o. Nikšić, je zaključen 22.04.2019. godine, na iznos od 968,00 €.
- Do sada su završeni svi radovi i izdata je upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 253.740,74 € za tekuće izdatke, odnosno 12.978.465,53 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 13.232.206,27 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na neusaglašenost i nekompletnost projektne dokumentacije.



2.2. Rekonstrukcija Dvorca kralja Nikole u Nikšiću

- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu su smješteni: zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv i depoi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66 €.
- U toku je izvođenje radova na rušenju i demontaži podnih i zidnih obloga, stolarije i fasade.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.559,94 € za tekuće izdatke, odnosno 26.477,36 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 34.037,30 €, pri čemu je kompletan iznos realizovan u 2020. godini.

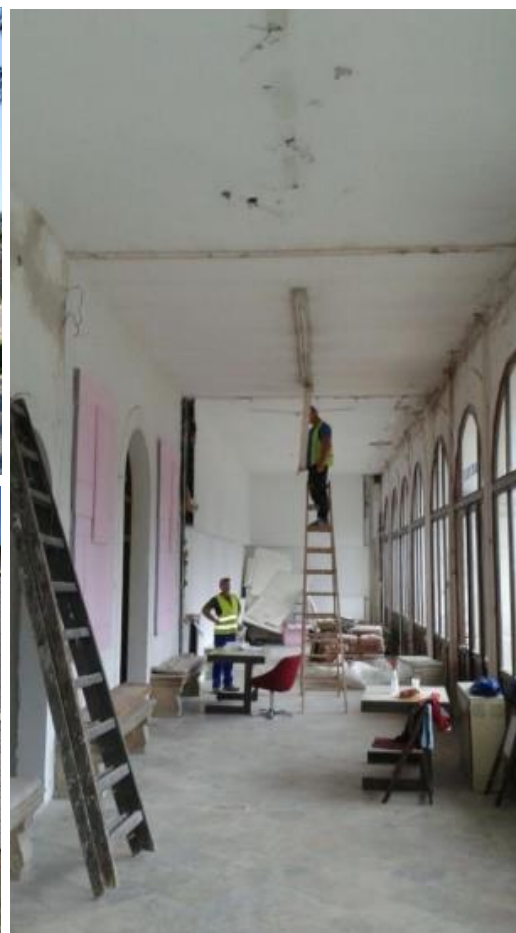

2.3. Izvođenje radova, nabavka oprema i unapređenje objekata u funkciji kulture

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za objekte: Narodni muzej, JU Crnogorsko narodno pozoriše u Podgorici, Nacionalna biblioteka "Đurađ Crnojević", kulturno dobro "Tamnica Jusovača", Kuća crnogorske istorije i drugih objekata iz oblasti kulture. Projekti se finansiraju iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Aktivnosti realizaciji koordinira nadležno ministarstvo koje utvrđuje prioritete.
- **Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju**
- Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-7157/1 sa izvršiocom, „Was design” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na
- iznos od 206.000,01€.
- Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
- Uprava javnih radova je od strane izvršioca 11.11.2020. godine obaviještena da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, nakon koje bi se predmetna oprema mogla ugraditi.
- Uprava javnih radova je o navedenom tražila zvanično izjašnjenje JU Narodni muzej Crne Gore, koje je dostavljeno 13.11.2020. godine. U istom je potvrđeno da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, te da nije moguće precizirati konačne datume stvaranja neophodnih uslova za ugradnju predmetne opreme. Takođe, Uprava javnih radova je izjašnjenjem obaviještena da je JU Narodni muzej Crne Gore obezbijedio poslovni prostor u Podgorici za privremeni smještaj ugovorene opreme, do njene konačne ugradnje u depo.
- S obzirom na to da su na ovaj način u značajnoj mjeri izmijenjeni preduslovi neophodni za konačnu realizaciju ugovora, Uprava javnih radova je nakon dalje zvanične korespodencije sa Ministarstvom kulture, JU Narodnim muzejom i izvršiocom, preduzela aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora o javnoj nabavci i iste su u toku.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a**
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Glavnog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.950.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Glavnog grada je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca

stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.

- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja**
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Opštine Plužine, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 285.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)**
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.300.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Obaveza Opštine Ulcinj je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

2.4. Dogradnja objekta JU "Zahumlje" u Nikšiću

- U prizemlju objekta projektovane su nove kancelarije, bina i sala, a na prvom spratu muška i ženska svlačionica, muzička soba, sala, prostorije za šivenje, kuhinja i klub, ukupne površine oko 318 m². Spratnost: prizemlje i sprat.
- Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Nikšić. Projektant glavnog projekta je „Lisina“ d.o.o. Nikšić, dok je revident glavnog projekta Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8178/1 sa izvođačem, „Tehnogradnja“ d.o.o. Pljevlja, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 283.568,66 €.


- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.09.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8030/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 8.100,00 €.
- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.700,00 € za tekuće izdatke, odnosno 282.603,93 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 291.3030,93 €, od čega 267.195,55 € u 2020. godini.



2.5. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja “Creativ Hubs” u Baru

- Kroz predmetnu kumulativnu poziciju sprovedene su aktivnosti na adaptaciji palate objekta br. 85 za potrebe uspostavljanja Creative Hub-a, Stari grad Bar.
- U prizemlju objekta, u prostoru nekadašnje konobe, organizovan je multifunkcionalni prostor koji treba da zadovolji informativnu, uslužnu i komercijalnu djelatnost. Osmišljen je kao prostor za druženje, odmor, prostor za kratke konsultacije, sastanke sa strankama, informativni pult i prodajni prostor. Na prvom spratu organizovan je radni prostor za primijenjeno vajarstvo. Na drugom spratu organizovan je kreativni prostor za umjetnike koji se bave fotografijom, grafikom, modelovanjem. Na trećem spratu organizovana je smještajna zona za umjetnike. Površina objekta je 221.11m². Spratnost: prizemlje i tri sprata.
- Projektnu dokumentaciju je obezbjedilo Ministarstvo kulture. Projektant glavnog projekta je „ACEP“ d.o.o. Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8745/1 sa izvođačem, “Euromont stil” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.11.2019. godine, na iznos od 256.630,83 €.
- Ministarstvo kulture raskinulo je ugovor sa nadzorom “Acep” d.o.o. Cetinje zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Novi ugovor sa nadzorom “Urbi pro” d.o.o. Podgorica Ministarstvo kulture je potpisalo 04.03.2020. godine.
- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 177.695,24 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 177.695,24 €, od čega 157.393,32 € u 2020. godini.

- Zbog prekoračenja ugovorenog roka od 32 dana, izvođaču su naplaćeni penali u skladu sa ugovorom, u iznosu od 78.935,59 €.

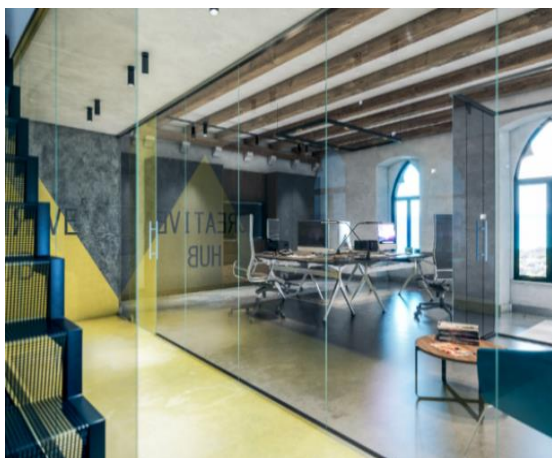

2.6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepce, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru. Riječ je o višegodišnjem projektu.
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi neophodnu dokumentaciju, urbanističko-tehničke uslove, projektne zadatke, idejna rješenja na osnovu kojih bi Uprava javnih radova pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

2.7. Muzej savremene umjetnosti u Podgorici

- Obaveza Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

2.8. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju



- Objekat se nalazi se na zahvatu DUP-UP-a Istorijisko jezgro - Cetinje. Bruto površina objekta je 635,98 m², i sastoji se od prizemlja i dvije eteže ukopane u zemlji. Objekat služi za kontemplaciju ikone Bogorodice Filermose. Nalazi se u pećini, s toga nije vidljiv spolja, niti sa jedne tačke grada, i ne nalazi se u vizuelnom i fizičkom konfliktu sa okolinom.
- Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta .
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7297/1 sa izvođačem, „Neimar inzenjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.12.2016. godine, na iznos od 1.594.839,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (za zemljane radove) je raspisano 26.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1915/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na uvođenju izvođača u posao u septembru 2019. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole od strane Prijestonice Cetinje, kao i izrada elaborata pripremnih radova od strane izvođača radova, ali su radovi obustavljeni zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 128.500 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na lokaciji, ugovoreni radovi su obustavljeni i urađen je elaborat pripremnih radova kojim su predviđeni radovi na zaštiti ulaza u pećinu. S obzirom na to da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dala saglasnost na elaborat pripremnih radova, Uprava javnih radova je obustavila dalje aktivnosti na realizaciji projekta dok se ne izvrši dopuna tehničke i druge dokumentacije potrebne za izvođenje radova, a čiji izradu sprovodi Ministarstvo kulture.

2.9. Rekonstrukcija kulturnog dobra Gradski bedem – ostaci Onogošta u Nikšiću

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zadužena je Uprava javnih radova da realizuje projekat “Valorizacija Gradskih bedema – ostataka Onogošta, izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa, I i II faza”.
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

2.10. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju

- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

3.1. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru




- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019. i 2020. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave javnih radova.

3.2. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru

- Objekat bazena čija je rekonstrukcija u toku, nalazi se na katastarskoj parceli 237/1, KO Škaljari 1, površine cca 5.980 m², dok je bruto površina objekta 5.400 m².
- Na prizemnoj etaži objekta smještene su: četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorije VK „Primorac“ i tehničke prostorije. Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se: osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama. Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405

sjedecih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.

- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili: sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- Radovima II faze rekonstrukcije predviđeni su: svi radovi neophodni za stavljanje objekta u funkciju, odnosno radovi na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehničkim i splinker instalacijama, kao i instalacije bazenske tehnike, radovi na uređenju terena i opremanje objekta namještajem.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.07.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-3688/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 11.09.2014. godine, na iznos od 99.365,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.12.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-939/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhient” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2015. godine, na iznos od 9.945,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2016. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 24.06.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5422/1 sa izvođačem, „Erlang” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.09.2016. godine, na iznos od 796.997,22 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 29.07.2017. godine. Ugovor br. 19/2-01-2636/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 16.641,28 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-841/1 sa izvođačem, „Neimar inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 3.480.077,34 €. Za nepredviđene radove ugovor br. 01-7111/1 od 20.09.2019. godine, na iznos od 159.994,74 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora II faze je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 01-1033/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.02.2019. godine, na iznos od 46.886,00 €.
- Do sada su završeni građevinsko-zanatski radovi i instalaterski radovi na objektu.
- U toku su radovi na montaži opreme i namještaja, bravarije, kao i radovi na infrastrukturnim priključcima i uređenju terena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 66.031,92 € za tekuće izdatke, odnosno 4.024.454,93 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 4.090.486,85 €, od čega 2.194.171,10 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na prolongiranje roka završetka radova zbog problema definisanja lokacije deponije za odlaganje gradilišnog otpada, propusta u projektnoj dokumentaciji i značajnog propadanja objekta, usljed neodržavanja, u periodu od izrade projektne dokumentacije do početka izvođenja radova. Takođe, rok završetka radova je prolongiran jer su se u prethodnom periodu radovi odvijali smanjenim intenzitetom, dijelom zbog neažurnosti izvođača radova (nedovoljan broj radne snage u odnosu na obim ugovorenih radova) i dijelom zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19.

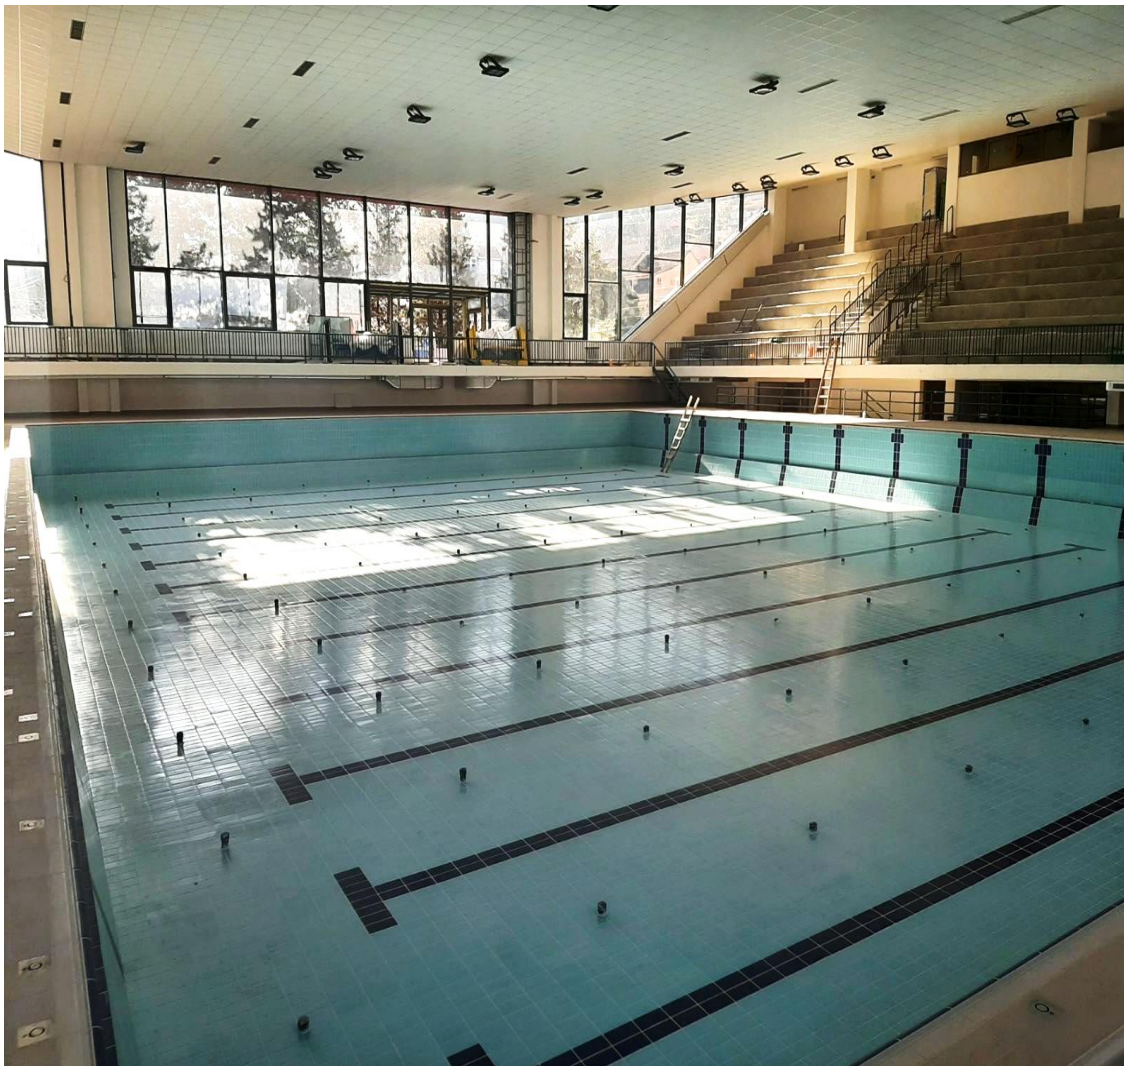

3.3. Izgradnja sportskih terena i sala

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena u Šavniku,

Rožajama, Beranama i Kolašinu. Riječ je o višegodišnjim projektima. Aktivnosti na realizaciji projekata koordinira nadležno ministarstvo koje utvrđuje prioritete.

- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

3.4. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću




- Sportska sala je projektovana u krugu školskog centra „Tvrtko Bijelić“, u neposrednoj blizini školskog objekta, u Ulici „Narodne omladine“ u Nikšiću.
- Objekat sadrži: fiskulturnu salu sa gledalištem, planiranu za potrebe fakulteta i za sportska takmičenja - srednji nivo takmičenja, odnosno regionalna takmičenja, takmičenja lokalnih i malih klubova, trening i rekreaciju. Uz salu planirane su garderobe, spravarnica, kancelarije i druge pomoćne prostorije. Bruto površina objekta je 1.000 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2296/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.04.2019. godine, na iznos od 14.822,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.06.2017. godine. Ugovor br. 1904/18-17 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2018., na iznos od 2.450,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2020. godini.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.272,50 € za tekuće izdatke, od čega 8.379,00 € u 2020. godini.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4829 sa obrađivačem glavnog projekta, „A12” d.o.o Podgorica, je zaključen 08.08.2018. godine, na iznos od 14.670,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano u januaru 2019. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922-1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 3.950,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8179/1 sa izvođačem, „Tehno-gradnja” d.o.o Pljevlja, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 1.626.827,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8230/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.10.2019. godine, na iznos od 48.400,00 €.
- Do sada su završeni radovi na temeljnoj konstrukciji, izrada glavnih AB stubova i nosača, zidarskim i pokrivačkim grubim radovima, radovi na instalacijama i keramičarski radovi.
- U toku su radovi na mašinskim instalacijama.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.008,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.081.059,71 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.111.067,71 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.



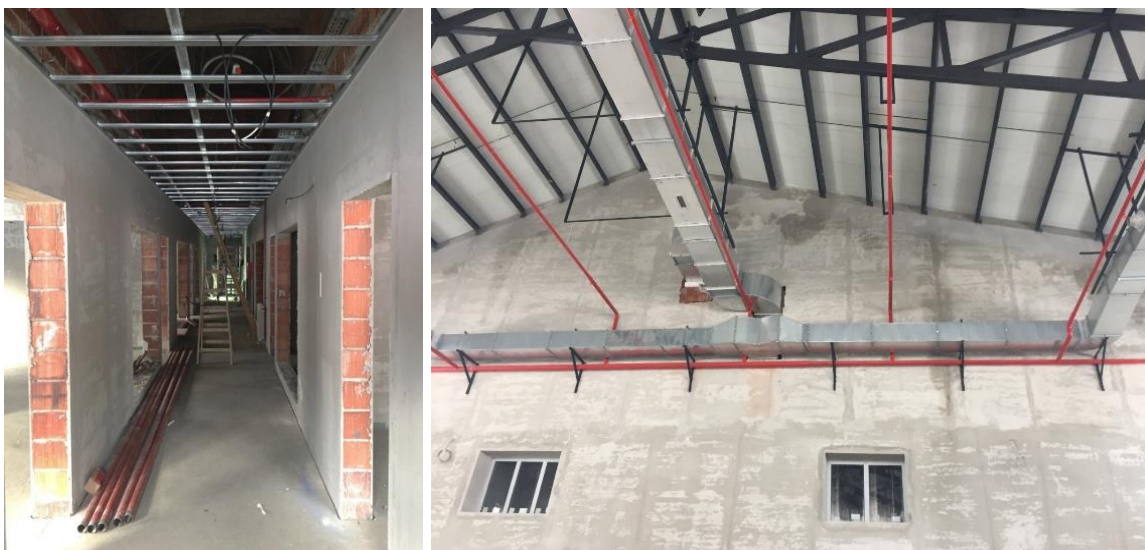

3.6. Izgradnja školsko-sportske dvorane u Gusinju

- Školsko-sportska dvorana u Gusinju je locirana u zahvatu Plana uređenja naselja Gusinje.
- Objekat je spratnosti visoko prizemlje; površine 2.180 m², sa sljedećim sadržajima: glavni ulaz sa biletarnicom i sanitarnim blokom, igralište za rukomet, košarku i odbojku, tribine za gledaoce kapaciteta 500 mjesta, prostorija za rekvizite, svlačionice za učenike i nastavnike sa toaletom i tuševima, kancelarije za zaposlene, kao i tehničke prostorije. Prostor dvorane je osim za razne vrste sportova planiran da se koristi i za druga dešavanja kao što su: koncerti, plesne večeri, plesna takmičenja, proslave i mnoga druga društvena dešavanja. U okviru parcele formirana je interna saobraćajnica, parking sa 70 parking mjesta za vozila i 4 parking mjesta za autobuse.
- Tehnička dokumentacija za predmetni objekat je izrađena i revidovana 2014. godine u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.
- U oktobru 2017. godine došlo je do promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti građevinarstva, u skladu sa kojim je neophodno prilagoditi tehničku dokumentaciju, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji.
- S obzirom na to da je Plan uređenja naselja Gusinja prestao da važi istekom vremena za koji je donijet, nakon usvajanja PUP-a od strane nadležnog ministarstva, sagledaće se dalji koraci i procedure oko realizacije projekta izgradnje sportske dvorane u Gusinju.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

3.7. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK "Sutjeska" u Nikšiću

- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore - Uprave javnih radova, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000 €, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000 € biće obezbijedena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.

- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem , "Roaming Montenegro" d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92 €.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske kontrukcije, montaži čelične konstrukcije i pokrivanju iste aluminijumskim panelima kao i zidarski radovi.
- U toku su radovi na izradi fasade i fasadne bravarije, malterisanju i razvodu elektro i mašinskih instalacija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 430.560,07 € za kapitalne izdatke, pri čemu je kompletan iznos realizovan u 2020. godini.
- Uprava javnih radove je obaviještena od strane izvođača i nadzora da je neophodno uraditi izmjene na projektnoj dokumentaciji zbog nemogućnosti nabavke prefabrikovanih elemenata za izradu tribina kao i prenamjenu službenih prostorija pod zahtjevima UEFA, što će dovesti do nepredviđenih radova i prolongiranja ugovorenog roka za završetak radova.



3.8. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju



- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000 €, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave javnih radova. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbijeduje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000 €.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br.
- 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00 €.
- Do sada su završeni zemljani radovi na izgradnji tribina i završni radovi na izradi armirano betonske i čelične konstrukcije objekta, izrada armirano betonskih konstrukcija na uređenju terena, izrada kamene fasade, zatvaranje objekta fasadnom bravarijom kao i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije.
- U toku su: izrada termo izolovane demit fasade, izrada unutrašnjih gips kartonskih zidova i plafona, malterisanje zidanih zidova, izrada podloga za podove, ugradnja unutrašnje

bravarije, krovopokrivački i limarski radovi, kao i radovi na elektro instalacijama jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 99.710,10 € za tekuće izdatke, odnosno 2.952.388,33€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.052.098,43 €, od čega 988.635,21 € u 2020. godini .
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, ne oslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih i viškova radova. U toku je usaglašavanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.

4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE


4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- U periodu od 2008. godine odvijaju se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u vezi sa rješavanjem trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države, a u skladu sa prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinskog polja, studije vodosnabdijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, PPOV u Andrijevici, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije.
- Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova i velike investicione vrijednosti, dio njih planiran je da se finansira kroz instrument predpristupne pomoći IPA programa, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- Koordinator ovih projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- **Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu**
- Dužina fekalne kanalizacione mreže iznosi 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00 €.
- U toku je usaglašavanje stavova projektanta i revidenta, kao bi s erevizija projektne dokumentacije privela kraju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 18.150,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- **Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama**
- Planirana je izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže opštine Rožaje, na osnovu projektnog zadatka koji je dostavljen Upravi javnih radova od strane Opštine Rožaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta je raspisano 27.12.2019. godine.
- U toku je postupak potpisivanja ugovora sa obrađivačem glavnog projekta i revidentom.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada elaborata procjena uticaja na životnu sredinu - PPOV Rožaje**

- Elaborat o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu izrađuje se za postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) industrijska zona Zeleni u Rožajama, prema tehničkom rješenju definisanom u studiji izvodljivosti, a u skladu sa projektnim zadatkom koji je Upravi javnih radova dostavila Opština Rožaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača Elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu je raspisano 20.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2703 sa obrađivačem Elaborata, „Medix” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2020. godine, na iznos od 10.890,00 €.
- Izrada elaborata je završena i isti je preveden na engleski jezik.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.825,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

- **Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu**

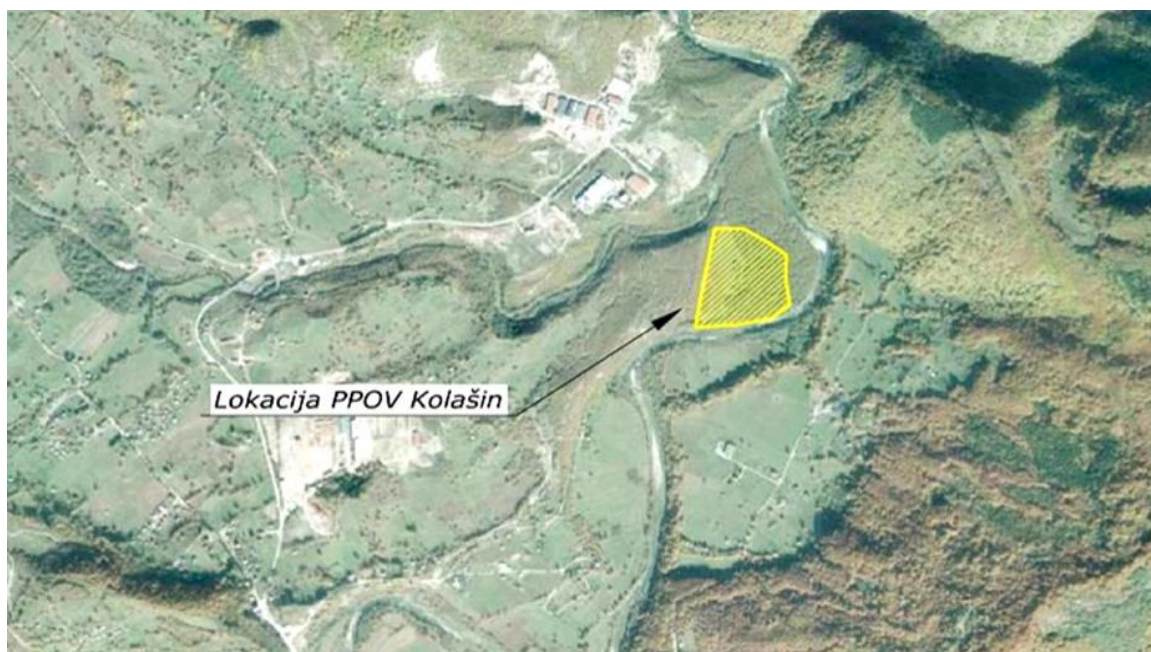

- U 2017. godini Uprava javnih radova je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Kolašin su kandidovali finansiranje projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja kroz IPA fond. Planirano je da se postrojenje gradi po principu "projektuj i izgradi" po pravilima Fidica, a kanalizaciona mreža na osnovu glavnog projekta za koji su u toku aktivnosti na pripremi projektnog zadatka. Nakon što projektni zadatak bude dostavljen, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Glavni projekat kanaliziranja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja**

- Izrada Glavnog projekta kanaliziranja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja se sastoji od tri podprojekta, i to:
 - Kanaliziranje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora u Donjem polju do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora,
 - Hidrotehnički tunel Belveder i
 - Odvođenje poplavnih voda od izlaznog portala tunela Belveder i prečišćenih otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do recipijenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 01.09.2015. godine. Ugovor br. 19/01-4873/1 sa obrađivačem glavnog projekta, konzorcijum „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad; „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica i „Lars fire” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2015. godine, na iznos od 198.420,60 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 01-3281/1 sa revidentom glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 7.444,54 €.
- Revizija glavnog projekta je završena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 205.865,14 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 205.865,14 €, od čega 106.654,84 € u 2020. godini.
- Radovi na kanaliziranju i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja su kandidovani za finansiranje kroz IPA fond.

- **Izrada Studije vodosnabdijevanja opštine Bar**

- Planirana je izrada studija vodosnabdijevanja opštine Bar, a u skladu sa projektnim zadatkom dostavljenim Upravi javnih radova od strane Opštine Bar.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2955 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „E3” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 64.009,00 €.
- Izrada studije je završena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 32.004,50 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata sanacije postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore, kao i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta i utvrđuje prioritete.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

- **Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu**



- Objekat je na lokaciji Marića luka u okviru radne zone bivšeg rudnika olova i cinka "Brskovo" u opštini Mojkovac. Ukupna površina lokacije iznosi 9.774,37 m². Predviđeni su sljedeći sadržaji: hala za tehnološku liniju reciklaže, upravna zgrada sa portirnicom, vaga i

uređeni plato kao manipulativni prostor za saobraćaj kamiona, parking prostor i zaštitna ograda sa kapijom.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-541/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.02.2016. godine, na iznos od 32.963,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7682/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.12.2016. godine, na iznos od 1.804,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1829/1 sa izvođačem, "Crnogoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 1.940.117,48 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-3140/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos 42.400,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni, osim obuke za zaposlene koja će se obaviti kada korisnik imenuje zaposlene radnike.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 80.672,16 € za tekuće izdatke, odnosno 1.755.211,83 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.835.883,99 €, od čega 1.002.433,36 € u 2020. godini.

- **Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane**



- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Toškovići“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00 €.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspeksijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava javnih radova je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković“ pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava javnih radova navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlašćenog lica firme „Tošković“ ima elemenata krivičnog djela prevare.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.970,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 19.970,00 €, od čega 4.900,00 € u 2020. godini.
- **Transfer stanica u Andrijevići**
 - Objekat transfer stanice u Andrijevići je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhiplan Crna Gora“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
 - Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, „Inženjering put“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
- Završena je izgradnja pristupnog puta gradilištu.
- Do sada su izvođeni radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 36.732,20 € za tekuće izdatke, odnosno 229.502,80€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 266.235,00 €, od čega 175.877,25 € u 2020. godini.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na kašnjenje izvođenja radova u odnosu na dostavljeni dinamički plan.



• **Sanacija odlagališta Zakršnica**

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi javnih radova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00 €.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.040,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 29.040,00 €, od čega 11.616,00 € u 2020. godini.

• **Transfer stanica u Pljevljima**

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Pljevlja su dostavili projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove neophodne za izradu glavnog projekta.

- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- **Sanacija odlagališta u Plavu**
- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 12.10.2016. godine, vrijednost ugovora 250.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2018. godini završena je izrada glavnog projekta.
- Početak radova planiran je za jul 2018. godine, ali se radovi nijesu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Krajem 2018. godine Opština Plav je riješila sporove sa građanima, čime su se stvorili uslovi da se sa radovima započne u 2019. godini.
- U 2019. godini radovi su započeti čim su se za to stekli povoljni vremenski uslovi i završeni su krajem 2019. godine, osim ozelenjavanja, koji će se realizovati u 2020. godini, u skladu sa vegetativnim periodom planiranog rastinja.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 118.560,01 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 118.560,01 €, od čega 4.940,00 € u 2020. godini.
- Usled situacije sa pandemijom virusa COVID-19, zbog čega je u martu i aprilu mjesecu ove godine bilo ograničeno kretanje među državama i predstavnici Konzorcijuma izvođača iz Slovenije nijesu bili u mogućnosti da završe radove koji se odnose na hortikulturu, a koji se izvode u proljećnim mjesecima.

4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

- Direkcija javnih radova je u 2014. godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju, koja je u vezi s hidrotehničkim tunelom u Mojdežu, opština Herceg Novi. Projektnu dokumentaciju za I fazu radova izradila je firma „Geo T“ d.o.o. iz Podgorice, a revident projektne dokumentacije je „Grad Dark“ d.o.o. iz Podgorice.
- Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze.
- Radovi I faze su okončani u oktobru 2015. godine i podrazumijevali su sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350 m. Radovi su se odnosili na tunelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela.
- Radovi II faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela, izradi betonskog čepa i vodonosnih vrata.
- Da bi se imao uvid u zatečeno stanje tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije II faze potrebno ga je u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Za ove radove javno nadmetanje je raspisano početkom 2016. godine, izabran je najpovoljniji ponuđač, ali je zbog žalbe postupak prolongiran.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3208/1 sa izvođačem, „Bi kod“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.06.2018. godine, na iznos od 275.716,65 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.11.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4650/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.08.2018. godine, na iznos od 5.831,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 43.387,40 € za tekuće izdatke, odnosno 1.128.226,27 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.171.613,67 €, od čega 47.181,40 € u 2020. godini.



4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata izgradnje sistemima vodosnabdijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Andrijevica i drugim opštinama i utvrđuje prioritete.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- **Vodovod Krkori**
 - Realizacija ovog projekta odvijala se fazno.
 - U 2015. godini završena je rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na izvorištu Krkori, kao i izgradnja cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85 km.
 - U 2016. i 2017. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda. Takođe, ugovoreno je i završeno opremanje hlorne stanice i spajanje vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom.
 - U 2017. godini ugovoreno je izvođenje radova III faze koja obuhvata izgradnju 7 km primarnog cjevovoda od hlorne stanice ka gradu i dogradnju vodozahvatne građevine sa pratećom opremom.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača III faze je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4341/1 sa izvođačem III faze, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.11.2017. godine, na iznos od 478.496,27 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora III faze je raspisano 26.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-

1560/1-4972/1 sa stručnim nadzorom III faze, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.08.2018. godine, na iznos od 6.400,00 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 38.451,80 € za tekuće izdatke, odnosno 1.289.883,64 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.328.335,44 €, od čega 65.030,76 € u 2020. godini.



• **Rezervoar Gradiošnica i sistem vodosnabdijevanja u Tivtu**

- Planirana je fazna realizacija ovog projekta. Prva faza predstavlja izgradnju rezervoara "Gradiošnica".
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5167/1 sa izvođačem, „Bauer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.08.2018. godine, na iznos od 546.660,46 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2528/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2018. godine, na iznos od 3.260,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 546.143,31 € za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

• **Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu**

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaza u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00 €.

- Do sada su sprovedene aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradi tehničke dokumentacije i izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
 - U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izgradnja i unapređenje sistema vodosnabdijevanja Zaton, opština Bijelo Polje**
 - Ugovornom i projektnom dokumentacijom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji cjevovoda u dužini od cca 10 km, kao i radova na izmještanju postojeće trase vodovoda u dužini od cca 3 km, preko rijeke Lim.
 - Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 22.07.2019. godine. Ugovor br. 01-9181/1 sa izvođačem, "Indel Inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2019. godine, na iznos od 484.870,41 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1193 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2020. godine, na iznos od 9.777,00 €.
 - U toku realizacije projekta utvrđeno je da stručni nadzor "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica nije ispunjavao ugovorne obaveze u smislu vršenja stalnog i svakodnevnog nadzora, pa je isti jednostrano raskinut od strane Uprave javnih radova i aktivirane su garancija banke i polisa osiguranja.
 - Novi ugovor br. 01-334/20-4270 sa stručnim nadzorom, "Sistem MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.06.2020. godine, na iznos od 7.258,79 €, na osnovu sprovedene procedure po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.
 - Na realizaciju projekta do sada je utrošeno 9.820,99 € za tekuće izdatke, odnosno 484.667,45€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 494.488,44 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.





- **Vodovod Šavnik**


- Predmetnim ugovorom obuhvaćeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže, izgradnji rezervoara, opremanje hidrostаницe i izrada pristupnog puta za rezervoar.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Šavnik.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1145 sa izvođačem, „Temko” d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.02.2020. godine, na iznos od 489.037,62 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2947 sa stručnim nadzorom, „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.05.2020. godine, na iznos od 10.769,00 €.
- Završeni su radovi na većem dijelu krakova vodovoda i radovi na pristupnom putu. Veći dio radova na izradi rezervoara je završen. Izvršena je nabavka opreme za hidrostanicu, kao i oprema za kompletiranje šahti. Usljed loših vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.847,83 € za tekuće izdatke, odnosno 173.958,43€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 177.806,26€, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da se radovi odvijaju usporenom dinamikom zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19.

- **Vodovod Ćosovsko vrelo u Rožajama**



- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini Uprava javnih radova je izradila glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreni su i završeni radovi II faze, koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Ćosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni.
- U 2017. godini izvođeni su radovi III faze na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, sve dok su to dozvaljali vremenski uslovi. U 2018. godini radovi III faze su završeni.
- Takođe, u 2018. godini ugovoreno je za izvođenje radova IV faze, čime bi realizacija ovog projekta biti kompletirana.
- Glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Projektant je „Hydrogis” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6367/1 sa izvođačem radova, „Indel-inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2018. godine, na iznos od 397.845,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 19.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8142/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos od 4.600,00 €.
- Svi ugovoreni radovi predviđeni IV fazom za MZ Klanac, MZ Ramoviće i MZ Sredani su završeni.
- U toku je priprema za ispitivanje mreže.
- Na realizaciji IV faze do sad je utrošeno 397.845,50 € za kapitalne izdatke, odnosno 4.600,00€ za tekuće izdatke.

- Ukupno je realizovano 402.245,00 € u 2019. godini, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
 - Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na to da je obaveza Opštine Rožaje da obezbijedi priključak buster stanica na elektro naponsku mrežu.
- **Vodovod u selu Ponari, Gradska opština Golubovci, Donja Zeta**
 - Ponari su naselje u dijelu Donje Zete. Vodovod je zahvata dužinu 3.765 m, prečnika cijevi DN 110.
 - Revidovani glavni projekat obezbijedilo je „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2369 sa izvođačem, “Kojo group“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 61.908,19 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 16.04.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2910 sa stručnim nadzorom, “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 4.440,70 €.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.440,70 € za tekuće izdatke, odnosno 61.907,97€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 66.348,67 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

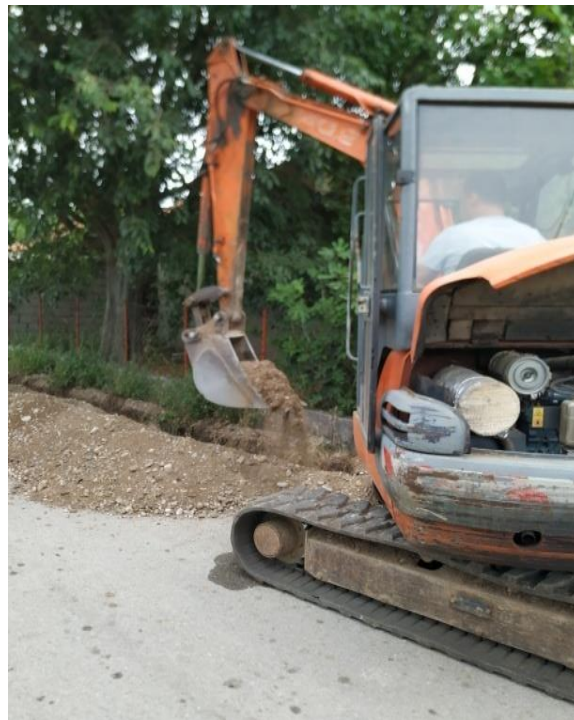

- **Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima**
 - U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza

rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00 €.
- Do sada su završeni radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su eralizovane po ovom ugovoru.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 77.360,00 € za tekuće izdatke, odnosno 278.950,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 356.310,00 €, od čega 282.584,50 € u 2020. godini.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz insalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hipering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00 €.
- Do sada su završeni radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.146,00 € za tekuće izdatke, odnosno 271.939,54€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 275.085,54 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da se sa radovima na rekonstrukciji, po zahtjevu DOO “Vodovod” Pljevlja, započelo prije nego što su izvedeni radovi na izgradnji novog postrojenja, kako je bilo predviđeno projektnom dokumentacijom, usljed čega se

javila potreba za izvođenjem nepredviđenih radova kako bi se sistem stavio u funkciju. Naime, izvođač radova je utvrdio, a stručni nadzor potvrdio da projektnom dokumentacijom nijesu obuhvaćene pozicije elektro ormara i frekventnih regulatora za zavojne pumpe. Projektom nije obuhvaćena šema, na koji način treba da pumpe budu frekventno regulisane u odnosu na parametre mutnoće. U toku je usaglašavanje predmjera i predračuna navedenih radova od strane krajnjeg korisnika, DOO "Vodovod" Pljevlja, izvođača radova i stručnog nadzora.

- **Nabavka i ugradnja materijala i opreme za filter stanicu Sopot, opština Žabljak**
- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.10.2020. godine. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora sprovodi Opština Žabljak.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata koji se odnose na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistemi za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Šavnik, Rožaje, Žabljak, Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Petnjica, Cetinje, Mojkovac, Podgorica i Vranjina i utvrđuje prioritete. Riječ je o višegodišnjem projektu.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

Kanalizaciona mreža na Vranjini

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.705,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kovačka dolina, opština Žabljak

- Dužina fekalne kanalizacije na lokaciji Kovačke doline u opštini Žabljak je 886 m.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je ponovo raspisano 06.06.2019. godine, nakon što je 2018. godine Državna komisija oborila odluku o izboru. Ugovor br. 01-6162/1 sa izvođačem, "Temko" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 228.701,33 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7564/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2018, na iznos 3.630,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.267,00 € za tekuće izdatke, odnosno 186.149,86€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 189.416,86 €, od čega 121.614,10 € u 2020. godini.
- **Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac**



- Dužina trase koja je ugovorena za izradu nedostajuće fekalne je 553,64 m.
- Ugovor br. 01-474211 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2011. godine, na iznos od 19.460,00 €.
- Ugovor br. 01-780 između revidenta glavnog projekta, „Projectman“ d.o.o Podgorica, i Opštine Mojkovac, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.210,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8029/1 sa izvođačem, "Konstruktor group" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 118.465,28 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01 - 334/20 - 522

sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos 4.833,00 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.359,80 € za tekuće izdatke, odnosno 70.771,24€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 93.131,04 €, od čega 73.371,04 € u 2020. godini.

• **Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik**

- U pitanju je linijski objekat sa sljedećim radovima: zemljani radovi, ugradnja kanalizacionih cijevi, izgradnja šahti i izvođenje priključaka na postojeće objekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.07.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-905/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2018. godine, na iznos od 7.140,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-156/1-1990/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 1.480,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6576/1 sa izvođačem, „Vukotić trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.09.2019. godine, iznos od 304 971,87 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6947/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2019. godine, na iznos od 7.450,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.070,00 € za tekuće izdatke, odnosno 283.276,62€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 299.346,62 €, od čega 223.834,77 € u 2020. godini.

• **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Andrijevica**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 738.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- Do sada su završene izrada i revizija glavnog projekta, a počele su aktivnosti na izvođenju radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.428,44 € za tekuće izdatke, odnosno 187.402,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 189.830,44 €, od čega 82.345,44 € u 2020. godini.

• **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 450.075,00 €. Projekat se

realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.

- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- Do sada su završene izrada i revizija glavnog projekta, a počele su aktivnosti na izvođenju radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 478,50 € za tekuće izdatke, odnosno 75.451,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 75.929,00 €, od čega 13.044,00 € u 2020. godini.

4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, zaključen je Ugovor i Anex Ugovora između Uprave javnih radova i Opštine Pljevlja, na osnovu kojeg je Opština preuzela obaveze realizacije projekta za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 720.000,00 €, u 2020. godini, i to za:
 - Izradu i reviziju projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja;
 - Izradu i reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja Pljevalja od kapije Termoelektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima;
 - Eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje primarnog toplovoda;
 - Sprovođenje mjera energetske efikasnosti.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 354.848,78€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 374.848,78 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Na osnovu ugovora o realizaciji programa „Projekti očuvanja životne sredine“, br. 01-334/20-8080 od 06.10.2020. godine, zaključenog između Uprave javnih radova i Opštine Pljevlja, opredijeljena su sredstva u iznosu od 130.000,00 € za nabavku ekološkog goriva, odnosno peleta, u cilju sanacije stanja životne sredine u opštini Pljevlja. Opština Pljevlja je preuzela obavezu realizacije ugovora.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 129.994,68 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

4.7. Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju infrastrukture za unapređenje postojeće mreže meteoroloških i hidroloških stanica i obuhvata IV faze.
- Tehničku dokumentaciju po kojoj se sprovode javna nadmetanja i izvode radovi obezbijedio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
- U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture I faze koja je obuhvatila 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica.
- U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture II faze koja je obuhvatila izgradnju 5 padavinskih i 5 hidroloških stanica, ugovoreni radovi za izvođenje radova III faze koja obuhvata 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica i raspisano javno nadmetanje za

izbor najpovoljnijeg izvođača za izvođenje radova IV faze, koja obuhvata rekonstrukciju meteoroloških stanica u četiri opštine.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 24.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3673 sa izvođačem radova IV faze, „Hidro-građevinar“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 34.685,65 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 11.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanej ponuda u postupku nabevke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4468/1 sa stručnim nadzorom IV faze, „Kov atelje “ d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.06.2020. godine, na iznos od 1.815,00 €.
- Svi ugovoreni radovi III faze su završeni i u toku su radovi IV faze.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 15.970,10 € za tekuće izdatke, odnosno 214.662,45€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 230.632,55 €, od čega 59.477,60 € u 2020. godini.



4.8. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava javnih radova će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

5.1 Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu

- Rekonstrukcija Ribarske ulice obuhvata radove na saobraćajnici dužine od cca 540 m, sa dvije kolovozne trake širine po 2,75 m i jednostranim trotoarom, izradu vodovoda, fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
- Revidovanu projektну dokumentaciju obezbijedila je Opština Plav. Obradivač glavnog projekta je „Ding” d.o.o. Podgorica, a revident „Geotechnics, projects & consultings” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7772/1 sa izvođačem, „PUTEVI BAR” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 299.689,94 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-7460/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 11.500,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.166,71 € za tekuće izdatke, odnosno 187.578,43€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 203.745,14 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.



5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora jalovišta u Mojkovcu

- Izgradnja pasarele



- Izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta - pasarele preko magistralnog puta Podgorica - Bijelo Polje, u opštini Mojkovac izvodi se fazno. Planirana je izgradnja glavnog mosta širine 7 m i ukupne dužine 62,65 m i prelazi preko glavne magistrale Podgorica – Bijelo Polje, kao i preko pješačko-biciklističke staze. Silazna rampa je širine 5 m i dužine 176,66 m i nalazi se na kraju mosta. Kružni dio pasarele, koji se nalazi na nekadašnjem jalovištu, sadržaće “zeleni trg”, kao i lift nosivosti osam osoba. II faza radova se odnosi na hidro i elektro instalacijama, izgradnja podnih fontana, potpornih zidova i žardinjera, kao i

postavljane kamenih ploča na stepenište na ulazu u pasarelu od grada, ograde, rasvjete i drvenih klupa.

- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2080/1 sa izvođačem I faze, IGP „Fidija“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.03.2019. godine, na iznos od 980.920,10 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 20.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2911 sa izvođačem II faze, IGP „Fidija“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 1.199.075,63 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I i II faze je raspisano 19.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3662/1 sa stručnim nadzorom I i II faze, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 24.805,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.123,25 € za tekuće izdatke, odnosno 1.565.831,26 € za kapitalne izdatke, od čega 908.458,79 € za kapitalne izdatke I faze i 657.372,47 € za kapitalne izdatke II faze.
- Ukupno je realizovano 1.581.954,51 €, od čega 823.662,83 € u 2020. godini.
- **Šetalište i uređenja prostora nekadašnjeg jalovišta u Mojkovcu**
- Radovi na izgradnji pratećeg sadržaja šetališta pored rijeke Tare obuhvataju izgradnju pješačkih staza sa pratećom rasvjetom u okviru bivšeg prostora jalovišta u Mojkovcu.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 03.10.2018. godine. Ugovor br. 01-5066/1 sa izvođačem, „Temko“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos 154.303,13 €.
- Javno nadmetanje za stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-5699/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos 2.980,00 €.
- Radovi su završeni krajem 2019. godine, a tehnički prijem izvedenih radova završen je u 2020. godini.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.980,00 € za tekuće izdatke i 154.302,92 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 157.282,92 €, od čega 13.160,09 € u 2020. godini.

5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice)

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
- Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2020. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova i vršenja stručnog nadzora. Naime, u 2020. godini Uprava javnih radova je sa opštinama zaključila ugovore u određenom iznosu za realizaciju projekata u okviru programa „Izgradnja lokalne infrastrukture“, i to za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Projekti za koje je Uprava javnih radova zaključila ugovore za projektantima, revidentima, izvođačima radova i stručnim nadzorom prije potpisivanja predmetnih ugovora, ostaju u nadležnosti Uprave.
- **Lokalni putevi i gradske saobraćajnice**
- **Opština Berane**
- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 350.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 232.992,58 €.



Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izgradnja ulica kod pomoćnih terena, Crpna stanica - OŠ Vuk Karadžić, L = 413m

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Berane.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.08.2018. godine. Ugovor br. 1010-1560/1-6634/1 sa izvođačem, „Nikola” d.o.o. Berane, je zaključen 19.10.2018. godine, na iznos od 188.472,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.08.2018. godine. Ugovor br. 1010-1560/1-7434 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.11.2018. godine, na iznos od 4.850,00 €.

- Na realizaciji projekta nije bilo aktivnosti u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Berane, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

- **Opština Pljevlja**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 48.833,28 €.

- **Opština Šavnik**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 199.590,23 €.

- **Opština Gusinje**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 42.712,29 €.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Lokalni put Gusinje-Vusanje

Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- U toku je dorada projektne dokumentacije po primjedbama revidenta.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

Lokalni put Gusinje-Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 - 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 - 334/20 - 3426 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09 €.
- U toku je izrada glavnog projekta na osnovu prihvaćenog idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.738,07 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

- **Rekonstrukcija Kosovske ulice**



- Radovi se odnose na rekonstrukciju gradske saobraćajnice u dužini od 330 m.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Gusinje. Obradivač glavnog projekta je "Ding" d.o.o Podgorica, a revident „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-890/1 sa izvođačem, „Temko“ d.o. o. Nikšić, je zaključen 13.02.2019. godine, na iznos od 143.760,64 €. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6221/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 6.900,00 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.900,00 € za tekuće izdatke, odnosno 139.942,25 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 146.842,25 €, od čega 139.942,25 € u 2020. godini.

- **Opština Danilovgrad**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a

sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 199.772,24 €.

Rekonstrukcija lokalnog puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.
- Obradivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica , je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Započeti su pripremni radovi, odnosno preuzimanje tačaka operativnog poligona od strane projektanta.
- Izvođač je uveden u posao, ali se radovi ne odvijaju jer nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Danilovgrad.



- **Opština Podgorica**
- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 1.500.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija lokalnog puta od Zatrijepča do Kučkih korita

- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3425 od 02.07.2020. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za potrebe rekonstrukcije lokalnog puta od Zatrijepča do Kučkih korita, u iznosu od 400.000,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-7923/1 sa Glavnim gradom Podgorica je zaključen 01.10.2020. godine, na iznos od 400.000,00 €.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 400.000,00 €.

Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom u okviru Glavnog grada – Golubovci za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 154.757,63 €.

Opština Andrijevica

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 298.079,39 €.

Opština Rožaje

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 299.913,40 €.

Opština Bijelo Polje

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 500.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 497.691,95 €.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Rekonstrukcija puta Srđevac-Lozna-Sipanje

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00 €.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 267.038,21 € za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

Gradska saobraćajnica u Resniku


I faza

- Prva faza radova obuhvatila je pripremne i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži. U ovoj fazi ugovorena je i modernizacija saobraćajnice u industrijskoj zoni.
- Revidovanu projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova I faze raspisano je 25.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-364/1 sa izvođačem I faze, “Fineco” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 02.02.2018. godine, na iznos od 227.661,31 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze raspisano je 27.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3922/1 sa stručnim nadzorom I faze, “Kov atelje” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.07.2018. godine, na iznos od 4.997,30 €.
- Krajem 2018. godine započeti su radovi I faze koji su se izvodili uz prolongiranje usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nedostataka u projektnoj dokumentaciji.
- S obzirom na to da izvođač radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve ugovorene obaveze, raspisano je novo javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora I faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova I faze raspisano je 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2054/1 sa izvođačem I faze, “Konstruktor” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.03.2020. godine, na iznos od 184.571,74 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze raspisano je 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2083/1 sa stručnim nadzorom I faze, “Kov atelje” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.03.2020 godine, na iznos od 4.356,00 €.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za izbor izvođača nepredviđenih radova I faze sproveden je 04.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6086 sa izvođačem navedenih radova, “Konstruktor” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 27.406,50 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.955,68 € za tekuće izdatke, odnosno 276.983,68€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 281.939,36 €, od čega 254.760,38 € u 2020. godini.

II faza

- Radovi II faze obuhvatili su završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.
- Revidovanu projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 21.02.2018. godine. Ugovor br. 01-6941/1 sa izvođačem, "Tehnoput-MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2019. godine, na iznos od 274.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5775/1 sa stručnim nadzorom, „Projectman“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 7.865,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.078,50 € za tekuće izdatke, odnosno 267.341,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 274.419,50 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

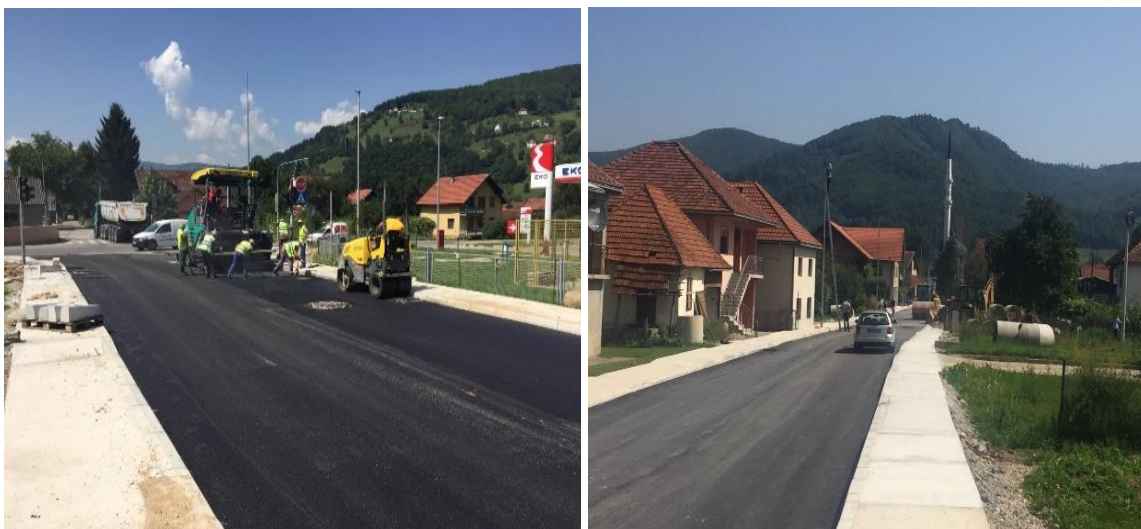

Gradska saobraćajnica - raskrsnica Mojkovačke ulice i bivše magistrale

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-210 sa obrađivačem glavnog projekta, „BMR Baošić“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 6.902,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-811/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 2.360,00 €.
- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla.

- Nakon obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova za izmiještanje 10kV kabla, što je bila obaveza Opštine Bijelo Polje, izvršena je dopuna projektne dokumentacije i pribavljene su saglasnosti nadležnih institucija.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.

- **Opština Petnjica**

U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 520.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 518.354,38 €.

- **Opština Nikšić**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 500.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 499.899,97 €.

- **Opština Mojkovac**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 370.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 104.627,13 €.

- **Rekonstrukcija gradske saobraćajnice pored groblja**

- Projektom je predviđena rekonstrukcija ulice u centru grada, kojom se, sjeverno od groblja, povezuje Valjevska ulica i Ulica junaka mojkovačke bitke sa magistralnim putem M2, uz obezbjeđenje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje sa postojećom fekalnom i kanizacionom mrežom.
- Izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu Internog pravila za postupanje Ministarstva održivog razvoja i turizma, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male nabavke, je raspisan 18.07.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4291/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 23.07.2018. godine, na iznos od 4.920,00 €.
- Reviziju glavnog projekta je vršio "Građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" a.d. Podgorica.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-6903/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 248.704,24 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-6549/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.10.2018. godine, na iznos od 6.050,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.365,00 € za tekuće izdatke, odnosno 241.057,63€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 251.422,63 €, pri čemu 13.861,95 € u 2020. godini.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni 2019. godine i predat je konačni izvještaj stručnog nadzora.

- **II faza**

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.06.2019. godine. Ugovor br. 01-5905/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.08.2019. godine, na iznos od 116.978,41 €.
- Izbor stručnog nadzora putem malih nabavki od 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-5904/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.08.2019. godine, na iznos od 3.150,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.070,00 € za tekuće i 115.374,92 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 123.444,92 €, od čega 3.150,00 € u 2020. godini.
- Radovi su završeni 2019. godine i predat je konačni izvještaj stručnog nadzora.

- **Opština Kotor**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 700.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 394.587,49 €.

- **Opština Kolašin**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 299.573,89 €.

Sanacija gradskih saobraćajnica u Kolašinu

- Projektom je obuhvaćeno struganje postojećeg asfalta i presvlačenje novim asfaltom devet ulica u Kolašinu.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8585/1 sa izvođačem, "Bemax" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 134.862,97 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-9113/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.12.2018. godine, na iznos od 4.625,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 134.799,69 € za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

- **Opština Ulcinj**

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u urbanoj cjelini Stari grad Ulcinj

- Revidovanim projektom je obuhvaćena rekonstrukcije ulica u starom gradu u Ulcinju, sa izmjenom atmosferske i fekalne kanalizacije, instalacija jake i slabe struje i popločavanjem ulica. Ovaj projekat obuhvata I fazu rekonstrukcije, što podrazumijeva rekonstrukciju dvije ulice, sa pratećom infrastrukturom. Korisnik je opština Ulcinj.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6733/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "VOIP" d.o.o. Ulcinj, je zaključen 24.12.2015. godine, na iznos od 24.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-800/2 sa revidentom glavnog projekta, "Urban studio" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2016. godine, na iznos od 4.900,00 €.
- Međutim, kako se radovi nijesu počeli izvoditi, a u međuvremenu se promijenio Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, reviziju je trebalo ponovo uraditi u skladu sa novim zakonom. Prethodni revident nije imao potrebne licence po novom zakonu, pa je imenovan drugi revident.
- Javno nadmetanje za izbor novog revidenta glavnog projekta je raspisano 03.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-3037/1 sa revidentom glavnog projekta, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 4.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5318/1 sa izvođačem, "MONTAL DSD" d.o.o. Podgorica i "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2017. godine, na iznos od 474.189,14 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-92/1 sa stručnim nadzorom, "Nik Com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 9.520,00 €.
- Sprovedene su pripremne aktivnosti i pregovori kako bi se izvođaču radova omogućio početak izvođenja. Zbog propusta pri izradi tehničke dokumentacije, faza pripreme projektne dokumentacije je dugo trajala, rađena je izmjena projekta i ponovna revizija.
- Izvođač radova je uveden u posao 14.02.2020. godine, međutim, nije mogao da obezbijedi potrebnu dokumentaciju za početak, pa radovi nijesu počeli.

- Stručni nadzor se u avgustu 2020. godine izjasnio da nije u mogućnosti da nastavi aktivnosti po Ugovoru, s obzirom na dug vremenski period od potpisivanja Ugovora.
- Javno nadmetanje za izbor novog stručnog nadzora je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8276/1 sa stručnim nadzorom, "MEPING PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 10.345,50 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.300,00 € za tekuće izdatke, odnosno 94.837,83€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 129.137,83 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Izvođač radova nije obezbijedio produženje avansne garancije, niti garancije za dobro izvođenje radova. Konzorcioni partner "Ramel" d.o.o. je izašao iz zajedničkog posla. Kako je Opština Ulcinj zainteresovana da se ovaj projekat ipak realizuje, predstavnici Opštine su pružili dodatnu stručnu pomoć, kako bi se stvorili uslovi za nastavak izvođenja radova.
- U toku je izvođenje radova.

- **Opština Bar**

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

- **Izgradnja pješačkog pothodnika u željezničkoj stanici Sutomore**

- Projektom je obuhvaćena izrada pješačkog prolaza ispod pruge na željezničkoj stanici u Sutomoru, kao i izrada stepeništa i nadstrešnice, kako bi se omogućio siguran prelazak putnika od naseljenog dijela do objekta stanice.
- Izradu projekta je donacija China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch opštini Bar na osnovu sporazuma.
- Izbor revidenta glavnog projekta je obezbijedila Opština Bar, šoping metodom od 18.08.2016. godine. Revident glavnog projekta je "Nik com" d.o.o. Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-318/1 sa izvođačem, "BI KOD" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.01.2018. godine, na iznos od 294.311,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 02.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1375/1 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 21.03.2018. godine, na iznos od 4.961,00 €.
- Stručni nadzor se martu 2020. godine izjasnio da nije u mogućnosti da nastavi aktivnosti po Ugovoru, s obzirom na dug vremenski period od potpisivanja Ugovora.
- Javno nadmetanje za izbor novog stručnog nadzora je raspisano 15.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8277/1 sa stručnim nadzorom, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 12.100,00 €.
- Izvođač radova nije zvanično uveden u posao, ali su rađene aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije.
- Na realizaciji ovog projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- S obzirom na to da se radovi izvode u neposrednoj blizini pružnog kolosjeka, Željeznica Crne Gore je imala dodatne zahtjeve po pitanju angažovanja stručnog kadra, specifičnih mašina, kao i dodatnih troškova obustave željezničkog saobraćaja. Svi navedeni zahtjevi nijesu bili obuhvaćeni revidovanom projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane Opštine Bar, niti su ugovoreni od strane Uprave javnih radova sa izvođačem radova. Imajući u vidu i problematiku izvođača radova da obezbijedi provizorijum, duži vremenski period

nakon potpisivanja ugovora u otežanim uslovima usljed pandemije izazvane virusom COVID-19, kao i imajući u vidu da je stručni nadzor odustao od posla, aktivnosti na realizaciji ugovora su prolongirane do ponovnog ugovaranja stručnog nadzora.

- Izvođaču radova je početkom oktobra upućen zahtjev da obezbijedi potrebnu opremu i dokumentaciju, kako bi otpočeo sa radovima. Međutim, izvođač se izjasnio da nije u mogućnosti da otpočne sa radovima dok se epidemiološka situacija izazvana virusom COVID-19 ne promijeni.

- **Opština Žabljak**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala dva Ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 450.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 449.964,99 €.

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

- **Rekonstrukcija Ulice Vojvode Mišića**

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Žabljak.
- Ugovor br. 101-1560/1-252/1 sa izvođačem radova, "Intermost" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.01.2018. godine, na iznos od 193.220,63 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-2103/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.04.2018 godine, na iznos od 2.320,50 €.
- Do sada su završeni radovi na instalacijama puta. Preostali su asfalterški radovi.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 133.372,47 € za kapitalne izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- S obzirom na to da je na predmetnoj trasi Opština Žabljak ugovorila određene radove sa drugim izvođačem, nakon što isti završi ugovoreno i ulicu vrati u prvobitno stanje, nastaviće se sa asfalterškim radovima.

Asfaltiranje dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka

- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3432 od 02.07.2020. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka, u iznosu od 240.000,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-5652 sa Opštinom Žabljak je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 240.000,00 €.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 51.469,67 €.
- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-35003 od 06.11.2020. godine, Vlada Crne Gore je ponovo usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka, u iznosu od 80.000,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-10291 sa Opštinom Žabljak je zaključen 01.12.2020. godine, na iznos od 80.000,00 €.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 32.487,36 €.

- **Opština Plužine**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 199.991,54 €.

- **Opština Herceg Novi**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 135.563,46 €.

- **Opština Tuzi**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 173.551,60 €.

- **Prijestonica Cetinje**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Prijesticom Cetinje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 563.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 563.000,00 €.

- **Opština Plav**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala tri Ugovora sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 840.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 33.892,57 €.

5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju



- Objekat gradske pijace u Gusinju je ukupne bruto površine 763 m², spratnosti prizemlje i potkrovlje. U prizemlju objekta su planirani sljedeći sadržaji: zelena pijaca, mliječna pijaca, mokri čvor, mokri čvor za invalide, kotlarnica i kancelarija. Prostor u potkrovlju predviđen je za komunalnu službu i službu zaštite i spašavanja. Obje ove službe imaju poseban hodnik i poseban ulaz.
- Za potrebe komunalne službe projektovan je zaseban hodnik, mokri čvor i 4 kancelarije. Za potrebe službe zaštite i spašavanja projektovan je zaseban hodnik, garderoba, mokri čvor, 2 kancelarije, kuhinja sa trpezarijom, dnevni boravak, spavaća soba i učionica.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Gusinje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze (grubi građevinski radovi i pokrivanje krova) i odabrala izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5492/1 sa izvođačem, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.12.2017. godine, na iznos od 134.660,13 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1407/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2018. godine, na iznos od 3.391,50 €.

- U aprilu 2018. godine započelo je izvođenje radova I faze, koji su završeni.
- U 2019. godini je raspisano javno nadmetanje i potpisan ugovor za izvođenje radova II faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5067/1 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 476.804,15 €.
- Radovi II faze obuhvatili su građevinsko-zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije jake i slabe struje, termotehničke instalacije, radove na izradi infrastrukturnih priključaka i opremanje objekta.
- Svi ugovoreni radovi II faze su završeni.
- Završen je tehnički pregled objekta, nakon čega je predat korisniku na upotrebu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.701,50 € za tekuće izdatke, odnosno 534.260,49€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 550.961,99 €, od čega 3.726,80 € u 2020. godini.

5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Radi se o višegodišnjem projekatu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka: Zlorečica, Popče, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice, Grnčar i Svinjače.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- **Nastavak uređenja korita rijeke Grnčar u urbanom dijelu nizvodno od škole do mosta na ulasku u Gusinje**
 - Uređenje korita rijeke Grnčar realizuje se fazno.
 - Svi ugovoreni radovi I i II faze su završeni, a u 2019. godini završeni su i ugovoreni radovi III faze.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 09.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6992/1 sa izvođačem IV faze, „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 139.816,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 17.07.2019. godine. Ugovor br.01-7062/1 sa stručnim nadzorom IV faze, „Geotehcnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 6.292,00 €.
 - U septembru 2019. godine počelo se sa radovima IV faze uređenja korita rijeke Grnčar.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku je konačni obračun izvedenih radova.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.146,00 € za tekuće izdatke, odnosno 73.364,36€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 76.510,36 €, od čega 33.211,11 € u 2020. godini.
- **Regulacija korita rijeke Zlorečice**
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedila Uprava za vode.
 - Nakon što je izvođač sa kojim je zaključen ugovor 2018. godine odustao od posla, u 2019. godini ponovno je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na regulaciji korita rijeke Zlorečice.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-835 sa izvođačem, „Vukotić trejd“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.02.2020. godine, na iznos od 218.830,61 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.07.2018. godine. Ugovor br. 01-334/20-5421/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 3.570,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Upravi za vode poslat je dopis da je neophodno izvršiti izmjenu projektne dokumentacije (PR01-PR33) iz razloga što je ista izrađena u 2011. godini, a tok rijeke Zlorečice se promijenio, te je potrebno projekat prilagoditi stanju na terenu.

• **Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici**

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 39.930,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.

• **Uređenje korita rijeke Ibar**



- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obradivač glavnog projekta je „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođačem, „Vukotić-trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00 €.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.

- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- U toku je vrednovanje pristiglih ponuda za izbor izvođača II faze radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.500,00 € za tekuće izdatke, odnosno 422.000,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 425.500,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.

- **Sanacija puta Han Garančića - Opasanica**

- Predmetni put se nalazi u opštini Podgorica, u blizini naselja Veruša. Projektom je obuhvaćena sanacija potpornih zidova u koritu rijeke i izgradnja novih zidova radi stabilizacije kosina rijeke, asfaltiranje dijela puta i oblaganje kanala u centru Opasanice. Korisnik je Glavni grad Podgorica - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.
- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zaključila je ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o Podgorica i revidentom JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6121/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2019. godine, na iznos od 429.066,25 €.
- Na otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za izbor stručnog nadzora br. 01-167/19 od 24.07.2019. godine se nije niko javio, pa je putem nabavke male vrijednosti od 02.08.2019. godine, sa "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, sklopljen ugovor za vršenje nadzora u trajanju od mjesec dana. Ugovor br. 01-6172/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 2.000,00 € i u trajanju mjesec dana od dana potpisivanja ugovora.
- Nakon obustave radova i zimskog perioda, putem nabavke male vrijednosti iz marta 2020. godine, izabran je stručni nadzor "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, za vršenje nadzora do primopredaje radova. Ugovor br. 01-334/20-3022 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.840,00 €, do primopredaje radova.
- S obzirom da je u toku radova došlo je do pojave viška radova u odnosu na projektovane, sproveden je pregovarački postupak za obezbjeđenje dodatnih sredstava. Ministarstvo finansija nije odobrilo pregovarački postupak. Takođe, sprovedene su aktivnosti na izmjeni projekta u vezi sa poboljšanjem sloja asfalta i izmjenom detalja kod oblaganja korita kanala kamenom.
- Završena je izgradnja novih potpornih zidova i sanirani su postojeći zidovi u koritu rijeke (izuzeće zid Z4), izrada betonskog kanala za odvod površinskih voda, izrada rigola, nasipanje tampona i asfaltiranje.
- Izvođeni su završni radovi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 5.872,00 € za tekuće izdatke, odnosno 401.247,62€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 407.119,62 €, pri čemu 55.380,11 € u 2020. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica, izrada potpornog zida Z4, l=28m je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8154/1

sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2020. godine, na iznos od 19.341,36 €.

- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na neusaglašenost projektne dokumentacije i stanja na terenu, kao i uslovljenost izvođenja radova nivom rijeke.



5.6. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tivtu

- Obaveza Opštine Tivat je da dostavi dokumentaciju nakon čega će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

5.7. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama

- Regionalna stočna pijaca nalazi se u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim na regionalnom putu Berane - Rožaje. Kompleks se prostire se na površini od 3.352 m².
- Projektovani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje. U okviru pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50 m koja opslužuje sve sadržaje kompleksa. Predviđen je parking prostor sa šest mjesta za kamione. Pored stočne pijace izgrađen je parking za posjetioce sa pristupnom saobraćajnicom širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- U julu 2018. godine izvođač radova je, na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Berane, započeo radove I faze koji su obuhvatali i izgradnju parkinga za posjetioce. Radovi su završeni krajem 2018. godine.
- U 2019. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova II faze, kako bi se objekat stavio u funkciju.
- Svi ugovoreni radovi II faze su završeni.
- U toku je tehnički pregled objekta.

- Na osnovu dostavljene dopune projektne dokumentacije od Opštine Berane, raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji javne rasvjete u okviru kompleksa stočne pijace i priključenju na elektroenergetsku mrežu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača objavljeno je 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3174/1 sa izvođačem, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 32.771,21 €.
- Ugovor br. 01-334/20-5208 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.07.2020. godine, na iznos od 1.452,00 €.
- Radovi na izgradnji javne rasvjete u okviru kompleksa stočne pijace i priključenju na elektroenergetsku mrežu su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 13.854,64 € za tekuće izdatke, odnosno 361.495,72€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 409.121,14 €, od čega 72.276,69 € u 2020. godini.



5.8. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila opština Bijelo Polje.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

5.9. Izgradnja gradske pijace u Rožajama



- Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su ugovoreni radovi I faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.
- Izvođač radova je do sada završio sve grube građevinske radove, instalaterske radove, zidarske radove, molersko-farbarske radove i radove na spuštenim plafonima.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je primopredaja objekta korisniku.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 15.000,00 € za tekuće, odnosno 754.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 770.000,00 €, od čega 185.721,90 € u 2020. godini.
- Obaveza Opštine Rožaje je usaglašavanje projektne dokumentacije II faze radova koji će biti obuhvaćeni novim tenderom uređenja terena i opremanja namještajem, čime će svi radovi na izgradnji objekta biti završeni.

5.10. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje



- Projektну dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju je obezbijedila Uprava javnih radova.
- Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- Nakon što su završeni svi ugovoreni radovi I faze, u toku je izvođenje radova II faze.
- Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radove, asfaltnerske radova i elektro instalacije.
- Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfaltnerskih radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
- Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatali hidrotehničke, elektro i asfaltnerske radove.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 600.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 600.000,00 €, od čega 350.000,00 € u 2020. godini.

II faza



- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
- Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.

- U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltiranje radova u dužini od 3 km.
- Na realizaciji projekta do sada utrošeno 478.797,67 € za kapitalne izdatke, odnosno 12.597,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 491.094,67 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Plav.

- **Most na rijeci Vruji u Gusinju**

- Most na Vruji u Gusinju ima ukupnu dužinu sa krilima obalnih oporaca 40,10 m, dok ukupna širina, zajedno sa ivičnim vijencima i ogradom, iznosi 10,44 m.
- Obrađivač glavnog projekta je „CDS project“ d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-492/1 sa izvođačem, „IGP Fidiija“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020.godine, na iznos od 399.312,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5417/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 9.559,00 €.
- Izvođač je uveden u posao i završeni su pripremni radovi.
- Završeni su radovi na obalnim oporcima-osloncima, kao i njihovo betoniranje sa krilnim zidovima, i postavljanje prednapregnutih nosača na mostu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 150.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 154.000,00 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Opština Gusinje je preuzela obavezu pripremnih radova na pripremi oslonaca za pokretni most, kao i njegovu montažu, što je bio uslov za početak radova.



- **Saobraćajnica od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji**

- Dužina saobraćajnice od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji je 470 m.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01 – 8583/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “DING” d.o.o. Podgorica, je raspisan 08.11.2019. godine, na iznos od 7.502,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8653/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt d.o.o. Podgorica”, je raspisan 11.11.2019. godine, na iznos od 2.412,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.914,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

5.11. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu

- Rekonstrukcija Prnjavorske ulice izvodi se u dvije faze, na osnovu projektne dokumentacije koju je obezbjedila Opština Plav.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 2018. godine.
- Radovi II faze izvode se na putu u dužini od 600 m, sa svim pratećim elementima gradske saobraćajnice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6373/1 sa izvođačem, “Putevi Bar” d.o.o. Bar, je zaključen 28.08.2019. godine, na iznos od 399.985,78€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 25.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6559/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.09.2019. godine, na iznos od 4.300,00 €.
- Izvođač je počeo sa radovima 03.09.2019. godine. Radovi su izvođeni po dinamičkom planu i završeni su 05.05.2020. godine.
- U toku su aktivnosti Opštine Plav na tehničkom prijemu radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 666.047,16€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 666.047,16 €, od čega 248.724,73 € u 2020. godini.



5.12. Rekonstrukcija puta Plav – Bogićevica, Plav

- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o., je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos 9.470,00 €.
- U toku je izrada idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

5.13. Lokalni put Ckla – granica Albanije, opština Bar

- Izgradnja puta u dužini od 1,4 km, sa dvije saobraćajne trake širine 2x2,75m, sa ivičnim trakama 2x0,25m i bankinama širine 1m, ivičnjacima, asfaltnim kolovoznim zastorom debljine 6+4cm, saobraćajnom opremom i signalizacijom. Odvodnja je riješena rigolama širine 0,5m, i kanalima. Za odvod vode kroz trup puta, predviđeni su cjevasti propusti. Korisnik je opština Bar.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Obrađivač glavnog projekta je "Put inženjering" d.o.o. Podgorica, a revident "Kov atelje" d.o.o. Nikšić.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2228/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 690.226,70 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2896 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 14.400,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 69.022,67 € za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Izvođaču radova su predate tačke operativnog poligona, ali izvođač nije uveden u posao jer nije dostavljena prijava radova, odnosno Opština Bar nije stvorila zakonske predušlove za uvođenje izvođača u posao.

5.14. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu

- Realizacija projekta obuhvata izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka, kao i izgradnju saobraćajnice za Biznis zonu u opštini Mojkovac.
- U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija trafostanice i infrastrukturnog priključka i saobraćajnice.
- **Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka**
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-8559//1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 89.243,04 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4801 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950,00 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku je tehnički prijem objekta.
- Na realizaciji projekta za NDTS do sada utrošeno 86.839,04 € za kapitalne izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Izgradnja saobraćajnice**



- Saobraćajnica za Biznis zonu je 760 m dužine.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101 - 1560/1 - 5669/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2018. godine, na iznos od 14.690 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 24.10.2018. godine. Ugovor br. 101 – 1560/1 – 7482 / 1 sa revidentom glavnog projekta, “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, je zaključen 14.11.2018. godine, na iznos od 2.420,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.03.2019. godine. Ugovor br. 01–5704/1 sa izvođačem, “IGP Fidija“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.08.2019. godine, na iznos od 825.499,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.03.2019. godine. Ugovor br. 01–5872/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.08.2019. godine, na iznos od 17.460,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku su korekcije konačnog izvještaja i priprema konačnog obračuna radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.224,20 € za tekuće izdatke, odnosno za 758.418,43 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 788.642,43 €, od čega 331.053,64 € u 2020. godini.

5.15. Putni pravac Monte – Rose

- Obaveza Opštine Herceg Novi je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

5.16. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu

- Obaveza opštine je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava javnih radova na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

5.17. Rekonstrukcija trga u Plavu


- Usljed nedostatka javnih površina u Plavu, određena je lokacija za izgradnju gradskog trga u vidu prenamjene dijela školskog dvorišta u javnu površinu. Projektnim rešenjem se predviđa uklapanje postojećeg zdravog i visokodekorativnog zelenila, a stabla planirana za uklanjanje se nadoknađuju sadnjom novih sadnica visokodekorativnih vrsta. Ukupna površina uređenja platoa je 3.308 m².
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Plav. Projektant je “Plan plus” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4417/1 sa izvođačem, “LD Gradnja” d.o.o. Nikšić, je zaključen 21.06.2019. godine, na iznos od 496.299,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 12.06.2019. godine. Ugovor br. 01-4666/1 sa stručnim nadzorom, “Ing-impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izdata je upotrebna dozvola korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.800,00 € za tekuće izdatke, odnosno 404.000,00€ za kapitalne izdatke.

- Ukupno je realizovano 505.000,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.



5.18. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar

- Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze. Zahvat obuhvata cca 4.800 m² šetališta sa pratećim sadržajima.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo JP Morsko dobro Crne Gore. Projektant glavnog projekta je "Arhitektonski studio AIM" d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je "Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4063 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 968.383,36 €, od čega će Opština Bar obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000,00 €, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore predvidjelo je iznos od 425.000,00 €, a Uprava javnih radova obezbijediti iznos od 443.383,36 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 17.20.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2501 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 26.299,35€.
- U toku je izvođenje radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 715,96 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

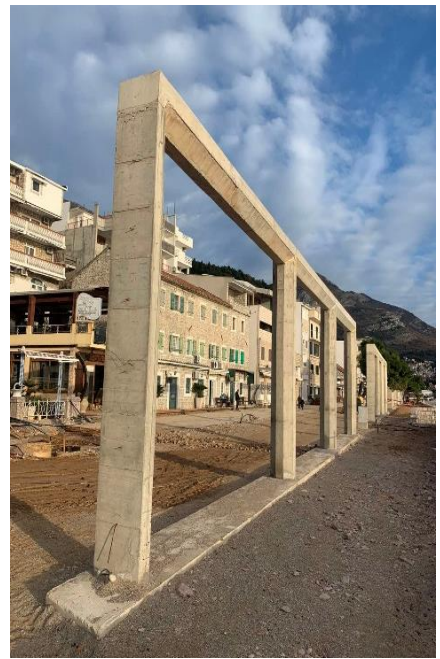

N
a
r
e
a
l
i
z
a
c
i
j
i
p
r
o
j
e
k
t
a
d
o
s
a
d
a
j
e
t
r
o
s
e
n

6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA

6.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32 €.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nemogućnost da se korisnik i projektant usaglase oko načina rješavanja rekonstrukcije energetskeg bloka trafostanice i pomoćnog izvora napajanja. Naime, kako je u pitanju Klinički centar Crne Gore potrebno je obezbijediti neprekidno napajanje električnom energijom. Nakon prilagođavanja odgovora i jedne i druge strane, izrađeno je prihvatljivo tehničko rješenje. Pojava pandemije izazvane virusom COVID-19 je dodatno usporila dinamiku izrade projektne dokumentacije.

6.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici

- Adaptacijom objekata planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovanište, ginekologiju, izabranog doktora i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-970/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 26.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidentom glavnog projekta je raspisano 01.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560//1-8834/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.12.2018. godine, na iznos od 6.240,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4658 sa izvođačem, "IGP Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.06.2020. godine, na iznos od 995.797,64 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-8517/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2020. godine, na iznos od 23.534,5 €.
- U toku su radovi na izradi cementne košuljice i izolacije podova, malterisanju zidova, izradi pregradnih gips-kartonskih zidova kao i radovi na razvodu elektro, termotehničkih i sprinkler instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 32.740,00 € za tekuće izdatke, odnosno 110.693,61€ za kapitalne izdatke.

- Ukupno je realizovano 143.433,61 € od čega 111.177,61 € u 2020. godini.



6.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja je krajem juna 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

6.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" u Risnu

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

6.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.

- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

6.6. Dom zdravlja u City kvartu

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

6.7. Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

6.8. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra realizovana je fazno. Kroz I fazu realizacije izvedeni su radovi na stavljanju u funkciju dijela objekta namijenjenog za potrebe Centra za genetiku i imunologiju (CMGI), kao i adaptacija dijela prostora Dnevne bolnice. Kroz II fazu na objektu su izvođeni radovi na spoljnjem uređenju ulaza u prostor CMGI, kao i opremanje kancelarijskih prostora, konferencijske sale, kabineta direktora, prostorija za medicinsko osoblje, kao i pojedinih prostorija u Dječjoj bolnici.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.04.2019. godine (I faza), odnosno 18.12.2019. godine (II faza).
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 06.08.2019. godine (I faza). Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (II faza) je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.
- Ugovor (I faza) br. 01-5233/1 sa izvođačem, "Refena" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.07.2019. godine, na iznos od 256.537,65 €.
- Ugovor (II faza) br. 01-334/20-4064 sa izvođačem, "Refena" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 39.873,13 €.
- Ugovor (I faza) br. 01-5805/1 sa stručnim nadzorom, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.08.2019. godine, na iznos od 9.700,00 €.
- Ugovor (II faza) br. 01-334/20-4559 sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.06.2020. godine, na iznos od 900,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.084,00 € za tekuće izdatke, odnosno 296.202,55€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 307.286,55 €, od čega 70.786,55 € u 2020. godini.
- Svi radovi su završeni i dio objekta na kojem su izvođeni radovi je predat korisniku na upotrebu.



7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

- Dom starih nalazi se na urbanističkoj parceli br. 33, u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Konik - Stari Aerodrom III" u Podgorica. Ukupna bruto površina objekta iznosi 11.225 m². Objekat je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata. Predviđen je za boravak 270 korisnika smještenih u: 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana. Pored smještajnih jedinica objekat sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, medicinski blok i prateće tehničke prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3108/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2017. godine, na iznos od 8.787.071,48 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača na ugradnji liftova je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9982/1 sa izvođačem na ugradnji liftova, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2019. godine, na iznos od 329.308,71 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5270/1 sa stručnim nadzorom, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 18.12.2017. godine, na iznos od 119.836,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje nepredviđenih radova raspisano je 20.08.2020.godine. Ugovor br. 01-334/20-8275/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 399.515,05 €.
- Do sada su završeni građevinski radovi na izgradnji objekta, radovi na uređenju terena, kao i radovi na opremanju objekta.
- U toku su radovi na povezivanju mašinskih i elektro instalacija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 198.729,22 € za tekuće izdatke, odnosno 9.037.011,72 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 9.235.740,94 €, od čega 3.165.096,25 € u 2020. godini.
- Zbog nedostataka i neusaglašenosti u glavnom projektu urađene su i revidovane izmjene projektne dokumentacije što je za posledicu imalo pojavu viškova i nepredviđenih radova. S obzirom na to da je zahtjev za davanje prethodne saglasnosti o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje odbijen od strane Ministarstva finansija, raspisano je otvoreno javno nadmetanje i zaključen ugovor sa izvođačem za navedene radove.





7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću





- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Dom starih je obuhvaćen PUPom opštine Nikšić – GUR, i nalazi se na katastarskoj parceli br. 4521/1 KO Nikšić.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti.
- Novoprojektovani smještajni objekti su spratnosti podrum, prizemlje, sprat i mansard (Po+P+1+M). Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Zaključkom Vlade Crne Gore od 20.02.2014. godine, broj: 08-282/3, zadužena je Agencija za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić, da sprovede aktivnosti na izradi projektne i planske dokumentacije za potrebe Regionalnog stambenog programa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine.
- Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
- Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
- Do sada su završeni pripremni radovi, zemljani, AB radovi, zidarski, tesarski, limarski, izolaterski, fasaderski radovi, kao i vodovod i kanalizacija.
- U toku su bravarsko- stolarski, montažerski, podpolagački, molersko- farbarski, jaka i slaba struja, mašinske instalacije i sprinkler.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 39.232,44 € za tekuće izdatke, odnosno 1.375.748,62 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.414.981,06 €, od čega 1.414.981,06 € u 2020. godini.
- Tokom izvođenja radova nadzorna služba je uočila određene nedostatke i propuste u projektu, što je očekivano s obzirom na to da se radi o rekonstrukciji starih i dotrajalih

objekata i projektant nije u mogućnosti da tokom izrade projektne dokumentacije sagleda obim svih potrebnih radova. Uočeni nedostaci ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao i na promjenu fasada objekta, ali utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta. Uočeni nedostaci za posljedicu imaju pojavu viškova i nepredviđenih radova. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 235.000 €. S obzirom na to da je zahtjev za davanje prethodne saglasnosti o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje odbijen od strane Ministarstva finansija, raspisano je novo javno nadmetanje i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.

7.3. Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU “Lovćen Bečići” u opštini Cetinje

- JU “Lovćen Bečići”, kao krajnji korisnik, koordinira aktivnostima na realizaciji projekta.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

7.4. Dom starih u Plavu

- Ministarstva zdravlja je sredinom juna 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Na osnovu zahtjeva Uprave javnih radova Ministarstvu finansija, projekat je uvršten u Plan javnih nabavki za 2020. godinu, ali nije dobijena potvrda od Ministarstva finansija da su obezbijeđena finansijska sredstva. Nakon dobijanja potrebnih saglasnosti Uprava javnih radova će pokrenuti procedure javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg izvođača i vršioca stručnog nadzora.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

7.5. Dom starih u Rožajama

- Obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranje je da u saradnji sa Opštinom dostavi Upravi javnih radova projektnu dokumentaciju na osnovu koje bi se pristupilo raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Do kraja septembra 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA

8.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na raspisivanje javnih konkursa za izbor najboljih urbanističko-arhitektonskih idejnih rješenja, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a, a učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a.
- **8.1.1. Vrtić u Baru**
 - Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **8.1.2. Vrtić u Ulcinju**
 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju.
 - Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta Glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
 - Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **8.1.3. Vrtić u Pljevljima**
 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma u 2016. godini je raspisalo konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Uprava javnih radova je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja ugovorila izradu Glavnog projekta.
 - U 2019. godini, nakon što je završena izrada i revizija glavnog projekta, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa CEB procedurama. Kako na javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, nakon provjere procijenjene projektantske vrijednosti ista je uvećana.
 - Ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
 - Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima u toku je u naselju Guke. Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², projektovane za smještaj 67 djece. U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslenu grupu, radne sobe za grupu vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. Projekat je finansiran iz kredita Razvojne Banke Savjeta Evrope – CEB.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 12.07.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6854/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.11.2016. godine, na iznos od 7.854,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano od strane Ministarstva prosvjete.

- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.01.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4557/1 sa izvođačem, "Tehno gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 19.06.2020. godine, na iznos od 1.048.956,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 04.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4186/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 29.500,00 €.
- Završeni su pripremni radovi, radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i krovopokrivački radovi.
- U toku su zidarski radovi, radovi na malterisanju i radovi na grubom razvodu ViK instalacija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.972,80 € za tekuće izdatke, odnosno 313.011,26€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 335.984,06 €, od čega 323.190,66 € u 2020. godini.



8.1.4. Vrtić u Bloku VI, Podgorica



- Vrtić se nalazi na urbanističkoj parceli UP 11, u Bloku VI u Podgorici, površine 3.185 m². Objekat će biti ukupne bruto površine 1.568 m² i spratnosti: suteran, prizemlje i jedan sprat, planiran za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za djecu uzrasta jaslica i uzrasta vrtića, višenamjenski prostor (otvoreni hol), prostor za trijažu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djeteta, kancelarije i zbornica, čajna kuhinja, perionica, tehničke i ostale prateće prostorije. Cjelokupan program boravka predškolske djece, sa zajedničkim prostorom i neophodnim medicinskim sadržajima je organizovan u prizemlju, a sprat je namijenjen prostoru jaslica. Sve prostorije su prirodno ventilisane, zeleni krov sprječava pregrijavanje objekta u toplijem dijelu godine, a u hladnom periodu gubitak toplote, dok solarni paneli omogućavaju iskorišćavanje sunčeve energije za zagrijavanje.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je sprovelo aktivnosti na raspisivanju i sprovođenju konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja koje je Upravi javnih radova dostavljeno da na osnovu istog sprovede tendersku proceduru za odabir projektanta i revidenta glavnog projekta.
- Ugovor br. 19/2-01-2500/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2017. godine, na iznos od 22.598,10 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-3405/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 19.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3949/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 1.992.689,56 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.03.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4185/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 59.500,00 €.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta i zidanju fasadnih i pregradnih zidova objekta.
- U toku je ugradnja spoljašnje bravarije, malterisanje unutrašnjih zidova, kao i razvod instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro, termotehničkih i sprinkler instalacija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 67.721,10 € za tekuće izdatke, odnosno 667.346,06€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 735.067,16 €, od čega 704.214,93 € u 2020. godini.

8.1.5. Rekonstrukcija predškolskih ustanova

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnih konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za u opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete.
- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi neophodnu dokumentaciju, nakon čega će Uprava javnih pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 5.000,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

8.2. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za objekte: vrtić u City kvartu, vrtić na Zlatici, vrtić na Tuškom putu, vrtić na Starom aerodromu, vrtić u Bijelom Polju, vrtić u Beranama i vrtić u Plavu. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a, a učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a.
- U 2020. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

8.2.1 Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

8.2.2. Vrtić na Zlatici, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.2.3. Vrtić na Tuškom putu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.2.4. Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.2.5. Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.2.6. Vrtić u Beranama


- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.2.7. Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.3. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama



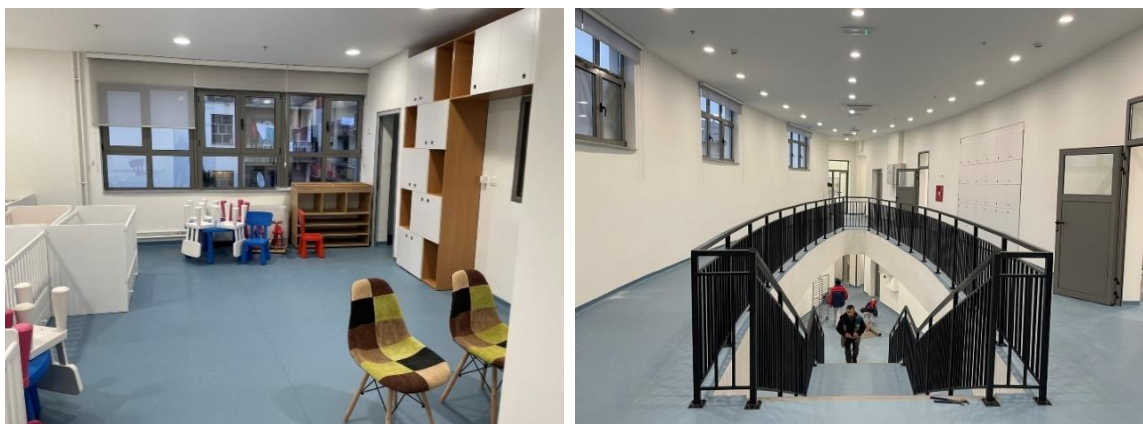

- Objekat je projektovan kao savremeno i funkcionalno zdanje, kapaciteta oko 100 djece, ukupne bruto površine 1.120 m². Imaće devet prostorija namijenjenih za dnevni boravak djece, od kojih četiri za jaslice, prostorije za vaspitače, kuhinju, administrativni blok, multifunkcionalni prostor sa garderoberima, višenamjensku salu i ostale prateće sadržaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3611/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.10.2017. godine, na iznos od 24.500,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisan 07.12.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-979/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 3.500,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2949/1 sa izvođačem, "Tofi" d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.05.2019.godine, na iznos od 1.504.617,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 04.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6102/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.10.2019. godine, na iznos od 24.210,00 €.
- Završeni su svi radovi i u toku je ispitivanje elektro i mašinskih instalacija i primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 43.050,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.345.552,62 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.388.602,62 €, od čega 892.089,31 € u 2020. godini.

8.4. Osnovna škola u Igalu

- Obaveza Ministarstva prosvjete je bila da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovede procedure konkursa i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Igalu.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.5. Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-912/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 09.03.2017. godine, na iznos od 116.874,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6754/1 sa revidentom glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. iz Nikšića, je zaključen 23.10.2018. godine, na iznos od 8.330,00 €.
- Završen je glavni projekat i predat na reviziju, koja je u toku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 93.499,26 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 93.499,26 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na ovom projektu nastupila je zbog izmjene zakonske regulative, usljed koje je bilo neophodno naknadno izraditi idejno rješenje i pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta. Idejno rješenje je izrađeno i proslijeđeno Univerzitetu Crne Gore radi pribavljanja saglasnosti. S obzirom na to da je glavni gradski arhitekta zatražio izmjenu segmenta idejnog rješenja, u toku je dorada istog.

8.6. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja OŠ u Tološima, Podgorica

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 31.333,33 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Dalje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta kroz donatorski ugovor.

8.7. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a “Univerzitetski centar” u Podgorici

- Izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta rekonstrukcije toplane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00 €.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.620,00 € za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos u 2020. godini.

8.8. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom

- Projektom sanacije klizišta na Savini, za potrebe izgradnje i rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom, planirana je realizacija više potprojekata u skladu sa prioritetima Ministarstva prosvjete.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije u 2018. godini završeni su radovi na sanaciji ovog klizišta, a koji su obuhvatili izradu potporne konstrukcije sa dva reda bušenih šipova prečnika 100 cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5 m.
- U 2016. godini završeni su hitni sanacioni radovi na objektu JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehničkim istraživanjima za objekat JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- U aprilu 2020. godine isplaćena su sredstva za preostale radove, nakon što je Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, preuzelo aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 104.041,80 € za tekuće izdatke, odnosno 933.551,14 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.037.592,94 €, od čega 31.323,10 € u 2020. godini.

8.9. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju





- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00 €.
- Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, zidarski radovi i izrada gips kartonskih pregradnih zidova.
- U toku je izrada armirano-betonske konstrukcije pasarele koja je predviđena kao pješačka staza uz objekat, izrada fasadne bravarije, izolaterski radovi, malterisanje, izrada keramike i razvod elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.654,00 € za tekuće izdatke, odnosno 3.299.085,44 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.325.739,44 €, od čega 1.950.252,06 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciji po pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je

raspisano javno nadmetanje za predmetne radova i u toku je procedura vrednovanja ponuda.

8.10. Izgradnja Osnovne škole u Rožajama

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Rožaje i Ministarstva.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.



8.11. Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje

- Po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti od 24.09.2019. godine i u skladu sa ponudom za izradu geodetske podloge od 26.09.2019. godine, za potrebe sprovođenja konkurs za idejno rješenje fiskulturne sala OŠ "Pavle Žižić" u Bijelom Polju izrađen je geodetski snimak lokacije.
- Ponuda br. 01-7298/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Geodeting” d.o.o. Bijelo Polje, od 26.09.2019. godine na iznos od 484,00 €.
- Do sada je završena izrada geodetske podloge.
- Obaveza Ministarstva prosvjete je bila da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovede procedure konkursa i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 484,00 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

8.12. OŠ "Lovćenski partizanski odred" na Cetinju

- Obaveza Ministarstva prosvjete je bila da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovede procedure konkursa i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Igalu.

- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.13. Naučno-tehnološki park u Podgorici





- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 3 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.

- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je Ministarstvo nauke. Projekant glavnog projekta je "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00 €.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine.
- U toku su zidarski, montažni radovi, betonski, bravarski, radovi na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija termotehnike.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.628.799,59 € za kapitalne izdatke, odnosno 10.890,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.639.689,59€ od čega kompletan iznos u 2020. godini.
- Usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, kao i propusta u projektnoj dokumentaciji, došlo je do pojave značajnih viškova i nepredviđenih radova. Stručni nadzor i izvođač radova nisu mogli da se usaglase oko jediničnih cijena za navedene radove, pa su Ministarstvo nauke i Naučno-tehnološki park Crne Gore preuzeli obavezu da obezbijedi konačan predmjer i predračun svih neophodnih radova od strane projektanta i revidenta, na osnovu kog će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju nove tenderske procedure za njihovo ugovaranje.

8.14. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekata, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.

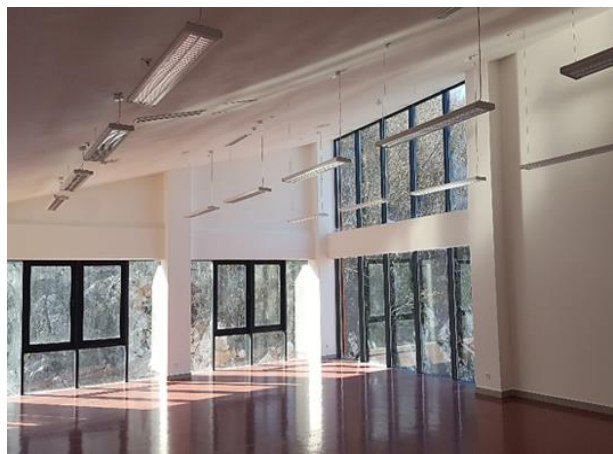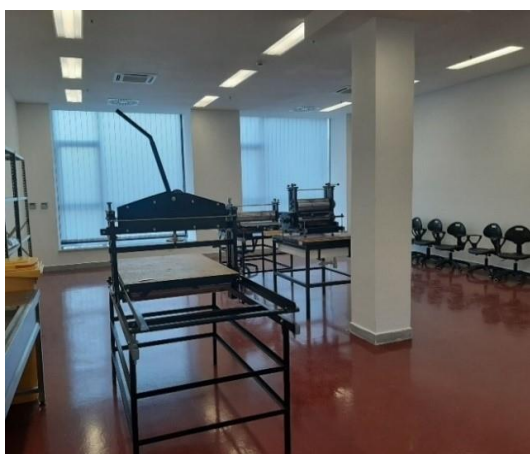

- **Kotlarnica i infrastrukturni priključci za potrebe Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju**
- Ugovor br. 19/2-01-1360/1 sa izvođačem , “Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2015. godine, na iznos od 833.225,47 €.
- Ugovor br. 19/2-01-2893/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2015. godine, na iznos od 22.850,00 €.
- Svi radovi su završeni, izdata je upotrebna dozvola i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.850,00 € za tekuće izdatke, odnosno 833.136,53€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 855.986,53 €, od čega 49.682,74€ u 2020. godini.

- **Izvođenje radova na uređenju terena dijela Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti i opremanja Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju**
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1162/2 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 22.02.2019. godine, na iznos od 1.195.302,33 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8611/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 24.200,00 €.
- Završeni su svi radovi, izdata je upotrebna dozvola i izvršena primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.200,00 € za tekuće izdatke, odnosno 995.243,39 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.019.443,39 €, od čega 87.919,23€ u 2020. godini.

8.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova za objekte: Druga Gimnazija u Podgorici, OŠ na Zabjelu u Podgorici, OŠ u City kvartu u Podgorici, OŠ Karabuško polje u Tuzima, Vrtić na Zabjelu, Vrtić u Kotoru, Vrtić u naselju Momišići u Podgorici, adaptaciju i opremanje osnovnih srednjih stručnih škola i ostalih objekata po prioritetu Ministarstva prosvjete.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.1. Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.2. Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.3. Osnovna škola na Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada i ovjera projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, nakon čega će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.4. Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.5. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.6. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.15.7. Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2020. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

8.16. Adaptacija objekata obrazovanja

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama: Podgorica, Plav, Nikšić, Cetinje, Pljevlja i Herceg Novi, a u skladu sa prioritetima Ministarstva prosvjete. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Rebalansom budžeta za 2020. godinu Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa Ministarstvom finansija, na osnovu definisanih prioriteta, prepoznalo i obezbijedilo potrebna sredstva za izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama Podgorica, Nikšić i Rožaje. U okviru navedenog projekta predviđena je adaptacija postojećeg objekta u okviru KBC-a u Podgorici za potrebe vrtića, adaptaciju Područne ustanove JU OŠ "Ivan Vušović" u Miločanima, opština Nikšić, kao i adaptacija postojećeg objekta JU OŠ u Dacićima, opština Rožaje. Krajem septembra 2020. godine, Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektnu dokumentaciju za predmetna tri projekta. Obaveza Ministarstva prosvjete je da obezbijedi reviziju projektne dokumentacije za objekat u krugu KBC-a i objekat OŠ Dacići.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za adaptaciju postojećeg objekta JU OŠ Dacići raspisano je 02.12.2020. godine. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- Uprava javnih radova će pristupiti pripremnim aktivnostima na izradi tenderske dokumentacije za objekat u krugu KBC-a.
- **Adaptacija Područne ustanove JU OŠ "Ivan Vušović" u Miločanima, Opština Nikšić**
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8321 sa izvođačem, „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 47.081,34 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.10.2020. godine. Ugovor br. 01-8030/1 sa stručnim nadzorom, „Arhitektonika” d.o.o. Nikšić, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 1.210,00 €.
 - Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.





9. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Aktivnostima na realizaciji projekata iz programa "Unapređenje turističke ponude" koordinira nadležno Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje utvrđuje potrebe i prioritete.

9.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice sa pratećim sadržajima, primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove na izgradnji žičara koje povezuju ski cente, ski staza i osnježavanju staza (izgradnja sistema vodosnabdijevanje, akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje).

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, I faza

- Projektom je predviđena rekonstrukcija puta u dužini od 2,3km, koja obuhvata zemljane radove, asfalterse radove, ugradnju saobraćajne opreme i signalizacije i postavljanje 10kV kabla. Izvođenje radova se realizuje u dvije faze.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50 €
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 17.08.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5819/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.11.2015. godine, na iznos od 777.385,73 €.
- Izbor stručnog nadzora izvršen je neposrednim sporazumom, na osnovu ponude br. 19/2-01-2073/2 od 20.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2492/2 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.05.2016. godine, na iznos od 4.988,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.489,20 € za tekuće izdatke, odnosno 738.362,94€ za kapitalne izdatke.
- Nakon završetka radova druge faze biće izvršen tehnički prijem za kompletan put.

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, II faza

- Radovi II faze obuhvataju preostali dio zemljanih radova, asfalterse radove i saobraćajnu opremu i signalizaciju na cijeloj dužini trase puta od 2,3km, kao i postavljanje 10kV kabla.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50 €,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5753/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 1.331.618,01 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.04.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00 €.
- Završena je izgradnja saobraćajnice i ugrađena oba sloja asfalta.
- Stručni nadzor sprovodi aktivnosti na izradi konačnog obračuna radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.595,30 € za tekuće izdatke, odnosno 1.307.627,74€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.337.223,04 €, od čega nije bilo realiacije u 2020. godini.



Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450- Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, I faza (PR8-PR14)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski resorta "Kolašin 1450" do Ski resorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a drugu fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija je rađen kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta I i II faze je raspisano 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta I i II faze, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695,00 €.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" (za I i II fazu) je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe

izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" sa projektantom I i II faze, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2376/1 sa izvođačem, "Akropolis" d.o.o. Nikšić, je zaključen 09.04.2019. godine, na iznos od 392.255,31 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01-812/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 8.730,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.898,62 € za tekuće izdatke, odnosno 386.518,19€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 395.416,81 €, od čega 9.570,76 € u 2020. godini.
- Stručni nadzor sprovodi aktivnosti na izradi konačnog izvještaja.

Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450- Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, II faza (PR1-PR8)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a II fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija rađen je kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta I i II faze raspisano je 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta I i II faze, JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine na iznos od 695,00 €.
- Ugovoru o izradi projektne dokumentacije zaključen je sa "GeoT" d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" I i II faze je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" sa projektantom I i II faze, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5068/1 sa izvođačem , "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 488.835,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-9975/1 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2019. godine, na iznos od 7.865,00 €.
- Nakon sprovedenih geoloških istraživanja i izrade Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena, u julu 2018. godine, urađen je projekat izrade potpornih konstrukcija.

Uvođenjem izvođača radova u posao, ustanovljena je neusaglašenost projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, pa je u avgustu 2019. godine napravljena izmjena projektne dokumentacije.

- Svi ugovoreni radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.310,70 € za tekuće izdatke, odnosno 488.831,35 € za kapitalne izdatke.
- S obzirom na to da je urađena izmjena projektne dokumentacije, došlo je do prekoračenja ugovorenih količina radova. Upućen je zahtjev Ministarstvu finansija za obezbjeđenjem dodatnih sredstava i odobren je pregovarački postupak. Nakon što budu završeni radova po pregovaračkom postupku, stručni nadzor će završiti izvještaj za obje faze.

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, potporne konstrukcije, II faza – pregovarački postupak

- Zbog izmjene prvobitne trase puta, javila se potreba za izradom potpornih konstrukcija. Ugovor se odnosi na naknadne radove i višak radova, ugovorenih po pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja, kojim je odobrena izmjena dopune glavnog projekta. Projekat konstrukcije za "Via projekt" d.o.o Podgorica, koji je radio glavni projekat izrade puta, radio je "GeoT" d.o.o. Podgorica. Izmjena projekta i dopuna izmjene, na koju se odnosi ovaj projekat, je povjerena projektantu osnovnog projekta, odnosno "GeoT" d.o.o. Podgorica, bez raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmjene dopune glavnog projekta je raspisano 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta, JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695,00 €.
- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera. Ugovor br. 01-334/20-1977/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 72.989,38 €.
- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera za izbor izvođača radova. Ugovor br. 01-334/20-3179 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 1.149,50 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 695,00 € za tekuće izdatke, odnosno 46.809,96 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 47.504,96 € , od čega 46.809,96 € u 2020. godini.
- U toku postavljanja putarske mreže za zaštitu kosina, izvođač radova je obavijestio naručioca i stručni nadzor da je na kosini iza zida, došlo do pojave ozbiljne pukotine. Stručni nadzor je dao svoje mišljenje u kojem nije mogao jasno potvrditi ozbiljnost deformacije, već je predložio angažovanje geologa. Zahtjev za dostavljanje stručnog mišljenja je upućen projektantu i revidentu.

U toku je izrada konačnog obračuna radova.

Zbog pojave pukotine, Naručilac je 13.11.2020. godine putem jednostavnih nabavki uputio zahtjev za dostavljanje ponuda za izradu projekta osmatranja tla i potporne konstrukcije od PR1-PR8 na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600.

Ugovor br. 01-334/20-10348 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.12.2020. godine, na iznos od 907,50 €.

Više puta je upućen Zahtjev za dostavljanje ponuda za vršenje revizije projekta osmatranja tla i potporne konstrukcije od PR1-PR8 na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, međutim nije bilo zainteresovanih ponuđača.



- **Izvođenje asfaltnih radova u toku rekonstrukcije puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600 - II faza, (PR1 - PR14)**
- Dio puta ispred potpornih zidova, u dužini od oko 180m koji je predmet projekta, je dio puta prema skijalištu "Kolašin 1600", koji je zbog izmjene trase pomjeren. Projektom je obuhvaćena izrada tampona, asfalta i rigola na dijelu ispred potpornih zidova.
- Obrađivač izmjene glavnog projekta je "Via projekt" d.o.o. Podgorica.
- Ugovor br. 01-9846/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.12.2019. godine, na iznos od 605,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9394/1 sa izvođačem, "Crnogoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 69.920,19 €.
- S obzirom da je ovaj dio puta bio obuhvaćen osnovnim ugovorom, nije raspisivano javno nadmetanje za usluge vršenja stručnog nadzora, već je nadzor koji je angažovan za izgradnju II faze puta Kolašin 1600 vršio stručni nadzor nad ovim projektom. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U toku su aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za dokazivanje opravdanosti izvođenja asfaltnog sloja koji nije ugrađen po projektu, kao i izrada konačnog obračuna radova.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 605,00 € za tekuće izdatke, odnosno 8.506,57 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 9.111,57 €, pri čemu nije utroška sredstava u 2020. godini.
- **Izrada Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10kV Kolašin 1450-1600**
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8109/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 4.477,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8107/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 1.573,00 €.
 - U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Skijališta Crne Gore.
- **Izgradnja parking prostora na lokaciji planinskog centra Kolašin 1600, II faza**
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9392/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” a.d.. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 69.824,99 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.09.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9107/2 sa stručnim nadzorom, „Kov atelje” d.o.o. Nikšić, je zaključen 29.11.2019. godine, na iznos od 4.798,86 €.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni i predate je konačni izvještaj stručnog nadzora.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.798,86€ za tekuće izdatke, odnosno 69.824,80 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 74.623,66 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- **Vodosnabdijevanje uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Kolašin 1600**
 - Objekat vodosnabdijevanja čine: 3 kaptaze, rezervoar kapaciteta 80 m³ i cjevovod dužine 2700 m. Objekat je u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, KO Smrčje, opština Kolašin.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6426/1 sa obrađivačem glavnog projekta, Konzorcijum „HydroGis System” d.o.o. Podgorica, „Jewel Crna Gora” d.o.o. Danilovgrad, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2015. godine, na iznos od 19.635,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 13.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-850/1 sa revidentom glavnog projekta, „Virmont” d.o.o. Bar, je zaključen 26.02.2016. godine, na iznos od 4.890,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.07.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6460/1 sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2016. godine, na iznos od 181.443,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1917/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.808,00 €.
- Svi ugovoreni radovi na vodosnabdijevanju uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600” su završeni.
- U toku su aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.809,80 € za tekuće izdatke, odnosno 138.057,14€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 164.866,94 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- **Trafostanica 35/10 kV Jezerine**
 - Projekat je realizovan po principu „projektuj i izgradi”.
 - Ugovor br. 19/2-01-778/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem, “Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.03.2015. godine, na iznos od 1.598.889,00 €.
 - Revident glavnog projekta je firma “Liming projekt” d.o.o. Podgorica
 - Ugovor br. 19/2-01-818/2 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.02.2016. godine, na iznos od 28.320,00 €.
 - Svi ugovoreni radovi na projektu su završeni 2017. godine.
- **Žičara K8**



- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mnm - Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat,

sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.

- Ugovor br. 19/2-01-5740/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem šestosjedne žičare K8, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 8.979.740,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-6145/1 sa revidentom glavnog projekta šestosjedne žičare K8, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2016. godine, na iznos od 11.543,00 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-624/1 sa stručnim nadzorom na izgradnji šestosjedne žičare K8 i ski staza, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.07.2017. godine, na iznos od 99.960,00 €.
- Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni i objekat je u februaru 2019. godine pušten u funkciju.

• **Ski staze uz žičaru K8**

- Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi". Ukupna dužina ski staza iznosi 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova je raspisano 01.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7567/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.197.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8054/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2901 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 4.477,00 €.
- Do sada su završene aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije.
- Radovi su u završnoj fazi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.526,20 € za tekuće izdatke, odnosno 1.090.089,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.097.615,20 € od čega 793.300,20 € u 2020. godini.

• **Žičara K7 - povezivanje Kolašin 1450 - Kolašin 1600**

- Prostornim planom posebne namjene "Bjelasica i Komovi" predviđena je izgradnja isklopive šestosjedne žičare K7 čijom izgradnjom će se povezati skijališta "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600". Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 26.03.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.04.2019. godine.
- Ugovor br. 01-6450/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, konzorcijum „Doppelmayr – Kolašin”, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 8.998.000€.
- Ugovor br. 01-7065/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 79.000 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.12.2019. godine.
- Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00 €.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi idejnog rješenja i glavnog projekta.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije.

- Izvršena je prijava radova na dijelu katastarskih parcela na kojima se ne sprovodi postupak eksproprijacije, međutim izvođač nije mogao biti uveden u posao usljed loših vremenskih prilika.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 71.100,00 € za tekuće izdatke, odnosno 2.830.578,08 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.901.578,08 €, od čega 2.033.430,08 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore.



- **Ski staze uz žičaru K7**

- Projekat se realizuju po principu "projektuj i izgradi". Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00 €.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije.
- Izvođeni su zemljani radovi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 28.120,40 € za tekuće izdatke, odnosno 1.401.704,32 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.429.824,72 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

9.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

- **Ravna Rijeka - Jasikovac 5,5 km**

- Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko - pravni problemi u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.
- Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.

Sanacija klizišta „Latinska kosa“

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2897 sa izvođačem radova, „Konstruktor” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 192.801,00 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-5972/1 sa stručnim nadzorom, „Projectman” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.09.2018. godine, na iznos od 4.990,00 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni i predate je konačni izvještaj nadzora.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.990,00 € za tekuće izdatke, odnosno 192.729,74 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 197.719,74 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

• **Jasikovac - Cmiljača 10 km**

- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.04.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-2798/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 22.07.2014. godine, na iznos od 19.635,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 20.11.2014. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-5127/2 sa revidentom glavnog projekta, „Simm inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.11.2014. godine, na iznos od 3.000,00 €.

I faza

- Radovima I faze obuhvaćeni su zemljani radovi u dužini od 120 m, potporni zidovi i propust na kompletnoj dužini trase.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 24.08.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4261/1 sa izvođačem, „PNP Perošević” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 17.11.2017. godine, na iznos od 740.614,70 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.08.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2078/2 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.05.2017. godine, na iznos od 7.400,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača naknadnih radova je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8748/1 sa izvođačem naknadnih radova, „PNP Perošević” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 19.12.2018. godine, na iznos od 109.796,61 €.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 849.889,22 € kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 856.889,22 €, od čega 27.421,96 € u 2020. godini.

II faza

- Radovima II faze obuhvaćeni su zemljani radovi u dužini od 3,76 km, potporni zidovi i propust na kompletnoj dužini trase.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.07.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4537/1 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.11.2017. godine, na iznos od 2.166.431,53 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 02.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2096/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 25.04.2018. godine, na iznos od 11.490,00 €.
- Nakon raskida ugovora sa stručnim nadzorom, ponovo je raspisano novo javno nadmetanje. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2245/1 sa stručnim nadzorom, Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 4.114,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača nepredviđenih radova je raspisano 21.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8082/1 sa izvođačem navedenih radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 319.994,14 €.
- Svi ugovoreni radovi II faze su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.965,98 € za tekuće izdatke, odnosno 2.130.635,40 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano za 2.140.601,38 €, od čega 252.934,83 € u 2020. godini.

III faza

- Radovima III faze obuhvaćeni su zemljani radovi u dužini od 3 km, potporni zidovi i propust na kompletnoj dužini trase. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5915/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.09.2018. godine, na iznos od 1.543.162,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6943 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 15.780,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača nepredviđenih radova raspisan je 03.12.2019. godine. Ugovor br. 01-9391/1 sa izvođačem navedenih radova, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 229.779,00 €.
- Svi ugovoreni radovi III faze su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.204,25 € za tekuće izdatke, odnosno 1.538.319,88 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano za 1.550.524,13 €, od čega 161.037,94 € u 2020. godini.



- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača**
- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost

prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00 €.
- Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, i izvedeni su zemljani radovi na objektu.
- Izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, kao i zemljani radovi na garaži za ratrake. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.481,00 € za tekuće izdatke, odnosno 506.129,99€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 525.610,99 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.



- **Primarna elektroenergetska infrastruktura**
- **Izgradnja trafostanice "Cmiljača" 35/10 kV**
- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojškovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2728/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Do sada su završeni svi građevinski i elektro radova na objektu.
- Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što su izgradnja 35 kV dalekovoda "Ribarevine-Cmiljača" nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 117.271,40 € za tekuće izdatke, odnosno 1.102.377,49 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.219.648,89 €, od čega 1.063.732,27 € u 2020. godini.



Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS "Ribarevine" 110/35 kV

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3090/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 19.995,25 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5418/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 2.970,00 €.
- Sprovede su aktivnosti na dobijanju saglasnosti na projekat i saglasnosti za priključenja na elektroenergetsku mrežu od strane CEDIS-a. Izvršena je prijava adaptacije predmetne trafostanice, te shodno tome, u narednom periodu se očekuje uvođenje izvođača u posao.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10 kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00 €.
- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase.
- U toku je izmjena projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da je predmetni dalekovod u fazi izmjene projektne dokumentacije. Naime, izvođač radova je obavjestio Upravu javnih radova da nije u mogućnosti da realizuje projekat u dijelu dobavljanja stubova ponuđenih tenderskom dokumentacijom, jer je proizvođač stubova otišao u stečaj. Uzimajući u obzir zamjenu proizvođača stubova, kao i preklapanje projekata žičare i staza sa predmetnim projektom, krenulo se u izmjenu projektne dokumentacije dalekovoda.

- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača**
- Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmiljača" sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00 €.
- Zapisnik o pozitivnom inspeksijskom pregledu je dostavljen. Čekaju se povoljni vremenski uslovi za uvođenje izvođača u posao.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.398,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 22.398,00 €, od čega 3.940,00 € u 2020. godini.
- **Nabavka žičare šestosjed Z7**



- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u

oblasti zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00 €.
- Do sada je završena izrada Idejnog rješenja, Idejnog projekta i Glavnog projekta i revizija Glavnog projekta šestosjedne isklöpive žičare i 3 km ski staza.
- Radovi su u završnoj fazi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 53.006,92 € za tekuće izdatke, odnosno 7.318.745,50 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je 7.371.752,42 €, od čega 427.069,50 € u 2020. godini.
- U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.

- **Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski**

- Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00 €.
- U toku je izrada idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

9.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

- **Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza**

- Put se nalazi u opštini Mojkovac. Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanje 10 kV kabla, a asfaltni radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00 €.

- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00 €.
- Do sada su završeni zemljani radovi na proboju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija I faze.
- U toku je izvođenje radova za potporne konstrukcije II faze i tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača III faze potpornih konstrukcija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.183,00 € za tekuće izdatke, odnosno 706.531,03 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 730.714,03 € , pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00 €.
- Više puta je putem jednostavnih nabavki upućen Zahtjev za dostavljanje ponude za reviziju dopune Glavnog projekta, za koje nije bilo zainteresovanih ponuđača.
- Izrada dopune glavnog projekta je u toku.



• **Izgradnja puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije), II faza**

- Nakon izgradnje I faze puta, došlo je do obrušavanja kosina koje su urađene po projektu i do pojave klizišta. Izrađen je projekat sanacije kosina na I fazi puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8027/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2018. godine, na iznos od 4.985,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta nije raspisano, već je ugovor zaključen na osnovu ponude ponuđača. Ugovor br. 440/1 sa revidentom glavnog projekta,

"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 26.06.2019. godine, na iznos od 2.500,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 09.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7557/1 sa izvođačem, "Eko reciklaža" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 967.990,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.09.2019. godine, ali je poništeno. Zaključen je ugovor sa stručnim nadzorom, "Kov atelje" d.o.o. Nikšića, na osnovu dostavljene ponude, na rok od 2 mjeseca. Nakon toga, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti, od 10.03.2020. godine, izabran je stručni nadzor do kraja realizacije projekta. Ugovor br. 01-7462/1 sa stručnim nadzorom, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, je zaključen 01.10.2019 godine na iznos od 4.900,50 €. Ugovor br. 01-334/20-2500 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, projects & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 14.883,00 €.
- Sprovedene su aktivnosti na izradi i reviziji tehničke dokumentacije, aktivnosti za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i stručnog nadzora i izvođač je uveden u posao.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora o izvedenim radovima.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 27.268,70 € za tekuće izdatke, odnosno 966.387,40 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 993.656,10 €, od čega 852.612,94 € u 2020. godini.

- **Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac**

- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Monteput" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00 €.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.932,50 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- Izvođač radova će biti uveden u posao kada se steknu povoljni vremenski uslovi.



- **Izvođenje radova na izgradnji izmijenjene trase puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m**
- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50 €.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od od 1.750,50 €.
- Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- **Regionalni put Mojkovac-Vragodo-Lubnica dužine 8,5 km**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije - geodetsko snimanje dionice puta Mojkovac – Vragodo, cca 8km je raspisano 18.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8441/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 8.954,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije - saobraćajne trase dionice puta Mojkovac-Vragodo cca 8 km, je raspisano 04.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8478/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2020. godine, na iznos od 14.520,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta Glavnog projekta dijela puta Mojkovac-Vragodo, cca 8km je raspisano 16.06.2020.godine. Ugovor br. 01-334/20-5422/1 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam-Ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 5.989,50 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.474,00 € za tekuće izdatke, od čega 2.904,00 € u 2020. godini.
 - Dalje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava za saobraćaj.
- Most na rijeci Tari- povezivanje regionalnog sa magistralnim putem cca L=220 m**
- Mosta na rijeci Tari lociran je na KO Podbišće i KO Bjelojevići u opštini Mojkovac.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog projekta je raspisano 09.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4846/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 06.12.2017. godine, na iznos od 34.510,00 €.
 - Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta je raspisano 04.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8440/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijaska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 14.520,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog i idejnog projekta je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-9374/1 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam-Ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 8.000,00 €.
 - Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 49.030,00 € za tekuće izdatke, od čega 16.708,00 € u 2020. godini.
 - Dalje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava za saobraćaj.
- Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno - servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski “**
- Donešena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja “Žarski”.
 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe Ski centra Žarski**
- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi“. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac“ iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00 €.
- Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta.
- Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova (snijeg i kiša), kao i lošeg pristupnog puta dužine cca 2 km ka prilazu gradilišta, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem novembra 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.146,83 € za tekuće izdatke, odnosno 375.216,70€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 386.363,53 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.





- **Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4**



- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvo“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta, i sprovedene su aktivnosti na nabavci opreme.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 23.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 5.117.907,80 € za kapitalne izdatke.

- Ukupno je realizovano 5.140.907,80 €, od čega 4.269.407,55 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore.

• **Ski staze uz žičaru Z4**

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00 €.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije.
- Izvršena je prijava radova na dijelu katastarskih parcela na kojima se ne sprovodi postupak eksproprijacije i izvođač je uveden u posao. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 13.818,20 € za tekuće izdatke, odnosno 1.253.422,05 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.267.240,25 €, od čega 792.315,20 € u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Skijališta Crne Gore.

• **Adaptacija objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu**

- Projektom dokumentacijom planirana je adaptacija dijela postojećeg objekta koji je u vlasništvu Opština Mojkovac, a za potrebe Skijališta Crne Gore.
- Poslovni prostor se sastoji od: ulaznog hodnika, stepeništa, toaleta, portirnice i čajne kuhinje u prizemlju. Na spratu se nalazi veliki centralni hodnik sa osam prostorija raspoređenih oko njega. Površina objekta iznosi 188,90 m². Spratnost objekta je prizemlje i sprat.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedio korisnik. Obradivač glavnog projekta je “INGrad” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8027/1 sa izvođačem radova, „Konstruktor group” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 134.475,97 €.
- Javno nadmetanje za stručnog nadzora je raspisano 10.06.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-7558/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 5.989,50 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.114,54 € za tekuće izdatke, odnosno 91.769,51 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 94.884,05 €, od čega 78.220,37 € u 2020. godini.



9.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Putna infrastruktura**

Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje – Štedim





- Realizacija projekta rekonstrukcije putnog pravca Rožaje - Štedim realizuje se fazno.
- Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 7,2 km, a preostalo je izvođenje asfaltnih radova na kompletnoj dionici, čime će projekat biti završen.
- Projekat obuhvata rekonstrukciju kompletne dionice puta, kao i izgradnju saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije sa regulisanom odvodnjom i izgradnjom potpornih konstrukcija.
- Ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.
- Ugovor sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.

II faza

- Druga faza obuhvata radove u dužini od 2,2 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-3885/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.07.2016. godine, na iznos od 405.622,10 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-4140/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.08.2016.godine, na iznos od 6.000,00 €.
- Svi ugovoreni radova II faze su završeni.
- Na realizaciji projekta za II fazu je utrošeno 399.265,21 €.

III faza

- Treća faza obuhvata radove u dužini od 1,4 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 585.629,58 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1588/1-1948/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 5.180,00 €.
- Svi ugovoreni radova III faze su završeni.
- Na realizaciji projekta je utrošeno 585.629,27 €, od čega 13.500,00 € u 2020. godini.


IV faza

- Četvrta faza obuhvata radove u dužini od 1,6 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3089/1 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 870.491,22 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3277/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Svi ugovoreni radova IV faze su završeni.
- Na realizaciji projekta za IV fazu je utrošeno 870.490,00 €, od čega 10.000,00 € u 2020. godini.

V faza

- Peta faza obuhvata dužinu puta od 1 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 14.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4381/1 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 20.06.2019. godine, na iznos od 1.090.903,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 31.05.2019. godine. Ugovor br. 01-5373/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.07.2019. godine, na iznos od 12.600,00 €.
- Svi ugovoreni radova V faze su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.090.900,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 12.600,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.103.000,00 €, od čega 80.000,00 € u 2020. godini.

Završni radovi, I faza

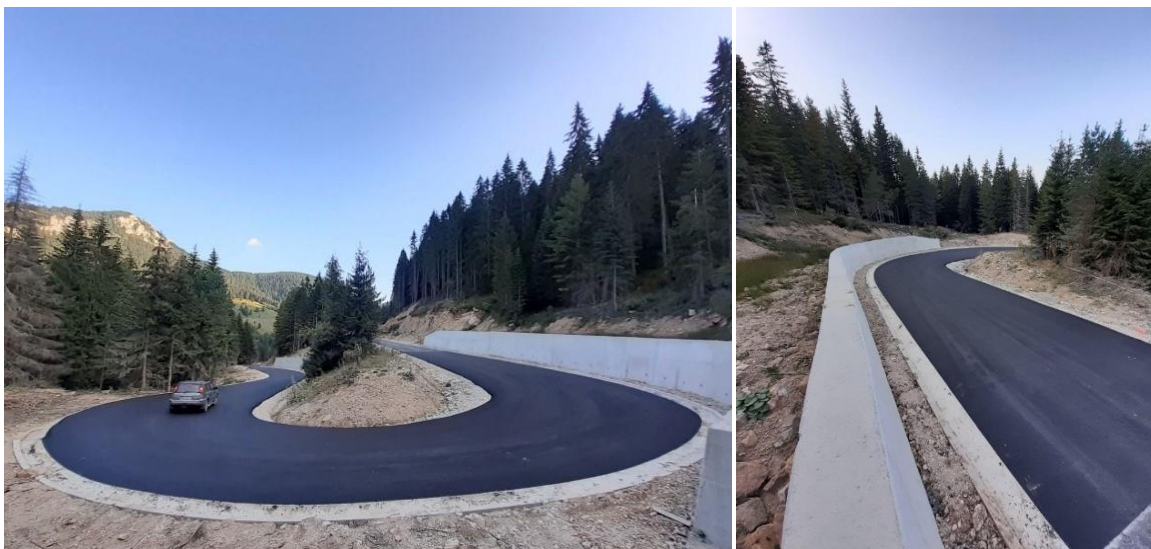

- Ova faza radova obuhvata izgradnju mosta u selu Kaluđerski laz i asfaltnerske radove u dužini od 2 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 19.06.2020. godine. Ugovor br. 04-19/20 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 27.08.2020. godine, na iznos od 697.073,33 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 29.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-7499/1 sa stručnim nadzorom, „Sedam-ing“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.09.2020. godine, na iznos od 2.420,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni, osim završnih radova na mostu.
- U toku su aktivnosti na primopredaji radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 694.162,38 € za kapitalne izdatke, odnosno 2.400,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 696.582,38 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

- **Žičara**



- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim“. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon“ d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00 €.

- Radovi na izgradnji žičare su u toku.
 - Do sada je završeno postavljanje šest stubova i montaža polazne stanice. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radova su privremeno obustavljeni i konzervirano je gradilište u decembru 2020. godine.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 32.670,00 € za tekuće izdatke, odnosno 2.238.500,00 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 2.271.170,00 €, od čega 1.671.170,00 € u 2020. godini.
- Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"**
- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti.
 - Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
 - U toku su aktivnosti na izradi idejnog rješenja.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
 - Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva održivog razvoja i turizma.



Elektroenergetska infrastruktura

- U toku je priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za napajanje ski centra "Hajla", koja će se realizovati po principu "projektuj i izgradi". U prethodnom periodu komisija za pripremu tenderske dokumentacije je u saradnji sa Opštinom Rožaje, kao i predstavnicima CEDIS-a, održala više radnih sastanaka, koji su za cilj imali izradu projektnog zadatka, definisanje tehničkih uslova, tehničkih specifikacija.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

9.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

- Realizacija projekta Ski centra na lokalitetu "Savin kuk" na Žabljaku planirana je fazno.
- Radi se o višegodišnjem projekatu. Sredstva planirana Zakonom o budžetom za 2020. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije, izgradnju cjevovoda od Modrog jezera do Savinog kuka, pravljenje akumulacije za vještačko osniježavanje na skijalištu i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra.
- **Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ski staze dužine cca 1,5 km**
 - Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi".
 - U oktobru 2017. godine završena je izrada glavnog projekta.
 - Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnih ministarstava, a u svjetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- **Izgradnja žičare i 4 km staza**



- Planirana je izgradnja šestosjedne žičare i 4km ski staza, na lokaciji „Savin kuk” u opštini Žabljak. Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4587/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.07.2018. godine, na iznos od 8.788.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-3360/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2019. godine, na iznos od 12.750,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1817/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 54.208,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i nabavka opreme.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 36.481,98 € za tekuće izdatke, odnosno 5.914.873,25 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 5.951.355,23 €, od čega 240.487,98 € u 2020. godini.

- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-115 od 20.06.2019. godine, Uprava javnih radova obaviještena da se do donošenja finalnih preporuka UNESCO-a obustavlja izgradnja šestosjedne žičare i 4 km ski staza na lokalitetu „Savin kuk“ u opštini Žabljak.
- Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 06.11.2020. godine, donešen je Zaključak o predlogu raskida ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Uprave javnih radova, kao naručioca i izvođača za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare i 4 km ski staza, na lokaciji „Savin kuk“ u opštini Žabljak sa predlogom da se nabavljene instalacije žičare za potrebe skijališta „Savin kuk“ iskoriste za spajanje ski centara u izgradnji „Žarski“ i „Cmiljača“, a u skladu sa zaključcima UNESCO misije, kojom su obustavljene sve dalje aktivnosti na realizaciji projekata za potrebe ovog ski centra. Istim Zaključkom zadužuje se Uprava javnih radova da pokrene proceduru sporazumnog raskida ugovora.
- Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 27.11.2020. godine, Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Uprave javnih radova, kao naručioca i izvođača, i ovlastila direktora Uprave javnih radova da potpiše predmetni sporazum. Nakon zaključivanja sporazuma, nabavljena oprema je od strane izvođača, posredstvom Uprave javnih radova, zapisnički predate “Skijalištima Crne Gore” d.o.o. Mojkovac na skladištenje i čuvanje.
- **Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice Usjek-Motički gaj, dužine cca 5km**
 - U 2018. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je predata opštini u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radovi na rekonstrukciji puta su ugovoreni i sa istima će se otpočeti kada se za to stvore uslovi.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8292/1 sa izvođačem, „Crnagoraput“ a.d. Podgorica, je zaključen 28.10.2019. godine, na iznos od 1.799.297,81 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8106/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 34.485,00 €.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Žabljak.
- **Stabilizacija kosina na saobraćajnici prema Savinom kuku, Žabljak**
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 28.08.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3430 sa izvođačem, „ARTEK“ a.d. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 94.886,38 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8373/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 4.235,00 €.
 - Zbog usaglašavanja projektne dokumentacije, što je bila obaveza Opštine Žabljak, radovi su započeli krajem 2020. godine i ubrzo obustavljeni usljed nepovoljnih vremenskih prilika. Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Suvog boba**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1309/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2017. godine, na iznos od 19.200,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-933/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.07.2017. godine, na iznos od 2.915,00 €.
- Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije su obustavljene.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnih ministarstava, a u svjetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Elektroenergetska infrastruktura**

- U 2020. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće elektroenergetske infrastrukture za ski centar, za koji je potrebno kompletirati projektni zadatak.
- Nakon završetka projektne dokumentacije planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svjetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

- **Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu**

- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302 m².

- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51 €.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine. Sa radovima II faze će se otpočeti nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 275.165,76 € za tekuće izdatke, odnosno 943.937,15 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.219.102,91 €, od čega 977.663,81 € u 2020. godini.





- **Pristupni put Bistrica- Manastir Podvrh**



- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km.

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Radovi na ovom projektu se izvode u fazi zemljanih radova, potpornih konstrukcija, polaganja elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.10.2019. godine. Ugovor br. 01-7895/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2019. godine, na iznos od 4.961,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8156/1 sa revidentom glavnog projekta, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 2.964,50 €.

II faza – signalizacija

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 08.08.2019. godine. Ugovor br. 01-5921/1 sa obrađivačem projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. je zaključen 08.08.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7112/1 sa izvođačem, „Alfaprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.09.2019. godine, na iznos od 238.250,70 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6470/1 sa stručnim nadzorom, „Ing impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 4.890,00 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.890,00 € za tekuće izdatke, odnosno 238.250,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 243.500,00 €, od čega 225.000,00 € u 2020. godini.


II faza – radovi

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4210/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2017. godine, na iznos od 2.579.858,13 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 24.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1932/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 16.654,05 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača dodatnih radova je raspisano 21.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8028/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 379.997,75 €.
- Svi ugovoreni radova II faze su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.531.370,78 € za kapitalne izdatke, odnosno 13.645,05 € tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.545.015,83 €, od čega 246.083,57 € u 2020. godini.

Sanacija klizišta i kosina

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2243/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 665.153,69 €.

- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2226/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 4.961,00 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 340.911,57 € za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.
- **Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice**

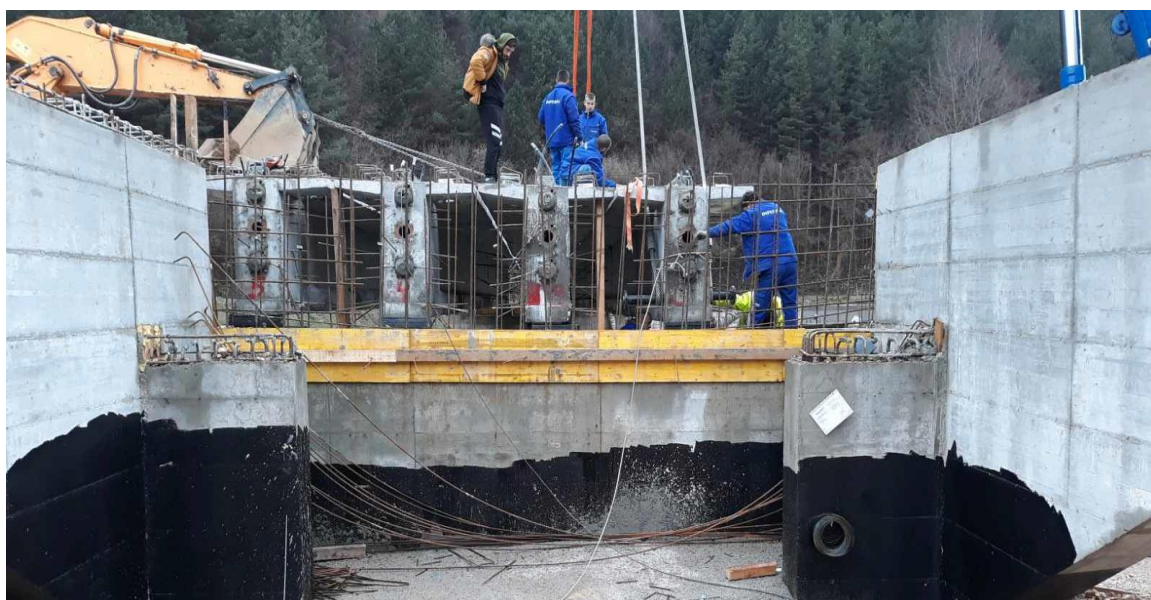

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik je Opština Bijelo Polje.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00 €.
 - Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00 €.
 - Izvođač radova je uveden u posao, ali se radovi odvijaju usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji uslovljavaju da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 63.986,00 € za tekuće izdatke, odnosno 527.060,92 za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 591.046,92 €, od čega 527.060,92 € u 2020. godini.
 - Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na dijelu trase, a koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, kao i nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem odnosno oodvodom površinskih voda i obezbjeđenim prilazima objektima i imanjima.
- **Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad "Vražjim firovima"**
- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu”d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00 €.
 - Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
 - U toku je pribavljanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje.
 - Obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma je da u saradnji Opštinom Bijelom Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.



- **Elektroenergetska infrastruktura**

- Za potrebe elektro napajanja kompleksa "Đalovića pećine" ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica“ do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh".

Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS "Nedakuse" 35/10 kV

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.06.2018. godine. Ugovor br. 01-3178/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 29.760,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4800 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950,00 €.
- Dobijena je saglasnost na projekat i saglasnost za priključenja na elektroenergetsku mrežu od strane CEDIS-a. U narednom periodu se očekuje uvođenje izvođača u posao.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.700,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV

- Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su + P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00 €.
- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.021,35 € za tekuće izdatke, odnosno 1.147.225,50 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.147.225,66 €, od čega 1.060.750,47 € u 2020. godini.
- U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za preostale radove čija je realizacija uslov za izvršenje tehničkog prijema na objektu.



Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

- Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00 €.
- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.843,20 € za tekuće izdatke, odnosno 524.934,53 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 541.777,73 €, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave javnih radova. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00 €.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku su aktivnosti na izradi tehničkog prijema radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.000,00 € za tekuće izdatke, odnosno 311.607,47€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 314.607,47 €, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Žičara**
- Planirana je izgradnja i opremanje žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu "projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00 €.

- Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije.
- Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme žičare.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 79.012,50 € za tekuće izdatke, odnosno 3.329.799,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.408.811,50 €, od čega 407.377,19 € u 2020. godini.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.



• **Vodosnabdijevanje**

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbijediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018., na iznos od 34.848,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00 €.

- U toku je usaglašavanje rješenja snabdijevanja vodom objekata na polaznoj stanici žičare između projektanta i Opštine Bijelo Polje.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.454,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare.
- **Izgradnja objekta vizitiring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom**



- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75 m².
- U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Permonte“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00 €.
 - Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, započeti su radovi na izgradnji objekta.
 - Izvođeni su zemljani, betonski i zidarski radovi. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova (snijeg i mraz), radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem decembra 2020. godine.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.961,00 € za tekuće izdatke, odnosno 114.197,42 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 119.158,42 €, od čega 116.617,42 € u 2020. godini.
- **Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00 €.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem, „Inženjering put“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o., Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00 €.
 - Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
 - Izvođač nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice iz razloga što je usljed velikih padavina nivo rijeke narastao i time je odložen početak izvođenja radova.
- **Rekonstrukcija lokalnog puta Bistrica-Mojstir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima**
 - Veza mosta sa lokalnim putem Bistrica-Mojstir planirana je izgradnjom pristupne saobraćajnice mostu na katastarskoj parceli br. 461/1 KO Bistrica, u dužini od oko 170 m

dok je veza sa putem Bistrica-Manastir Podvrh planirana izgradnjom saobraćajnice preko katastarske parcele br. 1/5/2, KO Kostenica, ukupne dužine oko 80 m.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-521 sa obrađivačem glavnog projekta, „Optimus projekt” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 15.888,51 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 14.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2715/1 sa revidentom glavnog projekta, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 4.410,45 €.
- Završena izrada i revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.298,96 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.

9.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu



- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Kaskade su definisane modulom za dvosmjerno parkiranje automobila na svakoj etaži. Ukupna površina objekta je cca 48.000 m², a površina I faze koja je predmet ugovora je cca 20.000 m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00 €.
- Tokom izrade glavnog projekta došlo je do izmjene idejnog rješenja na inicijativu projektanta, a u cilju boljeg funkcionalnog rješenja objekta. Pribavljena je saglasnost od strane Skijališta Crne Gore, kao krajnjeg korisnika, i revidenta, i zatim je izmijenjeno idejno rješenje upućeno investitoru na razmatranje, saglasnost i dalju procedure pribavljanja mišljenja od strane glavnog gradskog arhitekta. Nakon pribavljanja neophodnih saglasnosti, nastaviće se sa izradom glavnog projekta.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta iskopa temeljne jame I faze, izvršena je prijava građenja i otpočelo se sa izvođenjem navedenih radova. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano sredinom decembra 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 997.900,00 € za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

9.8. Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izrada replike prve štamparije na Balkanu - štamparije Crnojevića, izgradnja komunalne infrastrukture područja Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama, Info centra u Mojkovcu, Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", rekonstrukcija tvrđava i postavljanje spomen obilježja "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru, uređenje spomen parka "Knjaževac" u Andrijevići, Planinarski dom na lokalitetu "Štavna" Andrijevića, valorizacija kanjona "Nevidio". Projekti se realizuju u skladu sa prioritetima koje je utvrđivalo Ministarstvo održivog razvoja turizma.
- **Izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru**
 - Projektom je predviđena detaljna rekonstrukcija kompletne unutrašnjosti palate, koja će obuhvatiti zamjenu svih drvenih elemenata od poda do plafona, uključujući ugradnju novog stepeništa od hrastovine, postavljanje kamenih ploča prilagođenih postojećoj arhitekturi i radove na termo-tehničkim instalacijama.
 - Objekat će sadržati namjenske staklene vitrine za čuvanje eksponata, moderan alarmni sistem, a predviđeno je i opremanje inventarom neophodnim za rad kustosa. Spratnost: P+1, površina objekta je 135 m².
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedilo Ministarstvo kulture.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1567 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 06.03.2020. godine, na iznos od 91.499,99 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5588/1 sa stručnim nadzorom, „Enforma” d.o.o. Kotor, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 4.500,00 €.
- U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije koje sprovodi Ministarstvo kulture.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utoška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na to da pregledom tehničke dokumentacije i ugovorenog predmjera radova izvođač radova i nadzorni organ konstatovali su da postoje određeni nedostaci i neusaglašenosti zbog kojih nije moguće izvoditi radove.



• **Venecijansko bijenale**

- Uprava javnih radova vrši prenos sredstava za potrebe finansiranja projekata "Venecijansko bijenale", a na osnovu ovjerene dokumentacije koju je dostavljalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Odlukom Vlade Crne Gore, br. 07-183 od 23.01.2020. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 98.500,00 €, od čega je realizovano 22.499,80 € u 2020. godini.


• **Centar za prihvatilište životinja sa CITES liste u Beranama**

- Opština Berane je preuzela aktivnosti na realizaciji Idejnog rješenja i Glavnog projekta Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama.
- Opština Berane je obavijestila Upravu javnih radova da je raskinula ugovor sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta iz razloga što obrađivač projektne dokumentacije nije izvršavao ugovorene obaveze u ugovorenom roku, te da će u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovesti proceduru konkursa i odabrati najbolje idejno arhitektonsko rješenje.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.

• **Postavljanje spomen obilježja "Lesendro"**

- Kulturno dobro tvrđava Lesendro se nalazi na katastarskoj parceli br. 436, KO Vranjna.
- Površina koju zahvata zona nepokretnog kulturnog dobra iznosi 2481,35 m². Predložena zaštićena okolina kulturnog dobra obuhvata u cjelosti katastarsku parcelu 436, ukupne površine 2481,35 m². Cjelokupna zona zahvata iznosi 6774,64 m². Pripremni radovi obuhvataju poslove tehničke prirode koji treba da omoguće nesmetani rad angažovanim radnicima na realizaciji postavljanju spomen-obilježja Braniocima Lesendra 1843.

- Pripremni radovi podrazumijevaju:
 - obezbjeđivanje opreme za čišćenje zidova od zelenila i rastinja, vodom - mlazom pod pritiskom,
 - nabavku i pozicioniranje materijala i alata za izvođenje radova.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo Ministarstvo kulture.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 22.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-5589/1 sa izvođačem, "Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 7.985,56 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.08.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8398/1 sa konzervatorskim nadzornim organom „Restarting“ d.o.o. Budva, je zaključen 13.10.2020. godine, na iznos od 2.178,00 €.
- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.178,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

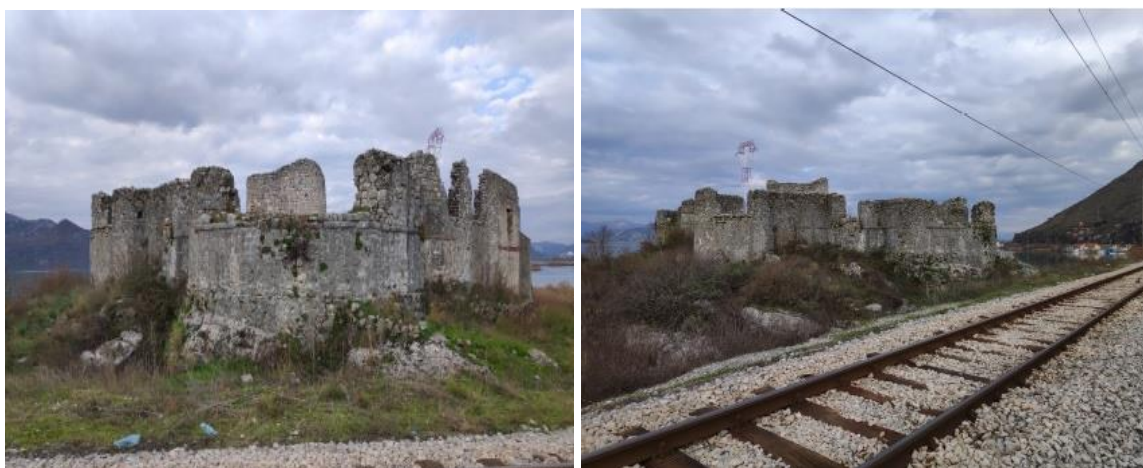

- **Uređenje spomen parka „Knjaževac“**
- Opština Andrijevica je za potrebe uređenja spomen parka „Knjaževac“ izradila projektnu dokumentaciju za koju je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- Radovi na sanaciji parka obuhvataju adaptaciju trotoara u parku Knjaževac, platoa ispred crkve u parku, ograde oko parka, dječijeg igrališta i ugradnju mobilijara (igrališta, klupa i kanti za otpad).
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1048/1 sa izvođačem, „Hiperling“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.02.2020. godine, na iznos od 343.647,26 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je sprovedeno po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-3314/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 10.285,00 €.
- Izvođač radova je uveden u posao u junu 2020. godine, ali su radovi bili privremeno obustavljeni usljed ometanja od strane građana.
- Izvođač radova je ponovo uveden u posao nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Opštine Andrijevica, u novembru 2020. godine i izvođeni su do sredine decembra kada je gradilište konzervirano, usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

- Do sada su završeni radovi na betoniranju platoa i trotoara u parku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 61.542,42 € kapitalnih izdataka, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Izrada projektne dokumentacije za uređenje lokacija-objekata na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“ u opštini Žabljak**
- Realizaciju projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je naručilo izradu projektne dokumentacije i istu dostavilo Upravi javnih radova u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za izvođenje radova. Kako dostavljena dokumentacija nije bila revidovana, sproveden je postupak za izbor revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-810/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 3.360 €.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.
- Zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa COVID-19, projekat je isključen iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

9.9. Objekat Kuća voća u Andrijevici

- Objekat „Kuća voća“ u Andrijevici nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevica, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevici, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojće se od proizvodnog

pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffè bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine. Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37 €.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00 €.
- Završeni su zemljani radovi, radovi na izradi betonske konstrukcije potpornih zidova objekta, proizvodnog pogona i bunkera, administrativno-edukativnog bloka, izložbeno-prodajnog prostora i pješačkog mosta, radovi na montaži čelične krovne konstrukcije, pokrivanju proizvodnog pogona sendvič panelima, radovi na zidanju pregradnih zidova, radovi na izradi izolacije, drenaže i zatrpavanju ukopanih zidova, radovi na izradi razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i radovi na grubom razvodu elektroinstalacija jake i slabe struje na Edukativnom objektu.
- Gradilište je trenutno konzervirano zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.491,00 € za tekuće izdatke, odnosno 534.209,87 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 568.700,87 €, od čega 43.770,92 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Takođe, dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Izmjena glavnog projekta je prouzrokovala pojavu značajnog broja naknadnih i nepredviđenih radova, za što je bilo neophodno sprovesti proceduru pregovaračkog postupka, u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava. Navedeno je prouzrokovalo i prolongiranje roka za izvođenje radova. Takođe, za viškove i naknadne radove koji su posljedica nedostataka, izmjena i propusta u projektnoj dokumentaciji, bilo je neophodno pokrenuti otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova.

Za potrebe izgradnje trafostanice koja nije obuhvaćena revidovanim glavnim projektom, urađena je projektna dokumentacija, ista je revidovana, ali građevinska dozvola nije izdata usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a što je bila obaveza Opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Nakon što se stvore uslovi biće pokrenut otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji trafostanice.



9.10. Objekat nacionalne Kuće maslina u Baru

- Lokacija objekta nacionalne "Kuće maslina" sa proizvodno-edukativnom namjenom nalazi se u Starom Baru, na kat. parceli br. 1075/2. Objekat je spratnosti Su+P+1 (suteran, prizemlje i sprat), ukupne bruto građevinske površine 1087,92 m². Objekat sadrži sljedeće sadržaje: prostor za proizvodnju maslinovog ulja, prostor za degustaciju i prodaju proizvoda i prostor za edukaciju i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 18.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-93/1 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 6.961,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3733/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2018. godine, na iznos od 2.750,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena 2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 05.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7456/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 994.134,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-7773/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 49.600,00 €.
- U toku su završni radovi na izgradnji objekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 33.335,35 € za tekuće izdatke, odnosno 931.773,06 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 965.108,41 €, od čega 926.077,03 € u 2020. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova usljed novonastale situacije sa pojavom pandemije virusa COVID-19, kao i nedostacima u projektnoj dokumentaciji koji za posljedicu imaju pojavu nepredviđenih radova zbog čega je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.



9.11. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00 €.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
- U toku je izrada geomehaničkog elaborata.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 50.190,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 50.190,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.

9.12. Nacionalni parkovi

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2020. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izgradnja parkinga i saobraćajnice na lokaciji Kraljevo kolo, vodovodna mreža Ganovača, put za Hridsko jezero, Rekonstrukcija Vojne karaule u Plavu, izgradnja infrastrukture za mobilehome “Lovćen”, izgradnja saobraćajne, komunalne i elektro infrastrukture u nacionalnim parkovima, kao i ostali objekti i infrastruktura uključujući sanacione radove na Ulcinjskoj Solani. Projekti se realizuju u skladu sa prioritetima JP Nacionalni parkovi.

- **Parking na Kraljevom kolu**

- Na lokaciji Kraljevo kolo u Nacionalnom parku Biogradska gora, bruto površine 18.000 m², predviđena je izgradnja i uređenje parking prostora za vozila posjetilaca Biogradskog jezera, kao i prostora za smještaj dva turistička voza koji će saobraćati na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero.
- Ugovor br. 101-1560/1-7344/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Geotechnics, projects & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.11.2018. godine, na iznos 14.979,00 €.
- Ugovor br. 01-809/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos 4.350,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.329,80 € za tekuće izdatke, od čega kompletan iznos u 2020. godini.



- **Izgradnja parking prostora duž saobraćajnice od mosta kod hotela Durmitor do rampe na ulazu u Nacionalni park**

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.10.2017. godine. Ugovor br. 1010-1560/1-1649/1 sa izvođačem, "Flemer Stone - AG" d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.04.2018. godine, na iznos od 134.991,45 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2101/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.04.2018. godine, na iznos od 1.368,00 €.
- U 2018. godini radovi su obustavljeni zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu, kao i potrebe da se izvrši dopuna projektne dokumentacije za nedostajuću infrastrukturu. Obaveza Opštine Žabljak je da kompletira projektnu dokumentaciju.

- S obzirom na to da su građani zahtjevali obustavu radova, dalje aktivnosti na realizaciji projekta nijesu sprovedene.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izgradnja nedostajuća infrastruktura od hotela Durmitor do Crnog jezera**
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.03.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.03.2019. godine.
- Predmetni projekat je uslovljen realizacijom projekta izgradnje parking prostora duž saobraćajnice od mosta kod hotela Durmitor do rampe na ulazu u Nacionalni park. S obzirom na to da je navedeni projekat obustavljen, obustavljene su aktivnosti i na ovom projektu.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Revitalizacija Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, opština Pljevlja**



- U 2017. godini na tri raspisana javna nadmetanja za izvođenje radova za rekonstrukciju objekata Centra za rafting u postojećim gabaritima nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon četvrtog tendera potpisan je ugovor za izvođenje radova.
- Revidovani glavni projekat su obezbijedili JP Nacionalni parkovi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.6.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6248/1 sa izvođačem, „Adria-internacional” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 08.10.2018. godine, na iznos od 106.350,10 €.
- Ugovor br. 101-1560/1-7134/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 2.11.2018. godine, na iznos od 4.449,00 €.
- Radovi su završeni 2019. godine. Obaveza Nacionalnih parkova da završi tehnički prijem.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.449,00 € za tekuće izdatke, odnosno 95.585,47 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 100.034,47 €, od čega 11.606,57 € u 2020. godini.
- **Rekonstrukcija bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno-istraživačkog centra**
- Obaveza JP Nacionalni parkovi je da dostavi neophodnu dokumentaciju kako bi Uprava javnih radova preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

9.13. Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju

- U okviru uređenja Alipašinih izvora, a isti su prepoznati kao sekundarni turistički centar sa sadržajima za turističku valorizaciju, predviđene su sljedeće intervencije u prostoru: izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza po obodu vodenog kompleksa i uređenje pješačkog trga, rekonstrukcija pješačkih mostova preko vodotoka, izgradnja informativnog pulta, sprovođenje odgovarajuće rasvjete u vodenoj zoni i oko izvorišta, čišćenja i uređenja vodotoka, uređenje i formiranje nove zelene zone, opremanje prirodnog prostora potrebnim mobilijarom: klupe, informativne table, korpe za otpad i sl.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 12.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-2856/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „AE Studio” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.04.2019. godine, na iznos od 3.509,00 €.
- Izrađeno je idejno arhitektonsko rješenje.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.509,53 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2020. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je obaveza Opštine Plav bila da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma razmotri potrebu raspisivanju konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

9.14. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1450 i Kolašin 1600 i osnježavanje staza ski centra Kolašin 1600

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Projekat će se realizovati po principu "projektuj i izgradi".
- Obaveza Opštine Kolašin je da u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavi projektni zadatak na osnovu kojih će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.000,00 € za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2020. godini.

10. ZAKON O PRIJESTONICI

- Uprava javnih radova je sa Prijesticom Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

10.1. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 450.743,97 €.

10.2. Sanacija sportskih sala SRC Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 12.890,73 €.

10.3. Rekonstrukcija Ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje Gipos

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 541.409,77 €.

10.4. Rekonstrukcija Jabučke ulice i izgradnja II faze saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 85.070,63 €.

10.5. Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.6. Prihvatište za napuštene kućne ljubimce (azil)

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 48.273,01 €.

10.7. Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 1.808.789,73 €.

10.8. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 258.980,00 €.

10.9. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 174.035,05 €.

10.10. Kupovina zemljišta za potrebe proširenja Novog groblja

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.11. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.12. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 105.480,48 €.

10.13. Kupovina lokacije za Lokandu

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

10.14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2020. godini utrošeno je 133.327,20 €.

10.15. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju

- U 2020. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i unapređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
 - U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
 - U 2018., 2019. i 2020. godini za finansiranje projekta bila su obezbijeđena sredstva iz Zakona o budžetu.
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50 €.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.

- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- **Kanalizaciona mreža**
 - Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
 - Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
 - U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).



- **Unapređenje sistema vodosnabdijevanja**
 - Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, 4 objekta na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2017. godine, sa izvođačem radova “PNP Perošević” d.o.o. Berane, na iznos od 880.927,04 €, dok je ugovor za vršenje stručnog nadzora zaključen sa “Beohidro” Beograd, čiji iznos zajedno sa aneksima iznosi 78.750,00 €.
 - Radovi su završeni i u decembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.

11.2. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju

- Realizacija projekta je obuhvatila izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju. Projekat se realizovao u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju – Žuta knjiga.
- Projekat se finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.

- Ugovor sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj”, d.o.o. Slovenija, je zaključen 20.12.2016. godine, na iznos od 1.562.735,50 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 1.643.444,85 €.
- Ugovor sa revidentom glavnog projekta i stručnim nadzorom, „Garnets Consulting” a.s., je zaključen 08.09.2016. godine, na iznos od 165.000,00 €.
- U 2017. godini, nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije i pribavljena građevinska dozvola, izvođač je uveden u posao. Prilikom početka radova pojavio se problem dodatne količine otpada i nelegalno odloženih automobilskih guma. Nakon rješavanja navedenog problema od strane Prijestonice Cetinje, radovi su otpočeli. U 2018. godini svi radovi su završeni.
- Upotrebna dozvola je izdata od strane Prijestonice Cetinje 31.07.2020. godine.
- Potvrda o dobrom izvršenju posla je izdata od strane stručnog nadzora 19.08.2020. godine i poslata je kranjem korisniku MORiT-u, o čemu je obaviještena i DEU.



11.3. Sanacija odlagališta “Ćafe” u Baru

- Projekat se realizovao po principu „projektuj i izgradi” kroz dva ugovora: Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.” iz Grčke i Ugovor o reviziji Glavnog projekta i nadzoru nad izvođenjem radova sa firmom „INGOB” iz Austrije. Ukupna ugovorena vrijednost za realizaciju ovog projekta iznosila je 3.817.896 €.
- Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.” iz Grčke je raskinut 07.11.2018. godine.
- Nakon raskida ugovora, Uprava javnih radova je, u skladu sa FIDIC procedurama, uputila firmi „Mesogeos” prijedlog za „amicable settlement” sa procjenom potraživanja po više osnova. Tim povodom, predstavnici firme „Mesogeos” su se obavezali da urade novo tehničko rješenje i dostave finansijsku ponudu za završetak radova.
- Ukoliko ponuda firme „Mesogeos” oko nastavka radova ne bude prihvaćena, Uprava javnih radova će zatražiti od „Tijela za rješavanje sporova” (DAB), što je u ovom slučaju ugovorna obaveza Konzorcijuma „INGOB-C&E” iz Austrije koji je vršio reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova, da donese odluku o zahtjevu Uprave javnih radova za naknadu štete.
- Takođe, u skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-309 od 17.01.2019. godine, u 2019. godini je pripremljen Projektni zadatak za raspisivanje javnog nadmetanja po principu „projektuj i

izgradi“ i isti je potpisan od strane Opštine Bar u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

- Zahtjevi za aktiviranje avansne garancije i garancije za dobro izvršenje ugovora, nakon potpisivanja od strane EU Delegacije, poslali su osiguravajućem društvu „Siguria“ sa Kosova, koje je izdalo garancije. Kako je „Siguria“ odbila da plati zahtijevana potraživanja, Uprava javnih radova je ugovornu i ostalu dokumentaciju u vezi sa garancijom, prosljedila Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore u cilju pokretanja sudskog spora radi prinudne naplate, u smislu čl. 53 Zakona o državnoj imovinu.



11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici “Kos – Trebešica”



- Projekat se finansira iz sredstava IPA II-Nacionalni program 2014. i nacionalnog budžeta.
- Projektom je predviđena rekonstrukcija pruge od stanica Kos do stanica Trebešica u dužini cca 6,75 km. Rekonstrukcija obuhvata zamjenu zastorne prizme, drvenih pragova, šina i kontaktne mreže. Na ovoj sekciji postoji 7 mostova ukupne dužine 476 m i 12 tunela ukupne dužine 4.372 m.
- Nakon završenih procedura javnih nabavki u decembru 2018. godine potpisani su ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom nad izvođenjem radova. Ugovor sa izvođačem radova,

„Štabag“ Austrija, zaključen je na iznos od 5.379.205,22 €, dok je sa stručnim nadzorom, „Institut za građevinarstvo“ d.o.o. Podgorica, zaključen na iznos od 237.295,00 €.

- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.

11.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne-vučne podstanice “Trebešica”

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica“. Projekat je finansiran 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj“, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Ugovor br. 19/2-01-6074/1 sa izvođačem, „Simens“ d.o.o. Beograd, je zaključen 03.12.2015. godine, na iznos od 3.408.897,93 €.
- Ugovor br. 19/2-01-1679/1 sa stručnim nadzorom, „Eminent“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.04.2016. godine, na iznos od 145.000,00 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 72.499,00 €.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine. Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme su završeni, čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U skladu sa FIDIC procedurama krajem 2018. godine izdat je „taking-over“ sertifikat. Nakon što je korisnik ŽICG sproveo proceduru nabavke i ugradnje elektro-ormara nastavljena je procedura tehničkog prijema i objekat predat na korišćenje.
- U 2020. godini pribavljena je upotrebna dozvola.

11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Procijenjena vrijednost radova iznosi 6.812.010,00 €.
- Procijenjena vrijednost vršenja usluge stručnog nadzora iznosi 350.000,00 €.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra. Obaveza Korisnika (Ministarstvo zdravlja) bila je da uskladi glavni projekat sa trenutnim zakonom, jer je glavni projekat urađen u skladu sa prethodnim.
- Nakon ispunjenja gore navedih obaveza pristupilo se pripremi tenderske dokumentacije.
- Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa CFCU vodilo proces ugovaranja eksperta za pripremu tenderske dokumentacije.
- Tenderska dokumentacija je u fazi usaglašavanja od strane Ministarstva zdravlja.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane EU Delegacije, pristupiće se raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Uprava javnih radova je preuzela inicijativu i pripremila najavu za tendersku proceduru za vršenje stručnog nadzora. Nakon odobrenja iste od strane DEU, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena Delegaciji Evropske Unije na ex-ante kontrolu.

11.7. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

Ovaj projekat obuhvata izradu glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Uprava javnih radova ima ulogu implementacione agencije za aktivnost koja predviđa jedan infrastrukturni projekat, i koja se tiče uključivanja marginalizovanih grupa u obrazovni sistem. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

1. Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 sa obrađivačem glavnog projekta i stručnim nadzorom, „Entasis” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00 €.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi javnih radova.

2. Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za građevinarstvo” a.d. Podgorica, je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00 €.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

3. Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera

- Ministarstvo je dostavilo nacrt tenderske dokumentacije UJR nakon revizije glavnog projekta. Po dobijanju saglasnosti od DEU na tendersku dokumentaciju, UJR će sprovesti tendersku proceduru.

11.8. Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S”, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.324.000,00 €.

11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na upravljanje otpadom iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Cilj ovog projekta je da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva održivog razvoja i turizma i ostalih korisnika za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.354.000,00 €.
- Prva tenderska procedura je poništena početkom 2020. godine, čime je projekat pri ponovnom raspisivanju već bio pod visokim rizikom ugovaranja. Nakon ponovnog raspisivanja, tenderska dokumentacija je poslata odabranim ponuđačima 18.09.2020. godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 10.11.2020. godine. Delegacija Evropske Unije je odbila izvještaj rada komisije dostavljen 11.12.2020. godine uz obrazloženje da kako je rok ugovaranja projekta 21.12.2020. godine, nije bilo vremena izvršiti kontrolu izvještaja obzirom i da je nakon odobravanja izvještaja do potpisivanja ugovora morao da istekne period žalbe u trajanju od 7-10 dana. U toku je procedura poništenja tendera.

11.10. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede. Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Vrijednost ugovora je 2.399.500,00 €. Aneks ugovora je potpisan 16.06.2020. godine.
- Aneks ugovora se odnosi na:
 - povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2 .
 - reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Sprovođenje aktivnosti se izvodi relativno u rokovima, s obzirom na novonastalu situaciju sa pandemijom virusa COVID-19 koja je uticala na neznatne izmjene pojedinih planiranih aktivnosti. Međutim, prema planiranoj dinamici nema predviđenog kašnjenja u realizaciji rezultata koji su definisani ovim projektom. Praćenje realizacije ovog ugovora vrši i Upravni odbor, s tim u vezi do sada su organizovana tri sastanka na kojima su usvojeni: Početni izvještaj, 1 šestomjesečni izvještaj i Aneks ugovora br. 1.
- Jedan od rezultata ovog projekta je bila i priprema tenderske dokumentacije za nabavku opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama, a detaljne informacije o ovom ugovoru se nalaze pod tačkom br. 11.13.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 479.900,00 €.

11.11. Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.12. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na oblast zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Svrha ovog ugovora je da podrži proces transpozicije i razvija institucionalni kapacitet za strateško planiranje, sprovođenje pravnih regulativa u oblasti životne sredine, u skladu sa akcionim planom o životnoj sredini i klimatskim akcijama 2018. - 2020. godina.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 3.671.412,00 €.
- U toku je procedura poništenja tenderske procedure obzirom da je EU Delegacija dva puta poništila Evaluacioni izvještaj zbog nepravilnosti u radu glasajućih članova Evaluacione komisije pri čemu je u međuvremenu istekla i validnost ponuda ponuđača.

11.13. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede. Opšti cilj projekta je nabavka opreme kojom se obezbjeđuje podrška Crnoj Gori u cilju efikasnog sprovođenja i monitoringa politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine.
- Inicijalna procijenjena vrijednost ugovora iznosila je 1.085.000,00 €, međutim, nakon Odluke Vlade Crne Gore o preusmjeravanju sredstava za borbu protiv virusa COVID-19 iz predmeta nabavke izuzeta je nabavka broda sa opremom, tako da je planirani budžet za nabavku opreme 650.000,00 €.
- Inicijalno je raspisano javno nadmetanje za 15 partija od kojih su tokom tenderskog procesa poništene 4 partije usljed slabog kvaliteta tehničkih specifikacija za čiju izradu su bili zaduženi korisnici zajedno sa konsultantom (Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede).
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat evaluacije potpisana su dva ugovora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10414 za LOT3 sa ponuđačem „MEGRA” d.o.o. Beograd, je zaključen 21.10.2020. godine, na iznos od 53.845,00 €.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10416 za LOT6 sa ponuđačem „UNI-CHEM” d.o.o. Beograd, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 19.740,00 €.

11.14. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 400.000,00 €.
- Poziv za najavu tendera je objavljen 23.03.2020. godine, a projekat čine dvije partije, i to: Partija 1 - Kontejneri za komunalni otpad i Partija 2 –V ertikalna mašina za presovanje balirke.
- U okviru projekta potpisani su Ugovori za obje partije 21.12.2020. godine u vrijednosti 430.367,85.

11.15. Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke

- Predmet tendera je snabdijevanje, isporuka, istovar, instalacije, raspakivanja, montaže i ugradnje IT opreme i softvera za sva tri Lot-a paketa, kao i testiranje IT opreme i softvera uz pružanje tehničke podrške i obuke krajnjim primaocima u Crnoj Gori.
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisani su ugovori za sve raspisane partije.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10751 za LOT1 „IT oprema i uređaji za horizontalnu podršku za praćenje životne sredine: Kontrola pristupa serverima-mrežnom zaštitnom zidu“ sa ponuđačem „SAGA CG“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 123.217,98 €.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10753 za LOT2 „Nabavka uređaja za radnu stanicu: Računar i monitor“ sa ponuđačem „InfoCore“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 31.914,00 €.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/-01-908/20-10752 za LOT3 „Nabavka IT hardverske opreme i softvera za mdelovanje kvaliteta vazduha“ sa ponuđačem „Čikom“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 62.100,00 €.

11.16. Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu

- Predmet tendera je snabdijevanje, isporuka, istovar, ugradnja, naručivanje, od strane izvođača opreme u 5 (pet) Lot-ova za institucije Civilne zaštite u Crnoj Gori DDP.
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisani su ugovori za 3 od 5 raspisanih partija.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10659 za LOT1 „Nabavka 4 x 4 vozila“ sa ponuđačem „Alliance“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 104.940,00 €.

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10660 za LOT2 „Nabavka kombija“ sa ponuđačem „Alliance“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 42.920,00 €.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10661 za LOT4 „Nabavka drona“ sa ponuđačem „Damiba“ d.o.o. Beograd, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 5.790,00 €.
- Za Lot 3 “Nabavku opreme za spašavanje od zemljotresa” i i Lot5 “Nabavku detektora za pronalaženje preživjelih ispod ruševina” prijavljene kompanije nijesu ispunile eliminacione kriterijume.

11.17. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 750.824,00 €.
- U okviru ovog projekta, potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13 €, od čega EU Delegacija preko Uprave javnih radova vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51 €.

11.18. Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju

- Imajući u vidu kompleksnost projekta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva usaglašava model realizacije sa Delegacijom Evropske Unije (DEU). U skladu sa preporukama konsultanata, korisnika kao i DEU, predloženo je da se projekat realizuje kroz dvije tenderske procedure, pri čemu je prva tenderska procedura ugovor o nabavci opreme – informacioni sistem za praćenje saobraćaja plovila (WTMIS II faza) koji će biti podijeljen na dvije partije, dok se druga tenderska procedura odnosi na uslugu, tj. nabavku određene opreme za „Uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u Crnoj Gori“ koja će biti kombinovana kroz servis i nabavku.
- Imajući u vidu kompleksnost tenderske procedure neophodno je dobiti odobrenje od DEU za korišćenje kombinovanog ugovora. Zahtjev za odobrenje iste poslat je DEU 23.12.2020. godine. U skladu sa dogovorom sa DEU, 28.12.2020 godine objavljene su dvije najave i to najave tendera za nabavku opreme i najave za tender za usluge.
- Procijenjena vrijednost projekta: 2,600,000,00 €.

11.19. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.200.000,00 €.
- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za nabavku opreme. Kako nije bilo uspješnih ponuđača, tender je poništen. Objavljena je Najava tendera i ponovo pokrenuta tenderska procedura koja je u toku. Pripremljene su tehničke specifikacije i istraživanja tržišta od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva i krajnjeg korisnika - Uprave za pomorsku sigurnost.

11.20. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor je potpisan 20.11.2019. godine. Vrijednost ugovora iznosi 3.659.900,00 €, a rok realizacije projekta je 48 mjeseci, odnosno do novembra 2023. godine.
- Projekat se realizuje planiranom dinamikom.
- U toku je implementacija ugovora sa konsultantom.

11.21. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 2.507.647,00 €.
- Tenderska dokumentacija odabranim ponuđačima je poslata u novembru 2020. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 01.02.2021. godine.

11.22. Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina

- Ugovor br. IPAIII/2012-2013/VIR-SUT WKS/19/2-01-7116/1 sa izvođačem, „STRABAG” AG Austija, je zaključen 23.12.2016. godine, na iznos od 4.083.891,36 €. Anex ugovora je potpisan 13.10.2017. godine. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 4.190.245,73 €.
- Ugovor br. IPAIII/2012-2013/VIR-SUT SER/19/2-01-7/7076/2 sa stručnim nadzorom, „Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.12.2016. godine, na iznos od 134.000,00 €. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 138.281,18 €.
- Svi ugovoreni radovi na projektu su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.

11.23. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

- Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijedeno je 215.000,00 €.
- Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:
 - **Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
 - Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 sa obrađivačem glavnog projekta i stručnim nadzorom, „URBI.PRO” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €. Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
 - Glavni projekat i Početni izvještaj su dostavljeni 21.12.2020.godine.
 - **Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
 - Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 10.000,00 €.
 - U 2019. godini tenderska dokumentacija je pripremljena i odobrena od strane EU Delegacije. Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije je objavljeno 31.12.2020.godine
 - **Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**
 - Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.165.000,00 €.
 - Ugovarač za izradu glavnog projekta je po projektnom zadatku dužan da izradi tendersku dokumentaciju za radove, nakon čega će se raspisati javno nadmetanja za izbor izvođača radova.

11.24. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa će biti raspisan novi.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrtu projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava javnih radova u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.650.000,00 € (za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju).
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 46.146,10 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 46.146,10 €, od čega 35.486,70 € u 2020. godini.

11.25. Komplex UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)



- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520m², uz dodatnih 1135m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.
- Konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja je sproveo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine. Ugovor br. 01-8439/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing-invest“ d.o.o., Danilovgrad, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 86.817,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-

334/20-523 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-impuls“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 8.954,00 €.

- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije objekata kompleksa.
- U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izmiještanje dalekovoda i izgradnju nove trafostanice u okviru kompleksa.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

11.26. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite

- **Rekonstrukcija bivšeg pograničnog punkta Božaj**
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 872.000,00 €.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti.

11.27. Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređenje veterinarske i fitosanitarne kontrole

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.28. Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.29. Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.30. Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica-Golubovci

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.31. Strategija izvodljivosti intermodalnosti

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.32. Studija o ITS (Inteligent Transport sistem) u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.33. Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.34. Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.35. Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU ACQUIS

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.36. Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu

PPOV u Rožajama

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Rožajama

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

PPOV u Kolašinu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Kolašinu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Kanalizaciona mreža u Mojkovcu

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

11.37. Grant šema za energetska efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-2273 od 16.04.2020. godine, sredstva planirana za predmetni projekat preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA

- Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije za tehnički pregled autoputa. U skladu sa Odlukom, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori koji se realizuju u kontinuitetu.
