



CRNA GORA
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA

Za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2016. godine




DIREKCIJA
JAVNIH
RADOVA

1. REZIME

Rebalansom kapitalnim budžeta za 2016. godinu planirano je da Direkcija javnih radova realizuje sredstva u ukupnom iznosu od 52.776.800,00 €.

(Zakon o izmjenama zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, Sl. list CG br. 73, od 25. novembra 2016. godine).

Svi projekti Rebalansa kapitalnog budžeta, kao što je i definisano Zakonom o izmjenama zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom opredijeljena su sredstva na sljedeći način:

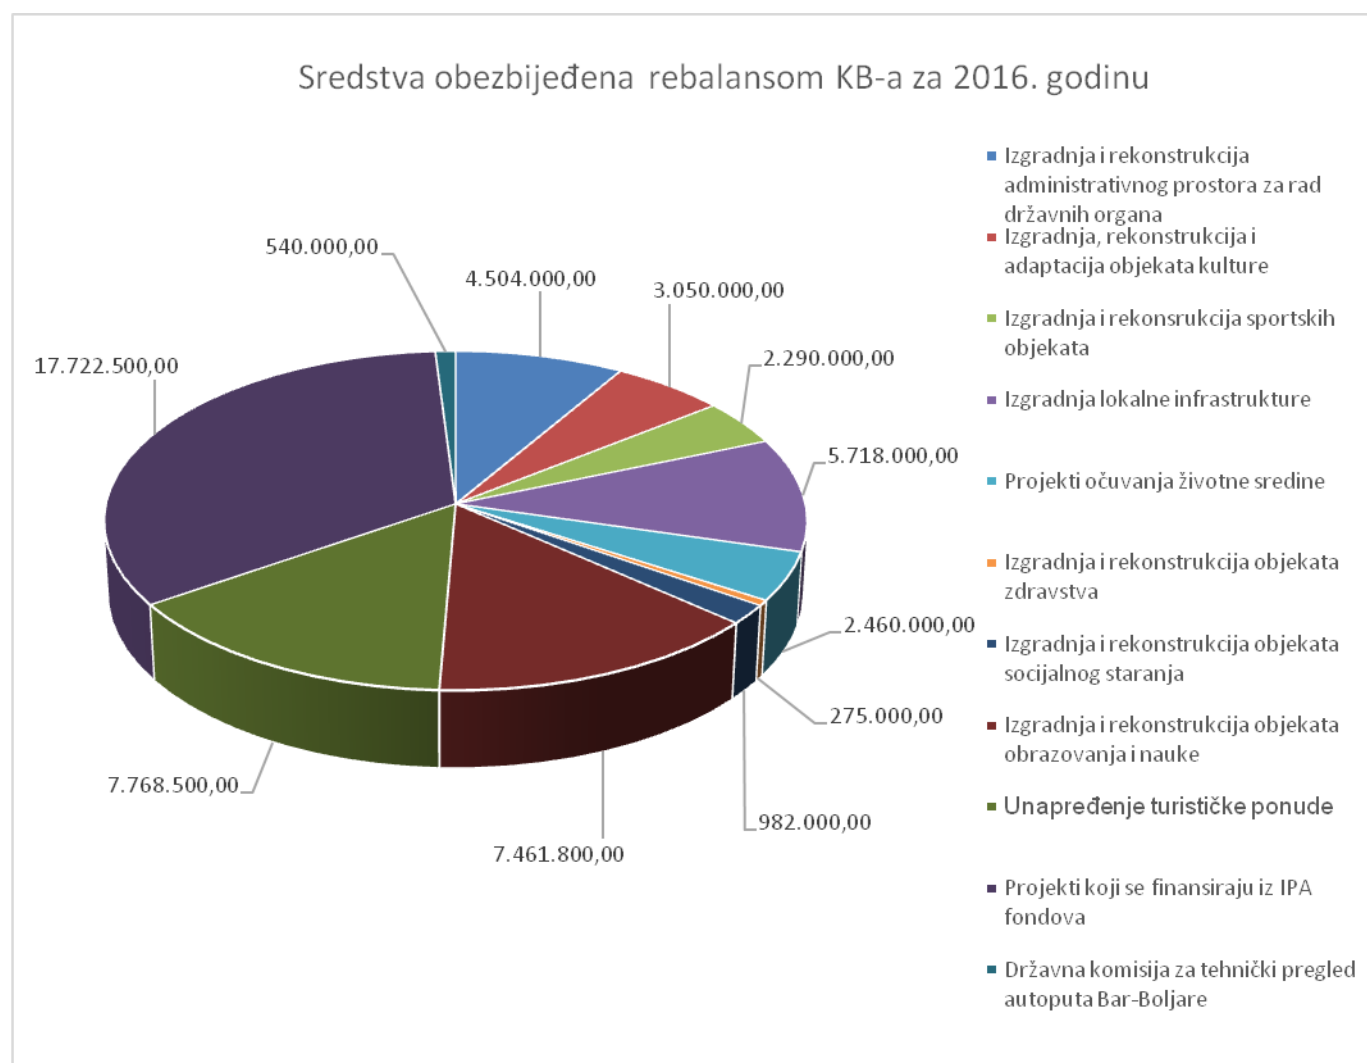

Rebalansom kapitalnog budžeta je predviđeno da Direkcija javnih radova sprovodi aktivnosti na realizaciji 113 projekata koji se finansiraju iz sljedećih izvora:

- opšti prihod - 100 projekata,
- opšti prihod uz sufinansiranje - donacije stranih Vlada - 3 projekta,
- bespovratna sredstava iz predpristupnih IPA programa, kreditna sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda - 1 projekat,
- bespovratna sredstava iz predpristupnih IPA programa, uz sufinansiranje iz opštih prihoda - 4 projekta,
- kreditna sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope, uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza za izmirenje obaveza PD-a - 8 projekata - projekti Dječijih vrtića.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu u članu 14 propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Donacija Vlade Republike Italije za projekat:

- Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa:

- Za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kanalizacione mreže i vodosnadbijevanja, sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada, projekte željezničke infrastrukture i projekte iz oblasti tehničke pomoći.

U članu 12 Zakona o budžetu propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciona mreža i vodosnabdijevanje

Kredit Razvojne banke Savjeta evrope (CEB) za projekte:

- Dječiji vrtić na Starom aerodromu u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Zagoriču u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Baru,
- Dječiji vrtić u Ulcinju,
- Dječiji vrtić u Pljevljima,
- Dječiji vrtić u Bloku VI u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Tuzima,
- Rekonstrukcija vrtića.

Prilikom izrade budžeta, u najvećoj mogućoj mjeri, vođeno je računa o ravnomjernom regionalnom razvoju zbog čega je akcenat dat na realizaciju projekata u sjevernom dijelu Crne Gore.

U centralnom regionu najveći broj projekata predviđen je na području Podgorice, kao administrativnog centra Crne Gore.

Pored navedenog, predviđeni su i projekti čija se realizacija ne može vezati za određeni region, gdje spadaju: Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu; Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje; Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta; Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice; Izgradnja i rekonstrukcija vrtića koja se finansira iz kredita CEB-a; Izrada planske dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih

projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude; Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda; Lokalni putevi; Nacionalni parkovi i Tehnička pomoć koja se sufinansira iz IPA fondova.

Ukupna sredstva obezbijeđena Rebalansom kapitalnim budžeta, uključujući kredite i donacije iznose 52.776.800 €, od čega je: 37.870.100 € iz opštih izvora, 15.100 € iz kreditnih izvora i 14.891.600 € donacije.

Od ukupnog iznosa sredstava opredijeljenih Rebalansom kapitalnog budžeta za 2016. godinu, 41.371.800,00€ (78,39%) odnosi se na projekte koji su započeti u prethodnim godinama, a 11.405.000,00€ (21,61%) se odnosi na projekte čiji je početak realizacije planiran u ovoj godini.

Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlašćenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava u prvom polugodištu 2016. godine donijela sljedeće Zaključke:

- Zaključak br. 08-437 od 17. marta 2016. godine

“Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Zadužuju se Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Direkcija javnih radova da, nakon dostavljanja Ugovora o izvođenju radova i ovjerenih situacija, s Programa: 805 – Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta kulture bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju i Pozicije: 4413 – Izdaci za građevinske radove, iz sredstava Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2016. godinu, Programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori prenesu sredstva, u iznosu od 300.000 eura.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Direkcija javnih radova da, u cilju realizacije Projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, razmotre mogućnost preusmjeranja finansijskih sredstava, planiranih Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2016. godinu, za realizaciju određenih projekata za koje se predpostavlja da neće biti u cjelosti realizovani.”

- Zaključak br. 08-942 od 21. april 2016. godine

“Zadužuje se Direkcija javnih radova, da u saradnji sa opštinom Pljevlja započne korišćenje sredstava iz Kapitalnog budžeta (450.000,00€) predviđenih za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projekat toplifikacije i sprovođenje mjera smanjenja zagađenja u Pljevljima i pripremu preciznog plana utrošaka sredstava sa definisanim rokovima.”

- Zaključak br. 08-1432 od 19. maja 2016. godine

“Zadužuje se Direkcija javnih radova da s pozicije – Uštede u 2016. godini prenese Opštini Bijelo Polje sredstva, u iznosu od 180.000,00 eura za izgradnju stambenih objekata za pripadnike romske populacije, na žiro račun broj 550-5376-57 kod Societe Generale Montenegro banke, a Opštini Mojkovac sredstva, u iznosu od 120.000,00 eura, na žiro račun broj 535-14691-44 kod Prve banke Crne Gore, za rješavanje stambenih potreba korisnika socijalne zaštite.”

- Zaključak br. 08-1986 od 11. jula 2016. godine

“Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova, da po skraćenim procedurama sprovede postupke javnih nabavki i izbora:

-obrađivača i revidenta Glavnog projekta sanacije klizišta za objekat JPU “Naša radost” na Savini, u iznosu do 25.000,00€

- izvođača radova i nadzora izvođenja radova na sanaciji klizišta, za objekat JPU "Naša radost" na Savini u iznosu do 400.000,00€.
- obrađivača i revidenta Glavnog projekta sanacije klizišta, sa neophodnim geomehaničkim istraživanjima za objekat JU OŠ "Milan Vuković" na Savini, u iznosu do 45.000,00€.
- obrađivača i revidenta Glavnog projekta sanacije objekta JU OŠ "Milan Vuković" na Savini, u iznosu do 35.000,00€.
- obrađivača i revidenta Glavnog projekta rekonstrukcije područne ustanove OŠ "Milan Vuković", zadužbine porodica Bošković, Đurović i Laketić u iznosu do 30.000,00€."

- Zaključak br. 08-1986 od 2. septembra 2016. godine

"Zaključak Vlade Crne Gore 08-1986 od 11. jula 2016. godine, sa sjednice od 7. Jula 2016. godine mijenja se na sljedeći način:

U tački 2 alineja 2, riječi: "U iznosu do 400.000,00€" zamjenjuju se riječima :

"U iznosu do 100.000,00€.

U tački 2. poslije alineje 5 dodaje se nova alineja koja glasi:

-"Izvođača radova i nadzora nad izvođenjem svih neophodnih radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta i objekta OŠ "Milan Vuković", u iznosu od 300.000,00€"."

- Zaključak br. 08-2341 od 8. septembra 2016. godine

"Vlada je usvojila informaciju o zakupu Ulcinjske solane, statusu zaštite i planiranim razvojnim aktivnostima na ovom području sa zahtjevom za obezbjeđenje finansijskih sredstava, za zakupca Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova, da sredstva u iznosu od 200.000,00€ uplati Privrednom sudu Crne Gore na račun depozita Privrednog suda Crne Gore, kao trošak stečajnog postupka, uz obavezu da nakon prodaje imovine stečajnog dužnika navedeni iznos bude vraćen budžetu Crne Gore"

- Zaključak br. 08-2507 od 15. septembra 2016. godine

"Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – direkcija javnih radova, da sredstvima, u iznosu od 400.000,00€ izmiri obaveze po osnovu poravnjanja u postupku povracaja oduzetih imovinskih prava bivsim vlasnicima nepokretnosti na kojima je planirana izgradnja srednje strucne škole u Golubovcima."

- Zaključak br. 08-3041 od 8. decembar 2016. godine

"Vlada Crne Gore na sjednici od 2. decembra 2016. godine, razmotrila je Informaciju o izgradnji srednje stručne škole u Golubovcima s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bivšeg vlasnika Mijović Vuka, koji je dostavilo Ministarstvo prosvjete.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeći zaključak:

-Vlada je usvojila Informaciju o izgradnji srednje stručne škole u Golubovcima.

-Vlada je prihvatila ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

-Ovlašćuje se Milan Martinović, direktor Direkcije javnih radova, da u ime Vlade Crne Gore, potpiše Ugovor iz tačke 2. ovih zaključaka.

-Zadužuje se Direkcija javnih radova, da prati realizaciju Ugovora iz tačke 2. ovih zaključaka."

- Zaključak br. 08-3276 od 15. decembar 2016. godine

"Vlada Crne Gore na sjednici od 15. decembra 2016. godine, razmotrila je Informaciju o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju, za potrebe Ministarstva vanjskih

poslova, sa Predlogom anexa I Ugovora o realizaciji rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova, koje je dostavilo Ministarstvo vanjskih poslova.

S tim u vezi je donijela sljedeće zaključke:

-Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova.

-Vlada je prihvatila Anex I Ugovora o realizaciji rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova.

-Ovlašćuju se Darko Radunović, Ministar finansija i Milan Martinović, direktor Direkcije javnih radova, da, u ime Vlade Crne Gore, potpišu Anex I ugovora iz tačke 2. ovih zaključaka.

-Zadužuje se Direkcija javnih radova da, nakon potpisivanja Anexa I Ugovora iz Kapitalnog budžeta za 2016. godinu, programu Ujedinjenih Nacija za razvoj u Crnoj Gori, uplati sredstva za ovu namjenu, s pozicije Projekat 805-izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture (Projekat rekonstrukcije bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju), sa izdatka: 4413 - izdaci za građevinske objekte, u iznosu od 1.700.000,00€ i sa izdataka 4147- konsultantske usluge u iznosu od 250.000,00€."

▪ Zaključak br. 08-3260 od 22. decembar 2016. godine

"Vlada je usvojila Informaciju o kupovini poslovnog prostora za potrebe smještaja organa državne uprave, organa uprave i drugih institucija u Bijelom Polju čiji je osnivač Vlada Crne Gore.

- Vlada je prihvatila Ugovor o prenosu prava raspolaganja.

- Ovlašćuje se Pavle Radulović Ministar održivog razvoja i turizma da u ime Vlade Crne Gore, potpiše Ugovor iz tačke 2. ovih zaključaka.

- Zaduguje se Direkcija javnih radova da, iz ušteđenih sredstava s programa:

821-izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke, pozicije: 4413 izdaci za građevinske objekte na osnovu dostavljenog zaključenog Ugovora, prenesu sredstva, u iznosu od 2.219,170,00€ opštini Bijelo Polje."

▪ Zaključak br. 08-3354 od 23. decembra 2016. godine

"Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta Elektrifikacija katuna u Rožajama "Dobro Buče" i "Giljevo polje".

-zadužuje se ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova, da iz sredstava opredijeljenih Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, s projekta 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture, s projekta Elektrifikacija katuna u Rožajama "Dobro Buče" i "Giljevo polje", prenesu sredstva u iznosu od 117.848,08€, na žiro-račun Opštine Rožaje za realizaciju Ugovora o izvođenju radova na ovom projektu.

-obavezuje se Opština Rožaje da prenesena sredstva namjenski koristi za realizaciju projekta Elektrifikacija katuna u Rožajama "Dobro Buče" i "Giljevo polje" i da o realizovanim aktivnostima informiše Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Direkciju javnih radova."

▪ Zaključak br. 08-3352 od 23. decembra 2016. godine

"Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izrade "Studije izvodljivosti Plavskog jezera".

-Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova, da iz sredstava opredijeljenih Kapitalnim budžetom za 2016. godinu s projekta 826- "Unaprjeđenje turističke ponude", s projekta Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unaprjeđenja turističke ponude" prenesu sredstva, u iznosu od 310.000,00€ na poseban namjenski žiro-račun Opštine Plav kod CKB Plav, broj: 510-80373-63-Podrška održivom razvoju i zaštiti okoline u prekograničnom području.

-Obavezuje se Opština Plav da prenesena sredstva namjenski koristi za realizaciju projekta zaštite Plavskog jezera i da o realizovanim aktivnostima informiše Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Direkciju javnih radova.”

- Zaključak br. 08-3353 od 28. decembar 2016. godine

“Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji izrade “Lokalne studije lokacije Hajla –Stedim” , u Rožajama u okviru projekta “Ski centra na lokalitetu Hajla, Rožaje”.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da prenese sredstva u iznosu od 300.000,00€ na žiro račun opštine Rožaje za izradu “Lokalne studije lokacije Hajla –Stedim” , u opštini Rožaje.

-Preporučuje se opštini Rožaje da sredstva iz zaključka 2. namjenski koristi za potrebe izrade “Lokalne studije lokacije Hajla –Stedim” i o realizovanim aktivnostima informiše Direkciju javnih radova, kao i da, eventualno, preostala sredstva, nakon završetka izrade “Lokalne studije lokacije Hajla –Stedim”, u saradnji sa Direkcijom javnih radova, opredijeli za potrebe realizacije projekta Ski centra na lokalitetu Hajla, Rožaje.”

- Zaključak br. 08-2577 od 30. decembar 2016. godine

“Vlada je usvojila informaciju o realizaciji Projekta rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore.

-Vlada je prihvatila Ugovor o kupovini stambenih jedinica za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore, između “Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju”, društvo sa ograničenom odgovornošću, za udruživanje sredstava i promet stambenim i poslovnim prostorom- Podgorica i Vlade Crne Gore- Ministarstvo finansija- Uprava za imovinu u iznosu od 299.270,00€, sredstva koja su predviđena Kapitalni budžetom Direkcije javnih radova za 2016. godinu.

-Zadužuje se Direkcija javnih radova da Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica prenese iz Kapitalnog budžeta za 2016. godinu, sredstva u iznosu od 299.270,00€ na žiro račun: 510-18496-36 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.”

Realizaciju projekata značajno usložnjava i činjenica da građevinska sezona počinje u maju, da je za realizaciju novih projekata potrebno prethodno sprovesti pripreme aktivnosti (izrada projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti, javna nadmetanja za izbor izvođača radova, itd.), te da je plan javnih nabavki usvojen sa značajnim zakašnjenjem.

U sklopu ukupnih aktivnosti koje su se odvijale u prethodnom periodu, posebno je značajno istaći aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori i izgradnji kanizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština, pretežno na sjeveru države.

Crna Gora je krajem aprila 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj”, a u decembru 2014. godine je potpisan finansijski sporazum, što je stvorilo uslove da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine i projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore.

U prvoj polovini tekuće godine Direkcija javnih radova je potpisala šest Ugovora za realizaciju projekata koji se sufinansiraju iz IPA sredstava, od čega dva Ugovora o izvođenju radova za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanizacione mreže u Opštini Berane; tri Ugovora za reviziju i nadzor nad izvođenjem radova za projekte: izgradnja postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Berane, demontaža postojeće, nabavka i izgradnja nove elekto-vučne stanice "Trebešica" i sanaciju odlagališta "Ćafe" u Opštini Bar; i jedan Ugovor o nabavci opreme za potrebe Operativne strukture.

Regionalnim stambenim programom za Crnu Goru predviđeno je rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica, odnosno 1.177 domaćinstava koja spadaju u najranjivije kategorije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 27.696.000,00 € od čega je učešće države 15% odnosno 4.154.400 €, dok su preostala sredstva obezbjeđena iz izvora definisanih okvirnim finansijskim sporazumom Razvojne banke savjeta Evrope.

U 2016. godini Direkcija javnih radova je sprovela 146 postupaka javnih nabavki od čega:

- 71 postupak za izvođenje radova,
- 72 postupka za pružanje usluga i
- 3 postupka za nabavku roba.

Takođe, u 2016. godini Direkcija javnih radova je zaključila 139 Ugovora od čega:

- 59 ugovora o izvođenju radova,
- 78 ugovora za pružanje usluga i
- 3 ugovora za nabavku roba.

U 2016. godini kroz Rebalans kapitalnog budžeta obezbjeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 52.776.800 € od čega je realizovano 30.028.661,16 €, što iznosi 56.90% ukupnog Budžeta.

Ne uzimajući u obzir sredstva obezbjeđena za realizaciju projekata iz IPA III kompenente u iznosu od 17.722.500 € (koji se finansiraju 85% iz donacije, a 15% iz opštih prihoda), realizacija opštih prihoda i kreditnih sredstva iznosi 28.415.182,90 € od ukupnih 35.051.300,00 €, što predstavlja 81,06% realizacije.

Podgorica, decembar 2016. godine

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA
za period od 01. 01. 2016. god. do 31. 12. 2016. godine

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	235.000,00	4.269.000,00	4.504.000,00	114.260,22	3.753.927,78	3.868.188,00
1.1.	Kamp na Zlatici	0.00	974.000,00	974.000,00	0.00	973.909,97	973.909,97
1.2.	Objekt CANU-a u Podgorici	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Državno tužilaštvo u Kotoru	20.000,00	290.000,00	310.000,00	13.997,97	287.958,59	301.956,56
1.6.	Bivša zgrada MUP-a CG u Podgorici	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje i lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.	20.000,00	800.000,00	820.000,00	13.754,24	514.326,88	528.081,12
1.8.	Administrativni objekat u Gusinju	10.000,00	250.000,00	260.000,00	8.676,32	245.067,29	253.743,61
1.9.	Stanica policije i filijale Upravnih unutrašnjih poslova u Gusinju	5.000.00	45.000,00	50.000,00	2.167,16	0.00	2.167,16
1.10.	Administrativni objekat u Petnjici	40.000,00	1.365.000,00	1.405.000,00	13.725,36	1.339.934,03	1.353.659,39
1.11.	Smještajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici	100.000,00	0,00	100.000,00	55.112,23	0.00	55.112,23

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1.12.	Zgrada Skupštine	15.000,00	440.000,00	455.000,00	6.826,94	392.731,02	399.557,96
2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	353.000,00	2.697.000,00	3.050.000,00	285.311,39	2.476.620,26	2.761.931,65
2.1.	Muzički centar Crne Gore u Podgorici	55.000,00	100.000,00	155.000,00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Centar kulture u Pljevljima	0.00	500.000,00	500.000,00	0.00	430.352,71	430.352,71
2.3.	Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	5.000,00	47.000,00	52.000,00	4.285,00	46.267,55	50.552,55
2.4.	Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP- Cetinje	270.000,00	2.000.000,00	2.270.000,00	258.925,00	2.000.000,00	2.258.925,00
2.5.	Zetski dom na Cetinju	23.000,00	0.00	23.000,00	22.101,39	0.00	22.101,39
2.6.	Centar savremene umjetnosti u Podgorici	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
2.7.	Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00
2.8.	Dvorac Kralja Nikole u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	65.000,00	2.225.000,00	2.290.000,00	34.586,60	1.599.597,20	1.634.183,80
3.1.	Sportska dvorana u Beranama	45.000,00	2.100.000,00	2.145.000,00	24.641,60	1.551.461,51	1.576.103,11
3.2.	Sportska dvorana u Kotoru	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	48.135,69	48.135,69

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
3.3.	Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Bazen u Kotoru i Tivtu	15.000,00	55.000,00	70.000,00	9.945,00	0.00	9.945,00
4.	Projekti očuvanja životne sredine	535.000,00	1.925.000,00	2.460.000,00	462.630,76	1.255.125,82	1.717.756,58
4.1.	Sanitarne deponije, sanacija neuređenih odlagališta, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	380.000,00	10.000,00	390.000,00	370.679,60	0.00	370.679,60
4.2.	Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik	10.000,00	305.000,00	315.000,00	5.418,71	304.300,14	309.718,85
4.3.	Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećeg odlagališta otpada	15.000,00	130.000,00	145.000,00	2.470,50	119.748,02	122.218,52
4.4.	Sanacija deponije na Žabljaku	15.000,00	210.000,00	225.000,00	3.456,95	189.730,00	193.186,95
4.5.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	15.000,00	85.000,00	100.000,00	2.659,91	0.00	2.659,91
4.6.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	20.000,00	630.000,00	650.000,00	13.735,00	532.822,42	546.557,42
4.7.	Vodosnabdijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin)	5.000,00	150.000,00	155.000,00	0.00	59.325,24	59.325,24
4.8.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	0,00	50.000,00	50.000,00	0.00	49.200,00	49.200,00
4.9.	Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	75.000,00	355.000,00	430.000,00	64.210,09	0.00	64.210,09

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
4.10.	Sanacija i čišćenje kanala Port Milena Ulcinj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Izgradnja lokalne infrastrukture	338.000,00	5.380.000,00	5.718.000,00	274.642,71	4.015.234,20	4.289.876,91
5.1.	Infrastruktura u MZ Bukovica	15.000,00	645.000,00	660.000,00	11.799,71	629.642,39	641.442,10
5.2.	Elektrifikacija katuna u Rožajama, "Dobro Buče" i "Giljevo polje"	0.00	250.000,00	250.000,00	0.00	242.760,00	242.760,00
5.3.	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
5.4.	Rekonstrukcija Ulice „Đeda Vojvodića“ u Beranama	5.000,00	240.000,00	245.000,00	624,14	48.442,18	49.068,32
5.5.	Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu	10.000,00	300.000,00	310.000,00	4.498,20	149.639,37	154.137,57
5.6.	Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	303.000,00	3.930.000,00	4.233.000,00	257.718,66	2.944.750,26	3.202.468,92
5.7.1.	Lokalni putevi 10,0 km	40.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00	11.608,65	735.980,63	747.589,28
5.7.2.	Gradske saobraćajnice	263.000,00	2.810.000,00	3.073.000,00	246.110,01	2.208.769,63	2.454.879,64
6.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	26.000,00	249.000,00	275.000,00	12.983,95	211.365,93	224.349,88
6.1.	Zavod za transfuziju krvi u Podgorici	11.000,00	0.00	11.000,00	10.824,34	0.00	10.824,34

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
6.2.	Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama	15.000,00	199.000,00	214.000,00	2.159,61	161.365,93	163.525,54
6.3.	Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	50.000,00	50.000,00
7.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	122.000,00	860.000,00	982.000,00	96.819,74	854.621,66	951.441,40
7.1.	Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama	12.000,00	260.000,00	272.000,00	9.538,00	255.351,66	264.889,66
7.2.	Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija	0.00	600.000,0	600.000,0	0.00	599.270,00	599.270,00
7.3.	Dom starih u Podgorici	110.000,00	0.00	110.000,00	87.281,74	0.00	87.281,74
8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	465.400,00	6.996.400,00	7.461.800,00	171.273,19	7.480.586,53	7.651.859,72
8.1.	Akademije umjetnosti na Cetinju	60.000,00	1.695.000,00	1.755.000,00	40.943,93	1.693.440,04	1.734.383,97
8.2.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a	80.400,00	333.000,00	413.400,00	35.756,65	862.812,35	898.569,00
8.2.1.	Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	3.000,00	80.000,00	83.000,00	3.718,10	0.00	3.718,10
8.2.2.	Vrtić u Zagoriču, Podgorica	15.000,00	158.000,00	173.000,00	23.107,30	862.812,35	885.919,65
8.2.3.	Vrtić u Baru	8.800,00	65.000,00	73.800,00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.	Vrtić u Ulcinju	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
8.2.5.	Vrtić u Pljevljima	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.6.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0.00	0.00	0.00

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
8.2.7.	Vrtić u Tuzima	8.600,00	20.000,00	28.600,00	8.931,25	0.00	8.931,25
8.2.8.	Rekonstrukcija vrtića	10.000,00	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
8.3.	Objekti obrazovanja u Herceg Novom	155.000,00	286.000,00	441.000,00	28.713,28	273.270,91	301.984,19
8.4.	Vrtić u Rožajama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	30.000,00	0.00	30.000,00	0.00	0.00	0.00
8.7.	Srednja stručna škola u Golubovcima	10.000,00	770.000,00	780.000,00	1.927,21	769.894,51	771.821,72
8.8.	Rekonstrukcija OŠ u Kotoru	0.00	40.000,00	40.000,00	0.00	40.000,00	40.000,00
8.9.	OŠ u Gukama	30.000,00	644.958,18	674.958,18	23.916,72	644.546,21	668.462,93
8.10.	OŠ u Tološima	30.000,00	0.00	30.000,00	0.00	0.00	0.00
8.11.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za komp.zdravlja Poliklinike i Univerzitetskog centra Berane	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0.00	0.00	0.00
8.12.	Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“-Nikšić	55.000,00	980.000,00	1.035.000,00	40.015,40	977.452,51	1.017.467,91
8.13.	OŠ „Dušan Korać“ Bijelo Polje	0,00	2.222.441,82	2.222.441,82	0.00	2.219.170,00	2.219.170,00
8.13.	OŠ u Sukobinu Ulcinj	0.00	5.000,00	5.000,00	0.00	0.00	0.00

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
9.	Unapređenje turističke ponude	1.364.000,00	6.404.500,00	7.768.500,00	915.303,35	4.068.391,10	4.983.694,45
9.1.	Ski centri na lokalitetu Bjelasica	412.000,00	4.521.500,00	4.933.500,00	164.554,13	3.064.139,42	3.228.693,55
9.1.1.	Ski centar „Kolašin 1600“, Kolašin	161.000,00	3.651.000,00	3.812.000,00	116.606,54	2.877.794,49	2.994.401,03
9.1.2	Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje	145.000,00	720.500,00	865.500,00	31.239,99	186.344,93	217.584,92
9.1.3.	Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	106.000,00	150.000,00	256.000,00	16.707,60	0.00	16.707,60
9.2.	SKI centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	30.000,00	550.000,00	580.000,00	2.545,50	546.573,38	549.118,88
9.3.	SKI centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	55.000,00	95.000,00	150.000,00	5.300,00	0.00	5.300,00
9.4.	Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude	550.000,00	0.00	550.000,00	525.984,61	0.00	525.984,61
9.5.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	105.000,00	35.000,00	140.000,00	92.294,15	0.00	92.294,15
9.6.	SKI centar Vučje – izgradnja akumulacionog jezera, opština Nikšić	5.000,00	133.000,00	138.000,00	0.00	39.780,69	39.780,69
9.7.	Dom revolucije u Nikšiću	85.000,00	330.000,00	415.000,00	80.325,00	0,00	80.325,00

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
9.8.	Izmještanje ikone bogorodice Filarmose na Cetinju	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0.00	0.00	0.00
9.9.	Izgradnja apartmana i restorana u NP Biogradska gora, Kolašin	14.000,00	300.000,00	314.000,00	9.222,56	217.897,61	227.120,17
9.10.	Kuca „Voća“-Andrijevića	33.000,00	0,00	33.000,00	32.244,40	0.00	32.244,40
9.11.	Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000.00	0.00	2.000.00
9.12.	Izgradnja projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
9.13.	Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14.	Nacionalni parkovi	35.000,00	165.000,00	200.000,00	833,00	0.00	833,00
9.15.	Solana "Bajo Sekulić" u Ulcinju	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.16.	Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor	10.000,00	0,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
10.	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	500.000,00	40.000,00	540.000,00	401.474,53	2.624,03	404.098,56
10.1.	Državna komisija za tehnički pregled auto puta Bar-Boljare prioritetne dionice Smokovac – Uvač-Mateševo i dr.	500.000,00	40.000,00	540.000,00	401.474,53	2.624,03	404.098,56
11.	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	1.486.500,00	16.241.000,0	17.727.500,0	227.868,44	1.313.411,77	1.541.280,21

R. br.	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2016. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2016.GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
11.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	406.000,00	6.643.000,00	7.049.000,00	0.00	1.098.365,77	1.098.365,77
11.2.	Sanacija odlagališta „Vrtijeljka“ na Cetinju	157.000,00	1.055.000,00	1.212.000,00	0.00	0.00	0.00
11.3.	Sanacija odlagališta „Čafe“ u Baru	282.500,00	3.024.000,00	3.306.500,00	130.109,70	203.400,00	333.509,70
11.4.	Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar-Sutomore	188.000,00	3.128.000,00	3.316.000,00	0.00	0.00	0.00
11.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice „Trebešica“	110.500,00	2.273.000,00	2.383.500,00	58.651,74	0.00	58.651,74
11.6.	Tehnička pomoć	342.500,00	118.000,00	460.500,00	39.107,00	11.646,00	50.753,00
	SVE UKUPNO	5.489.900,00	47.286.900,00	52.776.800,00	2.997.154,88	27.031.506,28	30.028.661,16

3. REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

I. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA

I.1. Kamp na Zlatici - kupovina objekta

Status projekta:

Završen

- Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 03-7921/4 od 17. novembra 2011. godine i Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa, zaključenom između Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija i Glavnog grada br. 06-4359/1 od 25.11.2011. godine, utvrđena je obaveza kupovine objekta Kampa na Zlatici, za potrebe trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice policije.
- U 2016. godini realizovan je prenos preostalih sredstava u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore u iznosu od 973.909,97€.

I.2. Objekat Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti u Podgorici – izgradnja

Status projekta:

U toku



- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 63 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića.
- Objekat je bruto površine cca 6.990 m² i sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova.
- U novoprojektovanoj zgradi CANU-a je planirano: 70 kancelarija, 7 sala za sastanke, 2 laboratorije akademskog kluba, čitaonice, 3 depoa, 2 arhive, kao i ostale prateće tehničke prostorije.
- Radovima na izgradnji objekta započeti su krajem 2010. godine.
- U periodu do 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, radovi na oblaganju fasadnih zidova cijepanim kamenom, radovi na izradi ventilirajuće kamene fasade i polustrukturalnih fasada, kao i radovi na grubom razvodu vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.
- U 2014. godini radovi se nisu izvodili i gradilište je bilo konzervirano.
- U 2015. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova u okviru obezbijedenih sredstava i izvođeni su keramičarski radovi, montažni radovi, kao i radovi na izradi elektroinstalacija.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti.
- U 2017. godini planiran je nastavak radova na izgradnji u skladu promjenjenom namjenom objekta.

I.3. Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici - izmirenje naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta

Status projekta:

Završen

- Radovi na izgradnji objekta završeni su krajem 2015. godine i za isti je pribavljena upotrebna dozvola.
- U novoizgrađenom poslovnom objektu ukupne bruto površine cca 8.600 m² funkcionalno su organizovani sadržaji Uprave za nekretnine i Područne jedinice Podgorica, za oko 220 radnih mjesta.
- Sredstva realizovana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu odnosila su se na izmirenje preostale naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta.



I.4. Eko-zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici - izgradnja

Status projekta:

U toku



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF- Environment Montenegro-Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica. Objekat sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi cca 10.020m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m².
- Izgradnja objekta se realizuje fazno. I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena. Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Izvođenje radova je otpočelo krajem 2012. godine i do kraja 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze. U cilju nastavka izvođenja radova na izgradnji objekta, u toku su aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja i izvođenju radova na izgradnji objekta.

I.5. Državno tužilaštvo u Kotoru - nadgradnja sa opremanjem

Status projekta:

Završen



- Ugovor o izvođenju radova na nadgradnji i opremanju objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Opštini Kotor potpisan je u 2014. godini.
- Objekat sadrži 13 kancelarija, prostorije za prepoznavanje, prostoriju za zadržavanje osumnjičenih, arhivu, salu za sastanke i ostale prateće tehničke prostorije, ukupne bruto površine cca 905 m².
- Radovi su započeti u martu 2015. godine i izvođeni su usporenom dinamikom, s obzirom na to da Centralna banka Crne Gore nije blagovremeno i u potpunosti oslobodila prostor u kojem je bila predviđena konstruktivna sanacija.
- Radovi su izvođeni punim intenzitetom od avgusta 2015. godine i isti su završeni u julu 2016. godine.
- Nakon završenog tehničkog pregleda izvedenih radova i pribavljanja upotrebne dozvole, objekat je predat Korisniku na upotrebu.
- U 2016. godini relizovano je 301.956,56€.

I.6. Bivša zgrada MUP-a u Opštini Podgorica - adaptacija

Status projekta:

U toku

- Tokom prvog kvartala 2014. godine završena je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju dijela bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u ulici "Serdara Jola Piletića".
- Realizacija projekta planirana je fazno.
- I faza obuhvatala je adaptaciju postojeće šalter sale u dijelu prizemlja objekta, koji je namijenjen za izdavanje dokumenata i registraciju vozila, ukupne površina oko 320 m².
- II faza se odnosila na adaptaciju prizemlja i prvog sprata, površine oko 1.550 m², kao i sanaciju krova i fasade objekta.
- Svi Ugovoreni radovi I i II faze su završeni u 2015. godini.
- Prostor je prilagođen radu sljedećih službi: sektora za vanredne situacije i upravnih poslova, kancelarije za upravnu inspekciju, kancelarije za inspektore za strance, kancelarije službe za prijem azilanata, biro za investicije i biro za smještaj i ishranu.
- U 2016. godini, nakon dostavljanja revidovanog Glavnog projekta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, pristupilo se pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova III faze na adaptaciji suterena i II sprata objekta.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja i početak i završetak radova na adaptaciji objekta.



I.7. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom-rekonstrukcija i adaptacija

Status projekta:

U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritetno prilagođavanje u Opštinama Podgorica, Nikšić i Berane.
- U prethodnom periodu završena je izrada i revizija Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Krajem 2015. godine raspisana su javna nadmetanja i potpisani Ugovori o izvođenju radova na prilagođavanju sljedećih objekata: JZU "Opšta bolnica" u Nikšiću, Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici, Osnovni sud u Podgorici i Ekonomski fakultet u Podgorici.

Osnovni sud u Podgorici

- Na objektu su završeni svi ugovoreni radovi i izvršena je primopredaja objekta Korisniku.

Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici



- Na objektu su završeni svi ugovoreni radovi i izvršena je primopredaja objekta Korisniku.


Ekonomski fakultet u Podgorici

- Na objektu su završeni svi ugovoreni radovi. U toku je tehnički pregled izvedenih radova.

JZU Opšta bolnica u Nikšiću

- Radovi na objektu su započeti i obustavljeni na zahtjev Korisnika zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem i velikog obima radova sa kojim Korisnik nije saglasan.
- Takođe, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i potpisani su Ugovori na prilagođavanju još četiri objekta: JZU Bolnica za plućne bolesti – Brezovik u Nikšiću, JZU Dom zdravlja u Nikšiću, JZU Opšta bolnica Berane i JZU Dom zdravlja u Beranama. Završen je izbor vršioca stručnog nadzora, a nakon potpisivanja ugovora, izvođači će biti uvedeni u posao. Raspisano je i javno nadmetanje za izvođenje radova i stručni nadzor na prilagođavanju objekta Ministarstva finansija.
- U 2016. godini relizovano je 528.081,12€.
- U 2017. godini planiran je početak i završetak izvođenja radova na prilagođavanju predmetnih objekata.

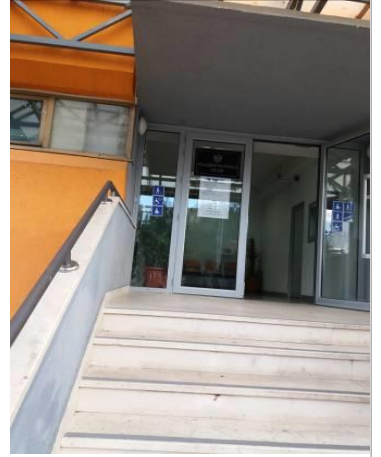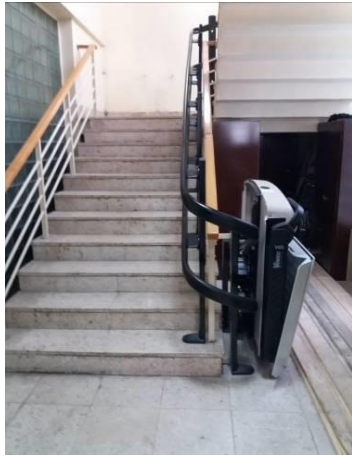

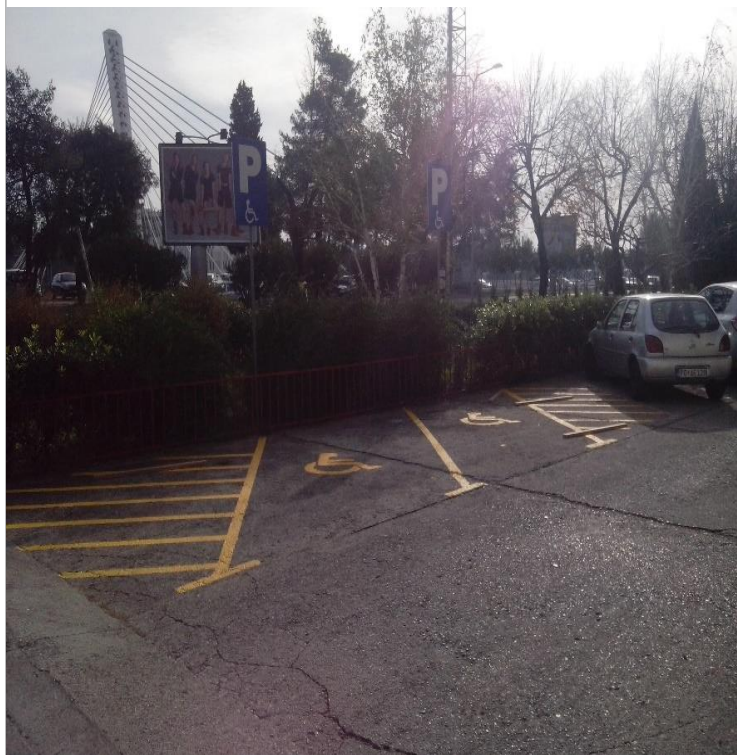

I.8. Administrativni objekat u Gusinju - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije za potrebe Administrativnog objekta sprovodi Opština Gusinje.
- Predviđena bruto površina objekta iznosi cca 1.130 m² i isti posjeduje prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju objekta, na prvom i drugom spratu predviđeni su kancelarijski prostori sa pratećim sanitarnim prostorijama, dok su na poslednjoj etaži predviđeni sljedeći sadržaji: skupštinska sala za 30 odbornika, prostorija za prevodioce, prostorija za novinare, multifunkcionalna sala i sanitarni blok.
- U prethodnom periodu, prije formiranja Opštine Gusinje, Opština Plav je sprovodila aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg objekta i realizovala grube građevinske radove.
- Opština Gusinje je raspisala javno nadmetanje i potpisala Ugovor za izvođenje građevinsko-zanatskih radova, radova na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkih instalacija. Izvođenje ugovorenih radova je otpočelo u 2015. godini i isti su završeni u 2016. godini.
- Sredstva realizovana u 2016. godini predstavljaju učešće Vlade Crne Gore - Direkcije javnih radova u finansiranju projekta.
- Preostalo je izvođenje radova za stavljanje objekta u funkciju.
- U 2016. godini realizovano je 253.743,61 €.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja i početak i završetak preostalih radova za stavljanje objekta u funkciju.



I.9. Stanica policije i filijale Upravnih unutrašnjih poslova u Gusinju - adaptacija

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini Direkcija javnih radova je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze na adaptaciji poslovnog prostora za potrebe stanice policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova i isto je u toku.
- I faza radova obuhvata građevinske i građ.-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama na objektu.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje II faze adaptacije objekta kojom su obuhvaćeni radovi na uređenju terena, izradi infrastrukturnih priključaka i opremanju objekta namještajem.
- U 2016. godini realizovano je 2.167,16€.
- U 2017. godini planiran je početak i završetak radova I faze, kao i ugovaranje i početak radova II faze.

I.10. Administrativni objekat u Petnjici - izgradnja

Status projekta:

U toku



- Projekat obuhvata izgradnju i opremanje administrativnog objekta Opštine Petnjica, projektovane bruto površine 1.760 m².
- Objekat posjeduje suteran, prizemlje, sprat i potkrovlje. U suterenu je smješten garažni prostor sa osam parking mjesta. Prizemlje objekta posjeduje šalter salu za opštinske službe sa dvije kancelarije, salu za sastanke Skupštine, kapaciteta oko 60 mjesta, i salu za vjenčanja i druge manifestacije. Na prvom spratu su smještene: kancelarije predsjednika, podpredsjednika, tehničkog sekretara, glavnog administratora, multifunkcionalna sala za sastanke i osam kancelarija. U potkrovnom prostoru je smješteno 14 kancelarija. Uz kancelarije su organizovani i prateći pomoćni i tehnički sadržaji.
- U 2015. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i opremanju objekta.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova i završeni su svi grubi građevinski i građevinsko zanatski radovi, kao i razvod instalacija. Preostalo je izvođenje radova na uređenju terena, fini zanatski radovi i radovi na opremanju objekta.
- U 2016. godini relizovano je 1.353.659,39€.
- U 2017. godini planiran je nastavak i završetak radova na izgradnji i opremanju objekta.

I.11. Smještajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe Korisnika.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi oko 5.350 m².
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta kompleksa objekata SAJ i PJP na Zlatici. Nakon što je u novembru završena procedura kod Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje revizije projektne dokumentacije, započeta je revizija iste.
- U 2016. godini relizovano je 55.112,23€.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta i ugovaranje i početak izvođenja radova na izgradnji objekata kompleksa u skladu sa prioritetima Korisnika.

I.12. Zgrada Skupštine - adaptacija

Status projekta:

U toku

- U 2011. godini stručni tim Direkcije javnih radova je izradio Studiju mogućih rješenja za obezbjeđenje prostora za rad Skupštine Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, na osnovu koje je donešen Zaključak Vlade o izboru lokacije Nove zgrade Skupštine Crne Gore.
- U 2012. godini stručni tim je u saradnji sa predstavnicima Skupštine, izradio Projektni zadatak u dijelu definisanja budućeg kapaciteta i prostornih sadržaja objekta Skupštine, a u skladu sa Zaključkom Vlade br. 03-7377/3 od 29.12.2011. godine, kojim je definisano raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja na izabranoj lokaciji i to u dvije varijante: a) rekonstrukcija i adaptacija stare zgrade Vlade u Ulici Jovana Tomaševića i izgradnja novog objekta u neposrednoj blizini, i b) rušenje postojećeg i izgradnja novog objekta na istoj urbanističkoj parceli. Nakon stvaranja planskih pretpostavki i definisanja površine zahvata lokacije na kojoj se predviđa izgradnja buduće zgrade Skupštine Crne Gore, stvorile se uslovi za dalju realizaciju aktivnosti na ovom projektu.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u postojećoj zgradi Skupštine koji se odnose na sanaciju krovne lanterne, enterijerske radove u plenarnoj sali, zamjenu prozora i sanaciju fasade.
- Izvođenje radova je u završnoj fazi.
- U 2016. godini relizovano je 399.557,96€.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na zgradi Skupštine, kao i nastavak aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje novog objekta Skupštine, a u skladu sa dokumentacijom pripremljenom od strane Korisnika.



II. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE

II.1. Muzički centar Crne Gore u Podgorici - nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola

Status projekta:

U toku



- U toku je rekonstrukcija i dogradnja bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², u kojem će nakon završetka radova biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola.
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- U toku su završni građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na objektu.
- U 2016. godini raspisan je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, kao i za radove na opremanju objekta. U toku je žalbeni postupak kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.
- U 2017. godini, nakon završetka tenderske procedure, planiran je nastavak izvođenja preostalih radova na rekonstrukciji objekta.

II.2. Centar kulture u Pljevljima - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Projekat rekonstrukcije objekta Doma kulture u Pljevljima realizuju Opština Pljevlja, Ministarstvo kulture u koordinaciji sa Direkcijom javnih radova.
- U 2011. godini su završeni svi građevinski instalaterski radovi na rekonstrukciji objekta, a u 2012. godini su završeni ugovoreni enterijerski radovi koji su se odnosili na dvoranu i prateće sadržaje.
- Početkom 2016. godine Opština Pljevlja je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje preostalih zanatskih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju biblioteke, muzeja, galerije i depoa u sklopu objekta. Sa izvođenjem radova otpočelo se u oktobru, nakon potpisivanja Ugovora sa Izvođačem. Izvođeni su radovi na postavljanju instalacija jake i slabe struje, termotehničkih i splinker instalacija.
- Sredstva realizovana u 2016. godini odnosila su se na učešće Direkcija javnih radova u finansiranju predmetnih radova.
- U 2016. godini realizovano je 430.352,71€.
- U 2017. godini opredjeljena su sredstva za finansijsko učešće Direkcije javnih radova u finansiranju preostalih radova.




II.3. Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku

Status projekta:

Završeno

- U 2016. godini izvođeni su radovi na sanaciji spomenika, dogradnji ograde oko lokacije i izgradnji postolja za spomenične biste. Svi planirani radovi na rekonstrukciji spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku su završeni.
- U 2016. godini relizovano je 50.552,55€.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja i početak i završetak radova na uređenju terena oko spomen obilježja.

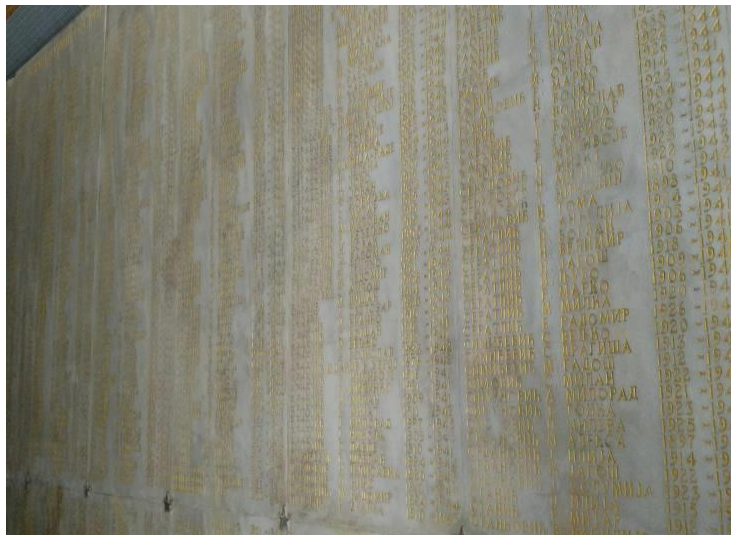


II.4. Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP, Cetinje - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br.08-1927/4 od 02.08.2013. godine Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je zadužen da pristupi izradi konzervatorskog projekta restauracije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju. Takođe, na osnovu Zaključka Vlade br. 08-2014/2 od 1. avgusta 2014. godine izvršen je transfer sredstava Prijestonici Cetinje na ime kofinansiranja projekta.
- U avgustu 2014. godine, u skladu sa Kapitalnim budžetom, Direkcija javnih radova je nakon završene procedure javnog nadmetanja potpisala Ugovor za vršenje revizije Glavnog projekta.

- Ugovorom o realizaciji predmetnog objekta zaključenim u novembru 2014. godine između Ministarstva finansija Crne Gore, Prijestonice Cetinje, UNDP-a (Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori) i Direkcije javnih radova, definisana je obaveza UNDP-a da sprovede postupak javne nabavke za izbor izvođača radova u skladu sa procedurama UNDP-a. Istim Ugovorom propisana je obaveza Direkcije javnih radova da shodno zakonskoj proceduri izvrši izbor nadzornog organa nad izvođenjem radova na objektu, kao i da izvrši prenos sredstava Prijestonici i UNDP-u.
- Krajem marta 2015. godine Direkcija javnih radova je, nakon završene procedure javnog nadmetanja, potpisala Ugovor o vršenju poslova stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji objekta.
- Sredinom oktobra 2015. godine završena je izrada projektne dokumentacije, a nakon završenog međunarodnog tenderskog postupka, UNDP je potpisao Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta.
- Sa radovima se otpočelo krajem novembra 2015. godine.
- Do sada su završeni radovi na izradi krovne konstrukcije i pokrivača, spoljne bravarije, završen je dio fasaderskih radova, malterisanje i grubi razvod elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Od strane UNDP-a, krajem juna, obavješteni smo da su radovi na objektu obustavljeni usled nedostatka sredstava u budžetu i da će se isti nastaviti nakon obezbjeđenja nedostajućih finansijskih sredstava.
- Rebalansom budžeta su obezbijedena nedostajuća sredstva i krajem decembra 2016. godine u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore 08-437 od 17. marta 2016. godine i br. 08-3276 od 15. decembra 2016. godine izvršen je transfer sredstava od strane Direkcije javnih radova prema UNDP-u za nastavak radova.
- U 2016. godini relizovano je 2.258.925,00€.
- U 2017. godini planiran je nastavak i zaršetak radova na rekonstrukcije objekta koje koordinira UNDP, a opredjeljena sredstva odnose se na tekuće izdatke.

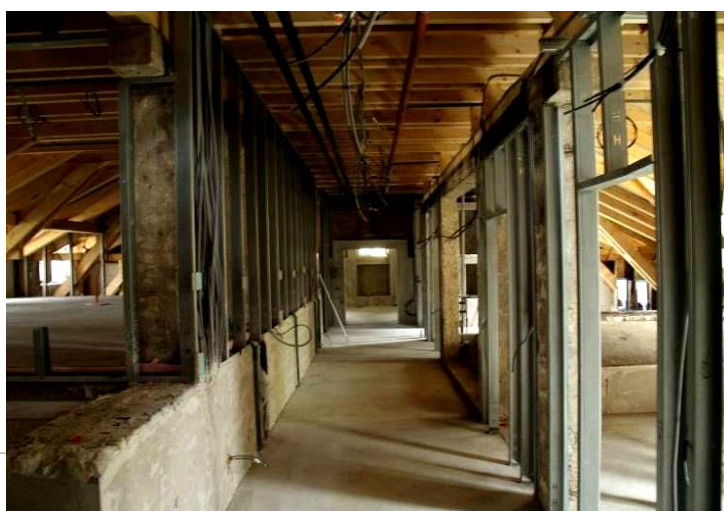

II.5. Zetski dom na Cetinju – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

U toku

- Aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije objekta Zetski dom na Cetinju sprovodi JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" Cetinje.
- U 2014. godini raspisana su javna nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i reviziju projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta Kraljevskog pozorišta "Zetski dom".
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2016. godini realizovano je 22.101,39€.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i početak izvođenja istih.

II.6. Centar savremene umjetnosti u Podgorici – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti

- Planirana je realizacija projekta izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici.
- Korisnik, Centar savremene umjetnosti Crne Gore zajedno sa Glavnim gradom razmatra moguće lokacije za izgradnju muzeja i nakon definisanja iste, Direkcija javnih radova će organizovati raspisivanje Konkursa za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja objekta i raspisivanju javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

II.7. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

U toku

- Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su za nabavku namještaja i opreme neophodne za rad Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja i opreme koje je poništeno s obzirom da nije bilo ispravnih ponuda.
- U 2017. godini planirano je ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za opremanje objekta.

II.8. Dvorac Kralja Nikole u Nikšiću – izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija objekta

Status projekta:

U toku


- Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom predviđena su za izradu projektne dokumentacije i započinjanje radova na rekonstrukciji objekta Dvorca kralja Nikole u Nikšiću.
- Dvorac je izgrađen 1900. godine, površine je cca 2.970 m² i sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja. U objektu su smješteni Zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv, depoi.
- U toku je izrada Glavnog konzervatorskog projekta rekonstrukcije koju sprovodi Opština Nikšić i nakon završetka istog, Direkcija javnih radova će raspisati javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja i početak radova na rekonstrukciji objekta.

III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

III.1. Sportska dvorana u Beranama - izgradnja

Status projekta:

U toku

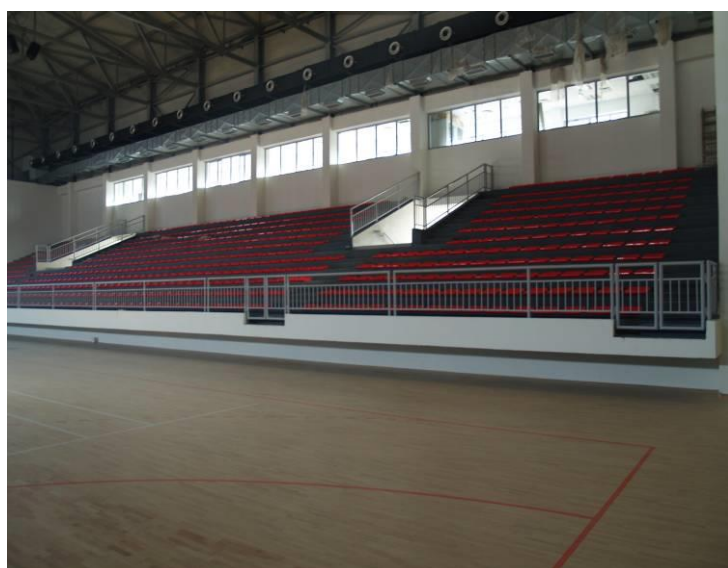

- Objekat sportske dvorane u Beranama smješten je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa u neposrednoj blizini gradskog stadiona.
- Projektovana bruto površina Sportske dvorane iznosi cca 5.350 m² i planirana je za održavanje međunarodnih rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica i drugih sportskih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 1.535 mjesta.
- U objektu su planirani i sljedeći sadržaji: fitnes centar, teretana, ambulanta, administrativni sadržaji, kafe restoran, lokali, svlačionice sa sanitarnim čvorom, prostorije za TV prenos, novinare i režiju, kao i ostali tehnički i prateći sadržaji.
- Realizacija ovog objekta odvija se fazno, u skladu sa dinamikom obezbjeđenja finansijskih sredstava.
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u 2008. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usled usaglašavanja projektne dokumentacije.
- U prethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali grube građevinske radove na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta.
- Radovi II faze koji se odnose na nastavak i završetak radova na objektu započeti su sredinom 2014. godine.
- Završeni su radovi na montaži čelične konstrukcije, krovnih i fasadnih panela, spoljne bravarije, kao radovi na izradi keramike, malterisanju, montaža tribinskih sjedišta i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija. U toku su završni molersko-farbarski i gipsarski radovi, isporuka namještaja i sportske opreme, radovi na povezivanju kotlovskog postrojenja i montaži instalaterske opreme, kao i radovi na uređenju terena.
- U 2016. godini realizovano je 1.576.103,11€.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje preostalih radova za stavljanje objekta u funkciju i završetak istih.

III.2. Sportska dvorana u Kotoru - izgradnja

Status projekta:

U toku

- Projekat izgradnje Sportske dvorane realizuje Opština Kotor i Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora, a sufinansira Vlada Crne Gore.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima.
- U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- U 2016. godini realizovano je ukupno 48.135,69€ preusmjeravanjem sredstva Zavodu za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti na izgradnji objekta.



III.3. Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom - izgradnja

Status projekta:

U toku

Fudbalski stadion na Cetinju

- Zaključkom Vlade Crne Gore od 26. decembra 2014. godine Fudbalski savez Crne Gore je zadužen da sprovede postupak odabira Izvođača radova, kao i da zajedno sa Prijestonicom Cetinje obezbijedi učešće u finansiranju u iznosu od najmanje 50% potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Preostala sredstva će biti obezbijeđena kroz Kapitalni budžet, u skladu sa mogućnostima, kao učešće Vlade Crne Gore u sufinansiranju projekta.
- I fazom planirana je izrada Glavnog projekta cjelokupnog stadiona i izvođenje radova na izgradnji jedne tribine i sanaciji postojećeg terena. Nakon završetka I faze radova, pristupit će se realizaciji II faze, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima.
- U 2015. godini započeta je izrada Glavnog projekta i isti je predat na reviziju.
- U 2016. nastavljene su i završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- U 2017. godini planirano je da Fudbalski savez Crne Gore raspiše javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova I faze i otpočne sa istima.

Pomoćni fudbalski teren na Žabljaku

- U prethodnom periodu izrađena je projektna dokumentacija i završeni pripremni radovi za ugradnju vještačke trave pomoćnog fudbalskog terena na Žabljaku.
- U 2016. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji vještačke podloge. U toku je žalbeni postupak.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak radova.



III.4. Bazen u Kotoru i Tivtu – rekonstrukcija i izgradnja

Status projekta:

U toku

Zatvoreni bazen „Nikša Bućin” u Kotoru

- Planirana je rekonstrukcija zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru, bruto površine cca 5.400 m².
- Objekat je koncipiran tako da su po etažama podjeljene zone objekta, a na samim etažama grupisane prostorije sa različitim organizacionim funkcijama.
- Na prizemnoj etaži su smještene četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana za treninge, sauna i tursko kupatilo sa zasebnim svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za građane, prostorije VK „Primorac” i tehničke prostorije.
- Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama.
- Tribine za gledaoce projektovane su za 1405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.
- U 2016. godini je završena procedura javnog nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze i potpisan ugovor sa izvođačem radova.
- Radovi I faze obuhvataju slijedeće: rušenja i demontaže, sanaciju armirano-betonske konstrukcije, sanaciju čelične konstrukcije, dogradnju objekta, krovopokrivačke radove i instalacije uzemljenja i gromobrana.
- Na zahtjev Korisnika, početak radova je odložen za mart 2017. godine.
- U 2016. godini relizovano je 9.945,00€.
- U 2017. godini planiran je početak i završetak izvođenja radova I faze, kao i raspisivanje javnog nadmetanja za najpovoljnijeg izvođača radova II faze i otpočinjanje istih.

Bazen u Tivtu

- U 2016. godini planirano je izvođenje radova na izgradnji bazena u Tivtu.
- Obaveza Opštine Tivat je da izradi i Direkciji javnih radova dostavi projektnu dokumentaciju za izgradnju bazena.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta s obzirom da nije dostavljena neophodna dokumentacija.

IV. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

IV.1. Sanitarne deponije, sanacija neuređenih odlagališta, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

U toku


- U prethodnom period, počev od 2008. godine, odvijale su se, a i dalje su u toku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i za izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za njihovu realizaciju iz domaćih izvora nedostatna, planirana je realizacija ovih projekata kroz instrument predpristupne pomoći IPA III „Regionalni razvoj”, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- Koordinator projekta izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Dokumentacija izrađena u prethodnom periodu koristila se u pregovorima oko kreditnih sredstava sa Evropskom investicionom bankom, kao i za razradu operativnog plana za korišćenje predpristupnih IPA fondova, čija realizacija je otpočela tokom 2015. godine.
- U 2016. godine završena je izrada: hidrotehničke studije za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinskog polja, Glavnog projekta rezervoara, pumpnih i hlornih stanica za unaprijeđenje vodovodnog sistema Berana, Cost-benefit analize sistema za odvođenje otpadnih voda u Plavu, ažuriranje Dugoročne projekcije vodosnabdijevanja Crne Gore, revizije Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže za odvođenje fekalnih voda u Plavu i Gusinju i Glavnog projekta kanalizacionog sistema urbanih otpadnih voda u opštini Rožaje.
- U toku je izrada projektne dokumentacije: Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije odlagališta Vasove Vode – Berane, Idejnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže – Kolašin, Glavnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u opštini Pljevlja, Transfer stanica – Mojkovac, Andrijevića, Plužine i Šavnik, izmjena i dopuna Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže Rožaje, kao i procedura javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta transfer stanice u Beranama.
- U 2016. godini realizovano je 370.679,60 €.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

IV.2. Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik - izgradnja

Status projekta:

U toku

- Projekat izgradnje kanalizacione mreže i PPOV u Opštini Šavnik se realizuje u saradnji sa Centrom za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-om) Republike Slovenije, sa kojim je Ministarstvo održivog razvoja i turizma potpisalo Donatorski Ugovor, sa učešćem od po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora.
- U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije koja je finansirana iz Kapitalnog budžeta.
- CMSR Republike Slovenije je izvršio izbor izvođača radova, zaključio Ugovor o građenju i svi radovi su završeni, osim sadnje projektovanog biljnog materijala koja je u skladu s ugovorom planirana na proljeće 2017. godine. Takođe, zaključen je i Anex Ugovora o građenju nove i rekonstrukciji dijela postojeće kanalizacione mreže neophodne za funkcionisanje PPOV, a koja je finansirana iz Kapitalnog budžeta. Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2016. godini realizovano je 309.718,85€.

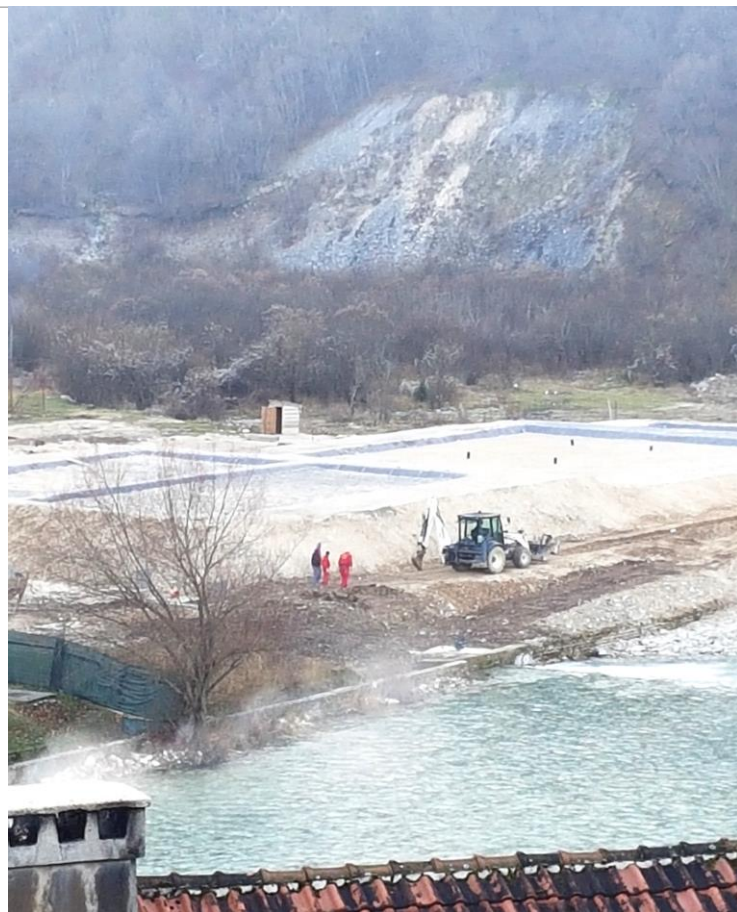

IV.3. Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada

Status projekta:

U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima u skladu sa kojima se realizuju projekti na sanaciji postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore.
- U 2016. godini relizovano je 122.218,52 €.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izrada Glavnog projekta sanacije postojećeg odlagališta "Vasove Vode" u Beranama

- Krajem 2015. godine raspisano je javno andmetanje za izrada dokumentacije Glavnog projekta sanacije postojećeg odlagališta "Vasove Vode" u Beranama i u toku je izrada i revizija iste.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta, kao i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji postojećeg odlagališta.

- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izvođenje hitnih interventnih mjera na lokaciji "Vasove Vode" u Beranama. Hitne interventne mjere obuhvatile su radove na izgradnji kolektora za nesmetano odvođenje voda Lučkog potoka koji je bio ugrožen čestim obrušavanjem otpada sa postojećeg odlagališta. Predmetnim mjerama spriječeno je obrušavanje otpada u Lučki potok i njegovo dalje raznošenje.
- Svi radovi su završeni.



Sanacija odlagališta otpada u Plavu

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učećem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova po sistemu „projektuj i izgradi” i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova na sanaciji odlagališta.

IV.4. Sanacija deponije na Žabljaku

Status projekta:

U toku

- U 2015. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa učećem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova po sistemu „projektuj i izgradi” i realizacija je otpočela krajem 2015. godine.
- U 2016. godini nastavljene su aktivnosti, izrađena je i revidovana projektna dokumentacija po kojoj su izvedeni radovi i isti su u završnoj fazi.
- U 2016. godini realizovano je 193.186,95€.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na sanaciji deponije.



IV.5. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti



- U prethodnom periodu, počev od 2014. godine završeni su radovi I faze, odnosno radovi na ulaznom portalu, izradi šipova, iskopu novog profila tunela i podgradi hidrotehničkog tunela u dužini od 350 m.
- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dijela radova II faze koja se odnosi na iskop i primarnu podgradu.
- U 2016. godini donešena je odluka o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova II faze na koju je uložena žalba i procedura kod Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki je u toku.
- Nakon završetka radova II faze stvoriće se uslovi za izradu projektne dokumentacije za preostale radove na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog tunela.
- U 2016. godini relizovano je 2.659,91€
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak radova i ugovornje i izrada projektne dokumentacije.

IV.6. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini odvijale su se aktivnosti na izgradnji vodovoda u Boanu–Opština Šavnik, Lovnici–Opština Rožaje, u Opštini Žabljak, Krkorima–Opština Andrijevića.
- U 2016. godini realizovano je 546.557,42 €.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Vodovod u Boanu, opština Šavnik

- Projekat izgradnje vodovoda realizovala je opština Šavnik u skladu sa potpisanim Protokolom.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.

Vodovod Ćosovsko vrelo - Lovnica, opština Rožaje

- U prethodnom periodu izrađen je Glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaze, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova II faze koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnadbijevanje MZ Gornja Lovnica.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.



Vodovod na Žabljaku

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta I faze izgradnje vodovoda i isto je u toku.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije.

Vodovod Krkori, opština Andrijevića

- U prethodnom periodu završeni su radovi na rekonstrukciji vodozahvata i izgradnji hlorne stanice na izvorištu Krkori, kao i radovi na izgradnji cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85km.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radova na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju hlorne stanice i spajanju vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom.
- Ugovor je potpisan i radovi su u završnoj fazi.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova na izgradnji vodovoda.



IV.7. Vodosnabdijevanje MZ Hoti (Drume i Traboin) - izgradnja

Status projekta:	U toku
------------------	--------

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji vodovoda u MZ Hoti, Gradska opština Tuzi, na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.
- Potpisan je Ugovor o građenju i izvođač je krajem 2016. godine uveden u posao, nakon što je JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica pribavilo građevinsku dozvolu.
- U 2016. godini relizovano je 59.325,24€.
- U 2017. godini planiran je nastavak i završetak izvođenja radova na izgradnji vodovoda.

IV.8. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda

Status projekta:	U toku
------------------	--------

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima u skladu sa kojima se realizuju projekti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sistema za odvođenje otpadnih voda.
- U 2016. godini relizovano je 49.200,00€.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja PPOV na Vranjini

- Potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa ušćem po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova po sistemu „projektuj i izgradi” i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova.

IV.9. Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevlja

Status projekta:	U toku
------------------	--------

- U 2016. godini sprovedene su planirane aktivnosti na izradi projektne dokumentacije toplane i gradskog toplovoda i kupovini briketa kao jednoj od mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima.
- Projekat koordinira Opština Pljevlja.
- U skladu sa potpisanim Protokolom opština Pljevlja je zadužena za izradu projektne dokumentacije toplane i magistralnog toplovoda za povezivanje sa kotlarnicom u Skerlićevoj ulici, kao i za reviziju istog. Izrada i Revizija Glavnog projekta je u toku i javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- Direkcija javnih radova je izvršila prenos sredstava u skladu sa Protokolom.
- U 2016. godini relizovano je 64.210,09€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak radova na izgradnji toplane i cjevovoda.

IV.10. Sanacija i čišćenje kanala Port Milena, Ulcinj

Status projekta:	Nijesu sprovedene aktivnosti
------------------	------------------------------

- Projektom sanacije i čišćenja kanala "Port Milena" u Opština Ulcinj koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane ministarstva.
- U 2017. godini, nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, planiran je nastavak aktivnosti.

V. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

V.1. Infrastruktura u MZ Bukovica – rekonstrukcija i izgradnja

Sta Status projekta:

Završeno



Radovi na rekonstrukciji infrastrukture u MZ Bukovica izvode se počev od 2008. godine i do kraja decembra 2016. godine ukupno je izgrađeno: 113 stambenih objekata ukupne površine 5.778,64 m² sa priključenjem istih na elektro i kanalizacionu mrežu; 71 pomoćni objekat površine 2.103,04m²; 28.635 m sekundarne mreže-prilaznih puteva; sanirano 18,5 km postojećeg asfaltnog puta; asfaltirano 8,5 km novog puta; nasuto i sanirano 54,4 km primarnih lokalnih puteva, sanirano i rekonstruisano 14 km elektrodistributivne mreže i završena izgradnja I faze puta tzv. „putni prsten” u dužini od 3.15 km.

- U 2016. godini nastavljeni su i završeni svi ugovoreni radovi na izgradnji 22 stambena objekta sa pomoćnim objektima.
- Takođe, u 2016. godini raspisana su javna nadmetanja i potpisani Ugovori o građenju za izvođenje radova na izgradnji preostalih stambenih objekata sa pomoćnim objektima za 6 porodica i sanaciju lokalnih puteva, u skladu sa usvojenim elaboratom iz 2008. godine.
- U 2016. godini relizovano je 641.442,10€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.

V.2. Elektrifikacija katuna u Rožajama - „Dobro Buče” i „Giljevo polje”

Status projekta:

Završeno

- Opština Rožaje sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta Elektrifikacija katuna u Rožajama „Dobro Buče” i „Giljevo polje” u skladu sa potpisanim Protokolom, a po principu „projektuj – izgradi”.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, potpisan je ugovor i radovi su otpočeli krajem godine. Za elektrifikaciju i obezbeđenje napajanja električnom energijom katunskog naselja Giljevo polje planirana je izgradnja dalekovoda 10 kV Balotiće - Giljevo polje, dužine 1350m sa izgradnjom niskonaponske mreže sa samonosivim kablovskim snopom ukupne dužine 2100 m. Za katunsko naselje Dobro buče je predviđen razvod niskonaponske mreže ukupna dužin 1950 m.
- U skladu sa Zaključkom Vlade br: 08-3354 od 23.12.2016. godine, izvršen je prenos sredstava Opštini Rožaje za dalju realizaciju Ugovora o izvođenju radova na projektu.
- U 2016. godini relizovano je 242.760,00€.

V.3. Rekonstrukcija “Ribarske” ulice u Opštini Plav

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti

- U 2015. godini završena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Ribarske ulice u Opštini Plav i zaključen je Ugovor za izvođenje radova.
- U 2016. godini dobijena je građevinska dozvola od strane Opštine Plav, ali usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa izvođač nije mogao biti uveden u posao.
- U 2017. godinim, nakon što se rješe imovinsko-pravni odnosi, planiran je početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice.

V.4. Rekonstrukcija ulice “Đeda Vojvodića” u Beranama

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice “Đeda Vojvodića” u Opštini Berane i potpisan je Ugovor o građenju.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda i glavnog fekalnog kolektora.
- U 2016. godini relizovano je 49.068,32€
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice.



V.5. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu

Status projekta:

U toku



- U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija za potrebe izgradnje šetališta pored rijeke Tare od strane Opštine Mojkovac.
- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova I faze koji se odnose na izvođenje hidrotehničkih instalacija (vodovod, atmosferska i fekalna kanalizacija) kao i na radove na izgradnji donjeg stroja.
- U 2016. godini započeti su radovi I faze i isti su završeni krajem oktobra 2016. godine.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova II faze koja obuhvata izgradnju gornjeg stroja i javne rasvjete.
- Zaključen je ugovor o građenju, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova izvođač nije uveden u posao.
- U 2016. godini relizovano je 154.137,57€.
- U 2017. godini planirani su radovi II faze i stavljanje šetališta u funkciju.

V.6. Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice

Status projekta:

U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima u skladu sa kojima se realizuje izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice.

- Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije od strane ministarstva, započelo se sa aktivnosti na realizaciji.
- Nakon dostavljanja projektnog zadatka, raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Mojковаčke ulice i magistralnog puta M 21 u Bijelom Polju.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta raskrsnice Mojковаčke ulice i magistralnog puta M 21 u Bijelom Polju i nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice.




V.7. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

- U 2017. godini za projekta Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema realizovano je ukupno 3.202.468,92 €.

V.7.1.Lokalni putevi

Status projekta:

U toku

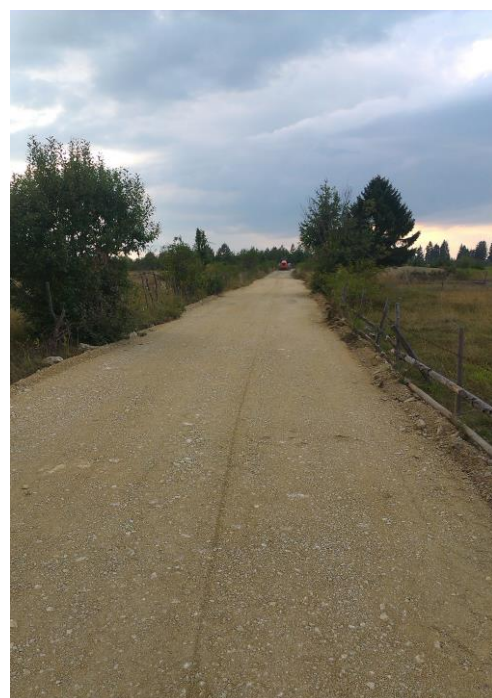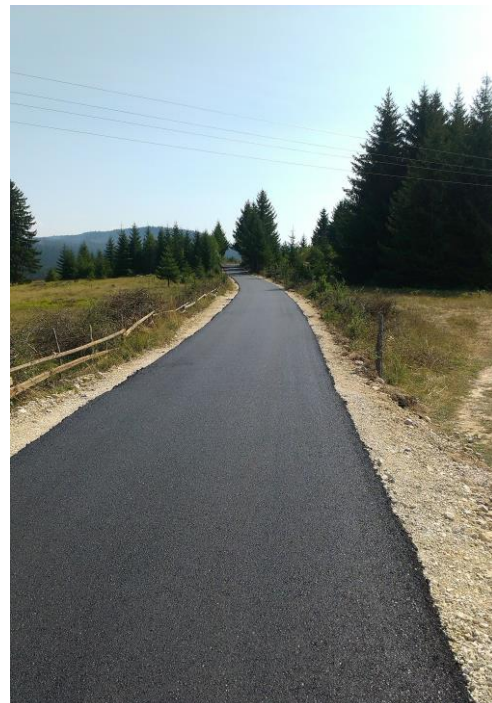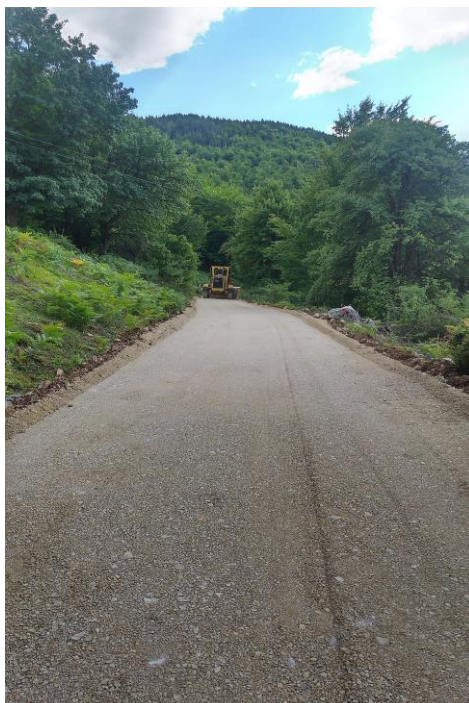

- U 2017. godini za projekta Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema realizovano je ukupno 3.202.468,92 €.
- U 2016. godini sprovedene su aktivnosti na modernizaciji lokalnih puteva po prioritetima koje određuje lokalna uprava. Ukupno je realizovano 17,67km.
- U 2016. godini završeni su radovi u opštinama Mojkovac(1,5km), Pljevlja(1,5km), Gusinje(2km), Šavnik(1,5km), Nikšić(1,5km), Rožaje(1,5km), Danilovgrad(1,5km), Plav(1km), Cetinje(1,5km) i Kotor (1km).
- U Bijelom Polju od ukupno 1km završeno je 0,87km, u Petnjici od ukupno 2,5km završeno je 1,9km i u Plužinama od ukupno 1km završeno je 0,4km.
- Preostalo je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u Bijelom Polju, Petnjici, Beranama, Kolašinu i Plužinama, a u toku je javno nadmetanje za izvođenje radova u Ulcinju.
- U 2016. godini realizovano je 747.589,28€.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova na modernizaciji lokalnih puteva.

V.7.2. Gradske saobraćajnice

- U 2016. godini sprovedene su aktivnosti na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica po prioritetima koje određuje lokalna uprava.
- U 2016. godini realizovano je 2.454.879,64€.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica po prioritetima lokalne uprave.

V.7.2.1. Gradske saobraćajnice u Bijelom Polju - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju "Mojkovačke" ulice i ulice "Lenke Jurišević" u Opštini Bijelo Polje.
- Krajem 2015. godine započeti su radovi na rekonstrukciji ulice "Lenke Jurišević" i isti su nastavljeni i završeni u 2016. godini.
- Krajem 2015. godine otpočeli su radovi na rekonstrukciji "Mojkovačke" ulice i isti su zbog vremenskih uslova obustavljeni.
- U 2016. godini radovi su nastavljeni i svi ugovoreni radovi su završeni.
- Takođe, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za dodatne radove.
- Radovi su ugovoreni i isti će biti nastavljeni u 2017. godini kada se steknu povoljni vremenski uslovi.
- Takođe, krajem 2016. god. raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u centralnoj gradskoj zoni.
- U 2016. godini realizovano je 548.501,97€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak izvođenja radova na rekonstrukciji trotoara.



V.7.2.2. Gradska saobraćajnica u Plavu - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku


- U periodu do 2016. godine potpisan je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Plav - Vojno selo - Gusinje u dužini od 12 km uključujući alternativnu dionicu puta od Jezerske ulice do Vojnog sela.
- U 2016. godini nastavljene su aktivnosti na izradi Glavnog projekta Plav - Vojno selo – Gusinje i isti je završen i revidovan.
- Takođe, u 2016. godini na osnovu liste prioriteta dostavljene od opštine Plav, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju gradskih saobraćajnica i isto je u toku.
- U 2016. godini relizovano je 34.922,05€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak izvođenja radova.

V.7.2.3. Gradske saobraćajnice u Andrijevici – rekonstrukcija

Status projekta:

U toku



Rekonstrukcija glavnog gradskog trga

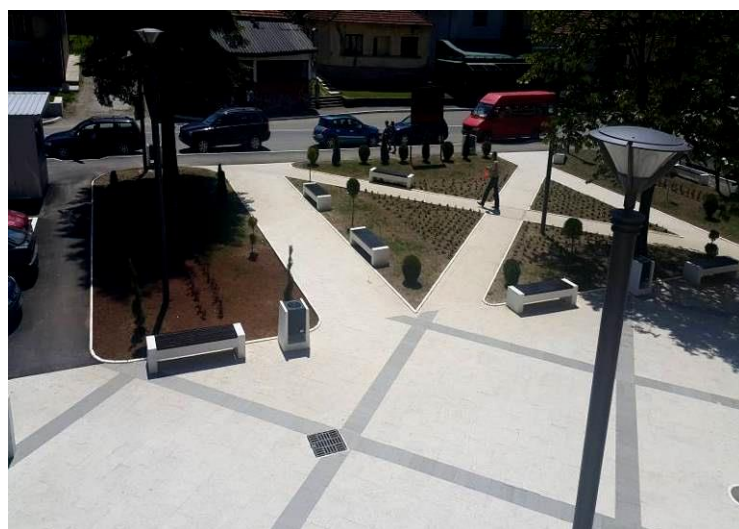

- Rekonstrukcija glavnog trga u Andrijevići obuhvata rekonstrukciju užeg gradskog jezgra, trga i parka sa fontanom i realizovana je po principu „projektuj i izgradi”.
- U 2015. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta i završeni su svi radovi koji su se odnosili na izgradnju trga i parka sa pristupnim pješačkim stazama i saobraćajnicama, kao i rasvjetom. Preostali su radovi na oblaganju fontane, montaži mobilijara, kao i radovi hortikulture.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni svi preostali radovi na uređenju užeg gradskog jezgra, završen tehnički pregled i izdata upotrebna dozvola.

Gradske saobraćajnice

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Andrijevica, shodno prioritetima lokalne uprave. Nakon što je potpisan Ugovor o izvođenju radova i izvođač uveden u posao završeni su radovi na polaganju hidrotehničkih i elektroinstalacija, betonski ivičnjaci i trotoari, dok se asfaltni radovi nijesu mogli izvoditi usljed nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice.
- U 2016. godini realizovano je ukupno 103.575,25€.

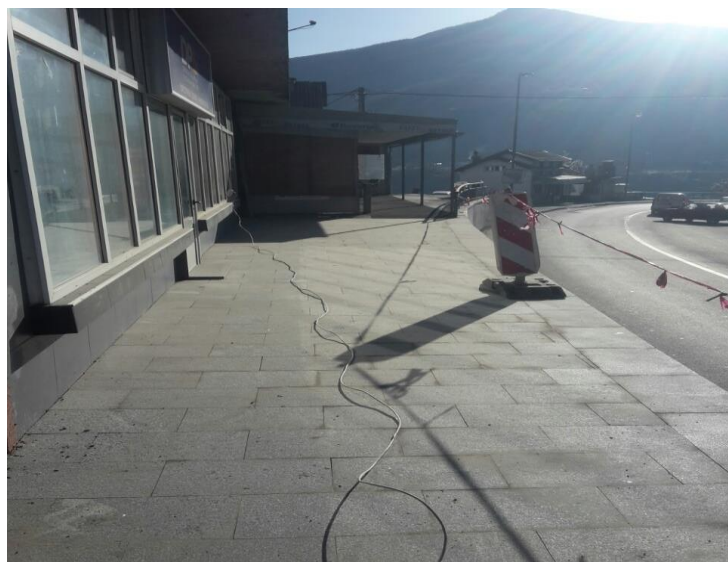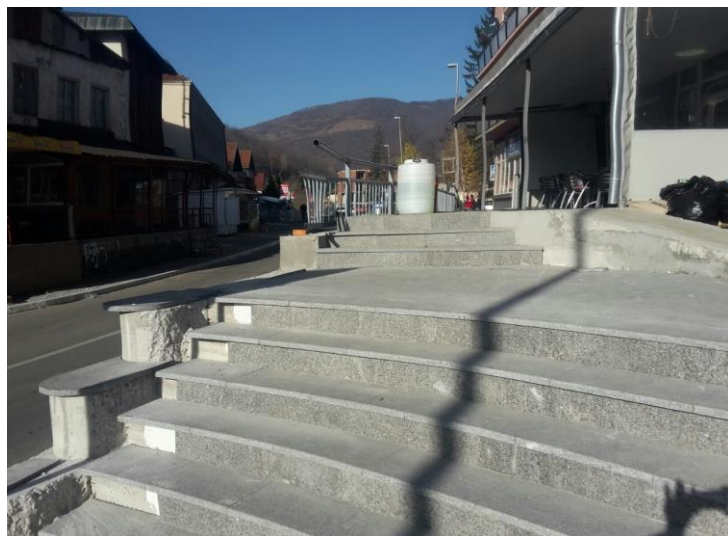

V.7.2.4. Gradska saobraćajnica u Pljevljima - rekonstrukcija

Status projekta:

U toku



- U 2015. godini ugovoreni su i započeti radovi na rekonstrukciji "Treće Sandžačke" i „Volođine ulice“ u Opštini Pljevlja.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radovi na rekonstrukciji "Treće Sandžačke" ulice, kao i radovi na rekonstrukciji „Volođine ulice“.
- Takođe, u skladu sa prioritetima opštine Pljevlja raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju ulice u naselju "Potrlica".
- Zaključen je ugovor o građenju, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova izvođač nije uveden u posao.
- U 2016. godini relizovano je 259.344,26€.
- U 2017. godini planiran je početak i zaršetak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice u naselju "Potrlica".

V.7.2.5. Gradska saobraćajnica u Šavniku – rekonstrukcija

Status projekta:

Završen

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Šavniku.
- Ugovor o izvođenju radova je potpisan i svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2016. godini relizovano je 182.878,07€.

V.7.2.6. Gradska saobraćajnica na Cetinju – rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Krajem 2015. godine Opština Cetinje je dostavila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju "Bajove ulice", nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze.
- Početkom 2016. godine donešana je odluka o izboru izvođača na koju je uložena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki. Nakon završetka procedure javnog nadmetanja, potpisan je Ugovor i izvođač je uveden u posao. Završeni su radovi na priključnoj saobraćajnici-Hercegovačka ulica i izvođe se radovi na izradi hidrotehničkih i telekomunikacionih instalacija.
- Krajem 2016. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze.
- Takođe, izvođeni su radovi na sanacija gradskih saobraćajnica u naselju Grude, koje je u skladu sa Protokolom realizovala Opština Cetinje.
- U 2016. godini relizovano je 473.040,42 €.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice.




V.7.2.7. Gradska saobraćajnica u Nikšiću – rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova za nastavak rekonstrukcije Bulevara „13. Jul” u Nikšiću u dužini od 1.200 m, potpisan je Ugovor o građenju i radovi su započeti u oktobru mjesecu.
- U toku je izvođenje radova na izradi hidrotehničkih instalacija.
- U 2016. godini relizovano je 58.224,04€.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice.

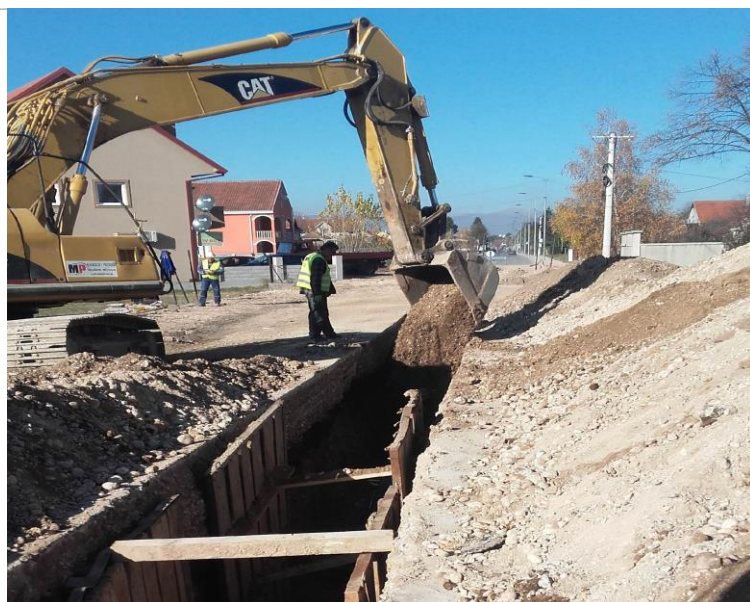

V.7.2.8. Gradska saobraćajnica u Ulcinju – rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Sredinom 2015. godine Opština Ulcinj je dostavila Projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove za izradu konzervatorskog projekta za sanaciju kaldrme u Starom Gradu na osnovu kojeg je Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- Takođe, započete su aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze.
- U 2016. godini relizovano je 24.500,00 €.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenedrske procedure, planiran je početak izvođenja radova I faze.

V.7.2.9. Gradska saobraćajnica u Baru – rekonstrukcija

Status projekta:

Završeno



- U 2016. godini započeti su i završeni svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u naselju Rutke (lijevi krak) u Sutomoru.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji parkinga u naselju Rutke - Pobrđe (krak desno) u Sutomoru i potpisan ugovor sa izvođačem.

- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2016. godini relizovano je 245.000,99€.

V.7.2.10. Gradske saobraćajnice u Podgorici - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica

Status projekta:	Završeno
-------------------------	----------

- U 2016. godini nastavljena je i završena izrada Glavnog projekta saobraćajnice od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Goričani.
- Takođe, u 2016. godini, nakon ponovljenog javnog nadmetanja, potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Cvijetne ulice na Starom aerodromu i izrada iste je završena.
- U 2016. godini relizovano je 66.786,00 €.

V.7.2.11. Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – rekonstrukcija Glavnog gradskog mosta

Status projekta:	U toku
-------------------------	--------

- Projekat rekonstrukcije Glavnog gradskog mosta preko rijeke Zete sprovodi opština Danilovgrad u skladu sa potpisanim protokolom.
- U 2016. godini opština je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Glavnog gradskog mosta, potpisan je ugovor i u toku su završne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2016. godini relizovano je 41.720,00 €.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje i završetak izvođenja radova na izgradnji mosta.

V.7.2.12. Gradska saobraćajnica na Žablaku – rekonstrukcija

Status projekta:	U toku
-------------------------	--------

- U 2015. godini na osnovu potpisanog Protokola između Ministarstva finansija, Opštine Žabljak i Direkcije javnih radova, Opština Žabljak je potpisala Ugovor za rekonstrukciju ulice "Vuka Karadžića" do ulice "Moše Pijade". Svi ugovoreni radovi su završeni i Direkcija javnih radova je izvršila transfer sredstava za izvedene radove.
- Takođe, nakon završene procedure javnog nadmetanja potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela ulice "Baja Pivljanina" i u toku je izrada hidrotehničkih instalacija.
- U 2016. godini relizovano je 411.031,59 €.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice.

V.7.2.14. Gradska saobraćajnica u Rožajama

Status projekta:	Završen
-------------------------	---------

- Aktivnosti na realizacija projekta rekonstrukcije ulice Carine u opštini Rožaje sprovedene su tokom 2014., 2015. uz učešće Opštine Rožaje.
- Takođe, i u 2016. godini izvođeni su radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice za koje je sredstva obezbjedila Opština Rožaje, dok Direkcija javnih radova obezbjedila stalni stručni nadzor.
- U 2016. godini relizovano je 5.355,00€.

VI. I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA

VI.1. Zavod za transfuziju krvi u Podgorici - plaćanja naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta

Status projekta:

Završeno


- U 2015. godini, u krugu Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, izgrađen je objekat Nacionalnog centra za transfuziju krvi, bruto površine cca 3.000 m² i spratnosti suteran, prizemlje i četiri sprata.
- Završeni su svi Ugovoreni radovi, kao i ugradnja medicinske opreme i laboratorijskog namještaja koji su obezbijeđeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije.
- Sredstva realizovana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu odnosila su se na preostalo plaćanje naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta.
- U 2016. godini realizovano je 10.824,34€.

VI.2. Poliklinički centar sa Urgentnim centrom u Beranama - opremanje

Status projekta:

U toku

- Projektnom dokumentacijom je predviđena dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta krila „B” za potrebe Doma zdravlja i Opšte bolnice u Beranama, lociranog u okviru DUP-a „Medicinski centar”.
- Ukupna bruto površina objekta, sa novoprojektovanom prizemnom toplom vezom sa postojećim objektom Opšte Bolnice, iznosi cca 3.113 m².
- Dio objekta koji pripada Domu zdravlja sadrži prizemlje i tri sprata, i korisne je površine cca 1.115m². U ovom dijelu je planiran smještaj Centra za djecu sa posebnim potrebama, Centra za mentalno zdravlje, Centra za prevenciju, Službe za fizikalnu terapiju, mikrobiologiju i parazitologiju, kao i higijensko epidemiološke službe sa pratećim prostorijama (arhive, magacini, komunikacije, sanitarne prostorije, garderobe, tehničke prostorije).
- Drugi dio objekta sadrži prizemlje i dva sprata i korisne je površine cca 1.290 m². Ovaj dio objekta pripada Opštoj bolnici i ovdje je predviđen smještaj ambulant (hirurška, ortopedska, pedijatrijska, ORL, neurološka i ginekološka), apoteke i prostorija za administraciju sa salom za sastanke i pratećim sadržajima.
- Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su za opremanje objekta potrebnim namještajem i opremom u cilju njegovog puštanja u funkciju.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje po partijama za zbor najpovoljnije ponude za opremanje objekta kancelarijskim i bolničkim namještajem i medicinskom opremom.
- Opremanje kancelarijskim i bolničkim namještajem i isporuka laboratorijskih inkubatora je završena.
- Nakon što je javno nadmetanje za nabavku i isporuku EKG aparata, aparata za ultrazvučnu dijagnostiku, monitora za praćenje pacijenta i mikrobiološku laboratorije regionalnog nivoa poništeno, isto je ponovo raspisano i u toku je.
- U 2016. godini realizovano je 163.525,54€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenederske procedure, planiran je nastavak aktivnosti na opremanju objekta.

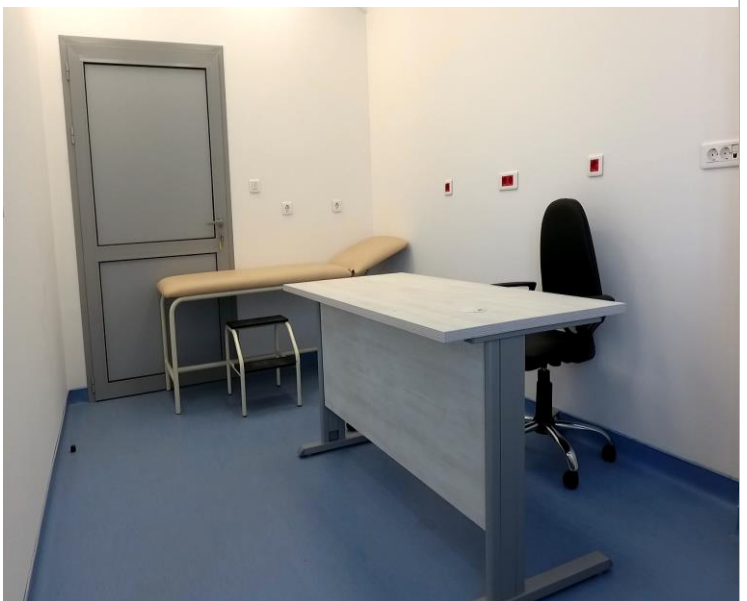

VI.3. Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu

Status projekta:

Završen

- Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 06-164/4 od 16. februara 2012. godine, prihvaćen je Sporazum o realizaciji programa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.
- Protokolom br. 19/2-01-3401/1 od 12.02.2013. godine, zaključenim između Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Direkcije javnih radova, definisano je da sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu Direkcija javnih radova transferiše Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore.
- Izvršen je transfer sredstava i projekat je realizovan.
- U 2016. godini relizovano je 50.000,00€.

VII. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

VII.1. Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama - izgradnja

Status projekta:

Završen



- Objekat Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Opštini Rožaje je ukupne bruto površine 485 m², spratnosti prizemlje i potkrovlje.
- U 2013. godini Opština Rožaje je dostavila projektnu dokumentaciju Direkciji javnih radova na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova i krajem 2013. godine je potpisan Ugovor sa Izvođačem radova. Radovi nisu otpočeli jer Opština Rožaje nije pribavila građevinsku dozvolu.
- U cilju pribavljanja građevinske dozvole bilo je potrebno izvršiti doradu projektne dokumentacije. Dorada projektne dokumentacije izvršena je tokom 2015. godine tako da je građevinska dozvola izdata u septembru 2015. godine, kada su se stekli uslovi za početak radova I faze. Radovi I faze su obuhvatali građevinske, građevinsko-zanatske radove, radove na razvodu instalacija u objektu.
- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova II faze, koji su obuhvatali završne instalaterske radove u objektu, radove na uređenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka, kao i radove na opremanju objekta. Ugovor o izvođenju radova II faze potpisan je početkom 2016. godine i svi ugovoreni radovi su završeni.
- Završen je tehnički prijem objekta i isti je predat Korisniku na upotrebu.
- U 2016. godini relizovano je 264.889,66€

VII.2. Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija

Status projekta:

Završen

- Projekat koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br: 08-2577 od 30. decembra 2016. godine Vlada je prihvatila Ugovor o kupovini stambenih jedinica za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore, između "Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju", društvo sa ograničenom odgovornošću, za udruživanje sredstava i promet stambenim i poslovnim prostorom- Podgorica i Vlade Crne gore- Ministarstvo finansija- Uprava za imovinu u iznosu od 299.270,00€, sredstva koja su predviđena Kapitalni budžetom Direkcije javnih radova za 2016. godinu.
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-1432 od 19. maja 2016. godine zadužuje se Direkcija javnih radova da s pozicije – Uštede u 2016. godini prenese Opštini Bijelo Polje sredstva, u iznosu od 180.000,00 eura za izgradnju stambenih objekata za pripadnike romske populacije, na žiro račun broj 550-5376-57 kod Societe Generale Montenegro banke, a Opštini Mojkovac sredstva, u iznosu od 120,000,00 eura, na žiro račun broj 535-14691-44 kod Prve banke Crne Gore, za rješavanje stambenih potreba korisnika socijalne zaštite.
- U 2016. godini relizovano je 599.270,00€

VII.3. Dom starih u Podgorici – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Prema usvojenom Idejnom rješenju, Dom za stare osobe u Podgorici spratnosti je: podrum, prizemlje i 3 sprata, ukupne bruto površine 11.230 m².
- Objekat je predviđen za boravak 270 korisnika, a pored smještajnih jedinica sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, prostorije za upravu, medicinski blok, prateće tehničke prostorije. Objekat sadrži odvojene cjeline za dementne korisnike i za korisnike koji su na dnevnom boravku.


- U 2015. godini usaglašen je projektni zadatak sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Glavnim gradom, nakon čega je Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U toku 2016. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2016. godini realizovano je 87.281,74€.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji objekta i početak istih.

VIII. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE

VIII.1. Akademije umjetnosti na Cetinju - izgradnja

Status projekta:

U toku

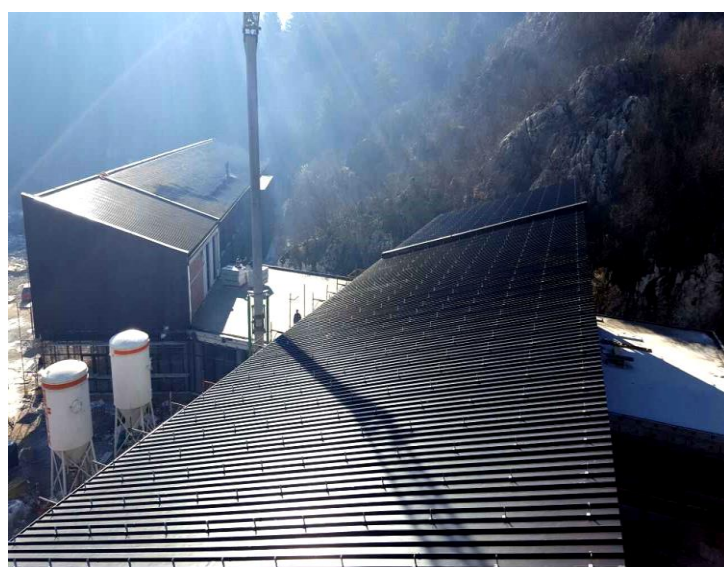

- Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti je planirana na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”.
- Predmetna lokacija zahvata površinu od 3.15 ha.
- U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmansi smještaj i Objekti zajedničkih sadržaja.
- Bruto površina kompleksa iznosi cca 22.086 m².
- Realizacija ovog projekta planirana je i odvija se fazno.
- Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok, ukupne bruto površine 4.980 m². Objekat zajedničkih kulturnih sadržaja je bruto površine 1.010 m² sa sljedećim sadržajima: izložbeni i multimedijalni prostori, knjižara i administrativni blok sa pratećim sadržajima. Podzemna garaža je bruto površine 3.970 m², kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže predviđen je i energetske blok sa tehničkim prostorijama.
- Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, kao sljedeća faza realizacije projekta planirana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Nakon završene procedure javnog nadmetanja Direkcija javnih radova je početkom oktobra 2015. godine potpisala Ugovor o građenju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Projektovana bruto površina objekta iznosi oko 5.100 m². Objekat je razuđene osnove različite spratnosti i sastoji se od prizemlja, jednog i dva sprata. Jedan dio objekta se zadržava kao revitalizovano nasljeđe industrijske arhitekture nekadašnjeg „Oboda”, dok ostalo predstavlja novoizgrađenu strukturu. Objekat je predviđen za održavanje nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, dizajna i fotografije.
- U 2016. godini nastavljeni su radovi na izgradnji Fakulteta likovnih umjetnosti i do sada su završeni zemljani i radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i krovnog pokrivača, zidarski radovi. U toku su završni radovi na izradi fasade, montaži spoljne bravarije, malterisanju i grubom razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje i mašinskih instalacija.
- Direkcija javnih radova je, nakon završetka tenderske procedure u aprilu 2015. godine potpisala Ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa. U predhodnom periodu završeni su građevinsko zanatski, instalaterski i radovi na montaži kotlovskog postrojenja za objekat kotlarnice kao i dio radova na infrastrukturnim priključcima kompleksa. U toku su završni radovi na polaganju VN i TK kabla.
- U 2016. godini realizovano je 1.734.383,97€
- U 2017. godini planiran je završetak radova na infrastrukturnim priključcima i nastavak aktivnosti na izgradnji objekta Fakulteta likovnih umjetnosti, kao i

VIII.2. Dječiji vrtići iz kredita CEB-a – izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcija

Status projekta:

U toku

- Sredinom juna 2013. godine Administrativni odbor Razvojne banke Savjeta Evrope je odobrio kreditnu liniju za izgradnju dječijih vrtića u iznosu od 10 miliona eura, na osnovu čega je potpisan Ugovor o uslovima i načinu korišćenja kreditnih sredstava.
- Tokom realizacije projekta planirano je da Direkcija javnih radova bude jedinica za implementaciju projekta, Ministarstvo prosvjete u ulozi Agencije za implemetaciju projekta, a Ministarstvo finansija korisnik kredita.
- Iz sredstava kredita je planirana izgradnja 7 novih vrtića, i to: 4 u Podgorici i po jedan vrtić u Baru, Ulcinju i Pljevljima.
- U 2016. godini relizovano je 898.569,00 €.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

VIII.2.1. Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica

Status projekta:

U toku

- Izgradnja objekta vrtića na Starom Aerodromu u Podgorici predviđena je na uglu "Cvijetne ulice" i Ulice "Mirka Banjevića" u Podgorici.
- Objekat sadrži prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 3.000 m² i planiran je za boravak 375 djece.
- U objektu su predviđeni sljedeći sadržaji: radne soba za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, fiskulturna sala, biblioteka, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 3000 djece (tri obroka dnevno) i koja će zadovoljiti potrebe na nivou Javne ustanove "Đina Vrbica", kao i vešeraj za potrebe 3000 djece, sa svim pratećim sadržajima.
- U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije, a nakon što na raspisano javno nadmetanje nije bilo ispravnih isto je ponovno raspisano.
- U 2016. godini, nakon završetka žalbene procedure kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, po žalbi od jednog od ponuđača, donijeto je rješenje o dodjeli ugovora. U toku je žalbeni rok.
- U 2016. godini relizovano je 3.718,10€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak radova na izgradnji objekta.



VIII.2.2. Vrtić u Zagoriču, Podgorica

Status projekta:

Završen





- Izgradnja objekta vrtića u Podgorici je predviđena je u ulici "Velimira Stojanovića" u Zagoriču u Podgorici.
- Objekat sadrži prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 1.400 m² i planiran je za boravak 200 djece.
- U objektu su predviđeni sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajnu kuhinju, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova i potpisan je Ugovor o građenju.
- Sa radovima se otpočelo krajem decembra 2015. godine.

- U 2016. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova i isti su završeni. Nakon pribavljanja upotrebne dozvole objekat je predat Korisniku na upotrebu.
- U 2016. godini relizovano je 885.919,65€.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak radova na izgradnji objekta.

VIII.2.3. Vrtić u Baru

Status projekta:	U toku
------------------	--------

- Izgradnja objekta vrtića u Baru predviđena je u neposrednoj blizini osnovne škole u Baru.
- Objekat sadrži prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 2.960 m² i planiran je za boravak 370 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, sala za zajedničke aktivnosti, biblioteka, kuhinja sa svim pratećim prostorijama za cca 600 obroka, prostorije za trijažu i ostale tehničke prostorije.
- U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova i isto je poništeno.
- U martu 2015. godine je ponovno raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova, a nakon donošenja odluke o izboru izvođača radova je donijeta u julu 2015. godine, na istu je uložena žalba. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je proceduru vratila na ponovno vrednovanje, nakon čega je nova odluka donijeta u oktobru 2015. godine na koju je takođe uložena žalba.
- U 2016. godini, nakon dostavljanja Rješenja Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, izvršeno je ponovno vrednovanje pristiglih ponuda i javno nadmetanje je poništeno.
- U toku su pripremne aktivnosti za ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova u skladu sa novim pravilima Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB).
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak izvođenja radova na izgradnji objekta.

VIII.2.4. Vrtić u Ulcinju

Status projekta:	U toku
------------------	--------

- Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 978 m² i planiran je za boravak 123 djece.
- U drugoj polovini 2015. godine Opština Ulcinj je donijela odluka o ustupanju lokacije na kojoj će se graditi objekat.
- Ministarstvo prosvjete koordinira aktivnosti na administrativnim procedurama za prenos vlasništva nad zemljištem na kojem će biti izgrađen objekat i iste su u toku.
- U 2017. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta za vrtić u Ulcinju.

VIII.2.5. Vrtić u Pljevljima

Status projekta:

U toku

- Izgradnja objekat vrtića u Pljevljima predviđena je u naselju Guke.
- Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², za smještaj 67 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 400 djece (tri obroka dnevno), koja će zadovoljiti potrebe na nivou JU „Eko bajka” u Pljevljima.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta.
- Nakon što je sprovedena procedura Konkursa i javnog nadmetanja, potpisan je Ugovor o izradi Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog Konkursnog rješenja. U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, kao i ugovaranje i početak izvođenja radova na izgradnji objekta.



VIII.2.6. Vrtić u Bloku VI, Podgorica

Status projekta:

U toku

- Izgradnja vrtića predviđena je u naselju Blok VI u Podgorici.
- Objekat će biti ukupne bruto površine cca 1.515 m² i planiran je za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajnu kuhinju, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i na isto je uložena žalba.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI, a Direkcija javnih radova je ponovno raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i na isto je uložena žalba.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje i početak radova na izgradnji objekta.

VIII.2.7. Vrtić u Tuzima

Status projekta:

U toku

- Objekat vrtića će biti ukupne bruto površine cca 1.700 m², i planiran je za boravak 243 djece.
- Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektni zadatak u decembru 2015. godine, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta i u toku je revizija istog.
- U 2016. godini relizovano je 8.931,25€.

VIII.2.8. Rekonstrukcija vrtića

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini planirano je raspisivanje javnih nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacija za rekonstrukciju više vrtića po prioritetima Ministarstva prosvjete.
- Nakon dostavljanja projektnih zadataka od strane Ministarstva prosvjete pristupiće se raspisivanju javnih nadmetanja.

VIII.3. Objekti obrazovanja u Herceg Novom

Status projekta:

U toku

- Zaključkom Vlade br. 08-1986 od 11.07.2016 i njegovom izmjenom i dopunom od 01.09.2016 godine Vlada je zadužila DJR da sprovede postupke javnih nabavki i izabere projektante, revidente i izvođače na sanaciji klizišta i objekta OŠ "Milan Vuković i JPU „Naša radost“ na Savini, opština Herceg Novi.
- U 2016. godini relizovano je 301.984,19€

Osnovna škola „Milan Vuković“ na Savini, Opština Herceg Novi - adaptacija

- U 2016. godini izvedeni su radovi na zamjeni rasvjetnih tijela, adaptaciji sanitarnih prostorija, zamjeni dijela fasadne bravarije, izradi mokrog čvora za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, zamjena krovnog pokrivača na muzičkoj sali.
- U 2017. godini planiran je nastavak i završetak izvođenja radova.



Sanacija klizišta objekta JPU „Naša radost“ na Savini

- U 2016. godini urađen je Glavni projekat za sanaciju klizišta i u toku je revizija istog.
- U 2017. godini planiran nastavak aktivnosti.

Sanacija klizišta objekta OŠ „Milan Vuković“ na Savini

- Raspisan tender za izbor obrađivača Glavnog projekta sanacije klizišta.
- U 2017. godini planiran nastavak aktivnosti.

Rekonstrukcija područne ustanove OŠ „Milan Vuković“ - Zadužbina porodica Bošković, Đurović i Laketić

- Upućen zahtjev Ministarstvu prosvjete za dostavljanje UTU-a i projektnog zadatka.
- Nakon dostavljanja potrebnih podataka, raspisaće se javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg obrađivača Glavnog projekta.
- U 2017. godini planiran nastavak aktivnosti.

VIII.4. Vrtić u Rožajama – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:	U toku
-------------------------	--------

- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta za Vrtić u Rožajama.

VIII.5. OŠ u Karabuškom polju, Tuzi – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:	U toku
-------------------------	--------

- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta za Osnovnu školu u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi.

VIII.6. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Status projekta:	U toku
-------------------------	--------

- U 2015. godini usaglašen je Projektni zadatak sa korisnicima objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, nakon čega je u septembru 2015. godine Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije.

- Izbor najpovoljnijeg ponuđača je prolongiran usled žalbi koje su riješene krajem decembra 2016. godine.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije.

VIII.7. Srednja stručna škola u Golubovcima - izgradnja

Status projekta:

U toku

- Planirani objekat Srednje stručne škole u Golubovcima, ukupne bruto površine oko 5.480 m², sastoji se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu su predviđene nastavne prostorije, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina do 500 gledalaca.
- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- U 2016. godini donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Srednje stručne škole u Golubovcima.
- Zaključkom Vlade br. 08-858 od 08. maja 2015. godine Direkcija javnih radova je zadužena da sprovede proceduru javnih nabavki za izgradnju novog antenskog stuba Radio-difuznog centra umjesto postojećeg koji se nalazi na lokaciji planiranog objekta.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju novog antenskog stuba, potpisan je ugovor sa Izvođačem radova i izvođenje radova su u toku.
- Prema zaključku Vlade Crne Gore br: 08-2507 od 15.09.2016 godine. Direkcija javnih radova je zadužena da sredstvima iz Kapitalnog budžeta izmiri obaveze po osnovu poravnjenja u postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava bivšim vlasnicima nepokretnosti na kojoj je planirana izgradnja škole. Postupak je u toku.
- U skladu sa Zaključkom Vlade br. 08-3041 od 8. decembar 2016. Godine, izvršen je prenos sredstava po osnovu poravnjenja u postupku oduzetih imovinskih prava bivšim vlasnicima nepokretnosti.
- U 2016. godini relizovano je 771.821,72€.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na uklanjanju postojećeg i izgradnji novog antenskog stuba, kao i početak izvođenja radova na izgradnji objekta.



VIII.8. Rekonstrukcija OŠ u Kotoru – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

Završeno

- Kapitalnim budžetom za 2016. godinu bila je planirana izrada Glavnog projekta rekonstrukcije JU OŠ "Savo Ilić" u Kotoru.
- Korisnik je koordinirao izradom projektne dokumentacije koja je i završena.
- U 2016. godini realizovano je 40.000,00 €.

VIII.9. Osnovna škola u Gukama, Opština Pljevlja - izgradnja

Status projekta:

U toku



- Izgradnja Osnovne škole u Gukama u Opštini Pljevlja realizuje se fazno.
- U 2011. godini je završena I faza radova koja je obuhvatila izgradnju Lamele „A” u okviru koje su učionice.
- U 2015. godini potpisan je Ugovor sa izvođačem radova za realizaciju II faze kojom je planirana izgradnja Lamele „B” – administrativni dio i Lamele „C” – fiskulturna sala.
- U 2016. godini, nakon pribavljanja građevinske dozvole, započelo se sa izvođenjem radova. Završeni su radovi na izradi armiranobetonske i čelične krovne konstrukcije, izrada krovnog pokrivača, zidarski radovi, malterisanje, keramičarski radovi i izrada termo izolovane fasade. U toku je izvođenje molersko farbarskih radova, radova na uređenju terena, kao i pratećih instalaterskih radova.
- U 2016. godini realizovano je 668.462,93€
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na izgradnji objekta.

VIII.10. Osnovna škola u Tološima, Podgorica – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti

- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji projekta, s obzirom da potrebna dokumentacija nije dostavljena od strane korisnika.
- U 2017. godini, nakon pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova i definisanja Projektnog zadatka od strane Ministarstva prosvjete, pristupiće se raspisivanju konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i izradu Glavnog projekta Osnovne škole u Tološima u Opštini Podgorica.

VIII.11. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja „Niko Labović”, Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini planiran je početak i završetak radova na opremanju kotlarnice i izgradnji toplovoda za kompleks Doma zdravlja „Niko Labović”, Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama.
- U 2016. godini, nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija o korišćenju postojećeg prostora kotlarnice JZU Doma zdravlja "Niko Labović" za smještaj kotlovskog postrojenja za potrebe objekta Univerzitetskog centra u Beranama, raspisana su dva javna nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova. Radovi obuhvataju opremanje kotlarnice i izgradnju toplovoda za kompleks Doma zdravlja „Niko Labović”, Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama. Na predmetno javno nadmetanje nije bilo ispravnih ponuda.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak aktivnosti na izgradnji infrastrukturnih priključaka.





VIII.12. Inovaciono-preduzetnički centar „Tehnopolis” u Nikšiću - rekonstrukcija

Status projekta:

Završen

- Objekat koji je rekonstruisan za potrebe IPC "Tehnopolis" u Nikšiću je spratnosti suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 1.925 m², sa sljedećim sadržajima: kancelarijski prostor sa salom za sastanke, multimedijalna sala, laboratorijske prostorije, prostor DATA centra, kafe bar i tehničke prostorije.
- U 2014. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2015. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, potpisan je Ugovor sa izvođačem radova i u avgustu se otpočelo sa izvođenjem radova.
- Svi radovi na rekonstrukciji objekta su završeni. Završen je tehnički pregled objekta, pribavljena je upotrebna dozvola i isti je prdat Korisniku.
- U 2016. godini relizovano je 1.017.467,91€



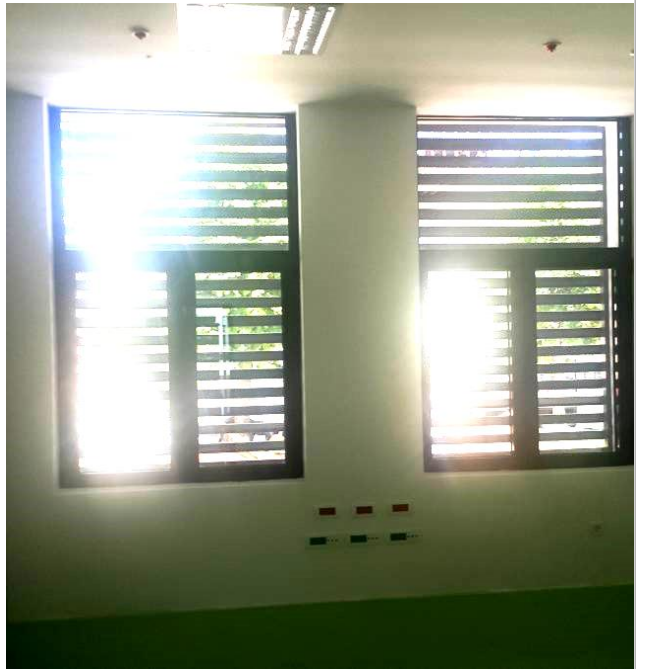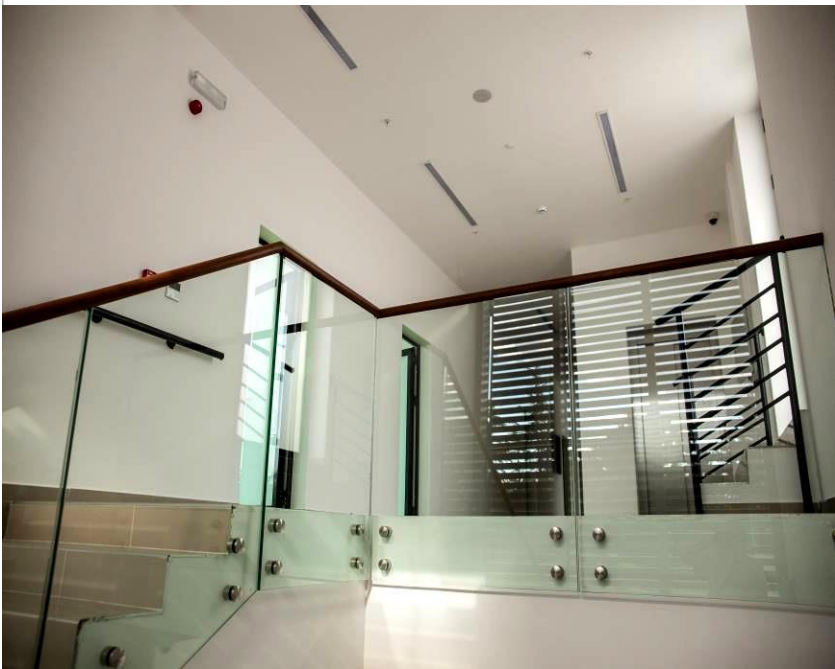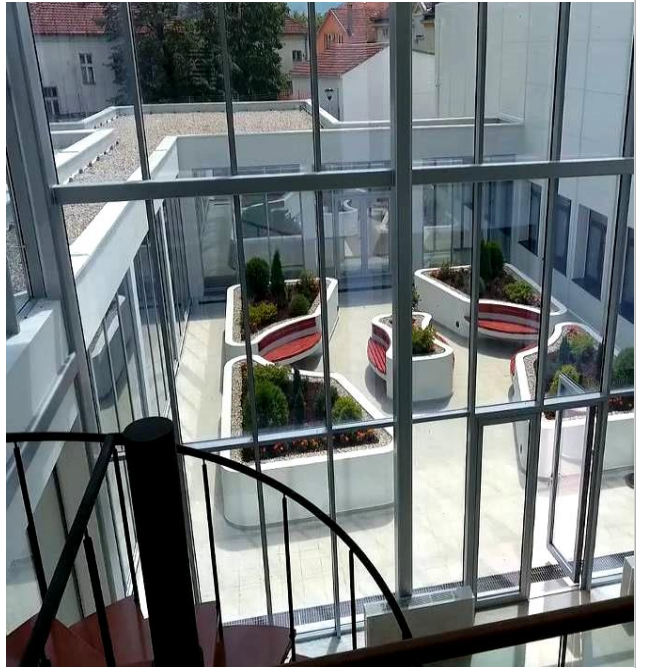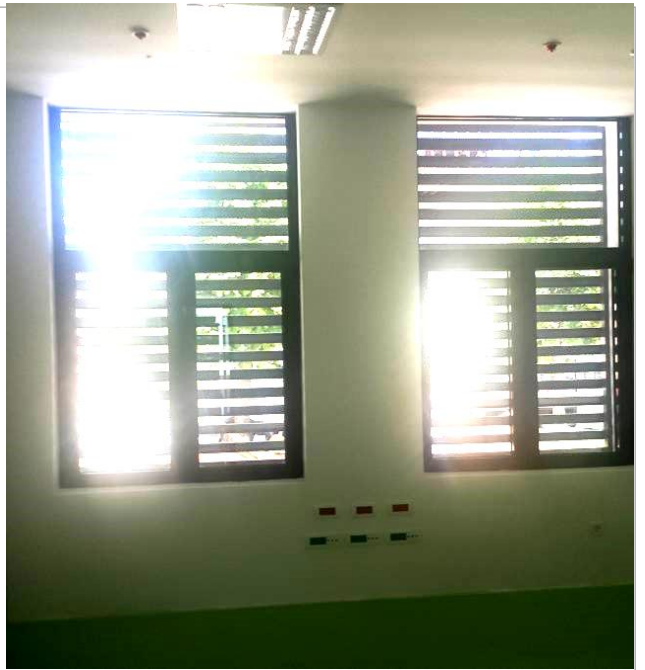

VIII.13. Osnovna škola „Dušan Korać“ u Bijelom Polju

Status projekta:

Završen

- U 2016. godini, u skladu sa Zaključakom Vlade Crne Gore br. 08-3260 od 22. decembar 2016. godine, Informacijom Ministarstva održivog razvoja i turizma o kupovini poslovnog prostora za potrebe smještaja predstavnika organa državne uprave, organa uprave i drugih institucija čiji je osnivač Vlada Crne Gore u Bijelom Polju i dopisom Ministarstva prosvjete od 2.11.2016 godine, akt broj 023-979/2016-2, kojim se isto obratilo Ministarstvu finansija sa zahtjevom da se kroz rebalans Kapitalnog budžeta za 2016. godinu obezbijede sredstva za kupovinu zgrade u vlasništvu opštine Bijelo Polje, površine 1.846m², procijenjene vrijednosti 2.272.441,82€ u kojoj bi se privremeno smjestila JU OŠ „Dušan Korać“ u Bijelom Polju, izvršen je prenos sredstava za predmetne namjene.
- U 2016. godini relizovano je 2.219.170,00€.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

VIII.14. Osnovna škola u Sukobinu, Opština Ulcinj - izgradnja

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti

- Protokolom br. 19/2-01-2733/1 od 25.06.2015. godine, zaključenim 09. juna 2015. godine između Dijaspore SAD, Opštine Ulcinj, Direkcije javnih radova i Ministarstva prosvjete Crne Gore, definisana je obaveza Direkcije javnih radova da, kroz sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, učestvuje u finansiranju školskog objekta u iznosu od jedne trećine njegove vrijednosti odnosno 100.000,00 €.
- Definisano je da će se sredstva uplatiti nakon što se izvođaču radova, po prethodno dostavljenim situacijama, izvrše plaćanja u iznosu od dvije trećine ukupnih sredstava odnosno sredstava koje obezbjeđuje Dijaspore i Opština Ulcinj.
- Realizaciju projekta koordinira Opština Ulcinj.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova i isti su u toku.
- U 2017. godini planiran je nastavak i završetak izvođenja radova na izgradnji objekta.



IX. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

IX.1. Ski centri na lokalitetu Bjelasica

IX.1.1. Ski centar „Kolašin 1600”, Kolašin – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

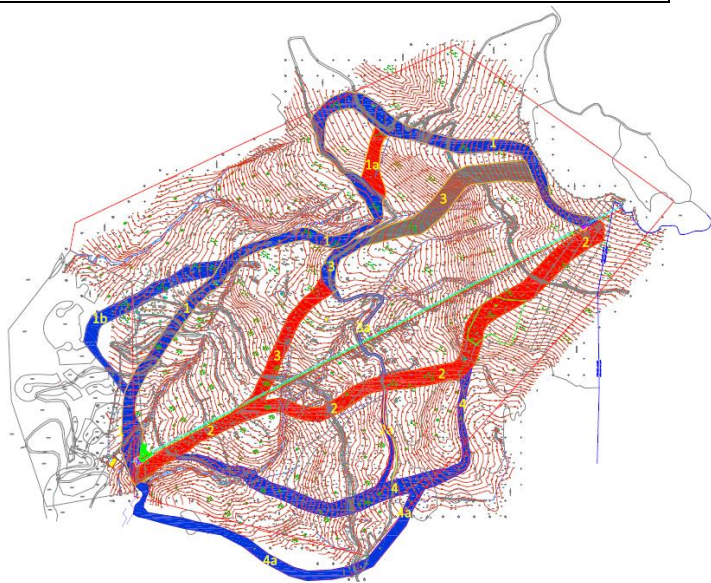



- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 4 km ski staza i nabavka neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2017. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza (izgradnja akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje). Planirani rok završetka II faze je u 2019. godini.
- U 2016. godini relizovano je 2.994.401,03€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Trafostanica 35/10 kV "Jezerine"

- Krajem 2014. godine potpisan je Ugovor za izgradnju primarne trafostanice 35/10kV na lokaciji Jezerine po principu „projektuj i izgradi”.
- U 2015. godine, nakon završetaka glavnog projekta, otpočelo je izvođenje radova I faze.
- U 2016. godini radovi su nastavljeni i isti su završeni, izuzev stavljanja opreme pod napon što je uslovljeno završetkom radova II faze.
- U cilju stavljanja opreme pod napon i trafostanice u funkciju u skladu sa uslovima nadležne institucije, potpisan je ugovor sa izvođačem radova na priključenju predmetne trafostanice na elektrodistributivnu mrežu.
- Radovi su u završnoj fazi.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na izgradnji trafostanice.

Bazna stanica

- Krajem 2014. godine potpisan je Ugovor za izgradnju bazne stanice po principu „projektuj i izgradi”, koji je obuhvatio izradu Glavnog projekta i izvođenje radova I faze, koja obuhvata izgradnje grubih građevinskih radova i razvod instalacija.
- U 2015. godini izvođeni su pripremni radovi.
- U 2016. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova I faze i isti su u toku.

- Raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze koja obuhvata preostale zanatske radove, instalaterske radove i opremanje objekta i uređenje terena i isto je u toku.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova I i II faze bazne stanice.

Rekonstrukcija puta od ski centra „Kolašin 1450” do ski centra „Kolašin 1600”

- U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju lokalnog puta od ski centra „Kolašin 1450” do ski centra „Kolašin 1600” u dužini od cca 2 km.
- Takođe, izabran je izvođač radova I faze na rekonstrukciji puta, a koja se odnosi na izvođenje zemljanih radova, potpornih zidova i armirano- betonskih cjevastih propusta za dio trase u dužini 1,1 km.
- U 2016. godini, nakon pribavljanja građevinske dozvole, radovi I faze su započeti.
- Takođe, u 2016. godini zaključen je ugovor za radove II faze koji se odnose na izvođenje preostalih radova na završetku rekonstrukcije puta.
- Nastavak aktivnosti na realizaciji radova I faze i završetaka radova II faze planiran je u 2017. godini.

Izgradnja žičare - šestosjed K8/D6C

- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju žičare šestosjeda K8/D6C po sistemu „Projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mnm -Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom Glavnog projekta za izgradnju staza u dužini od 4 km i Glavnog projekta osnježavanja staza i akumulacionog jezera, koje je poništeno.
- Krajem 2015. godine ponovljen je postupak javnog nadmetanja.
- U 2016. godini, nakon što je rok otvaranja ponuda više puta odlagan zbog uložених žalbi, procedura javne nabavke je završena i u oktobru je potpisan Ugovor za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji isklopive šestosjedne žičare K8 , sa puštanjem u rad, ski staza u neposrednoj blizini žičare K8 u ukupnoj dužini od cca 4 km, projektovanje staza predviđenih Detaljnom razradom Kolašin 1600 i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje na lokalitetu Kolašin 1600 u Opštini Kolašin. U toku je izrada idejnog rješenja i projektne dokumentacije.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije Glavnih projekata i nabavake i ugradnje žičare.


Vodosnabdijevanje

- U 2015. godini završena je izrada Studije izvodljivosti vodosnabdijevanja ski centra „Kolašin 1600”, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice.
- U 2016. godini završena je izrada Glavnog projekta i ugovoreni radovi na vodosnabdijevanju bazne stanice, sa kojim će se otpočeti u 2017. godini.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova na vodosnabdijevanju.

IX.1.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

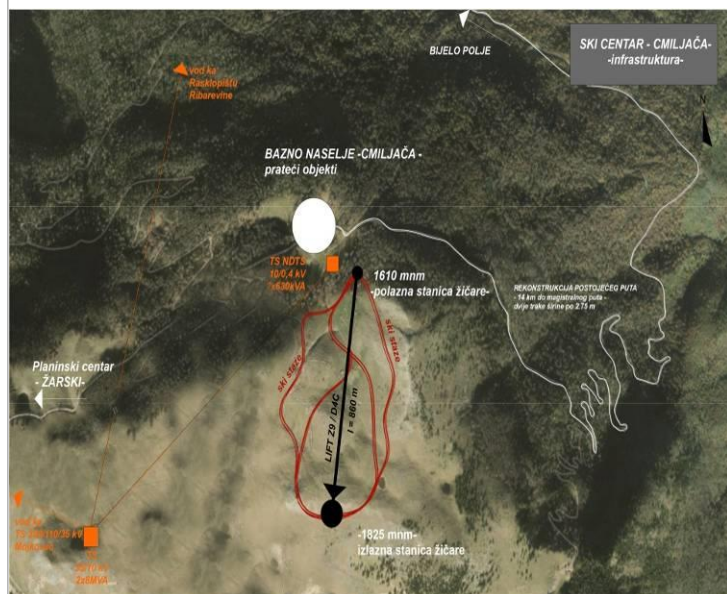

Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.

- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka radova I faze je kraj 2018. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka radova II faze je u 2020. godini.
- U 2016. godini realizovano je 217.584,92€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Izgradnja žičare - šestosjed K8/D6C

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju žičare sa izradom Glavnog projekta ski staza i sistema za osnježavanja i izvođenje radova na izgradnji 3km ski staza i postavljanju žičare i isto je u toku.

- U 2017. nakon okončanja tenederske procedure, planiran je nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i nabavci žičare.

Rekonstrukcija puta Ravna rijeka – Jasikovac

- U prethodnom periodu ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5,5 km i izvođenje radova na dionici od Latinske kose do Jasikovca u dužini 4,8 km, koji su započeti krajem 2014. godine i izvođeni u 2015. godini.
- U 2016. godini radovi su nastavljeni i isti su završeni, osim na dijelu gdje nijesu riješeni imovinsko pravni odnosi.
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ravne rijeke (magistrala) do Latinske kose u dužini 700 m, uključujući i izgradnju mosta na rijeci Ljubovići. Potpisan je ugovor i nakon pribavljanja građevinske dozvole otpočeće se sa radovima u 2017. godini.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na rekonstrukciji puta Ravna rijeka- Jasikovac i izgradnji mosta na rijeci Ljubovići.

Rekonstrukcija puta Jasikovac-Cmiljača

- U prethodnom periodu urađena je projektna dokumentacija za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 8,5 km.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji puta u dužini od 1,1 km, koji se odnose na radove donjeg stroja, rješavanje odvodnjavanja i izradu armirano-betonskih zidova.
- U toku je žalbeni postupak.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak radova I faze na rekonstrukciji puta Jasikovac-Cmiljača i ugovaranje i početak izvođenja radova II faze.

Vodosnabdijevanje

- U 2015. godini potpisan je Ugovor za izradu Prethodne Studije vodosnabdijevanja za lokalitet Cmiljača.
- U 2016. godini nastavljena je i završena izrada Studije i u toku je javno nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta vodosnadbijevanja bazne stanice.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta.

TS 35/10 "Cmiljača"

- U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta izgradnje TS 35/10 "Cmiljača" i nakon žalbenog postupka, otpočelo se sa izradom projekta.
- U 2017. godini, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta, ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji trafostanice.

IX.1.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka radova I faze je kraj 2020. godine.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka radova II faze je u 2022. godini.
- U 2016. godini relizovano je 16.707,60€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Lokalni put Vragodo-Vrioca-Žarski katun

- U 2015. godini završen je i revidovan Glavni projekat rekonstrukcije putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katunu dužini 5,7 km.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova, izabran je izvođač i u toku je žalbeni postupak.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak izvođenja radova I faze, kao i ugovaranje i početak izvođenja radova II faze.

Regionalni put Mojkovac-Vragodo

- Krajem 2015. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Regionalni put Mojkovac-Vragodo, dužine 8,5 km.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta i izrada istog je u završnoj fazi.
- U 2017. godini, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta.

Bazna stanica

- U 2016. godini planirano je raspisivanje Konkursa za najbolje Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta bazne stanice.
- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

IX.2. Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Planirani rok završetka radova je u 2023. godini.
- U 2016. godini realizovano je 549.118,88€.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Planska dokumentacija

- Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana je izrada prostorno-planske dokumentacije za ski centar na lokalitetu Hajla.
- Aktivnosti koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U skladu sa prijedlogom Ministarstva održivog razvoja i turizma potpisan je Protokol za izradu planske dokumentacije kojim se opština Rožaje obavezala da sprovede planirane aktivnosti.
- U 2016. godini, shodno zaključku Vlade br. 08-3353 od 28. decembar 2016. godine realizovan je prenos preostalih sredstava opštini Rožaje za izradu Lokalne studije lokacije u iznosu od 549.118,88 €.

Putna infrastruktura

- U 2014. godini završena je izrada Glavnog projekata rekonstrukcije putnog pravca Rožaje – Štedin u dužini 7,3 km.
- U 2015. godini započeti su radovi na izgradnji I faze u dužini 850m, uključujući sve pozicije radova, osim ugradnje habajućeg - završnog asfaltnog sloja.
- U 2016. godini nastavljeni su radovi I faze i isti su završeni.
- Takođe, u 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova II faze u dužini 2,2 km (zemljani radovi, odvodnjavanje i armirano-betonski zidovi). Potpisan je Ugovor o izvođenju radova, ali usled nepovoljnih vremenskih uslova Izvođač nije uveden u posao.
- U 2017. godini planiran je završetak izvođenja radova II faze, kao i ugovaranje i početak radova III faze.

IX.3. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Planirani rok završetka radova je u 2019. godini.
- U 2016. godini realizovano je 5.300.00€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Projektovanje i izgradnja 1,5 km ski staza

- Na dijelu skijališta „Savin kuk” koji se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Durmitor” - Opština Žabljak, predviđena je izrada projektne dokumentacije na nivou Idejnog rješenja i Glavnog projekta i izgradnja dvije nove ski staze.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za realizaciju projekta po principu “projektuj i izgradi” i potpisan ugovor.
- Sprovedene su aktivnosti za pribavljanje saglasnosti Nacionalnih parkova za snimanje terena i uklanjanje drveća u cilju izrade geodetske podloge.
- U 2017. godini, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta, ugovaraje i početak izvođenja radova.

Projektovanje 21 km ski staza

- Takođe, predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju 21 km ski staza na lokalitetu Durmitor.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta.

Izgradnja prilaznog puta dužine 1,5 km i parkinga

- U 2016. godini izrađena je projekta dokumentacija za 1,5 km prilaznog puta.
- Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova u dužini 1,5 km sa parkingom i isto je u toku.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak izvođenja radova.

Rekonstrukcija prilazne saobraćajnice dužine 5 km

- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta prilazne saobraćajnice od magistralnog puta do skijališta “Savin kuk” u dužini od 5 km i isto je u toku.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak izrade i revizije Glavnog projekta.

Strategija razvoja vodosnabdjevanja opštine Žabljak

- U 2016. godini je raspisano javno nadmetanja za izbor najpovoljnijeg obrađivača Strategije razvoja vodosnabdjevanja opštine Žabljak i isto je u toku.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je završetak izrade Strategije.

Izgradnja žičare

- U 2017. planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju žičare sa izradom Glavnog projekta ski staza i sistema za osnježavanja i izvođenje radova na izgradnji 3km ski staza i postavljanju žičare.

IX.4. Izrada planske dokumentacije i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude

Status projekta:


U toku

- U 2016. godini sprovedene su aktivnosti na realizaciji projekata, odnosno raspisivanju konkursa, izradi i reviziji planske i projektne dokumentacije za objekte od javnog i opšteg interesa: objekat "Dom revolucije" u Nikšiću, Venecijansko bijenale, projekat hidroaviona, replika prve štamparije na Balkanu, Suvog boba na Žabljaku, rekonstrukcija tvrđava "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", Golf akademija - trening golf tereni, kuća "Voća", objekat plaže "Galeb" u Podgorici, rekonstrukcija hotela "Durmitor" na Žabljaku, željeznička pruga "Virpazar - Bar", žičara Kotor-Cetinje, Panoramske rute, riješenje revitalizacije starog Bara, Pećina i izrada Studije zaštite Plavskog jezera. Projekti revalorizacije kulturnih dobara, revitalizacija brownfield lokacija, sanacija ugroženih urbanih zona kroz arhitektonske konkurse, izrada urbanističko-arhitektonskih konkursa i projektne dokumentacije za Opštine - nastavak projekta "Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru".
- U 2016. godini realizovane su sljedeće aktivnosti:
 - završena je procedura raspisivanja Konkursa za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja za objekat "Kuća voća" u Andrijevici,
 - završena je procedura raspisivanja Konkursa za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja adaptacije i rekonstrukcije za objekat "Dom revolucije" u Nikšiću,
 - završena je izrada Idejnog projekta žičare Kotor - Lovćen - Cetinje,
 - prezentacija Crnogorske arhitekture – Solana, Ulcinj na Venecijanskom bijenalu.
 - Izvršen je transfer sredstava opštini Plav u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-3352 od 23.12.2016. god. za izradu studije Plavskog jezera.
- U 2016. godini realizovano je 525.984,61€

IX.5. Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

U toku

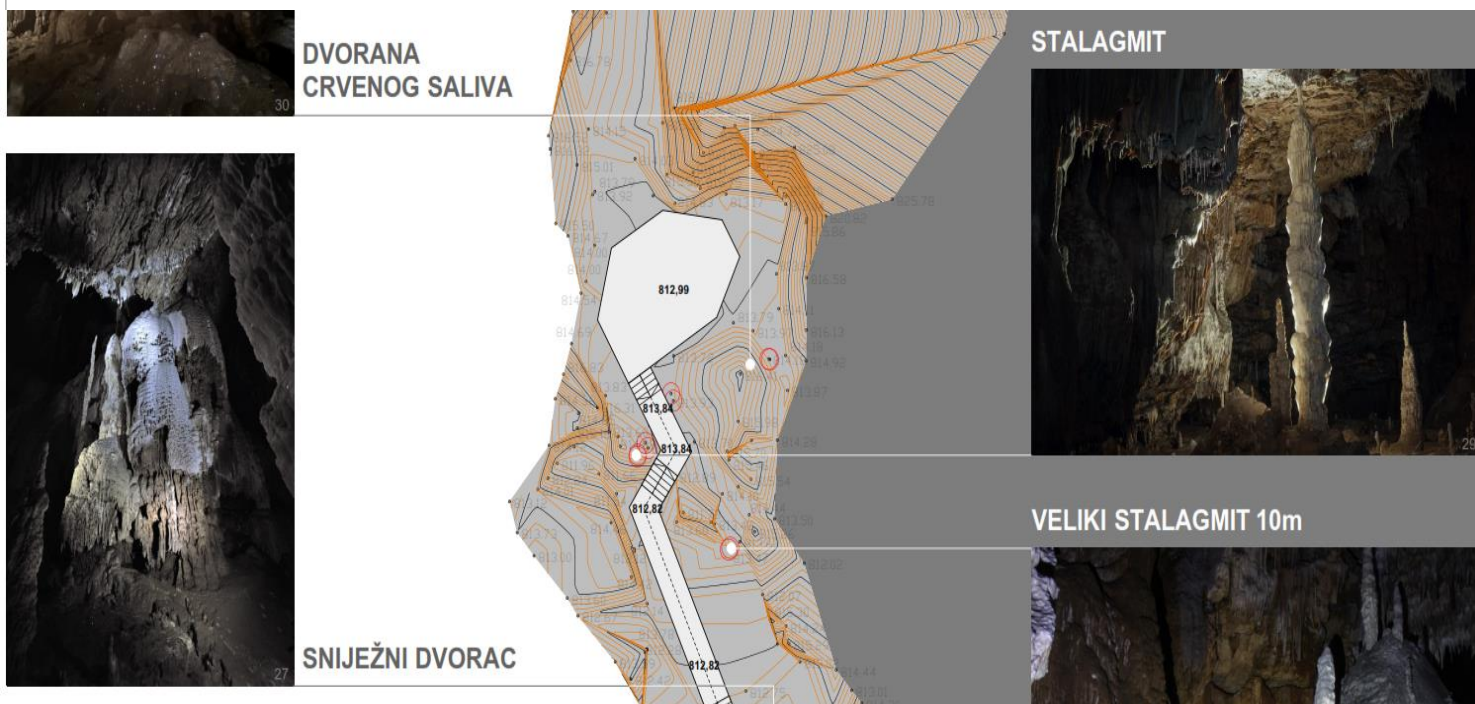

- U prethodnom periodu završena je izrada prethodne Studije izvodljivosti za infrastrukturu do Đalovića pećine na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta puta od Bistrice do Manastira Podvrh. U 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta puta i u toku je revizija istog.
- Takođe, u 2016. godini potpisan je Ugovor za izradu prethodne Studije izvodljivosti uređenja unutrašnjosti pećine i ista je završena.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova I faze na rekonstrukciji puta od Bistrice do Manastira Podvrh, koja obuhvata zemljane radove, kao i sprovedene pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti pećine, vodosnadbijevanja i primarne elektroenergetske infrastrukture.
- U 2016. godini relizovano je 92.294,15€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti, ugovaranje i izvođenje radova na rekonstrukciji puta Bistrica-manastir Podvrh, ugovaranje i izrada tehničke dokumentacije pješačke staze do Đalovića pećine, uz kanjon Bistrice, ugovaranje i izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji primarne elektrenergetske infrastrukture za potrebe Đalovića pećine, ugovaranje i izrada tehničke dokumentacije unutrašnjosti Đalovića pećine, ugovaranje i izrada tehničke dokumentacije za infrastrukturne objekte za potrebe valorizacije pećine, ugovaranja i izrada tehničke dokumentacije sistema za vodosnabdijevanje za infrasturkturane objekte, kao i ugovranje nabavke i ugradnje žičare.

IX.6. Ski centar Vučje - izgradnja akumulacionog jezera, opština Nikšić

Status projekta:

U toku

- U 2015. godini opština Nikšić je sprovela aktivnosti na odabiru izvođača radova na izgradnji akumulacionog jezera za ski-centar Vučje i ugovor je zaključen.
- Sa radovima se otpočelo naklon pribavljanja građevinske dozvole od strane opštine Nikšić.
- U 2016. godini rebalansom Kapitalnog budžeta opredijeljena su sredstva za realizaciju projekata Izgradnja akumulacionog jezera za ski-centar Vučje.
- U 2016. godini relizovano je 39.780,69€.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na izgradnji akumulacionog jezera.

IX.7. Dom revolucije u Nikšiću

Status projekta:

U toku



- Realizacijom projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- U 2016. godini sprovedena je procedura raspisivanja Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije objekta Dom revolucije u Nikšiću, nakon čega je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja. U toku je izrada Glavnog projekta.
- U 2016. godini relizovano je 80.325,00€.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, kao i početak radova na rekonstrukciji objekta.

IX.8. Izmještanje ikone Bogorodice Filermosa na Cetinju

Status projekta:

U toku



- U prethodnom periodu Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije prostora namijenjenog za smještaj ikone.
- U maju 2016. godine Direkciji javnih radova je dostavljen revidovani Glavni projekat na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje i donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača radova.
- Sa izvođenjem radova zapoćeće se nakon pribavljanja građevinske dozvole od strane Prijestonice Cetinje.
- U 2017. godini planiran je početak izvođenja radova.

IX.9. Izgradnja apartmana i restorana u NP „Biogradska gora”, Kolašin

Status projekta:

U toku

- Objekti za apartmanski smještaj i restoran se nalaze u zahvatu Prostornog plana posebne namjene NP Biogradska gora.
- Projektну dokumenaciju je obezbjedilo i dostavilo Direkciji javnih radova JP “Nacionalni parkovi”.
- U 2016. godini relizovano je 227.120,17€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

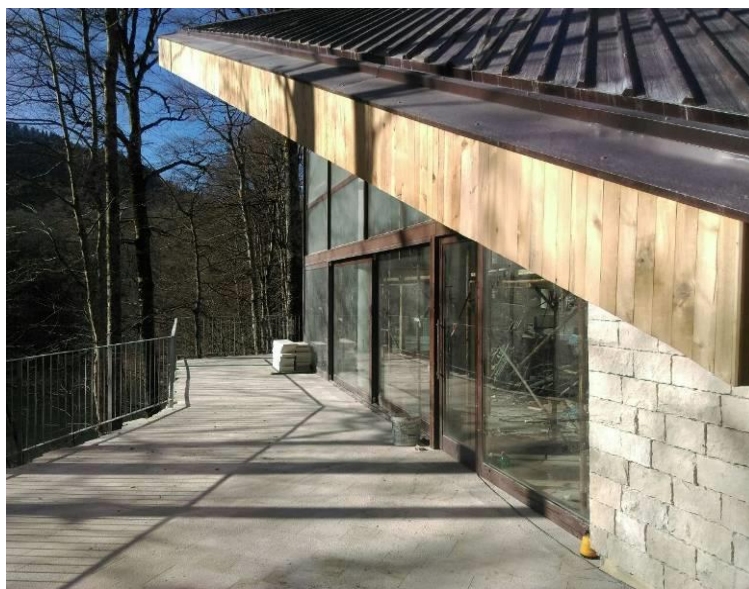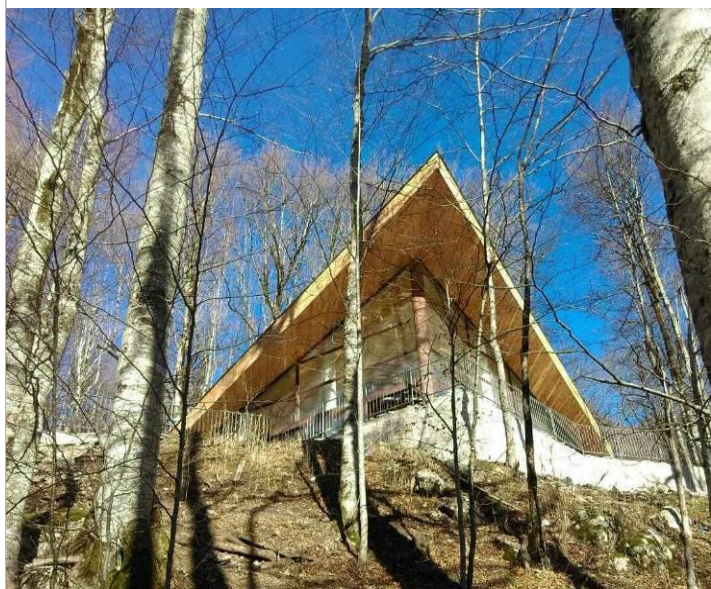



Izgradnja restorana

- Objekat restorana je spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 350 m².
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: restoranska sala sa pratećim šankom, kuhinja sa pratećim tehničkim prostorijama, kancelarija, magacin pića i hrane, kotlarnica i ostali prateći sadržaji.
- U pethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali izvođenje grubih građevinskih radova, krovopokrivačkih radova i radova na izradi fasadne bravarije. Takođe, potpisan je Ugovor o izvođenju radova II faze, koji obuhvataju sve preostale građevinsko-zanatske i instalaterske radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju (osim opremanja).
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radovi II faze i potpisan je ugovor za izvođenje radova III faze, kojom je obuhvaćeno opremanje objekta namještajem i isto je u toku.
- U 2017. godini planiran je završetak radova.

Izgradnja apartmana

- Objekat apartmana je spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 578 m².
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: sobe, apartmani, recepcije, restoran, kuhinja, kafe i kotlarnica.
- Krajem 2014. godine raspisano je javno nadmetanje i donešena odluka o odabiru izvođača radova za radove I faze koja se odnosi na grube građevinske radove.
- Obaveza JU "Nacionalni parkovi" je pribavljanje građevinske dozvole, što je uslov za početak radova.

IX.10. Kuća „Voća”, Andrijevisa – izrada projektne dokumentacije

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je završilo aktivnosti na sprovođenju Konkursa za izbor Idejnog arhitektonskog rješenja i potpisalo Ugovor za izradu Glavnog projekta objekta „ Kuća voća” u Opštini Andrijevisa. Obaveza Ministarstva poljoprivrede bilo je dostavljanje Elaborata tehnologije proizvodnje, koji predstavlja neophodan ulazni podatak za izradu Glavnog projekta.

- Bruto površina objekta „ Kuća voća” u Andrijevici površine je cca 1.500 m² i sastoji se iz proizvodnih pogona, edukativno-poslovnog dijela i izložbeno-prodajnih prostora sa kafeterijom.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta i započelo se sa aktivnostima za raspisivanje javnog nadmetanje za najpovoljnijeg izvođača radova.
- U 2016. godini relizovano je 32.244,40€
- U 2017. godini planirano je ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji objekta.



IX.11. Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru

Status projekta:

U toku

završetak radova.završetak radova.završetak radova.završetak radova.završetak
 radova.završetak radova.završetak radova.završetak radova.završetak radova.završetak
 radova.završetak radova.završetak radova.

- Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcija objekta bivšeg zatvora u Opštini Kotor.
- U 2015. godini potpisan je Ugovor i otpočela je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta zatvora.
- U 2016. godini nastavljena je izrada Glavnog projekta i u toku je revizija istog.
- U 2016. godini relizovano je 2.000,00€
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije, ugovaranje i početak izvođenja radova na rekonstrukciji objekta.

IX.12. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom

Status projekta:

U toku

- U 2016. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kanli Kule u Opštini Herceg Novi.
- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila urbanističko-tehničke uslove i Projektni zadatak, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2017. godini, nakon okončanja tenderske procedure, planiran je početak i završetak izrade projektne dokumentacije.

IX.13. Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti


- Projekat stavljanja u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- S obzirom na to da nijesu dostavljene smjernice od strane Ministarstva, nijesu sprovedene aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

IX.14. Nacionalni parkovi - – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, u okviru projekta Nacionalni parkovi, planirane su sledeće aktivnosti:
 - Rekonstrukcija bivše vojne karaule u NP Prokletije, za potrebe naučno-istraživačkog centra
 - Izgradnja kampa za mobilne kuće u NP Lovćen
 - Valorizacija Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor
 - Izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor
 - Stavljanje u funkciju motela Radovan Luka u NP Durmitor
 - Rekonstrukcija putne infrastrukture u NP Biogradska gora
- U skladu sa potpisanim Protokolom obaveza JU “Nacionalni parkovi Crne Gore” je izrada i revizija projektne dokumentacije za Vojnu karaulu, Kamp na Lovćenu i Žugića Luku, nakon čega će Direkcija javnih radova raspisati javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova. U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Takođe, u skladu sa potpisanim Protokolom obaveza JU “Nacionalni parkovi Crne Gore” je i izvođenje radova na restoranu na Crnom jezeru i isti su u završnoj fazi.
- U 2016. godini Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji putne infrastrukture u NP Biogradska gora i stavljanje u funkciju Motela “Radovan Luka” u NP Durmitor, koja su nakon što su prvobitno poništena, ponovno raspisana.
- U 2016. godini realizovano je 833,00€|
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

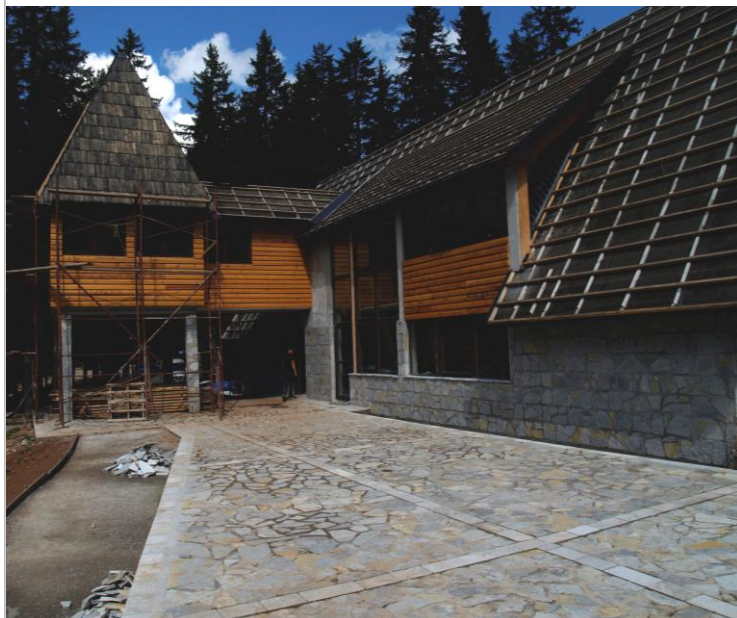

IX.15. Solana „Bajo Sekulić“ u Ulcinju

Status projekta:

Završeno

- Realizacijom projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2341 od 8. septembra 2016. godine izvršen je transfer sredstava na račun Privrednog suda.
- U 2016. godini realizovano je 200.000,00€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti u skladu sa dostavljenom dokumentacijom od strane nadležnog ministarstva.

IX.16. Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor

Status projekta:

Nijesu sprovedene aktivnosti

- Realizaciju projekta kordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Planirana je izrada projektne dokumentacija i izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor, a na osnovu idejnog rješenja i koncepta predstavljenog u okviru crnogorskog paviljona na Venecijanskom bijenalu.
- U 2016. godini nijesu sprovedene aktivnosti.
- U 2017. godini planirano je raspisivanje javnih nadmetanja, izrada i revizija projektne dokumentacije i početak i završetak radova na izgradnji paviljona.

X. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA BAR - BOLJARE

X.1. Državna komisija za tehnički pregled autoputa Bar-Boljare prioritetne dionice Smokovac – Uvač - Mateševo i dr.

Status projekta:

U toku

- Vlada Crne Gore je, na osnovu člana 12 Zakona o autoputu Bar – Boljare, (Sl. cg. 52/14) na sjednici od 14. maja 2015. godine donijela Odluku o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo. Sredstva za rad Komisije se obezbjeđuju u Kapitalnom budžetu Crne Gore. Visina nadoknade članovima Komisije se, shodno Internom pravilniku o raspodjeli finansijskih sredstava za rad Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar - Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, određuje proporcionalno učešću, odnosno oblasti u ukupnom tehničkom pregledu, kao i na osnovu stvarnog angažmana na pregledu radova na prijedlog predsjednika Komisije.
- U 2016. godini započete su aktivnosti na tehničkom pregledu radova na autoputu i to prije svega na mostu Moračica, tunelu Vjeternik i na privremenom i stalnom napajanju električnom energijom, kao i na ostalim objektima za koje je izdata građevinska dozvola.
- U 2016. godini relizovano je 404.098,56€.
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

XI. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

- U 2015. godini otpočela je realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj”, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture. Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12€, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja ovih sredstava za 2015. godinu.

XI.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva: izradu glavnog projekta i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika po FIDIC Žutoj knjizi; rekonstrukciju i izgradnju sistema za sakupljanje otpadnih voda koji uključuje 21 km kanalizacione mreže po FIDIC Crvenoj knjizi i izrada glavnog projekta i izgradnja rezervoara i pumpnih stanica za vodovodni sistem Berane po FIDIC Crvenoj knjizi.
- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, 15 % predstavlja nacionalno učešće, osim izrade Glavnog projekta za rezervoar i pumpne stanice koji se finansira 100% iz opštih prihoda.
- U prvoj polovini 2016. godine su potpisani Ugovori za izvođača radova, kao i za konsultantske usluge koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Za izgradnju rezervoara i pumpnih stanica za vodovodni sistem Berana raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača radova. Evaluacioni izvještaj za odabir Nadzora nad izvođenjem radova je dostavljen Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori na odobrenje.
- U 2016. godini realizovano je 1.098.365,77€
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i izvođenje radova.

XI.2. Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju.
- U 2016. godini, nakon izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za odlagalište, koju je koordinirala Prijestonica Cetinje, stvoreni su uslovi za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za realizaciju projekta sanacije odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju po FIDIC Žutoj knjizi - “projektuj i izgradi”. Nakon poništenja raspisanog javnog nadmetanja, nastavljeno je sa procedurom pregovaračkog postupka koja je rezultirala izborom najpovoljnijeg izvođača i potpisivanjem ugovora. Izvođač je uveden u posao.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju i ugovor je potpisan, a izvođenje radova se očekuje nakon završetka izrade projektne dokumentacije i pribavljanja građevinske dozvole.
- U 2017. godini planiran je završetak izrade i revizije projektne dokumentacije i završetak radova.

XI.3. Sanacija odlagališta „Ćafe” u Baru – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za realizaciju projekta sanacije odlagališta „Ćafe” u Baru po FIDIC Žutoj knjizi - "projektuj i izgradi". Krajem 2015. godine potpisan je Ugovor i započete aktivnosti na izradi Glavnog projekta.
- U 2016. godini završena je procedura javne nabavke i potpisan ugovor za konsultantske usluge za projekat „Ćafe” koje podrazumijevaju reviziju Glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta i pribavljena je građevinska dozvola. U toku je izvođenje pripremnih radovi.
- U 2016. godini realizovano je 333.509,70€
- U 2017. godini planiran je završetak radova na sanaciji odlagališta.

XI.4. Rekonstrukcija dijela pruge Virpazar-Sutomore

Status projekta:

U toku

- Rekonstrukcija dijela pruge „Virpazar – Sutomore” će se realizovati u skladu sa pravilima Crvene FIDIC knjige, a na osnovu revidovane projektne dokumentacije dostavljene od strane Korisnika Željezničke infrastrukture Crne Gore.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, u 2016. godini raspisno je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji.
- Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki potpisani su ugovori za izvođenje radova i za vršenje stručnog nadzora i izvođač je uveden u posao.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na rekonstrukciji.

XI.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice „Trebešica” – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Status projekta:

U toku

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, tender je objavljen u junu 2015. godine.
- Nakon završenog postupka javne nabavke, potpisan je Ugovor sa ponuđačem koji će projekat realizovati po Žutoj FIDIC knjizi po principu "projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za konsultantske usluge, koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, nakon dva neuspješna postupka, rezultiralo je potpisivanjem Ugovora u 2016. godini.
- U toku je dopuna i dorada projektne dokumentacije u skladu sa primjedbama revizije.
- U 2016. godini realizovano je 58.651,74€
- U 2017. godini planiran je završetak radova na rekonstrukciji postrojenja.

XI.6. Tehnička pomoć

Status projekta:

U toku

- U 2015. godini, potpisan je Ugovor za jačanje kapaciteta Operativne strukture kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevod službenih dokumenata i realizacija istih je u toku.
- U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za usluge organizovanja Sektorskih monitoring odbora i implementaciju Komunikacionog akcionog plana i nakon završene procedure, potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.
- Takođe, raspisana su javna nadmetanja za nabavku IT opreme i službenog vozila. Za dio nabavke koji se odnosi na nabavku službenog vozila odabran je najpovoljniji ponuđač, dok je za nabavku IT opreme procedura još uvijek u toku.
- U 2016. godini potpisan je Ugovor i realizovana je isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Operativne strukture.
- U 2016. godini potpisan je i ugovor "Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovođenja ugovora i FIDIC pravila ". Svrha Ugovora je jačanje kapaciteta čitave Operativne strukture sa naglaskom na Direkciju javnih radova kao Implementaciono tijelo iz oblasti finansija i rukovodjenim projektima sa naglaskom na FIDIC pravila.
- U 2016. godini realizovano je 50.753,00€
- U 2017. godini planiran je nastavak aktivnosti.

XII. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

XII.1. Stambeni objekat u Nikšiću - izgradnja

Status projekta:

Završen

- Izgrađeni stambeni objekat je spratnosti podrum, prizemlje, tri sprata i potkrovlje, ukupne bruto površine 5.590 m², sa 62 stambene jedinice za smještaj 231-og korisnika.
- Sa radovima se otpočelo krajem maja 2015. godine.
- Svi planirani radovi na izgradnji objekta i uređenju terena su završeni u maju 2016. godine.



XII.2. Dom starih u Pljevljima - izgradnja

Status projekta:

U toku

- U toku je izgradnja objekta Dom starih u Pljevljima koji posjeduje podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine 2.810 m².
- Objekat je predviđen za smještaj 68 lica. Pored 37 smještajnih jedinica, predviđen je kuhinjski blok, restoran, pošta, kancelarije, višenamjenska sala, ambulanta, komunikacije, kao i prateće tehničke prostorije.
- Sa radovima se započelo krajem maja 2016. godine.
- Završeni su radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije objekta i drvene krovne konstrukcije, kao i krovopokrivački radovi. U toku su zidarski radovi, radionička izrada fasadne bravarije i radovi na razvodu grubih instalacija.
- U 2017. godini planiran je završetak radova.



XII.3. Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici - izgradnja

Status projekta:

U toku

- Projekat obuhvata izgradnju 12 stambenih objekata koji posjeduju podrum, prizemlje i dva sprata, ukupne bruto površine 10.408 m², sa ukupno 120 stambenih jedinica za smještaj 660 korisnika.
- Izvođenje radova je započelo krajem marta 2016. godine.
- Završeni su radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije objekta i drvene krovne konstrukcije, krovopokrivački radovi, zidarski radovi. U toku su keramičarski i podopolagački radovi, radovi na izradi termoizolavane fasade i montaži fasadne bravarije, kao i prateći instalaterski radovi.
- U 2017. godini planiran je završetak radova na izgradnji objekata.



XII.4. Stambeni objekti u Beranama - izgradnja

Status projekta:

U toku

- Projekat obuhvata izgradnju 4 stambena objekta, ukupne bruto površine cca 7.000 m², sa ukupno 94 stambenih jedinica za smještaj 271 korisnika.
- Krajem 2016 godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor.
- U toku su pripremne aktivnosti za izvođenje izvođača u posao.
- U 2017. godini planiran je nastavak izvođenja radova.



Projekat finansiran iz Policijski objekti Kremza i Zoganje - adaptacija

Status projekta:

Završen

- Svi ugovoreni radovi na adaptaciji policijskih objekata Kremza i Zoganje u gradskoj opštini Tuzi i opštini Ulcinj su završeni.
- Radovi su obuhvatali adaptaciju sanitarnih čvorova, adaptaciju kuhinja i prostorija za smještaj osoblja, popravku krova, zamjenu fasadne bravarije, sanacije fasade i olučnih vertikalna, zamjenu elektro i vodovodne instalacije, sanaciju kanalizacione i hidrantske mreže.
- U 2016. godini relizovano je 96.683,30 € iz Budžetske rezerve.

