




Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Realizacija Kapitalnog Budžeta za 2015. godinu

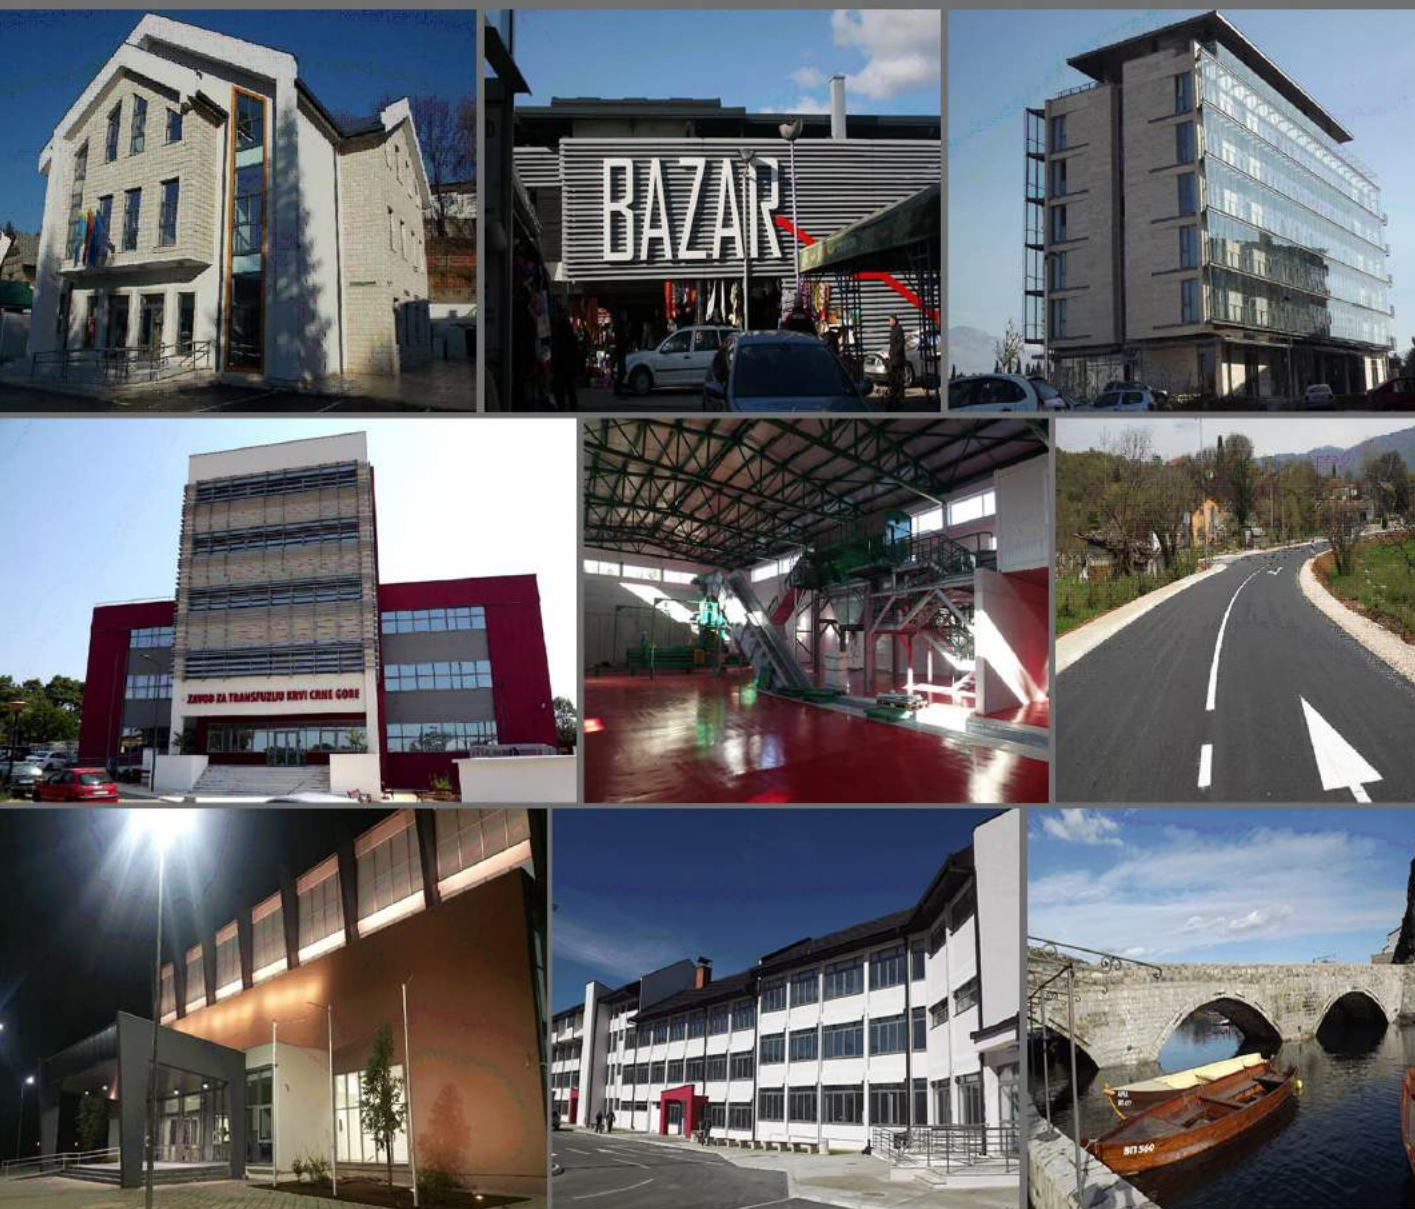

Podgorica, januar 2016. godine

Sadržaj:

1. REZIME.....	4
2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA.....	12
3. REALIZACIJA PO OBJEKTIMA.....	22
I. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa.....	23
I.1. Kupovina objekta Kampa na Zlatici.....	24
I.2. Izgradnja objekta Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti.....	24
I.3. Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine.....	25
I.4. Izgradnja objekta Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma.....	27
I.5. Nadgradnja objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Opštini Kotor.....	28
I.6. Raspisivanje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Nove zgrade Skupštine Crne Gore.....	29
I.7. Bivša zgrada MUP-a u Opštini Podgorica.....	30
I.8. Akcioni plan prilagođavanja obj. u javnoj upotrebi za pristup,kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti.....	31
I.9. Administrativni objekat u Opštini Mojkovac.....	33
I.10. Administrativni objekat u Gusinju.....	34
I.11. Administrativni objekat u Andrijevići.....	35
I.12. Administrativni objekat u Petnjici.....	35
I.13. Izgradnja i opremanje zatvorske kuhinje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spuzu.....	36
I.14. Adaptacija prostorija Državnog tužilaštva na Cetinju.....	37
I.15. Smještajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici.....	38
I.16. Adaptacija poslovnog prostora MUP-a.....	39
I.17. Granični prelazi.....	39
II. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture.....	41
II.1. Nadogradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola.....	42
II.2. Rekonstrukcija Centra kulture u Opštini Pljevlja.....	43
II.3. Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP - Cetinje.....	44
II.4. Nacionalna biblioteka „Đurađ Crnojević”.....	45
II.5. Adaptacija zgrade bivšeg Belgijskog poslanstva na Cetinju.....	45
II.6. Sanacija spomenika na Stražici, Opština Pljevlja.....	45
II.7. Biblioteka za slijepe u Opštini Podgorica.....	46
II.8. Državni institut u Kolašinu.....	46
III. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata.....	47
III.1. Izgradnja objekta sportske dvorane u Opštini Berane.....	48
III.2. Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom, Opštine Mojkovac i Žabljak.....	49
III.3. Izgradnja stadiona na Cetinju.....	50
III.4. Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra, Opština Kotor.....	51
IV. Projekti očuvanja životne sredine.....	52
IV.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje.....	53
IV.2. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Šavnik.....	53
IV.3. Izgradnja transfer stanice i sanacija postojećeg odlagališta otpada u Opštini Šavnik.....	53
IV.4. Kanalizaciona mreža u Opštini Plav.....	54
IV.5. Kanalizaciona mreža u Opštini Rožaje.....	54
IV.6. Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove Vode u Beranama.....	54
IV.7. Kanalizaciona mreža u Opštini Pljevlja.....	54
IV.8. Rezervoar za poboljšanje vodosnabdijevanja u Opštini Tivat.....	55
IV.9. Sanacija deponije na Žabljaku.....	55
IV.10. Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku.....	55
IV.11. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu - I faza, Opština Herceg Novi.....	57
IV.12. Sanacija stanja životne sredine, Opština Pljevlja.....	57
V. Izgradnja lokalne infrastrukture.....	58
V.1. Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica – Opština Pljevlja.....	59
V.2. Rekonstrukcija gradske tržnice u Opštini Bijelo Polje.....	60
V.3. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštinama Kolašin i Mojkovac.....	61
V.4. Asfaltiranje durmitorskog prstena.....	62
V.5. Rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na vodovodu „Krkori” u Opštini Andrijevića.....	62
V.6. Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici – faza, Opština Rožaje.....	63
V.7. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema.....	63
VI. Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja.....	74
VI.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi u Opštini Podgorica.....	75
VI.2. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra sa Urgentnim centrom u Opštini Berane.....	76
VI.3. Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.....	78
VI.4. Kupovina objekata od opština.....	78

VI.5.	Rekonstrukcija Internog odjeljenja Opšte bolnice Bijelo Polje	78
VII.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja.....	79
VII.1.	Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija	80
VII.2.	Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Rožaje.....	80
VII.3.	Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” u Opštini Podgorica.....	81
VII.4.	Dom starih u Podgorici	81
VIII.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	82
VIII.1.	Izgradnja Akademija umjetnosti na Cetinju	83
VIII.2.	Izgradnja objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Opštini Podgorica	84
VIII.3.	Izgradnja i opremanje novog objekta Studentskog doma „Braća Vučinić” u Opštini Nikšić.....	86
VIII.4.	Dječiji vrtići iz kredita CEB-a.....	86
VIII.5.	Srednja stručna škola u Golubovcima	89
VIII.6.	Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	90
VIII.7.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	91
VIII.8.	Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe inovaciono-preduzetničkog centra „TehnoPolis” u Opštini Nikšić	91
VIII.9.	Osnovna škola u Gukama – II faza.....	92
IX.	Unapređenje turističke ponude.....	93
IX.1.	Izgradnja apartmana i restorana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin	94
IX.2.	Izrada Glavnog projekta za valorizaciju Đalovića pećine, Opština Bijelo Polje	95
IX.3.	Izrada projektna dokumentacije puta Vragodo-Vrioca-Žarski katun, Opština Mojkovac.....	95
IX.4.	Ski centar „Kolašin 1600”, Opština Kolašin	96
IX.5.	Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Opština Bijelo Polje	97
IX.6.	Unapređenje turističke ponude u Rožajama	98
IX.7.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje-Štedin u dužini od 7 km, Opština Rožaje.....	99
IX.8.	Revitalizacija jezera Ponikvice, Opština Danilovgrad.....	99
IX.9.	Izrada planske dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude.....	100
IX.10.	Izgradnja infrastrukture kamp odmorišta	100
IX.11.	Izgradnja akumulacionog jezera za ski-centar Vučje.....	101
IX.12.	Rekonstrukcija objekta bivšeg zatvora u Opštini Kotor	101
IX.13.	Izmještanje ikone Bogorodice Filermose, Prijestonica Cetinje	102
IX.14.	Kuća „Voća” i kuća „Vina”	102
IX.15.	Solana Ulcinj.....	102
X.	Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova.....	103
X.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i unapređenje vodosnadbijevanja u Beranama.....	104
X.2.	Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju i „Čađe” u Baru.....	105
X.3.	Rekonstrukcija kosina na željezničkoj pruzi	105
X.4.	Tehnička pomoć	106
X.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove elektro vučne podstanice „Trebešica”	106
XI.	Hitna pomoć i prevencija poplava.....	107
XI.1.	Regulacija korita rijeke Zlorečice, Opština Andrijevice	108
XI.2.	Sanacija klizišta Smoljevica, Opština Andrijevice	109
XI.3.	Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru, Opština Bar	109
XI.4.	Sanacija pješačke staze u Virpazaru, Opština Bar.....	111
XI.5.	Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u Gusinje i izgradnja pješačkog mosta, O. Gusinje.....	111
XI.6.	Regulacija korita rijeke Tare, Opština Kolašin - II i III faza/Bećova bara Babljak	112
XI.7.	Regulacija korita rijeke Plašnice, Opština Kolašin.....	113
XI.8.	Regulacija korita rijeke Tare nizvodno od Prošćenja - IV faza, Opština Mojkovac.....	113
XI.9.	Sanacija klizišta Stevanovac, Opština Mojkovac.....	113
XI.10.	Sanacija korita Murinske rijeke izgradnja mosta u Dragijama.....	114
XI.11.	Sanacija mreže lokalnih puteva, Opština Plav	114
XI.12.	Sanacija mostova, izgradnja pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanacija temelja potpornih zidova, Opština Šavnik	115
XI.12.	Regulacija Plavske rijeke, Opština Plav.....	115
XI.13.	Sanacija lokalnog puta u Štoju, Opština Ulcinj.....	115
XII.	Regionalni stambeni program.....	116
XII.1.	Stambeni objekat u Nikšiću	117
XII.2.	Dom starih u Pljevljima	118
XII.3.	Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici.....	118

1. REZIME

Kapitalnim budžetom za 2015. godinu planirano je da Direkcija javnih radova realizuje sredstva u iznosu od 42.197.077,00 €.

(Zakon o budžetu Crne Gore za 2015. godinu, Sl. list CG br. 59, od 30. decembra 2014. godine).

Svi projekti Kapitalnog budžeta, kao što je i definisano Zakonom o budžetu za 2015. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom obezbijedena su sredstva na sljedeći način:

- Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	8.016.000,00 €
- Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	3.640.956,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	1.650.000,00 €
- Izgradnja lokalne infrastrukture	6.144.000,00 €
- Projekti očuvanja životne sredine	2.810.000,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	1.824.077,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	1.911.144,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke	6.679.000,00 €
- Hitna pomoć i prevencija poplava	420.000,00 €
- Unapređenje turističke ponude	8.639.900,00 €
- Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova	462.000,00 €.

Kroz Kapitalni budžet Direkcija javnih radova je u 2015. godini sprovodila aktivnosti na realizaciji 148 projekata od čega je planirano da se iz:

- opštih prihoda realizuje 116 projekata,
- opštih prihoda uz sufinansiranje - donacije stranih Vlada realizuju 3 projekta,
- bespovratnih sredstava iz predpristupnih IPA programa, kreditnih sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda za projekat izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Beranama – realizuje 1 projekat,
- bespovratnih sredstava iz predpristupnih IPA programa, uz sufinansiranje iz opštih prihoda za projekte sanacije nesanitarnih odlagališta otpada i projekte željezničke infrastrukture – 5 projekata,
- opštih prihoda uz sufinansiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke realizuje 1 projekat - projekat Katastra (LAMP),
- kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a realizuju 8 projekata – projekti Dječijih vrtića,
- kreditnih sredstava Evropske investicione banke uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a realizuju 14 projekata – Hitna pomoć i sanacija od poplava.

U članu 8. Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu definisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Donacija Vlade Republike Italije za projekat:

- Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma

Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa:

- Za projekte izgradnje PPOV i kanalizacione mreže, sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada i projekte željezničke infrastrukture, kao i za tehničku pomoć u cilju jačanja administrativnih kapaciteta organa u sastavu Operativne strukture

U članu 12. Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu definisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciona mreža i vodosnabdijevanje

Kredit Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) za projekte:

- Dječiji vrtić na Starom aerodromu u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Zagoriču u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Bloku VI u Podgorici,
- Dječiji vrtić u Tuzima,
- Dječiji vrtić u Baru,
- Dječiji vrtić u Ulcinju,
- Dječiji vrtić u Pljevljima,
- Rekonstrukcija vrtića na Žabljaku

Kredit Svjetske banke za projekat:

- Projekat katastra (LAMP).

Navedeno podrazumijeva da će prvobitno usvojena sredstva u Kapitalnom budžetu, ali i sama realizacija, biti dodatno uvećana po osnovu realizacije navedenih kreditnih, odnosno donatorskih aranžmana. Po ovom osnovu, u 2015. godini dodatno je povučeno **3.164.650,09 €**.

Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlašćenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava, do 31. decembra 2015. godine donijela sljedeće Zaključke:

- Zaključak Vlade CG br. 08-3039/3/14 od 15. januara 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi formiranja koordinacionog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu između Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i Države Crne Gore za realizaciju Projekta „Izgradnja sedam novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture u Crnoj Gori”.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete da formira navedeni koordinacioni odbor, u čijem sastavu će biti predstavnici Ministarstva prosvjete, Direkcije javnih radova i Ministarstva finansija.

- Zaključak Vlade CG br. 08-399 od 6. marta 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o razlozima hitne adaptacije Internog i Infektivnog odjeljenja Opšte bolnice Bijelo Polje.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da iz sredstava kapitalnog budžeta za 2015. godinu, s Programa 41501818 „Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja”, pozicija 4413 – Izdaci za građevinske objekte, prenese sredstva u iznosu od 85.000,00 € Opštoj bolnici u Bijelom Polju, po ispostavljenim situacijama, koje su potpisane od strane stručnog nadzora i predstavnika Opšte bolnice Bijelo Polje za izvođenje radova na rekonstrukciji Internog i Infektivnog odjeljenja Opšte bolnice Bijelo Polje.

Izbor najpovoljnijeg izvođača radova Opšta bolnica Bijelo Polje izvršiće u najkraćem mogućem roku i u zakonom propisanom postupku.

- Zaključak Vlade CG br. 08-467 od 2. aprila 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore.

Vlada je prihvatila Ugovor o kupovini stambenih jedinica za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore za 31 stambenu jedinicu od Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica, čija je vrijednost 999.544,00 €, koja sredstva su predviđena Kapitalnim budžetom Direkcije javnih radova za 2015. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore, broj: 08-1431/3, od 26. juna 2014. godine.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica prenese, iz Kapitalnog budžeta za 2015. godinu, sredstva u iznosu od 999.544,00 € na žiro-račun broj: 530-12829-35 kod NLB Montenegrobanke AD Podgorica.

- Zaključak Vlade CG br. 08-53 od 16. aprila 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Regionalnog stambenog programa.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da, u saradnji s menadžerskim timom Ministarstva rada i socijalnog staranja, implementira Regionalni stambeni program za Crnu Goru.

- Zaključak Vlade CG br. 08-858 od 8. maja 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanju Urbanističkog projekta JU „Srednja škola Golubovci”.

Vlada je odobrila sredstva, u iznosu od 90.000,00 eura, za izgradnju antenskog stuba, iz Kapitalnog budžeta za 2015. godinu, s Programa: 821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke, s Projekta: JU „Srednja škola Golubovci”, s izdatka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte.

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da sprovede proceduru javnih nabavki za izgradnju antenskog stuba.

Zadužuje se Radio-difuzni centar d.o.o. da pribavi građevinsku dozvolu za izgradnju antenskog stuba i obavljanje pratećih radova. Takođe, zadužuje se Radio-difuzni centar d.o.o. da, nakon izgradnje novog stuba, opremu s postojećeg prenese na novoizgrađeni antenski stub.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2273 od 25. septembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o postupanju nadležnih organa i institucija u slučaju većeg priliva migranata i izbjeglica u Crnu Goru.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da preduzme aktivnosti na adaptaciji objekata Kremza i Zoganje u cilju stvaranja minimalnih uslova za prihvatanje migranata i izbjeglica.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2710 od 19. novembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta izgradnje saobraćajnice od Solila do kružne raskrsnice za Pržno – MR1, Opština Tivat.

Vlada je prihvatila Protokol o realizaciji Projekta izgradnje saobraćajnice od Solila do kružne raskrsnice za Pržno – MR1 između Direkcije javnih radova i Opštine Tivat.

Vlada je odobrila preusmjerenje sredstava u iznosu od 3.000.000,00 eura, i to:

- s potrošačke jedinice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj
s Programa: 41001771 – Rješavanje uskih grla

s pozicije: 4411 – Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja u iznosu od 2.500.000,00 eura

s Programa: 41001762 – Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka

sa izdatka: 4411 – Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja u iznosu od 400.000,00 eura

s Program: 41001773 – Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije

sa izdatka: 4411 – Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja u iznosu od 100.00,00 eura

- na potrošačku jedinicu Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova na Program – Izgradnja lokalne infrastrukture (organizacioni kod 41501810)

na izdatak: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 eura.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2038 od 10. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o saradnji s kompanijom „Paradores de Turismo, S.A.”.

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da potrebna sredstva obezbijedi iz sredstava Programa: 826 – Unapređenje turističke ponude, s pozicije 4147 – Konsultantske usluge, projekti i studije.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2951 od 10. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za sanaciju stanja životne sredine u Opštini Pljevlja.

Vlada, shodno Zaključku broj: 08-1818, od 30. jula 2015. godine, zadužuje Direkciju javnih radova da, iz sredstava Kapitalnog budžeta, s Projekta: 812 – Projekti očuvanja životne sredine, sa izdatka: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu, Opštini Pljevlja uplati sredstva u iznosu od 500.000,00 eura.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2957 od 10. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava radi rješavanja hitnih mjera upravljanja na području ulcinjske Solane.

Vlada, shodno Zaključku broj: 08-1819, od 30. jula 2015. godine, zadužuje Direkciju javnih radova da, iz sredstava Kapitalnog budžeta, s Projekta: 826 – Unapređenje turističke ponude, sa izdatka: 4413 – Izdaci za građevinske objekte, Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore uplati sredstva u iznosu od 70.000,00 eura.

- Zaključak Vlade CG br. 08-3046 od 22. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za unapređenje turističke ponude u Opštini Rožaje.

Zadužuje se Direkcija javnih radova da, iz Kapitalnog budžeta za 2015. godinu, u okviru Programa: Unapređenje turističke ponude (organizacioni kod 826), s pozicije: 4413 – Izdaci za građevinske objekte, preusmjeri sredstva, u iznosu od 300.000,00 eura, na poseban račun Opštine Rožaje za potrebe unapređenja turističke ponude.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2998 od 28. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta Inovaciono-preduzetnički centar „TehnoPolis” Nikšić – Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori.

Zadužuju se Ministarstvo nauke i Direkcija javnih radova da realizuju aktivnosti utvrđene navedenom informacijom i o tome informišu Vladu.

- Zaključak Vlade CG br. 08-3062 od 28. decembra 2015. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju.

Vlada je prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o realizaciji rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Ukupna sredstva obezbijeđena Kapitalnim budžetom, uključujući kredite, donacije i Zaključke Vlade do ukupnog izvršenja, iznose 48.337.727,05 €.

Vrijednost sredstava koje je Direkcija javnih radova ukupno realizovala do 31.12.2015. godine iznosi 35.677.808,24 €, odnosno 73,81 % planiranih sredstava.

Od realizovanih sredstava u iznosu od 35.677.808,24 €, iz opštih prihoda realizovano je 32.513.158,15 €, iz kreditnih sredstava 1.673.054,73 € i iz donacija 1.491.595,36 €.

Takođe, pored naprijed navedenih sredstava realizovano je i **872.350,97 €** kroz sufinansiranje Republike Slovenije, posredstvom CMSR-a, za izgradnju Reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku, kao i za sanaciju neuređenog odlagališta otpada na Žabljaku. Ova sredstva nisu prikazana kroz realizaciju Kapitalnog budžeta, jer su ista direktno isplaćena izvođačima radova od strane CMSR-a.

Od ukupno realizovanih sredstava po regijama je:

- **40,38 %** realizovano za projekte u sjevernom regionu;
- **36,88 %** realizovano za projekte u centralnom regionu, pri čemu je najveći broj projekata realizovan u Podgorici, kao administrativnom centru Crne Gore;
- **15,59 %** realizovano za projekte u južnom regionu;
- **7,15 %** realizovano za projekte koji se ne mogu vezati za određeni region (Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu, Kupovina objekata od opština, Izrada planske dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude, Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija, Granični prelazi i Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdjevanje).

Direkcija javnih radova je u periodu od 01. januara do 31. decembra u okviru svojih aktivnosti sproveda 133 postupaka javnih nadmetanja, od čega 128 otvorena postupaka javne nabavke i 5 pregovaračkih postupaka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, u skladu sa odobrenjima dobijenim od strane Uprave za javne nabavke.

Direkcija javnih radova, u periodu do 31. decembra 2015. godine, zaključila je 75 ugovora, od čega 58 ugovora o izvođenju radova, 7 ugovora za vršenje stručnog nadzora i revizije tehničke dokumentacije i 10 ugovora za izradu Glavnog projekta.

Do kraja 2015. godine, od ukupnog broja projekata, za čiju realizaciju je zadužena Direkcija javnih radova, završene su aktivnosti na 70 projekata, u toku su aktivnosti na realizaciji 68 projekata od kojih je većina višegodišnjih, a nije realizovano 10 projekata.

U ukupnoj realizaciji u 2015. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je **33.659.031,42 €**. Radove na realizaciji projekata je gotovo u cjelosti realizovala domaća građevinska operativa. Iznos realizacije za naknade za gradsko-građevinsko zemljište, kao i iznos koji su ostvarile konsultatske firme (izrada tehničke dokumentacije, revizije, stručni nadzori i slično) ostvaren je u ukupnom iznosu od **2.018.776,82 €**.

Ukupan broj firmi koje su bile angažovane od strane Direkcije javnih radova u 2015. godini iznosi **104**, od čega je broj građevinskih firmi koje su izvodile radove **41**, dok je u kategoriji projektantskih i konsultantskih preduzeća bilo angažovano njih **63**.

Kako je Crna Gora tokom 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj” i potpisala finansijski sporazum, stvorili su se uslovi da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture. Ovaj program traje do kraja 2017. godine, kada je i krajnji rok za povlačenje sredstava po istom.

Tokom 2015. godine intenzivno je rađeno, u saradnji sa institucijama koje sačinjavaju Operativnu strukturu za realizaciju IPA projekata, kao i sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, na pripremi dokumentacije za objavljivanje tendera u skladu sa PRAG procedurama.

Do kraja 2015. godine raspisano je devet tendera za realizaciju projekata iz Operativnog programa, nakon što je pripremljena tenderska dokumentacija prihvaćena i odobrena od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, u skladu sa propisanim procedurama.

Takođe, pripremljene su još dvije tenderske dokumentacije i poslate na kontrolu i odobrenje Delegaciji EU u Crnoj Gori, a iste su krajem 2015. godine vraćene na doradu uz određene sugestije i primjedbe i aktivnosti će biti nastavljene u narednoj godini.

Na osnovu naprijed navedenih raspisanih tendera sklopljeni su ugovori za: izgradnju elektrovnog postrojenja „Trebešica”, rehabilitaciju i sanaciju nesanitarnog odlagališta otpada „Ćafe” u Opštini Bar, kao i za sprovođenje dijela aktivnosti u okviru tehničke pomoći i po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno **1.347.443,12 €**, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja ovih sredstava za 2015. godinu.

Zaključkom Vlade CG br. 08-53 od 16. aprila 2015. godine Direkcija javnih radova je zadužena da u saradnji sa menadžerskim timom Ministarstva rada i socijalnog staranja realizuje Regionalni stambeni program.

Regionalnim stambenim programom za Crnu Goru predviđeno je rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica, odnosno 1.177 domaćinstava koja spadaju u najranjivije kategorije (lica smještena u neformalnim kolektivnim centrima i ugrožena lica u privatnom smještaju, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik). Ukupna vrijednost projekta iznosi **27.696.000,00 €**, od čega je kontribucija države 15% odnosno **4.154.000,00 €**, dok su preostala sredstva obezbijeđena iz donatorskih sredstava međunarodnih partnera posredstvom Razvojne banke Savjeta Evrope. Trajanje programa je oročeno do kraja novembra 2017. godine.

Kroz navedeni program predviđena je:

- izgradnja 907 stambenih jedinica,
- isporuka građevinskog materijala za 120 stambenih jedinica,
- izgradnja 60 stambenih objekata montažnog tipa,
- izgradnja Doma starih u Pljevljima za 63 korisnika.

Tokom 2015. godine potpisan je ugovor i otpočelo se sa izvođenjem radova na izgradnji stambene zgrade sa 62 stambene jedinice za raseljenja lica u Nikšiću i raspisana javna nadmetanja za izvođenje radova na izgradnji 120 stambenih jedinica na lokaciji kamp Konik II u Podgorici i izvođenje radova na izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima. Takođe, sa Razvojnomo bankom Savjeta Evrope usaglašeno

je Idejno rješenje za 4 stambena objekta sa 94 stambene jedinice u Beranama, i otpočelo se sa izradom Glavnog projekta.

Realizaciju Kapitalnog budžeta u 2015. godini pratili su i određeni problemi, a koji u krajnjem rezultatu utiču na stepen realizacije planiranih aktivnosti.

Sredinom 2015. godine počela je primjena Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kao i novih podzakonskih akata, što je u početnom periodu dovelo do određenih poteškoća naručiocima i ponuđačima prilikom pripreme tenderske dokumentacije i ponuda, a odrazilo se na povećanje broja neispravnih ponuda.

Procedure javnih nabavki su pratili i žalbeni procesi koji su prolongirali rokove donošenja odluka i zaključivanje ugovora, tako da su neki postupci javnih nabavki trajali duže od uobičajenog vremena (Srednja stručna škola u Golubovcima, Dječiji vrtić u Baru, Rekonstrukcija vrtića na Žabljaku, Ski centar „Kolašin 1600”, itd.).

Takođe, na stepen realizacije budžeta reflektovale su se i neblagovremene odluke organa lokalnih uprava, a koje se odnose na donošenje planskih dokumenata, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, bez kojih nije bilo moguće započeti realizaciju projekata ili se određeni projekti nisu mogli realizovati u planiranom obimu (Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Pljevlja, Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Bijelo Polje, Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Plav, itd.).

U pojedinim slučajevima realizacija projekata se odvijala uz obavezu lokalne uprave ili nadležnog Javnog preduzeća da obezbijedi projektnu dokumentaciju, a izrada iste je kasnila ili se pokazalo da je njen kvalitet takav da zahtijeva dorade ili čak i izradu potpuno nove tehničke dokumentacije, što je neminovno usporavalo realizaciju, a postoje i situacije kada i pored više ponovljenih urgencija lokalna uprava nije dostavila potrebnu dokumentaciju, pa nije došlo do realizacije projekta (Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Rožaje, Administrativni objekat u Gusinju, Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Plav, Rekonstrukcija vodovoda „Krkori” u Opštini Andrijevica, Izgradnja restorana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin, Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Bar, Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Cetinje, Rezervoar za poboljšanje vodosnadbijevanja u Opštini Tivat, itd.).

Realizacija Kapitalnog budžeta bitan je instrument funkcionisanja i kontinuiranog obavljanja privredne aktivnosti, a javni radovi definisani na tržišnim principima poslovanja, izraz su legitimnog učešća države u kreiranju poslovnog i privrednog ambijenta. Kapitalno investiranje i politika javnih radova kroz realizaciju Kapitalnog budžeta omogućava svim učesnicima ovog programa da uz očekivane multiplikativne efekte dodatno dinamiziraju ekonomsku aktivnost i podstaknu rast i razvoj. Kroz realizaciju Kapitalnog budžeta omogućeno je poboljšanje lokalne infrastrukture, stvaranje uslova za rad državnih organa, kulturnih institucija, organa socijalnog staranja, obrazovnih institucija, zdravstvenih institucija, uz politiku što ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

Podgorica, 31. decembar 2015. godine

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA
za period od 01.01.2015. god. do 31.12.2015. godine

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</i>	551,000.00	7,465,000.00	8,016,000.00	324,268.62	6,999,789.14	7,324,057.76
1.1.	Kamp na Zlatici	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	973,909.97	973,909.97
1.2.	Objekt CANU-a u Podgorici	20,000.00	500,000.00	520,000.00	4,856.09	435,741.92	440,598.01
1.3.	Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici	90,000.00	1,100,018.00	1,190,018.00	82,459.66	1,510,289.82	1,592,749.48
1.4.	Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	71,000.00	249,982.00	320,982.00	51,748.19	287,864.65	339,612.84
1.5.	Državno tužilaštvo u Kotoru	37,000.00	740,000.00	777,000.00	23,970.35	506,303.03	530,273.38
1.6.	Nova zgrada Skupštine CG u Podgorici	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Bivša zgrada MUP-a CG u Podgorici	50,000.00	800,000.00	850,000.00	24,625.48	782,588.09	807,213.57
1.8.	Akcioni plan prilagođavanja objekta javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	50,000.00	400,000.00	450,000.00	44,424.09	359,116.63	403,540.72
1.9.	Administrativni objekat u Mojkovcu	25,000.00	985,000.00	1,010,000.00	17,136.00	926,857.53	943,993.53
1.10.	Administrativni objekat u Gusinju	10,000.00	150,000.00	160,000.00	9,020.20	140,978.19	149,998.39
1.11.	Administrativni objekat u Andrijevići	5,000.00	80,000.00	85,000.00	4,902.80	76,971.28	81,874.08
1.12.	Administrativni objekat u Petnjici	35,000.00	315,000.00	350,000.00	13,982.50	0.00	13,982.50
1.13.	Izgradnja i opremanje kuhinje ZIKS-a	6,000.00	360,000.00	366,000.00	5,853.50	359,022.49	364,875.99

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1.14.	Adaptacija prostorija Državnog tužilaštva na Cetinju	5,000.00	120,000.00	125,000.00	4,950.00	119,059.37	124,009.37
1.15.	Smještajni kapaciteti za SAJ i PJP u Danilovgradu	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
1.16.	Adaptacija poslovnog prostora MUP-a	20,000.00	247,000.00	267,000.00	12,411.46	191,494.80	203,906.26
1.17.	Granični prelazi	25,000.00	333,000.00	358,000.00	23,928.30	329,591.37	353,519.67
2.	<i>Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</i>	<i>210,000.00</i>	<i>3,180,956.00</i>	<i>3,390,956.00</i>	<i>73,742.76</i>	<i>649,189.39</i>	<i>722,932.15</i>
2.1.	Muzički centar Crne Gore u Podgorici	40,000.00	778,456.00	818,456.00	22,509.29	515,528.89	538,038.18
2.2.	Centar kulture u Pljevljima	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP-Cetinje	40,000.00	1,375,000.00	1,415,000.00	9,098.55	0.00	9,098.55
2.4.	Nacionalna biblioteka „Đurađ Crnojević“	75,000.00	35,000.00	110,000.00	42,134.92	33,662.89	75,797.81
2.5.	Adaptacija zgrade bivšeg Belgijskog poslanstva na Cetinju	15,000.00	217,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.	Sanacija spomenika na Stražici, Pljevlja	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	99,997.61	99,997.61
2.7.	Biblioteka za slijepe u Podgorici	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.	Državni institut u Kolašinu	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</i>	<i>67,000.00</i>	<i>1,583,000.00</i>	<i>1,650,000.00</i>	<i>39,251.01</i>	<i>1,547,650.54</i>	<i>1,586,901.55</i>
3.1.	Sportska dvorana u Beranama	50,000.00	1,220,000.00	1,270,000.00	25,271.30	1,213,126.02	1,238,397.32

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
3.2.	Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom MK i ŽB	15,000.00	340,000.00	355,000.00	13,979.71	334,524.52	348,504.23
3.3.	Stadion na Cetinju	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Sportska dvorana u Kotoru	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	<i>Projekti očuvanja životne sredine</i>	<i>612,000.00</i>	<i>2,128,000.00</i>	<i>2,740,000.00</i>	<i>506,664.91</i>	<i>2,002,434.31</i>	<i>2,509,099.22</i>
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdjevanje	248,000.00	10,000.00	258,000.00	229,366.00	0.00	229,366.00
4.2.	Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik	50,000.00	10,000.00	60,000.00	47,655.00	0.00	47,655.00
4.3.	Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećeg odlagališta otpada u Šavniku	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	Kanalizaciona mreža u Plavu	90,000.00	0.00	90,000.00	69,496.00	0.00	69,496.00
4.5.	Kanalizaciona mreža u Rožajama	70,000.00	0.00	70,000.00	44,744.00	0.00	44,744.00
4.6.	Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove Vode u Beranama	31,000.00	10,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7.	Kanalizaciona mreža u Pljevljima	5,000.00	188,000.00	193,000.00	4,760.00	170,970.23	175,730.23
4.8.	Rezervoar za poboljšanje vodosnabdjevanja u Tivtu	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4.9.	Sanacija deponije na Žabljaku	51,000.00	0.00	51,000.00	50,100.00	0.00	50,100.00
4.10.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku	35,000.00	780,000.00	815,000.00	33,214.99	770,000.02	803,215.01

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
4.11.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	30,000.00	600,000.00	630,000.00	27,328.92	561,464.06	588,792.98
4.12.	Sanacija stanja životne sredine, Opština Pljevlja	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5.	<i>Izgradnja lokalne infrastrukture</i>	<i>267,500.00</i>	<i>9,181,499.96</i>	<i>9,448,999.96</i>	<i>258,706.55</i>	<i>8,877,402.80</i>	<i>9,136,109.35</i>
5.1.	Infrastruktura u MZ Bukovica	14,000.00	420,000.00	434,000.00	13,282.80	414,539.24	427,822.04
5.2.	Rekonstrukcija gradske tržnice u Bijelom Polju	42,500.00	1,420,000.00	1,462,500.00	41,121.00	1,414,681.09	1,455,802.09
5.3.	Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštini Kolašin i Mojkovac	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5.4.	Asfaltiranje durmitorskog prstena	5,000.00	195,000.00	200,000.00	3,332.00	174,920.56	178,252.56
5.5.	Vodovod Krkori, Andrijevića	7,000.00	660,000.00	667,000.00	6,897.00	652,259.34	659,156.34
5.6.	Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici, Rožaje	8,100.00	150,000.00	158,100.00	6,200.00	144,383.00	150,583.00
5.7.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	190,900.00	6,401,499.96	6,592,399.96	187,873.75	6,046,619.57	6,234,493.32
5.7.1.	Lokalni putevi 10 km	14,450.00	3,454,999.96	3,469,449.96	13,115.60	3,441,628.90	3,454,744.50
5.7.1.1.	Opština Berane 0,6 km	1,500.00	30,000.00	31,500.00	1,094.80	29,762.50	30,857.30
5.7.1.2.	Opština Petnjica 2,2 km	9,250.00	100,000.00	109,250.00	9,164.80	97,009.51	106,174.31
5.7.1.3.	Opština Pljevlja 2,2 km	500.00	102,000.00	102,500.00	0.00	101,102.40	101,102.40
5.7.1.4.	Opština Žabljak 0,6 km	800.00	27,000.00	27,800.00	714.00	26,609.83	27,323.83
5.7.1.5.	Opština Gusinje 2,2 km	200.00	96,000.00	96,200.00	0.00	87,178.71	87,178.71
5.7.1.6.	Opština Herceg Novi 2,2 km	2,200.00	100,000.00	102,200.00	2,142.00	99,965.95	102,107.95

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
5.7.1.7.	Opština Tivat	0.00	2,999,999.96	2,999,999.96	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5.7.2.	Gradske saobraćajnice	176,450.00	2,946,500.00	3,122,950.00	174,758.15	2,604,990.67	2,779,748.82
5.7.2.1.	Gradske saobraćajnice u Rožajama - rekonstrukcija	13,150.00	150,000.00	163,150.00	13,120.10	129,066.30	142,186.40
5.7.2.2.	Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Beranama	8,700.00	140,000.00	148,700.00	8,688.00	133,007.68	141,695.68
5.7.2.3.	Gradske saobraćajnice u Plavu	60,800.00	550,000.00	610,800.00	60,619.25	541,880.30	602,499.55
5.7.2.4.	Gradska saobraćajnica u Andrijevići- rekonstrukcija glavnog trga	5,000.00	270,000.00	275,000.00	4,998.00	266,083.63	271,081.63
5.7.2.5.	Gradske saobraćajnice u Bijelom Polju	22,900.00	178,000.00	200,900.00	22,807.50	169,626.02	192,433.52
5.7.2.6.	Gradske saobraćajnice u Mojkovcu	19,500.00	52,000.00	71,500.00	19,404.16	51,039.20	70,443.36
5.7.2.7.	Gradske saobraćajnice u Pljevljima	27,000.00	580,000.00	607,000.00	26,896.86	575,952.80	602,849.66
5.7.2.8.	Gradske saobraćajnice u Danilovgradu	12,000.00	200,000.00	212,000.00	11,994.28	186,559.79	198,554.07
5.7.2.9.	Gradska saobraćajnica na Cetinju	3,900.00	10,000.00	13,900.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5.7.2.10.	Gradska saobraćajnica u Nikšiću	500.00	481,500.00	482,000.00	0.00	473,889.34	473,889.34
5.7.2.11.	Gradska saobraćajnica u Ulcinju	2,500.00	100,000.00	102,500.00	2,380.00	3,850.07	6,230.07
5.7.2.12.	Gradske saobraćajnice u Podgorici	500.00	40,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
5.7.2.13.	Gradska saobraćajnica u Baru	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,035.54	74,035.54

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
6.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja</i>	157,000.00	1,667,077.00	1,824,077.00	115,970.34	1,636,167.31	1,752,137.65
6.1.	Zavod za transfuziju krvi u Podgorici	92,000.00	410,000.00	502,000.00	91,388.68	402,132.06	493,520.74
6.2.	Poliklinički sa Urgentnim centrom u Beranama	45,000.00	295,000.00	340,000.00	24,581.66	276,958.89	301,540.55
6.3.	Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
6.4.	Kupovina objekata od opštine	0.00	522,077.00	522,077.00	0.00	522,076.55	522,076.55
6.5.	Rekonstrukcija Internog odjeljenja OB Bijelo Polje	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	84,999.81	84,999.81
7.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</i>	91,600.00	1,819,544.00	1,911,144.00	38,142.56	1,317,972.53	1,356,115.09
7.1.	Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija	0.00	999,544.00	999,544.00	0.00	999,544.00	999,544.00
7.2.	Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama	32,100.00	380,000.00	412,100.00	19,342.97	318,428.53	337,771.50
7.3.	Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” Podgorica	19,500.00	0.00	19,500.00	18,799.59	0.00	18,799.59
7.4.	Dom starih u Podgorici	40,000.00	440,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
8.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja</i>	377,800.00	6,135,200.00	6,513,000.00	275,399.02	5,039,928.18	5,315,327.20
8.1.	Akademije umjetnosti na Cetinju	73,300.00	1,676,700.00	1,750,000.00	37,300.14	1,474,922.10	1,512,222.24
8.2.	Sportska dvorana Univerziteta CG u Podgorici	89,027.78	2,329,006.43	2,418,034.21	60,902.21	2,161,887.06	2,222,789.27

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
8.3.	Studentski dom „Braća Vučinić” u Nikšiću	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a	115,472.22	392,493.57	507,965.79	114,435.71	506,879.09	621,314.80
8.4.1.	Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	38,472.22	52,500.00	90,972.22	62,261.16	19,990.00	82,251.16
8.4.2.	Vrtić u Zagoriču, Podgorica	37,500.00	182,493.57	219,993.57	36,363.30	367,366.21	403,729.51
8.4.3.	Vrtić u Baru	6,500.00	52,500.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4.4.	Vrtić u Ulcinju	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4.5.	Vrtić u Pljevljima	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4.6.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4.7.	Vrtić u Tuzima	5,000.00	0.00	5,000.00	4,879.00	0.00	4,879.00
8.4.8.	Rekonstrukcija vrtića na Žabljaku	11,000.00	85,000.00	96,000.00	10,932.25	119,522.88	130,455.13
8.5.	Srednja stručna škola u Golubovcima	46,000.00	365,000.00	411,000.00	45,327.46	0.00	45,327.46
8.6.	Izrada fiskulturne sale za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	8,000.00	0.00	8,000.00	4,760.00	0.00	4,760.00
8.7.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8.8.	Inovaciono-preduzetnički centar „Technopolis” -Nikšić	19,000.00	900,000.00	919,000.00	11,959.50	896,239.93	908,199.43
8.9.	OŠ u Gukama	2,000.00	392,000.00	394,000.00	714.00	0.00	714.00

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
9.	<i>Unapređenje turističke ponude</i>	1,032,400.00	7,345,500.00	8,377,900.00	307,378.85	2,367,937.75	2,675,316.60
9.1.	Izgradnja apartmana i restorana u NP Biogradska gora, Kolašin	25,000.00	270,000.00	295,000.00	20,505.37	187,489.41	207,994.78
9.2.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32,900.00	250,000.00	282,900.00	26,590.00	0.00	26,590.00
9.3.	Put Vragodo Vrioca-Žarski katun, Mojkovac	25,000.00	0.00	25,000.00	23,283.00	0.00	23,283.00
9.4.	Ski centar „Kolašin 1600”, Kolašin	188,500.00	4,509,500.00	4,698,000.00	44,106.50	1,192,372.20	1,236,478.70
9.5.	Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje	125,000.00	1,225,000.00	1,350,000.00	32,068.00	394,585.13	426,653.13
9.6.	Unapređenje turističke ponude u Rožajama	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
9.7.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje -Štedin u dužini od 7 km- Rožaje	10,000.00	50,000.00	60,000.00	7,867.60	30,000.00	37,867.60
9.8.	Revitalizacija jezera Ponikvice, Danilovgrad	23,000.00	160,000.00	183,000.00	18,032.50	155,774.97	173,807.47
9.9.	Izrada planske dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude	548,000.00	0.00	548,000.00	97,538.00	0.00	97,538.00
9.10.	Izgradnja infrastrukture kamp odmorišta	5,000.00	81,000.00	86,000.00	1,190.00	37,716.04	38,906.04
9.11.	Izgradnja akumulacionog jezera za ski centar „Vučje”	10,000.00	240,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

R. br.	NAZIV PROJEKTA	KAPITALNI BUDŽET ZA 2015. GODINU			REALIZOVANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2015. GODINU		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
9.12.	Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	30,000.00	100,000.00	130,000.00	29,097.88	0.00	29,097.88
9.13.	Izmještanje ikone bogorodice Filarmosa na Cetinje	10,000.00	90,000.00	100,000.00	7,100.00	0.00	7,100.00
9.14.	Kuća „Voća” i Kuća „Vina”	10,000.00	480,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
9.15.	Solana Ulcinj	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
10.	<i>Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova</i>	<i>73,500.00</i>	<i>428,500.00</i>	<i>502,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>1,565,227.45</i>	<i>1,585,227.45</i>
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	32,999.90	171,600.00	204,599.90	0.00	0.00	0.00
10.2.	Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju i „Čafe” u Baru	4,000.10	149,000.00	153,000.10	0.00	691,344.20	691,344.20
10.3.	Rekonstrukcija kosina na željezničkoj pruzi	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
10.4.	Tehnička pomoć	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
10.5.	Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice „Trebešica”	12,000.00	107,900.00	119,900.00	0.00	873,883.25	873,883.25
11.	<i>Poplave</i>	<i>37,000.00</i>	<i>786,000.00</i>	<i>823,000.00</i>	<i>59,252.20</i>	<i>1,655,332.02</i>	<i>1,714,584.22</i>
	SVE UKUPNO	3,476,800.00	41,720,276.96	45,197,076.96	2,018,776.82	33,659,031.42	35,677,808.24

3. REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

I. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

I.1. Kupovina objekta Kampa na Zlatici

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 03-7921/4 od 17. novembra 2011. godine i Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa, zaključenog između Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija i Glavnog grada br. 06-4359/1 od 25.11.2011. godine, utvrđena je obaveza kupovine objekta Kampa na Zlatici, za potrebe trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice Uprave policije.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **973.909,97 €**.

I.2. Izgradnja objekta Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti

Status projekta:

U toku



- ❑ Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 63 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića.
- ❑ Objekat je bruto površine 6.990 m² i sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova.
- ❑ U novoprojektovanoj zgradi CANU-a je planirano: 70 kancelarija, 7 sala za sastanke, 2 laboratorije akademskog kluba, čitaonice, 3 depoa, 2 arhive, kao i ostale prateće tehničke prostorije.
- ❑ Sa radovima na izgradnji objekta se započelo krajem 2010. godine.
- ❑ U prethodnom periodu su završeni radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, radovi na oblaganju fasadnih zidova cijepanim kamenom, radovi na izradi ventilirajuće kamene fasade i polustrukturalnih fasada, kao i radovi na grubom razvodu vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.
- ❑ U 2014. godini radovi se nisu izvodili i gradilište je bilo konzervirano.
- ❑ U 2015. godini nastavljeno je sa izvođenjem radova u okviru obezbijedenih sredstava i izvođeni su keramičarski radovi, montažni radovi, kao i radovi na montaži elektroinstalacija.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **440.598,01 €**.

I.3. Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine

Status projekta:

Završen

- ❑ Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine se finansira kroz Kapitalni budžet Crne Gore i iz kredita Svjetske banke.
- ❑ Objekat Uprave za nekretnine je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 2 u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona” – Izmjene i dopune, u Podgorici.
- ❑ Objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i pet spratova, ukupne bruto površine cca 8.600 m², od čega je površina podzemnih etaža 2.780 m², a nadzemnih 5.820 m².
- ❑ U novoprojektovanom poslovnom objektu funkcionalno su organizovani sadržaji Uprave za nekretnine i Područne jedinice Podgorica, za cca 220 radnih mjesta.
- ❑ U objektu je planirano: 100 kancelarija, 6 kabineta sa predprostorom i toaletima, 13 šaltera sa prostorom za stranke, 5 sala za sastanke, 2 multimedijalne sale kapaciteta 30 i 70 mjesta, restoran sa kuhinjom kapaciteta 30 mjesta, prostorije za tehničku opremu i održavanje objekta, server sale, arhive, magacini, ostali tehnički i prateći sadržaji, kao i garažiranje vozila, na drugom nivou suterena, sa 40 parking mjesta.
- ❑ Sa radovima na izgradnji objekta se započelo sredinom 2011. godine.
- ❑ Krajem 2015. godine završeni su radovi na izgradnji objekta i za isti je pribavljena upotrebna dozvola. Radovi su izvođeni u skladu sa dinamikom obezbijedenja sredstava.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.592.749,48 €**.



I.4. Izgradnja objekta Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma

Status projekta:

U toku



- ❑ Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegro-Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- ❑ Lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica, na urbanističkoj parceli br. 9. Objekat će sadržati podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi cca 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m².
- ❑ Izgradnja objekta se realizuje fazno.
- ❑ I faza izgradnje objekta predmet je zajedničkog finansiranja Crnogorske strane (43,81%) i Italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.

- ❑ Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- ❑ Krajem 2012. godine se otpočelo sa izgradnjom, do kraja 2014. godine su završeni radovi na izradi armirano-betonske, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine.
- ❑ Objekat je konzerviran do usaglašavanja aktivnosti sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za radove II faze.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **339.612,84 €**.

I.5. Nadgradnja objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Opštini Kotor

Status projekta:

U toku



- ❑ Planirana je nadogradnja bivšeg objekta SDK Kotor, koji se sastoji od suterena i prizemlja.
- ❑ Nadograđeni objekat će sadržati 13 kancelarija, prostorije za prepoznavanje, prostoriju za zadržavanje osumnjičenih, arhivu, salu za sastanke i ostale prateće tehničke prostorije, ukupne bruto površine cca 905 m².
- ❑ U 2014. godini potpisan je Ugovor sa izabranim izvođačem radova i pribavljena je građevinska dozvola.
- ❑ Radovi su započeti u martu 2015. godine i izvodili su se usporenom dinamikom jer Centralna banka Crne Gore nije blagovremeno u potpunosti oslobodila prostor u kom je predviđena konstruktivna sanacija. Radovi se punim intenzitetom izvode od avgusta 2015. godine, kada su prostorije iseljene.
- ❑ Završeni su radovi na konstruktivnoj sanaciji postojećeg objekta, armiranobetonski, zidarski i krovopokrivački radovi, kao i radovi na ugradnji fasadne bravarije.
- ❑ U toku su radovi na izvođenju razvoda elektro, vodovodnih i mašinskih instalacija, kao i fasaderski radovi.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **530.273,38 €**.

I.6. Raspisivanje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Nove zgrade Skupštine Crne Gore

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2011. godini stručni tim Direkcije javnih radova je izradio Studiju mogućih rješenja za obezbjeđenje prostora za rad Skupštine Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, na osnovu koje je donešen Zaključak Vlade o izboru lokacije Nove zgrade Skupštine Crne Gore.
- ❑ Zaključkom Vlade br. 03-7377/3 od 29.12.2011. godine, definisano je raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja na predmetnoj lokaciji i to u dvije varijante: a) rekonstrukcija i adaptacija stare zgrade Vlade u Ulici Jovana Tomaševića i izgradnja novog objekta u neposrednoj blizini, i b) rušenje postojećeg i izgradnja novog objekta na istoj urbanističkoj parceli.
- ❑ U 2012. godini stručni tim je, u saradnji sa predstavnicima Skupštine, izradio Projektni zadatak u dijelu definisanja budućeg kapaciteta i prostornih sadržaja objekta Skupštine.
- ❑ U toku je izrada DUP-a za lokaciju rekreativno kulturne zone – sjeverni dio, na kojoj je predviđena buduća zgrada Skupštine Crne Gore, nakon čijeg će se usvajanja pristupiti raspisivanju konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, čime će se stvoriti uslovi za konkretnu realizaciju aktivnosti na ovom projektu.
- ❑ Takođe, u 2015. godini bilo je planirano izvođenje radova na sanaciji krovne lanterne i dio enterijerskih radova u plenarnoj sali, koji su u dogovoru sa predstavnicima Skupštine odloženi za 2016. godinu.

I.7. Bivša zgrada MUP-a u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen

- ❑ Tokom prvog kvartala 2014. godine završena je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju dijela bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Ulici Serdara Jola Piletića.
- ❑ Realizacija projekta odvijala se fazno.
- ❑ I faza je obuhvatala adaptaciju postojeće šalter sale u dijelu prizemlja objekta, koji je namijenjen za izdavanje dokumenata i registraciju vozila, i čija površina iznosi oko 320 m².
- ❑ II faza se odnosila na adaptaciju prizemlja i prvog sprata ukupne površine oko 1.550 m², kao i sanaciju krova i fasade objekta.
- ❑ Prostor je namijenjen za potrebe sljedećih službi: sektora za vanredne situacije i upravnih poslova, kancelarije za upravnu inspekciju, kancelarije za inspektore za strance, kancelarije službe za prijem azilanata, biro za investicije i biro za smještaj i ishranu.
- ❑ Svi ugovoreni radovi I i II faze su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **807.213,57 €**.




I.8. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Status projekta:

U toku

- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti.
- ❑ Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritetno prilagođavanje u Opštinama Podgorica, Nikšić, Berane i Pljevlja.
- ❑ Završena je izrada Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti.
- ❑ Završena je I faza izvođenja radova na objektu Skupštine Crne Gore u Podgorici, kao i na objektu Doma zdravlja – zgrada laboratorije i rendgena u Pljevljima.
- ❑ Takođe, završeni su svi ugovoreni radovi na objektima Poreske uprave u Podgorici i Doma zdravlja „Dr Niko Labović” – služba izabranog doktora u Beranama, dok su na objektu Centra za socijalni rad završeni građevinsko zanatski radovi i preostala je ugradnja kosih podiznih rampi.
- ❑ Krajem 2015. godine raspisana su javna nadmetanja za radove na prilagođavanju sljedećih objekata: Opšta bolnica u Nikšiću, Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici, Osnovni sud u Podgorici i Ekonomski fakultet u Podgorici.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **403.540,72 €**.

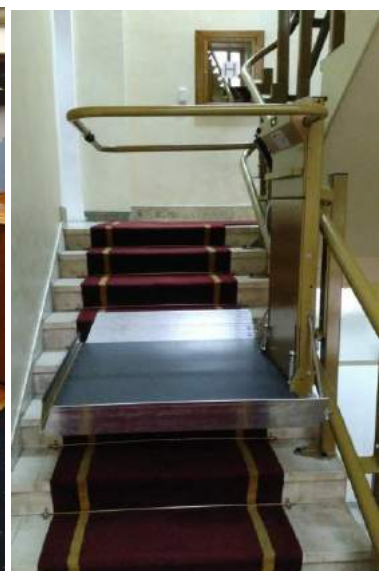



I.9. Administrativni objekat u Opštini Mojkovac

Status projekta:

Završen



- ❑ U 2013. godini završena je izrada Glavnog projekta administrativnog objekta Opštine Mojkovac.
- ❑ Krajem 2014. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova i otpočelo se sa istim.
- ❑ Objekat je izgrađen na lokaciji u centru grada, na mjestu gdje se nalazio bivši objekat Opštine Mojkovac, koji je srušen u cilju oslobađanja lokacije za izgradnju novog.
- ❑ Izgrađeni objekat se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne bruto površine 1.290 m².
- ❑ U objektu je smješteno 35 kancelarija za opštinske službe i službu Predsjednika Opštine, multimedijalna sala kapaciteta 50 mjesta, bife sa čajnom kuhinjom, kao i ostale prateće prostorije.
- ❑ Svi ugovoreni radovi na izgradnji i opremanju objekta su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **943.993,53 €**.

I.10. Administrativni objekat u Gusinju

Status projekta:

U toku



- ❑ Aktivnosti na realizaciji ovog projekta sprovodi Opština Gusinje.
- ❑ U prethodnom periodu prije formiranja Opštine Gusinje, Opština Plav je sprovela aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg objekta i realizovala grube građevinske radove.
- ❑ Planiran je administrativni objekat bruto površine 1.133 m², spratnosti prizemlje, dva sprata i potkrovlje.

- ❑ Direkcija javnih radova je od Opštine Gusinje, koja je naručila izradu Glavnog projekta, dobila isti, a njegovom analizom utvrđeno je da ne sadrži sve faze da bi se objekat mogao izvesti u skladu sa tehničkim propisima. Zajedno sa Opštinom se pristupilo doradi tehničke dokumentacije, nakon čega je Opština raspisala javno nadmetanje i potpisala ugovor za izvođenje radova, koji su otpočeli tek u oktobru 2015. godine i isti su u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova na objektu.
- ❑ Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **149.998,39 €**.

I.11. Administrativni objekat u Andrijevici

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini završeni su radovi na adaptaciji postojećeg administrativnog objekta Opštine.
- ❑ Radovi su se odnosili na zamjenu spoljne stolarije, krovnog pokrivača i sanaciju fasade.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **81.874,08 €**.



I.12. Administrativni objekat u Petnjici

Status projekta:

U toku



- ❑ U 2015. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na izgradnji administrativnog objekta Opštine Petnjica.
- ❑ Objekat je projektovane bruto površine 1.760 m² i posjeduje suteran, prizemlje, sprat i potkrovlje. U suterenu je smješten garažni prostor sa osam parking mjesta. Prizemlje objekta posjeduje šalter salu za opštinske službe sa dvije kancelarije, salu za sastanke Skupštine, kapaciteta oko 60 mjesta i salu za vjenčanja i druge manifestacije. Na prvom spratu su smještene: kancelarije predsjednika, podpredsjednika, tehničkog sekretara, glavnog administratora, multifunkcionalna sala za sastanke i osam kancelarija. U potkrovnom prostoru je smješteno 14 kancelarija. Uz kancelarije su organizovani i prateći pomoćni i tehnički sadržaji.
- ❑ Završena je izrada i revizija Glavnog projekta, raspisano je javno nadmetanje i izvršen odabir izvođača radova.
- ❑ Planiran je početak radova u januaru 2016. godine.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **13.982,50 €**.

I.13. Izgradnja i opremanje zatvorske kuhinje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

Status projekta:

Završen



- ❑ Objekat, čija je adaptacija izvršena za potrebe nove kuhinje ZIKS-a (prostor nekadašnje radionice), nalazi se u okviru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spuzu.
- ❑ Objekat je prizemni, ukupne bruto površine 217,13 m². Projektovana kuhinja zadovoljava traženi kapacitet od 1.200 doručaka, 1.200 ručkova, 1.200 večera i 360 užina, pri čemu se hrana distribuira na šest lokacija.
- ❑ U 2014. godini raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača radova, a u 2015. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **364.875,99 €**.

I.14. Adaptacija prostorija Državnog tužilaštva na Cetinju

Status projekta:

Završen



- ❑ Sa adaptacijom prostorija Državnog tužilaštva na Cetinju otpočelo se krajem 2013. godine, nakon preseljenja Likovne akademije.
- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su grubi građevinsko zanatski radovi, grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i elektroinstalacija.
- ❑ U 2015. godini zaključen je ugovor za izvođenje preostalih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, a koji obuhvataju podopolagačke radove, radove na termotehničkim instalacijama, elektroinstalacijama, kao i radove na opremanju objekta namještajem i svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **124.009,37 €**.

I.15. Smještajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici

Status projekta:

U toku

- ❑ Nakon izrade Studije mogućih lokacija za smještaj kompleksa, Direkcija javnih radova je izradila i Idejno arhitektonsko rješenje koje je bilo osnova za izradu Glavnog projekta.
- ❑ Predviđeno je da kompleks objekata bude ukupne bruto površine oko 5.350 m² i da bude smješten u okviru postojećeg kompleksa na Zlatici u Podgorici.
- ❑ U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, 17 kancelarija, 2 kabineta i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom.
- ❑ U 2015. godini, nakon dostavljanja urbanističko-tehničkih uslova raspisano je javno nadmetanje za izradu i reviziju projektne dokumentacije smještajnih objekata za potrebe Specijalne aniterorističke jedinice (SAJ) i Posebne jedinice policije (PJP) i isto je u toku.
- ❑ U narednoj godini je planiran nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na izgradnji kompleksa.



I.16. Adaptacija poslovnog prostora MUP-a

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini izvođeni su radovi na zamjeni krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i gromobranske instalacije, zamjeni dijela fasadne bravarije, kao i radovi na rekonstrukciji mokrih čvorova na trećem spratu objekta.
- ❑ Svi planirani radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **203.906,26 €**.



I.17. Granični prelazi

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini odvijala se realizacija projekta poboljšanja uslova rada i boravka službi na 17 graničnih prelaza u 8 Opština i to u: Baru, Herceg Novom, Nikšiću, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Podgorici i Rožajama.
- ❑ Sve planirane aktivnosti na realizaciji poboljšanja uslova rada i boravka službi na graničnim prelazima završene su.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **353.519,67 €**.



- ❑ Zaključkom Vlade br. 08-2273 od 25. septembra 2015. godine o postupanju nadležnih organa i institucija u slučaju većeg priliva migranata i izbjeglica u Crnu Goru, Direkcija javnih radova je zadužena da preduzme aktivnosti na adaptaciji bivših vojnih graničnih objekata Kremza i Zoganje u cilju stvaranja minimalnih uslova za prihvrat migranata i izbjeglica.
- ❑ Tokom oktobra i novembra 2015. godine stručna služba Direkcije javnih radova je, sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, izvršila obilazak navedenih lokacija i izradila Elaborat sanacije postojećih objekata. Procijenjena vrijednost radova na sanaciji objekata iznosi 255.000,00 €.
- ❑ Kako navedeni objekti nisu bili obuhvaćeni Planom javnih nabavki, Direkcija javnih radova se obratila Ministarstvu finansija i zatražila donošenje amandmana na Plan javnih nabavki kako bi u skladu sa zakonskom procedurom, mogla raspisati javno nadmetanje za izvođenje radova.
- ❑ S obzirom na to da Ministarstvo finansija do kraja 2015. godine nije usvojilo naprijed navedeni amandman, ovaj projekat nije realizovan.
- ❑ U toku su aktivnosti u koordinaciji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, u cilju definisanja načina za realizaciju ovog projekta.

II. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

II.1. Nadogradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola

Status projekta:

U toku



- ❑ U toku je rekonstrukcija i dogradnja bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², u kojem će nakon završetka radova biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola.
- ❑ Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- ❑ Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- ❑ U toku su završni građevinsko zanatski i instalaterski radovi na objektu.
- ❑ U pripremi je javno nadmetanje za radove na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, kao i za radove na opremanju objekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **538.038,18 €**.

II.2. Rekonstrukcija Centra kulture u Opštini Pljevlja

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat rekonstrukcije objekta Doma kulture u Pljevljima implementirali su stručna služba Opštine Pljevlja, Ministarstvo kulture, a u koordinaciji sa Direkcijom javnih radova.
- ❑ U 2011. godini su završeni svi građevinski instalaterski radovi na rekonstrukciji objekta, a u 2012. godini su završeni ugovoreni enterijerski radovi, koji su se odnosili na dvoranu i prateće sadržaje.
- ❑ Sredstva planirana za 2015. godinu odnose se na finansiranje završetka preostalih zanatskih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju biblioteke, muzeja, galerije i depoa u sklopu Centra kulture.
- ❑ Tokom 2014. i 2015. godine Opština je raspisala više javnih nadmetanja koja je poništila Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa Zakonom, a na posljednja raspisana dva javna nadmetanja nije bilo pristiglih ispravnih ponuda, pa planirana sredstva nisu realizovana.
- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta će se nastaviti u narednoj godini.



II.3. Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP - Cetinje

Status projekta:

U toku



- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br.08-1927/4 od 02.08.2013. godine Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je zadužen da pristupi izradi konzervatorskog projekta restauracije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju. Takođe, na osnovu Zaključka Vlade br. 08-2014/2 od 1. avgusta 2014. godine izvršen je transfer sredstava Prijestonici Cetinje na ime kofinansiranja projekta.
- ❑ U skladu sa Kapitalnim budžetom Direkcija javnih radova je nakon završene tenderske procedure, avgusta 2014. godine potpisala Ugovor za vršenje revizije Glavnog projekta.
- ❑ Ugovorom o realizaciji predmetnog objekta zaključenog između Ministarstva finansija Crne Gore, Prijestonice Cetinje, UNDP-a (Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori) i Direkcije javnih radova definisana je obaveza UNDP-a da sprovede postupak javne nabavke za izbor izvođača radova u skladu sa procedurama UNDP-a i obaveza Direkcije javnih radova da shodno zakonskoj proceduri izvrši izbor nadzornog organa nad izvođenjem radova na objektu, kao i da izvrši prenos sredstava Prijestonici i UNDP-u.
- ❑ Direkcija javnih radova je nakon završene procedure javnog nadmetanja potpisala krajem marta mjeseca 2015. godine Ugovor o vršenju poslova stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji objekta.

- ❑ Projektna dokumentacija je završena sredinom oktobra 2015. godine.
- ❑ Nakon završenog međunarodnog tenderskog procesa UNDP je potpisao Ugovor za radove na rekonstrukciji objekta.
- ❑ Sa radovima se započelo krajem novembra 2015. godine.
- ❑ U toku su demontažni radovi i izrada krovne konstrukcije.
- ❑ Zaključkom Vlade br. 08-3062 od 28. decembra 2015. godine ovlašćeni su ministar finansija i direktor Direkcije javnih radova, da u ime Vlade, potpišu Aneks ugovora o realizaciji rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Aneksom je predviđeno da se sredstva koja su planirana Kapitalnim budžetom za 2015. godinu isplate na račun UNDP-a u iznosu koji je u skladu sa mogućnostima Budžeta Crne Gore za 2015. godinu, do 31.12.2015. godine. Zbog nedostatka sredstava u budžetu, krajem godine, ova odluka nije realizovana.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **9.098,55 €**.

II.4. Nacionalna biblioteka „Đurađ Crnojević“

Status projekta:

Završen

- ❑ Aktivnosti je sprovodila Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“.
- ❑ U 2015. godini raspisana su javna nadmetanja za izvođenje radova na uređenju parka oko Glavnog objekta biblioteke (bivšeg Italijanskog poslanstva) i izradu Glavnog projekta adaptacije Depoa knjiga.
- ❑ Sve planirane aktivnosti na realizaciji ovog projekta su završene.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **75.797,81€**.

II.5. Adaptacija zgrade bivšeg Belgijskog poslanstva na Cetinju

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ U 2015. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na adaptaciji objekta sa ciljem obezbjeđivanja prostorija za sjedište Fonda za Zapadni Balkan.
- ❑ Ministarstvo kulture nije dostavilo Direkciji javnih radova potrebnu dokumentaciju za raspisivanje javnog nadmetanja i projekat nije realizovan.

II.6. Sanacija spomenika na Stražici, Opština Pljevlja

Status projekta:

Završen

- ❑ Opština Pljevlja i Direkcija javnih radova su potpisali Protokol o realizaciji projekta, na način da Opština Pljevlja vodi realizaciju projekta, a učešće Direkcije javnih radova u ovom projektu predstavlja transfer sredstava u vrijednosti od 100.000,00 €.
- ❑ Izvođenje radova je u toku, a sve obaveze Direkcije javnih radova su završene u skladu sa Protokolom.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **99.997,61 €**.



II.7. Biblioteka za slijepe u Opštini Podgorica

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Biblioteka za slijepe planirana je u okviru budućeg objekta Saveza slijepih.
- ❑ Savez slijepih je preuzeo obavezu izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta i dostavi je Direkciji javnih radova radi daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ Kako do kraja 2015. godine Savez slijepih nije završio planirane aktivnosti, projekat nije realizovan.

II.8. Državni institut u Kolašinu

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ U 2015. godini planirano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju objekta.
- ❑ Ministarstvo kulture je bilo u obavezi da Direkciji javnih radova dostavi projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove da bi se raspisalo javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- ❑ Kako Ministarstvo kulture nije ispunilo svoju obavezu, odustalo se od realizacije ovog projekta.

III. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

III.1. Izgradnja objekta sportske dvorane u Opštini Berane

Status projekta:

U toku



- ❑ Objekat sportske dvorane u Beranama smješten je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa u neposrednoj blizini gradskog stadiona.
- ❑ Projektovana bruto površina Sportske dvorane iznosi cca 5.350 m² i planirana je za održavanje međunarodnih rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica i drugih sportskih aktivnosti. Kapacitet dvorane je 1.800 mjesta od čega je 260 sjedišta predviđeno na teleskopskim tribinama.
- ❑ U objektu su planirani i sljedeći sadržaji: fitnes centar, teretana, ambulanta, administrativni sadržaji, kafe restoran, lokali, svlačionice sa sanitarnim čvorom, prostorije za TV prenos, novinare i režiju, kao i ostali tehnički i prateći sadržaji.

- ❑ Realizacija ovog objekta planirana je i odvija se fazno u skladu sa dinamikom obezbjeđenja finansijskih sredstava.
- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi I faze koji su obuhvatali grube građevinske radove na izradi armirano-betonske konstrukcije objekta. Radovi II faze koji se odnose na nastavak i završetak radova na objektu započeti su sredinom 2014. godine.
- ❑ Tokom 2015. godine završeni su radovi na montaži čelične konstrukcije, krovnih i fasadnih panela, spoljne bravarije, kao i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije i instalacija slabe i jake struje. U toku su radovi na izradi keramike, montaži unutrašnje bravarije i grubom razvodu termotehničkih i sprinkler instalacija.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak aktivnosti na izgradnji objekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.238.397,32 €**.

III.2. Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom, Opštine Mojkovac i Žabljak

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **348.504,23 €**.

Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom, Opština Mojkovac



- ❑ U 2014. godini urađena je projektna dokumentacija.
- ❑ Projekat se realizuje na način da Direkcija javnih radova izvodi sve radove koji prethode postavljanju vještačke trave.
- ❑ Postavljanje vještačke podloge je obaveza Fudbalskog saveza Crne Gore.
- ❑ Ugovor za izvođenje radova Direkcija javnih radova je zaključila krajem 2014. godine.
- ❑ Radovi su započeti početkom juna mjeseca 2015. godine i isti su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **177.970,21 €**.

Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom, Opština Žabljak

- ❑ U 2014. godini urađena je projektna dokumentacija i zaključen ugovor za izvođenje radova koji prethode postavljanju vještačke trave.
- ❑ Za narednu godinu je planirano postavljanje vještačke podloge.
- ❑ Svi planirani radovi za 2015. godinu su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **170.543,02 €**.



III.3. Izgradnja stadiona na Cetinju

Status projekta:

U toku

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta koordinira Prijestonica Cetinje.
- ❑ U 2014. godini urađen je Idejni projekat i na osnovu njega izdata građevinska dozvola u aprilu 2015. godine.
- ❑ Realizacija projekta planirana je fazno, po principu „projektuj i izgradi“. Prvom fazom planirana je izrada Glavnog projekta cjelokupnog stadiona i izvođenje radova na izgradnji jedne tribine i sanaciji postojećeg terena. Nakon toga bi se pristupilo realizaciji II faze, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima.
- ❑ Zaključkom Vlade od 26. decembra 2014. godine Fudbalski savez Crne Gore je zadužen da sprovede postupak odabira Izvođača radova, kao i da zajedno sa Prijesticom Cetinje obezbijedi

učesće u finansiranju u iznosu od najmanje 50% potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Preostala sredstva će biti obezbijedena kroz Kapitalni budžet, u skladu sa mogućnostima, kao učesće Vlade Crne Gore u sufinansiranju projekta.

- ❑ U 2015. godini završena je izrada Glavnog projekta i revizija istog je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.

III.4. Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra, Opština Kotor

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat izgradnje Sportsko-rekreativnog centra Kotor implementira Opština Kotor i Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora, a sufinansira Vlada Crne Gore.
- ❑ Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- ❑ Aktivnosti na izgradnji objekta započeti su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima.
- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije hale sa grubim razvodom instalacija, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- ❑ U 2015. godini nije bilo ulaganja od strane Direkcije javnih radova, već su trošena sredstva koja je obezbijedila Opština Kotor.



IV. Projekti o uvanja  ivotne sredine

IV.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

Status projekta:

U toku

- ❑ U prethodnom periodu su se odvijale, a i dalje su u toku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i za izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za realizaciju navedenih projekata iz domaćih izvora nedostatna, planirana je realizacija ovih projekata kroz instrument predpristupne pomoći IPA III „Regionalni razvoj”, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- ❑ Koordinator projekta izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- ❑ Dokumentacija izrađena u prethodnom periodu koristila se u pregovorima oko kreditnih sredstava sa Evropskom investicionom bankom, kao i za razradu operativnog plana za korišćenje predpristupnih IPA fondova, čija realizacija je otpočela tokom 2015. godine.
- ❑ U 2015. godini završeno je: Izrada idejnog projekta Centra za obradu otpada u okviru kompleksa sanitarne deponije „Možura” u Opštini Bar, Izrada Elaborata o kategorizaciji otpada na odlagalištu Vasove Vode u Opštini Berane, Izrada Projekta izgradnje sistema za tretman kanalizacionog mulja na PPOV u Opštini Mojkovac, Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice u Opštini Plužine, Izrada Idejnog projekta kanalizacionog sistema za otpadne vode i PPOV u Opštini Rožaje, Glavni projekat kanalizacija za fekalne i atmosferske vode za četiri naselja u Opštini Ulcinj, Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice i sanaciju postojećeg odlagališta otpada u Opštini Šavnik, Revizija Glavnog projekta za izgradnju PPOV-a u Opštini Pljevlja.
- ❑ U toku je izrada projektne dokumentacije, kao i procedure javnih nadmetanja za izradu projektne dokumentacije za više projekata po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **229.366,00 €**.

IV.2. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Šavnik

Status projekta:

U toku

- ❑ Za 2015. godinu planiran je završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak izvođenja radova.
- ❑ Završena je izrada projektne dokumentacije, a realizacija projekta je otpočela u saradnji sa CMSR-om Republike Slovenije, sa kojim je Ministarstvo održivog razvoja i turizma potpisalo Donatorski ugovor.
- ❑ CMSR Republike Slovenije je izvršio izbor izvođača radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **47.655,00 €**.

IV.3. Izgradnja transfer stanice i sanacija postojećeg odlagališta otpada u Opštini Šavnik

Status projekta:

U toku

- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pripremilo projektne zadatke za izradu Glavnih projekata za izgradnju transfer stanice i za sanaciju postojećeg odlagališta otpada u Šavniku.

- ❑ Planska dokumentacija u Opštini Šavnik je usvojena krajem juna 2015. godine i nakon provjere usklađenosti projektnih zadataka sa planskom dokumentacijom i pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Šavnik, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije, i isto je u toku.

IV.4. Kanalizaciona mreža u Opštini Plav

Status projekta:

Završen

- ❑ Na osnovu javnog nadmetanja raspisanog krajem 2014. godine, u 2015. godini je zaključen ugovor za izradu Glavnog projekta i aktivnosti na izradi istog su završene.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **69.496,00 €**.

IV.5. Kanalizaciona mreža u Opštini Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ Za 2015. godinu planirana je izrada i završetak projektne dokumentacije.
- ❑ U toku je izrada Glavnog projekta kanalizacione mreže I faze, tj. kanalizacione mreže u užem gradskom području i izrada istog je u završnoj fazi.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **44.744,00 €**.

IV.6. Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove Vode u Beranama

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2015. godini, nakon ponovljenog javnog nadmetanja, ugovorena je izrada Glavnog projekta i izrada istog je u toku.
- ❑ Takođe, izrađen je projekat hitnih sanacionih mjera I faze na osnovu kojeg je krajem godine raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova.

IV.7. Kanalizaciona mreža u Opštini Pljevlja

Status projekta:

Završen



- ❑ Za 2015. godinu planirana je izgradnja dijela kanalizacione mreže u naselju Gorijevac u dužini od 1,15 km, sa pumpnom stanicom.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **175.730,23 €**.

IV.8. Rezervoar za poboljšanje vodosnadbijevanja u Opštini Tivat

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Za 2015. godinu planirana je realizacija projekta u saradnji sa Opštinom Tivat, pri čemu opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade Crne Gore.
- ❑ Kako se Opština Tivat, poslije održanih sastanaka i više puta upućenih urgencija, nije izjasnila u pogledu realizacije projekta, aktivnosti na realizaciji projekta nisu sprovedene.

IV.9. Sanacija deponije na Žabljaku

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana sredstva su se odnosila na izradu projektne dokumentacije.
- ❑ Potpisan je donatorski Ugovor između CMSR-a i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta.
- ❑ CMSR je obavio izbor izvođača radova po sistemu „Projektuj i izgradi” i realizacija je otpočela krajem 2015. godine.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ U 2015. godini, kroz Kapitalni budžet, realizovano je ukupno **50.100,00 €**.
- ❑ Učešće u sufinansiranju Republike Slovenije u 2015. godini iznosi **50.000,00 €**, i ova sredstva su direktno uplaćena izvođaču radova od strane CMSR-a.

IV.10. Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku

Status projekta:

Završen

- ❑ Projekat se realizovao na osnovu donatorskog ugovora između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i CMSR-a, po kome je učešće Republike Slovenije i Crne Gore po 50%, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodio je CMSR.
- ❑ Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za ovaj projekat predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u realizaciji.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U toku su radovi na izgradnji trafostanice sa koje će se obezbijediti električno napajanje za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu, što je obaveza Opštine Žabljak, nakon čega će objekat reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice biti pušten u rad.
- ❑ U 2015. godini, kroz Kapitalni budžet, realizovano je ukupno **803.215,01 €**.
- ❑ Učešće u sufinansiranju Republike Slovenije u 2015. godini iznosi **822.350,97 €**, i ova sredstva su direktno uplaćena izvođaču radova od strane CMSR-a.



IV.11. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu – I faza, Opština Herceg Novi

Status projekta:

Završen

- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su radovi na ulaznom portalu, izradi šipova, a započeti su radovi na iskopu novog profila tunela i probijeno je preko 50 m.
- ❑ U 2015. godini nastavljeni su i završeni radovi I faze koji su se odnosili na iskope i podgradu hidrotehničkog tunela u dužini od 350 m.
- ❑ Za narednu godinu je planirana izrada projektne dokumentacije za realizaciju radova II faze, kao i izvođenje radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **588.792,98 €**.



IV.12. Sanacija stanja životne sredine, Opština Pljevlja

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2951 od 10. decembra 2015. godine o obezbjeđenju sredstava za sanaciju stanja životne sredine u Opštini Pljevlja, izvršen je transfer sredstava Opštini.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **500.000,00 €**.

V. Izgradnja lokalne infrastrukture



- ❑ Radovi na rekonstrukciji infrastrukture u MZ Bukovica u kontinuitetu se izvode od 2008. godine i u dosadašnjem periodu ukupno je izgrađeno: 85 stambenih objekata ukupne površine 4.415,09 m² sa priključenjem istih na elektro i kanalizacionu mrežu; pomoćni objekti površine 1.445,14m²; 26.341,00msekundarne mreže-prilaznih puteva; sanirano 18,5 km postojećeg asfaltnog puta; asfaltirano 8,5 km novog puta; nasuto i sanirano 51,1km primarnih lokalnih puteva i sanirano i rekonstruisano 14 km elektrodistributivne mreže i završena izgradnja I faze puta tzv „putni prsten” u dužini od 3.15 km.
- ❑ U 2015. godini odvijale su se sljedeće aktivnosti:
 - nastavljeni i završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji 15 individualnih stambenih objekata, započetih u 2014. godini;
 - ugovoreni su i završeni radovi za izgradnju II faze lokalnog puta tzv. „prstena”; i
 - ugovoreni su radovi na izgradnji nova 22 individualna stambena objekta, čiji su radovi u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **427.822,04 €**.

V.2. Rekonstrukcija gradske tržnice u Opštini Bijelo Polje

Status projekta:

Završen



- ❑ Glavnim projektom, čiju je izradu finansirala Opština, planirana je rekonstrukcija i opremanje gradske tržnice, spratnosti prizemlje i sprat, kao i izgradnja nadstrešnice između postojećeg objekta i rijeke Lješnice, ukupne bruto površine 3.362 m². U prizemlju objekta je centralni prostor sa 64 tezge za potrebe zelene pijace, dok su po njegovom obodu organizovani poslovni i administrativni prostori i sanitarni čvorovi. Na spratu je višenamjenski poluotvoreni prostor sa 163 tezge zatvorenog tipa za potrebe tržnice. U natkrivenom dijelu objekta je smješteno 30 betonskih tezgi za potrebe otvorene pijace. Izvršena je rekonstrukcija staza i prilaza oko objekta, kao i proširenje platoa uz rijeku, a na parking-mostu preko rijeke Lješnice je 14 parking mjesta za parkiranje putničkih i dostavnih vozila.
- ❑ U 2014. godini završeni su radovi I faze, koji su obuhvatali radove na rušenju i demontaži dijela postojećeg objekta, građevinsko zanatske i instalaterske radove na rekonstrukciji objekta, kao i armirano-betonske radove na izradi konstrukcije parkinga preko rijeke Lješnice.
- ❑ U 2015. godini Opština Bijelo Polje je izradila dopunu projektne dokumentacije, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova II faze, a koji su obuhvatili preostale građevinsko zanatske i instalaterske radove za stavljanje objekta u funkciju, radove na uređenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka, kao i radove na opremanju objekta.
- ❑ Potpisan je ugovor o građenju sa izvođačem radova II faze i svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.455.802,09 €**.

V.3. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštinama Kolašin i Mojkovac

Status projekta:

- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **30.000,00 €**.

Opština Kolašin

Završen

- ❑ U 2015. godini je izvršen transfer sredstava u iznosu od **30.000,00 €** za izvedene radove u prethodnoj godini.



Opština Mojkovac

U toku

- ❑ U 2015. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i početak radova.
- ❑ Obaveza Opštine Mojkovac je obezbjeđenje projektne dokumentacije, koju je Opština tokom maja 2015. godine dostavila Direkciji javnih radova, ali je ista vraćena na doradu jer je zajednički utvrđeno da sadržaj iste nije kompletan za planiranu realizaciju projekta.

- ❑ Dorađena projektna dokumentacija je dostavljena tokom novembra 2015. godine, kada je Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje, i isto je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

V.4. Asfaltiranje durmitorskog prstena

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2013. godini, kroz poziciju Unapređenje infrastrukture u zoni nacionalnih parkova, započete su aktivnosti na modernizaciji durmitorskog prstena dužine 12 km.
- ❑ U prethodnom periodu završeno je 8,5 km puta.
- ❑ U 2015. godini zaključen je ugovor na modernizaciji preostale dionice puta u dužini od 3,5 km.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **178.252,56 €**.



V.5. Rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na vodovodu „Krkori” u Opštini Andrijevića

Status projekta:

U toku



- ❑ Krajem 2014. godine započeti su radovi na rekonstrukciji vodozahvata i izgradnji hlorne stanice na izvorištu Krkori.
- ❑ U 2015. godini nastavljeni su i završeni svi ugovoreni radovi.
- ❑ Takođe, u 2015. godini ugovoreni su radovi na izgradnji cjevovoda od izvorišta do hlorne stanice u dužini od 3,3 km.
- ❑ Radovi su u toku i do kraja 2015. godine postavljeno je 1850 m cjevovoda.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **659.156,34 €**.

V.6. Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici – I faza, Opština Rožaje

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2014. godini završena je izrada projektne dokumentacije za rješavanje vodosnabdijevanja više seoskih područja u Opštini Rožaje.
- ❑ Projekat je višegodišnji i planirano je da se realizuje fazno i u skladu sa opredijeljenim sredstvima.
- ❑ U 2015. godini završeni su radovi I faze koja obuhvata izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu, čime su završene sve planirane aktivnosti u 2015. godini.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova u skladu sa projektnom dokumentacijom.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **150.583,00 €**.



V.7. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

- ❑ Realizacija projekta lokalne infrastrukture višestruko je značajna: prije svega modernizacijom i izgradnjom lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica razvija se mreža puteva koja unapređuje kvalitet života građana na način da skraćuje vrijeme potrebno za savladavanje prostorne distance, dodatno olakšava pristup određenim geografskim područjima, posebno ljudima na sjeveru države, omogućava se kvalitetniji, jednostavniji i efikasniji protok ljudi i roba i stvara kvalitetna infrastrukturna baza za razvoj poljoprivrede, šumarstva i drugih privrednih djelatnosti.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **6.234.493,32 €**.

V.7.1. Lokalni putevi

- ❑ U 2015. godini nastavljena je modernizacija lokalnih puteva po prioritetima koje određuje lokalna uprava.
- ❑ Završeni su svi planirani radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 10 km, i to u opštinama: Gusinje, Berane, Petnjica, Pljevlja, Žabljak i Herceg Novi.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **3.454.744,50 €**.



V.7.1.1. Opština Berane

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 0,6 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **30.857,30 €**.

V.7.1.2. Opština Petnjica

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,2 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **106.174,31 €**.

V.7.1.3. Opština Pljevlja

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,2 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **101.102,40 €**.

V.7.1.4. Opština Žabljak

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 0,6 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **27.323,83 €**.

V.7.1.5. Opština Gusinje

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,2 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **87.178,71 €**.

V.7.1.6. Opština Herceg Novi

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,2 km.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **102.107,95 €**.

V.7.1.7. Opština Tivat

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2710 od 19. novembra 2015. godine, za realizaciju projekta izgradnje saobraćajnice od Solila do kružne raskrsnice za Pržno u Opštini Tivat, izvršen je transfer sredstava Opštini.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **3.000.000,00 €**.

V.7.2. Gradske saobraćajnice

- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **2.779.748,82 €**.

V.7.2.1. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Rožaje

Završen

- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **142.186,40 €**.

Ulica „Carine”

- ❑ Projekat se zajednički realizuje sa Opštinom Rožaje.
- ❑ U 2014. godini zaključen je ugovor za rekonstrukciju Ulice „Carine”.
- ❑ Sa radovima se započelo krajem 2014. godine, a u zimskom periodu radovi su prekinuti i gradilište je bilo konzervirano.
- ❑ U 2015. godini radovi su nastavljani i završeni su svi radovi do ugradnje završnog asfaltnog zastora – habajućeg sloja, čime su završene obaveze Direkcije javnih radova na realizaciji projekta.
- ❑ Preostali radovi na ugradnji habajućeg sloja su obaveza Opštine Rožaje.

Ulica „Krak Rifata Burdžovića”

- ❑ U 2015. godini završeno je asfaltiranje Ulice „Rifata Burdžovića” u dužini od 300 m.



- ❑ U 2015. godini nastavljani su radovi na rekonstrukciji Ulice Terano i isti su završeni.
- ❑ Takođe, u 2015. godini ugovoreni su i završeni radovi na asfaltiranju ulica po prioritetima lokalne uprave - Ulica Crvenog krsta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **141.695,68 €**.



- ❑ U 2015. godini nastavljeni su i završeni svi radovi na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Plav-Vojno selo, dionica Jezerska ulica-Vojno selo u dužini od 1,1 km.
- ❑ Završena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Ribarske ulice i zaključen ugovor za izvođenje radova. Za narednu godinu, nakon pribavljanja građevinske dozvole od strane Opštine Plav, planiran je početak i završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **602.499,55 €**.



- ❑ U 2015. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije glavnog trga u Andrijevici, a koja se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- ❑ Takođe, završeni su svi radovi koji se odnose na izgradnji trga i parka sa pristupnim pješačkim stazama i saobraćajnicama, kao i rasvjetom. Preostali su radovi na oblaganju fontane, montaži mobilijara, kao i radovi hortikulture.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak svih preostalih radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **271.081,63 €**.





- ❑ U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Mojковаčke ulice i Ulice Lenke Jurišević.
- ❑ U oktobru mjesecu 2015. godine je dobijena građevinska dozvola za rekonstrukciju Mojковаčke ulice, kada je zaključen ugovor i otpočeli radovi i isti su u toku.
- ❑ Početkom decembra 2015. godine je dobijena građevinska dozvola za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Lenke Jurišević, kada je zaključen ugovor, izvođač radova uveden u posao i radovi su u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **192.433,52 €**.

V.7.2.6. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Mojkovac

Završen

- ❑ U 2015. godini završeni su radovi na modernizaciji dvije gradske saobraćajnice po prioritetima lokalne uprave, i to Ulice Dušana Tomovića i Ulice Filipa Žurića.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **70.443,36 €**.

- ❑ U 2015. godini nastavljeni su i završeni radovi na rekonstrukciji Ulice Vuka Kneževića, koja je započeta u 2014. godini.
- ❑ Takođe, ugovoreni su i započeti radovi na rekonstrukciji Treće Sandžačke ulice. Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **602.849,66 €**.



V.7.2.8. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Danilovgrad

Završen

- ❑ U 2015. godini nastavljani su i završeni radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Pružni prelaz Sekulići-Gorica.
- ❑ Završeno je asfaltiranje saobraćajnice Mlinovi-Brestice, čiju realizaciju je vodila Opština Danilovgrad.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **198.554,07 €**.



V.7.2.9. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Cetinje

U toku

- ❑ U 2015. godini planirana je rekonstrukcija Bajove ulice.
- ❑ Obaveza Opštine Cetinje je bila obezbjeđenje projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole.
- ❑ Tokom juna mjeseca 2015. godine Opština Cetinje je dostavila nekompletanu projektnu dokumentaciju i ista je vraćena na doradu.
- ❑ Po dostavljanju projektne dokumentacije tokom novembra 2015. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i isto je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak i završetak radova. Uslov za početak radova je dostavljanje građevinske dozvole od strane Opštine Cetinje.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **3.850,00 €**.

V.7.2.10. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Nikšić

Završen

- ❑ U 2015. godini nastavljani su i završeni radovi na rekonstrukciji Trebješke ulice.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **473.889,34 €**.



V.7.2.11. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj

U toku

- ❑ Opština Ulcinj je tokom juna meseca 2015. godine dostavila Projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove za izradu konzervatorskog projekta za sanaciju kaldrme u Starom Gradu.
- ❑ Nakon ponovljenog javnog nadmetanja, jer na prethodnom nije bilo pristiglih ponuda, odabran je obrađivač projektne dokumentacije i u toku je izrada iste.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak i završetak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **6.230,07 €**.

V.7.2.12. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u Opštini Podgorica

U toku

- ❑ U 2015. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Cvijetne ulice, kao i početak radova. Takođe, planiran je nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za gradsku saobraćajnicu od kružnog toka u Mojanovićima do kružnog toka u Goričanima.
- ❑ U toku je žalbeni postupak na ponovljeno javno nadmetanje za rekonstrukciju Cvijetne ulice.
- ❑ U toku je revizija projektne dokumentacije za gradsku saobraćajnicu od kružnog toka u Mojanovićima do kružnog toka u Goričanima.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

V.7.2.13. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Bar

U toku

- ❑ U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Sutormu u Opštini Bar, nakon čega je potpisan ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ Krajem decembra 2015. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole, izvođač je uveden u posao a sa radovima se planira započeti kada to dozvole vremenski uslovi.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ 2015. godini realizovano je ukupno **74.035,54 €** kroz avansno plaćanje.

VI. Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja

VI.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen



- ❑ Izgradnja Nacionalnog centra za transfuziju krvi u krugu Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici započeta je sredinom 2013. godine.
- ❑ Bruto površina objekta iznosi cca 3.000 m² i spratnosti je: suteran, prizemlje i četiri sprata.
- ❑ Objekat u funkcionalnom smislu obuhvata tri cjeline namijenjene: davaocima krvi, pacijentima Kliničkog centra i zaposlenima. Objekat sadrži 10 laboratorija, 7 ambulanti, 11 ljekarskih soba, administrativni blok sa multifunkcionalnom salom, amfiteatar, biblioteku, korisničke prostorije za pripreme mobilnih ekipa i ostale prateće i tehničke prostorije.
- ❑ Završeni su svi ugovoreni radovi, kao i ugradnja medicinske opreme i laboratorijskog namještaja, koja je obezbijeđena od strane Svjetske zdravstvene organizacije.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **493.520,74 €**.

VI.2. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra sa Urgentnim centrom u Opštini Berane

Status projekta:

Završen

- ❑ Projektnom dokumentacijom je predviđena dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta krila „B” za potrebe Doma zdravlja i Opšte bolnice u Beranama, lociranog u okviru DUP-a „Medicinski centar”.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta, sa novoprojektovanom prizemnom toplom vezom sa postojećim objektom Opšte Bolnice, iznosi cca 3.113 m².
- ❑ Dio objekta koji pripada Domu zdravlja sadrži prizemlje i tri sprata, i korisne je površine cca 1.115m². U ovom dijelu je planiran smještaj Centra za djecu sa posebnim potrebama, Centra za mentalno zdravlje, Centra za prevenciju, Službe za fizikalnu terapiju, mikrobiologiju i parazitologiju, kao i higijensko epidemiološke službe sa pratećim prostorijama (arhive, magacini, komunikacije, sanitarne prostorije, garderobe, tehničke prostorije).
- ❑ Drugi dio objekta sadrži prizemlje i dva sprata i korisne je površine cca 1.290 m². Ovaj dio objekta pripada Opštoj bolnici i ovdje je predviđen smještaj ambulanti (hirurška, ortopedska, pedijatrijska, ORL, neurološka i ginekološka), apoteke i prostorija za administraciju sa salom za sastanke i pratećim sadržajima.
- ❑ Na objektu su završeni svi ugovoreni radovi.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **301.540,55 €**.



VI.3. Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 06-164/4 od 16. februara 2012. godine, prihvaćen je Sporazum o realizaciji programa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.
- ❑ Protokolom br. 19/2-01-3401/1 od 12.02.2013. godine, zaključenim između Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Direkcije javnih radova, definisano je da sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2014. godinu Direkcija javnih radova transferiše Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **350.000,00 €**.

VI.4. Kupovina objekata od opština

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2308/4 od 09. oktobra 2014. godine, u Kapitalnom budžetu za 2015. godinu obezbijedena su sredstva za izmirenje obaveza u skladu sa Sporazumom o regulisanju međusobnih odnosa između Ministarstva zdravlja, JZU Dom zdravlja Podgorica i Glavnog grada Podgorice.
- ❑ U 2015. godini potpisan je Protokol na osnovu kojeg je izvršen transfer sredstava u iznosu od **522.076,55 €**.

VI.5. Rekonstrukcija Internog odjeljenja Opšte bolnice Bijelo Polje

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Internog odjeljenja Opšte bolnice Bijelo Polje.
- ❑ Ministarstvo zdravlja je bilo u obavezi da dostavi Direkciji javnih radova potpisani projektni zadatak, nakon čega je bilo planirano raspisivanje javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Pored više insistiranja od strane Direkcije javnih radova, Ministarstvo zdravlja nije dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove.
- ❑ Zaključkom Vlade CG br. 08-399 od 6. marta 2015. godine zadužena je Opšta bolnica u Bijelom Polju da izvede hitne sanacione radove na internom odjeljenju, i isto je u toku. Istim Zaključkom zadužena je Direkcija javnih radova da izvrši plaćanje na osnovu ovjerenih situacija dostavljenih od strane Opšte bolnice i Nadzornog organa.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **84.999,81 €** čime su završene obaveze Direkcije javnih radova na realizaciji projekta.



VII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

VII.1. Rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija

Status projekta:

Završen

- ❑ Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-467 od 2. aprila 2015. godine, Direkcija javnih radova je zadužena da Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica prenese sredstva u iznosu od 999.544,00 € na ime kupovine 31 stambene jedinice za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore.
- ❑ U 2015. godini izvršen je transfer sredstava u iznosu od 999.544,00 €.

VII.2. Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Rožaje

Status projekta:

U toku



- ❑ Planirana je izgradnja objekta Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Opštini Rožaje bruto površine 375 m², spratnosti prizemlje i potkrovlje.
- ❑ U 2013. godini Opština Rožaje dostavila je projektnu dokumentaciju Direkciji javnih radova na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova i krajem 2013. godine je potpisan ugovor sa Izvođačem radova. Radovi nisu otpočeli jer Opština Rožaje nije pribavila građevinsku dozvolu.
- ❑ U cilju pribavljanja građevinske dozvole bilo je potrebno izvršiti doradu projektne dokumentacije. Kako Opština Rožaje tokom 2014. godine nije završila ove obaveze, Direkcija javnih radova tokom

2015. godine preduzela je aktivnosti na doradi i dopuni projektne dokumentacije i građevinska dozvola je izdata u septembru 2015. godine, kada su se stekli uslovi za početak radova.

- ❑ Završeni su radovi na izmještanju postojećeg vodovoda, kao i radovi na izradi armirano betonske konstrukcije objekta, zidanju fasadnih zidova, montaži spoljašnje bravarije i izradi drvene krovne konstrukcije.
- ❑ U toku su krovopokrivački i limarski radovi.
- ❑ Krajem godine je raspisano javno nadmetanje za izvođenje preostalih radova, koji obuhvataju završne instalaterske radove u objektu, radove na uređenju terena i izradi infrastrukturnih priključaka, kao i radove na opremanju objekta.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak svih radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **337.771,50 €**.

VII.3. Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen

- ❑ Planirana sredstva su se odnosila na plaćanje naknade za opremanje građevinskog zemljišta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **18.799,59 €**.

VII.4. Dom starih u Podgorici

Status projekta:

U toku

- ❑ Analizom projektne dokumentacije Doma starih na lokaciji Donja Gorica zaključeno je da su projektna rješenja neracionalna. Na sastanku sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Glavnim gradom dogovoreno je da se odredi nova lokacija, te nakon toga Direkcija javnih radova raspiše javno nadmetanje za izradu novog Glavnog projekta koji će na racionalniji način riješiti pitanje izgradnje Doma starih.
- ❑ Glavni grad je opredijelio novu lokaciju.
- ❑ Tokom oktobra mjeseca 2015. godine usaglašen je projektni zadatak sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Glavnim gradom, nakon čega je Direkcija javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije i isto je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.

VIII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja

VIII.1. Izgradnja Akademija umjetnosti na Cetinju

Status projekta:

U toku



- ❑ Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti je planirana na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”, uz zonu Istorijskog jezgra Cetinja.
- ❑ Predmetna lokacija zahvata površinu od 3.15 ha.
- ❑ U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekti zajedničkih sadržaja.
- ❑ Bruto površina kompleksa iznosi cca 22.086 m².

- ❑ Realizacija ovog projekta planirana je i odvija se fazno.
- ❑ Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula mjeseca 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok, ukupne bruto površine 4.980 m². Objekat zajedničkih kulturnih sadržaja je bruto površine 1010 m² sa sljedećim sadržajima: izložbeni i multimedijalni prostori, knjižara i administrativni blok sa pratećim sadržajima. Podzemna garaža je bruto površine 3.970 m², kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže predviđen je i energetske blok sa tehničkim prostorijama.
- ❑ Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine.
- ❑ Direkcija javnih radova je, nakon završetka tenderske procedure, potpisala u aprilu 2015. godine ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa. Tokom 2015. godine završeni su armirano betonski, zidarski, krovopokrivački i radovi na montaži spoljne bravarije kao i grubi razvod instalacija na objektu kotlarnice. U toku su radovi na iskopima i razvodu infrastrukturnih priključaka vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u kompleksu.
- ❑ U skladu sa prioritetima iskazanih od strane Univerziteta Crne Gore, kao sljedeća faza realizacije projekta planirana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Nakon završene procedure javnog nadmetanja Direkcija javnih radova je početkom oktobra 2015. godine potpisala Ugovor o građenju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti.
- ❑ Projektovana bruto površina Fakulteta Likovnih umjetnosti iznosi oko 5.100 m². Objekat je razučene osnove različite spratnosti i sastoji se od prizemlja, jednog i dva sprata. Jedan dio objekta se zadržava kao revitalizovano nasljeđe industrijske arhitekture nekadašnjeg „Oboda“, dok ostalo predstavlja novoizgrađenu strukturu. Objekat je predviđen za održavanje nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, dizajna i fotografije.
- ❑ Sredinom oktobra mjeseca 2015. godine započeti su radovi na izgradnji objekta i do kraja godine završeni su zemljani radovi, kao i radovi na izradi temeljne konstrukcije.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.512.222,24 €**.

VIII.2. Izgradnja objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen

- ❑ Početkom 2012. godine Direkcija javnih radova je na osnovu inoviranih zahtjeva Univerziteta Crne Gore, Ministarstva prosvjete i sporta i Studentskog parlamenta UCG, u smislu prostornih kapaciteta i sadržaja, izradila Idejno arhitektonsko rješenje objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- ❑ Lokacija Sportske dvorane se nalazi u okviru kompleksa „Univerzitetskog centra“.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta iznosi 3.290 m². Objekat sadrži prizemlje i sprat sa pratećim sadržajima i multimedijalnim centrom.
- ❑ Višenamjenska dvorana je namijenjena odigravanju svih vrsta malih sportova, a projektna rješenja omogućavaju organizaciju koncertnih i raznih kulturnih dešavanja.
- ❑ Kapacitet dvorane je 770 mjesta za sjedenje na fiksnim betonskim i teleskopskim tribinama.
- ❑ Objekat sadrži 6 garderoba za sportiste, trenere i sudije, teretanu sa svlačionicom, administrativni prostor, ambulantu, multimedijalni centar kapaciteta 220 mjesta, kao i tehničke i pomoćne prostorije.
- ❑ U 2015. godini završeni su svi radovi na izgradnji i opremanju objekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **2.222.789,27 €**.



VIII.3. Izgradnja i opremanje novog objekta Studentskog doma „Braća Vučinić” u Opštini Nikšić

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Prvobitnim planom Ministarstva prosvjete predviđeno je da se realizuje novi objekat Studentskog doma sa objektom zajedničkih sadržaja u sklopu DUP-a „Studentsko-fakultetskog centra” u Nikšiću.
- ❑ Predviđena bruto površina objekata iznosi cca 7.000 m².
- ❑ Planirano je da objekat Studentskog doma sadrži suteran, visoko prizemlje i pet spratova, dok je spratnost objekta zajedničkih sadržaja suteran i visoko prizemlje.
- ❑ Planirani kapacitet objekta je oko 360 mjesta i zajedno sa postojećim, rekonstruisanim domom i anexom zajedničkih sadržaja, formiraće jednu funkcionalnu cjelinu za smještaj i boravak studenata i učenika. Novi objekat Studentskog doma pozicioniran je paralelno u odnosu na postojeći objekat Doma, čiji je kapacitet 250 mjesta.
- ❑ U objektu zajedničkih sadržaja planirani su: ulazni hol sa recepcijom, restoran kapaciteta oko 200 mjesta, kuhinja, čitaonica, teretana, administrativni prostor, kao i tehničke i pomoćne prostorije.
- ❑ U prethodnom periodu, od 2012. godine do kraja 2014. godine tri puta su raspisivana javna nadmetanja za realizaciju projekta po principu privatno-javnog partnerstva, po modelu sličnom onome kako je realizovan novi Studentski dom u Podgorici.
- ❑ Kako naprijed navedena javna nadmetanja nisu uspjela, tokom 2015. godine Ministarstvo prosvjete je preduzelo aktivnosti na pregovaranju sa potencijalnim privatnim partnerima, u cilju aktiviranja kapaciteta postojećeg objekta hotela „Onogošt” u Nikšiću za potrebe smještaja studenata i iste su u toku.
- ❑ Planirana sredstva nisu realizovana.

VIII.4. Dječiji vrtići iz kredita CEB-a

Status projekta:

U toku

- ❑ Sredinom juna mjeseca 2013. godine Administrativni odbor Razvojne banke Savjeta Evrope je odobrio kreditnu liniju u iznosu od 10 miliona eura, na osnovu čega je potpisan ugovor o uslovima i načinu korišćenja kreditnih sredstava.
- ❑ Iz sredstava kredita je planirana izgradnja 7 novih vrtića, i to: 4 u Podgorici i po jedan vrtić u Baru, Ulcinju i Pljevljima. U 2014. godini su započete aktivnosti na realizaciji tri vrtića.
- ❑ Tokom realizacije projekta planirano je da Direkcija javnih radova bude jedinica za implementaciju projekta, Ministarstvo prosvjete u ulozi Agencije za implemetaciju projekta, a Ministarstvo finansija korisnik kredita.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **621.314,80 €**.

VIII.4.1. Dječiji vrtić na Starom Aerodromu, Opština Podgorica

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića na Starom Aerodromu u Podgorici planiran je preko puta Doma zdravlja, na uglu Cvijetne ulice i Ulice Mirka Banjevića, na urbanističkoj parceli broj UP 2090/975, u zahvatu DUP-a „Konik – Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 3.000 m², za smještaj 375 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne soba za jaslene grupe, radne soba za grupe vrtića, kancelarije, fiskulturna sala, biblioteka, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije.

- ❑ U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 3000 djece (tri obroka dnevno) i koja će zadovoljiti potrebe na nivou Javne ustanove „Đina Vrbica”, kao i vešeraj za potrebe 3000 djece, sa svim pratećim sadržajima.
- ❑ U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije, raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača radova i isto je poništeno jer nije bilo ispravnih ponuda.
- ❑ Novo javno nadmetanje je u toku.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **82.251,16 €**.



VIII.4.2. Dječiji vrtić u Zagoriču, Opština Podgorica

U toku


- ❑ Budući objekat vrtića u Zagoriču u Podgorici je planiran u Ulici Velimira Stojanovića, na urbanističkoj parceli broj UP 568, u zahvatu DUP-a „Zagorič 1” - izmjene i dopune u Podgorici.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 1.400 m², za smještaj 200 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajnu kuhinju, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- ❑ U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije, raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača radova i potpisan je Ugovor o građenju.
- ❑ Sa radovima se otpočelo krajem decembra 2015. godine, a planirani rok završetka je 12 mjeseci.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **403.729,51 €**.



VIII.4.3. Dječiji vrtić u Baru

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića u Baru je planiran u neposrednoj blizini osnovne škole u Baru, na urbanističkoj parceli broj 4 u zoni „G”, po DUP-u „Topolica I” - izmjene i dopune u Baru.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 2.956,20 m², za smještaj 370 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, sala za zajedničke aktivnosti, biblioteka, kuhinja sa svim pratećim prostorijama za cca 600 obroka, prostorije za trijažu i ostale tehničke prostorije.
- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova koje je poništeno.
- ❑ U martu 2015. godine je raspisano novo javno nadmetanje za izbor izvođača radova. Odluka o izboru izvođača radova je donijeta u julu 2015. godine, na koju je uložena žalba. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je proceduru vratila na ponovno vrednovanje, nakon čega je nova odluka donijeta u oktobru 2015. godine.
- ❑ Na postupak je ponovo uložena žalba i dokumentacija se od sredine oktobra nalazi kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. Nakon donošenja odluke od strane Komisije nastaviće se sa aktivnostima na realizaciji projekta.

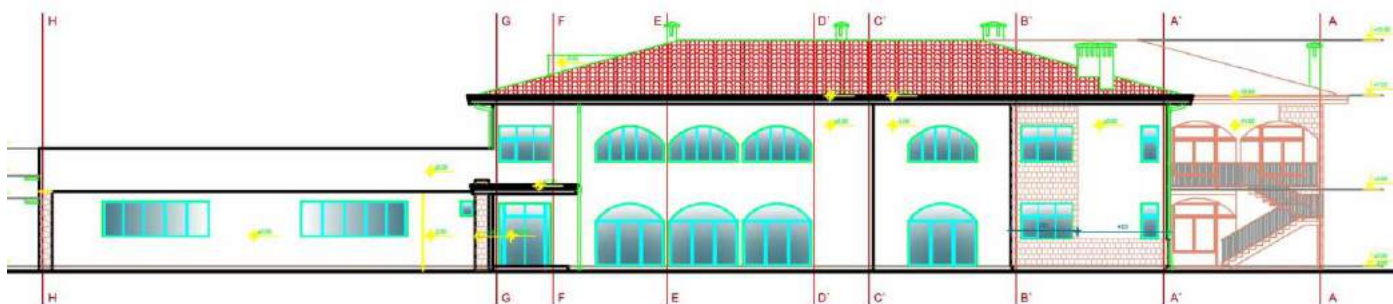

VIII.4.4. Dječiji vrtić u Ulcinju

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 978 m², za smještaj 123 djece.
- ❑ U drugoj polovini 2015. godine Opština Ulcinj je donijela odluka o ustupanju lokacije na kojoj će se graditi objekat.
- ❑ Ministarstvo prosvjete koordinira aktivnosti na administrativnim procedurama za prenos vlasništva nad zemljištem na kom će biti izgrađen objekat, i iste su u toku.

VIII.4.5. Dječiji vrtić u Pljevljima

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića u Pljevljima planiran je u naselju Guke, u zahvatu DUP-a „Dolovi I”, koju čini katastarska parcela broj 5325/1 KO Pljevlja.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 500m², za smještaj 67 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije.
- ❑ U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 400 djece (tri obroka dnevno), koja će zadovoljiti potrebe na nivou JU „Eko bajka” u Pljevljima.
- ❑ U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Na javno nadmetanje je uložena žalba i dokumentacija je od avgusta 2015. godine kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. Nakon donošenja odluke od strane Komisije nastaviće se sa aktivnostima na realizaciji projekta.

VIII.4.6. Dječiji vrtić u Bloku VI, Podgorica

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića planiran je na urbanističkoj parceli UP 11, zona 6, koja se nalazi na dijelu katastarskih parcela broj 1146/16 i 1146/36, KO Podgorica, u naselju Blok VI u Podgorici.
- ❑ Objekat vrtića će biti ukupne bruto površine 1.512 m², za smještaj 215 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslene grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajnu kuhinju, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- ❑ U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Na javno nadmetanje je uložena žalba i dokumentacija je od septembra 2015. godine kod Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. Nakon donošenja odluke od strane Komisije nastaviće se sa aktivnostima na realizaciji projekta.

VIII.4.7. Dječiji vrtić u Tuzima

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića će biti ukupne bruto površine cca 1.700 m², za smještaj 243 djece.
- ❑ Ministarstvo prosvjete je dostavilo projektni zadatak u decembru 2015. godine, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije i isto je u toku.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **4.879,00 €**.

VIII.4.8. Rekonstrukcija vrtića na Žabljaku

U toku

- ❑ U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg vrtića na Žabljaku i potpisan je ugovor za izvođenje radova.
- ❑ Radovi su obuhvatali zamjenu krovnog pokrivača, zamjenu fasadne bravarije, kao i molersko-farbarske radove, i isti su pri kraju.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **130.455,13 €**.



VIII.5. Srednja stručna škola u Golubovcima

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirani objekat, ukupne bruto površine oko 5.480 m², sastoji se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu su predviđene nastavne prostorije, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina do 500 gledalaca.
- ❑ U 2014. godini završena je izrada Glavnog projekta i revizija istog.

- ❑ U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, donešena odluka o izboru izvođača radova na koju je uložena žalba i dokumentacija je sredinom septembra 2015. godine poslata Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki i ista je vraćena na ponovno vrednovanje sredinom novembra 2015. godine. U toku je vrednovanje ponuda.
- ❑ Zaključkom Vlade br. 08-858 od 08. maja 2015. godine Direkcija javnih radova je zadužena da sprovede proceduru javnih nabavki za izgradnju novog antenskog stuba Radio-difuznog centra umjesto postojećeg koji se nalazi na lokaciji planiranog objekta, nakon što Radio-difuzni centar dostavi tehničku dokumentaciju i pribavi građevinsku dozvolu za izgradnju novog antenskog stuba. Navedena dokumentacija nije dostavljena Direkciji javnih radova do kraja 2015. godine.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **45.327,46 €**.




VIII.6. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ U 2015. godini je urađeno Idejno-arhitektonsko rješenje fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.
- ❑ Objekat je prizeman i ukupne bruto površine cca 1.000 m².
- ❑ Projektovan je u dvije funkcionalne cjeline: fiskulturna sala i aneks sa garderobama, spravarnicom i kancelarijom i pratećim sadržajima.
- ❑ S obzirom na to da su urbanističko-tehnički uslovi pribavljeni u decembru 2015. godine, javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije nije raspisano i projekat nije realizovan.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **4.760,00 €** za izradu Idejnog rješenja.

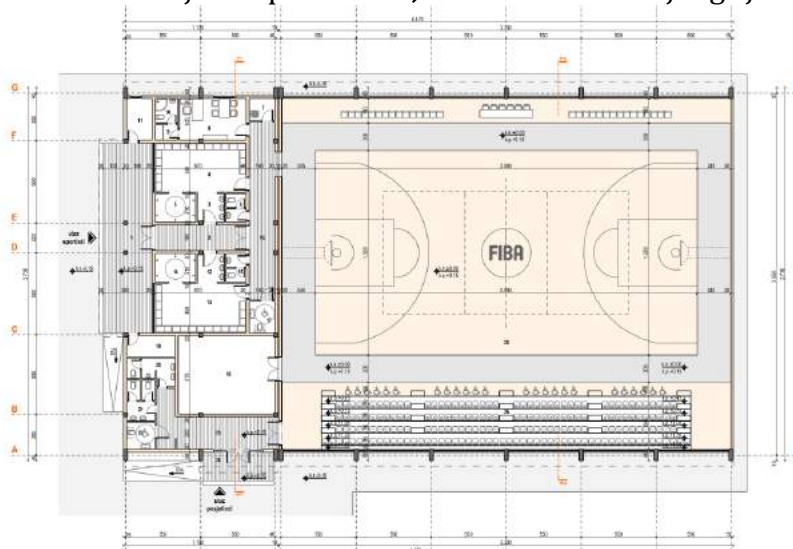

VIII.7. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2015. godini usaglašen je Projektni zadatak sa korisnicima objekta Tehničkih fakulteta.
- ❑ Nakon potpisivanja Projektnog zadatka od strane Univerziteta Crne Gore, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Nakon završene procedure vrednovanja pristiglih ponuda donešena je odluka o izboru najpovoljnije ponude i nakon isteka zakonski predviđenih rokova očekuje se potpisivanje ugovora i nastavak aktivnosti u narednoj godini.

VIII.8. Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis” u Opštini Nikšić

Status projekta:

U toku



- ❑ Objekat je spratnosti suteran, prizemlje i sprat, ukupne planirane površine 1.925 m².
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: kancelarijski prostor sa salom za sastanke, multimedijalna sala, laboratorijske prostorije, prostor DATA centra, kafe bar i tehničke prostorije.
- ❑ U 2014. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta.
- ❑ U 2015. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, potpisan je ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ Na postojećim objektima završeni su svi grubi građevinski radovi ojačavanja, zidanja, betoniranja i u toku su aktivnosti na izradi armiranobetonske konstrukcije i zidanju zidova novih objekata.
- ❑ U toku je i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija slabe i jake struje.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak aktivnosti na rekonstrukciji objekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **908.199,43 €**.

VIII.9. Osnovna škola u Gukama – II faza

Status projekta:

U toku

- ❑ Godine 2011. je završena faza I – Izgradnja učionica Lamela „A”.
- ❑ U 2015. godini planiran je početak izvođenja radova II faze izgradnje Osnovne škole u Gukama – Lamela „B” i „C”.
- ❑ Objekat je projektovan kao prizemni, površine cca 690 m².
- ❑ Drugom fazom planira se izgradnja Lamela „B” – administrativni dio i Lamela „C” – fiskulturna sala.
- ❑ Nakon završenog javnog nadmetanja potpisan je ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak radova, kada Opština Pljevlja pribavi građevinsku dozvolu.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **714,00 €** za administrativne troškove.

IX. Unapređenje turističke ponude

IX.1. Izgradnja apartmana i restorana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin

Status projekta:

U toku

- ❑ Objekti za apartmanski smještaj i restoran se nalaze na katastarskoj parceli br. 956, KO Rovačko Trebaljevo, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene NP Biogradska gora.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **207.994,78 €**.

Izgradnja restorana - I faza

- ❑ Objekat je spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 351,83 m².
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: restoranska sala sa pratećim šankom, kuhinja sa pratećim tehničkim prostorijama, kancelarija, magacin pića i hrane, kotlarnica i ostali prateći sadržaji.
- ❑ U 2014. godini započeti su radovi I faze koji obuhvataju izvođenje grubih građevinskih radova, zidarskih radova, radova na izradi čelične konstrukcije, krovopokrivačkih radova i radova na izradi fasadne bravarije.
- ❑ Tokom 2015. godine svi ugovoreni radovi I faze su završeni.
- ❑ Raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača za radove II faze, koji obuhvataju sve preostale radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju i potpisan je ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji II faze projekta.



- ❑ Objekat je spratnosti podrum, prizemlje i potkrovlje, ukupne bruto površine 578,32 m².
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: sobe, apartmani, recepcije, restoran, kuhinja, kafe i kotlarnica.
- ❑ Krajem 2014. godine raspisano je javno nadmetanje i donešena odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za radove I faze koja se odnosi na grube građevinske radove.
- ❑ Obaveza JU Nacionalni parkovi je pribavljanje građevinske dozvole, što je uslov za početak radova.
- ❑ U narednoj godini, nakon dobijanja građevinske dozvole, otpočeće se sa izvođenjem ugovorenih radova I faze.

IX.2. Izrada Glavnog projekta za valorizaciju Đalovića pećine, Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2015. godini završena je izrada prethodne Studije izvodljivosti za infrastrukturu do Đalovića pećine.
- ❑ U toku je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta puta od Bistrice do Manastira Podvrh.
- ❑ Takođe, u toku je javno nadmetanje za prethodnu Studiju izvodljivosti uređenja unutrašnjosti pećine.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **26.590,00 €**.



IX.3. Izrada projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioca-Žarski katun, Opština Mojkovac

Status projekta:

Završen

- ❑ Krajem 2014. godine zaključen je Ugovor za izradu projektne dokumentacije, ali su aktivnosti odložene za 2015. godinu zbog zimskog perioda.
- ❑ U toku 2015. godine započeta je i završena izrada projektne dokumentacije.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **23.283,00 €**.

IX.4. Ski centar „Kolašin 1600”, Opština Kolašin

Status projekta:

U toku



- ❑ Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, Bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 4 km ski staza i nabavka neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2016.

godine. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza (izgradnja akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje). Planirani rok završetka II faze je u 2018. godini.

- Krajem 2014. godine potpisan je ugovor za izgradnju primarne trafostanice 35/10kV na lokaciji Jezerine po principu „Projektuj i izgradi“. U toku je izvođenje radova sa planiranim rokom završetka sredinom 2016. godine.
- Krajem 2014. godine potpisan je ugovor za izgradnju bazne stanice po principu „Projektuj i izgradi“. Završena je izrada projektne dokumentacije i u toku je izvođenje pripremnih radova. Planirani rok završetka je kraj 2016. godine.
- U toku 2015. godine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnog puta od ski centra „Kolašin 1450“ do ski centra „Kolašin 1600“ u dužini od 2,3 km i ista je završena. Izabran je izvođač radova I faze, koja obuhvata zemljane radove i potporne zidove. Zbog zimskog perioda radovi se nisu izvodili, a sa istim će se otpočeti čim to dozvole vremenski uslovi. Takođe, u toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze, koji obuhvataju preostale radove na završetku izgradnje puta. Planirano je da se svi radovi završe do kraja 2016. godine.
- U toku je ponovljeno javno nadmetanje, jer na prethodnom nije bilo ispravnih ponuda, za izgradnju žičare šestosjeda K8/D6C po sistemu „Projektuj i izgradi“ na lokalitetu Kolašin 1600mm-Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom Glavnog projekta za izgradnju staza u dužini od 4 km i Glavnog projekta osnježavanja staza i akumulacionog jezera. Planirani rok završetka je kraj 2016. godine.
- U toku je izrada Studije izvodljivosti vodosnabdijevanja ski centra „Kolašin 1600“, kao i izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja Bazne stanice. Planirano je da se projekti završe u prvom kvartalu 2016. godine kada će biti raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova na vodosnabdijevanju bazne stanice.
- U 2015. godini realizovano je ukupno **1.236.478,70 €**.

IX.5. Ski centar na lokalitetu Cmiljača, Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku



- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski

staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2017. godine. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka II faze je u 2019. godini.

- ❑ Tokom 2014. godine ugovoreni su radovi na rekonstrukciji puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5 km, koji su započeti krajem iste godine. U 2015. godini radovi su nastavljani i isti su u toku. Takođe, krajem 2014. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 8 km i ista je u toku.
- ❑ U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta od Ravne rijeke (magistrala) do Latinske kose, uključujući izgradnju mosta na rijeci Ljuboviđ. Za narednu godinu je planiran početak i završetak radova.
- ❑ Pored ovih aktivnosti, u 2015. godini ugovorena je Prethodna Studija vodosnabdijevanja za lokalitet Cmiljača i raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za primarnu elektroenergetsku mrežu.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **426.653,13 €**.

IX.6. Unapređenje turističke ponude u Rožajama

Status projekta:

Završen



- ❑ Realizaciju ovog projekta koordinira Opština Rožaje na osnovu protokola koji je potpisan između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Direkcije javnih radova i Opštine Rožaje.
- ❑ U 2015. godini odvijale su se aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradi predmjera i predračuna radova na rekonstrukciji i revitalizaciji i nabavci neophodne opreme, raspisivanju javnih nadmetanja i zaključivanju ugovora.

- ❑ U 2015. godini završeni su radovi na raščišćavanju ski staza, izgradnji parkinga na ulazu u skijalište i njegovom osvjetljavanju, izgradnja montažnog mosta koji povezuje parking i skijalište, rekonstrukcija i reparacija stubova ski lifta i koturače, zamjena elektro instalacija i postavljanje novih podzemnih kablova, rekonstrukcija kućice za iznajmljivanje ski opreme i naplatu ski pasa i postavljanje drvene platforme sa stolovima za odmor i posluživanje skijaša. Završena je izgradnja bejbi ski lifta.
- ❑ U toku su radovi na postavljanju sajle, priključenju električne energije na skijalište, kao i preuzimanju nabavljene opreme: motornih sanki i tabača staza - ratraka.
- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-3046 od 22. decembra 2015. godine o obezbjeđenju sredstava za unapređenje turističke ponude u Opštini Rožaje, Direkcija javnih radova je izvršila transfer sredstava na račun Opštine Rožaje.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **300.000,00 €**.

IX.7. Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje-Štedin u dužini od 7 km, Opština Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2015. godini završena je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Rožaje-Štedin u dužini od 7 km.
- ❑ Projekat je višegodišnji i krajem 2015. godine započeti su radovi I faze, koji se odnose na rekonstrukciju puta u dužini od 1 km.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak ugovorenih radova I faze, kao i radovi II faze.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **37.867,60 €**.



IX.8. Revitalizacija jezera Ponikvice, Opština Danilovgrad

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini započete su i završene sve planirane aktivnosti na revitalizaciji jezera Ponikvice po sistemu „Projektuj i izgradi”.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **173.807,47 €**.



IX.9. Izrada planske dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude

Status projekta:

U toku

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2038 od 10. decembra 2015. godine o saradnji s kompanijom „Paradores de Turismo, S.A.“, kao i nalogu Ministarstva održivog razvoja i turizma, izvršena je uplata firmi „Paradores de Turismo, S.A.“ u Španiji, u iznosu od 24.600,00 €.
- ❑ Nalogom Ministarstva održivog razvoja i turizma izvršena je uplata firmi „FCP Montenegro“ za žičaru Lovćen Kotor u iznosu od 72.938,00 €.
- ❑ Takođe, na osnovu prioriteta Ministarstva održivog razvoja i turizma raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta puta Mojkovac-Lubnice, na dijelu teritorije Opštine Mojkovac i potpisan je ugovor za izradu istog.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak projektne dokumentacije.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **97.538,00 €**.

IX.10. Izgradnja infrastrukture kamp odmorišta

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini planirana je izgradnja 2 objekta kamp odmorišta na Durmitoru i Skadarskom jezeru.
- ❑ Završeni su svi ugovoreni radovi za kamp odmorište na Durmitoru, dok Nacionalni parkovi nisu stvorili uslove za izgradnju objekta kamp odmorišta na Skadarskom jezeru.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **38.906,04 €**.



IX.11. Izgradnja akumulacionog jezera za ski-centar Vučje

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Za 2015. godinu planirana je izrada akumulacionog jezera za ski-centar Vučje, kao i hidrogeološko istražno-eksploatacioni radovi za potrebe vodosnabdijevanja akumulacionog jezera.
- ❑ Obaveza Opštine Nikšić bila je izrada hidrogeološko istražno-eksploatacionih radova, kao i izvođenje zemljanih radova na akumulacionom jezeru, čime bi se stvorili uslovi za izvođenje radova na postavljanju vodonepropusne podloge, za koje je zadužena Direkcija javnih radova.
- ❑ Odabran je izvođač radova i zaključen ugovor.
- ❑ Kako se nisu stvorili uslovi za uvođenje izvođača u posao, ovaj projekat nije realizovan.

IX.12. Rekonstrukcija objekta bivšeg zatvora u Opštini Kotor

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju objekta za potrebe Ministarstva kulture, kao i hitni sanacioni radovi na krovnom pokrivaču.
- ❑ Ministarstvo kulture sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ Završena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta.
- ❑ Potpisan je Ugovor za izvođenje hitnih sanacionih radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **29.097,88 €**.

IX.13. Izmještanje ikone Bogorodice Filermose, Prijestonica Cetinje

Status projekta:

U toku

- ❑ Realizaciju projekta sprovodi Prijestonica Cetinje.
- ❑ U 2015. godini završena je revizija Glavnog projekta.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **7.100,00 €**.

IX.14. Kuća „Voća” i kuća „Vina”

Status projekta:

U toku

Kuća voća – Opština Andrijevica

- ❑ U 2015. godini završeno je usaglašavanje projektnog zadatka sa Ministarstvom poljoprivrede i priprema dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izgradnju Kuće „Voća” po sistemu „Projektuj i izgradi”.
- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo konkurs za izradu Idejno urbanističko-arhitektonskog rješenja „Kuća Voća” u Andrijevici.

Kuća vina

- ❑ Ministarstvo poljoprivrede nije dostavilo Projektni zadatak na osnovu čega bi se pokrenula procedura javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije.

IX.15. Solana Ulcinj

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-2957 od 10. decembra 2015. godine o obezbjeđenju sredstava radi rješavanja hitnih mjera upravljanja na području ulcinjske Solane, izvršen je transfer sredstava Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore.
- ❑ U 2015. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **70.000,00 €**.

X. Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova


- ❑ U 2015. godini otpočela je realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj”, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture.
- ❑ Tokom 2015. godine, u saradnji sa institucijama koje sačinjavaju Operativnu strukturu za realizaciju IPA projekata, kao i sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, intenzivno je rađeno na pripremi dokumentacije za objavljivanje tendera u skladu sa PRAG procedurama.
- ❑ Do kraja 2015. godine raspisano je devet tendera za realizaciju projekata iz Operativnog programa i sklopljeni ugovori za: izgradnju elektrovočnog postrojenja „Trebešica”, rehabilitaciju i sanaciju nesanitarnog odlagališta otpada „Ćafe” u Opštini Bar, kao i za sprovođenje dijela aktivnosti u okviru tehničke pomoći.
- ❑ Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno **1.347.443,12 €**, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja ovih sredstava za 2015. godinu.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.585.227,45 €**, od čega **237.784,33 €** je domaće učešće, u skladu sa procedurama koje prate realizaciju IPA projekata.

X.1. PPOV, kanalizaciona mreža i unapređenje vodosnadbijevanja u Beranama

Status projekta:

U toku

- ❑ Projektom je planirano: a) izrada glavnog projekta i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ES po žutoj FIDIC knjizi, b) rekonstrukcija i izgradnja sistema za sakupljanje otpadnih voda koji uključuje 21 km kanalizacione mreže, po crvenoj FIDIC knjizi, i c) izrada glavnog projekta i izgradnja rezervoara i pumpnih stanica za vodovodni sistem Berane po crvenoj FIDIC knjizi.
- ❑ Projekat se finansira iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, osim izrade Glavnog projekta za rezervoar i pumpne stanice koji se finansira iz opštih prihoda.
- ❑ U 2015. godini je završena izrada tenderske dokumentacije za PPOV i kanalizacionu mrežu po FIDIC Žutoj i Crvenoj knjizi, ista je odobrena od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i raspisani su tenderi za izbor izvođača radova, kao i za konsultantske usluge koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Tenderske procedure su u toku.
- ❑ Za izgradnju rezervoara i pumpnih stanica za vodovodni sistem Berana potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta, i izrada istog je u toku.

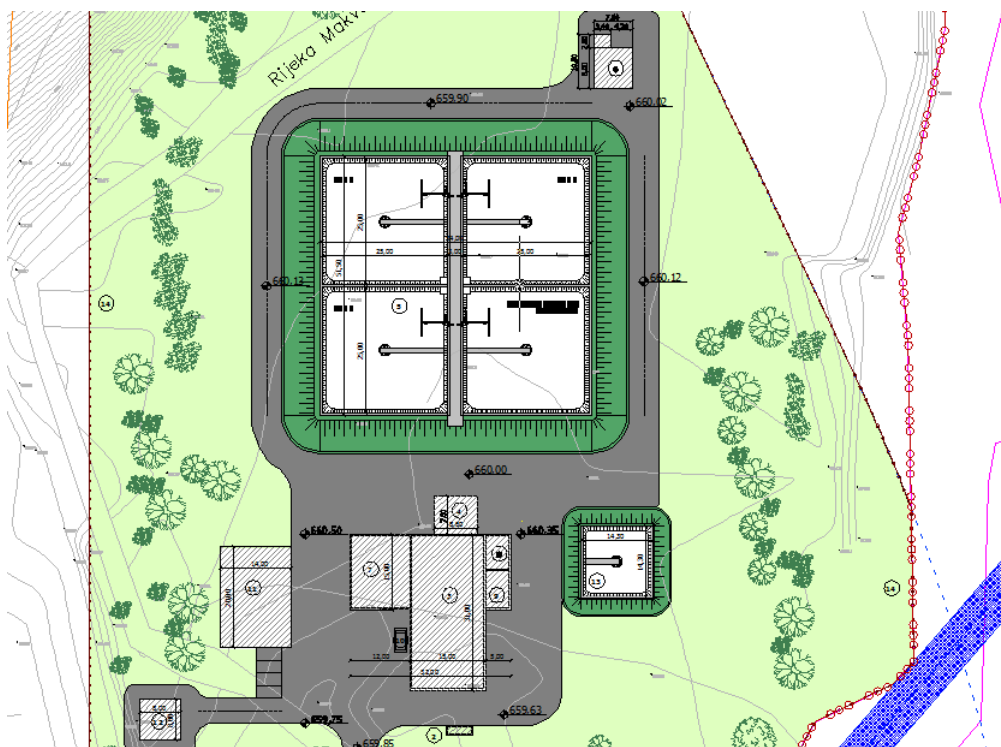

X.2. Sanacija odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju i „Ćafe” u Baru

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat uključuje izradu Glavnog projekta i rehabilitaciju zatvorenog nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u Baru, kao i izradu Glavnog projekta i rehabilitaciju nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju.
- ❑ U toku 2015. godine tenderske dokumentacije za realizaciju projekata „Ćafe” i „Vrtijeljka” po FIDIC Žutoj knjizi su pripremljene i poslate na kontrolu i odobrenje Delegaciji EU u Crnoj Gori.
- ❑ Nakon odobrenja tenderske dokumentacije za realizaciju projekta „Ćafe”, raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i krajem 2015. godine potpisan je ugovor i za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ Tenderska procedura za konsultantske usluge za projekat „Ćafe”, a koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, u toku je.
- ❑ Zbog dva neuspjela tenderska postupka raspisana od strane Prijestonice Cetinje za izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za odlagalište „Vrtijeljka”, raspisivanje tendera je odloženo, a tenderska dokumentacija za realizaciju projekta „Vrtijeljka” po FIDIC Žutoj knjizi je vraćena Direkciji javnih radova na doradu uz određene sugestije i primjedbe. Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **691.344,20 €** kroz avansno plaćanje za projekat „Ćafe”.

X.3. Rekonstrukcija kosina na željezničkoj pruzi

Status projekta:

U toku

- ❑ Zbog kašnjenja u pripremi Idejnog rješenja, koje je naručeno od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, nije došlo do realizacije ovog projekta. Isti je zamijenjen projektom „Virpazar – Sutomore”, za koji je izrada tenderske dokumentacije u toku.

X.4. Tehnička pomoć

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2015. godini, u okviru Tehničke pomoći urađena je tenderska dokumentacija i odobrena od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
- ❑ Krajem 2015. godine potpisan je ugovor za jačanje kapaciteta Operativne strukture kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevod službenih dokumenata.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **20.000,00 €** kroz avansno plaćanje za projekat.

X.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove elektro vučne podstanice „Trebešica”

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat podrazumijeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice.
- ❑ Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, tender je objavljen u junu 2015. godine.
- ❑ Nakon neuspješne prve procedure i ponovnog postupka javne nabavke, potpisan je ugovor sa ponuđačem koji će projekat realizovati po Žutoj FIDIC knjizi.
- ❑ Javno nadmetanje za konsultantske usluge, koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, u toku je.
- ❑ Za narednu godinu je planirana izrada projektne dokumentacije i početak izvođenja radova.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **873.883,25 €** kroz avansno plaćanje za projekat.

XI. Hitna pomoć i prevencija poplava

- ❑ Radovi na sanaciji posljedica od poplava iz 2010. godine izvodili su se od 2011. godine, a financirani su iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, kao i iz opštih prihoda.
- ❑ U okviru ovog projekta, koji se završava zaključno sa 2015. godinom, odvijale su se aktivnosti na realizaciji 62 projekta i utrošena su sredstva u iznosu od **10.404.700,44 €**, od čega je u 2015. godini realizovano **1.714.584,22 €** i to: **977.586,55 €** iz kreditnih sredstava i **736.997,67 €** iz opštih prihoda. Realizacija projekata se odvijala na osnovu prethodno izrađenog Elaborata, na koji je saglasnost dala Evropska investiciona banka. Najveći dio radova se odnosio na sanaciju mostova, puteva, klizišta, regulaciju vodotokova i izgradnju i sanaciju vodovoda. Kroz realizaciju ovog projekta planirana je pomoć lokalnim upravama, prije svega na sjeveru države, u cilju saniranja i prevencija od poplava najugroženijih područja kako bi se unaprijedio i dodatno olakšao život ljudi u tim područjima. Realizacijom ovog projekta preduzete su interventne mjere kako bi se uspostavila lokalna saobraćajna komunikacija i obezbijedila sigurnost ugroženih objekata i imovine u zoni vodotokova.
- ❑ Od ukupnog broja projekata u potpunosti su završene aktivnosti na 56 projekata. Četiri projekta su u najvećem dijelu završeni, a dio planiranih aktivnosti na istim nije mogao biti realizovan zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok 2 projekta nisu realizovana zbog toga što lokalne uprave nisu završile preuzete obaveze i pribavile projektnu dokumentaciju.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **1.714.584,22 €**.
- ❑ U 2015. godini odvijale su se aktivnosti i to kako slijedi:

XI.1. Regulacija korita rijeke Zlorečice, Opština Andrijevica

Status projekta:

Završen

- ❑ Radovi na regulaciji korita rijeke Zlorečice su započeti u 2013. godini i odvijali su se fazno, usporenom dinamikom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i visokog vodostaja. U prethodnom periodu završeni su radovi I faze.
- ❑ U 2015. godini, nakon obavještenja od strane Opštine Andrijevica da su riješeni imovinsko-pravni odnosi, započeti su radovi II i III faze.
- ❑ Započeti radovi III faze su završeni u 2015. godini, dok su radovi II faze obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **37.851,61 €** iz kreditnih sredstava, kao i **57.315,32 €** iz opštih prihoda.



XI.2. Sanacija klizišta Smoljevica, Opština Andrijevica

Status projekta:

Završen

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta su započete u 2014. godini.
- ❑ U 2015. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova i isti su završeni u ugovorenom roku.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **100.444,75 €** iz kreditnih sredstava, kao i **256.431,46 €** iz opštih prihoda.



XI.3. Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru, Opština Bar

Status projekta:

Završen

- ❑ Glavni projekat rekonstrukcije mosta u Virpazaru dostavila je Opština Bar.
- ❑ Krajem 2013. godine, nakon završene procedure javnog nadmetanja odabran je izvođač radova.
- ❑ Obaveza Opštine Bar je bila obezbjeđenje građevinske dozvole. S obzirom na to da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije izdala saglasnost na projekat rekonstrukcije mosta, pristupilo se doradi projektne dokumentacije i ista je završena krajem 2014. godine.
- ❑ U 2015. godini, nakon dostavljanja građevinske dozvole od strane Opštine Bar, nastavljene su aktivnosti na rekonstrukciji mosta u Virpazaru.
- ❑ Svi ugovoreni radovi na sanaciji i rekonstrukciji mosta su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **363.401,65 €** iz kreditnih sredstava, kao i **107.387,47 €** iz opštih prihoda.



XI.4. Sanacija pješačke staze u Virpazaru, Opština Bar

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Opština Bar je preuzela obavezu pribavljanja projektne dokumentacije, nakon čega je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
- ❑ S obzirom na to da Opština Bar nije završila projektnu dokumentaciju, ovaj projekat nije realizovan.

XI.5. Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u Gusinje i izgradnja pješačkog mosta, Opština Gusinje

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije i nakon procedure javnog nadmetanja potpisan je ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ Svi planirani radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **200.162,50 €** iz kreditnih sredstava, kao i **68.453,62 €** iz opštih prihoda.



XI.6. Regulacija korita rijeke Tare, Opština Kolašin - II i III faza/Bećova bara Babljak

Status projekta:

Završen

- ❑ Radovi na izgradnji obaloutvrde su se odvijali fazno u zavisnosti od obezbijedenih sredstava i vremenskih uslova, a podrazumijevaju izvođenje radova za vraćanje rijeke Tare u svoje korito, produbljivanje korita, kao i izradu desne obaloutvrde korita od lomljenog kamena.
- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi I faze. Radovi regulacije rijeke Tare su obuhvatali potez od Bećove bare do novog mosta (650 m) i potez nizvodno od starog mosta uključujući ušće rijeke Svinjače (450 m).
- ❑ Radovi II faze obuhvataju regulaciju rijeke Tare na potezu između novog i starog mosta u dužini od 1.520 m.
- ❑ Radovi III faze obuhvataju regulaciju korita rijeke Tare uzvodno od novog mosta, regulaciju korita rijeke Svinjače i potoka Pažanj.
- ❑ U 2015. godini završeni su svi planirani radovi, osim dijela regulacije rijeke Svinjače (ušće) zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **96.499,14 €** iz kreditnih sredstava, kao i **118.260,28 €** iz opštih prihoda.



XI.7. Regulacija korita rijeke Plašnice, Opština Kolašin

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2012. godini potpisan je Ugovor na izvođenju interventnih radova na četiri lokacije korita rijeke Plašnica.
- ❑ U 2013. i 2014. godini radovi su izvođeni smanjenim intezitetom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i visokog vodostaja.
- ❑ Nakon obavještenja od strane Opštine Kolašin da su riješeni imovinsko-pravni odnosi, preduzete su aktivnosti za nastavak radova.
- ❑ U 2015. godini radovi su nastavljeni na lokaciji Bakovići i isti su zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odmah obustavljeni, tako da radovi na ovoj lokaciji nisu u potpunosti realizovani.

XI.8. Regulacija korita rijeke Tare nizvodno od Prošćenja - IV faza, Opština Mojkovac

Status projekta:

Završen

- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi I, II i III faze na regulaciji rijeke Tare i zaštiti naselja Ambarine, nasipa jalovišta i lokalnog puta u Prošćenju.
- ❑ U 2015. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova IV faze na regulaciji korita rijeke Tara, nizvodno od Prošćenja.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je 52.541,25 € iz kreditnih sredstava, kao i 57.116,57 € iz opštih prihoda.



XI.9. Sanacija klizišta Stevanovac, Opština Mojkovac

Status projekta:

Završen

- ❑ U prethodnom periodu Opština Mojkovac je uradila projektну dokumentaciju za sanaciju klizišta Stevanovac.
- ❑ Na osnovu dostavljene projektne dokumentacije, Direkcija javnih radova je raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova.

- ❑ Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i isti su završeni.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **119.619,27 €** iz kreditnih sredstava, kao i **4.087,00 €** iz opštih prihoda.



XI.10. Sanacija korita Murinske rijeke izgradnja mosta u Dragijama

Status projekta:

Završen


- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi na izgradnji mostova u Dragijama i na Murinskoj rijeci, kao i sanacija dijela korita Murinske rijeke.
- ❑ Zbog neadekvatne projektne dokumentacije sanacija korita Murinske rijeke nije u potpunosti realizovana.

XI.11. Sanacija mreže lokalnih puteva, Opština Plav

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2015. godini nastavljani su i završeni svi radovi na sanaciji mreže lokalnih puteva započeti u 2014. godini.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **31.963,64 €** iz opštih sredstava.

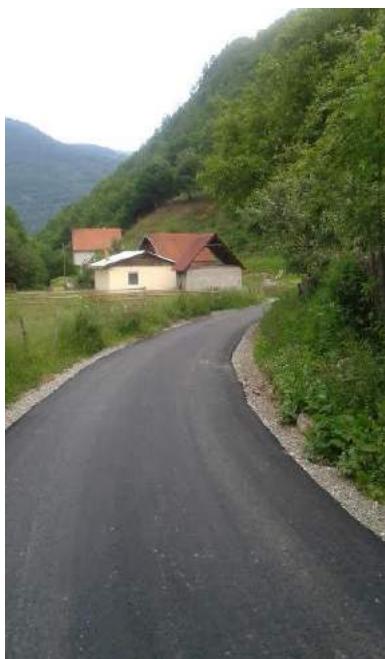

XI.12. Regulacija Plavske rijeke, Opština Plav

Status projekta:

Završen

- ❑ Izvršeno je plaćanje sredstava za izvedene radove u prethodnoj godini.
- ❑ U 2015. godini realizovano je ukupno **14.467,11 €**.

XI.13. Sanacija mostova, izgradnja pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanacija temelja potpornih zidova, Opština Šavnik

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2013. godini je izabran izvođač radova za izgradnju pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanaciju temelja potpornih zidova u koritu rijeke Bijele.
- ❑ U 2014. godini se započelo sa radovima, ali zbog visokog vodostaja radovi na sanaciji temelja su odloženi za narednu godinu.
- ❑ U 2015. godini su završeni svi planirani radovi.
- ❑ U 2015. godini realizovano je **7.066,38 €** iz kreditnih sredstava, kao i **21.515,20 €** iz opštih prihoda.



XI.14. Sanacija lokalnog puta u Štoju, Opština Ulcinj

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Opština Ulcinj je preuzela obavezu pribavljanja projektne dokumentacije.
- ❑ Kako projektne dokumentacije nije dostavljena tokom 2015. godine, projekat nije realizovan.

XII. Regionalni stambeni program

XII.1. Stambeni objekat u Nikšiću

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirani objekat je spratnosti podrum, prizemlje, tri sprata i potkrovlje, ukupne bruto površine 5.590,01 m², sa 62 stambene jedinice za smještaj 231-og korisnika.
- ❑ Sa radovima se otpočelo krajem maja 2015. godine.
- ❑ Na objektu su završeni radovi na izradi armirano betonske konstrukcije, drvene konstrukcije potkrovlja, radovi na pokrivanju objekta sa izradom potrebnih, kao i radovi na izradi unutrašnjih i fasadnih zidanih zidova.
- ❑ Takođe, na objektu je ugrađen veći dio fasadne bravarije.
- ❑ U toku su radovi na malterisanju unutrašnjih zidova, kao i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i na elektro instalacijama.



XII.2. Dom starih u Pljevljima

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirani objekat je spratnosti podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine 2.811,25 m², za smještaj 63 korisnika.
- ❑ Raspisano je javno nadmetanje za odabir izvođača radova i isto je u toku.



XII.3. Stambeni objekti na lokaciji Konik II u Podgorici

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je izgradnja 12 stambenih objekata, spratnosti podrum, prizemlje i dva sprata, ukupne bruto površine 10.408,28 m², sa ukupno 120 stambenih jedinica za smještaj 660 korisnika.
- ❑ U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

XII.4. Stambeni objekti u Beranama

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je izgradnja 4 stambena objekta, ukupne bruto površine cca 7.000 m², sa ukupno 94 stambenih jedinica za smještaj 271 korisnika.
- ❑ U toku je izrada Glavnog projekta.
