




CRNA GORA
UPRAVA JAVNIH RADOVA

Izvještaj o realizaciji
Zakona o budžetu Crne Gore
za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine

januar, 2022. godine

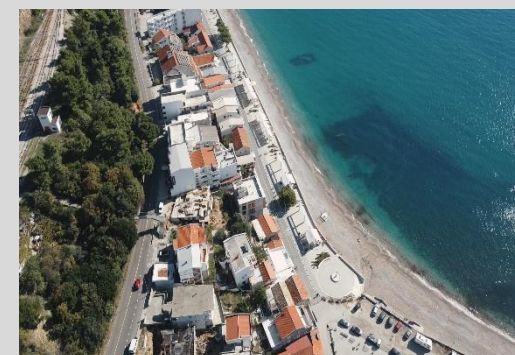

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
REZIME	10
PRILOG BROJ 1	17
PRILOG BROJ 2	39
REALIZACIJA PO PROJEKTIMA	40
TURISTIČKA DJELATNOST	41
1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE.....	42
1.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin	43
1.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju.....	51
1.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	57
1.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama.....	65
1.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	69
1.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	72
1.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu.....	85
1.8. Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova.....	86
1.9. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule	88
1.10. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin i Kolašin 40 ..	89
1.11. Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	89
1.12. Objekat nacionalne "Kuće " u Baru.....	90
EKOLOGIJA I PRIRODA	92
2. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE.....	93
2.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.....	94
2.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	95
2.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	100
2.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama.....	104
2.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	108
2.6. Unapređenje postojeće mreže meteroloških i padavinskih stanica.....	108
2.7. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera.....	109
2.8. Servisna zona u Gradiošnici, opština Tivat	Error! Bookmark not defined.
3. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – sektor ODRŽIVI RAZVOJ.....	110
3.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.....	111

3.2.	Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru.....	112
3.3.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	113
3.4.	Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom	113
3.5.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama.....	114
3.6.	Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini.....	114
3.7.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama	115
3.8.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom.....	115
3.9.	Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke	116
3.10.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu	116
3.11.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	117
	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA.....	118
4.	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA.....	119
4.1.	Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	120
4.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici.....	120
4.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici.....	121
4.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan.....	122
4.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima.....	122
4.6.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	122
4.7.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju.....	123
4.8.	Izgradnja urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	Error! Bookmark not defined.
5.	PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR ZDRAVSTVO	124
5.1.	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore.....	125
	UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA.....	126
6.	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE PRAVOSUĐA I PALATE PRAVDE	127
6.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde.....	128

6.2. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac.....	130
6.3. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	131
7. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR PRAVOSUĐE.....	132
7.1. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa.....	133
UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA	134
8. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR JAVNE BEZBIJEDNOSTI I ODBRANE	135
8.1. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite.....	136
JAVNA BEZBIJEDNOST.....	137
9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI.....	138
9.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	139
9.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici ...	140
FUNKCIONISANJE MINISTARTSVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE	143
10. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE.....	144
10.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.....	145
SOCIJALNA ZAŠTITA.....	146
11. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA.....	147
11.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici	148
11.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću.....	149
INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ	152
12. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE	153
12.1. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani.....	154
12.2. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada	154
12.3. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja.....	154
12.4. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	154
12.5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje.....	154

12.6. Unapređenje turističke ponude grada.....	154
12.7. Adaptacija prostora u d.o.o. Sportski centar Cetinje	154
12.8. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica	155
12.9. Obezbeđivanje prostora , seljenje i opremanje RTV Cetinje	155
12.10. Unapređenje gradski, lokalnih i nekategorisanih puteva	155
12.11. Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa.....	155
12.12. Rekonstrukciju, adaptaciju dječijeg objekta bolničkog kompleksa JZU Danilo I - objekata stare dječije bolnice i nekadašnji objekat bolnice Danilo I	155
12.13. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	155
12.14. Izgradnja svlačionica i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani	157
UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA	158
13. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTO-PUTA BAR-BOLJARE	159
14. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA.....	160
14.1. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici Kos-Trebešica	161
14.2. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	161
14.3. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	162
14.4. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.....	163
14.5. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta.....	164
14.6. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju.....	164
14.8. Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika.....	166
UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	167
15. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE.....	168
15.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.....	169
15.2. Adaptacija objekata obrazovanja	170
15.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica.....	172
15.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica	172

15.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	172
15.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlati, Podgorica.....	172
15.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	173
15.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	173
15.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu.....	173
15.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	173
15.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	174
15.12. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Bloku VI, Podgorica.....	174
15.13. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Pljevljima.....	176
15.14. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju.....	178
15.15. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju.....	178
15.16. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan " u Bijelom Polju.....	180
15.17. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta osnovne škole u Tološima, Podgorica.....	Error! Bookmark not defined.
15.18. Naučno-tehnološki park u Podgorici.....	181
15.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici.....	183
15.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	183
15.21. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	183
15.22. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi.....	183
15.23. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici.....	184
15.24. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	184
15.25. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici.....	184
15.26. Osnovna škola u Igalu	184
15.27. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	185
15.28. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	185

15.29. Sanacija klizišta za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi	186
15.30. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama.....	186
15.31. Osnovna škola u Tivtu	188
15.32. Rekonstrukcija objekata Zadružbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi.....	188
15.33. Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica	188
15.34. Izgradnja Osnovne škole u Blok 35/36, Tuški put, Podgorica	189
16. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPOTSKIH OBJEKATA	190
16.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	191
16.2. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	192
16.3. Rekonstrukcija objekata zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru.....	193
16.4. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru.....	195
16.5. Izgradnja sportskih terena i sala	196
16.6. Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru.....	196
16.7. Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici.....	196
16.8. Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja.....	196
17. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I MLADI.....	197
17.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem.....	198
ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE	200
18. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE.....	201
18.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	202
18.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture.....	203
18.3. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creative hubs"	204
18.4. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture.....	205
18.5. Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	206
18.6. Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću.....	207
18.7. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	207
REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE.....	208
19. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	209
19.1. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu.....	210

19.2. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice)	211
19.3. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	220
19.4. Izgradnja gradske pijace u Rožajama	223
19.5. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinja.....	224
19.6. Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav.....	227
19.7. Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla, opština Bar i graničnog prelaza Božaj, opština Tuzi	228
19.8. Putni pravac Monte Rose	228
19.9. Rekonstrukcija trga u Plavu	229
19.10. Izgradnja trga i šetališta u u opština Bar	230
19.11. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića	231
19.12. Izgradnja puta Srđevac – Lozna.....	232
19.13. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina.....	232
19.14. Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu.....	232
19.15. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu – TS.....	233
19.16. Regionalna stočna pijaca u Beranama	235
19.17. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor	236
19.18. Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama, opština Herceg Novi.....	236
19.19. Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj, opština Herceg Novi	236
19.20. Rekonstrukcija buleva Veljka Vlahovića	236
19.21. Rekonstrukci buleva Save Kovačevića	237
19.22. Rekonstrukcija puta Gusinja-Vusanje	237
19.23. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	237
19.24. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu	237
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA	238
20. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE.....	239
20.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	240
20.2. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	240

REZIME

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu **55.525.939,55€**, od čega je 50.326.278,49€ iz budžetskih sredstava, 578.361,06€ iz kredita, 300,00€ donacija i 4.621.000,00€ IPA sredstva.

U periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine ukupan procenat realizacije Kapitalnog budžeta iznosio je 95,87%, odnosno isplaćena su sredstva u iznosu od 53.230.777,19€, od čega 43.776.126,89€ iz budžetskih sredstava, 1.553.330,89€ iz kreditnih sredstava, 3.582.805,20€ iz IPA fondova i 4.318.514,21€ na ime zaključenih ugovora o asignaciji.

Dodatno, zaključno sa 31.12.2021. godine, Upravi javnih radova su ispostavljene situacije/računi ugovarača u iznosu od 540.472,07€, a koje nijesu isplaćene u 2021. godini s obzirom na to da su ispostavljene obaveze prevazilazile iznos opredjeljen Zakonom o budžetu za predmetne projekte.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 148 projekata u okviru kojih se realizuju brojni podprojekti.

U periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Uprava javnih radova je zaključila **90** ugovora, čija vrijednost iznosi **56.098.320,60€**.

U periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Uprava javnih radova je raspisala **35** postupka javne nabavke čija vrijednost iznosi **22.585.892,00€**.

Kroz Izvještaj o realizaciji za 2021. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Međutim, izvanredan rezultat u stepenu realizacije Zakona o budžeta, kao i rekordan iznosa sredstava koji je uložen u kapitalne projekte u 2021. godini, prate i brojni problemi sa kojima se susreće Uprava javnih radova, a na koje smo i ranije ukazivali kroz predmetni Izvještaj u cilju sistemskog rješavanja ove problematike.

Prvenstveno, napomenućemo da je Budžet za 2021. godinu usvojen 17. juna 2021. godine ("Služ. List CG" br. 70/2021 od 25.06.2021. godine), a da je sve do tog trenutka bila aktivna mjera privremenog finansiranja. Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2021. godinu iznosila su 38.750.184,40€, dok je privremenim finansiranjem do trenutka usvajanja Budžeta bilo obezbijeđeno 16.775.755,15€. Ukupna sredstava opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2021. godinu iznosila su 55.525.939,55€.

Takođe, realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava javnih radova ne može uticati, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama, kao i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Vlada Crne Gore je na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela Odluku o izradi Kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata u avgustu 2018. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 057/18 od 10.08.2018.). Predmetnom Odlukom je utvrđeno da projekti čija je realizacija otpočela u prethodnom periodu ne podliježu vrednovanju odnosno ocjenjivanju u skladu sa ovom odlukom i imaju prioritet u realizaciji. Uprava javnih radova, na osnovu izjašnjenja stručnog nadzora, planirala sredstva za ovu budžetsku godinu, neophodna za kontinuiranu realizaciju već otpočetih projekta, u skladu sa ugovorenim

obavezama. Pregled sredstava neophodnih za realizaciju već započetih projekata se dostavlja Ministarstvu finansija, koje navedene iznose koriguje u skladu sa budžetskom i fiskalnom politikom. Smanjivanjem prvobitno planiranog i neophodnog iznosa sredstva direktno se utiče na dinamiku realizacije projekata, a nerijetko se isti i dijele na faze čime se realizacija projekata usložnjava, a obim posla uvećava. Takođe, prolongiranje finansiranja može proizvesti i pravne posledice koje proističu iz ugovornih obaveza koje Uprava javnih radova ima prema izvršiocima.

Prijedlog Uprave javnih radova bio je da se, u okviru obezbijedenih sredstava Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijedeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost i odloženo finansiranje projekata, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi izgradnje.

Takođe, u skladu sa predmetnom Odlukom potrošačke jedinice kandiduju projekte za finansiranje, dostavljajući Obrasce koji sadrže podatke o pripremljenoj dokumentaciji i zrelosti samih projekata za realizaciju. Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava javnih radova nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020)), nisu bili dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom, sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava javnih radova ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog koji često dolazi i do obustave radova od strane trećih lica.

Prijedlog Uprave javnih radova je bio da se kod izbora kapitalnih projekata uvedu dodatni eliminatorni uslovi koji će obezbijediti da Zakonom o budžetu budu obuhvaćeni samo projekti čiji su Korisnici već sa kandidovanjem projekta dostavili svu neophodnu i validnu dokumentaciju, na osnovu koje će Uprava javnih radova sa početkom naredne budžetske godine pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji samog projekta.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti građenja i javnih nabavki, Uprava javnih radova sprovodi aktivnosti vezano za izgradnju objekata koji se realizuju kroz Zakon o budžetu Crne Gore, a koje pored ostalog podrazumijevaju i javno oglašavanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, kao i za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

Tokom realizacije određenih ugovora o građenju, u skladu sa svojim zakonskim obavezama vršioći stručnog nadzora Upravu javnih radova obavještavaju o uočenim propustima u projektnoj dokumentaciji, čije otklanjanje za posledicu ima pojavu viškova, nepredviđenih i naknadnih radova koje je neophodno izvesti kako bi izgrađeni objekti bili predati na upotrebu. Sama pojava dodatnih radova povećava i ugovorenu cijenu koštanja izgradnje, zbog čega je neophodno obezbijediti dodatna sredstva za realizaciju projekta kroz pregovarački odnosno otvoreni tenderski postupak. Imajući u vidu propuste projekatana i revidenata, Uprava javnih radova je kod nadležnog Direktorata za inspeksijske poslove i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma inicirala pokretanje više postupaka ukidanja licenci privrednim društvima i ovlašćenim inženjerima u skladu sa Članom 139, stav 1, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektna dokumentacija sa lošim tehničkim rješenjima ugrožava i proces planiranja, kako neophodnih sredstava za realizaciju projekata, tako i dinamike izvođenja radova, što za posledicu ima uvećanje vrijednosti investicije i produžetak roka završetka radova.

Prijedlog Uprave javnih radova bio je da se kroz zakonsku regulativu bliže utvrde uslovi za ukidanje licenci projektantima, revidentima i privrednim društvima koja se bave projektovanjem i revizijom tehničke dokumentacije, čime bi se i navedeni propusti prilikom izrade projektne dokumentacije adekvatno sankcionisali. Takođe, neophodno je zakonom propisati obavezu projektantima i revidentima da nadoknade nastalu štetu investitoru.

Predlog Uprave javnih radova da se izmenama Zakona izgradnji planiranju prostora pojačaju kriterijumi za dobijanje licence privrednih društava koji se bave izradom i revizijom tehničke dokumentacije, izvođenjem radova i vršenje usluga stručnog nadzora.

Uprava javnih radova će napraviti pravilnik o kritirijumima za formiranje tzv. „crne liste“ privrednih društava koji krše ugovorne obaveze čime bi privredna društava preuzela odgovornost za propuste u realizaciji projekata.

Predlog Uprave javnih radova da se izmenama Zakona o javnim nabavkama predvidi isključivanje ponuđača iz postupaka javnih nabavki čije su ponuđene cijene niže za 30% procijenjene vrijednosti nabavke.

Predlog Uprave javnih radova da se uvede elektronska baza podataka za provjeru privrednih subjekata u postupcima javnih nabavki imajući u vidu da trenutno stanje do odugovlačenja procedure evaluacije ponuda i zaključivanja ugovora. Kao prelazno rješenje predlažemo da se ispred svakog nadležnog organa odredi lice koje će biti zaduženo za saradnju sa Upravom javnih radova i pravom za saobraćaj kako bi se dokazi u postupcima provjere privrednih subjekata efikasnije obezbijevali, a samim tim ubrzala procedura zaključivanja ugovora.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava javnih radova ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017).

Takođe, bilo je planirano da Uprava realizuje i projekte iz Godišnjeg akcionog programa 2019, kako za sektor saobraćaja, tako i za sektor životne sredine, međutim prošle godine su u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za ove projekte preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćen ovim programima je 32.

Uprava javnih radova na mjesečnom nivou priprema dinamičke planove realizacije svih projekata u kojima blagovremeno i kontinuirano ukazuje na projekte čija je realizacija ugrožena i iste dostavlja Kancelariji za evropske integracije, Ministarstvu finansija, kao i nadležnim ministarstvima na komentar, upoznavanje i preduzimanje adekvatnih aktivnosti na nivou strukture.

Kao što smo već ranije napominjali, u cilju ugovaranja projekata na vrijeme jedan od je kvalitet tenderske dokumentacije, prvenstveno tehničkih specifikacija koji su sastavni dio tenderske

dokumentacije, a koje najčešće pripremaju korisnici (ministarstva) u saradnji sa konsultantima i dostavljaju Upravi javnih radova na dalje postupanje.

Nedovoljno kvalitetno obrađene tehničke specifikacije najčešće rezultiraju velikim brojem pitanja potencijalnih ponuđača. Za pojedine projekte koji se realizuju kroz navedene programe, propusti/nejasnoće u tehničkim specifikacijama su u krajnjem doveli do poništenja tenderskih postupaka.

Evaluacione komisije čine članovi sa pravom glasa, a koji su uvijek predstavnici korisnika (ministarstava), i predsjednik i sekretar, koji nemaju pravo glasa i predstavnici su Uprave javnih radova. Iskusni članovi Evaluacione komisije, koji ažurno i posvećeno rade na vrednovanju ponuda su ključni za uspješan završetak evaluacionog procesa. Iz izvještaja DEU kojima se odbijaju evaluacioni izvještaji komisija za određene projekte, zaključuje se da komisija nije prihvatila i nije postupala u skladu sa komentarima DEU, što je dovelo do prolongiranja procesa evaluacije i u krajnjem isticanja rok za ugovaranje projekta.

Uprava javnih radova, sa zanemarljivo malim brojem zaposlenih u odnosu na ukupan broj IPA zaposlenih u operativnoj strukturi, ažurno i posvećeno radi na sprovođenju svih koraka i procedura, u skladu sa svojim nadležnostima, stavljajući se na raspolaganje članovima komisije.

Uprava javnih radova nema mandat da utiče na rad drugih institucija i zaposlenih u tim institucijama, prvenstveno članova komisije, iako direktno utiču na dinamiku i kvalitet realizacije projekta kod ove Uprave.

O pitanju navedene problematike, na zahtjev Uprave javnih radova, nastavila se pojačana komunikacija i organizacija sastanaka na najvišem nivou kako bi se kod upravljačke strukture uticalo da kroz svoje aktivnosti obezbijedi proces rada svih uključenih u realizaciju IPA projekata.

Pritisci na Upravu javnih radova koji se koji su se ponovili i ove godine godine kako bi se ispoštovali rokovi za ugovaranje, rokovi za završetak realizacije projekta ili povlačenje sredstava i time nadomjestilo izgubljeno vrijeme, ne predstavljaju sistemsko rješenje problema. Uprava javnih radova je uvijek spremna da svojim dodatnim anagožavnjem pokuša nadomjestiti vrijeme koje je izgubljeno na realizaciji projekta od perioda programiranja, pripreme od strane korisnika, a kasnije u postupku javne nabavke, iako je već u trenutku raspisivanja tendera za određene projekte bilo očito da su svi dinamički rokovi minimalni i da je ugovaranje u roku ugroženo. 15. decembra 2021. godine, održan je putem online platforme, XVI redovni sastanak Nadglednog odbora IPA, na kojem su se razmatrali statusi programiranja, pripreme i sprovođenje svih akcija koje finansira EU, posebno u dijelu koji se odnosi na programe koji se sprovode u indirektnom upravljanju. Tokom sastanka, gđin Yngve Engstroem, Šef odsjeka za saradnju EU delegacije u Crnoj Gori, i gđa Barbara Jesus Gimeno su posebno istakli pozitivne promjene unutar Uprave javnih radova, što je rezultiralo ispunjavanjem svih obaveza i ugovaranjem aktuelnih projekata u okviru CAP2017 programa, što je ocijenjeno kao veliki uspjeh i napredak u odnosu na prethodni period.

Pitanje programiranja po kojem se Upravi javnih radova, kao specijalizovanoj ustanovi za infrastrukturne projekte, dodjeljuje realizacija projekata koji se ugovaraju kroz GRANT tip ugovora je krajnje upitno, a na šta je svim relevantnim institucijama više puta skrenuta pažnja.

Pored navedenih, tekućih pitanja, Uprava javnih radova je 2020. godine brojnim dopisima, molbama i zahtjevima urgirala kod upravljačke strukture da se razmotri reorganizacija IPA strukture u samoj Upravi. Zvaničan pokušaj Uprave javnih radova tokom 2016. godine da se kroz sistematizaciju izdvoji sektor za implementaciju IPA projekata na čijem jačanju bi se sistemski radilo, je bio oštro kritikovan i odbijen. Kao rezultat ovakvog postupanja, u Upravi smo imali situaciju da su IPA službenici raspoređeni po svim sektorima baveći se raznoraznim poslovima iz djelokruga Uprave.

Vlada Crne Gore je 30. jula 2021. godine usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za javne radove. U skladu sa usvojenim Pravilnikom formirane su četiri unutrašnje organizacione jedinice. Jedna od internih jedinica je novi sektor, Sektor za upravljanje IPA projektima, koji se sastoji od tri odsjeka:

1. Odsjek za ugovaranje, implementaciju i nadzor međunarodnih projekata
2. Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumentacije međunarodnih projekata
3. Odsjek za finansijsko-računovodstvene postupke međunarodnih projekata.

Novina ovog pravilnika je da je po prvi put u okviru organizacije i ljudskih resursa predviđen novi sektor koji obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka javnih nabavki i realizaciju projekata finansiranih sredstvima EU. Takođe, novina je da je za ovaj sektor predviđeno mjesto pomoćnika direktora. Sve ove novine će nesumnjivo uticati na bolju i efikasniju organizaciju IPA aktivnosti, kao i na podjelu dužnosti.

Ipak, preopterećenost složenim procesom rada rezultira kontinuiranim odlaskom zaposlenih, koji se vrlo teško nadomjesti, naročito imajući u vidu da je proces obuke dugotrajan pa se Uprava javnih radova konstantno suočava sa nedostatkom kadra upoznatog sa radom na realizaciji IPA projekata.

Prijedlog Uprave javnih radova bio je i da se kroz reorganizaciju čitave IPA operativne strukture unaprijedi rad svih uključenih na IPA projektima od programiranja, preko pripreme ulaznih podataka i dokumentacije od strane krajnjih korisnika, korisnika, ministarstava čime će se unaprijediti kvalitet dokumentacije koja se dostavlja Upravi javnih radova.

Nepromijenjena je činjenica da pored toga što je u Upravi javnih radova inženjerski kadar deficitaran, ni na tržištu rada nema zainteresovanih inženjera koji bi u uslovima koje može obezbjediti Uprava bili zainteresovani za odgovoran i uskospecijalizovan posao projekt menadžera na infrastrukturnim projektima koji se realizuju u skladu sa složenim FIDIC i PRAG pravilima. Ovo pitanje je ključno za dalju efikasnu realizaciju IPA programa, naročito imajući u vidu broj projekata koji uskoro dolaze na realizaciju.

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi javnih radova je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi. S toga je neophodno u okviru tekućeg budžeta planirati sredstva za povećanje zarada ljudi zaposlenih u Upravi javnih radova, koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

Prilozi:

- Tabelarni prikaz potrošnje sredstava (Prilog broj 1);
- Realizacija po projektima (Prilog broj 2).

Zaključci i preporuke Vladi Crne Gore i nadležnim institucijama:

- ❖ Zaključak br. 04-6421/2 od 03. decembra 2021. godine kojim je Vlada Crne Gore odlučila o Informaciji o plaćanju IV i V privremene situacije po Ugovoru broj 310-1896/2019-4 od 26.12.2019. godine sa izvođačem radova JV Roaming Montenegro d.o.o. Nikšić, za rekonstrukciju JPU "Naša radost" Savina, Herceg Novi, koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama", koju je dostavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta;
- ❖ Zaključak br. 04-6404/2 od 9. decembra 2021. godine kojim je Vlada Crne Gore odlučila o Informaciji o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2021. godinu u okviru programa Razvojni projekti Prijestonice Cetinje sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte;
- ❖ Zaključak br. 04-6634 od 13. decembra 2021. godine kojim je Vlada Crne Gore odlučila o Informaciji o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2021. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte;
- ❖ Zaključak br. 04-6860/2 od 23. decembra 2021. godine kojim je Vlada Crne Gore razmotrila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2021. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte Uprave javnih radova;
- ❖ Zaključak br. 04-6947/2 od 23. decembra 2021. godine kojim je Ministarstvo pravde, ljudskih resursa i manjinskih prava u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Upravom javnih radova zadužuje da osigura adekvatnu kadrovsku popunjenost i obučenost kadra za fazu implementacije ugovorenih projekata;
- ❖ Zaključak br. 04-6857/2 od 23. decembra 2021. godine kojim je Vlada Crne Gore razmotrila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2021. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte.

PRILOG BROJ 1

**TABELA PLAĆANJA - KAPITALNI BUDŽET ZA 2021. GODINU,
01.01.2021. godine - 31.12.2021. godine**

41506	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2021. GODINU			IZVORI FINANSIRANJA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2021. GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
1	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
1.1.	Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2	Izgradnja lokalne infrastrukture	286,126.34	6,334,377.68	6,620,504.02	Opšti prihodi i kredit	233,047.61	6,290,241.55	6,523,289.16
2.1.	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu	9,000.00	437,100.00	446,100.00	Opšti prihodi	8,681.75	436,384.44	445,066.19
2.2.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	134,536.78	2,493,288.68	2,627,825.46	Opšti prihodi	124,144.70	2,479,916.79	2,604,061.49
2.2.1.	Lokalni putevi km	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	97,251.15	2,084,124.44	2,181,375.59

2.2.1.1.	Opština Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Opština Berane	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	500.00	14,258.29	14,758.29
2.2.1.3	Opština Pljevlja	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	442,564.22	442,564.22
2.2.1.4	Opština Šavnik	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	1,357.62	1,357.62
2.2.1.5	Opština Gusinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	87,883.06	92,743.81	180,626.87
2.2.1.6	Opština Danilovgrad	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	120,000.00	120,000.00
2.2.1.7	Opština Podgorica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.1.8	Opština Plav	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	125,032.46	125,032.46
2.2.1.9	Opština Andrijevica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	98,925.20	98,925.20
2.2.1.10	Opština Rožaje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	59,774.00	59,774.00
2.2.1.11	Opština Bijelo Polje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.1.12	Opština Herceg Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	64,038.57	64,038.57
2.2.1.13	Opština Petnjica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	94,988.87	94,988.87
2.2.1.14	Opština Nikšić	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	67,669.25	67,669.25
2.2.1.15	Opština Mojkovac	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	244,670.48	244,670.48
2.2.1.16	Opština Kolašin	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	6,835.29	69,210.88	76,046.17
2.2.1.17	Opština Ulcinj	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.1.18	Opština Žabljak	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	2,032.80	73,809.46	75,842.26
2.2.1.19	Opština Bar	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	89,844.61	89,844.61
2.2.1.20	Opština Golubovci	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.1.21	Opština Plužine	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	89,970.76	89,970.76
2.2.1.22	Opština Tivat	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	98,924.98	98,924.98
2.2.1.23	Opština Tuzi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	91,522.29	91,522.29

2.2.1.24	Opština Kotor	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	144,818.69	144,818.69
2.2.2.	Gradske saobraćajnice	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi i krediti	26,893.55	395,792.35	422,685.90
2.2.2.1	Opština Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Opština Berane	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00		0.00
2.2.2.3	Opština Pljevlja	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.4	Opština Šavnik	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.5	Opština Gusinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.6	Opština Danilovgrad	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.7	Opština Podgorica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.8	Opština Plav	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	86,709.75	86,709.75
2.2.2.9	Opština Andrijevica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.10	Opština Rožaje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.11	Opština Bijelo Polje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	13,086.12	0.00	13,086.12
2.2.2.12	Opština Herceg Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.13	Opština Petnjica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.14	Opština Nikšić	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.15	Opština Mojkovac	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	605.00	0.00	605.00
2.2.2.16	Opština Kolašin	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	4,625.00	0.00	4,625.00
2.2.2.17	Opština Ulcinj	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	6,256.93	249,960.26	256,217.19
2.2.2.18	Opština Žabljak	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	2,320.50	59,122.34	61,442.84
2.2.2.19	Opština Bar	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.20	Opština Budva	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.21	Opština Plužine	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.22	Opština Tivat	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

2.2.2.23	Opština Tuzi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.2.2.24	Opština Kotor	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.3.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	9,000.00	123,913.00	132,913.00	Opšti prihodi	4,114.00	123,813.00	127,927.00
2.4.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	4,000.00	41,100.00	45,100.00	Opšti prihodi	3,989.49	40,842.16	44,831.65
2.5.	Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje	11,904.20	1,051,351.40	1,063,255.60	Opšti prihodi	11,904.20	1,050,875.19	1,062,779.39
2.6.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	42,350.00	0.00	42,350.00	Opšti prihodi	42,250.00	0.00	42,250.00
2.7.	Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla i Božaj	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.8.	Putni pravac Monte Rose Tivat	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.9.	Rekonstrukcija trga u Plavu	847.00	0.00	847.00	Opšti prihodi	847.00	0.00	847.00
2.10.	Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru opština Bar	26,200.35	425,560.16	451,760.51	Opšti prihodi	26,200.35	424,438.12	450,638.47
2.11.	Izgradnja puta Danilovgrad Spuž preko Martinića	0.00	219,655.91	219,655.91	Opšti prihodi	0.00	219,555.91	219,555.91
2.12.	Izgradnja puta Srđevac Lozna	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.13.	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	0.00	622,000.98	622,000.98	Opšti prihodi	0.00	621,578.66	621,578.66
2.14.	Rekonstrukcija Ribarske ukica	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.15.	Biznis zona u Mojkovcu	10,295.80	2,950.00	13,245.80	Opšti prihodi	7,295.80	2,404.00	9,699.80

2.16.	Izgradnja Stočne pjace u Beranama	3,620.32	29,700.46	33,320.78	Opšti prihodi	3,620.32	29,700.46	33,320.78
2.17.	Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece O Kotor	29,271.89	86,728.11	116,000.00	Opšti prihodi	0.00	64,903.84	64,903.84
2.18.	Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama o H Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.19.	Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj O H Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.20.	Rekonstrukcija, Bulevar Veljka Vlahovića	0.00	700,000.00	700,000.00	Opšti prihodi	0.00	700,000.00	700,000.00
2.21.	Rekonstrukci bulevara Save Kovačevića	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.22.	Rekonstrukcija puta Gusinje Vusanje	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
2.23.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	0.00	95,828.98	95,828.98	Opšti prihodi	0.00	95,828.98	95,828.98
2.24.	Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	342,000.00	5,724,378.16	6,066,378.16	Opšti prihodi i krediti	256,715.93	4,528,341.29	4,785,057.22
3.1.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

3.2.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	146,130.42	0.00	146,130.42	Opšti prihodi	110,153.36	0.00	110,153.36
3.3.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	0.00	20,000.00	20,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.4.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0.00	351,561.74	351,561.74	Opšti prihodi	0.00	200,180.74	200,180.74
3.5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	8,185.00	331,466.77	339,651.77	Opšti prihodi	5,979.82	278,379.19	284,359.01
3.6.	Unapređenje turističke ponude grada	22,684.58	80,000.00	102,684.58	Opšti prihodi	16,778.55	67,529.31	84,307.86
3.7.	Adaptacija prostora u doo Sportski centar Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.8.	Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	105,000.00	1,091,163.13	1,196,163.13	Opšti prihodi	88,583.50	1,013,536.42	1,102,119.92
3.9.	Obezbeđivanje prostora, seljenje i opremanje RTV Cetinje	0.00	20,000.00	20,000.00	Opšti prihodi	0.00	12,934.30	12,934.30
3.10.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	0.00	950,000.00	950,000.00	Opšti prihodi	0.00	950,000.00	950,000.00
3.11.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	0.00	426,186.52	426,186.52	Opšti prihodi	0.00	216,234.33	216,234.33
3.12.	Rekon/adaptacija objekata bolničkog kompleksa JZU Danilo I-objekat stare dječje bolnice i stari objekat bolonice Danilo I	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.13.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	50,000.00	2,254,000.00	2,304,000.00	Opšti prihodi	33,236.70	1,646,499.57	1,679,736.27

3.14.	Izgradnja svlačionica i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani	10,000.00	200,000.00	210,000.00	Opšti prihodi	1,984.00	143,047.43	145,031.43
4	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosuđa	173,500.00	300.00	173,800.00	Opšti prihodi i krediti	0.00	0.00	0.00
4.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
4.2.	Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac	35,100.00	100.00	35,200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
4.3.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	138,400.00	0.00	138,400.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	65,840.00	189,760.00	255,600.00	Opšti prihodi i krediti	0.00	0.00	0.00
5.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa	65,840.00	189,760.00	255,600.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
6	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	47,090.77	2,067,331.89	2,114,422.66	Opšti prihodi i krediti	13,722.25	2,008,260.58	2,021,982.83
6.1.	Rekonstrukcija ob za potrebe Min unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju	100.00	200.00	300.00	Opšti prihodi Donacija kredit	0.00	0.00	0.00

6.2.	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici	46,990.77	2,067,131.89	2,114,122.66	Opšti prihodi	13,722.25	2,008,260.58	2,021,982.83
7	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	124,301.63	3,120,956.92	3,245,258.55	Opšti prihodi i krediti	108,683.67	3,120,856.98	3,229,540.65
7.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	124,301.63	3,120,956.92	3,245,258.55	Opšti prihodi Donacija	108,683.67	3,120,856.98	3,229,540.65
8	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova -sektor Javne bezbjednosti i odbrane	24,800.00	127,200.00	152,000.00	Opšti prihodi i krediti	0.00	0.00	0.00
8.1.	Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	24,800.00	127,200.00	152,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

9.	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	1,308,264.77	274,598.35	1,582,863.12	Opšti prihodi i krediti	1,245,217.33	0.00	1,245,217.33
9.1.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici Kos-Trebešica	53,612.95	20,000.00	73,612.95	Opšti prihodi	47,238.51	0.00	47,238.51
9.2.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	21,950.90	0.00	21,950.90	Opšti prihodi	21,749.90	0.00	21,749.90
9.3.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	1,002.00	68,518.35	69,520.35	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.4.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	100.00	150,000.00	150,100.00	Opšti prihodi/Donacija	0.00	0.00	0.00
9.5.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	590,098.92	0.00	590,098.92	Opšti prihodi/Donacija	1,086,423.92	0.00	1,086,423.92
9.6.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju	523,500.00	0.00	523,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.7.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	118,000.00	0.00	118,000.00	Opšti prihodi	89,805.00	0.00	89,805.00

9.8.	Adaptacija/ Rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika	0.00	36,080.00	36,080.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	287,000.00	5,000.00	292,000.00	Opšti prihodi i krediti	144,047.21	0.00	144,047.21
11	Projekti očuvanja životne sredine	107,274.47	1,108,540.86	1,215,815.33	Opšti prihodi i krediti	95,139.01	1,001,283.77	1,096,422.78
11.1.	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade MORT-a u Podgorici	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.2.	Sanitarne deponije,postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	53,178.53	478,382.91	531,561.44	Opšti prihodi	61,149.03	430,866.53	492,015.56

11.3.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	5,803.99	137,965.38	143,769.37	Opšti prihodi	3,370.80	123,431.77	126,802.57
11.4.	Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdjevanja	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.5.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema otpadnih voda	46,891.95	436,139.45	483,031.40	Opšti prihodi	29,856.88	394,403.51	424,260.39
11.6.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	100.00	40,653.12	40,753.12	Opšti prihodi	0.00	38,176.91	38,176.91
11.7.	Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	1,200.00	15,100.00	16,300.00	Opšti prihodi	762.30	14,405.05	15,167.35
11.8.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.9.	Servisna zona u Gradionici Opština Tivat	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
12	Unapređenje turističke ponude	465,012.61	13,507,760.52	13,972,773.13	Opšti prihodi i krediti	420,162.38	13,218,723.16	13,638,885.54
12.1.	Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin	159,493.56	3,102,949.36	3,262,442.92	Opšti prihodi	151,534.30	3,102,649.36	3,254,183.66
12.2.	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	33,695.31	116,930.29	150,625.60	Opšti prihodi	33,694.31	116,930.29	150,624.60
12.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	94,157.91	2,331,725.55	2,425,883.46	Opšti prihodi	94,156.91	2,269,725.55	2,363,882.46

12.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	37,573.30	2,775,789.54	2,813,362.84	Opšti prihodi	27,181.44	2,775,437.50	2,802,618.94
12.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	1.00	171,340.01	171,341.01	Opšti prihodi	0.00	111,137.01	111,137.01
12.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	75,214.00	4,535,965.30	4,611,179.30	Opšti prihodi	51,753.76	4,381,640.28	4,433,394.04
12.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	8,340.65	0.00	8,340.65	Opšti prihodi	8,340.65	0.00	8,340.65
12.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	11,600.00	361,427.85	373,027.85	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	11,600.00	356,876.10	368,476.10
12.9.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	3,100.00	0.00	3,100.00	Opšti prihodi	3,025.00	0.00	3,025.00
12.10.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolšin 1450 i Kolašin 1600 i osniježavanje staza ski centra Kolašin 1600	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
12.12.	Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
12.12.	Izgradnja nacionalne kuće Maslina u Baru	41,836.88	111,432.62	153,269.50	Opšti prihodi	38,876.01	104,327.07	143,203.08
13	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Održivi razvoj i turizam	2,522,408.40	3,366,608.96	5,889,017.36	Opšti prihodi kredit	2,212,850.36	876,067.82	3,088,918.18
13.1.	PPOV kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama	83,500.00	2,637,128.43	2,720,628.43	Opšti prihodi	73,993.97	0.00	73,993.97

13.2.	Sanacija odlagališta "Čađe" u Baru	27,062.39	100.00	27,162.39	Opšti prihodi	635.25	0.00	635.25
13.3.	Podrška u pripremi projekata za zaštitu sredine i klimatske akcije	648,335.61	0.00	648,335.61	Opšti prihodi	648,113.60	0.00	648,113.60
13.4.	Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom	200,000.00	0.00	200,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
13.5.	Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama	661,161.40	0.00	661,161.40	Opšti prihodi	904,969.53	0.00	904,969.53
13.6.	Jačanje kapaciteta tranzicija acqvi-ja i planiranja u životnoj sredini	304,000.00	0.00	304,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
13.7.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama	500.00	122,574.50	123,074.50	Opšti prihodi	0.00	73,845.75	73,845.75
13.8.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom	500.00	213,326.07	213,826.07	Opšti prihodi	0.00	431,294.09	431,294.09
13.9.	Nabavka opreme za horizontalnu podršku izvještavanje i monitoring u životnoj sredini za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštite od buke	2,000.00	226,322.96	228,322.96	Opšti prihodi	0.00	217,231.98	217,231.98
13.10.	Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu	2,000.00	167,157.00	169,157.00	Opšti prihodi	0.00	153,696.00	153,696.00

13.11.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	593,349.00	0.00	593,349.00	Opšti prihodi	585,138.01	0.00	585,138.01
14	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke	137,181.25	7,094,240.96	7,231,422.21	Opšti prihodi kredit	140,603.27	7,973,340.86	8,113,944.13
14.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	31,430.88	2,888,986.18	2,920,417.06	Opšti prihodi kredit	31,130.88	2,886,539.86	2,917,670.74
14.2.	Adaptacija objekata obrazovanja	1,210.00	68,771.80	69,981.80	Opšti prihodi kredit	968.00	68,771.80	69,739.80
14.4.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	600.00	10,700.00	11,300.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.1.	Vrtić u City kvartu	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.2.	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.3.	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	100.00	10,100.00	10,200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.4.	Vrtić na Zlatici u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.5.	Vrtić u Beranama	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00

14.4.6.	Vrtić u Bijelom Polju	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.4.7.	Vrtić u Plavu	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.5.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB I	33,085.88	954,066.17	987,152.05	Opšti prihodi kredit	56,649.99	1,869,991.43	1,926,641.42
14.5.1.	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.5.2.	Vrtić u Baru	200.00	100.00	300.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.5.3.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	14,639.43	523,994.88	538,634.31	Opšti prihodi kredit	36,294.99	1,134,060.93	1,170,355.92
14.5.4.	Vrtić u Pljevljima	18,046.45	429,771.29	447,817.74	Opšti prihodi kredit	20,355.00	735,930.50	756,285.50
14.5.5.	Vrtić u Ulcinju	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.6.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00
14.7.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	44,255.50	1,196,010.01	1,240,265.51	Opšti prihodi kredit	34,091.50	1,192,646.96	1,226,738.46
14.6.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta OŠ u Tološima u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi kredit	0.00	0.00	0.00

14.7.	Naučno-Tehnološki park u Podgorici	20,000.00	847,863.88	867,863.88	Opšti prihodi kredit	14,157.00	847,293.11	861,450.11
14.8.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	600.00	700.00	1,300.00	Opšti prihodi i krediti	0.00	0.00	0.00
14.8.2.	Druga Gimnazija u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.3.	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.4.	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.5.	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.6.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.7.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.8.8.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.9.	Osnovna škola u Igalu	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.10.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.11.	Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne gore u Podgorici	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

14.12.	Sanacija klizališta na Savina za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom	0.00	990,100.00	990,100.00	Opšti prihodi	0.00	973,094.62	973,094.62
14.13.	Vrtić u Rožajama	4,598.99	136,442.92	141,041.91	Opšti prihodi	3,605.90	135,003.08	138,608.98
14.14.	Osnovna škola u Tivtu	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.15.	Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.16.	Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica	1,100.00	0.00	1,100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
14.17.	Izgradnja Osnovne škole u Bloku 35/36-Tuški put, Podgorica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
15	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	46,472.00	1,977,310.70	2,023,782.70	Opšti prihodi i krediti	29,106.40	1,971,964.13	2,001,070.53
15.1.	Rekonstrukcija zapadna tribina FK Sutjeska u Nikšiću	5,000.00	1,000,100.00	1,005,100.00	Opšti prihodi	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
15.2.	Izrada sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	16,172.00	612,849.94	629,021.94	Opšti prihodi	15,972.00	609,968.24	625,940.24
15.3.	Rekonstrukcija objekata zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru	25,100.00	364,160.76	389,260.76	Opšti prihodi	13,134.40	361,995.89	375,130.29
15.4.	Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Kotoru	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

15.5.	Izgradnja sportskih terena i sala	100.00	100.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
15.6.	Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
15.7.	Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
15.8.	Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
16	Prijekti koji se finansiraju iz IPA fondova sektor Obrazovanja, nauka, sport i mladi	49,462.50	410,287.50	459,750.00	Opšti prihodi i krediti	8,940.00	0.00	8,940.00
16.1.	Inkluzija marginalnih grupa u obrazovni sistem	49,462.50	410,287.50	459,750.00	Opšti prihodi i krediti	8,940.00	0.00	8,940.00
17	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	42,139.72	806,700.00	848,839.72	Opšti prihodi i krediti	22,679.82	759,981.73	782,661.55
17.1.	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	36,839.72	650,200.00	687,039.72	Opšti prihodi	22,679.82	628,979.30	651,659.12
17.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	4,300.00	156,100.00	160,400.00	Opšti prihodi	0.00	131,002.43	131,002.43
17.3.	Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja Creative hubs	200.00	100.00	300.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
17.4.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	300.00	0.00	300.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

17.5.	Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
17.6.	Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću	200.00	100.00	300.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
17.7.	Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	300.00	100.00	400.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18	Izgradnja I rekonstrukcija objekata zdravstva	23,835.50	762,868.08	786,703.58	Opšti prihodi i krediti	18,592.25	742,567.33	761,159.58
18.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš"-Podgorica	23,535.50	761,768.08	785,303.58	Opšti prihodi	18,592.25	742,567.33	761,159.58
18.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan	0.00	200.00	200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	100.00	200.00	300.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18.6.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	200.00	200.00	400.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
18.7.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

18.8.	Izgradnja urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta kliničkog centra Crne Gore u PG	0.00	100.00	100.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
19	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstva	192,218.50	922,571.50	1,114,790.00	Opšti prihodi i krediti	0.00	0.00	0.00
19.1.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KC CG	192,218.50	922,571.50	1,114,790.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
20	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	27,000.00	1,453,119.01	1,480,119.01	Opšti prihodi i krediti	18,107.28	1,453,019.01	1,471,126.29
20.1.	Izgradnja doma Starih u Podgorici	0.00	328,267.30	328,267.30	Opšti prihodi	0.00	328,267.30	328,267.30
20.2.	Izgradnja doma Starih u Nikšiću	27,000.00	1,124,851.71	1,151,851.71	Opšti prihodi	18,107.28	1,124,751.71	1,142,858.99
	SVE UKUPNO	6,271,928.46	49,254,011.09	55,525,939.55		4,967,614.77	43,944,648.21	48,912,262.98

		Plan	Realizacija
Program 11 052	Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa	100,00	0,00
Program 12 024	Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa	429.400,00	0,00
Program 13 023	Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova	152.000,00	0,00
Program 13 024	Javna bezbjednost	1.399.808,86	1.307.369,03
Program 13 025	Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	3.959.872,41	3.944.154,45
Program 15 019	Turistička djelatnost	13.972.773,13	13.638.885,54
Program 15 030	Industrijski i regionalni razvoj	6.066.378,16	4.785.057,22
Program 17 019	Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja	1.874.863,12	1.389.264,54
Program 17 020	Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje	6.620.504,02	6.523.289,16
Program 18 003	Ekologija i priroda	7.104.832,69	4.185.340,96
Program 19 032	Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, nauke, kulture i sporta	9.714.954,91	10.123.954,66
Program 20 021	Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	848.839,72	782.661,55
Program 21 011	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	1.901.493,52	761.159,58
Program 22 025	Socijalna zaštita	1.480.119,01	1.471.126,29
	UKUPNO	55,525,939.55	48,912,262.98

PRILOG BROJ 2

REALIZACIJA PO PROJEKTIMA

PROGRAM:

TURISTIČKA DJELATNOST

1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Aktivnostima na realizaciji projekata iz potprograma "Unapređenje turističke ponude" koordinira nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja koje utvrđuje potrebe i prioritete.

1.1. Ski centar na lokalitetu Kolašin 1600, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice sa pratećim sadržajima, primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove na izgradnji žičara koje povezuju ski centre, ski staza i osnježavanju staza (izgradnja sistema vodosnabdijevanje, akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje).

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, I faza

- Projektom je predviđena rekonstrukcija puta u dužini od 2,3km, koja obuhvata zemljane radove, asfalterse radove, ugradnju saobraćajne opreme i signalizacije i postavljanje 10kV kabla. Izvođenje radova se realizuje u dvije faze.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50€
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 17.08.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5819/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.11.2015. godine, na iznos od 777.385,73€.
- Izbor stručnog nadzora izvršen je neposrednim sporazumom, na osnovu ponude br. 19/2-01-2073/2 od 20.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2492/2 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.05.2016. godine, na iznos od 4.988,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.489,20€ za tekuće izdatke, odnosno 738.362,94€ za kapitalne izdatke.
- Nakon završetka radova druge faze biće izvršen tehnički prijem za kompletan put.

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, II faza

- Radovi II faze obuhvataju preostali dio zemljanih radova, asfalterse radove i saobraćajnu opremu i signalizaciju na cijeloj dužini trase puta od 2,3km, kao i postavljanje 10kV kabla.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50€,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5753/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 1.331.618,01€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.04.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00€.
- Ugovoreni radovi su završeni 2020. godine, a okončana situacija i dokumentacija uz okončanu situaciju je od strane stručnog nadzora dostavljena 2021. godine.
- Na realizaciji projekta je utrošeno 33.498,50€ za tekuće izdatke, odnosno 1.331.571,56€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.365.070,06€, od čega 27.847,03€ u 2021. godini.



Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, I faza (PR8-PR14)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski resorta "Kolašin 1450" do Ski resorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a drugu fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija je rađen kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta I i II faze je raspisano 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta I i II faze, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695,00€.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" (za I i II fazu) je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin

1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" sa projektantom I i II faze, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90€.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2376/1 sa izvođačem, "Akropolis" d.o.o. Nikšić, je zaključen 09.04.2019. godine, na iznos od 392.255,31€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01-812/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 8.730,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni 2019. godine.
- Stručni nadzor je 2021. godine dostavio konačni izvještaj o izvedenim radovima.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.657,30€ za tekuće izdatke, odnosno 386.518,19€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 398.175,49€, od čega 2.758,68€ u 2021. godini.

Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, II faza (PR1-PR8)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a II fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija rađen je kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta I i II faze raspisano je 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta I i II faze, JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine na iznos od 695,00€.
- Ugovoru o izradi projektne dokumentacije zaključen je sa "GeoT" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" I i II faze je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" sa projektantom I i II faze, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5068/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 488.835,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-9975/1 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2019. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Nakon sprovedenih geoloških istraživanja i izrade Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena, u julu 2018. godine, urađen je projekat izrade potpornih konstrukcija. Uvođenjem izvođača radova u posao, ustanovljena je neusaglašenost projektne

dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, pa je u avgustu 2019. godine napravljena izmjena projektne dokumentacije.

- Svi ugovoreni radovi su završeni 2019. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.310,70€ za tekuće izdatke, odnosno 488.831,35€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 498.142,05€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- S obzirom na to da je urađena izmjena projektne dokumentacije, došlo je do prekoračenja ugovorenih količina radova. Upućen je zahtjev Ministarstvu finansija za obezbjeđenjem dodatnih sredstava i odobren je pregovarački postupak. Nakon što budu završeni radova po pregovaračkom postupku, stručni nadzor će završiti izvještaj za obje faze.

**Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 -
Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, potporne konstrukcije, II faza -
pregovarački postupak**



- Zbog izmjene prvobitne trase puta, javila se potreba za izradom potpornih konstrukcija. Ugovor se odnosi na naknadne radove i višak radova, ugovorenih po pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja, kojim je odobrena izmjena dopune glavnog projekta. Projekat konstrukcije za "Via projekt" d.o.o Podgorica, koji je radio glavni projekat izrade puta, radio je "GeoT" d.o.o. Podgorica. Izmjena projekta i dopuna izmjene, na koju se odnosi ovaj projekat, je povjerena projektantu osnovnog projekta, odnosno "GeoT" d.o.o. Podgorica, bez raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmjene dopune glavnog projekta je raspisano 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta, JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine, na iznos od 695,00€.
- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera. Ugovor br. 01-334/20-1977/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 72.989,38€.
- Nije rađeno javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora, jer se radi o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja tendera za izbor izvođača radova. Ugovor br. 01-

334/20-3179 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 1.149,50€.

- Svi ugovoreni radova su završeni.
- I pored insistiranja od strane Uprave javnih radova, stručni nadzor nije dostavio konačni izvještaj o izvedenim radovima. Okončana situacija je vraćena izvođaču radova, do kompletiranja dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 695,00€ za tekuće izdatke, odnosno 46.809,96€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 47.504,96€ , pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- U toku postavljanja putarske mreže za zaštitu kosina, izvođač radova je obavijestio naručioca i stručni nadzor da je na kosini iza zida, došlo do pojave pukotine. Stručni nadzor je dao svoje mišljenje u kojem nije mogao jasno potvrditi ozbiljnost deformacije, već je predložio angažovanje geologa. Zahtjev za dostavljanje stručnog mišljenja je upućen projektantu i revidentu.
- U vezi sa pojavom pukotine na kosini iza zida, Naručilac je 13.11.2020. godine putem jednostavnih nabavki uputio zahtjev za dostavljanje ponuda za izradu projekta osmatranja tla i potporne konstrukcije od PR1 do PR8 na putu Ski resort Kolašin 1450-Jezerine-Ski resort Kolašin 1600.

Ugovor br. 01-334/20-10348 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.12.2020. godine, na iznos od 907,50€.

Na osnovu ponude br. 01-426/20-1722/1 od 31.03.2021. godine, sa kompanijom "Crta" d.o.o. Podgorica, zaključen je ugovor br. 01-334/21-2403 od 29.04.2021. godine za vršenje usluge revizije glavnog projekta osmatranja tla i potporne konstrukcije od PR1 do PR8 na iznos 605,00 €. Revizija projekta je završena i u 2021. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 1.512,50€, i projekat je predat izvođaču radova i stručnom nadzoru radi praćenja eventualnih slijeganja tla u toku garantnog perioda.

- **Izvođenje asfaltnih radova u toku rekonstrukcije puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600 - II faza, (PR1 - PR14)**

- Dio puta ispred potpornih zidova, u dužini od oko 180m koji je predmet projekta, je dio puta prema skijalištu "Kolašin 1600", koji je zbog izmjene trase pomjeren. Projektom je obuhvaćena izrada tampona, asfalta i rigola na dijelu ispred potpornih zidova.
- Obradivač izmjene glavnog projekta je "Via projekt" d.o.o. Podgorica.
- Ugovor br. 01-9846/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.12.2019. godine, na iznos od 605,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9394/1 sa izvođačem , "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 69.920,19€.
- S obzirom da je ovaj dio puta bio obuhvaćen osnovnim ugovorom, nije raspisivano javno nadmetanje za usluge vršenja stručnog nadzora, već je nadzor koji je angažovan za izgradnju II faze puta Kolašin 1600 vršio stručni nadzor nad ovim projektom. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00 €.
- Svi ugovoreni radova su završeni.
- Stručni nadzor je dostavio konačni obračun radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 605,00€ za tekuće izdatke, odnosno 69.621,72€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 70.226,72€, od čega 61.115,15€ u 2021. godini.

- **Izrada Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10kV Kolašin 1450-1600**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8109/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8107/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 1.573,00€.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na postupak eksproprijacije, koji je u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i Skijališta Crne Gore. Obezbijeđena su sredstva za eksproprijaciju.

- **Žičara K8**



- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mnm - Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.
- Ugovor br. 19/2-01-5740/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem šestosjedne žičare K8, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 8.979.740,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-6145/1 sa revidentom glavnog projekta šestosjedne žičare K8, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2016. godine, na iznos od 11.543,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-624/1 sa stručnim nadzorom na izgradnji šestosjedne žičare K8 i ski staza, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.07.2017. godine, na iznos od 99.960,00€.
- Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni i objekat je u februaru 2019. godine pušten u funkciju.
- Ukupno je realizovano 9.002.858,49€, od čega 439.734,62€ u 2021. godini.

- **Ski staze uz žičaru K8**

- Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi". Ukupna dužina ski staza iznosi oko 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova je raspisano 01.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7567/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.197.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8054/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2901 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.317,80€ za tekuće izdatke, odnosno 1.197.000,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.207.217,00€, od čega 109.601,80€ u 2021. godini.

- **Žičara K7 - povezivanje Kolašin 1450 - Kolašin 1600**

- Prostornim planom posebne namjene "Bjelasica i Komovi" predviđena je izgradnja isklopive šestosjedne žičare K7 čijom izgradnjom će se povezati skijališta "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600". Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-6450/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, konzorcijum „Doppelmayr – Kolašin”, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 8.998.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7065/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 79.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Civilenginer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi idejnog rješenja i glavnog projekta.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju dijela postupka eksproprijacije.
- U decembru 2020. godine izvršena je prijava radova na dijelu katastarskih parcela na kojima se ne sprovodi postupak eksproprijacije i izvođač je uveden u posao krajem maja 2021. godine, kada su se stekli povoljni vremenski uslovi. Radovi na izgradnji žičare su završeni i objekat će u februaru 2022. godine biti pušten u funkciju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 119.534,40€ za tekuće izdatke, odnosno 8.680.792,78€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 8.800.327,18€, od čega 5.898.649,10€ u 2021. godini.



• **Ski staze uz žičaru K7**

- Projekat se realizuju po principu "projektuj i izgradi". Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije, kao i 97% ugovorenih radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.412,40€ za tekuće izdatke, odnosno 1.743.814,35€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.778.226,75€, od čega 348.402,03€ u 2021. godini.

- Problematika na realizaciji ovog projekta odnosi se na izgradnju dijela ski staza čija je trasa ispod budućeg vijadukta na saobraćajnici koju realizuje Uprava za saobraćaj. Naime, treba donijeti odluku da li privremeno izmjestiti trasu ski staza iznad tunela (što nije u skladu sa planskom dokumentacijom) ili sačekati završetak izgradnje vijadukta, što se očekuje tokom 2022. godine.
- **Nabavka i isporuka mehanizacije za pripremu i održavanje ski staza**
- Javno nadmetanje za izbor isporučioaca dva nova vozila za pripremu i ravnanje snijega na ski stazama (tabača, ratraka) za potrebe Ski centra Kolašin 1600, raspisano je 24.11.2021. godine. Otvaranje ponuda zakazano je za 17.01.2022. godine.
- Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.300.000,00€ bez uračunatog PDV-a.
- **Izgradnja trafostanice 10/0,4 kV za potrebe napajanja šestosjedne isklopive žičare "K7" i 10 kV kablovskih vodova**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova po principu "projektuj i izgradi" je raspisano 28.09.2021. godine.
- Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 130.000,00€ bez uračunatog PDV-a.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta biće raspisano u januaru 2022. godine.
- **Adaptacija krova garaže za smještaj korpi uz žičaru**
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 23.11.2021. godine. Ugovor sa izvođačem radova, biće zaključen početkom 2022. godine.
- Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 40.000,00€.

1.2. Ski centar na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača**
- **Ravna Rijeka - Jasikovac 5,5 km**
- Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko - pravni problemi u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.
- Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.

- **Jasikovac - Cmiljača 10 km**

- U prethodnom periodu završeno je probijanje trase puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km, koje se realizovalo kroz 3 faze.



- **Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije puta “Ravna Rijeka – Jasikovac” je raspisano 08.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3017/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “DING” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 14.970,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije puta “Ravna Rijeka – Jasikovac” je raspisano 28.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 334/20-3591 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020 godine, na iznos od 3.951,01 €.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije. Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja, Upava javnih radova će preduzeti dalje aktivnosti na realizaciji ovog putnog pravca.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta “Ravna Rijeka – Jasikovac”, na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11090/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 8.373,20€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta “Ravna Rijeka – Jasikovac”, na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-69/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ground Engineering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.01.2021. godine, na iznos od 2.262,7€.
- Izrada projektne dokumentacije je završena.

- Ukupno je realizovano 10.635,90€, od čega cio iznos u 2021. godini.
- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača**



- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.

- Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta.
- Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova (snijeg i kiša), kao i lošeg pristupnog puta dužine cca 2 km ka prilazu gradilištu, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem godine.
- Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare. Dokumentacija je proslijeđena nadležnom inspekcijskom organu na dalje postupanje.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 23.115,81€ za tekuće izdatke, odnosno 530.790,26€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 553.906,07€, od čega 28.295,08€ u 2021. godini.

• **Primarna elektroenergetska infrastruktura**

Izgradnja trafostanice "Cmiljača" 35/10 kV



- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojkovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 2728/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
- U 2021. godini završeni su svi radovi na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad.
- Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što su izgradnja 35 kV dalekovoda "Ribarevine-Cmiljača" nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 117.271,40€ za tekuće izdatke, odnosno 1.174.692,26€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.291.963,66€, od čega 72.314,77€ u 2021. godini.

Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS "Ribarevine" 110/35 kV

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3090/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 19.995,25€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5418/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer " d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 2.970,00€.
- Svi ugovoreni radovi na adaptaciji vodne ćelije su završeni tokom 2021. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.970,00€ za tekuće izdatke, odnosno 19.995,25€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 22.965,25€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10 kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.
- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase.
- U toku su aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na pojavu nepredviđenih okolnosti, zbog kojih Izvođač nije mogao nastaviti sa izvoditi izvođenjem radova po revidiranom Glavnom projektu. Nepredviđene okolnosti se odnose na nemogućnost nabavke projektovanih stubova i do preklapanja trase dalekovoda na određenim dionicama sa projektom ski staza. Uzimajući u obzir nastale okolnosti pokrenuta je procedura izmjene projektne dokumentacije dalekovoda shodno zakonskoj regulativi.

- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača**

- Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmiljača" sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
- Nakon što bude dostavljen zapisnik o pozitivnom inspekcijskom pregledu, izvođač će biti uveden u posao.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.398,00€ za tekuće izdatke, od čega 3.940,00€ u 2021. godini.

- **Nabavka žičare šestosjed Z7**

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
- Do sada je završena izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi.
- Izvođenje radova je nastavljeno, nakon što je gradilište bilo konzervirano u decembru 2020. godine. Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 65.520,52€ za tekuće izdatke, odnosno 7.318.745,50 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 7.384.266,02€, od čega 12.513,60€ u 2021. godini.

- U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom.

1.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, I faza**
 - Izgradnja puta u dužini od 5,3km, izvodi se u dvije faze. U prvoj fazi, predviđeno je izvođenje radova na dužini od 2,3km puta, odnosno do PR 200, i to zemljani radovi-iskop i nasip, izrada tampona, potpornih konstrukcija, dva pločasta propusta i izrada cjevastih propusta.
 - Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
 - Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 14.04.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-209 sa izvođačem IGP "Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 1.132.133,88 €.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 16.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6365/1/2 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.11.2016. godine, na iznos od 5.950,00€.
 - Svi ugovoreni radovi I faze su završeni.
 - Na realizaciji projekta je utrošeno 25.983,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.102.564,53 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 1.128.547,53€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta ogleda se u nemogućnosti da se izvedu cjevasti propusti, neriješenim imovinsko-pravnim odnosima na trasi puta, obrušavanju kosina. Iz tog razloga, radovi su izvedeni do PR180 umjesto do PR200.
- **Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza**



- Put se nalazi u opštini Mojkovac. Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboku II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanje 10 kV kabla, a asfaltni radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.
- Do sada su završeni zemljani radovi na proboku II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.183,00€ za tekuće izdatke, odnosno 706.531,03€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 730.714,03€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
- Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.
- Izrada projektne dokumentacije je završena. U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
- **Izgradnja puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije), I faza**
 - Nakon izgradnje I faze puta, došlo je do obrušavanja kosina urađenih po projektu i do pojave klizišta. Izrađen je projekat sanacije kosina na I fazi puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, koji se izvodio u dvije faze. Prvom fazom je obuhvaćena izrada zidova 5 i 6, a drugom fazom izrada preostalih 7 od ukupno 9 zidova na I fazi trase puta.
 - Dopunu Glavnog projekta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, koji se odnosi na sanaciju nestabilnih kosina potpornim zidovima, radio je obrađivač Glavnog projekta izgradnje puta, "Inter project" d.o.o., na osnovu ponude broj: 101-1560/1-5356/1 od 04.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8027/1 sa "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2018. godine, na iznos od 4.985,20€.
 - Ugovor br. 440/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 26.06.2019. godine, na iznos od 2.500,00€, na osnovu ponude ponuđača.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 13.11.2018. godine. Ugovor br. 01-429/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.01.2019. godine, na iznos od 181.351,62 €.
 - Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku male vrijednosti, upućen je 15.04.2019. godine. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-2701/1 od 18.04.2019. godine, zaključen je Ugovor br. 01-3094/1 od 10.05.2019 godine sa "Kov atelje" d.o.o. iz Nikšića, za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na potpornim konstrukcijama I faze, u iznosu od 4.477,00 €.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora o izvedenim radovima.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.962,20€ za tekuće izdatke, odnosno 178.272,55€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 190.234,75€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- **Izgradnja puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije), II faza**
- Nakon izgradnje I faze puta, došlo je do obrušavanja kosina koje su urađene po projektu i do pojave klizišta. Izrađen je projekat sanacije kosina na I fazi puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8027/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.12.2018. godine, na iznos od 4.985,20€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta nije raspisano, već je ugovor zaključen na osnovu ponude ponuđača. Ugovor br. 440/1 sa revidentom glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 26.06.2019. godine, na iznos od 2.500,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 09.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7557/1 sa izvođačem, "Eko reciklaža" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 967.990,50€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.09.2019. godine, ali je poništeno. Na osnovu dostavljene ponude, zaključen je ugovor br. 01-7462/1 od 01.10.2019 godine, za vršenje stručnog nadzora u roku od 2 mjeseca, sa kompanijom "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, na iznos od 4.900,50 €. Nakon toga, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti, od 10.03.2020. godine, izabran je stručni nadzor do kraja realizacije projekta. Ugovor br. 01-334/20-2500 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, projects & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 14.883,00€.
 - Sprovedene su aktivnosti na izradi i reviziji tehničke dokumentacije, aktivnosti za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i stručnog nadzora i izvođač je uveden u posao.
 - Svi ugovoreni radovi su završeni i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora o izvedenim radovima.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 27.268,70€ za tekuće izdatke, odnosno 966.387,40€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 993.656,10€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- **Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac**



- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Montepuť" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
 - Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.932,50€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- **Izvođenje radova na izgradnji izmijenjene trase puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m**

- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od 1.750,50€.
 - Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljani u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
 - U 2021. godini, za izradu i reviziju Elaborata o geotehničkim svojstvima terena utrošeno je 6.318,25€.
 - Revident projekta izmijenjene trase puta "Ing-impuls" d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma "Ing-impuls" d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine, zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom "Europrojekt" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1936,00€.
 - Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta.
 - Na realizaciji projekta u 2021. godini nije bilo utroška sredstva.
- Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“**
- Donešena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja "Žarski".
 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto poništeno 16.07.2021. godine.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski**
- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi“. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac“ iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
- Do sada je završena izrada i revizija glavnog projekta, i izvedeni su zemljani radovi na objektu.
- Izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, kao i zemljani radovi na garaži za ratrake. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- Početkom jula 2021. godine izvođač radova je, usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, zatražio izmjenu ugovorene cijene izvođenja radova, sporazumni raskid ili zamrzavanje ugovora do normalizacije tržišta. Zahtjev je proslijeđen Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje razmatranje.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 11.146,83€ za tekuće izdatke, odnosno 375.216,70€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 386.363,53€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.



- **Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4**



- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta, i sprovedene su aktivnosti na nabavci opreme. Takođe, izvršena je i prijava radova na dijelu katastarskih parcela na kojima se ne sprovodi postupak eksproprijacije.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju dijela eksproprijacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 104.741,10€ za tekuće izdatke, odnosno 7.813.229,64€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 7.917.970,74€, od čega 2.777.062,94€ u 2021. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i Skijališta Crne Gore.

- **Ski staze uz žičaru Z4**

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4“ je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- U toku su aktivnosti na sprovođenju dijela eksproprijacije.
- Izvršena je prijava radova na dijelu katastarskih parcela na kojima se ne sprovodi postupak eksproprijacije i izvođač je uveden u posao. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine. Radovi su nastavljani i završeni na nespornom dijelu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.036,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.389.858,50€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.406.894,50€, od čega 139.655,05€ u 2021. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti Skijališta Crne Gore.

• **Adaptacija objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu**



- Projektom dokumentacijom planirana je adaptacija dijela postojećeg objekta koji je u vlasništvu Opština Mojkovac, a za potrebe Skijališta Crne Gore.
- Poslovni prostor se sastoji od: ulaznog hodnika, stepeništa, toaleta, portirnice i čajne kuhinje u prizemlju. Na spratu se nalazi veliki centralni hodnik sa osam prostorija raspoređenih oko njega. Površina objekta iznosi 188,90 m². Spratnost objekta je prizemlje i sprat.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedio korisnik. Obradivač glavnog projekta je “INGrad” d.o.o. Podgorica.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8027/1 sa izvođačem radova, „Konstruktor group“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 134.475,97€.
- Javno nadmetanje za stručnog nadzora je raspisano 10.06.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-7558/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 5.989,50€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 5.989,50€ za tekuće izdatke, odnosno 132.148,54€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 138.138,04€, od čega 43.253,99€ u 2021. godini.

1.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Putna infrastruktura

Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje – Štedim

- Realizacija projekta rekonstrukcije putnog pravca Rožaje - Štedim realizuje se fazno.
- Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 7,2 km, a preostalo je izvođenje asfalterških radova na kompletnoj dionici, čime će projekat biti završen.
- Projekat obuhvata rekonstrukciju kompletne dionice puta, kao i izgradnju saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije sa regulisanom odvodnjom i izgradnjom potpornih konstrukcija.
- Ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.
- Ugovor sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen krajem 2015. godine.





II faza

- Druga faza obuhvata radove u dužini od 2,2 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-3885/1 sa izvođačem, „Toškovići“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.07.2016. godine, na iznos od 405.622,10€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.05.2016. godine. Ugovor br. 19/2-4140/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.08.2016.godine, na iznos od 6.000,00€.
- Svi ugovoreni radova II faze su završeni.
- Na realizaciji projekta za II fazu je utrošeno 399.265,21€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

III faza

- Treća faza obuhvata radove u dužini od 1,4 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 585.629,58€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1588/1-1948/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 5.180,00€.
- Svi ugovoreni radova III faze su završeni.
- Na realizaciji projekta je utrošeno 585.629,27€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

IV faza

- Četvrta faza obuhvata radove u dužini od 1,6 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.03.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3089/1 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 08.06.2018. godine, na iznos od 870.491,22€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3277/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Svi ugovoreni radova IV faze su završeni.
- Na realizaciji projekta za IV fazu je utrošeno 870.490,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

V faza

- Peta faza obuhvata dužinu puta od 1 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 14.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4381/1 sa izvođačem, „Tofi“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 20.06.2019. godine, na iznos od 1.090.903,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 31.05.2019. godine. Ugovor br. 01-5373/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.07.2019. godine, na iznos od 12.600,00€.
- Svi ugovoreni radovi V faze su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.090.900,00 € za kapitalne izdatke, odnosno 12.600,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.103.000,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Završni radovi I faze



- Ova faza radova obuhvata izgradnju mosta u selu Kaluđerski laz i asfALTERSKE radove u dužini od 2 km.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisan je 19.06.2020. godine. Ugovor br. 04-19/20 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 27.08.2020. godine, na iznos od 697.073,33€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 29.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-7499/1 sa stručnim nadzorom, „Sedam-ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.09.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni. Izvođač radova je dostavio konačni izvještaj.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 694.162,38€ za kapitalne izdatke, odnosno 2.400,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 696.582,38€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

Žičara

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim”. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon” d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
- Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.
- Do sada je završeno postavljanje svih dvanaest stubova i montaža polazne stanice žičare. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2021. godine.
- Ugovoreni rok za završetak radova na izgradnji žičare je 21.03.2022. godine. S obzirom na to da se napajanje kompletnog sistema žičare nije obezbijedilo do kraja avgusta 2021. godine, doći će do prolongiranja ugovorenog roka za izgradnju žičare.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 92.093,16€ za tekuće izdatke, odnosno 6.139.237,50€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 6.231.330,66€, od čega 2.443.430,66€ u 2021. godini.



• **Ski staze**

- Izrađeno je idejno rješenje ski staza uz žičaru na lokalitetu “Hajla i Štedim” u Rožajama. Obradivač idejnog rješenja je "Strucon" d.o.o. iz Sarajeva.
- Ministarstvo ekonomskog razvoj je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora, nakon što se stvore uslovi za to.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"**



- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
- U toku su aktivnosti na izradi idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva ekonomskog razvoja.

• **Elektroenergetska infrastruktura**

- Za izgradnju elektroenergetske infrastrukture Uprava javnih radova je u saradnji sa CEDISom i Opštinom Rožaje sprovedla aktivnosti na izradi tenderske dokumentacije za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za napajanje ski centra "Hajla" (izradila projektni zadatak i pribavila urbanističko-tehničke uslove), koja će se realizovati po principu "projektuj i izgradi". U prethodnom periodu komisija za pripremu tenderske dokumentacije je održala više radnih sastanaka, koji su za cilj imali izradu projektnog zadatka, definisanje tehničkih uslova i tehničkih specifikacija.
Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

1.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

- Realizacija projekta Ski centra na lokalitetu "Savin kuk" na Žabljaku planirana je fazno.
- Radi se o višegodišnjem projekatu. Planirana sredstva odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije, izgradnju cjevovoda od Modrog jezera do Savinog kuka, pravljenje

akumulacije za vještačko osniježavanje na skijalištu i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra.

- **Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ski staze dužine cca 1,5 km**

- Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi".
- U oktobru 2017. godine završena je izrada glavnog projekta.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnih ministarstava, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

- **Izgradnja žičare i 4 km staza**

- Planirana je izgradnja šestosjedne žičare i 4km ski staza, na lokaciji „Savin kuk" u opštini Žabljak. Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4587/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.07.2018. godine, na iznos od 8.788.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-3360/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2019. godine, na iznos od 12.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1817/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 54.208,00 €.
- Završena je izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i nabavka opreme.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 36.481,98€ za tekuće izdatke, odnosno 5.914.873,25€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 5.951.355,23€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-115 od 20.06.2019. godine, Uprava javnih radova obaviještena da se do donošenja finalnih preporuka UNESCO-a obustavlja izgradnja šestosjedne žičare i 4 km ski staza na lokalitetu „Savin kuk" u opštini Žabljak.
- Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 06.11.2020. godine, donešen je Zaključak o predlogu raskida ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Uprave javnih radova, kao naručioca i izvođača za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare i 4 km ski staza, na lokaciji „Savin kuk" u opštini Žabljak sa predlogom da se nabavljene instalacije žičare za potrebe skijališta „Savin kuk" iskoriste za spajanje ski centara u izgradnji „Žarski" i „Cmiljača", a u skladu sa zaključcima UNESCO misije, kojom su obustavljene sve dalje aktivnosti na realizaciji projekata za potrebe ovog ski centra. Istim Zaključkom zadužuje se Uprava javnih radova da pokrene proceduru sporazumnog raskida ugovora.
- Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 27.11.2020. godine, Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Uprave javnih radova, kao naručioca i izvođača, i ovlastila direktora Uprave javnih radova da potpiše predmetni sporazum. Nakon zaključivanja sporazuma, nabavljena oprema je od strane izvođača, posredstvom Uprave javnih radova, zapisnički predate "Skijalištima Crne Gore" d.o.o. Mojkovac na skladištenje i čuvanje.



- **Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice Usjek-Motički gaj, dužine cca 5km**
- U 2018. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je predata opštini u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radovi na rekonstrukciji puta su ugovoreni i sa istima će se otpočeti kada se za to stvore uslovi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8292/1 sa izvođačem, „Crnagoraput” a.d. Podgorica, je zaključen 28.10.2019. godine, na iznos od 1.799.297,81€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.07.2019. godine. Ugovor br. 01-8106/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 34.485,00€.
- Nakon što se stvore povoljni vremenski uslovi, izvođač će biti uveden u posao.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Žabljak.
- **Stabilizacija kosina na saobraćajnici prema Savinom kuku, Žabljak**



- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 28.08.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3430 sa izvođačem, „ARTEK” a.d. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 94.886,38€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.10.2019. godine. Ugovor br. 01-8373/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 4.235,00€.
 - Zbog usaglašavanja projektne dokumentacije, što je bila obaveza Opštine Žabljak, radovi su započeli krajem 2020. godine i ubrzo obustavljeni usljed nepovoljnih vremenskih prilika.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.548,20€ za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
 - Izvođenje radova će se nastaviti kada to dozvole vremenske prilike.
- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Suvog boba**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1309/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2017. godine, na iznos od 19.200,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 29.12.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-933/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.07.2017. godine, na iznos od 2.915,00€.
 - Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije su obustavljene.
 - Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnih ministarstava, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Elektroenergetska infrastruktura**
- U 2021. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće elektonergetske infrastrukture za ski centar, za koji je potrebno kompletirati projektni zadatak.
 - Nakon završetka projektne dokumentacije planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
 - Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog ministarstva, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

1.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Radi se o višegodišnjem projektu. Planirana sredstva odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

- **Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu**



- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine. Sa radovima II faze će se otpočeti nakon završetka dijela radova I faze koji se odnose na izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 275.165,76 € za tekuće izdatke, odnosno 1.423.999,21€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.219.102,91€, od čega 480.062,06 € u 2021. godini.

• **Pristupni put Bistrica - Manastir Podvrh**



- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7 km.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Radovi na ovom projektu se izvode u dvije faze i to I faza- zemljani radovi i potporne konstrukcija, dok su II fazom planirani radovi na polaganju elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.10.2019. godine. Ugovor br. 01-7895/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2019. godine, na iznos od 4.961,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8156/1 sa revidentom glavnog projekta, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 2.964,50€.

I faza – radovi

- U 2019. godini završeni su radovi I faze izgradnje puta koji su podrazumijevali izvođenje zemljanih radova, kao i radova na potpornim konstrukcijama. Vrijednost izvedenih radova iznosi 672.323,06€.

II faza – signalizacija

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 08.08.2019. godine. Ugovor br. 01-5921/1 sa obrađivačem projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. je zaključen 08.08.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7112/1 sa izvođačem, „Alfaprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.09.2019. godine, na iznos od 238.250,70€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.07.2019. godine. Ugovor br. 01-6470/1 sa stručnim nadzorom, „Ing impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 4.890,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izdata je upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.890,00€ za tekuće izdatke, odnosno 238.250,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 243.500,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

II faza – radovi

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4210/1 sa izvođačem, „Crnogoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2017. godine, na iznos od 2.579.858,13€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 24.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1932/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2018. godine, na iznos od 16.654,05€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača dodatnih radova je raspisano 21.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8028/1 sa izvođačem, „Crnogoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 379.997,75€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izdata je upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 13.645,05€ tekuće izdatke, odnosno 2.959.850,94€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.973.495,99€, od čega 428.480,16€ u 2021. godini.

Sanacija klizišta i kosina

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2243/1 sa izvođačem, „Crnogoraput” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 665.153,69€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2226/1 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izdata je upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.961,00€ tekuće izdatke, odnosno 665.153,60€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 670.114,60€, od čega 329.203,03€ u 2021. godini.

- **Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice**

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik je Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta ogleda se kroz: nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijedenim prilazima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predana Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
- Sa projektantom "Inter projekt" d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
Za postavljanje javne rasvjete duž trase puta naknadno je urađen projekat. Javna rasvjeta se nalazi u trotoarima, koji su sastavni dio projekta rekonstrukcije puta. Krajem 2020. godine, sprovedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova za izradu javne rasvjete, međutim, taj tender je oboren. Dana 14.09.2021. godine, pokrenuta je tenderska procedura za izbor izvođača radova na postavljanju javne rasvjete na potezima Lozna

Luka-Mirojevići i Mirojevići-Bistrica. Donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i nakon isteka zakonskog roka za žalbeni postupak, sa odabranim izvođačem radova će biti zaključen Ugovor o izvođenju.

- Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 77.780,00€ za tekuće izdatke, odnosno 2.511.045,32€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.588.825,32€, od čega 1.504.716,60€ u 2021. godini.



- **Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad "Vražjim firovima"**



- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
- Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- U toku je pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje.
- Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja je da u saradnji Opštinom Bijelom Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.
- **Elektroenergetska infrastruktura**
- Za potrebe elektro napajanja kompleksa "Đalovića pećine" ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica” do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh".

Adaptacija 35 kV vodne ćelije u TS "Nedakuse" 35/10 kV

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.06.2018. godine. Ugovor br. 01-3178/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 29.766,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4800 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950,00€.
- Svi radovi na adaptaciji čelije su završeni i izvršena je primopredaji objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.150,00€ za tekuće izdatke, odnosno 29.766,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 35.916,00€, od čega 32.716,00€ u 2021. godini.

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV

- Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
- Reviziju glavnog projekta odradio je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.
- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni u 2021.godini, u toku tehnički prijem objekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.827,25€ za tekuće izdatke, odnosno 1.147.225,66€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.178.052,91€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.



Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

- Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni tokom 2021. godine, i u toku je otklanjanje nedostataka po primjedbama komosije za tehnički prijem objekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 41,507,20€ za tekuće izdatke, odnosno 679.201,95€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 720.709,15€, od čega 164.431,42€ u 2021. godini.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV



- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave javnih radova. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni i u toku je otklanjanje nedostataka po primjedbama komisije za tehnički prijem objekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 7.960,00€ za tekuće izdatke, odnosno 311.607,47€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 319.567,47€, od čega 7.960,00€ u 2021. godini.

- **Žičara**

- Planirana je izgradnja i opremanje žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu "projektuj i izgradi".
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.
- Sprovedene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije.
- Završena je izgradnja pristupnih puteva, betoniranje i montiranje polazne, okretne stanice i stubova 1, 2, 3 i 8, betoniranje temelja stubova 4, 5 i 6, kao i isporuka opreme žičare.
- Izvođenje radova je nastavljeno, nakon što je gradilište bilo konzervirano u decembru 2020. godine. Izvode se radovi na transportu i montaži stuba 7, i izvođenje radova na montaži TS Žičara i priključnog kabla, radovi na uređenju terena oko polazne stanice (osim dijela radova koji se izvode nakon puštanja u rad žičare).
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 79.013,00€ za tekuće izdatke, odnosno 3.716.031,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 3.795.044,00€, od čega 386.232,00€ u 2021. godini.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.





• **Vodosnabdijevanje**

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbjediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018., na iznos od 34.848,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
- U toku je usaglašavanje rješenja snabdijevanja vodom objekata na polaznoj stanici žičare između projektanta i Opštine Bijelo Polje.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.454,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekata na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekata na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i nezavisni projekat.

• **Izgradnja objekta vizitiring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom**

- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za

prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „PermonTE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.
- Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2021. godine. Preostali su radovi na fasadi objekta i uređenju parking.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.325,96€ za tekuće izdatke, odnosno 708.802,89€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 719.128,85€, od čega 602.511,43€ u 2021. godini.
- Izvođač radova viziting centar je za potrebe završetka svojih ugovorenih obaveza, izveo radove na nasipanju materijala iz riječnog korita za popunjavanje lokacije viziting centra, što je bio predmet posebnog ugovora – izvođenje radova na regulaciji rijeke Bistrice.





- **Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.453,50€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Izvođač nije mogao započeti radove na preusmjeravanju toka rijeke Bistrice iz razloga što je usljed velikih padavina nivo rijeke narastao i time je odložen početak izvođenja radova.
- **Rekonstrukcija lokalnog puta Bistrica-Mojstir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima**
- Veza mosta sa lokalnim putem Bistrica-Mojstir planirana je izgradnjom pristupne saobraćajnice mostu na katastarskoj parceli br. 461/1 KO Bistrica, u dužini od oko 170m dok je veza sa putem Bistrica-Manastir Podvrh planirana izgradnjom saobraćajnice preko katastarske parcele br. 1/5/2, KO Kostenica, ukupne dužine oko 80m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-521 sa obrađivačem glavnog projekta, „Optimus projekt” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 15.888,51€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 14.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2715/1 sa revidentom glavnog projekta, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 4.410,45€.
- Završena izrada i revizija glavnog projekta.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.298,96€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

1.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Kaskade su definisane modulom za dvosmjerno parkiranje automobila na svakoj etaži. Ukupna površina objekta je cca 48.000 m², a površina I faze je cca 20.000m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01- 334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.
- Tokom izrade glavnog projekta došlo je do izmjene idejnog rješenja na inicijativu projektanta, a u cilju boljeg funkcionalnog rješenja objekta. Pribavljena je saglasnost od strane revidenta i Skijališta Crne Gore, kao krajnjeg korisnika, i zatim je izmijenjeno idejno rješenje upućeno investitoru na razmatranje, saglasnost i dalju proceduru pribavljanja mišljenja od strane glavnog državnog arhitekta. Nakon pribavljanja neophodne saglasnosti, nastavilo se sa izradom i revizijom glavnog projekta.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta iskopa temeljne jame I faze, izvršena je prijava građenja krajem 2020. godine i navedeni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 5.808,00€ za tekuće izdatke, odnosno 997.900,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.003.708,00€, od čega 8.340,65€ u 2021. godini.




1.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Projekat je višegodišnji. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na: raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekte: izrada replike prve štamparije na Balkanu - štamparije Crnojevića, izgradnja komunalne infrastrukture područja Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvata životinja sa CITES liste u Beranama, Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru, uređenje spomen parka "Knjaževac" u Andrijevi, Planinarski dom na lokalitetu "Štavna" Andrijevi, valorizacija kanjona "Nevidio".
- Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- **Izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru**



- Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo revidovani glavni projekat adaptacije objekta Arhiepiskopske palate.
- Spratnost: P+1, površina objekta je 135 m².
- Projektom dokumentacijom je bila predviđena adaptacija kompletne unutrašnjosti palate, koja obuhvata zamjenu svih drvenih elemenata od poda do plafona, uključujući ugradnju novog stepeništa, postavljanje kamenih ploča prilagođenih postojećoj arhitekturi, radove na elektro-instalacijama jake i slabe struje, kao i radove na opremanju enterijera.
- Radovi na opremanju enterijera su obuhvatili nabavku i ugradnju namjenskih staklenih vitrina za čuvanje eksponata, klupa za posjetioce, pulta i stolice za kustosa.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20- 1567 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 06.03.2020. godine, na iznos od 91.499,99€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01- 334/20-5588/1 sa stručnim nadzorom, „Enforma” d.o.o. Kotor, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 4.500,00€.
 - Sa radovima se otpočelo u septembru 2021. godine, a isti su završeni krajem decembra 2021. godine.
 - Na realizaciji projekta utrošeno je 1.350,00€ za tekuće izdatke, odnosno 91.492,46 € za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 95.992,46€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- **Centar za prihvatilište životinja sa CITES liste u Beranama**
 - Opština Berane sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, a finansiranje se vrši od strane Uprave javnih radova.
 - Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta, a na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Uređenje spomen parka „Knjaževac”**
 - Opština Andrijevica je za potrebe uređenja spomen parka „Knjaževac” izradila projektnu dokumentaciju za koju je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
 - Radovi na sanaciji parka obuhvataju adaptaciju trotoara u parku Knjaževac, platoa ispred crkve u parku, ograde oko parka, dječijeg igrališta i ugradnju mobilijara (igrališta, klupa i kanti za otpad).
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20- 1048/1 sa izvođačem, „Hiperling” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.02.2020. godine, na iznos od 343.647,26€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je sprovedeno po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-3314/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 10.285,00€.
 - Izvođač radova je uveden u posao u junu 2020. godine, ali su radovi bili privremeno obustavljeni usljed ometanja od strane građana.
 - Izvođač radova je ponovo uveden u posao nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Opštine Andrijevica, u novembru 2020. godine i izvođeni su do sredine decembra kada je gradilište konzervirano, usljed nepovoljnih vremenskih uslova.
 - Svi ugovoreni radovi završeni su u julu 2021. godine, kada je dostavljen i Konačan izvještaj nadzora i kada je objekat predat Opštini Andrijevica na upotrebu.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.285,00€ za tekuće izdatke, odnosno 318.940,50€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 329.225,50€, od čega 162.826,29€ u 2021. godini.

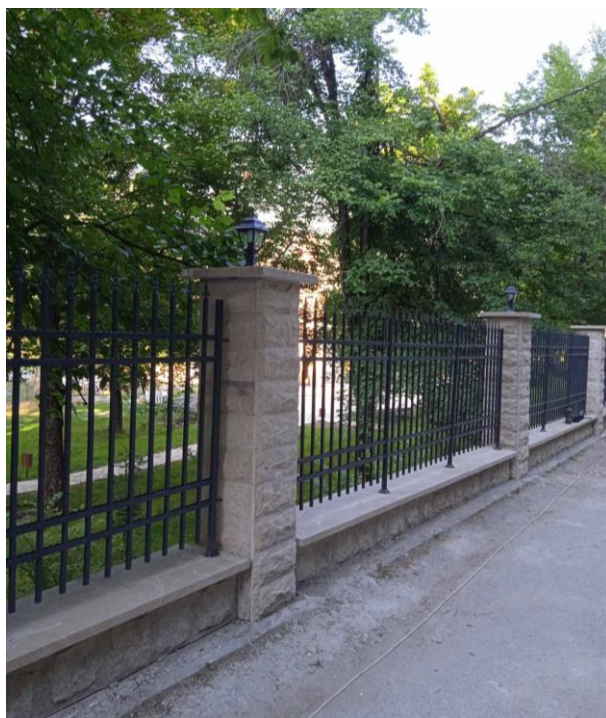

1.9. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00 €.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00 €.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata

rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
- U toku je otklanjanje nedostataka u projektnoj dokumentaciji po primjedbama revidenta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 53.215,00€ za tekuće izdatke, od čega 3.025,00€ u 2021. godini.

1.10. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin i Kolašin 40

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osniježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Obaveza Opštine Kolašin je da u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavi projektni zadatak na osnovu kojih će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora, nakon što se stvore uslovi za to.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

1.11. Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na: izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije.
- **Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski**
 - Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog

projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.
- U toku su pripremne aktivnosti na geodetskom snimanju terena i izrada varijantnog idejnog rješenja.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

1.12. Objekat nacionalne "Kuće " u Baru

- Lokacija objekta nacionalne "Kuće maslina" sa proizvodno-edukativnom namjenom nalazi se u Starom Baru, na kat. parceli br. 1075/2. Objekat je spratnosti Su+P+1 (suteran, prizemlje i sprat), ukupne bruto građevinske površine 1087,92 m². Objekat sadrži sljedeće sadržaje: prostor za proizvodnju maslinovog ulja, prostor za degustaciju i prodaju proizvoda i prostor za edukaciju i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 18.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-93/1 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 6.961,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3733/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2018. godine, na iznos od 2.750,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena 2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 05.07.2019. godine. Ugovor br. 01- 7456/1 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 994.134,76€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 7773/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 49.600,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje naknadnih radova je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01- 334/21-4166/1 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.08.2021. godine, na iznos od 48.942,73€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji objekta i uređenju terena, kao i opremanje objekta namještajem.
- U toku je tehnički pregled izvedenih radova u cilju pribavljanja upotrebne dozvole.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 49.600,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.036.100,13€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.085.700,13€, od čega 142.533,95€ u 2021. godini.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na produženje roka završetaka radova usljed situacije sa pojavom pandemije virusa COVID-19, kao i nedostacima u projektnoj dokumentaciji koji su za posljedicu imali izmjene glavnog projekta i pojavu nepredviđenih radova zbog čega je bilo raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača.



PROGRAM:

EKOLOGIJA I PRIRODA

2. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

2.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegro–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50 €.
- Do sada je završena izrada armirno-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za


izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.

- Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnih nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG“ AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021.godine na iznos od 14.904.394,84€.
- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.094.302,71 € za tekuće izdatke, odnosno 2.856.428,57 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 4.286.503,42€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021.godini.

2.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- Radi se o višegodišnjem projektu.-Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na: izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinskog polja, studije vodosnabdijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, PPOV u Andrijevići, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žablaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, Vranjini, Herceg Novom, sistem vodosnabdijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevića, Pljevlja, Gusinje i Šavnik, kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žablaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije, kao i izradu ostale dokumentacije.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- **Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu**
 - Dužina fekalne kanalizacione mreže iznosi 6 km.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
 - U toku je pribavljanje neophodnih saglasnosti za kompletiranje pozitivnog izvještaja revizije projektne dokumentacije.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.750,00€ za tekuće izdatke, od čega 11.600,00€ u 2021. godini.
- **Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu**
 - U 2017. godini Uprava javnih radova je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.

- Bivše Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Kolašin su kandidovali finansiranje projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja kroz IPA fond. Planirano je da se postrojenje gradi po principu "projektuj i izgradi" po pravilima Fidica, a kanalizaciona mreža na osnovu glavnog projekta za koji su u toku aktivnosti na pripremi projektnog zadatka. Nakon što projektni zadatak bude dostavljen, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava

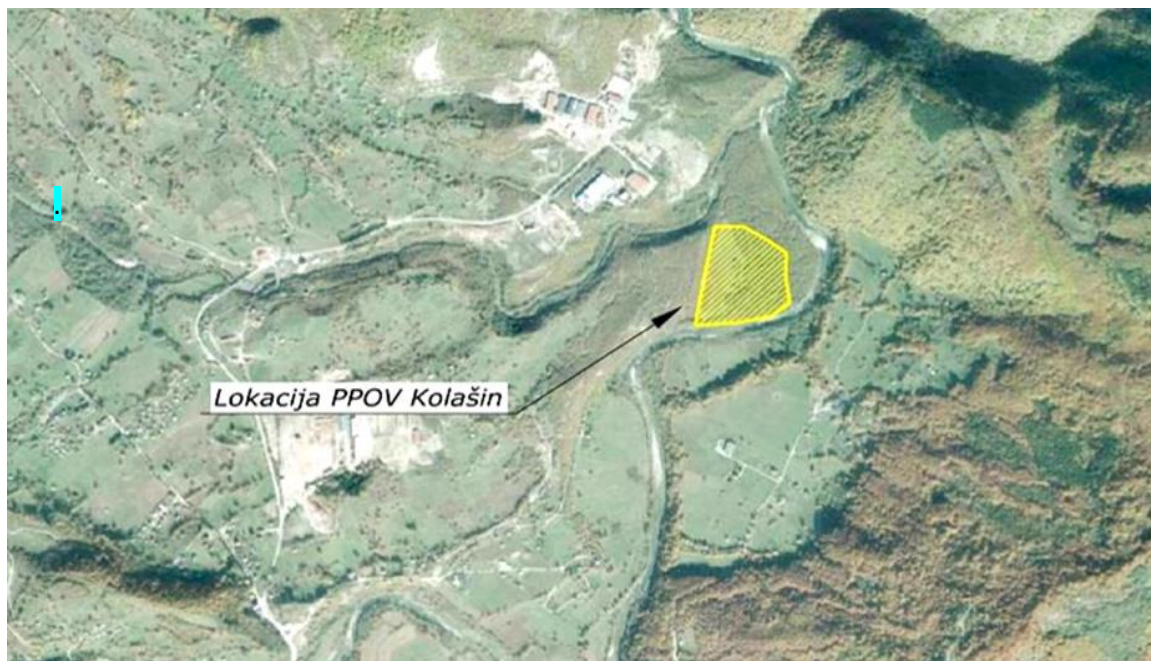

• **Izrada Studije vodosnabdijevanja opštine Bar**

- Planirana je izrada studija vodosnabdijevanja opštine Bar, a u skladu sa projektnim zadatkom dostavljenim Upravi javnih radova od strane Opštine Bar.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2955 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „E3” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 64.009,00€.
- Izrada studije je završena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 64.009,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Vodovod Šavnik**

- Predmetnim ugovorom obuhvaćeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže, izgradnji rezervoara, opremanje hidrostaniice i izrada pristupnog puta za rezervoar.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Šavnik.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1145 sa izvođačem, „Temko” d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.02.2020. godine, na iznos od 489.037,62€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2947 sa stručnim nadzorom, „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.05.2020. godine, na iznos od 10.769,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u 2021. godini.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.769,00€ za tekuće izdatke, odnosno 489.037,62€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 499.806,62€, od čega 315.135,17€ u 2021. godini.



• **Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu**

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, „Eurozox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije i izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje imovinsko -pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Vodovod Čosovsko vrelo u Rožajama**

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini Uprava javnih radova je izradila glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreni su i završeni radovi II faze, koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Čosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni.
- U 2017. godini izvođeni su radovi III faze na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, sve dok su to dozvaljali vremenski uslovi. U 2018. godini radovi III faze su završeni.
- Takođe, u 2018. godini ugovoreno je za izvođenje radova IV faze, čime bi realizacija ovog projekta biti kompletirana.
- Glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Projektant je „Hydrogis” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6367/1 sa izvođačem radova, „Indel-inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2018. godine, na iznos od 397.845,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 19.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8142/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos od 4.600,00 €.
- Svi ugovoreni radovi predviđeni IV fazom za MZ Klanac, MZ Ramoviće i MZ Sređani su završeni.
- U toku je priprema za ispitivanje mreže.
- Na realizaciji IV faze do sada je utrošeno 397.845,50 € za kapitalne izdatke, odnosno 4.600,00€ za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 402.245,00 € u 2019. godini, za IV fazu.
- Završni radovi su izvedeni u 2021. godini.
- Na realizaciji završne faze utrošeno je 1.966,30€ za tekuće izdatke, odnosno 50.543,29€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 52.506,59€ za završnu fazu, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na to da je obaveza Opštine Rožaje da obezbijedi priključak buster stanica na elektro naponsku mrežu.

- **Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima**

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
- Do sada su završeni radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su eralizovane po ovom ugovoru.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 77.360,00€ za tekuće izdatke, odnosno 278.950,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 356.310,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz instalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Do sada su završeni radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.146,00€ za tekuće izdatke, odnosno 271.939,54€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 275.085,54 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da se sa radovima na rekonstrukciji, po zahtjevu D00 “Vodovod” Pljevlja, započelo prije nego što su izvedeni radovi na izgradnji novog postrojenja, kako je bilo predviđeno projektnom dokumentacijom, usljed čega se javila potreba za izvođenjem nepredviđenih radova kako bi se sistem stavio u funkciju. Naime, izvođač radova je utvrdio, a stručni nadzor potvrdio da projektnom dokumentacijom nijesu obuhvaćene pozicije elektro ormara i frekventnih regulatora za zavojne pumpe. Projektom nije obuhvaćena šema, na koji način treba da pumpe budu frekventno regulisane u odnosu na parametre mutnoće. U toku je usaglašavanje predmjera i predračuna navedenih radova od strane krajnjeg korisnika, D00 “Vodovod” Pljevlja, izvođača radova i stručnog nadzora.
U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesti kako bi se sistem stavio u fukciju.
- Javno nadmetanje za nepredviđene radove raspisano je 16.12.2021. godine.

Procijenjena vrijednost nepredviđenih radova je 54.356,00€ sa PDV-om.

2.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na: izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: sanacija odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, transfer stanice u Andrijevići i reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- **Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu**



- Objekat je na lokaciji Marića luka u okviru radne zone bivšeg rudnika olova i cinka "Brskovo" u opštini Mojkovac. Ukupna površina lokacije iznosi 9.774,37 m². Predviđeni su sljedeći sadržaji: hala za tehnološku liniju reciklaže, upravna zgrada sa portirnicom, vaga i uređeni plato kao manipulativni prostor za saobraćaj kamiona, parking prostor i zaštitna ograda sa kapijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-541/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.02.2016. godine, na iznos od 32.963,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7682/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.12.2016. godine, na iznos od 1.804,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1829/1 sa izvođačem, "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 1.940.117,48€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-3140/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos 42.400,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u 2021. godini. U toku su aktivnosti na otklanjanje nedostataka po primjedbama korisnika i primopredaja radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 84.042,96€ za tekuće izdatke, odnosno 1.878.643,60€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.962.686,56€, od čega 126.801,77€ u 2021. godini.
- **Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane**



- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Tošković” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspekcijском organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava javnih radova je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković” pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava javnih radova navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlašćenog lica firme „Tošković” ima elemenata krivičnog djela prevare.
- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 19.970,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Transfer stanica u Andrijevici**

- Objekat transfer stanice u Andrijevici je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhiplan Crna Gora” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
- Završena je izgradnja pristupnog puta gradilištu.
- Do sada su izvođeni radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 36.732,20€ za tekuće izdatke, odnosno 229.502,80€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 266.235,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na kašnjenje izvođenja radova u odnosu na dostavljeni dinamički plan.
- U toku su aktivnosti na definisanju uslova za nastavka radova po zaključenom ugovoru.



• **Sanacija odlagališta Zakršnica**

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi javnih radova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 29.040,00€ za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 29.040,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- **Sanacija odlagališta u Plavu**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 12.10.2016. godine, vrijednost ugovora 250.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2021. godini završeni svi radova na objektu osim sadnje biljnog materijala, za koje se čeka vremenski period pogodan za sadnju biljaka.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 118.560,01 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 118.560,01 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

2.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik, kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žabljaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

- **Nabavka i ugradnja materijala i opreme za filter stanicu Sopot, opština Žabljak**

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.10.2020. godine. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora sprovodi Opština Žabljak.
- Izvođač će biti uveden u posao kada to dozvole vremenske prilike.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Kanalizaciona mreža na Vranjini**

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- U 2021. godini glavni projekat je upućen Glavnom gradu Podgorica na mišljenje, kao nosiocu prava svojine kojim je trasiran kolektor.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.705,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- **Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama**
 - Planirana je izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže opštine Rožaje, na osnovu projektnog zadatka koji je dostavljen Upravi javnih radova od strane Opštine Rožaje.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta je raspisano 27.12.2019. godine.
 - Ugovor br. 01-334/20-8155/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Aqua engineering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2020. godine, na iznos od 53.600,00€.
 - Ugovor br. 01-334/20-8788 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 23.10.2020. godine, na iznos od 6.231,50€.
 - Za završetak glavnog projekta, projektant čeka Projekat regulacije korita rijeke Ibar, čije ugovaranje je bila obaveza korisnika.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 25.190,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- **Izrada elaborate procjena uticaja na životnu sredinu - PPOV Rožaje**
 - Elaborat o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu izrađuje se za postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) industrijska zona Zeleni u Rožajama, prema tehničkom rješenju definisanom u studiji izvodljivosti, a u skladu sa projektnim zadatkom koji je Upravi javnih radova dostavila Opština Rožaje.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača Elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu je raspisano 20.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2703 sa obrađivačem Elaborata, „Medix” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2020. godine, na iznos od 10.890,00 €.
 - Izrada elaborata je završena i isti je preveden na engleski jezik.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.825,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- **Revizija "Izmijenjenog glavnog projekta fekalne kanalizacije i idejnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima"**
 - Ministarstvo ekologije, urbanizma i prostornog planiranja sprovodi aktivnosti na izradi glavnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima", dok je Uprava javnih radova 24.12.2021. godine raspisala javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta. U toku je procedura dostavljanaj ponuda.
 - Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kovačka dolina, opština Žabljak**
 - Dužina fekalne kanalizacije na lokaciji Kovačke doline u opštini Žabljak je 886 m.
 - Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je ponovo raspisano 06.06.2019. godine, nakon što je 2018. godine Državna komisija oborila odluku o izboru. Ugovor br. 01-6162/1 sa

izvođačem, "Temko" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 228.701,33 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 20.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7564/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2018, na iznos 3.630,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni krajem 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.267,00€ za tekuće izdatke, odnosno 226.338,73 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 229.968,73€, od čega 40.551,87 € u 2021. godini.
- **Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac**



- Dužina trase koja je ugovorena za izradu nedostajuće fekalne je 553,64 m.
- Ugovor br. 01-474211 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2011. godine, na iznos od 19.460,00 €.
- Ugovor br. 01-780 između revidenta glavnog projekta, „Projectman“ d.o.o Podgorica, i Opštine Mojkovac, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.210,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8029/1 sa izvođačem, "Konstruktor group" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 118.465,28 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor br. 01 – 334/20 – 522 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt " d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos 4.833,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni krajem 2020. godine.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.293,00€ za tekuće izdatke, odnosno 118.333,72€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 142.626,72€, od čega 49.495,68 € u 2021. godini.

• **Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik**

- U pitanju je linijski objekat sa sljedećim radovima: zemljani radovi, ugradnja kanalizacionih cijevi, izgradnja šahti i izvođenje priključaka na postojeće objekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.07.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-905/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2018. godine, na iznos od 7.140,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-156/1-1990/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 1.480,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6576/1 sa izvođačem, „Vukotić trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.09.2019. godine, iznos od 304 971,87€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6947/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2019. godine, na iznos od 7.450,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.070,00€ za tekuće izdatke, odnosno 283.276,62€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 299.346,62€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Andrijevice**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 738.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- U 2021. godini završeni svi radova na objektu osim sadnje biljnog materijla, za koje se čeka vremenski period pogodan za sadnju biljaka.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.428,44€ za tekuće izdatke, odnosno 355.775,28€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 358.203,72€, od čega 168.373,30€ u 2021. godini.

• **Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica**

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 450.075,00€. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- U 2021. godini završeni svi radova na objektu osim sadnje biljnog materijla, za koje se čeka vremenski period pogodan za sadnju biljaka.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.650,00€ za tekuće izdatke, odnosno 213.307,32 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 219.957,32 €, od čega 137.856,30 € u 2021. godini.

2.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, zaključen je Ugovor i Anex Ugovora između Uprave javnih radova i Opštine Pljevlja, na osnovu kojeg je Opština preuzela obaveze realizacije projekta za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 720.000,00 €, u 2020. godini, i to za:
 - Izradu i reviziju projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja;
 - Izradu i reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja Pljevalja od kapije Termoelektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima;
 - Eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje primarnog toplovoda;
 - Sprovođenje mjera energetske efikasnosti.
- Za izradu i reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja Pljevalja od kapije Termoelektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima, Elektroprivreda Crne Gore je oformila radnu grupu za praćenje realizacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Elektroprivrede CG, Opštine Pljevlja i Uprave javnih radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 20.000,00€ za tekuće izdatke, odnosno 523.020,37€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 543.020,37€, od čega 38.176,91€ u 2021. godini.

2.6. Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju infrastrukture za unapređenje postojeće mreže meteoroloških i hidroloških stanica i obuhvata IV faze.
- Tehničku dokumentaciju po kojoj se sprovode javna nadmetanja i izvode radovi obezbijedio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
- U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture I faze koja je obuhvatila 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica.
- U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture II faze koja je obuhvatila izgradnju 5 padavinskih i 5 hidroloških stanica, ugovoreni radovi za izvođenje radova III faze koja obuhvata 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica i raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za izvođenje radova IV faze, koja obuhvata rekonstrukciju meteoroloških stanica u četiri opštine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 24.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3673 sa izvođačem radova IV faze, „Hidro-građevinar“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 34.685,65€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 11.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4468/1 sa stručnim nadzorom IV faze, „Kov atelje “ d.o.o. Nikšić, je zaključen 17.06.2020. godine, na iznos od 1.815,00€.

- U 2020. godini završeni ugovoreni radova III faze i počelo izvođenje radova IV faze u toku su radovi IV faze.
- U 2021.godini završeni svi ugovoreni radova IV faze.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 17.803,10€ za tekuće izdatke, odnosno 227.974,91€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 245.778,00 €, od čega 15.167,35€ u 2021. godini.



2.7. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava javnih radova će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

3. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – sektor ODRŽIVI RAZVOJ

3.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.

- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- **Kanalizaciona mreža**
- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
- Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).



- **Unapređenje sistema vodosnabdijevanja**
- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, 4 objekta na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2017. godine, sa izvođačem radova “PNP Perošević” d.o.o. Berane, na iznos od 880.927,04 €, dok je ugovor za vršenje stručnog nadzora zaključen sa “Beohidro” Beograd, čiji iznos zajedno sa aneksima iznosi 78.750,00 €.
- Radovi su završeni i u decembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 73.993,97€ za tekuće izdatke.

3.2. Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru

- Projekat se realizovao po principu „projektuj i izgradi“ kroz dva ugovora: Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.“ iz Grčke i Ugovor o reviziji Glavnog projekta i nadzoru nad izvođenjem radova sa firmom „INGOB“ iz Austije. Ukupna ugovorena vrijednost za realizaciju ovog projekta iznosila je 3.817.896€.
- Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom „Mesogeos S.A.“ iz Grčke je raskinut 07.11.2018. godine.

- Uprava javnih radova je dokumentaciju vezanu za raskid ugovora i izdate garancije prosljedila Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore u cilju pokretanja sudskog spora, u smislu čl. 53 Zakona o državnoj imovini.
- U cilju nastavka i završetka radova, u okviru projekta „Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija“ angažovana je firma „COWI A/S“ iz Danske koja će u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije, a u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, pripremiti dokumentaciju do faze implementacije.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 635,25€ za tekuće izdatke.

3.3. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S“, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€.
- Rok realizacije projekta je 36 mjeseci.
- Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 646.800,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

3.4. Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i odnosi se na upravljanje otpadom iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Cilj ovog projekta je da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ostalih korisnika za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.354.000,00€.
- Prva tenderska procedura je poništena početkom 2020. godine, čime je projekat pri ponovnom raspisivanju već bio pod visokim rizikom ugovaranja. Nakon ponovnog raspisivanja, tenderska dokumentacija je poslata odabranim ponuđačima 18.09.2020.

godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 10.11.2020. godine. Delegacija Evropske Unije je odbila izvještaj rada komisije dostavljen 11.12.2020. godine uz obrazloženje da kako je rok ugovaranja projekta 21.12.2020. godine, nije bilo vremena izvršiti kontrolu izvještaja obzirom i da je nakon odobravanja izvještaja do potpisivanja ugovora morao da istekne period žalbe u trajanju od 7-10 dana.

- Tender je poništen 26. marta 2021. godine.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

3.5. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
- Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.
- Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
- Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
- Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.562.784,98€, od čega 904.969,53€ za kapitalne izdatke u 2021. godini.

3.6. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i odnosi se na oblast zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Svrha ovog ugovora je da podrži proces transpozicije i razvija institucionalni kapacitet za strateško planiranje, sprovođenje pravnih regulativa u oblasti životne sredine, u skladu sa akcionim planom o životnoj sredini i klimatskim akcijama 2018. - 2020. godina.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 3.671.412,00€.
- U toku je procedura poništenja tenderske procedure obzirom da je EU Delegacija dva puta poništila Evaluacioni izvještaj zbog nepravilnosti u radu glasajućih članova Evaluacione komisije pri čemu je u međuvremenu istekla i validnost ponuda ponuđača.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

3.7. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
- Opšti cilj projekta je nabavka opreme kojom se obezbjeđuje podrška Crnoj Gori u cilju efikasnog sprovođenja i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine.
- Inicijalna procijenjena vrijednost ugovora iznosila je 1.085.000,00€, međutim, nakon Odluke Vlade Crne Gore o preusmjeravanju sredstava za borbu protiv epidemije virusa COVID-19, iz predmeta nabavke izuzeta je nabavka broda sa opremom, tako da je planirani budžet za nabavku opreme 650.000,00€.
- Inicijalno je raspisano javno nadmetanje za 15 partija od kojih su tokom tenderskog procesa poništene 4 partije usljed slabog kvaliteta tehničkih specifikacija za čiju izradu su bili zaduženi korisnici zajedno sa konsultantom (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat evaluacije potpisana su dva ugovora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10414 za LOT3 sa ponuđačem „MEGRA” d.o.o. Beograd, je zaključen 21.10.2020. godine, na iznos od 53.845,00€.
- Ugovor je realizovan u aprilu 2021. godine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10416 za LOT6 sa ponuđačem „UNI-CHEM” d.o.o. Beograd, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 19.740,00€.
- Ugovor je realizovan u maju 2021. godine.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 73.845,75€ za kapitalne izdatke.

3.8. Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom



- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Poziv za najavu tendera objavljen je 23.03.2020. godine, a projekat čine dvije partije, i to: Partija 1 - Kontejneri za komunalni otpad i Partija 2 – Vertikalne mašine za presovanje otpada.

- U okviru projekta potpisani su ugovori za obje partije 21.12.2020. godine u vrijednosti 430.367,85€.
- Realizacija ugovora je završena u decembru 2021. godine i izvršen je prenos vlasništva na krajnje korisnike projekta.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 431.294,09€ za kapitalne izdatke.

3.9. Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke

- Predmet tendera je snabdijevanje, isporuka, istovar, instalacije, raspakivanja, montaže i ugradnje IT opreme i softvera za sva tri Lot-a paketa, kao i testiranje IT opreme i softvera uz pružanje tehničke podrške i obuke krajnjim primaocima u Crnoj Gori.
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisani su ugovori za sve raspisane partije.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10751 za LOT1 „IT oprema i uređaji za horizontalnu podršku za praćenje životne sredine: Kontrola pristupa serverima-mrežnom zaštitnom zidu“ sa ponuđačem „SAGA CG“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 123.217,98€.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10753 za LOT2 „Nabavka uređaja za radnu stanicu: Računar i monitor“ sa ponuđačem „InfoCore“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 31.914,00€.
- Nabavljena je IT hardverska oprema i softveri za kvalitet vazduha za potrebe Instituta za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u vrijednosti od 62.100,00€, kao i 18 računara i monitora za Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, čija je vrijednost 31.940,00€.
- Projektom je obuhvaćena i IT oprema i uređaji za podršku monitoringa životne sredine, u vrijednosti od 123.217,98€, koje će koristiti Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/-01-908/20-10752 za LOT3 „Nabavka IT hardverske opreme i softvera za modelovanje kvaliteta vazduha“ sa ponuđačem „Čikom“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 62.100,00€.
- Ugovor je realizovan u aprilu 2021. godine.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 217.231,98€ za kapitalne izdatke.

3.10. Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu

- Predmet tendera je snabdijevanje, isporuka, istovar, ugradnja, naručivanje, od strane izvođača opreme u 5 (pet) Lot-ova za institucije Civilne zaštite u Crnoj Gori DDP.
- Nakon pristiglih ponuda, Evaluciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisani su ugovori za 3 od 5 raspisanih partija.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10659 za LOT1 „Nabavka 4 x 4 vozila“ sa ponuđačem „Alliance“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 104.940,00€.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10660 za LOT2 „Nabavka kombija“ sa ponuđačem „Alliance“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 42.920,00€.
- Ugovor je realizovan u martu 2021. godine.

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SUP/01-908/20-10661 za LOT4 „Nabavka drona“ sa ponuđačem „Damiba“ d.o.o. Beograd, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 5.790,00€.
- Ugovor je realizovan u aprilu 2021. godine.
- Za Lot 3 „Nabavku opreme za spašavanje od zemljotresa“ i i Lot5 „Nabavku detektora za pronalaženje preživjelih ispod ruševina“ prijavljene kompanije nijesu ispunile eliminacione kriterijume.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 153.696,00€ za kapitalne izdatke.

3.11. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave javnih radova vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
- Avansna uplata koja je bila predviđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
- Od strane korisnika grantova realizovan je veći broj aktivnosti koji je bio predviđen akcijama, međutim, korisnik grantu Brdo Gorica udruženje čiji je kraj implementacije bio predviđen za početak februara 2022. godine je podnio zahtjev za produženje implementacionog perioda. To je zahtijevano iz razloga što određene aktivnosti nijesu mogle biti realizovane zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 585.131,01€ za tekuće izdatke.

PROGRAM:

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA

4.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
- U toku je revizija projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nemogućnost da se korisnik i projektant usaglase oko načina rješavanja rekonstrukcije energetskeg bloka trafostanice i pomoćnog izvora napajanja. Naime, kako je u pitanju Klinički centar Crne Gore potrebno je obezbijediti neprekidno napajanje električnom energijom. Nakon prilagođavanja odgovora i jedne i druge strane, izrađeno je prihvatljivo tehničko rješenje.

4.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici

- Adaptacijom objekata planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-970/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 26.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidentom glavnog projekta je raspisano 01.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8834/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.12.2018. godine, na iznos od 6.240,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4658 sa izvođačem, "IGP Fidiya" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.06.2020. godine, na iznos od 995.797,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-8517/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2020. godine, na iznos od 23.534,5€.
- Završeni su radovi izradi cementne košuljice i izolacije podova, malterisanju zidova, izradi pregradnih gips-kartonskih zidova kao i radovi na razvodu elektro, termotehničkih i sprinkler instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Završetak adaptacije objekata je uslovljen ugovaranjem dodatnih radova zbog potrebe za sanacijom krovnog pokrivača za objekat Doma zdravlja "Nova Varoš" i naknadnih

zahtjeva korisnika za izmjenom računarske opreme, kao i zbog ostalih radova neohodnih za stavljanjem objekata u funkciju.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje dodatnih radova je raspisano 26.08.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6616/1 sa izvođačem, "Grand design" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.12.2021. godine, na iznos od 76.373,99€.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 51.332,25€ za tekuće izdatke, odnosno 853.260,94€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 904.593,19€ od čega 761.159,58 € u 2021. godini.



4.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja je krajem juna 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Nakon usvajanja Zakona o budžetu za 2022. godine, po kojem su opredijeljena finansijska sredstva za početak izgradnje, javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora je raspisano 31.12.2021. godine.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.



4.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Ćuković" Risan

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Krajem 2021 .godine je raspisano javno nadmetanje za odabir izvođača radova i vršioca stručnog nadzora i isto je u toku.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

4.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

4.6. Dom zdravlja u City kvartu Podgorica

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

4.7. Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

5. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR ZDRAVSTVO
--

5.1. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Procijenjena vrijednost radova iznosi 6.812.010,00€.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra. Obaveza Korisnika (Ministarstvo zdravlja) bila je da uskladi glavni projekat sa trenutnim zakonom, jer je glavni projekat urađen u skladu sa prethodnim.
- Nakon ispunjenja gore navedih obaveza pristupilo se pripremi tenderske dokumentacije.
- Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa CFCU vodilo proces ugovaranja eksperta za pripremu tenderske dokumentacije.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex ante kontrolu i ista je u fazi odobrenja.
- Nakon odobrenja tenderske dokumentacije od strane EU Delegacije, pristupiće se raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Procijenjena vrijednost vršenja usluge stručnog nadzora iznosi 350.000,00€.
- Uprava javnih radova je preuzela inicijativu i pripremila najavu za tendersku proceduru za vršenje stručnog nadzora. Nakon odobrenja iste od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine. Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM:

UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

**6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA
ZA POTREBE PRAVOSUĐA I PALATE PRAVDE**

6.1. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde

- Radi se o višegodišnjem projekatu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju, Baru kao i jedinstvenom sistemu pravosuđa / IKT-u.
- Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju. Takođe, projekat Palata pravde finansiraće se iz kreditnih sredstava.

• Osnovni sud u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-326/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• Osnovni sud u Nikšiću

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-324/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• Osnovni sud u Kotoru

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Kotoru raspisano je 19.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-1379/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.03.2019. godine, na iznos od 4.980,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.980,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Osnovni sud u Beranama**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3283/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interforma" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.053,50€.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.053,50€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Osnovni sud u Bijelom Polju**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3284/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interformom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.549,60 €.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.549,60€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• **Vrhovni sud u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača za izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije je raspisano 26.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za izradu projekta postojećeg stanja objekta. Ugovor br. 01-1260/1 sa obrađivačem elaborata geodetskog snimanja lokacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.02.2019. godine, na iznos od 2.299,00€.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta. Obaveza Vrhovnog suda i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi glavnog projekta.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.299,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- **Objekat Palate pravde**
- Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, kao i saglasnost glavnog državnog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa, u koliko je projekat predmet donacije, nakon čega će Uprava javnih radova raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo uroška sredstava.

6.2. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac

- **Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu**



- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520m², uz dodatnih 1135m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.

- Konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja je sproveo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine. Ugovor br. 01-8439/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing-invest“ d.o.o., Danilovgrad, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 86.817,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-523 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-impuls“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 8.954,00 €.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije objekata kompleksa.
- U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izmiještanje dalekovoda i izgradnju nove trafostanice u okviru kompleksa.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 100.157,75€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- **Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac**
- U skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, Ministarstvo pravde sprovodi aktivnosti na izradi projekta “Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac”. Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.
- Uprava javnih radova je u skladu sa svojim nadležnostima, sprovela procedure javnih nabavki, zaključila i realizovala ugovore za izradu i reviziju geodetskih i geotehničkih podloga za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora u sjevernoj regiji – Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 29.12.2021. godine.
- Javna nadmetanja za izradu i reviziju glavnog projekta regulacije dijela korita rijeke Tare u dužini od cca 800m’ su raspisana 29.12.2021. godine.
- U toku su procedure dostavljanja ponuda.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.200,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

6.3. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija

- Objava tendera bila je 09.06.2021. godine, a krajnji rok za dostavljanje aplikacija 09.07.2021. nakon uspješno završene I faze evaluacionog procesa, objavljena je tenderska dokumentacija sa krajnjim rokom za dostavljanje ponuda do 24.12.2021. godine, nakon čega se otpočelo sa evaluacijom i vrednovanjem pristiglih ponuda. Nakon završetka evaluacionog procesa, pristupiće se potpisivanju ugovora sa odabranim ponuđačem koji je u obavezi da izradi tendersku dokumentaciju za radove za sve projekte za potrebe pravosuđa.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

7. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR PRAVOSUĐE
--

7.1. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrt projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava javnih radova u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.650.000,00 € (za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju).
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 46.146,10€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

PROGRAM:

**UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

8. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR JAVNE BEZBIJEDNOSTI I ODBRANE
--

8.1. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite

- **Rekonstrukcija bivšeg pograničnog punkta Božaj**
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 872.000,00€.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi projektnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti. Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Radovi obuhvataju rekonstrukciju migracionog centra koji će biti rekonstruisan na način da će migrantima biti pružena sva neophodna pomoć u skladu sa međunarodnim standardima.
- U toku je revizija glavnog projekta.

PROGRAM:

JAVNA BEZBIJEDNOST

9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI
--

9.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suterren, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaji:
 - u suterenu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
 - u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
 - na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
 - u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
 - na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će se stvoriti uslovi za završetak radova I faze i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze koja će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.617,60€ za tekuće izdatke, odnosno 238.898,37€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 242.515,97€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.



9.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00€.
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02€).
- Na realizaciji objekta magacina do sada realizovano 8.307,00€ za tekuće izdatke, odnosno 759.950,20 € za kapitalne izdatke. Ukupno je realizovano 768.257,20 € od čega 388.752,06€ u 2020. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupaku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-

8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00€.

- Ugovoreni radovi obuhvataju rušenje postojećih i izgradnju preostalih novih objekata smještajnog kompleksa SAJ i PJP na Zlatici (administrativno smještajni objekti, sportski objekat, objekat za dresuru pasa, garaže i drugi sadržaji).
- U toku su završni zanatski radovi i ugradnja rasvjete u administrativno smještajnom objektu „B”, izrada fasade i podopolagački radovi u administrativno-smještajnom objektu „A”, završni zanatski radovi u sportskom objektu, ugradnja rasvjete u objektu za dresuru pasa, kao i radovi na uređenju slobodnih površina u okviru kompleksa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4140/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.08.2021. godine na iznos od 976.504,29€.
- Na realizaciji projekta je do sada je utrošeno 358.235,82€ za tekuće izdatke, odnosno 5.998.116,51€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 6.356.352,33€, od čega 2.021.582,83€ u 2021. godini.
- Prilikom izvođenja zemljanih radova na sportskom objektu, izvođač je utvrdio prisustvo visokonaponskih kablova koje je trebalo izmjestiti kako bi se nastavili radovi. Takođe, usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, na dijelu projektovane ograde obustavljena je izgradnja same ograde. Na lokaciji predviđenoj za izgradnju administrativno-smještajnog objekta „A”, postojeći objekat koji je predviđen za rušenje je oslobođen od ljudi i stvari od strane korisnika u avgustu 2020. godine, što za posljedicu ima prolongiranje ukupnog roka završetka radova.
- Do pojave nepredviđenih radova došlo je usljed nedostataka u projektnoj dokumentaciji koji se odnose na neusaglašenost predmjera i predračuna radova i grafičkih priloga što za posljedicu ima i značajnije povećanje količina pojedinih pozicija radova, koje je neophodno izvesti kako bi se kompleks stavio u funkciju. Otvorenom javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, oграда oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.





PROGRAM:

FUNKCIONISANJE MINISTARTSVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

**10. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA
ZA POTREBE ODBRANE**

10.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

- **Rekonstrukcija kompleksa kasarna "Masline" za potrebe Vojske Crne Gore**
- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane. Planirano je da se rekonstrukcija kompleksa odvija fazno.
- Ministarstvo odbrane je kroz prvu fazu realizacije obihvatilo rekonstrukciju dva postojeća objekta i to objekte KN18 i KN19 za potrebe logističkog bataljona i vojne policije.
- Ministarstvo odbrane je zaključilo ugovor sa izvođačem radova "Bemax" d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 2.970.291,19 € i sa vršiocem stručnog nadzora "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, vrijednosti 84.700,00 €.
- U 2020.godini su završeni svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji objekata KN18 i KN19.
- Druga faza realizacije obuhvata rekonstrukciju dva postojeća objekta KN 20 i KN 21 i za iste je krajem 2020. godine Ministarstvo odbrane zaključilo ugovore sa izvođačem radova "Bemax" d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 3.326.755,54€, kao i sa vršiocem stručnog nadzora "Sedam -ing" d.o.o. Podgorica, vrijednosti 103.500,00€.
- Radovi na realizaciji objekta KN 20 i KN 21 završeni su krajem 2021. godine i u toku su aktivnosti na tehničkom pregledu objekata.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 187.165,00€ za tekuće izdatke, odnosno 5.963.172,26 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 6.150.337,26 € od čega 3.229.540,65€ u 2021. godini.

PROGRAM:

SOCIJALNA ZAŠTITA

11. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

11.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

- Dom starih nalazi se na urbanističkoj parceli br. 33, u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Konik - Stari Aerodrom III" u Podgorica. Ukupna bruto površina objekta iznosi 11.225 m².
- Objekat je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata. Predviđen je za boravak 270 korisnika smještenih u: 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana.
- Pored smještajnih jedinica objekat sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, medicinski blok i prateće tehničke prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1- 3108/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2017. godine, na iznos od 8.787.071,48€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača na ugradnji liftova je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9982/1 sa izvođačem na ugradnji liftova, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2019. godine, na iznos od 329.308,71€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5270/1 sa stručnim nadzorom, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 18.12.2017. godine, na iznos od 119.836,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje nepredviđenih radova raspisano je 20.08.2020.godine. Ugovor br. 01-334/20-8275/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 399.515,05€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji objekta i uređenju terena, kao i opremanje objekta namještajem.
- U toku je tehnički pregled izvedenih radova u cilju pribavljanja upotrebne dozvole.
- 15.12.2021. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova koji su po mišljenju komisije za tehnički pregled neophodni u cilju otklanjanja uočenih nedostataka i nepravilnosti.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 111.447,48€ za tekuće izdatke, odnosno 9.365.279,02€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 9.476.726,50€, od čega 328.267,30€ u 2021. godini.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na produženje roka završetaka radova usljed situacije sa pojavom pandemije virusa COVID-19, nedostacima u projektnoj dokumentaciji koji su za posljedicu imali izmjene glavnog projekta i pojavu nepredviđenih radova zbog čega je bilo raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača.





11.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću





- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Dom starih je obuhvaćen PUPom opštine Nikšić – GUR, i nalazi se na katastarskoj parceli br. 4521/1 KO Nikšić.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti.
- Novoprojektovani smještajni objekti su spratnosti podrum, prizemlje, sprat i mansard (Po+P+1+M). Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Zaključkom Vlade Crne Gore od 20.02.2014. godine, broj: 08-282/3, zadužena je Agencija za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić, da sprovede aktivnosti na izradi projektne i planske dokumentacije za potrebe Regionalnog stambenog programa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine.
- Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
- Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
- Na objektu su završeni svi radovi osim radova koji su uslovljeni priključenjem kompleksa na elektroenergetsku infrastrukturu. Nakon izgradnje trafostanice I priključenja kompleksa izvošač radova će nastaviti sa funkcionalnim probama I preostalim sitnim popravkama na objektu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 57.339,72€ za tekuće izdatke, odnosno 2.500.500,33€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.557.840,05€, od čega 1.142.858,99 € u 2021. godini.

- Tokom izvođenja radova nadzorna služba je uočila određene nedostatke i propuste u projektu, što je očekivano s obzirom na to da se radi o rekonstrukciji starih i dotrajalih objekata i projektant nije u mogućnosti da tokom izrade projektne dokumentacije sagleda obim svih potrebnih radova. Uočeni nedostaci ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao i na promjenu fasada objekta, ali utiču na stabilnost i funkcionalnost objekta. Uočeni nedostaci za posljedicu imaju pojavu viškova i nepredviđenih radova.

PROGRAM:

INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

12. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

Uprava javnih radova je sa Prijestonicom Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

12.1. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani

- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

12.2. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 110.153,36 €.

12.3. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

12.4. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 200.180,74€.

12.5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 284.359,01€.

12.6. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 84.307,86€.

12.7. Adaptacija prostora u d.o.o. Sportski centar Cetinje

- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu

12.8. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 1.102.119,92€.

12.9. Obezbjedivanje prostora , seljenje i opremanje RTV Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 12.934,30€.

12.10. Unapređenje gradski, lokalnih i nekategorisanih puteva

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 950.000,00€.

12.11. Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 216.234,33€.



12.12. Rekonstrukciju, adaptaciju dječijeg objekta bolničkog kompleksa JZU Danilo I - objekata stare dječije bolnice i nekadašnji objekat bolnice Danilo I

- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

12.13. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave javnih radova. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.

- Do sada su završeni zemljani radovi na izgradnji tribina i završni radovi na izradi armirano betonske i čelične konstrukcije objekta, izrada armirano betonskih konstrukcija na uređenju terena, izrada kamene fasade, zatvaranje objekta fasadnom bravarijom kao i grubi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije.
- U toku su završni radovi u objektu i aktivnosti na nabavci liftova. Izvođač će nakon završetka zimskog perioda povećati aktivnosti na radovima koji se tiču spoljnog uređenja i pripreme podloge terena za igru.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno budžetskih 132.946,80€ za tekuće izdatke, odnosno 2.952.388,33€ za kapitalne izdatke. U dosadašnjoj realizaciji FSCG je učestvovao u finasiranju iznosa od 2.238.000€.
- Ukupno je realizovano budžetskih sredstava 3.052.098,43€, od čega 1.679.736,20€ u 2021. godini .
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih i viškova radova. U toku je usaglašavanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.

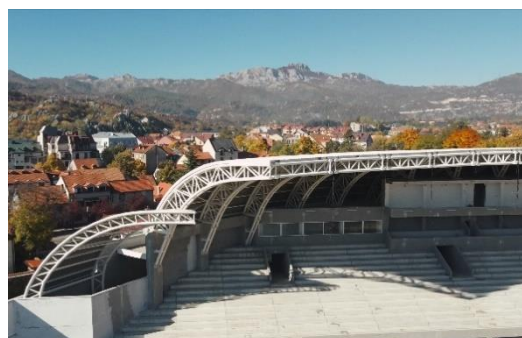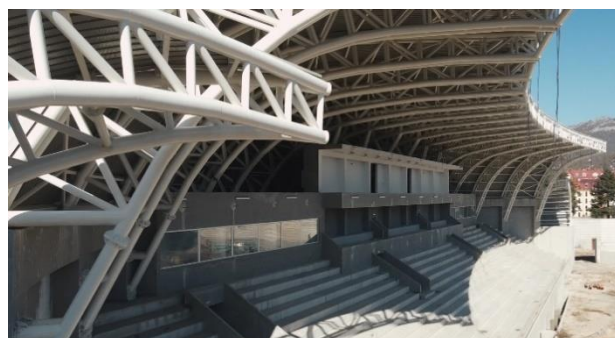

12.14. Izgradnja svlačionica i adaptacija pomoćnog fudbalskog terena na Obilića poljani

- Na realizaciji ovog projekta u 2021. godini utrošeno je 145.031,43€.

PROGRAM:

UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

13. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTO-PUTA BAR-BOLJARE

- Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o auto-putu donijela Odluku o imenovanju državne komisije za tehnički pregled autoputa. U skladu sa Odlukom, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori koji se realizuju u kontinuitetu.

14. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA

14.1. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici Kos-Trebešica

- Projekat se finansira iz sredstava IPA II-Nacionalni program 2014. i nacionalnog budžeta.
- Projektom je predviđena rekonstrukcija pruge od stanica Kos do stanica Trebešica u dužini cca 6,75km. Rekonstrukcija obuhvata zamjenu zastorne prizme, drvenih pragova, šina i kontaktne mreže. Na ovoj sekciji postoji 7 mostova ukupne dužine 476m i 12 tunela ukupne dužine 4.372m.
- Nakon završenih procedura javnih nabavki u decembru 2018. godine potpisani su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom nad izvođenjem radova. Ugovor sa izvođačem radova, "Štabag" Austrija, zaključen je na iznos od 5.379.205,22€, dok je sa stručnim nadzorom, "Institut za građevinarstvo" d.o.o. Podgorica, zaključen na iznos od 237.295,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu, odnosno 13.01.2020. godine je izdat nalog o primopredaji.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 47.238,51€ za tekuće izdatke.

14.2. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”. Projekat je finansiran 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Ugovor br. 19/2-01-6074/1 sa izvođačem, „Simens” d.o.o. Beograd, je zaključen 03.12.2015. godine, na iznos od 3.408.897,93€.
- Ugovor br. 19/2-01-1679/1 sa stručnim nadzorom, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.04.2016. godine, na iznos od 145.000,00€. Nakon Anexa vrijednost ugovora je 72.499,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta, i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine.
Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme su završeni, čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U skladu sa FIDIC procedurama krajem 2018. godine izdat je „taking-over” sertifikat. Nakon što je korisnik ŽICG sproveo proceduru nabavke i ugradnje elektro-ormara nastavljena je procedura tehničkog prijema i objekat predat na korišćenje.
- U 2020. godini pribavljena je upotrebna dozvola.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 21.749,90€ za tekuće izdatke.

14.3. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju



- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalinih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT 1-: Maintenance and Revitalization of Existing and Installation of New Marine Lights; LOT2- Supply of Equipment for Vessel Traffic Monitoring Information System (VTMIS)-phase II.
Tender za LOT1 nije nagrađen, kako nije bilo zadovoljavajućih ponuda.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2-ELMAN SRL iz Italije. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 sa izvršiocom zaključen je 13.12.2021. godine, na iznos od 1.425.000,00€.
- Commencement order (zvaničan datum početka implementacije projekta) je izdat 08.02.2022.godine. Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja commencement ordera.

- U toku su početne aktivnosti na implementaciji ugovora.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

VTMIS

- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT1-: Maintenance and Revitalization of Existing and Installation of New Marine Lights; LOT2- Supply of Equipment for Vessel Traffic Monitoring Information System (VTMIS)-phase II. Tender za LOT1 nije nagrađen, kako nije bilo zadovoljavajućih ponuda.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2-ELMAN SRL iz Italije.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 sa izvršiocom potpisan je 13.12.2021. godine. Vrijednost ugovora je 1.425.000,00€.
- Commencement order (zvaničan datum početka implementacije projekta) je izdat 08.02.2022. godine. Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja commencement ordera.
- U toku su početne aktivnosti na implementaciji ugovora.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

14.4. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 sa ugovaračem, „Excelor Holding Group” je zaključen 30.11.2021. godine, na iznos od 941.474,00 €, sa rokom implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
- U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU. Oprema se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

14.5. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPA II/CAP17/SER/01-8132/1 sa obrađivačem projekta, „B&S Europe”, je zaključen 20.11.2019. godine, na iznos od 3.659.900,00€.
- Rok realizacije projekta je 48 mjeseci.
- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.816.175,13€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godine.

14.6. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja.
- Ugovor sa odabranim ponuđačem je potpisan 15.10.2021. godine, a ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.981.040,00€.
- Nalog za početak realizacije Ugovora je izdat 05.11.2021. godine.
- U toku je implementacija Ugovora.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

14.7. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju



- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.

- Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
- Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/BPMD/SER/7830/1 sa obrađivačem glavnog projekta i stručnim nadzorom, „URBI.PRO” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00€.
- Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
- Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020. godine.
- Addendum br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00€, a period implementacije projekta je produžen na 36 mjeseci.
- Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.
- Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekta. Nakon toga, „URBI.PRO” d.o.o. pristupa izradi glavnog projekta koji je dostavljen 02.06.2021. godine. Time je implementacija prve faze ugovora završena.
- Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i same evaluacije ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Administrativna naredba za početak 2 faze ugovora upućena je 13.08.2021. godine. Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice. Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAI/BPMD/01-908/21-5514/1 sa izvođačem radova „IGP FIDIJA”, je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 79.805,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SER/01-908/21-2171 sa revidentom, „ENTASIS” d.o.o., je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
- Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 10.000,00€ za tekuće izdatke. Ukupno je realizovano 10.000,00€, od čega 10.000,00€ u 2021. godini.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 sa izvođačem radova „IGP FIDIJA”, je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Izvođač je 18.02.2022. uveden u posao a realizacija projekta je 12 mjeseci.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utrošenih sredstava.

14.8. Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika


- Završena izrada i revizija projektne dokumentacije krajem 2021. godine.
- Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 190.000,00€.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM:

**UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA**

15. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE
--

15.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

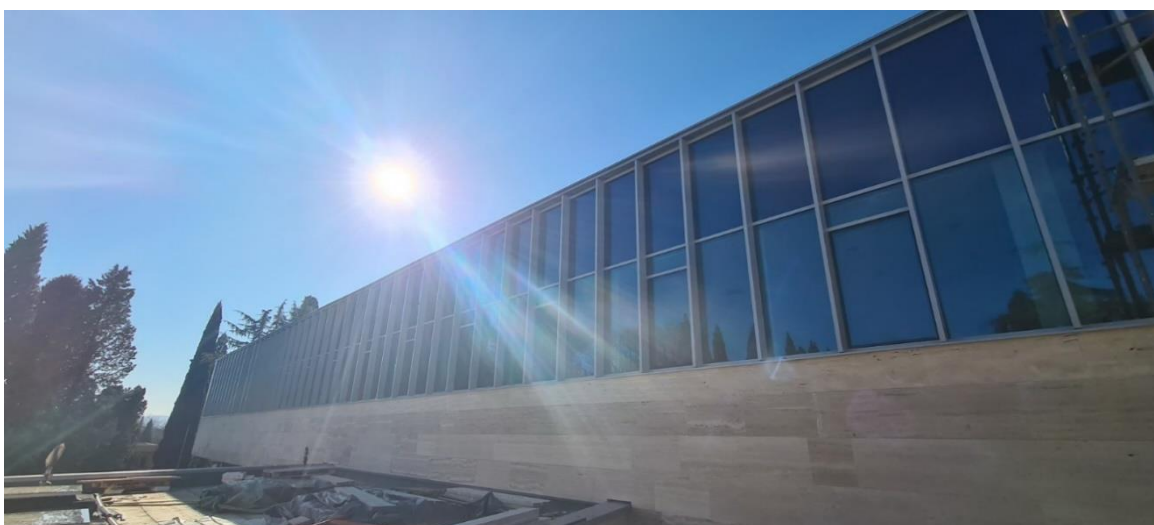

- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
- Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00€.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00€.
- U oba objekta završeni su izolaterski radovi krovnih površina i ukopanih zidova, radovi na kamenoj ventilisanoj fasadi, keramcarski radovi, instalacije vodovoda i Vlk-a unutar objekata, podloge, radovi na postavljanju al fasade, termotehnicke i elektro instalacije u plafonima u oba objekta (instalacije ventilacije, sprinkler, novak, vrf sistem, instalacije jake i slabe struje), montirane su lifotvske kabine i instalacije istih, postavljena je komplet podkonstrukcija za spustene plafone i završeno je 70% kamene obloge na potpornim AB zidovima.
- U toku su molersko - farbarski radovi u oba objekta, postavljanje gipsanih ploca u nivoima spustenih plafona, postavljanje svjetiljki, difuzora i mlaznica, zemljani radovi na zasipanju iza potpornih zidova, kao i radov na uređenju terena.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 128.146,32€ za tekuće izdatke, odnosno 4.737.698,31€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 4.865.844,63€, od čega 2.917.670,74 € u 2021. godini.

15.2. Adaptacija objekata obrazovanja

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama Podgorica, Nikšić i Rožaje. U okviru navedenog projekta predviđena je adaptacija postojećeg objekta u okviru kompleksa KBC-a u Podgorici za potrebe vrtića. Procijenjena vrijednost navedenog projekta je 850.000,00€ sa opremanjem. Realizuje se u saradnji sa Kliničko bolničkim centrom Crne Gore. Takođe, u okviru navedenog projekta predviđena

je adaptacija podgučnog odjeljenja OŠ „Ivan Vušović“ u Miločanima, opština Nikšić. Procijenjena vrijednost iznosi 75.000,00€. Istovremeno, u okviru istog projekta predviđena je adaptacija postojećeg objekta OŠ u Dacićima opština Rožaje. Procijenjena vrijednost navedenog projekta je 200.000,00€.

- **Adaptacija postojećeg objekta JU OŠ u Dacićima u Opštini Rožaje**

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-5039/1 sa izvođačem, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.10.2021. godine, na iznos od 148.888,53€ bez PDV-a.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/21-5134/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex Architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 19.10.2021. godine, na iznos od 3.700,00€ bez PDV-a.
- Kada se stvore povoljni vremenski uslovi, izvođač će biti uveden u posao.

- **Adaptacija Područne ustanove JU OŠ „Ivan Vušović“ u Miločanima, Opština Nikšić**

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8321 sa izvođačem, „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 47.081,34 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.10.2020. godine. Ugovor br. 01-8030/1 sa stručnim nadzorom, „Arhitektonika“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 1.210,00 €.
- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekata do sada je utrošeno 968.00€ za tekuće izdatke, odnosno 68.771,80€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 69.739,80€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.



15.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

15.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova i ostalim opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Projekti se sufinansiraju iz kredita CEB-a.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 5.000,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. Godini.

15.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Baru.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.12. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Bloku VI, Podgorica






- Vrtić se nalazi na urbanističkoj parceli UP 11, u Bloku VI u Podgorici, površine 3.185 m². Objekat će biti ukupne bruto površine 1.568 m² i spratnosti: suteran, prizemlje i jedan sprat, planiran za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za djecu uzrasta jaslica i uzrasta vrtića, višenamjenski prostor (otvoreni hol), prostor za trijažu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djeteta, kancelarije i zbornica, čajna kuhinja, perionica, tehničke i ostale prateće prostorije. Cjelokupan program boravka predškolske djece, sa zajedničkim prostorom i neophodnim medicinskim sadržajima je organizovan u prizemlju, a sprat je namijenjen prostoru jaslica. Sve prostorije su prirodno ventilisane, zeleni krov sprječava pregrijavanje objekta u toplijem dijelu godine, a u hladnom periodu gubitak toplote, dok solarni paneli omogućavaju iskorišćavanje sunčeve energije za zagrijavanje.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je sprovelo aktivnosti na raspisivanju i sprovođenju konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja koje je Upravi javnih radova dostavljeno da na osnovu istog sprovede tendersku proceduru za odabir projektanta i revidenta glavnog projekta.
- Ugovor br. 19/2-01-2500/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2017. godine, na iznos od 22.598,10€.
- Ugovor br. 101-1560/1-3405/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 19.06.2018. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3949/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 1.992.689,56€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.03.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4185/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 59.500,00€.
- Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka za izvođenje dodatnih radova koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim ugovorom, a zbog nepredviđenih okolnosti su postali neophodni da bi se izvršio prvobitni ugovor o javnoj nabavci, zaključen Ugovor br. . 01-402/21-5359/1 od 29.10.2021. godine sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, na iznos od 69.990,57€.
- Svi ugovoreni radovi na izgradnji dječijeg vrtića i jaslica u Bloku Vi su završeni, a u toku je otklanjanje sitnih nedostataka na izvedenim radovima.
- Nakon dostavljanja konačnog izvještaja i pisane izjave stručnog nadzora da je objekat podoban za upotrebu, obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da sprovede aktivnosti na upisu objekta u katastar nepokretnosti.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 104.016,09€ za tekuće izdatke, odnosno 1.827.127,71 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.931.143,80 €, od čega 1.170.355,92 € u 2021. godini.

15.13. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Pljevljima

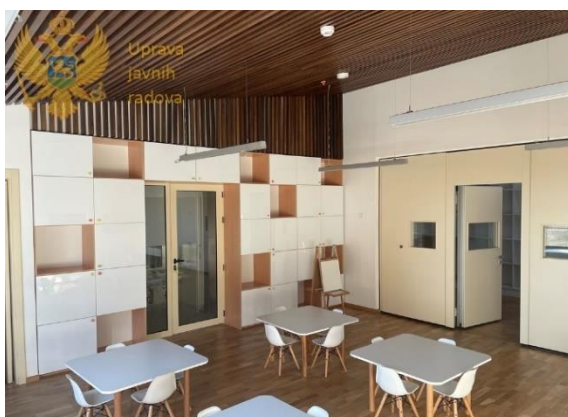




- Bivše Ministarstvo održivog razvoja i turizma u 2016. godini je raspisalo konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Uprava javnih radova je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja ugovorila izradu Glavnog projekta.
- U 2019. godini, nakon što je završena izrada i revizija glavnog projekta, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa CEB procedurama. Kako na javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, nakon provjere procijenjene projektantske vrijednosti ista je uvećana.
- Ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima u toku je u naselju Guke. Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m², projektovane za smještaj 67 djece. U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radna soba za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije. Projekat je finansiran iz kredita Razvojne Banke Savjeta Evrope – CEB.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 12.07.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6854/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.11.2016. godine, na iznos od 7.854,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano od strane Ministarstva prosvjete.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.01.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4557/1 sa izvođačem, "Tehno gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 19.06.2020. godine, na iznos od 1.048.956,20 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 04.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4186/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 29.500,00€.
- Svi ugovoreni radovi, kao i primopredaji objekta korisniku završeni su krajem 2021. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.154,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.048.941,76€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.091.095,76 €, od čega 756.285,50€ u 2021. godini.

15.14. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.15. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

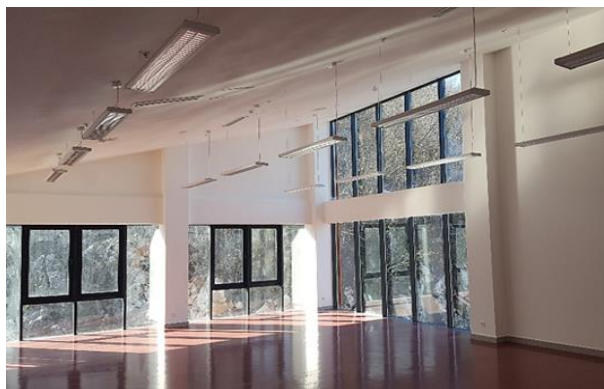

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekata Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekata, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.
- **Kotlarnica i infrastrukturni priključci za potrebe Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju**
 - Ugovor br. 19/2-01-1360/1 sa izvođačem, "Novi volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2015. godine, na iznos od 833.225,47€.
 - Ugovor br. 19/2-01-2893/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2015. godine, na iznos od 22.850,00€.
 - Svi radovi su završeni, izdata je upotrebna dozvola i izvršena je primopredaja objekata korisniku.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 22.850,00€ za tekuće izdatke, odnosno 833.136,53€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 855.986,53€, pri čemu nije bilo utoška sredstava u 2021. godini.
- **Izvođenje radova na uređenju terena dijela Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti i opremanja Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju**
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.07.2018. godine. Ugovor br. 01-1162/2 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 22.02.2019. godine, na iznos od 1.195.302,33€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8611/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 24.200,00€.
 - Završeni su svi radovi, izdata je upotrebna dozvola i izvršena primopredaja objekata korisniku.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.200,00€ za tekuće izdatke, odnosno 995.243,39€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 1.019.443,39€, pri čemu nije bilo utoška sredstava u 2021. godini.

15.16. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan" u Bijelom Polju




- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku

školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00€.
- Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, zidarski radovi i izrada gips kartonskih pregradnih zidova, kao i veći dio fasaderskih radova na objektu, grubi razvod mašinskih, elektro i instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu,
- U toku su završni radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije pasarele koja je predviđena kao pješačka staza uz objekat, radovi na izradi fasadne bravarije, izrada keramike, molersko-farbarski radovi i montaža mašinskih instalacija, kao i povezivanje elektro instalacija jake i slabe struje.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciji o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove raspisano je 30.10.2020. godine. Ugovor za uzvođenje dodatnih radova br.01-334/21-4112/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 24.08.2021. godine, na iznos od 1.017.555,59€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja preostalih radova raspisano je 21.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9280/1 sa stručnim nadzorom, "Sistem-mne" d.o.o. Podgorica je zaključen 06.11.2020. godine, na iznos od 18.150,00€.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 83.528,50€ za tekuće izdatke, odnosno 4.491.724,20€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 4.575.252,70€, od čega 1.226.738,46€ u 2021. godini.

15.17. Naučno-tehnološki park u Podgorici

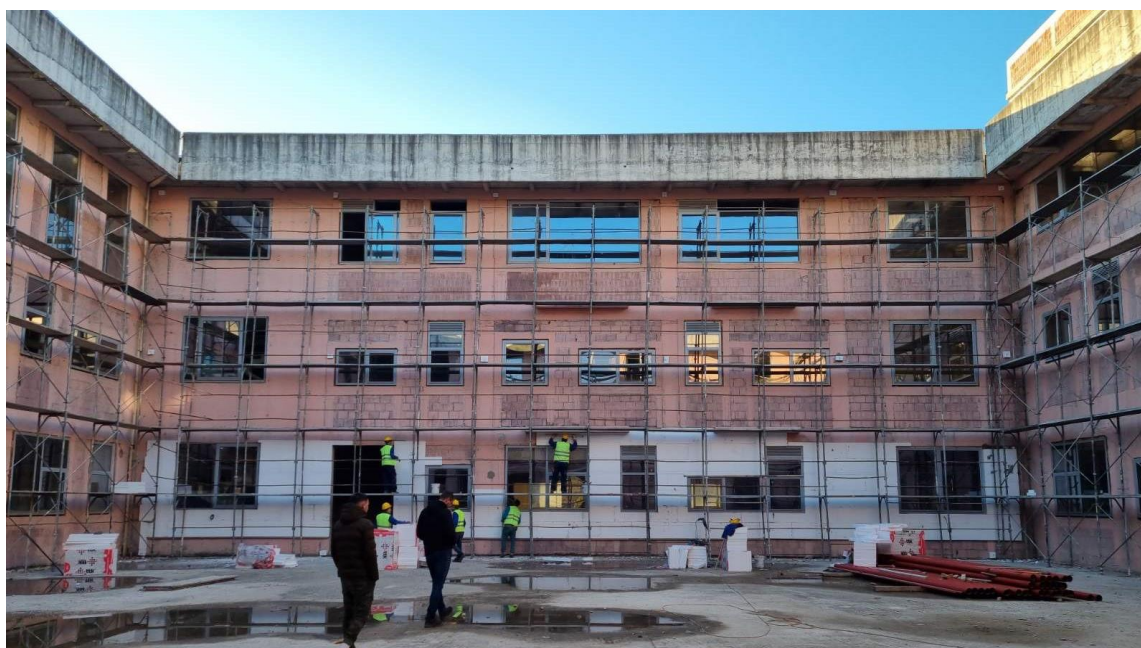



- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 30 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije. 189
Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke. Projekant glavnog projekta je "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđen je značajan broj dodatnih radova čije je izvođenje bilo neophodno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.
- Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6693/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
- Do sada su izvođeni: zemljani, betonski, zidarski, bravarski radovi, kao i radovi na razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija i termotehničkih instalacija.
- Sa radovima će se nastaviti u januaru 2022. godine, i očekuje se završetak istih do kraja godine.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.476.211,62€ za kapitalne izdatke, odnosno 25.047,00€ za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 2.501.258,62€ od čega 861.450,71€ u 2021. godini.

15.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.21. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada i ovjera projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, nakon čega će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.

- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.22. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.23. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.24. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.25. Osnovna škola u Igalu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je bila da u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovede procedure konkursa i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Igalu.

- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.26. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica

- Izrada idejnog rješenja, glavnog projekta rekonstrukcije toplane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00€.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.620,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

15.27. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-912/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 09.03.2017. godine, na iznos od 116.874,07€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6754/1 sa revidentom glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. iz Nikšića, je zaključen 23.10.2018. godine, na iznos od 8.330,00€.
- U toku je izmjena glavnog projekta u skladu sa idejnim rješenjem na koje je data saglasnost glavnog državnog arhitekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 93.499,26 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika na ovom projektu nastupila je zbog izmjene zakonske regulative, usljed koje je bilo neophodno naknadno izraditi idejno rješenje i pribaviti saglasnost glavnog državnog arhitekta.

15.28. Sanacija klizišta za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi


- Projektom sanacije klizišta na Savini, za potrebe izgradnje i rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom, planirana je realizacija više potprojekata u skladu sa prioritetima Ministarstva prosvjete.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije u 2018. godini završeni su radovi na sanaciji ovog klizišta, a koji su obuhvatili izradu potporne konstrukcije sa dva reda bušenih šipova prečnika 100cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5m.
- U 2016. godini završeni su hitni sanacioni radovi na objektu JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehaničkim istraživanjima za objekat JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.
- U aprilu 2020. godine isplaćena su sredstva za preostale radove, nakon što je bivše Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa bivšim Ministarstvom ekonomije, preuzelo aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića JPU "Naša radost" na Savini, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 104.041,80€ za tekuće izdatke, odnosno 1.906.645,76€ za kapitalne izdatke.
- U 2021. godini u skladu sa Zaključkom Vlade br. 04-6421/7 od 03.12.2021. godine Uprava javnih radova je izvršila plaćanje u iznosu od 973.064,62€ za izvedene radove na rekonstrukciji objekta vrtića JPU "Naša radost" na Savini po privremenim situacijama potpisanim od strane Ministarstva kapitalnih investicija, a dostavljenim od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.
- Ukupno je realizovano 2.010.687,56 €, od čega 973.064,62€ u 2021. godini.

15.29. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama

- Objekat je projektovan kao savremeno i funkcionalno zdanje, kapaciteta oko 100 djece, ukupne bruto površine 1.120 m². Imaće devet prostorija namijenjenih za dnevni boravak djece, od kojih četiri za jaslice, prostorije za vaspitače, kuhinju, administrativni blok, multifunkcionalni prostor sa garderoberima, višenamjensku salu i ostale prateće sadržaje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3611/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.10.2017. godine, na iznos od 24.500,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisan 07.12.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-979/1 sa revidentom glavnog projekta, "Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 3.500,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2949/1 sa izvođačem, "Tofi" d.o.o. Rožaje, je zaključen 03.05.2019.godine, na iznos od 1.504.617,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 04.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6102/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.10.2019. godine, na iznos od 24.210,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 43.050,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.504.609,58€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.504.609,58 €, od čega 138.608,98€ u 2021. godini.



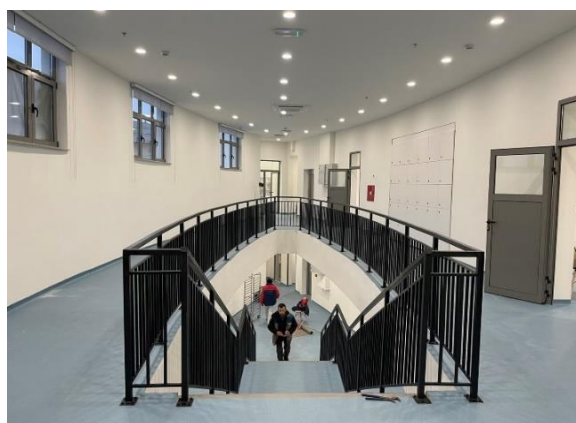

15.30. Osnovna škola u Tivtu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.31. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi

- Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Uprava javnih radova je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
- Krajem 2021. godine donešena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izbor projektanta, u toku je žalbeni rok. Za izbor revidenta projektne dokumentacije u toku je vrednoanje pristiglih ponuda.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

15.32. Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.


15.33. Izgradnja Osnovne škole u Blok 35/36, Tuški put, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.


16. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPOTSKIH OBJEKATA

16.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore - Uprave javnih radova, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijedena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem , “Roaming Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, montaži čelične konstrukcije i pokrivanju iste aluminijumskim panelima , zidarski radovi, dio radova na izradi fasade i fasadne bravarije, malterisanju, moleraju i razvodu elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Uprava javnih radove je obaviještena od strane izvođača i nadzora da je neophodno uraditi izmjene na projektnoj dokumentaciji zbog nemogućnosti nabavke prefabrikovanih elemenata za izradu tribina kao i prenamjenu službenih prostorija pod zahtjevima UEFA, što će dovesti do nepredviđenih radova i prolongiranja ugovorenog roka za završetak radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 1.430.560,07€ za kapitalne izdatke, od čega 1.000.000,00€ u 2021. godini.

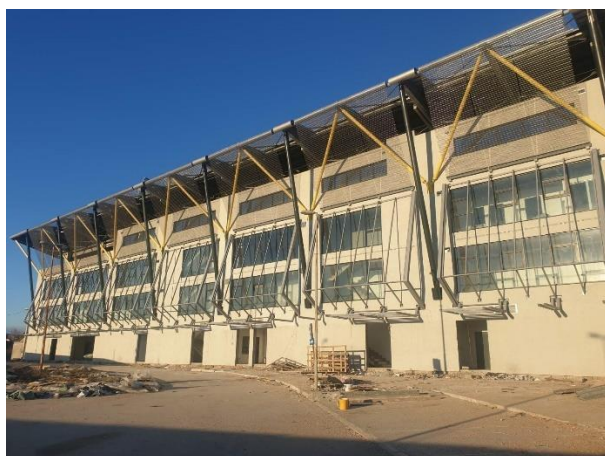

16.2. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

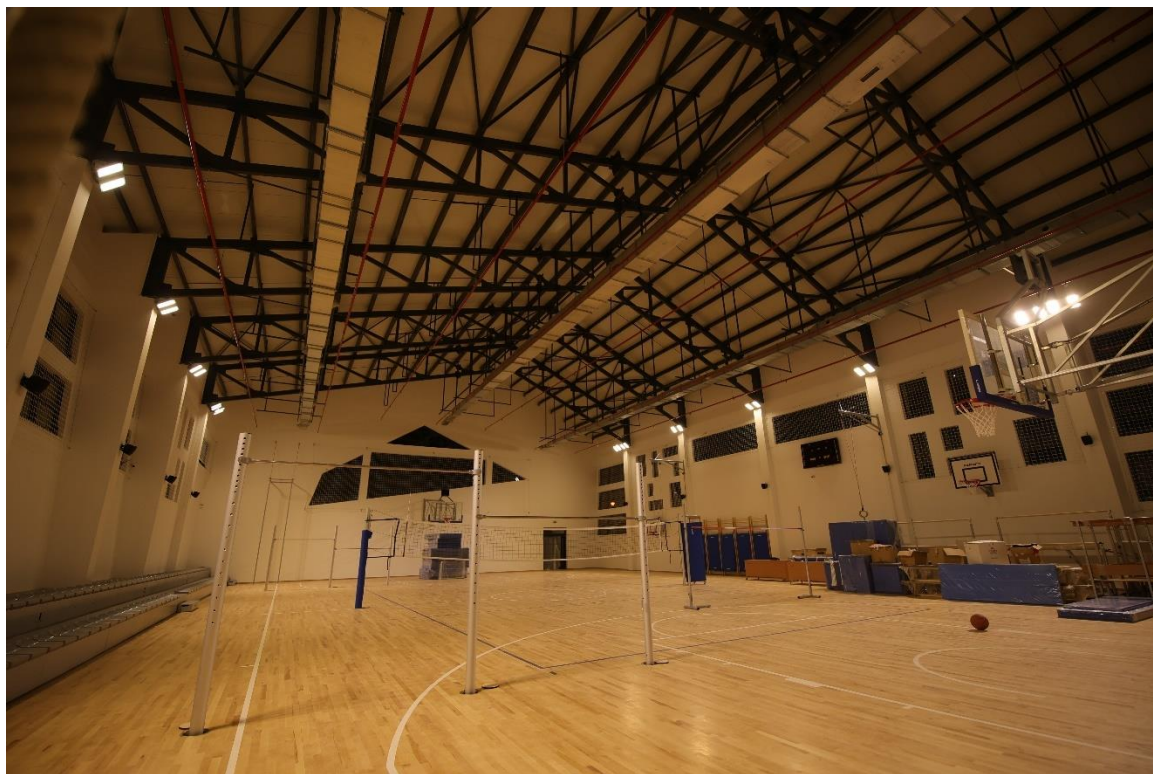


- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima.


- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4829 sa obrađivačem glavnog projekta, „A12” d.o.o Podgorica, je zaključen 08.08.2018. godine, na iznos od 14.670,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano u januaru 2019. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922-1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2018. godine, na iznos od 3.950,00€.
 - Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8179/1 sa izvođačem, „Tehno-gradnja” d.o.o Pljevlja, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 1.626.827,85€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8230/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.10.2019. godine, na iznos od 48.400,00€.
 - Do sada su završeni radovi na temeljnoj konstrukciji, izrada glavnih AB stubova i nosača, zidarskim i pokrivačkim grubim radovima, radovi na instalacijama i keramičarski radovi.
 - U toku su radovi na mašinskim instalacijama.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 45.980,00€ za tekuće izdatke, odnosno 1.613.809,65€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 1.659.789,65€, od čega 625.940,24€ u 2021. godini.
 - Problematika na realizaciji projekta odnosi se na neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na terenu. Predlog nadzornog organa i izvođača radova je ponuda za nepredviđene radove na mašinskim instalacijama u iznosu od cca 74.000,00€, kao i za viškove radova na zemljanim i armirano-betonskim radovima u iznosu od cca 91.000,00€. Tako da je za završetak objekta potrebno obezbijediti iznos od cca 165.000,00€.
 - Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sa „Tehnogradnjom” d.o.o Pljevlja zaključen je ugovor za naknadne radove br. 01-334/21-5854/1 od 25.11.2021. godine na iznos od 201.462,76€.
- Na realizaciji ovog ugovora utrošeno 77.218,30€ u 2021 .godini.

16.3. Rekonstrukcija objekata zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru

- Objekat bazena čija je rekonstrukcija u toku, nalazi se na katastarskoj parceli 237/1, KO Škaljari 1, površine cca 5.980m², dok je bruto površina objekta 5.400m². Na prizemnoj etaži objekta smještene su: četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorije VK „Primorac” i tehničke prostorije. Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se: osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama. Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.

- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili: sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- Radovima II faze rekonstrukcije predviđeni su: svi radovi neophodni za stavljanje objekta u funkciju, odnosno radovi na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehničkim i splinker instalacijama, kao i instalacije bazenske tehnike, radovi na uređenju terena i opremanje objekta namještajem.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.07.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-3688/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 11.09.2014. godine, na iznos od 99.365,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.12.2014. godine. Ugovor br. 19/2-01-939/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhient” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2015. godine, na iznos od 9.945,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2016. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 24.06.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5422/1 sa izvođačem, „Erlang” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.09.2016. godine, na iznos od 796.997,22€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 29.07.2017. godine. Ugovor br. 19/2-01-2636/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 16.641,28€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-841/1 sa izvođačem, „Neimar inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 3.480.077,34€. Za nepredviđene radove ugovor br. 01-7111/1 od 20.09.2019. godine, na iznos od 159.994,74€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora II faze je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 01-1033/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.02.2019. godine, na iznos od 46.886,00€.
- Radovi na rekonstrukciji objekta, uključujući i aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole i primopredaji objekta korisniku, završeni su krajem 2021. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 92.830,36€ za tekuće izdatke, odnosno 4.386.450,82€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 4.479.281,18€, od čega 375.130,29€ u 2021. godini.

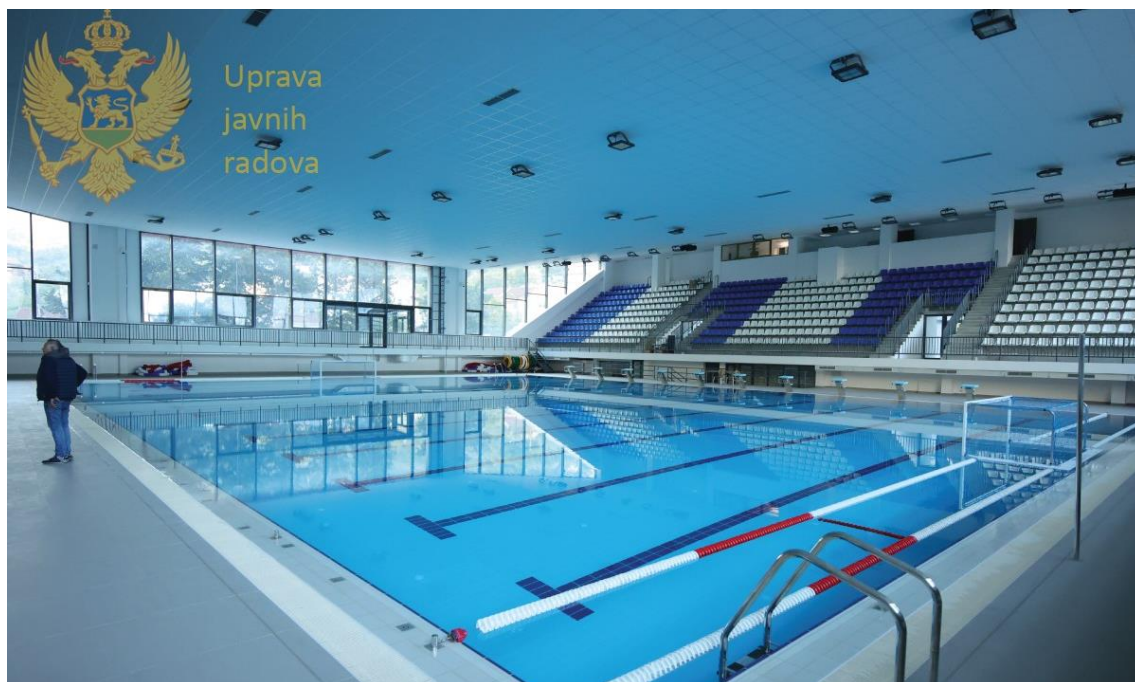

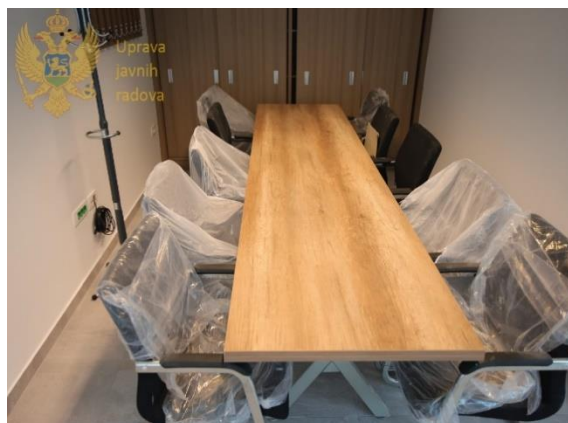

16.4. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru



- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019., 2020. godini i 2021. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave javnih radova.

16.5. Izgradnja sportskih terena i sala

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena i sala na teritoriji Crne Gore, shodno utvrđenim prioritetima od strane ministarstva.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

16.6. Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

16.7. Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

16.8. Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja

- Obaveza Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta sprovede konkurs i odabre najbolje idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje,
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

**17. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR
OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I MLADI**

17.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

- Ovaj projekat obuhvata izradu glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Uprava javnih radova ima ulogu implementacione agencije za aktivnost koja predviđa jedan infrastrukturni projekat, i koja se tiče uključivanja marginalizovanih grupa u obrazovni sistem. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 sa obrađivačem glavnog projekta i stručnim nadzorom, „Entasis” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi javnih radova.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za građevinarstvo” a.d. Podgorica, je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 8.940,00€.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 sa izvođačem radova “Gokyol Insaat ve Sanayii A.S.” je zaključen 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od sedam mjeseci. Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
- Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
 - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN” PODGORICA
 - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ” PODGORICA
 - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI” PODGORICA
 - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA
 - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ” NIKŠIĆ
 - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ” HERCEG NOVI
 - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA” BIJELO POLJE
 - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA” NIKŠIĆ

- U toku su pripremne aktivnosti od strane izvođača radova na prikupljanju potrebne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom kako bi se obezbijedili uslovi za početak izvođenja radova.



PROGRAM:

ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

18. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE

18.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću



- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu će nakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
- Do sada su završeni radovi na zamjeni spoljne stolarije, sanaciji krova i izradi krovnih opšiva, sanaciji fasade, zidarski, izolaterski, keramičarski i parketarski radovi u unutrašnjosti, kao i radovi na grubom razvodu hidrotehničkih i elektro instalacija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 30.239,76€ za tekuće izdatke, odnosno 655.456,65€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 685.696,41€, od čega 651.659,11€ u 2021. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se nedostatke i neusaglašenosti faza u projektnoj dokumentaciji usljed čega su pokrenute aktivnosti na izmjeni glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija i njihovu ponovnu reviziju. Izmjena glavnog projekta je u toku i završetak se očekuje početkom sljedeće godine, čime će se stvoriti uslovi za nesmetano izvođenje radova.

18.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture


- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na: izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za objekte kulture. Projekti se finansiraju iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Aktivnosti na realizaciji koordinira nadležno ministarstvo koje utvrđuje prioritete.
- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a**
 - U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, Ministarstva kulture i Glavnog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.950.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
 - Obaveza Glavnog grada je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva kulture je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
 - Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- **Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja**
 - U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Plužina, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 285.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
 - Obaveza Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
 - Na realizaciji projekata do sada je utrošeno ukupno 131.002,43€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- **Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)**
 - U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave javnih radova, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanja

polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)“, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.300.000,00 € u 2020. i 2021. godini.

- Obaveza Opštine Ulcinj je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, obaveza Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta je da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave javnih radova je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

18.3. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja “Creative hubs”

- Radi se višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za otvaranje kreativnih hubova u Podgorici, Baru i više opština na sjeveru Crne Gore. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- **Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja “Creativ Hubs” u Baru**



- Kroz predmetnu kumulativnu poziciju sprovedene su aktivnosti na adaptaciji palate objekta br. 85 za potrebe uspostavljanja Creative Hub-a, Stari grad Bar.

- U prizemlju objekta, u prostoru nekadašnje konobe, organizovan je multifunkcionalni prostor koji treba da zadovolji informativnu, uslužnu i komercijalnu djelatnost. Osmišljen je kao prostor za druženje, odmor, prostor za kratke konsultacije, sastanke sa strankama, informativni pult i prodajni prostor. Na prvom spratu organizovan je radni prostor za primijenjeno vajarstvo. Na drugom spratu organizovan je kreativni prostor za umjetnike koji se bave fotografijom, grafikom, modelovanjem. Na trećem spratu organizovana je smještajna zona za umjetnike. Površina objekta je 221.11m². Spratnost: prizemlje i tri sprata.
- Projektu dokumentaciju je obezbjedilo bivše Ministarstvo kulture. Projektant glavnog projekta je „ACEP“ d.o.o. Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 23.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8745/1 sa izvođačem, „Euromont stil“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.11.2019. godine, na iznos od 256.630,83€.
- Ministarstvo kulture raskinulo je ugovor sa nadzorom „Acep“ d.o.o. Cetinje zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Novi ugovor sa nadzorom „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica Ministarstvo kulture je potpisalo 04.03.2020. godine.
- Svi radovi su završeni i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 177.695,24€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 177.695,24€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Zbog prekoračenja ugovorenog roka od 32 dana, izvođaču su naplaćeni penali u skladu sa ugovorom, u iznosu od 78.935,59€.

18.4. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture

- Radi se o višegodišnjem projektu.
- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.


Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju

- Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od nekadašnjeg Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20- 7157/1 sa izvršiocom, „Was design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na iznos od 206.000,01€.
- Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
- Uprava javnih radova je od strane izvršioca 11.11.2020. godine obaviještena da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, nakon koje bi se predmetna oprema mogla ugraditi.
- Uprava javnih radova je o navedenom tražila zvanično izjašnjenje JU Narodni muzej Crne Gore, koje je dostavljeno 13.11.2020. godine. U istom je potvrđeno da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta

građevinska rekonstrukcija istog, te da nije moguće precizirati konačne datume stvaranja neophodnih uslova za ugradnju predmetne opreme. Takođe, Uprava javnih radova je izjašnjenjem obaviještena da je JU Narodni muzej Crne Gore obezbijedio poslovni prostor u Podgorici za privremeni smještaj ugovorene opreme, do njene konačne ugradnje u depo.

- S obzirom na to da su na ovaj način u značajnoj mjeri izmijenjeni preduslovi neophodni za konačnu realizaciju ugovora, Uprava javnih radova je nakon dalje zvanične korespondencije sa Ministarstvom kulture, JU Narodnim muzejom i izvršiocem usluge, preduzela aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora o javnoj nabavci, koje nisu bile uspješne, te ni ugovor nije realizovan.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

18.5. Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju

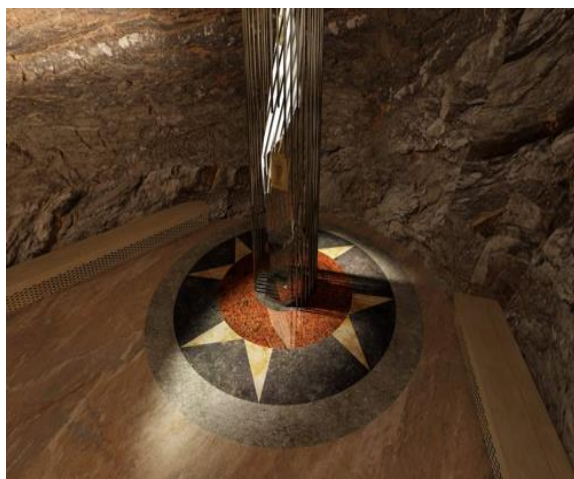

- Objekat se nalazi se na zahvatu DUP-UP-a Istorijsko jezgro - Cetinje. Bruto površina objekta je 635,98 m², i sastoji se od prizemlja i dvije eteže ukopane u zemlji. Objekat služi za kontemplaciju ikone Bogorodice Filermose. Nalazi se u pećini, s toga nije vidljiv spolja, niti sa jedne tačke grada, i ne nalazi se u vizuelnom i fizičkom konfliktu sa okolinom.
- Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta .
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7297/1 sa izvođačem, „Neimar inzenjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.12.2016. godine, na iznos od 1.594.839,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (za zemljane radove) je raspisano 26.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1915/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 4.650,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na uvođenju izvođača u posao u septembru 2017. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole od strane Prijestonice Cetinje, kao i izrada elaborata pripremnih radova od strane izvođača radova, ali su radovi obustavljeni zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 128.500,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na lokaciji, ugovoreni radovi su obustavljeni i urađen je elaborat pripremnih radova kojim su predviđeni radovi na zaštiti ulaza u pećinu. S obzirom na to da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dala saglasnost na elaborat pripremnih radova, Uprava javnih radova je obustavila dalje aktivnosti na realizaciji projekta dok se ne izvrši dopuna tehničke i druge dokumentacije potrebne za izvođenje radova, a čiji izradu sprovodi Prijestonica Cetinje.

- U 2021. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

18.6. Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zadužena je Uprava javnih radova da realizuje projekat "Valorizacija Gradskih bedema – ostataka Onogošta, izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa, I i II faza".
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

18.7. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju

- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Do kraja 2021. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava javnih radova preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.



PROGRAM:

REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

19. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

19.1. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji pasarele, pratećih sadržaja i neophodne infrastrukture za potrebe uređenja prostora bivšeg Jalovišta u Mojkovcu.
- **Izgradnja pasarele**

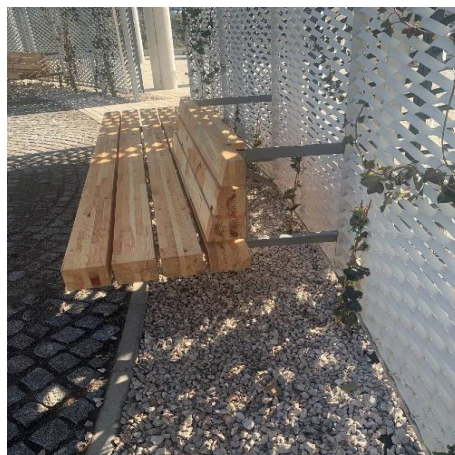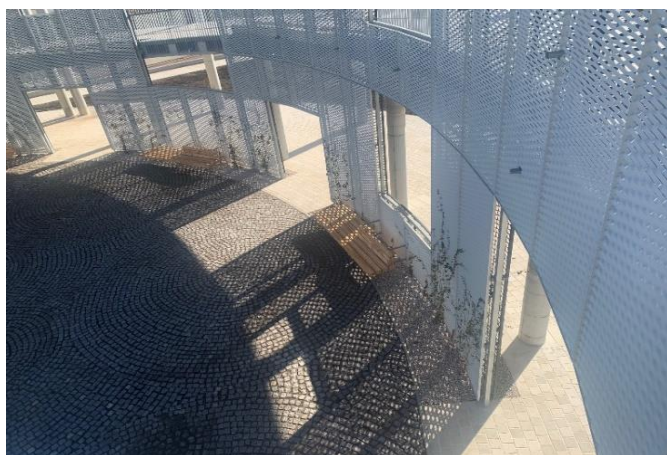

- Izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta - pasarele preko magistralnog puta Podgorica - Bijelo Polje, u opštini Mojkovac izvodi se fazno. Planirana je izgradnja glavnog

mosta širine 7 m i ukupne dužine 62,65 m i prelazi preko glavne magistrale Podgorica – Bijelo Polje, kao i preko pješačko-biciklističke staze. Silazna rampa je širine 5 m i dužine 176,66 m i nalazi se na kraju mosta. Kružni dio pasarele, koji se nalazi na nekadašnjem jalovištu, sadržaće "zeleni trg", kao i lift nosivosti osam osoba. II faza radova se odnosi na hidro i elektro instalacijama, izgradnja podnih fontana, potpornih zidova i žardinjera, kao i postavljane kamenih ploča na stepenište na ulazu u pasarelu od grada, ograde, rasvjete i drvenih klupa.

- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2080/1 sa izvođačem I faze, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.03.2019. godine, na iznos od 980.920,10€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze je raspisano 20.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2911 sa izvođačem II faze, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 1.199.075,63€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I i II faze je raspisano 19.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3662/1 sa stručnim nadzorom I i II faze, „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 24.805,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 24.805,00€ za tekuće izdatke, odnosno 2.002.215,70€ za kapitalne izdatke, od čega 908.458,79€ za kapitalne izdatke I faze i 1.093.736,91€ za kapitalne izdatke II faze.
- Ukupno je realizovano 2.027.020,70€, od čega 445.066,19€ u 2021. godini.

19.2. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice)

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
- Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2021. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji.
- **Lokalni putevi i gradske saobraćajnice**
- **Opština Berane**
 - U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
 - Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 104.256,36€.
- **Opština Pljevlja**
 - U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I**

niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 105.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 104.959,22€.

- **Opština Šavnik**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 90.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 89.882,16€.

- **Opština Gusinje**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 81.972,31€.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Lokalni put Gusinje-Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09€.
- U 2021. godini dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.848,09€, od čega 14.110,02€ u 2021. godini.

- **Opština Danilovgrad**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 120.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 120.000,00€.

- **Glavni grad Podgorica**

- U 2020. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 1.500.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora u 2021. godini je utrošeno 1.321.578,66€.

- **Opština Andrijevica**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 98.925,20€.

- **Opština Rožaje**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 60.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 59.774,00€.

- **Opština Bijelo Polje**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 85.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2021. godini nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

Gradska saobraćajnica - raskrsnica Mojkovačke ulice i bivše magistrale

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-210 sa obrađivačem glavnog projekta, „BMR Baošić” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 6.902,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-811/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 2.360,00€.
- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla.

- Nakon obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova za izmiještanje 10kV kabla, što je bila obaveza Opštine Bijelo Polje, izvršena je dopuna projektne dokumentacije i pribavljene su saglasnosti nadležnih institucija.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

• **Opština Petnjica**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 95.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 94.988,87€.

• **Opština Nikšić**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 100.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 67.669,25€.

• **Opština Mojkovac**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 80.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 80.000,00€.

• **Opština Kotor**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 165.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 144.818,69€.

• **Opština Kolašin**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I**

niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 80.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 76.046,17€.


Sanacija gradskih saobraćajnica u Kolašinu

- Projektom je obuhvaćeno struganje postojećeg asfalta i presvlačenje novim asfaltom devet ulica u Kolašinu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8585/1 sa izvođačem, "Bemax" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 134.862,97€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 07.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-9113/1 sa stručnim nadzorom, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.12.2018. godine, na iznos od 4.625,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u 2019. godini.
- Na realizaciji projekta do je utrošeno 4.625,00€ za tekuće izdatke, odnosno 134.799,69€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 139.424,69€, od čega 4.625,00€ u 2021. godini.
- Predat je konačni izvještaj stručnog nadzora.

Opština Ulcinj

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u urbanoj cjelini Stari grad Ulcinj

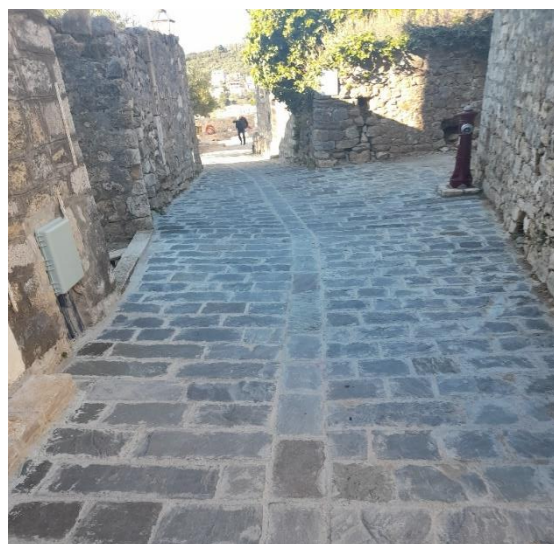

- Revidovanim projektom je obuhvaćena rekonstrukcije ulica u starom gradu u Ulcinju, sa izmjenom atmosferske i fekalne kanalizacije, instalacija jake i slabe struje i popločavanjem ulica. Ovaj projekat obuhvata I fazu rekonstrukcije, što podrazumijeva rekonstrukciju dvije ulice, sa pratećom infrastrukturom. Korisnik je opština Ulcinj.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6733/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "VOIP" d.o.o. Ulcinj, je zaključen 24.12.2015. godine, na iznos od 24.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-800/2 sa revidentom glavnog projekta, "Urban studio" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2016. godine, na iznos od 4.900,00€.
- Međutim, kako se radovi nijesu počeli izvoditi, a u međuvremenu se promijenio Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, reviziju je trebalo ponovo uraditi u skladu sa novim zakonom. Prethodni revident nije imao potrebne licence po novom zakonu, pa je imenovan drugi revident.
- Javno nadmetanje za izbor novog revidenta glavnog projekta je raspisano 03.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-3037/1 sa revidentom glavnog projekta, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 4.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5318/1 sa izvođačem, "MONTAL DSD" d.o.o. Podgorica i "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2017. godine, na iznos od 474.189,14€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-92/1 sa stručnim nadzorom, "Nik Com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 9.520,00€.
- Sprovedene su pripremne aktivnosti i pregovori kako bi se izvođaču radova omogućio početak izvođenja. Zbog propusta pri izradi tehničke dokumentacije, faza pripreme projektne dokumentacije je dugo trajala, rađena je izmjena projekta i ponovna revizija.
- Izvođač radova je uveden u posao 14.02.2020. godine, međutim, nije mogao da obezbijedi potrebnu dokumentaciju za početak, pa radovi nijesu počeli.
- Stručni nadzor se u avgustu 2020. godine izjasnio da nije u mogućnosti da nastavi aktivnosti po ugovoru, s obzirom na dug vremenski period od potpisivanja ugovora.
- Javno nadmetanje za izbor novog stručnog nadzora je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8276/1 sa stručnim nadzorom, "MEPING PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 10.345,50€.
- Konzorcioni partner "Ramel" d.o.o. je izašao iz zajedničkog posla. Kako je Opština Ulcinj bila zainteresovana da se ovaj projekat ipak realizuje, predstavnici Opštine su pružili dodatnu stručnu pomoć, kako bi se stvorili uslovi za nastavak izvođenja radova.
- Radovi su otpočeli 24.12.2020. godine i odvijali su se usporeno zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, otežane zamjene vodovodnih instalacija zbog nepostojanja katastra podzemnih instalacija, odabira kamena za popločavanje propisanih karakteristika. S obzirom da se projekat realizuje u dvije faze, dio radova obuhvaćen ovim ugovorom nije izveden jer su predmetni radovi tehnološki povezani sa radovima koji su predmet druge faze rekonstrukcije i biće izvedeni u okviru radova II faze.
- Radovi su završeni i u toku je konačni obračun radova.
- Na realizaciji projekta do je utrošeno 40.556,93€ za tekuće izdatke, odnosno 344.798,06€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 385.345,99€, od čega 256.217,19€ u 2021. godini.
- **Opština Bar**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Bar za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 90.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 89.844,61€.
- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:
- **Izgradnja pješačkog pothodnika u željezničkoj stanici Sutomore**
 - Projektom je obuhvaćena izrada pješačkog prolaza ispod pruge na željezničkoj stanici u Sutomoru, kao i izrada stepeništa i nadstrešnice, kako bi se omogućio siguran prelazak putnika od naseljenog dijela do objekta stanice.
 - Izradu projekta je donacija China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch opštini Bar na osnovu sporazuma.
 - Izbor revidenta glavnog projekta je obezbijedila Opština Bar, šoping metodom od 18.08.2016. godine. Revident glavnog projekta je "Nik com" d.o.o. Nikšić.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-318/1 sa izvođačem, "BI KOD" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.01.2018. godine, na iznos od 294.311,85€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 02.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1375/1 sa stručnim nadzorom, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 21.03.2018. godine, na iznos od 4.961,00€.
 - Stručni nadzor se martu 2020. godine izjasnio da nije u mogućnosti da nastavi aktivnosti po Ugovoru, s obzirom na dug vremenski period od potpisivanja Ugovora.
 - Javno nadmetanje za izbor novog stručnog nadzora je raspisano 15.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8277/1 sa stručnim nadzorom, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 12.100,00€.
 - Izvođač radova nije zvanično uveden u posao, ali su rađene aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije.
 - Na realizaciji ovog projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
 - S obzirom na to da se radovi izvode u neposrednoj blizini pružnog kolosjeka, Željeznica Crne Gore je imala dodatne zahtjeve o pitanju angažovanja stručnog kadra, specifičnih mašina, kao i dodatnih troškova obustave željezničkog saobraćaja. Svi navedeni zahtjevi nijesu bili obuhvaćeni revidovanom projektnom dokumentacijom dostavljenom od strane Opštine Bar, niti su ugovoreni od strane Uprave javnih radova sa izvođačem radova. Imajući u vidu i problematiku izvođača radova da obezbijedi provizorijum, duži vremenski period nakon potpisivanja ugovora u otežanim uslovima usljed pandemije izazvane virusom COVID-19, kao i imajući u vidu da je stručni nadzor odustao od posla, aktivnosti na realizaciji ugovora su prolongirane do ponovnog ugovaranja stručnog nadzora.
 - Izvođaču radova je početkom oktobra upućen zahtjev da obezbijedi potrebnu opremu i dokumentaciju, kako bi otpočeo sa radovima. Međutim, izvođač se izjasnio da nije u mogućnosti da otpočne sa radovima dok se epidemiološka situacija izazvana virusom COVID-19 ne promijeni.
 - Dana 16.04.2021. godine, Uprava javnih radova je obavijestila izvođača radova da se ugovor jednostrano raskida. Bitni razlozi za raskid ugovora su što izvođač radova i pored

više upozorenja nije otpočeo sa ugovorenim radovima i što nije dostavio garancija banke za dobro izvršenje ugovora.

- **Opština Žabljak**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 90.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 75.842,26€.
- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

- **Rekonstrukcija Ulice Vojvode Mišića**

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Žabljak.
- Ugovor br. 101-1560/1-252/1 sa izvođačem radova, "Intermost" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.01.2018. godine, na iznos od 193.220,63€.
- Ugovor br. 101-1560/1-2103/1 sa stručnim nadzorom, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.04.2018 godine, na iznos od 2.320,50€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.320,50€ za tekuće izdatke, odnosno 192.494,81€ za kapitalne izdatk.
- Ukupno je realizovano 194.815,31€, od čega 61.442,84€ u 2021. godini.

Asfaltiranje dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka

- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3432 od 02.07.2020. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka, u iznosu od 240.000,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-5652 sa Opštinom Žabljak je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 240.000,00€.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 51.469,67€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-35003 od 06.11.2020. godine, Vlada Crne Gore je ponovo usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan luka, u iznosu od 80.000,00 €.
- Ugovor br. 01-334/20-10291 sa Opštinom Žabljak je zaključen 01.12.2020. godine, na iznos od 80.000,00€.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 32.487,36€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- **Opština Plužine**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I**

niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 90.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 89.970,76 €.

- **Opština Herceg Novi**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 165.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 64.038,57€.

- **Opština Tuzi**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 95.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 91.522,29€.

- **Opština Plav**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 120.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 116.390,40€.

- **Opština Tivat**

- U 2021. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Tivat za realizaciju projekata u okviru programa **17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 100.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije,

izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 98.924,88€.

19.3. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Radi se o višegodišnjem projekatu.
- Sredstva planirana Zakonom o budžetu 2021. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popča, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice i Svinjače. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

• Nastavak uređenja korita rijeke Grnčar u urbanom dijelu nizvodno od škole do mosta na ulasku u Gusinje

- Uređenje korita rijeke Grnčar realizuje se fazno.
- Svi ugovoreni radovi I i II faze su završeni, a u 2019. godini završeni su i ugovoreni radovi III faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača IV faze je raspisano 09.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6992/1 sa izvođačem IV faze, „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 139.816,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora IV faze je raspisano 17.07.2019. godine. Ugovor br.01-7062/1 sa stručnim nadzorom IV faze, „Geotehnics, projects & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 6.292,00 €.
- U septembru 2019. godine počelo se sa radovima IV faze uređenja korita rijeke Grnčar.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.146,00 € za tekuće izdatke, odnosno 73.364,36€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 76.510,36 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

• Regulacija korita rijeke Zlorečice

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Uprava za vode.
- Nakon što je izvođač sa kojim je zaključen ugovor 2018. godine odustao od posla, u 2019. godini ponovno je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na regulaciji korita rijeke Zlorečice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-835 sa izvođačem, „Vukotić trejd” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.02.2020. godine, na iznos od 218.830,61€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.07.2018. godine. Ugovor br. 01-334/20-5421/1 sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.
- Upravi za vode poslat je dopis da je neophodno izvršiti izmjenu projektne dokumentacije (PR01-PR33) iz razloga što je ista izrađena u 2011. godini, a tok rijeke Zlorečice se

promijenio, te je potrebno projekat prilagoditi stanju na terenu. Iz navedenog razloga, izvođač nije uveden u posao.

- **Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici**

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 39.930,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.

- **Uređenje korita rijeke Ibar**



- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obađivač glavnog projekta je „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođčem, „Vukotić-trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.
- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze i isto je poništeno od strane Ministarstva finansija.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 3.500,00€ za tekuće izdatke, odnosno 422.000,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 425.500,00€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.
- **Sanacija puta Han Garančića - Opasanica**
 - Predmetni put se nalazi u opštini Podgorica, u blizini naselja Veruša. Projektom je obuhvaćena sanacija potpornih zidova u koritu rijeke i izgradnja novih zidova radi stabilizacije kosina korita rijeke, asfaltiranje dijela puta i oblaganje kanala u centru Opasanice. Korisnik je Glavni grad Podgorica - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.
 - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zaključila je ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić“ d.o.o Podgorica i revidentom JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6121/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2019. godine, na iznos od 429.066,25€.
 - Na otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za izbor stručnog nadzora br. 01-167/19 od 24.07.2019. godine se nije niko javio, pa je putem nabavke male vrijednosti od 02.08.2019. godine, sa "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, sklopljen ugovor za vršenje nadzora u trajanju od mjesec dana. Ugovor br. 01-6172/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 2.000,00€ i u trajanju mjesec dana od dana potpisivanja ugovora.
 - Nakon obustave radova i zimskog perioda, putem nabavke male vrijednosti iz marta 2020. godine, izabran je stručni nadzor "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, za vršenje nadzora do primopredaje radova. Ugovor br. 01-334/20-3022 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.840,00€, do primopredaje radova.
 - S obzirom da je u toku radova došlo je do pojave viška radova u odnosu na projektovane, sproveden je pregovarački postupak za obezbjeđenje dodatnih sredstava. Ministarstvo finansija nije odobrilo pregovarački postupak. Takođe, sprovedene su aktivnosti na izmjeni projekta u vezi sa poboljšanjem sloja asfalta i izmjenom detalja kod oblaganja korita kanala kamenom.
 - Završena je izgradnja novih potpornih zidova i sanirani su postojeći zidovi u koritu rijeke (izuzev zida Z4), izrada betonskog kanala za odvod površinskih voda, izrada rigola, nasipanje tampona i asfaltiranje.
 - Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
 - Preostali radovi su nastavljani i završeni u 2021. godine, čim su stvoreni povoljni vremenski uslovi za nastavak radova.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 6.840,00€ za tekuće izdatke, odnosno 413.313,95€ za kapitalne izdatke.
 - Ukupno je realizovano 420.153,95 €, pri čemu 13.034,33€ u 2021. godini.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica, izrada potpornog zida Z4, l=28m je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8154/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2020. godine, na iznos od 19.341,36€. Troškovi stručnog nadzora obuhvaćeni su kroz prethodni Ugovor.
 - Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na neusaglašenost projektne dokumentacije i stanja na terenu, kao i uslovljenost izvođenja radova nivoom rijeke.
 - Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 15.933,67€.



19.4. Izgradnja gradske pijace u Rožajama



- Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektну dokumentaciju, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su ugovoreni radovi I faze.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.
- Izvođač radova je do sada završio sve grube građevinske radove, instalaterske radove, zidarske radove, molersko-farbarske radove i radove na spuštenim plafonima.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je primopredaja objekta korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.596,50 € za tekuće, odnosno 857.458,68€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 884.055,18€, od čega 44.831,65€ u 2021. godini.
- U 2021. godini je raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača II faze koji obuhvata uređenje terena sa opremom i namještajem. Nakon završetka II faze objekat će biti u funkciji.

19.5. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinja



- Projektnu dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju je obezbijedila Uprava javnih radova.
- Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- Nakon što su završeni svi ugovoreni radovi I faze, u toku je izvođenje radova II faze.
- Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radove, asfalterse radova i elektro instalacije.
- Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfalterških radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
- Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatali hidrotehničke, elektro i asfalterse radove.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 600.000,00 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 600.000,00 €, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

II faza



- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
- Završeni su radovi na probouju puta u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.
- U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltiranje radova u dužini od 3km.

- Na realizaciji projekta do sada utrošeno 1.439.469,08€ za kapitalne izdatke, odnosno 12.597,00 € za tekuće izdatke.
- Ukupno je realizovano 1.452.066,20€, od čega 1.062.779,39€ u 2021. godini.
- Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Gusinje.

Most na rijeci Vruji u Gusinju



- Most na Vruji u Gusinju ima ukupnu dužinu sa krilima obalnih oporaca 40,10 m, dok ukupna širina, zajedno sa ivičnim vijencima i ogradom, iznosi 10,44 m.
- Obradivač glavnog projekta je „CDS project“ d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-492/1 sa izvođačem, „IGP Fidiya“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020.godine, na iznos od 399.312,02 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5417/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.07.2020. godine, na iznos od 9.559,00 €.
- Izvođač je uveden u posao i završeni su pripremni radovi.
- Završeni su radovi na trotoarima mosta i asfalterški radova, kao i radovi na signalizaciji mosta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.559,00€ za tekuće izdatke, odnosno 383.559,73 € za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 393.118,73€, od čega 240.717,98€ u 2021. godini.

- Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2021. godine i objekat je predat opštini Gusinje na korišćenje.

- **Saobraćajnica od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji**

- Dužina saobraćajnice od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji je 470 m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01 – 8583/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "DING" d.o.o. Podgorica, je raspisan 08.11.2019. godine, na iznos od 7.502,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8653/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt d.o.o. Podgorica", je raspisan 11.11.2019. godine, na iznos od 2.412,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta je završena u 2020. Godini.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 9.914,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

19.6. Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav

- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnom projekta "Civil engineer" d.o.o., je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos 9.470,00€.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.250,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

- **Izrada elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta**

- Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku za jednostavne nabavke, za uslugu izrade projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta rekonstrukcije puta Plav – Babino Polje – Bogićevica, Opština Plav, poslat je 29.11.2021. godine.
- Ugovor br. 01-334/21-6684/1 od 31.12.2021. godine sa Ponuđačem "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, na iznos 12.670,00 eura bez pdv-a.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, trenutno nije moguće izvoditi geološko kartiranje terena.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

19.7. Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla, opština Bar i graničnog prelaza Božaj, opština Tuzi



- Izgradnja puta u dužini od 1,4 km, sa dvije saobraćajne trake širine 2x2,75m, sa ivičnim trakama 2x0,25m i bankinama širine 1m, ivičnjacima, asfaltnim kolovoznim zastorom debljine 6+4cm, saobraćajnom opremom i signalizacijom. Odvodnja je riješena rigolama širine 0,5m, i kanalima. Za odvod vode kroz trup puta, predviđeni su cjevasti propusti. Korisnik je opština Bar.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Obrađivač glavnog projekta je "Put inženjering" d.o.o. Podgorica, a revident "Kov atelje" d.o.o. Nikšić.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20- 2228/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 690.226,70€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2896 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 14.400,00€.
- Izvođaču radova su predate tačke operativnog poligona, ali izvođač nije uveden u posao jer Opština Bar nije stvorila zakonske preduslove za uvođenje izvođača u posao.
- Dopisom Ministarstva unutrašnjih poslova od 30.07.2020. godine, naznačeno je da će se raskrsnica koja vodi prema graničnom prelazu i Albaniji riješiti saobraćajnim rješenjem na osnovu budućeg objekta zajedničkog graničnog prelaza, što se odnosi na dio puta od PR0-PR 23. Iz tog razloga, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar izdao je djelimično Rješenje kojim se odobrava izvođenje radova od PR23 do PR85.
- Izvođač radova je uveden u posao 15.12.2021. godine i u toku je izvođenje radova-
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 69.022,67€ za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

19.8. Putni pravac Monte Rose

- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova putnog pravca Monte Rose raspisano je 26.11.2021. godine. U toku je procedura dostavljanja ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 28.12.2021. godine. U toku je procedura dostavljanja ponuda.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.



19.9. Rekonstrukcija trga u Plavu



- Usljed nedostatka javnih površina u Plavu, određena je lokacija za izgradnju gradskog trga u vidu prenamjene dijela školskog dvorišta u javnu površinu. Projektnim rešenjem se predviđa uklapanje postojećeg zdravog i visokodekorativnog zelenila, a stabla planirana za uklanjanje se nadoknađuju sadnjom novih sadnica visokodekorativnih vrsta. Ukupna površina uređenja platoa je 3.308m².
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Plav. Projektant je "Plan plus" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4417/1 sa izvođačem, "LD Gradnja" d.o.o. Nikšić, je zaključen 21.06.2019. godine, na iznos od 496.299,76 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 12.06.2019. godine. Ugovor br. 01-4666/1 sa stručnim nadzorom, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.07.2019. godine, na iznos od 4.840,00 €.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i izdata je upotrebna dozvola korisniku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.800,00€ za tekuće izdatke, odnosno 404.000,00€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 505.000,00 €, od čega 847,00€ u 2021. godini.

19.10. Izgradnja trga i šetališta u u opština Bar

- Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze. Zahvat obuhvata cca 4.800 m² šetališta sa pratećim sadržajima.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo JP Morsko dobro Crne Gore. Projektant glavnog projekta je "Arhitektonski studio AIM" d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je "Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4063 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 968.383,36 €, od čega će Opština Bar obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000,00 €, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore predvidjelo je iznos od 425.000,00 €, a Uprava javnih radova obezbijediti iznos od 443.383,36 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 17.02.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2501 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 26.299,35€.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.200,35€ za tekuće izdatke, odnosno 424.438,12€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 450.638,47€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

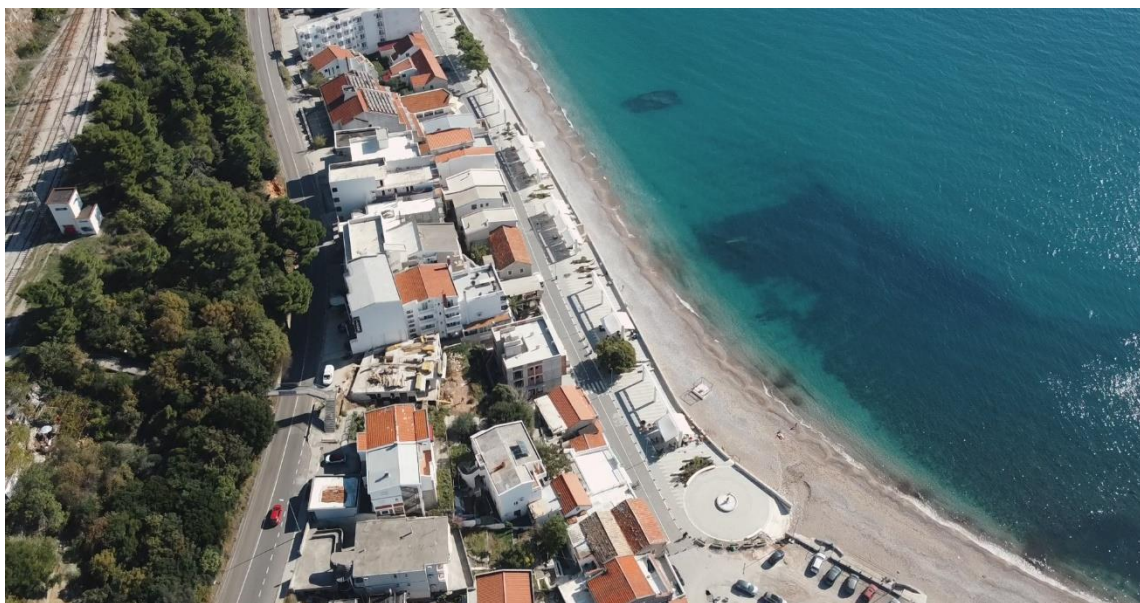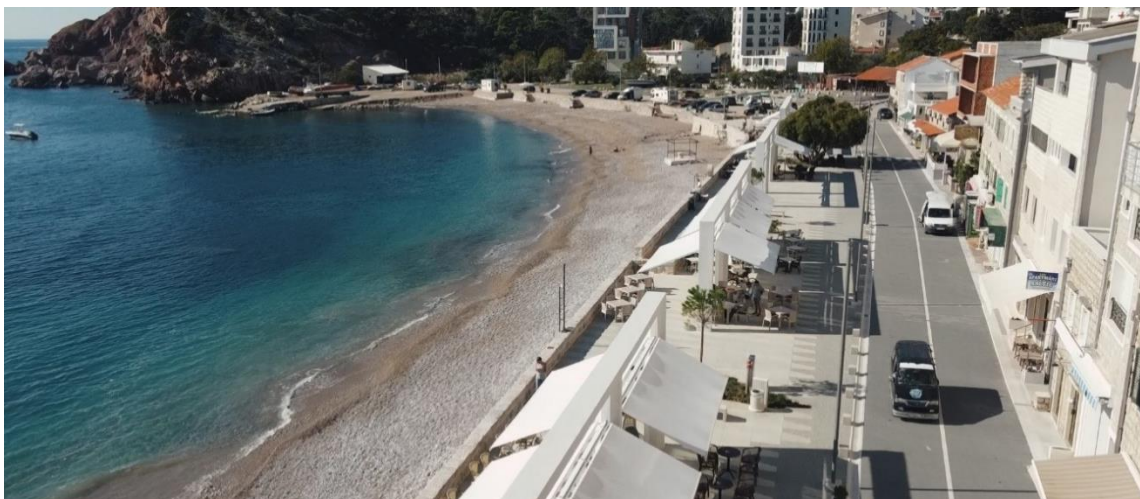

19.11. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.
- Obradivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93€.
- Izvođač radova je uveden u posao 03.09. 2020. godine, ali su radovi odmah obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Radovi su više puta nastavljeni i prekidani, bez krivice izvođača radova. Uglavnom su se izvodili radovi na rekonstrukciji tri mosta, gdje nije bilo problema sa eksproprijacijom, da bi se od 25.10.2021. godine, u dogovoru sa predstavnicima Opštine Danilovgrad, radovi nastavili na dionici puta od 3+651km do 8+300km.
- Radovi se odvijaju usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, usporenog izmještanja podzemnih instalacija, što je u nadležnosti Opštine Danilovgrad, slabog odziva projektanta na zahtjeve za pojašnjenje projektne dokumentacije, najska na stabla skadarskog hrasta duž trase puta, za čiju zaštitu je pokrenuta inicijativa od strane Crnogorskog društva ekologa.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 219.555,91€ za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

19.12. Izgradnja puta Srđevac – Lozna

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 267.038,21€ za kapitalne izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.

19.13. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije..
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 621.578,66€.

19.14. Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu



- Rekonstrukcija Ribarske ulice obuhvata radove na saobraćajnici dužine od cca 540m, sa dvije kolovozne trake širine po 2,75m i jednostranim trotoarom, izradu vodovoda, fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
- Revidovanu projektnu dokumentaciju obezbijedila je Opština Plav. Obradivač glavnog projekta je „Ding” d.o.o. Podgorica, a revident „Geotechnics, projects & consultings” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.07.2019. godine. Ugovor br. 01-7772/1 sa izvođačem, „PUTEVI BAR” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 299.689,94€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-7460/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 11.500,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 16.166,71 za tekuće izdatke, odnosno 187.578,43€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 203.745,14€, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

19.15. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu – TS

- Realizacija projekta obuhvata izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka, kao i izgradnju saobraćajnice za Biznis zonu u opštini Mojkovac.
- U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija trafostanice i infrastrukturnog priključka i saobraćajnice.
- **Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka**



- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za NDTS 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-8559//1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 89.243,04€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4801 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 2.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u 2020. Godini, atehnički prijem objekta u 2021. godini.
- Na realizaciji projekta za NDTS utrošeno 3.896,00€ za tekuće izdatke, odnosno 89.243,04€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 93.139,04€, od čega 5.354,00€ u 2021. godini.

• **Izgradnja saobraćajnice**

- Saobraćajnica za Biznis zonu je 760 m dužine.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.08.2018. godine. Ugovor br. 101 – 1560/1 – 5669/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.09.2018. godine, na iznos od 14.690,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 24.10.2018. godine. Ugovor br. 101 – 1560/1 – 7482 / 1 sa revidentom glavnog projekta, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 14.11.2018. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.03.2019. godine. Ugovor br. 01–5704/1 sa izvođačem, "IGP Fidiya" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.08.2019. godine, na iznos od 825.499,07€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.03.2019. godine. Ugovor br. 01–5872/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.08.2019. godine, na iznos od 17.460,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni sredinom 2020. godine.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 34.570,00€ za tekuće izdatke, odnosno 758.418,43€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 792.988,43€, od čega 4.345,80€ u 2021. godini.



19.16. Regionalna stočna pijaca u Beranama

- Regionalna stočna pijaca nalazi se u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim na regionalnom putu Berane - Rožaje. Kompleks se prostire na površini od 3.352 m².
- Projektovani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje. U okviru pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50 m koja opslužuje sve sadržaje kompleksa. Predviđen je parking prostor sa šest mjesta za kamione. Pored stočne pijace izgrađen je parking za posjetioce sa pristupnom saobraćajnicom širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- Aktivnosti na realizaciji izgradnje objekta portirnice sa veterinarskom inspekcijom, što je predstavljao početak izgradnje stočne pijace, sprovodila je Opština Berane.
- Uprava javnih radova je sprovodila aktivnosti na realizaciji izgradnje pijace, ukupne ugovorene vrijednosti 406.279,85€.
- U julu 2018. godine izvođač radova je, na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Berane, započeo radove I faze koji su obuhvatali i izgradnju parkinga za posjetioce. Radovi su završeni krajem 2018. godine.
- U 2019. godini ugovoreni su radovi II faze, a koji su obuhvatili sve preostale radove kako bi se stočna pijaca stavila u funkciju i isti su završeni 2020. godine.
- Na osnovu dostavljene dopune projektne dokumentacije od Opštine Berane, u 2020. godini su ugovoreni i izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete u okviru kompleksa stočne pijace i priključenju na elektroenergetsku mrežu.
- Završetkom ovih radova završeni su svi radovi na izgradnji kompleksa pijace, a koji su finansirani Zakonom o budžetu.
- Nakon što je komisija za tehnički pregled dostavila Konačne pozitivne izvještaje o tehničkom pregledu izvedenih radova na izgradnji komunalnog objekta - stočna pijaca i na izgradnji parking prostora, od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora opštine Berane, dana 23.07.2021. godine, izdate su upotrebne dozvole.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 13.854,64€ za tekuće izdatke, odnosno 361.495,72€ za kapitalne izdatke.
- Ukupno je realizovano 408.176,18€, od čega 31.152,46€ u 2021. godini.





19.17. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor

- Obaveza Opštine Kotor je da dostavi dokumentaciju, nakon čega će Uprava javnih radova pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada je utošeno 64.903,84€ za kapitalne izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.

19.18. Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama, opština Herceg Novi

- Na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Opštine Herceg Novi, javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 27.08.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-5967/1 sa izvođačem, "Briv Construction" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2021. godine, na iznos od 216.511,47€.
- Ugovor br. 01-334/21-6430/1 sa stručnim nadzorom, "Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi", je zaključen 22.12.2021. godine, na iznos od 5.808,00€.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

19.19. Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj, opština Herceg Novi

- Na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Opštine Herceg Novi, javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisana su krajem 2021. godine.
- Procijenjena vrijednost radova iznosi 140.000,00€ bez uračunatog PDV-a.
- U toku je procedura dosatvljanja ponuda.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

19.20. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Na realizaciji projekta u 2021. godini utošeno je 700.000,00€.

19.21. Rekonstrukci bulevara Save Kovačevića

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

19.22. Rekonstrukcija puta Gusinje-Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- Krajem 2021. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

19.23. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu

- Obaveza opštine je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava javnih radova na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

19.24. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu

- Opština Plav sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM:

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

**20. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I
UPRAVLJANJE**

20.1. Rekonstrukcija objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

- Za potrebe smještaja administrativnih organa planirana je prenamjena već izgrađenog objekta na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića, koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Izgrađeni objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova, ukupne bruto površina cca 6.990 m².
- Završena je izrada projektnog zadatka, na osnovu kojeg će biti urađen Glavni projekat rekonstrukcije, u cilju prilagođavanja novoj namjeni, opremanja i uređenja lokacije za potrebe Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova.
- Javno nadmetanje za odabir obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta objavljeno 02.07.2020. godine je poništeno, a novo javno nadmetanje je objavljeno 28.10.2020. godine.
- U 2021. godini je završeno vrednovanje ponuda, donijeta je odluga o izboru, a u toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.



20.2. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i Cetinje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada

državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.

- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 12.934,90€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- **Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Stare Vlade Crne Gore u Podgorici, dok je za zgradu Predsjednika Crne Gore završena izrada idejnog rješenja i isto je dostavljeno Upravi za imovinu na saglasnost.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.

- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu**

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2229/1 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 8.107,00€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Uprave carina u Podgorici, kao i revizija glavnog projekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- U 2021. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova za radove na prilagođavanju zgrade državnih organa u Mojkovcu i Uprave carina u Podgorici i tenderska procedura je u toku.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 8.107,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.

- **Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju**
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju raspisano je 10.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-944 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020, na iznos od 4.827,90€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju završena je revizija projektne dokumentacije i ista je dostavljena Upravi za imovinu kako bi u skladu sa Zaključkom Vlade preduzeli dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 4.827,90€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2021. godini.
