



**CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE**

**Izvještaj o realizaciji
Zakona o budžetu Crne Gore
za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godine**

Podgorica, februar 2023. godine



Sadržaj

UVOD 14

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA.....	20
REALIZACIJA PO PROJEKTIMA	38
I. TURISTIČKA DJELATNOST	39
1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE.....	40
1.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin.....	41
1.2. Ski centar na lokalitetu “Cmiljača” u Bijelom Polju.....	44
1.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	49
1.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama.....	54
1.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak.....	57
1.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju.....	57
1.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	66
1.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova..	67
1.9. Objekat “Kuća voća” u Andrijevići	67
1.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule	68
1.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”	69
1.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”	69
1.13. Izgradnja nove instalacije žičare postojećom trasom na "Savinom Kuku"	70
1.14. Ski poligon Žabljak	70
1.15. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	70
1.16. Izgradnja montažno-demontažnog boba na šinama na lokalitetu Ski centar “Kolašin 1600”.70	
1.17. Ski centar na lokalitetu "Lokve" – Berane.....	70
1.18. Izgradnja gondole na skijalištu na Jelovici - Berane	70
1.19. Izgradnja vodovoda u Klenku - Nikšić.....	70
II. EKOLOGIJA I PRIRODA.....	71
2. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE	72
2.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.....	73
2.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje.....	74
2.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	77

2.4.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	81
2.5.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	82
2.6.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	83
2.7.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	83
2.8.	Servisna zona u Gradiošnici, Opština Tivat	83
2.9.	Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	83
2.10.	Izgradnja sanitarne deponije „Duboki do” u Herceg Novom	83
2.11.	Postrojenje za proizvodnju električne energije na deponiji Livade	83
2.12.	Postrojenje za proizvodnju otpadnih guma na deponiji Livade	83
2.13.	Izgradnja sanitarne kade br.4 na deponiji Livade u Podgorici	83
2.14.	Izgradnja II faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žabljaku	84
2.15.	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	84
2.16.	Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-I faza	84
2.17.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Danilovgradu	84
2.18.	Izgradnja kanalizacione mreže u Danilovgradu	84
2.19.	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	84
2.20.	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza	84
2.21.	Uspostavljanje putne funkcije hidroloških stanica Rošca, Vranjske njive, Crna poljana i Trgaj 85	
2.22.	Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice	85
2.23.	Neuređena odlagališta otpada i regionalni centri za obradu otpada	85
2.24.	Izgradnja centra za prihvata životinja sa Cites liste sa zoološkim vrtom, Berane	85
2.25.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze 85	
2.26.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Čatovske livade-Rožaje	85
2.27.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Ibarac-Rožaje	85
2.28.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-I faza, Bijelo Polje	85
2.29.	Vodosnadbijevanje Pljevalja-izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja	85
2.30.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Breznica, Pljevlja	86
2.31.	Rekonstrukcija glavnog napojnog cjevovoda PPV Pliješ, Pljevlja	86
2.32.	Rekonstrukcija Glavnog dovoda sirove vode izvorišta Potpeć, Pljevlja	86
2.33.	Vodosnadbijevanje Donjeg Grblja	86
2.34.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	86

2.35.	Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić	86
2.36.	Projekat hidrogeoloških istraživanja ugljenokisjelih voda, Nedakusi-Bijelo Polje	86
2.37.	Izgradnja vodovoda Nedakusi-Šljepašnica.....	86
2.38.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića.....	86
2.39.	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda Komani-Bandići.....	87
2.40.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići.....	87
2.	b.PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR[ODRŽIVI RAZVOJ]	88
2.41.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama	89
2.42.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	90
2.43.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	90
2.44.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	91
III.	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	92
3.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA.....	93
3.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	94
3.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	94
3.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	96
3.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan.....	97
3.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima.....	98
3.6.	Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica.....	98
3.7.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	98
3.8.	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	98
3.9.	Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, Internog i palijativne njege, Nikšić	98
3.10.	Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	99
3.11.	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	99
3.12.	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav.....	99
3.13.	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju.....	99
3.14.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama, Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	99
3.15.	Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore	99

3.16.	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju.....	99
3.17.	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi –opšta Bolnica Berane	100
3.18.	Adaptacija Doma zdravlja Budva.....	100
3.19.	Adaptacija i rekonstrukcija domova zdravlja.....	100
3.20.	Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru.....	100
3.21.	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama.....	100
3.22.	Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj.....	100
3.23.	Sanacija objekta i unapređenje funkcionisanje ambulate dr Niko Miljanić Velimlje	100
3.	b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ZDRAVSTVO	101
3.24.	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	102
3.25.	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	103
3.26.	Rekonstrukcija Laboratorije 3 nivoa	104
3.27.	Radovi na izgradnji operativnog centra	105
IV.	UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA	107
4.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA 108	
4.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde.....	109
4.2.	Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac.....	111
4.3.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija.....	112
4	b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE	113
4.4.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa.....	114
4.5.	Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i	114
V.	UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA.....	115
5.	PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR JAVNA BEZBJEDNOST I ODBRANA	116
5.1.	Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite.....	117
5.2.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	117
VI.	JAVNA BEZBIJEDNOST.....	118
6.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI	119

6.1.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	120
6.2.	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici.....	121
VII.	FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE	123
7.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE.....	124
7.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore...	125
7.2.	Izgradnja objekata za prihvatanje i servisiranje vazduhoplova-hangar "Knjaz Danilo" u Golubovcima	125
7.3.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	125
7.4.	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici.....	125
VIII.	SOCIJALNA ZAŠTITA.....	126
8.	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA.....	127
8.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	128
8.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću.....	130
8.3.	Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	131
8.4.	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	131
8.5.	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi 132	
8.6.	Izgradnja Doma starih u Plavu	132
IX.	INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ	133
9.	a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE.....	134
9.1.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada.....	135
9.2.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja.....	135
9.3.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice.....	135
9.4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje.....	135
9.5.	Unapređenje turističke ponude grada.....	135
9.6.	Adaptacija prostora u d.o.o. Sportski centar Cetinje	135
9.7.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica.....	135
9.8.	Unapređenje gradski, lokalnih i nekategorisanih puteva.....	135
9.9.	Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	135

9.10.	Rekonstrukciju, adaptaciju dječijeg objekta bolničkog kompleksa JZU Danilo I - objekata stare dječije bolnice i nekadašnji objekat bolnice Danilo I	135
9.11.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju.....	135
9.12.	Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza.....	137
9.13.	Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske	137
9.14.	Izgradnja II faze pristupnog puta	137
9.15.	Rekonstrukcija Bajičke ulice	137
X.	UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA	138
10.	a. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTO-PUTA BAR-BOLJARE.....	139
10.	b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR SAOBRAĆAJ.....	140
10.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju.....	141
10.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	142
10.3.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	142
10.4.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju.....	143
10.5.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju.....	143
10.6.	Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj.....	144
10.7.	Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika	145
10.8.	Upravljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u CG.....	145
XI.	UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA, NAUKE, KULTURE I SPORTA.....	146
11.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE	147
11.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	148
11.2.	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	150
11.3.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica	152
11.4.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica	152
11.5.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica	152
11.6.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatnici, Podgorica.....	152
11.7.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	153

11.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	153
11.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	153
11.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	153
11.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru.....	153
11.12. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	154
11.13. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju.....	154
11.14. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan " u Bijelom Polju	155
11.15. Naučno-tehnološki park u Podgorici	157
11.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici....	158
11.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	158
11.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	158
11.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	159
11.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	159
11.21. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	159
11.22. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	159
11.23. Osnovna škola u Igalu.....	159
11.24. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	160
11.25. Rekonstrukcije objekata Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica.....	160
11.26. Osnovna škola u Tivtu	160
11.27. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi.....	161
11.28. Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica.....	161
11.29. Izgradnja Osnovne škole u Blok 35/36, Tuški put, Podgorica	161
11.30. Sufinansiranje izgradnje vrtića „Naša Radost” na Savini.....	161
11.31. Izgradnja vrtića u Grblju	162
11.32. Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ „Pavle Žižić” – Njegnjevo, Bijelo Polje.....	162
11.33. Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje stručne škole Bijelo Polje	162

11.34. Izgradnja školske sportske dvorane JU OŠ „Džafer Nikočević” Gusinje	162
11.35. Izgradnja dječijeg vrtića u naselju Srpska, Golubovci	162
11.36. Izgradnja sportskih sala za dvije osnovne škole, Golubovci	162
11.37. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	162
11.38. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	163
11.39. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici.....	163
11.40. Izgradnja novog objekta OŠ " Vladimir Nazor" Masline Podgorica	163
11.41. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat.....	163
11.42. Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - područno odjeljenje u Donjim Lugama.....	163
11.43. Sanacija krova i postavljanje ograde oko dvorišta OŠ "Blažo Jokov Orlandić", Bar	163
11.44. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" –Komani	164
11.45. Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar	164
11.46. Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva.....	164
11.47. Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Radomir Mitrović" Berane	164
11.48. Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Polica" Berane	164
11.49. Izgradnja nove OŠ „Mladost” Bijelo Polje.....	164
11.50. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić.....	164
11.51. Izgradnja III osnovne škole –opština Rožaje	164
11.52. Izgradnja novog paviljona u sastavu OŠ „Oktoih” –Zabjelo	165
11. b. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA.....	166
11.53. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	167
11.54. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama.....	168
11.55. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	169
11.56. Izgradnja sportskih terena i sala	170
11.57. Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici	170
11.58. Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja.....	170
11.59. Izgradnja sportske sale za potrebe JU OŠ “Bajo Jojić” i Srednje mješovite škole u Andrijevići 170	
11.60. Renoviranje Doma mladih “Gorštak”	170
11.61. Sportska zona Kolasin-izrada projektne dokumentacije I izgradnja I faze.....	171
11.62. Pješačko biciklistička staza Dimiškin most – Kalače	171
11.63. Pokrivanje otvorenog bazena Vaterpolo i plivačkog kluba Jadran na Škveru, Herceg Novi. 171	

11.64. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	171
11.65. Fiskulturna sala "Ivo Visin" Prčanj, Kotor.....	171
11.66. Izgradnja gradskog bazena Berane.....	172
11.67. Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru.....	172
11.68. Adaptacija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva.....	172
11.c. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I MLADI173	
11.69. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	174
XII. ZAŠTITA,OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE	175
12. IZGRADNJA,REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE.....	176
12.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	177
12.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	178
12.3. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja „Creative Hubs”	179
12.4. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture.....	179
12.5. Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	180
12.6. Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću	181
12.7. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	181
12.8. Regionalni kreativni HUB u Bijelom Polju	181
12.9. Rekonstrukcija doma kulture "Vladimir Popović Španac"	181
12.10. Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru.....	181
12.11. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić.....	181
12.12. Intervencije na objektu Dvorac Kralja Nikole na Topolici Bar	182
12.13. Uređenje naselja Vranjina i tvrđave Lesendro.....	182
12.14. Teatar u Ulcinju.....	183
12.15. Kino sala, Ulcinj.....	183
12.16. Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane	183
12.17. Izgradnja nove zgrade Centra za kulturu, Berane	183
12.18. Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	183
12.19. Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	183
12.20. Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj.....	183
12.21. Sanacija Doma kulture na Jasenovom Polju opštine Nikšić.....	183
XIII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE.....	185

13. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE	186
13.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo)	187
13.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloloutvrda i uređenje korita rijeka	193
13.3. Izgradnja gradske pijace u Rožajama	195
13.4. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje	196
13.5. Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav.....	197
13.6. Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla, opština Bar i graničnog prelaza Božaj, opština Tuzi	197
13.7. Putni pravac Monte Rose	198
13.8. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	198
13.9. Izgradnja trga i šetališta u opština Bar	198
13.10. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića	199
13.11. Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović”	200
13.12. Izvođenje radova na adaptaciji seoskih puteva na području Komansko-Bandičkih sela Milati, Crvena Paprat, Mokanje i Bijela Rudina	200
13.13. Izgradnja puta Srđevac – Lozna	201
13.14. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	201
13.15. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor	201
13.16. Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama, opština Herceg Novi	201
13.17. Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj, opština Herceg Novi.....	202
13.18. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	202
13.19. Rekonstrukcija bulevara Save Kovačevića	202
13.20. Rekonstrukcija puta Gusinje-Vusanje.....	203
13.21. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu	203
13.22. Sanacija puta Kruševica-Vrbanj-Orjen, sa adaptacijom planinskog doma.....	203
13.23. Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare.....	203
13.24. Izgradnja saobraćajnice od hotela "Durmitor" do Ravnog Žabljaka.....	204
13.25. Nastavak radova na zaobilaznici u Beranama.....	204
13.26. Rekonstrukcija ulice Ludviga Kube.....	204
13.27. Modernizacija lokalnog puta Hurije-Donja Lovnica-Ćosovica u Rožajama.....	204

13.28. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	204
13.29. Rekonstrukcija Trga "21.jul", Berane	205
13.30. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka.....	205
13.31. Adaptacija prostora službe zaštite i spašavanja u Bijelom Polju	205
13.32. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	205
13.33. Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike.....	205
13.34. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od „Galeba” do Titove vile.....	206
13.35. Rekonstrukcija šetališta „Belane” u Opštini Tivat - II faza.....	206
13.36. Izgradnja pješačke i biciklističke staze u dužini od 10km od Doljana do Meduna	206
13.37. Izgradnja dijela zaobilaznice u Pljevljima od raskrsnice kod "Balkana" do raskrsnice kod "Sekcije za puteve", Pljevlja.....	206
13.38. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen.....	206
13.39. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen.....	207
13.40. Sanacija puta Danilovgrad-Manastir Ostrog.....	207
13.41. Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	208
13.42. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	209
13.43. Rekonstrukcija buleva „13. Jul” Nikšić.....	209
13.44. Rekonstrukcija lokalnog puta Javorovača –Njegovuđa, Žabljak.....	209
13.45. Glavna ulica u Gusinju	209
13.46. Izgradnja buleva u Ulcinju	210
13.47. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	210
13.48. Lokalni put Rožaje (Kujevići, Hadžići, Fejići)	210
13.49. Rekonstrukcija lokalnog puta Šljepašnica-Još, putni pravac Kisjele vode	210
13.50. Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama.....	210
13.51. Rekonstrukcija lokalnih puteva – Stevanovac, Jahoviće, Bjelojeviće, Juškovića Potok, Ravni, Štitarica, Slatina, Uroševina, Gostilovina, Iepenac, Žari – Mojkovac.....	210
13.52. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva – Brezojevice, Velika, Novšiće, Mašnica, Gornja Ržanica – Plav.....	211
13.53. Rekonstrukcija lokalnih puteva – Bašča, Radevića Mala, Bijela crkva, Bogaje, Bukovica – Rožaje	211
13.54. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani	211

13.55. Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće	211
13.56. Izrada projektne dokumentacije za pristupni put i zaobilaznicu centralnom jezgru Virpazara 212	
13.57. Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar	212
13.58. Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić	212
13.59. Rekonstrukcija Krupačke ulice – Nikšić	212
13.60. Rekonstrukcija međupštinskog puta Šavnik-Plužine –JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN	212
13.61. Rekonstrukcija seoskog, asfaltiranog, nekategorisanog puta Komani-Bandići (preko Mokanja, Bijelih rudina i Malenze).....	213
13.62. Izgradnja balon sale u Andrijevići.....	213
13.63. Izgradnja Vatrogasno –spasilačkog doma u Nikšiću	213
13.64. Rekonstrukcija spomen kuće vojvode Gavra Vukovića, Berane.....	213
13.65. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča – Andrijevića	213
13.66. Projektovanje i izgradnja puta Nikšićka Župa –Kapetanovo jezero.....	214
13.67. Sanacija puta Maočići Velimlje -Petrovići, dionica Maočići –Velimlje.....	214
13.68. Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje	214
13.69. Rekonstrukcija puta lokalnog puta Veruša -petlja Veruša.....	214
13.70. Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom	214
13.71. Sanacija putnog pravca Šipačno Nikšić	214
XIV. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA	215
14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE.....	216
14.1. Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	217
14.2. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	217
14.3. Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta.....	218

UVOD

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu **95.625.655,71€**, od čega je **95.518.170,89€** iz budžetskih sredstava, **65.228,02€** iz kredita, **956,80€** donacija i **41.300,00€** IPA sredstva.

U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine ukupan procenat realizacije Kapitalnog budžeta iznosio je 60,36%, odnosno isplaćena su sredstva u iznosu od 57.718.852,60€, od čega 52.987.932,60€ iz budžetskih sredstava, 144.393,52 iz kreditnih sredstava, 4.586.526,48€ iz IPA fondova.

Dodatno, zaključno sa 31.12.2022. godine, Upravi za kapitalne projekte su ispostavljene situacije/računi ugovarača u iznosu od 540.472,07€, a koje nijesu isplaćene u 2022. godini s obzirom na to da su ispostavljene obaveze prevazilazile iznos opredjeljen Zakonom o budžetu za predmetne projekte.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 110 projekata u okviru kojih se realizuju brojni podprojekti.

U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Uprava za kapitalne projekte je zaključila **73** ugovora, čija vrijednost iznosi 45.961.092,25€.

U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala **124** postupka javne nabavke čija vrijednost iznosi 100.025.650,00€.

Kroz Izvještaj o realizaciji za 2022. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Takođe, realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava za kapitalne projekte ne može uticati, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama, kao i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Prijedlog Uprave za kapitalne projekte bio je da se, u okviru obezbijedenih sredstava Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijedeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost i odloženo finansiranje projekata, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi izgradnje.

Na ukupno 110 projekata nije bilo utroška sredstava.

Takođe, u skladu sa predmetnom Odlukom potrošačke jedinice kandiduju projekte za finansiranje, dostavljajući Obrasce koji sadrže podatke o pripremljenoj dokumentaciji i zrelosti samih projekata za realizaciju. Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020)), nisu bili dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom, sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava za kapitalne projekte ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane

Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog koji često dolazi i do obustave radova od strane trećih lica.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017) i u IPA III perspektivi (2021-2027) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2021.

Takođe, bilo je planirano da Uprava realizuje i projekte iz Godišnjeg akcionog programa 2019, kako za sektor saobraćaja, tako i za sektor životne sredine, međutim prošle godine su u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, sredstva planirana za ove projekte preusmjerena su na spječavanje širenja i saniranje posljedica epidemije virusa COVID-19.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćen ovim programima je 27.

Uprava za kapitalne projekte na mjesečnom nivou priprema dinamičke planove realizacije svih projekata u kojima blagovremeno i kontinuirano ukazuje na projekte čija je realizacija ugrožena i iste dostavlja Kancelariji za evropske integracije, Ministarstvu finansija, kao i nadležnim ministarstvima na komentar, upoznavanje i preduzimanje adekvatnih aktivnosti na nivou strukture.

Kao što smo već ranije napominjali, u cilju ugovaranja projekata na vrijeme jedan od je kvalitet tenderske dokumentacije, prvenstveno tehničkih specifikacija koji su sastavni dio tenderske dokumentacije, a koje najčešće pripremaju korisnici (ministarstva) u saradnji sa konsultantima i dostavljaju Upravi za kapitalne projekte na dalje postupanje.

Nedovoljno kvalitetno obrađene tehničke specifikacije najčešće rezultiraju velikim broj pitanja potencijalnih ponuđača. Za pojedine projekte koji se realizuju kroz navedene programe, propusti/nejasnoće u tehničkim specifikacijama su u krajnjem doveli do poništenja tenderskih postupaka.

Evaluacione komisije čine članovi sa pravom glasa, a koji su uvijek predstavnici korisnika (ministarstava), i predsjednik i sekretar, koji nemaju pravo glasa i predstavnici su Uprave za kapitalne projekte. Iskusni članovi Evaluacione komisije, koji ažurno i posvećeno rade na vrednovanju ponuda su ključni za uspješan završetak evaluacionog procesa. Iz izvještaja DEU kojima se odbijaju evaluacioni izvještaji komisija za određene projekte, zaključuje se da komisija nije prihvatila i nije postupala u skladu sa komentarima DEU, što je dovelo do prolongiranja procesa evaluacije i u krajnjem isticanja rok za ugovaranje projekta.

Uprava za kapitalne projekte ažurno i posvećeno radi na sprovođenju svih koraka i procedura, u skladu sa svojim nadležnostima, stavljajući se na raspolaganju članovima komisije.

Uprava za kapitalne projekte nema mandat da utiče na rad drugih institucija i zaposlenih u tim institucijama, prvenstveno članova komisije, iako direktno utiču na dinamiku i kvalitet realizacije projekta kod ove Uprave.

O pitanju navedene problematike, na zahtjev Uprave za kapitalne projekte, nastavila se pojačana komunikacija i organizacija sastanaka na najvišem nivou kako bi se kod upravljačke strukture uticalo da kroz svoje aktivnosti obezbijedi proces rada svih uključenih u realizaciju IPA projekata.

Pritisci na Upravu za kapitalne projekte koji se koji su se ponovili i ove godine godine kako bi se ispoštovali rokovi za ugovaranje, rokovi za završetak realizacije projekta ili povlačenje sredstava i time nadomjestilo izgubljeno vrijeme, ne predstavljaju sistemsko rješenje problema. Uprava za kapitalne projekte je uvijek spremna da svojim dodatnim anagožavnjem pokuša nadomjestiti vrijeme koje je izgubljeno na realizaciji projekta od perioda programiranja, pripreme od strane korisnika, a kasnije u postupku javne nabavke, iako je već u trenutku raspisivanja tendera za određene projekte bilo očito da su svi dinamički rokovi minimalni i da je ugovaranje u roku ugroženo. 15. decembra 2021. godine, održan je putem online platforme, XVI redovni sastanak Nadglednog odbora IPA, na kojem su se razmatrali statusi programiranja, pripreme i sprovođenje svih akcija koje finansira EU, posebno u dijelu koji se odnosi na programe koji se sprovode u indirektnom upravljanju. Tokom sastanka, gđin Yngve Engstroem, Šef odsjeka za saradnju EU delegacije u Crnoj Gori, i gđa Barbara Jesus Gimeno su posebno istakli pozitivne promjene unutar Uprave za kapitalne projekte, što je rezultiralo ispunjavanjem svih obaveza i ugovaranjem aktuelnih projekata u okviru CAP2017 programa, što je ocijenjeno kao veliki uspjeh i napredak u odnosu na prethodni period.

Pored navedenih, tekućih pitanja, Uprava za kapitalne projekte je 2020. godine brojnim dopisima, molbama i zahtjevima urgirala kod upravljačke strukture da se razmotri reorganizacija IPA strukture u samoj Upravi. Zvaničan pokušaj Uprave za kapitalne projekte tokom 2016. godine da se kroz sistematizaciju izdvoji sektor za implementaciju IPA projekata na čijem jačanju bi se sistemski radilo, je bio oštro kritikovan i odbijen. Kao rezultat ovakvog postupanja, u Upravi smo imali situaciju da su IPA službenici raspoređeni po svim sektorima baveći se raznoraznim poslovima iz djelokruga Uprave.

Vlada Crne Gore je 30. jula 2021. godine usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za kapitalne projekte. U skladu sa usvojenim Pravilnikom formirane su četiri unutrašnje organizacione jedinice. Jedna od internih jedinica je novi sektor, Sektor za upravljanje IPA projektima, koji se sastoji od tri odsjeka:

1. Odsjek za ugovaranje, implementaciju i superviziju međunarodnih projekata
2. Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumentacije međunarodnih projekata
3. Odsjek za finansijsko-računovodstvene postupke međunarodnih projekata.

Novina ovog pravilnika je da je po prvi put u okviru organizacije i ljudskih resursa predviđen novi sektor koji obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka javnih nabavki i realizaciju projekata finansiranih sredstvima EU. Takođe, novina je da je za ovaj sektor predviđeno mjesto pomoćnika direktora. Sve ove novine su nesumnjivo uticale na bolju i efikasniju organizaciju IPA aktivnosti, kao i na podjelu dužnosti.

Ipak, preopterećenost složenim procesom rada rezultira kontinuiranim odlaskom zaposlenih, koji se vrlo teško nadomjesti, naročito imajući u vidu da je proces obuke dugotrajan pa se Uprava za

kapitalne projekte konstantno suočava sa nedostatkom kadra upoznatog sa radom na realizaciji IPA projekata.

Prijedlog Uprave za kapitalne projekte bio je i da se kroz reorganizaciju čitave IPA operativne strukture unaprijedi rad svih uključenih na IPA projektima od programiranja, preko pripreme ulaznih podataka i dokumentacije od strane krajnjih korisnika, korisnika, ministarstava čime će se unaprijediti kvalitet dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kapitalne projekte.

Nepromijenjena je činjenica da pored toga što je u Upravi za kapitalne projekte inženjerski kadar deficitaran, ni na tržištu rada nema zainteresovanih inženjera koji bi u uslovima koje može obezbjediti Uprava bili zainteresovani za odgovoran i uskospecijalizovan posao projekt menadžera na infrastrukturnim projektima koji se realizuju u skladu sa složenim FIDIC i PRAG pravilima. Ovo pitanje je ključno za dalju efikasnu realizaciju IPA programa, naročito imajući u vidu broj projekata koji uskoro dolaze na realizaciju.

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi za kapitalne projekte je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi. S toga je neophodno u okviru tekućeg budžeta planirati sredstva za povećanje zarada ljudi zaposlenih u Upravi za kapitalne projekte, koje će biti u zavisnosti od realizacije kapitalnog budžeta.

Tabelarni prikaz plaćanja po programima

		Planirano KB	Realizacija
Program 11 052	Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa	180.102,00	122.402,14
Program 12 024	Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa	1.164.535,02	1.427.843,31
Program 13 023	Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova	16.000	0,00
Program 13 024	Javna bezbjednost	3.324.401,00	2.296.244,78
Program 13 025	Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	1.361.800,00	206.418,41
Program 15 019	Turistička djelatnost	19.849.589,98	11.357.945,93
Program 15 030	Industrijski i regionalni razvoj	9.157.209,61	7.957.985,70
Program 17 019	Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja	2.434.057,07	4.686.384,83
Program 17 020	Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje	23.640.716,85	15.853.481,92
Program 18 003	Ekologija i priroda	9.521.656,10	3.269.229,60
Program 19 032	Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema, nauke, kulture i sporta	15.821.142,98	8.697.476,20
Program 20 021	Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	2.093.345,01	66.416,95
Program 21 011	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	5.596.216,47	1.515.650,49
Program 22 025	Socijalna zaštita	1.464.883,62	261.372,34
	UKUPNO	95.625.655,71	57.718.852,60

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2022. GODINU 31.12.2022. godine

41506	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2022. GODINU			PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2022.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO	Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	30,002.00	150,100.00	180,102.00	6,050.00	116,352.14	122,402.14
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	20,000.00	100.00	20,100.00	6,050.00	0.00	6,050.00
1.2.	Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti	2.00	150,000.00	150,002.00	0.00	116,352.14	116,352.14
1.3.	Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	4,712,892.96	18,927,823.89	23,640,716.85	2,374,786.78	13,478,695.14	15,853,481.92
2.1.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	268,200.00	4,700,000.00	4,968,200.00	192,092.31	4,644,776.83	4,836,869.14
2.1.1.	Lokalni putevi	268,200.00	4,700,000.00	4,968,200.00	186,188.74	4,517,356.12	4,703,544.86
2.2.2.	Gradske saobraćajnice	0.00	0.00	0.00	5,903.57	127,420.71	133,324.28
2.3.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	19,268.91	287,000.00	306,268.91	0.00	2,486.68	2,486.68
2.4.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	10,000.00	122,743.45	132,743.45	0.00	0.00	0.00
2.5.	Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje	9,000.00	136,100.00	145,100.00	3,630.00	38,437.49	42,067.49
2.6.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	1,001.00	50,000.00	51,001.00	0.00	0.00	0.00
2.7.	Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla i Božaj	12,461.47	416,318.88	428,780.35	10,123.20	416,318.88	426,442.08
2.8.	Putni pravac Monte Rose Tivat	1,720,000.00	740,100.00	2,460,100.00	864,645.00	0.00	864,645.00
2.9.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	16,072.42	123,000.00	139,072.42	0.00	0.00	0.00
2.10.	Izgradnja trga i šetališta u Sutormu opština Bar	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2.11.	Izgradnja puta Danilovgrad Spuž preko Martiniča	249,900.00	269,452.45	519,352.45	244,027.71	227,252.45	471,280.16
2.12.	Izgradnja puta Srdevac Lozna	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

2.13.	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	1,000.00	1,016,729.62	1,017,729.62	0.00	780,891.02	780,891.02
2.14.	Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece O Kotor	32,226.84	123,100.00	155,326.84	0.00	0.00	0.00
2.15.	Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama o H Novi	6,428.97	216,372.00	222,800.97	5,808.00	216,182.80	221,990.80
2.16.	Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj O H Novi	5,000.00	185,100.00	190,100.00	0.00	101,104.94	101,104.94
2.17.	Rekonstrukcija, Bulevar Veljka Vlahovića	1,000.00	1,200,100.00	1,201,100.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2.18.	Rekonstrukci bulevara Save Kovačevića	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.19.	Rekonstrukcija puta Gusinje Vusanje	16,115.00	1,100.00	17,215.00	16,015.00	0.00	16,015.00
2.20.	Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu	16,072.42	82,000.00	98,072.42	0.00	82,000.00	82,000.00
2.21.	Sanacija puta Kruševica - Vrbanj - Orijen, sa adaptacijom planinskog doma	11,501.00	776,900.00	788,401.00	10,648.00	776,332.93	786,980.93
2.22.	Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	4,289.69	0.00	4,289.69	0.00	0.00	0.00
2.23.	Izgradnja saobraćajnice od hotela "Durmitor" do Ravnog Žabljaka	9,001.00	1,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
2.24.	Izgradnja kružne raskrsnice u Danilovgradu	1,001.00	84,938.38	85,939.38	0.00	0.00	0.00
2.25.	Nastavak radova na zaobilaznici u Beranama	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2.26.	Rekonstrukcija ulice Ludviga Kube	1,001.00	1,000.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00
2.27.	Modernizacija lokalnog puta Hurije - Donja Lovnica - Kosovica u Rožajama	35,441.33	82,000.00	117,441.33	0.00	81,999.89	81,999.89
2.28.	Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	6,428.97	0.00	6,428.97	0.00	0.00	0.00
2.29.	Rekonstrukcija Trga "21.jul", Berane	1,001.00	78,424.45	79,425.45	0.00	0.00	0.00
2.30.	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	20,001.00	1.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00
2.31.	Adaptacija prostora službe zaštite i spašavanja u Bijelom Polju	9,725.45	98,400.00	108,125.45	0.00	0.00	0.00
2.32.	Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.33.	Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	32,226.84	82,000.00	114,226.84	0.00	0.00	0.00
2.34.	Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	32,226.84	82,000.00	114,226.84	0.00	82,000.00	82,000.00

2.35.	Rekonstrukcija šetališta Belane u Opštini Tivat - II faza	32,144.84	82,000.00	114,144.84	0.00	0.00	0.00
2.36.	Izgradnja pješačke i biciklističke staze u dužini od 10km od Doljana do Meduna	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.37.	Izgradnja dijela zaobilaznice u Pljevljima od raskrsnice kod "Balkana" do raskrsnice kod "Sekcije za puteve", Pljevlja	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.38.	Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen	266,013.91	328,000.00	594,013.91	0.00	0.00	0.00
2.39.	Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen	169,579.38	410,000.00	579,579.38	0.00	0.00	0.00
2.40.	Sanacija puta Danilovgrad-Manastir Ostrog	1,120.00	320,000.00	321,120.00	1,117.27	227,045.46	228,162.73
2.41.	Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.42.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	64,289.69	880,000.00	944,289.69	10,139.80	727,888.77	738,028.57
2.43.	Rekonstrukcija buleva 13. Jul Nikšić	289.69	0.00	289.69	0.00	0.00	0.00
2.44.	Rekonstrukcija lokalnog puta Javorovača – Njegovuda, Žabljak	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.45.	Glavna ulica u Gusinju	10,000.00	104,144.84	114,144.84	0.00	0.00	0.00
2.46.	Izgradnja buleva u Ulcinju	1,010,000.00	10,000.00	1,020,000.00	1,008,010.00	0.00	1,008,010.00
2.47.	Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00
2.48.	Lokalni put Rožaje (Kujevići, Hadžići, Fejzić)	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	128,412.47	128,412.47
2.49.	Rekonstrukcija lokalnog puta Šljepašnica-Još, putni pravac Kisle vode	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.50.	Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.51.	Rekonstrukcija lokalnih puteva - Stevanovac, Jahoviće, Bjelojeviće, Juškovića Potok, Ravni, Štitarica, Slatina, Uroševina, Gostilovina, Lepenac, Žari - Mojkovac	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00
2.52.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva - Brezjevice, Velika, Novšiće, Mašnica, Gornja Ržanica - Plav	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	149,274.32	149,274.32
2.53.	Rekonstrukcija lokalnih puteva - Bašča, Radevića Mala, Bijela Crkva, Bogaje, Bukovica - Rožaje	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	13,535.01	13,535.01

2.54.	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani	4,642.90	1,080,180.00	1,084,822.90	4,416.50	842,925.83	847,342.33
2.55.	Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće	1,864.40	415,600.00	417,464.40	1,815.00	394,387.93	396,202.93
2.56.	Izrada projektne dokumentacije za pristupni put i zaobilaznicu centralnom jezgri Virpazara	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.57.	Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.58.	Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić	6,428.97	319,800.00	326,228.97	0.00	202,722.16	202,722.16
2.59.	Rekonstrukcija Krupačke ulice - Nikšić	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2.60.	Rekonstrukcija međuoštinskog puta Šavnik-Plužine -JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN	1,844.15	0.00	1,844.15	0.00	0.00	0.00
2.61.	Rekonstrukcija seoskog, asfaltiranog, nekategorisanog puta Komani-Bandići (preko Mokanja, Bijelih rudina i Malenze)	10,000.00	573,144.84	583,144.84	2,298.99	550,318.71	552,617.70
2.62.	Izgradnja balon sale u Andrijevići	0.00	109,873.98	109,873.98	0.00	0.00	0.00
2.63.	Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.64.	Rekonstrukcija spomen kuće vojvode Gavra Vukovića, Berane	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.65.	Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, Rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča - Andrijevića	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	119,255.02	119,255.02
2.66.	Projektovanje i izgradnja puta Nikšićka Župa - Kapetanovo jezero	30,000.00	480,000.00	510,000.00	0.00	476,127.68	476,127.68
2.67.	Sanacija puta Maočići Velimlje -Petrovići, dionica Maočići -Velimlje	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,017.87	997,017.87
2.68.	Rekonstrukcija puta Gusinje -Grebaje	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.69.	Rekonstrukcija puta lokalnog puta Veruša - petlja Veruša	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.70.	Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2.71.	Sanacija putnog pravca Šipačno Nikšić	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	651,209.61	8,506,000.00	9,157,209.61	546,361.50	7,411,624.20	7,957,985.70
3.1.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	307,969.50	0.00	307,969.50	307,969.50	0.00	307,969.50
3.2.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	5,747.25	531,000.00	536,747.25	5,717.25	531,000.00	536,717.25
3.3.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	419,483.56	419,483.56
3.4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	0.00	221,200.00	221,200.00	0.00	221,183.64	221,183.64
3.5.	Unapređenje turističke ponude grada	133,406.00	9,000.00	142,406.00	109,583.59	6,578.24	116,161.83
3.6.	Adaptacija prostora u doo Sportski centar Cetinje	614.02	764,000.00	764,614.02	605.00	758,258.40	758,863.40
3.7.	Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	129,134.19	1,798,000.00	1,927,134.19	54,926.42	1,785,313.04	1,840,239.46
3.8.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	19,600.51	1,483,800.00	1,503,400.51	18,331.50	1,465,686.59	1,484,018.09
3.9.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	19,201.03	470,000.00	489,201.03	15,179.77	460,972.28	476,152.05
3.10.	Rekon/adaptacija objekata bolničkog kompleksa JZU Danilo I-objekat stare dječje bolnice i stari objekat bolonice Danilo I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	29,856.70	2,200,000.00	2,229,856.70	29,825.57	1,347,720.22	1,377,545.79
3.12.	Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13.	Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ul. IV Proleterske	5,680.41	280,000.00	285,680.41	4,222.90	280,000.00	284,222.90
3.14.	Izgradnja II faze pristupnog puta	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,428.23	135,428.23
3.15.	Rekonstrukcija Bajičke ulice	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosudja	200,300.00	400.00	200,700.00	30,632.20	0.00	30,632.20
4.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde	100.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac	50,100.00	200.00	50,300.00	30,032.20	0.00	30,032.20
4.3.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	150,100.00	0.00	150,100.00	600.00	0.00	600.00

12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	16,614.00	947,221.02	963,835.02	16,214.00	1,380,997.11	1,397,211.11
5.1.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa	16,414.00	2,000.00	18,414.00	16,214.00	0.00	16,214.00
5.2.	Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica)	200.00	945,221.02	945,421.02	0.00	1,380,997.11	1,380,997.11
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	15,301.00	3,309,100.00	3,324,401.00	13,782.30	2,282,462.48	2,296,244.78
6.1.	Rekonstrukcija ob za potrebe Min unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju	200.00	10,100.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici	15,101.00	3,299,000.00	3,314,101.00	13,782.30	2,282,462.48	2,296,244.78
13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	330,400.00	1,031,400.00	1,361,800.00	1,035.00	205,383.41	206,418.41
6.3.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	160,100.00	206,400.00	366,500.00	1,035.00	205,383.41	206,418.41
6.4.	Izgradnja objekta za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	35,100.00	125,000.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00
6.5.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	35,100.00	415,000.00	450,100.00	0.00	0.00	0.00
6.6.	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	100,100.00	285,000.00	385,100.00	0.00	0.00	0.00
13 023 K01	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova -sektor Javne bezbjednosti i odbrane	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
7.1.	Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
7.2.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	407,207.07	1,216,850.00	1,624,057.07	1,920,345.82	1,965,577.32	3,885,923.14
8.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju	2,000.00	214,750.00	216,750.00	1,160.00	570,000.00	571,160.00

	pomoćnih objekata za navigaciju						
8.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1,000.00	142,500.00	143,500.00	773.18	625,528.86	626,302.04
8.3.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	213,000.00	0.00	213,000.00	1,071,108.45	0.00	1,071,108.45
8.4.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaju	130,850.00	2,000.00	132,850.00	495,126.20	0.00	495,126.20
8.5.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	13,235.95	793,000.00	806,235.95	74,623.00	770,048.46	844,671.46
8.6.	Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8.7.	Adaptacija/ Rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8.8.	Uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u CG	43,121.12	42,600.00	85,721.12	277,554.99	0.00	277,554.99
17 019 K01	Državna komisija za tehnički pregled auto puta	810,000.00	0.00	810,000.00	800,441.69	0.00	800,441.69
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	1,011,458.92	6,026,210.76	7,037,669.68	197,167.82	231,231.39	428,399.21
10.1.	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade MORT-a u Podgorici	184,368.09	167,100.00	351,468.09	178,435.47	0.00	178,435.47
10.2.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	64,450.09	328,100.00	392,550.09	2,178.00	166,186.01	168,364.01
10.3.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	64,531.45	203,460.00	267,991.45	11,051.90	4,940.00	15,991.90
10.4.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	128,739.14	246,100.00	374,839.14	5,502.45	18,725.00	24,227.45
10.5.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	64,471.69	164,100.00	228,571.69	0.00	0.00	0.00
10.6.	Unapređenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	6,507.37	73,900.00	80,407.37	0.00	0.00	0.00
10.7.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
10.8.	Servisna zona u Gradiošnici Opština Tivat	1,100.00	9,100.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00

10.9.	Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	64,371.69	1,341,370.38	1,405,742.07	0.00	0.00	0.00
10.10.	Izgradnja sanitarne deponije "Duboki do" u Herceg Novom	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
10.11.	Postrojenje za proizvodnju električne energije na deponiji Livade	1,001.00	1,000.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00
10.12.	Postrojenje za proizvodnju otpadnih guma na deponiji Livade	1,001.00	1,000.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00
10.13.	Izgradnja sanitarne kade br.4 na deponiji Livade u Podgorici	200.00	530,000.00	530,200.00	0.00	0.00	0.00
10.14.	Izgradnja II faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žablaku	64,371.69	205,000.00	269,371.69	0.00	0.00	0.00
10.15.	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	25,797.88	139,400.00	165,197.88	0.00	0.00	0.00
10.16.	Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice - I faza	3,296.48	104,140.00	107,436.48	0.00	0.00	0.00
10.17.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Danilovgradu	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
10.18.	Izgradnja kanalizacione mreže u Danilovgradu	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
10.19.	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	10,001.00	720,000.00	730,001.00	0.00	0.00	0.00
10.20.	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza	51,513.75	0.00	51,513.75	0.00	0.00	0.00
10.21.	Uspostavljanje putne funkcije hidroloških stanica Rošca, Vranjske njive, Crna poljana i Trgaj	9,725.45	82,000.00	91,725.45	0.00	0.00	0.00
10.22.	Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice	20,001.00	230,000.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00
10.23.	Neuređena odlagališta otpada i regionalni centri za obradu otpada	20,001.00	100,000.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00
10.24.	Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
10.25.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	51,513.75	20,500.00	72,013.75	0.00	0.00	0.00
10.26.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Čatovske livade - Rožaje	5,225.18	12,300.00	17,525.18	0.00	0.00	0.00
10.27.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Ibarac - Rožaje	3,939.38	86,100.00	90,039.38	0.00	0.00	0.00
10.28.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - I faza-Bijelo Polje	32,226.84	80,360.00	112,586.84	0.00	0.00	0.00
10.29.	Vodosnadbijevanje Pljevalja- izgradnja postrojenja za pitku vodu Plješ, Pljevlja	10,000.00	43,880.38	53,880.38	0.00	41,380.38	41,380.38

10.30.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Breznica, Pljevlja	9,900.00	90,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
10.31.	Rekonstrukcija glavnog napojnog cjevovoda PPV Pliješ, Pljevlja	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
10.32.	Rekonstrukcija Glavnog dovoda sirove vode izvorišta Potpeć, Pljevlja	20,000.00	280,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
10.33.	Vodosnabdijevanje Donjeg Grblja	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.34.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.35.	Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.36.	Projekat hidrogeoloških istraživanja ugljenokisjelih voda, Nedakusi-Bijelo Polje	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10.37.	Izgradnja vodovoda Nedakusi-Šljepašnica	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.38.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.39.	Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda Komani-Bandići	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.40.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	100.00	600,200.00	600,300.00	0.00	0.00	0.00
10.41.	Izgradnja vodovoda u Klenku - Nikšić	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	2,005,360.70	17,844,229.28	19,849,589.98	421,154.78	10,936,791.15	11,357,945.93
11.1.	Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin	287,100.00	6,198,279.00	6,485,379.00	78,615.21	5,854,300.11	5,932,915.32
11.2.	Ski centar na lokalitetu "Čmiljača", Bijelo Polje	193,029.47	1,131,382.00	1,324,411.47	18,921.01	0.00	18,921.01
11.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	128,739.78	1,854,200.00	1,982,939.78	23,446.15	969,661.77	993,107.92
11.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	128,739.78	2,187,993.55	2,316,733.33	12,330.16	1,343,100.00	1,355,430.16
11.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	25,876.28	326,100.00	351,976.28	0.00	0.00	0.00
11.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	128,105.91	2,500,310.73	2,628,416.64	18,694.15	1,332,026.80	1,350,720.95
11.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	281,200.00	2,170,200.00	2,451,400.00	10,418.10	1,293,252.54	1,303,670.64
11.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	200,100.00	800,200.00	1,000,300.00	11,515.00	144,449.93	155,964.93
11.9.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevići	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.10.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	247,512.94	205,000.00	452,512.94	247,215.00	0.00	247,215.00

11.11.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osniježavanjem	50,100.00	200.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00
11.12.	Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	6,428.27	40,164.00	46,592.27	0.00	0.00	0.00
11.13.	Izgradnja nove instalacije žičare postojećom trasom na "Savinom Kuku"	1,100.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
11.14.	Ski poligon Žabljak	1,100.00	9,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
11.15.	Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	299,000.00	1,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.16.	Izgradnja montažno demontažnog boba na šinama na lokalitetu Ski centar Kolašin 1600	6,428.27	410,000.00	416,428.27	0.00	0.00	0.00
11.17.	Ski centar na lokalitetu "Lokve" - Berane	9,900.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.18.	Izgradnja gondole na skijalištu na Jelovici - Berane	9,900.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	273,657.99	2,210,328.43	2,483,986.42	775,906.18	2,064,923.67	2,840,829.85
12.1.	PPOV kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	11,057.99	2,210,328.43	2,221,386.42	10,822.15	2,064,923.67	2,075,745.82
12.3.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	132,000.00	0.00	132,000.00	414,825.93	0.00	414,825.93
12.5.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	91,000.00	0.00	91,000.00	350,258.10	0.00	350,258.10
12.11.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
19 032 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke	1,028,323.35	12,264,536.00	13,292,859.35	89,618.48	8,023,008.41	8,112,626.89
13.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	25,815.88	3,453,100.00	3,478,915.88	18,159.68	3,363,199.11	3,381,358.79
13.2.	Adaptacija objekata obrazovanja	150,100.00	850,100.00	1,000,200.00	7,140.00	517,129.54	524,269.54
13.3.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	260,922.03	78,436.00	339,358.03	0.00	0.00	0.00
13.3.1	Vrtić u City kvartu	90,083.97	8,300.00	98,383.97	0.00	0.00	0.00
13.3.2	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	6,507.37	8,300.00	14,807.37	0.00	0.00	0.00
13.3.3	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	45,081.18	8,300.00	53,381.18	0.00	0.00	0.00
13.3.4	Vrtić na Zlatici u Podgorici	38,652.21	8,300.00	46,952.21	0.00	0.00	0.00
13.3.5	Vrtić u Beranama	38,652.21	32,736.00	71,388.21	0.00	0.00	0.00
13.3.6	Vrtić u Bijelom Polju	38,652.21	8,300.00	46,952.21	0.00	0.00	0.00

13.3.7	Vrtić u Plavu	3,292.88	4,200.00	7,492.88	0.00	0.00	0.00
13.4.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB I	32,380.05	24,900.00	57,280.05	0.00	0.00	0.00
13.4.1	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	6,507.37	8,300.00	14,807.37	0.00	0.00	0.00
13.4.2	Vrtić u Baru	6,507.37	8,300.00	14,807.37	0.00	0.00	0.00
13.4.3	Vrtić u Ulcinju	19,365.31	8,300.00	27,665.31	0.00	0.00	0.00
13.5.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	64,368.09	506,100.00	570,468.09	0.00	0.00	0.00
13.6.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	10,100.00	2,310,100.00	2,320,200.00	5,868.50	1,745,075.29	1,750,943.79
13.7.	Naučno-Tehnološki park u Podgorici	53,438.84	2,870,200.00	2,923,638.84	19,957.74	1,737,071.62	1,757,029.36
13.8.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	109,841.26	29,400.00	139,241.26	0.00	0.00	0.00
13.8.1	Druga Gimnazija u Podgorici	3,292.88	4,200.00	7,492.88	0.00	0.00	0.00
13.8.2	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	38,652.21	4,200.00	42,852.21	0.00	0.00	0.00
13.8.3	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	3,292.88	4,200.00	7,492.88	0.00	0.00	0.00
13.8.4	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	6,507.37	4,200.00	10,707.37	0.00	0.00	0.00
13.8.5	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	6,507.37	4,200.00	10,707.37	0.00	0.00	0.00
13.8.6	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	38,652.21	4,200.00	42,852.21	0.00	0.00	0.00
13.8.7	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	12,936.34	4,200.00	17,136.34	0.00	0.00	0.00
13.9.	Osnovna škola u Igalu	38,734.22	700.00	39,434.22	0.00	0.00	0.00
13.10.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	10,100.00	260,100.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00
13.11.	Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne gore u Podgorici	64,368.09	5,100.00	69,468.09	36,556.56	0.00	36,556.56
13.12.	Osnovna škola u Tivtu	38,652.22	500.00	39,152.22	0.00	0.00	0.00
13.13.	Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
13.14.	Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.15.	Izgradnja Osnovne škole u Blok 35/36-Tuški put, Podgorica	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.16.	Sufinansiranje izgradnje vrtića "Naša Radost" na Savini	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	654,532.85	654,532.85
13.17.	Izgradnja vrtića u Grblju	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

13.18.	Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ „Pavle Žižić“ - Njegnjevo, Bijelo Polje	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.19.	Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje stručne škole Bijelo Polje	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.20.	Izgradnja školske sportske dvorane JU OŠ "Džafer Nikočević" Gusinje	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.21.	Izgradnja dječijeg vrtića u naselju Srpska, Golubovci	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.22.	Izgradnja sportskih sala za dvije osnovne škole, Golubovci	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.23.	Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	10,000.00	450,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
13.24.	Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.25.	Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	10,000.00	300,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
13.26.	Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	32,928.86	42,000.00	74,928.86	0.00	0.00	0.00
13.27.	Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.28.	Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - područno odjeljenje u Donjim Lugama	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.29.	Sanacija krova i postavljanje ograde oko dvorišta OŠ "Blažo Jokov Orlandić", Bar	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.30.	Renoviranje OŠ "Boško Radulović" -Komani	6,428.97	155,800.00	162,228.97	1,936.00	0.00	1,936.00
13.31.	Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.32.	Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.33.	Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Radomir Mitrović" Berane	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.34.	Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Polica" Berane	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.35.	Izgradnja nove OŠ "Mladost" Bijelo Polje	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.36.	Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	22,144.84	10,000.00	32,144.84	0.00	0.00	0.00
13.37.	Izgradnja III osnovne škole - opština Rožaje	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13.38.	Izgradnja novog paviljona u sastavu OŠ Oktoih na Zabjelu	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
19 032 K02	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	140,583.63	2,129,700.00	2,270,283.63	7,694.36	294,919.82	302,614.18
14.1.	Rekonstrukcija zapadna tribina FK Sutjeska u Nikšiću	100.00	510,100.00	510,200.00	0.00	152,155.79	152,155.79

14.2.	Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	9,857.38	126,500.00	136,357.38	6,756.64	121,236.31	127,992.95
14.3.	Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Kotoru	1,100.00	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
14.4.	Izgradnja sportskih terena i sala	10,100.00	390,100.00	400,200.00	937.72	0.00	937.72
14.5.	Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici	32,223.25	41,000.00	73,223.25	0.00	0.00	0.00
14.6.	Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
14.7.	Izgradnja sportske sale za potrebe JU OŠ "Bajo Jojić" i Srednje mješovite škole u Andrijevici	50,100.00	1,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00
14.8.	Renoviranje Doma mladih "Gorštak"	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
14.9.	Sportska zona Kolasin-izrada projektne dokumentacije i izgradnja I faze	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
14.10.	Pješačko biciklistička staza Dimiškin most - Kalače	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
14.11.	Pokrivanje otvorenog bazena Vaterpolo i plivačkog kluba Jadran na Škveru, Herceg Novi	1,000.00	23,000.00	24,000.00	0.00	21,527.72	21,527.72
14.12.	Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	10,000.00	890,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
14.13.	Fiskulturna sala "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
14.14.	Izgradnja gradskog bazena Berane	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
14.15.	Projekat izgradnje Olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
14.16.	Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	10,000.00	116,900.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00
19 032 K03	Prijekti koji se finansiraju iz IPA fondova sektor Obrazovanja, nauka, sport i mladi	7,000.00	251,000.00	258,000.00	12,633.31	269,601.82	282,235.13
15.1.	Inkluzija marginalnih grupa u obrazovni sistem	7,000.00	251,000.00	258,000.00	12,633.31	269,601.82	282,235.13
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	218,962.01	1,874,383.00	2,093,345.01	5,039.96	61,376.49	66,416.45
16.1.	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	9,724.81	303,682.00	313,406.81	5,039.96	61,376.49	66,416.45
16.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	5,100.00	10,100.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
16.3.	Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja Creative hubs	6,510.97	8,300.00	14,810.97	0.00	0.00	0.00

16.4.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	12,857.94	164,100.00	176,957.94	0.00	0.00	0.00
16.5.	Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
16.6.	Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću	1,200.00	9,100.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
16.7.	Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	1,100.00	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
16.8.	Regionalni kreativni HUB u Bijelom Polju	1,001.00	9,001.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00
16.9.	Rekonstrukcija doma kulture "Vladimir Popović Španac"	1,001.00	9,000.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00
16.10.	Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru	1,000.00	299,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
16.11.	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić	128,579.38	766,000.00	894,579.38	0.00	0.00	0.00
16.12.	Intervencije na objektu Dvorac Kralja Nikole na Topolici Bar	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16.13.	Uređenje naselja Vranjina i tvrđave Lesendro	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
16.14.	Teatar u Ulcinju	43,886.91	0.00	43,886.91	0.00	0.00	0.00
16.15.	Kino sala, Ulcinj	1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
16.16.	Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16.17.	Izgradnja nove zgrade Centra za kulturu, Berane	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
16.18.	Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
16.19.	Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
16.20.	Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
16.21.	Sanacija Doma kulture na Jasenovom Polju O Nikšić	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	488,533.42	4,697,433.05	5,185,966.47	30,217.91	1,262,942.58	1,293,160.49
17.1.	Rekonstrukcija energetske blokade trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	10,453.22	205,100.00	215,553.22	10,293.45	0.00	10,293.45
17.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš"- Podgorica	11,606.42	216,143.36	227,749.78	10,980.14	215,856.02	226,836.16
17.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	20,200.00	1,500,200.00	1,520,400.00	8,944.32	1,047,086.56	1,056,030.88
17.4.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan	19,443.71	397,600.00	417,043.71	0.00	0.00	0.00

17.5.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	1,100.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	9,100.00	1,100.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
17.7.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	9,100.00	1,100.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
17.8.	Izgradnja urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta kliničkog centra Crne Gore u PG	100,100.00	1,100.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00
17.9.	Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić	9,100.00	1,100.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
17.10.	Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	19,304.62	1,147,500.00	1,166,804.62	0.00	0.00	0.00
17.11.	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	50,100.00	1,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00
17.12.	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	10,100.00	40,100.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00
17.13.	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	9,725.45	164,000.00	173,725.45	0.00	0.00	0.00
17.14.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	50,100.00	350,000.00	400,100.00	0.00	0.00	0.00
17.15.	Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.16.	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	90,000.00	1,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
17.17.	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi –opšta Bolnica Berane	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
17.18.	Adaptacija odjeljenja izabranih ljekara za odrasle i fizijatriju DZ Budva	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
17.19.	Adaptacija i rekonstrukcija domova zdravlja	30,000.00	157,289.69	187,289.69	0.00	0.00	0.00
17.20.	Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.21.	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
17.22.	Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.23.	Sanacija objekta i unapređenje funkcionisanje ambulante dr Niko Miljanić Velimlje	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	13,000.00	397,250.00	410,250.00	8,041.00	214,449.00	222,490.00
18.1.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike	3,000.00	270,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00

	za dermatovenerologiju KC CG						
18.2.	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	6,000.00	11,000.00	17,000.00	8,041.00	0.00	8,041.00
18.3.	Rekonstrukcija Laboratorije 3 nivoa	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.4.	Radovi na izgradnji operativnog centra	2,000.00	108,250.00	110,250.00	0.00	214,449.00	214,449.00
22 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	98,329.62	1,366,554.00	1,464,883.62	17,262.36	244,131.02	261,393.38
19.1.	Izgradnja doma Starih u Podgorici	17,314.48	232,372.00	249,686.48	17,262.36	231,705.49	248,967.85
19.2.	Izgradnja doma Starih u Nikšiću	7,000.00	248,500.00	255,500.00	0.00	12,425.53	12,425.53
19.3.	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	25,797.88	287,082.00	312,879.88	0.00	0.00	0.00
19.4.	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	3,214.48	82,000.00	85,214.48	0.00	0.00	0.00
19.5.	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	12,857.94	147,600.00	160,457.94	0.00	0.00	0.00
19.6.	Izgradnja Doma starih u Plavu	32,144.84	369,000.00	401,144.84	0.00	0.00	0.00
	SVE UKUPNO	12,463,136.28	83,162,519.43	95,625,655.71	7,274,385.45	50,444,467.15	57,718,852.60

REALIZACIJA PO PROJEKTIMA

PROGRAM

I. TURISTIČKA DJELATNOST

POTPROGRAM:

1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Aktivnostima na realizaciji projekata "Unapređenja turističke ponude" koordinira nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje utvrđuje potrebe i prioritete i dostavlja dokumentaciju na osnovu koje Uprava za kapitalne projekte pokreće aktivnosti iz svoje nadležnosti kao naručilac posla.

1.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je u fazno.
- Završeni su radovi prve faze koja je obuhvatila: putnu infrastrukturu od Ski rezorta „Kolašin 1450” do Ski rezorta „Kolašin 1600” sa izgradnjom potpornih zidova; sanacija klizišta i izgradnja parkinga za dnevne skijaše, izgrađena je bazna stanica sa sistemom vodosnadbijevanja, žičara K8 sa pripadajućim cca 10km staza, trafostanica 35/10kW i dvije trafostanice 10/0,4kW, završena je nabavka dvije mašine za pripremu ski staza.
- Sve aktivnosti planirane za realizaciju prve faze su završene i ski centar je stavljen u funkciju krajem 2019. godine.
- Druga faza obuhvata radove na: izgradnji žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, garaže na lokalitetu „Kolašin 1450”, izgradnji vodosnadbijevanja i sistema za osnježavanja, izgradnji dva ski lifta, nabavci neophodne mehanizacije za pripremu i održavanje ski staza.
- Kroz drugu fazu je završena: izgradnja žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza.. U toku je izgradnja garaže na lokalitetu „Kolašin 1450” i ugovorena je izgradnja hidrotehničke infrastrukture za vodosnadbijevanje i osvježavanje. U toku su javna nadmetanja za izgradnju dva ski lifta tipa „sidro” i „tanjir”.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „sidro”

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju novog fiksnog Ski lifta tipa „sidro” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Procijenjena vrijednost radova je 1.720.000,00€ bez PDV-a.
- U toku je javno nadmetanje.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „tanjir”

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za Izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i Izgradnja novog fiksnog Ski lifta tipa „tanjir” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Procijenjena vrijednost radova je 1.245.000,00€ bez PDV-a.
- U toku je javno nadmetanje.

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od Ski rezorta Kolašin 1450 - Jezerine do Ski rezorta Kolašin 1600, II faza

- Radovi II faze obuhvataju preostali dio zemljanih radova, asfalterne radove i saobraćajnu opremu i signalizaciju na cijeloj dužini trase puta od 2,3km, kao i postavljanje 10kV kablova.
- Ugovor br. 1912-01-1689/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Via project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.04.2015. godine, na iznos od 19.873,00€.

- Ugovor br. 19/2-01-3196/2 sa revidentom glavnog projekta, "Simm inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen 17.07.2015. godine, na iznos od 3.867,50€,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-5753/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 1.331.618,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.04.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1000/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.03.2018. godine, na iznos od 9.758,00€.
- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 26.818,17 u 2022. godini.

Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji na putu Ski resort Kolašin 1450- Jezerine-Ski resort Kolašin 1600, II faza (PR1-PR8)

- Zbog pomjeranja jednog dijela trase puta od Ski resorta "Kolašin 1450" do Ski resorta "Kolašin 1600", napravljena je izmjena projekta saobraćajnice u dužini od oko 180m, a na tom dijelu je urađena dopuna projekta, odnosno projekat izgradnje potpornih zidova. U skladu sa finansijskim planom, izvođenje radova na izgradnji zidova podijeljeno je u dvije faze. I fazu čine zidovi od PR8 do PR14, a II fazu zidovi od PR1 do PR8.
- Projekat izrade potpornih konstrukcija rađen je kao dopuna glavnog projekta i obrađivač glavnog projekta za izradu puta je uradio projekat za izradu potpornih konstrukcija.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta I i II faze raspisano je 25.07.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-4523/1 sa revidentom glavnog projekta I i II faze, JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Podgorica, je zaključen 27.07.2018. godine na iznos od 695,00€.
- Ugovoru o izradi projektne dokumentacije zaključen je sa "GeoT" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor dodatnih istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneksa Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" I i II faze je raspisano 21.06.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavki malih vrijednosti. Ugovor za dodatna istraživanja za potrebe rekonstrukcije puta Jezerine i Aneks Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade izmjene glavnog projekta rekonstrukcije puta od Ski rezorta "Kolašin 1450" do Ski rezorta "Kolašin 1600" sa projektantom I i II faze, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 4.464,90€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.03.2019. godine. Ugovor br. 01-5068/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.07.2019. godine, na iznos od 488.835,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-9975/1 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska istraživanja" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2019. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 1.149,50 u 2022. godini.

Izrada Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10kV Kolašin 1450-1600

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 05.08.2019. godine. Ugovor br. 01-8109/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.10.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-8107/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.10.2019. godine, na iznos od 1.573,00€.
- Završena je tehnička revizija projekta.
- Konačni izvještaj revizije nije moguće kompletirati do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sprovođenje postupka eksproprijacije je u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja turizma, Opštine Kolašin i Skijališta Crne Gore. Sredstva za eksproprijaciju su obezbijedena na poseban žiro račun Ministarstva finansija.finsansija.
- Ukupno je realizovano 49.815,00€ u 2022. godini.

Žičara K8

- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mnm - Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.
- Ugovor br. 19/2-01-5740/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem šestosjedne žičare K8, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 8.979.740,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-6145/1 sa revidentom glavnog projekta šestosjedne žičare K8, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2016. godine, na iznos od 11.543,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-624/1 sa stručnim nadzorom na izgradnji šestosjedne žičare K8 i ski staza, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.07.2017. godine, na iznos od 99.960,00€.
- Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni.
- Ukupno je realizovano 88.384,51€ u 2022. godini.

Žičara K7 - povezivanje Kolašin 1450 - Kolašin 1600

- Prostornim planom posebne namjene “Bjelasica i Komovi” predviđena je izgradnja isklopive šestosjedne žičare K7 čijom izgradnjom će se povezati skijališta “Kolašin 1450” i “Kolašin 1600”. Kapacitet žičare je 2600 skijaša na sat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 26.03.2019. godine. Ugovor br. 01-6450/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, konzorcijum „Doppelmayr – Kolašin”, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 8.998.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7065/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 79.000,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Civilenginer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 4.035.175,26 u 2022. godini.

Ski staze uz žičaru K7

- Projekat se realizuje po principu “projektuj i izgradi”. Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa

obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Završeno je 97% ugovorenih radova i ski staze su stavljene u funkciju od strane Skijališta Crne Gore januara 2021. godine. Da bi se završila realizacija projekta potrebno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore u saradnji sa Upravom za saobraćaj riješe pitanje devastacije dijela ski staza koja je nastupila od strane izvođača radova angažovanog od strane Uprave za saobraćaj za izgradnju budućeg vijadukta na saobraćajnici Berane-Lubnica.
- Ukupno je realizovano 9.768,63€ u 2022. godini.

Nabavka i isporuka mehanizacije za pripremu i održavanje ski staza

- Javno nadmetanje za izbor isporučioaca dva nova vozila za pripremu i ravnanje snijega na ski stazama (tabača, ratraka) za potrebe Ski centra „Kolašin 1600”, raspisano je 24.11.2021. godine.
- Ugovor br.01-334/22-893/1 od 03.03.2022. u vrijednosti 1.572.879,00€ sa PDV-om sa rokom završetka radova od 4 mjeseca, je potpisan sa izvođačem radova „Eurozox”doo iz Danilovgrada.
- Mehanizacija je isporučena polovinom 2022. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 1.572.897,00€ u 2022. godini.

Izgradnja trafostanice 10/0,4 kV za potrebe napajanja šestosjedne isklopive žičare “K7” i 10 kV kablovskih vodova

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova po principu “projektuj i izgradi” je raspisano 28.09.2021. godine. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova „Ramel”doo iz Nikšića br.01-334/22-74/1 od 13.01.2022. godine u vrijednosti od 95.469,00€ i sa stručnim nadzom „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice br. 01-334/22-3972/1 od 28.09.2022. godine u vrijednosti 3.448,50€.
- Radovi su završeni i u toku je procedura tehničkog pregleda.
- Ukupno je realizovano 77.302,91€ u 2022. godini.

Adaptacija krova garaže za smještaj korpi uz žičaru

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 23.11.2021. godine.
- Ugovor je potpisan sa izvođačem radova „Novi Volvox”doo iz Podgorice 31.01.2022. godine br.01-334/22-336/1 u vrijednosti 48.390,34€ sa PDV-om i sa stručnim nadzorom „Urbi.pro”d.o.o. iz Podgorice br.101-1560/1-624/1 od 12.07.2017. godine.
- Radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 48.390,34€ u 2022. godini.

1.2. Ski centar na lokalitetu “Cmiljača” u Bijelom Polju

Realizacija ovog projekta se odvija fazno.

Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača

Ravna Rijeka - Jasikovac 5,5 km

- Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko - pravni problemi u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.
- Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.

Jasikovac - Cmiljača 10 km

- U prethodnom periodu završeno je probijanje trase puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km, koje se realizovalo kroz 3 faze.

Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije puta “Ravna Rijeka – Jasikovac” je raspisano 08.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3017/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “DING” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 14.970,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije puta “Ravna Rijeka – Jasikovac” je raspisano 28.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 334/20-3591 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020 godine, na iznos od 3.951,01€.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije. Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti dalje aktivnosti na realizaciji ovog putnog pravca.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta “Ravna Rijeka – Jasikovac”, na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11090/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Indel inžinjeri” d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 8.373,20€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta “Ravna Rijeka – Jasikovac”, na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-69/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ground Engineering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.01.2021. godine, na iznos od 2.262,7€.
- Izrada projektne dokumentacije je završena.
- Ukupno je realizovano 18.921,01€ u 2022. godini.



Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača



- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1

sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta. Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena.
- Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare i radovi su obustavljeni do daljnjeg. Dokumentacija je proslijeđena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje na dalje postupanje, nakon čega je predmet proslijeđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Komunalnoj policiji Opštine Bijelo Polje.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-7697/2 od 08.12.2023. godine donijela Rješenje kojim se Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje proglašava nadležnim za vršenje inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole građenja. Uprava za kapitalne projekte je uputila urgenciju Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje u cilju rješavanja navedene problematike.
- Nakon izjašnjenja inspekcijske službe, potrebno je da se Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma izjasni o daljim koracima na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.
- U 2022. godini radovi se nisu izvodili.

Primarna elektroenergetska infrastruktura

Izgradnja trafostanice “Cmiljača” 35/10 kV

- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojškovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, “Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2728/1 sa stručnim nadzorom, “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
- U 2021. godini završeni su svi radovi na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad.
- Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje konstantno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za ispitivanje predmetne trafostanice.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, “Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, “Nik com” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.
- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase u toku 2020. godine.
- U toku izvođenja pripremnih radova i geodetskog snimanja trase dalekovoda utvrđeno je da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom Glavnom projektu usled preklapanja projektovane trase dalekovoda na pojedinim dionicama sa izgrađenim ski stazama i žičarom, usled čega je izvođač obustavio radova do izmjene projektne dokumentacije. Kako je u međuvremenu došlo do nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga pa je pokrenuta procedura raskida zaključenog ugovora za izvođenje radova.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Cmiljača” do TS 10/0,4 kV bazna stanica “Cmiljača”

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača

- Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra “Cmiljača” sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m, izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m’.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
- U cilju uvođenja izvođača u posao Opština Bijelo Polje je izvršila prijavu radova.
- Od strane inspekcijskih organa dobijen je negativan odgovor na prijavu radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega je i prolongiran početak izvođenja radova, a potom i raskinut ugovor sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Nabavka žičare šestosjed Z7

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare “Z7” i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi. Radovi su se izvodili do kraja 2021. godine, nakon čega je gradilište konzervirano.
- Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza. Preostali su radovi na funkcionalnom ispitivanju koje je neophodno obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- Radovi se nisu izvodili u 2022. godini.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza

- Radovi I faze koji su obuhvatili proboj puta su završeni.
- Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanje 10 kV kabla, a asfaltni radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.
- Do sada su završeni zemljani radovi na proboju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
- Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.
- Izrada dopune Glavnog projekta je završena.
- Zbog mnogobrojnih problema na trasi puta, Uprava za kapitalne projekte je 28.12.2022. godine raspisala javnu nabavku za izbor projektanta za izradu Glavnog projekta za završetak svih preostalih radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Da bi se nastavilo izvođenje radova na dijelu trase po dopunjenom revidovanom glavnom projektu potrebno je da Opština Mojkovac riješe imovinsko-pravne odnose.
- Ukupno utrošenih sredstava u 2022. godini su 17.586,80€.

Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac



- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Monteput" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
- Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
- Radovi na objektu nisu izvođeni u 2022. godini.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Trasa puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m

- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od 1.750,50€.
- Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljani u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
- Revident projekta izmijenjene trase puta "Ing-impuls" d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma "Ing-impuls" d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine, zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom "Europrojekt" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1.936,00€.
- Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta, na koju je revident dostavio primjedbe.
- U 2022. godini sprovedene su aktivnosti na doradi projektne dokumentacije po primjedbama revidenta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno - servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“

- Donešena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja "Žarski".
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovedla proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto poništeno 16.07.2021. godine.
- Nije bilo aktivnosti u 2022. godini.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski

- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi“. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac“ iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta, nakon čega se otpočelo sa radovima u julu 2020. godine.
- Izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, a izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih zidova i stubova suterena ugostiteljskog objekta. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine i od tada više nisu izvođeni.
- Početkom jula 2021. godine izvođač radova je, usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, zatražio izmjenu ugovorene cijene izvođenja radova, sporazumni raskid ili zamrzavanje ugovora do normalizacije tržišta. Zahtjev je proslijeđen Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje razmatranje.
- U 2022. godini radovi se nisu izvodili.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4

- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta i otpočelo se sa radovima u 2020. godinu. Završene su aktivnosti na nabavci opreme i građevinski radovi na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije.
- U 2022. godinu radovi se nisu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Ukupno je realizovano 608.271,12€ u 2022. godini.

Ski staze uz žičaru Z4

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4“ je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo u 2020. godini. Radovi su izvođeni do polovine 2022. godine na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije. Završeno je preko 80% ugovorenih radova.
- Da bi se počelo sa radovima, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.
- Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Ukupno je realizovano 367.250,00€ u 2022. godini.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Cmiljača” do TS 10/0,4 kV bazna stanica

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima),

primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.

- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Žičara

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim”. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon” d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
- Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.
- Do sada je završeno postavljanje svih dvanaest stubova i montaža polazne stanice žičare. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2021. godine.
- Radovi su nastavljani 01.07.2022. godine i do zimske sezone izvođeni su radovi na garaži skijališta.
- Završne radove na izgradnji žičare nije moguće izvesti dok se ne izgradi elektroenergetska infrastruktura zbog napajanja iste.
- Ukupno je realizovano 1.355.430,16€ u 2022. godini.



Ski staze

- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte 30.12.2022. godine raspisala tender za izbor ponuđača za izgradnju cca 9 km ski staza po sistemu „projektuj i izgradi“, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora.
- Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.250.000,00€ bez PDV-a.

Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"



- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Nakon što je projektant 27.04.2020. godine dostavio korigovano idejno rješenje izrađeno u skladu sa Odlukom o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pratećeg objekta žičare – bazne stanice, izdatom od strane Opštine Rožaje i projektnim zadatkom koji je potpisalo Ministarstvo turizma i održivog razvoja, na sastanku održanom sa projektantom i predstavnicima Skijališta Crne Gore (krajnji korisnici), korisnici su, između ostalog, imali i primjedbu na procijenjenu projektantsku vrijednost objekta od cca 4.500.000€ koja je proistekla iz radova koji obuhvataju i izgradnju podzemne garaže. Projektant se izjasnio da na predmetnoj parceli UPŠT18 - predviđenoj za izgradnju bazne stanice „Hajla“, nije moguće projektovati otvoreni parking, jer ne postoje prostorni kapaciteti za to.
- S tim u vezi, obaveza opštine i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, odnosno priprema novog projektnog zadatka uz eventualnu izmjenu lokacije.
- U 2022. godini nije bilo aktivnosti po ovom pitanju.

- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Elektroenergetska infrastruktura

- Nakon što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Upravi za kapitalne projekte ovjerene projektne zadatke, Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za realizaciju projekta po principu „projektuj i izgradi“ za: čeliju 35kV u TS 35/10kV “Zeleni”, podzemni vod 35kV od TS 35/10kV “Zeleni” do TS 35/10kV “Crnja”, TS 35/10kV “Crnja”, TS 10/0,4kV, 1x1000kVA “Nova 4”, TS 10/0,4kV, 1x630kVA “Nova 5”, TS 10/0,4kV, 2x1000kVA “Nova 6” i TS 10/0,4kV, 1x1000kVA “Nova 7”, TS 10,04kW Nova 8 sa podzemnim kablom, kao i za izbor revidenta i stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- Procijenjena vrijednost radova nedostajuće elektroenergetske infrastrukture iznosi 4.800.000,00€ bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

- Nije bilo aktivnosti u 2022. godini.

1.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Kroz realizaciju projekta sprovode se aktivnosti na realizaciji više podprojekata, a koji se odnose na izgradnju žičare-gondole, servisnih objekata na ulazu u žičaru, uređenje unutrašnjosti same pećine, izgradnja vizitoring centra sa regulacijom korita rijeke, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku nepohodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu

- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99€ .
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine.
- U drugoj polovini 2022. godine, radovi nisu izvođeni iz razloga što je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje kojim je utvrdila da je Uprava za kapitalne projekte – „Operater“, pričinila štetu životnoj sredini u okviru zaštićenog područja Đalovića klisure, u dijelu Đalovića pećine usljed izvođenja radova I faze, te je naložila obustavu radova na valorizaciji pećine dok se ne pribave neophodne dozvole. Usljed navedenog se nije otpočelo ni sa izvođenjem radova II faze.
- Uprava za kapitalne projekte je na donijeto rješenje uložila žalbu posredstvom advokatske kancelarije „Iusticia”, s obzirom na to da Uprava za kapitalne projekte nije Operater u postupku, a da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje je Investitor, bilo dužno da obezbijedi sve neophodne dozvole od Agencije na osnovu blagovremenih informacija dostavljenih od strane Uprave, da je postupak utvrđivanja značaja štete u životnoj sredini nepravilno i nezakonito sproveden, naročito imajući u vidu činjenicu da je Agencija za zaštitu životne sredine, i prije početka radova imala tačna, precizna i jasna saznanja o vrsti radova koji će se izvoditi na uređenju zaštićenog lokaliteta, kao i da ne postoje zakonske granice pećine i da one nikada nisu definitivno utvrđene, tako da nulta stanje same pećine nije poznato. Na navedenu žalbu do danas nije dostavljen odgovor.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.





Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik Opština Bijelo Polje je dostavila Upravi za kapitalne projekte ovjeren Projektni zadatak kako bi pokrenula postupak iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnogoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta ogleda se kroz: nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijeđenim prilazima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predata Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
- Sa projektantom "Inter projekt" d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
- Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
- Radovi na predmetnom projektu su nastavljani u septembru 2022. godine, nakon što su od strane nadležnih institucija izmještene postojeće vodovodne, TK i elektro
- instalacije, a od strane opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte obaviještena da mještani pristaju da se izvode radovi po revidovanom glavnom projektu.
- Ukupno je realizovano 1.073.013,88€ u 2022. godini.

Postavljanje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje

- Projektom je obuhvaćeno postavljanje javne rasvjete duž rekonstruisanog puta Gubavač-Bistrica i to na dvije dionice: Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica
- Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani Glavni projekat. Projektant je „Arhing inženjering” doo iz Bijelo Polja (br.ugovora 07/1-7087 od 24.07.2019. godine)i revident „Civil engineer”doo iz Podgorice (br.ugovora 07/1-14043 od 27.12.2019. godine).
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala Javno nadmetanje za izbor izvođača radova 03.07.2020. godine, koji je poništen i drugi put 14.09.2021. godine. Ugovor br.01-334/22-

337/1 sa izvođačem „Ramel”doo iz Nikšića, zaključen je 31.01.2022.godine, na iznos od 161.771,43€ sa PDV-om.

- Stručni nadzor je izabran u postupku nabavke male vrijednosti br.03-48/20 od 06.07.2020. godine. Ugovor br.01-334/22-5940 sa stručnim nadzorom „Sistem-MNE”doo iz Podgorice, zaključen je 29.07.2020. godine, na iznos od 7.900,00€.
- S obzirom da su radovi na postavljanju javne rasvjete uslovljeni izvođenjem radova na rekonstrukciji puta, izvođač radova je uveden u posao 12.08.2022. godine. Radovi se u ovom periodu mogu izvoditi samo na dionici puta Mirojevići-Bistrica, dok na drugoj dionici nijesu stvoreni uslovi za početak radova.
- Ukupno je realizovano 18.694,15€ u 2022. godini.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”



- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
- Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
- U toku je pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje.
- Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je da u saradnji Opštinom Bijelo Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.
- U 2022. godini nije bilo aktivnosti po ovom podprojektu.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa “Đalovića pećine” ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice “Nedakuse”, izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”,

dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica“ do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh". Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i dobijena je upotrebna dozvola 16.12.2022. godine.
- Ukupno je realizovano 25.647,89€ u 2022. godini.

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV



- Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
- Reviziju glavnog projekta odradio je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine.

Ugovor br. 01- 3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikcom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.

- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni u 2021. godini i u toku je tehnički prijem objekta.
- Ukupno je realizovano u 2022. godini 39.383,54€.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave za kapitalne projekte. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni u 2021. godini, a u 2022. godini započet je tehnički pregled objekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izgradnja TS 10/0,4 kV za potrebe vizitiring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitiring centar"

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Izgradnja 10 kV dalekovoda sa pristupno -servisnim putem i stubne TS 1x 250 kV za potrebe napajanja žičare

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Žičara





- Projekat izgradnje gondole se izvodi po principu „projektuj i izgradi“. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu “projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.
- Završene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Sa radovima se otpočelo u 2019. godini. Do sada su završeni radovi na izgradnji pristupnih puteva, ugradnja polazne i izlazne stanice i isporučena oprema žičare.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- U 2022. godini radovi se nisu izvodili zbog nepristupačnog terena.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Vodosnabdijevanje

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbijediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018., na iznos od 34.848,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da

sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekta na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i nezavisni projekat.

- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izgradnja objekta vizitiring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom



- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu ovjerenog Projektnog zadatka dostavljenog
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Permonite“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-

4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.
- Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2022. godine, ali objekat nije predat na upotrebu iz razloga što investitor – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma nije definisalo korisnika.
- Ukupno je realizovano 194.086,76€ u 2022. godini.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Radovi su prolongirani zbog nivoa rijeke, a potom nisu izvođeni zbog situacije na globalnom tržištu cijena.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Izgradnja objekta planirana je fazno pri čemu svaka faza čini tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu koje će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Ukupna površina objekta je 49.067,37m², a površina I faze je 22.540,75m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.

- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i nakon izvršene prijave građenja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, izvođač je uveden u posao 19.09.2022. godine. Izvođeni su pripremni i zemljani radovi koji su obustavljeni krajem novembra usljed nepovoljnih vremenskih uslova i isti će biti nastavljeni kada se steknu povoljne vremenske prilike.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Ukupno je realizovano 1.303.670,64€ u 2022. godini.

1.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Centar za prihvatilište životinja sa CITES liste u Beranama

- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, a na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.9. Objekat "Kuća voća" u Andrijevi

- Objekat "Kuće voća" u Andrijevi nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevi, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevi, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i
- Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastoji se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffè bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine.
- Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37€.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00€.
- Sa izvođenjem ugovorenih radova otpočelo se u aprilu 2018. godine i radovi su se do sredine 2019. godine odvijali planiranom dinamikom. Tokom 2019. godine, po zahtjevu bivšeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, urađen je novi tehnološki elaborat na osnovu kog je izmijenjena projektna dokumentacija za objekat proizvodnog pogona, u dijelu arhitekture, vodovodnih, elektro i mašinskih instalacija. Navedene izmjene su između ostalog

podrazumijevale rušenja i demontaže već izvedenih radova na objektu proizvodnog pogona, što je za posljedicu imalo produženje ugovorenog roka za završetak radova, kao i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.

- U cilju završetka realizacije projekta, Uprava za kapitalne projekte je sprovela pregovarački postupak po odobrenju Ministarstva finansija i raspisala novi otvoreni tenderski postupak za dodatne radove, kako bi se time obuhvatili svi naknadni i dodatni radovi koji su nastali usljed propusta i izmjena u projektnoj dokumentaciji. Po osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka sa izvođačem radova "Neimar inženjering" je potpisan ugovor o izvođenju dodatnih radova, dok je otvoreni postupak obustavljen, iz razloga što predmetni objekat nije bio obuhvaćen Zakonom o budžetu za 2021. godinu, odnosno nisu bila obezbijeđena finansijska sredstva za izvođenje radova.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Takođe za predmetni objekat je u 2019. godini izrađen projekat trafostanice za potrebe napajanja objekta "Kuća voća", međutim, za isti nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije realizovan.
- Do kraja 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik, nije dostavilo inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, niti je u saradnji sa Opštinom Andrijevica realizovalo aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00€.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta,

„Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
- Sredinom 2022. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Krajem 2022.godine raspisan je tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje je u toku.
- Ukupno je realizovano 247.215,00€ u 2022. godini.

1.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osniježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obradivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Opština Kolašin je u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavila potpisani projektni zadatak i UTU-uslove sa programskim zadatkom na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obradivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obradivača tehničke dokumentacije i izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 03.11.2022.godine, procijenjeni iznos javne nabavke 9.196.000,00€ sa Pdv-om.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je 20.12.2022.godine sa procijenjim iznosom javne nabavke od 121.000,00€ sa Pdv-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisani su 20.12.2022.godine, procijenjena vrijednost javne nabavke je 199.650,00€ sa Pdv-om.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"

Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača" žičarom

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski

- Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
- Javno nadmetanje za izbor obradivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obradivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.
- U toku su pripremne aktivnosti na geodetskom snimanju terena i izrada varijantnog idejnog rješenja.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

1.13. Izgradnja nove instalacije žičare postojećom trasom na "Savinom Kuku"

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.14. Ski poligon Žabljak

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.15. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije dostavljene od strane opštine Herceg Novi raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju panoramske gondole Igalo Ilinica u opštini Herceg Novi. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je poništila postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od 04.02.2022. godine.
- Uprava za kapitalne projekte je ponovo 30.11.2022. godine objavila javni poziv.
- Procijenjena vrijednost javne nabavke je 9.970.000,00€.
- Javna nadmetanja za izbor stručnog nadzora i vršioca revizije raspisana su 08.02.2022. godine. Procijenjena vrijednost za vršioca stručnog nadzora iznosi 200.000,00€, dok za vršenje revizije iznosi 80.000,00€.
- Javno nadmetanje je u toku.

1.16. Izgradnja montažno-demontažnog boba na šinama na lokalitetu Ski centar "Kolašin 1600"

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.17. Ski centar na lokalitetu "Lokve" – Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.18. Izgradnja gondole na skijalištu na Jelovici - Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

1.19. Izgradnja vodovoda u Klenku - Nikšić

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

PROGRAM

II. EKOLOGIJA I PRIRODA

POTPROGRAM

2. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE
--

2.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegro-Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50€.
- Do sada je završena izrada armirno-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.

- Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnih nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG“ AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021.godine na iznos od 14.904.394,84€.
- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
- Početkom 2022. godine radovi su započeti i do sada su završeni radovi na sanaciji postojeće čelične konstrukcije i izradi lamelirane drvene konstrukcije. U toku su završni radovi na zatvaranju objekta strukturalnom fasadom, izrada fasadne obloge od lameliranih drvenih i aluminijumskih sendvič panela, krovopokrivački radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
- Ukupno je realizovano 178.435.47€ u 2022. godini.

2.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalizacija i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, studije vodosnabdijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, PPOV u Andrijevici, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije, zradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnabdijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žabljaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije, kao i drugim projektima po prioritetima ministarstva.

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu

- Dužina fekalne kanalizacione mreže iznosi 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
- Za potrebe izrade konačnog izvještaja revizije potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.

Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu

- U 2017. godini Uprava za kapitalne projekte je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila Ugovor u okviru projekta "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija" sa COWI A/S Danska, dana 16.12.2020. godine (Identification number Europe Aid/139893/IH/SER/ME), čiji je Glavni koordinator i Korisnik potpisanog Ugovora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u okviru kojeg se realizuje i izrada Glavnog projekta kanalizacione mreže u Kolašinu.

- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula tendersku proceduru za odabir Revidenta Glavnog projekta br. 01 – 17/22 od 09.03.2022. godine. Na osnovu toga zaključen je Ugovor br. 01-334/22 – 3631/1 od 02.09.2022. godine na iznos 4.200,00€ bez PDV-a. U toku je revizija predmetne dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije i izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
- Završeni su radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz insalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Po primarnom ugovoru završeni su radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnjosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
- U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesti kako bi se sistem stavio u funkciju na osnovu čega je potpisan ugovor sa firmom „Hiperling“ doo Podgorica br. 01-334/22-1303/1 od 31.03.2022. godine u iznosu od 47.037,68€ sa Pdv-om. Sve aktivnosti po ovom ugovoru za nepredviđene radove su realizovane.
- Preostale su određene pozicije iz primarnog ugovora kako bi se okončala II faza projekta, a iste će biti odrađene kada se za to stvore tehnički uslovi tj. zamućenje izvorske vode.
- Na realizaciji projekta u 2022.godini je utrošeno 46.651,59 €.

Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje

- Uprava za kapitalne projekte je 09.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 80.000,00 € bez PDV-a.

- Uprava za kapitalne projekte je 13.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 20.000,00 € bez PDV-a.
- U toku je vrednovanje ponuda.

2.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: sanacija odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, transfer stanice u Andrijevici, reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama, kao i drugim projektima po prioritetima ministarstva. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€.

Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu

- Objekat je na lokaciji Marića luka u okviru radne zone bivšeg rudnika olova i cinka "Brskovo" u opštini Mojkovac. Ukupna površina lokacije iznosi 9.774,37 m². Predviđeni su sljedeći sadržaji: hala za tehnološku liniju reciklaže, upravna zgrada sa portirnicom, vaga i uređeni plato kao manipulativni prostor za saobraćaj kamiona, parking prostor i zaštitna ograda sa kapijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 25.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-541/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.02.2016. godine, na iznos od 32.963,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7682/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.12.2016. godine, na iznos od 1.804,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1829/1 sa izvođačem, "Crnogoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 20.03.2019. godine, na iznos od 1.940.117,48€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.02.2019. godine. Ugovor br. 01-3140/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos 42.400,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u 2021. godini. Primopredaja radova i predaja objekta korisniku završena u 2022. godini.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane

- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.

- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Tošković” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspekcijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava za kapitalne projekte je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković” pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava za kapitalne projekte navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlašćenog lica firme „Tošković” ima elemenata krivičnog djela prevare.
- U 2022. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Transfer stanica u Andrijevići

- Objekat transfer stanice u Andrijevići je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada. Projektni zadatak je potpisala opština Andrijevića.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, „Arhiplan Crna Gora” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
- Radovi su počeli 2019. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Andrijevića.
- Završeni su radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na kašnjenje izvođenja radova u odnosu na dostavljeni dinamički plan, uslovljeni promjenom cijena na tržištu.
- U toku su aktivnosti na raskidu zaključenog ugovora i raspisivanju javnog nadmetanja za preostale radove.

- U 2022. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



Sanacija odlagališta Zakršnica

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi za kapitalne projekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
- Izvršena je Izmjena glavnog projekta na osnovu ugovora br. 01-334/22-4931/1 od 15.11.2022.godine kao i revizija izmijenjenog glavnog projekta, ugovor br. 01-334/22-4957/1 od 16.11.2022.godine. Potreba za izmjenom glavnog projekta javila se usljed promjene količina na samom odlagalištu od perioda izrdade projekta do raspisivanja javnog nadmetanja. Na realizaciji projekta do sada utrošeno 39.577,00€ za tekuće izdatke.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji privremenog skladišta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica u Mojkovcu, raspisano je 27.12.2022.godine, vrijednost javne nabavke je 3.500.000,00€ bez PDV-a.
- Ukupno je realizovano 10.537,90€ u 2022. godini.

Sanacija odlagališta u Plavu

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 12.10.2016. godine, vrijednost ugovora 250.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.
- U 2022. godini završeni svi radovi i izvršena primopredaja objekta korisniku.
- Ukupno je realizovano 5.424,00€ u 2022. godini.

2.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

Nabavka i ugradnja materijala i opreme za filter stanicu Sopot, opština Žabljak

- Revidovani glavni projekat je obezbijedila Opština Žabljak.
- Javno nadmetanje za nabavku i ugradnju materijala i opreme filter stanice „Sopot” u opštini Žabljak je raspisano 16.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-6141/1 sa izvođačem radova „Intermost” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.12.2021. godine, na iznos od 145.101,99€.
- Vršenje stručnog nadzora obezbijedila je Opština Žabljak.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- U 2022. godini ukupno je realizovano 145.101,99€.

Kanalizaciona mreža na Vranjini

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- U 2021. godini glavni projekat je upućen Glavnom gradu Podgorica na mišljenje, kao nosiocu prava svojine kojim je trasiran kolektor.
- Putem jednostavne nabavke raspisan je tender za odabir stručnog nadzora, procijenjena vrijednost jednostavne nabavke je 8.000€.
- Za odabir izvođača radova raspisano je javno nadmetanje 09.02.2022.godine, procijenjena vrijednost javne nabavke je 236.200,00€.
- Odluka o izboru najbolje ponude donešena je 06.06.2022. godine na osnovu koje je uložena žalba. Na osnovu rješenja o žalbi, donešena je nova odluka o izboru najpovoljnije ponude 23.11.2022. godine.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Andrijevića

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 738.000,00 €. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- U 2022. godini završeni svi radovi na objektu i izvršena je primopredaja objekta.
- Ukupno je realizovano 20.903,00€ u 2022. godini.

Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica

- Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi“, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 450.075,00€. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50%, i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
- CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
- U 2022. godini su završeni svi radovi na objektu osim priključenja na infrastrukturu, jer opština Petnjica nije obezbijedila uslove.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Revizija izmijenjenog glavnog projekta fekalne kanalizacije za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima u opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija", zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi izmijenjenog glavnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV, sa priključcima, u opštini Rožaje, dok Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na reviziji izmijenjenog glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmijenjenog glavnog projekta je raspisano 24.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-900/1 sa revidentom izmijenjenog glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 03.03.2022. godine, na iznos od 2.662,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, za realizaciju projekta "Toplifikacija Pljevalja, za čista i topla Pljevlja-izgradnja magistralnog toplovoda od TE Pljevlja do grada" u januaru 2022. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Opštine Pljevlja, Elektroprivrede Crne Gore i Uprave za Kapitalne projekte kojim se definiše namjera svih strana da učestvuju u realizaciji projekta.
- U martu je Elektroprivreda Crne Gore je oformila radnu grupu za praćenje realizacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Elektroprivrede CG, Opštine Pljevlja i Uprave za kapitalne projekte
- Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2022.godine, nakon sprovedene procedure javne nabavke, ugovorila izradu projektne dokumentacije za kompletan primarni toplovod i izvođenje radova na prvoj dionici toplovoda u dužini od cca 2,3km, po principu "projektuj i izgradi". U toku je izrada projektne dokumentacije.

- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.6. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.7. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava za kapitalne projekte će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.8. Servisna zona u Gradiošnici, Opština Tivat

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.9. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica

- Na osnovu dostavljenog Revidovanog Glavnog projekta od strane Opštine Herceg Novi, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavu za odabir najpovoljnijeg Izvođača i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-677/1 sa izvođačem „EUROZOX” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.02.2023. godine, na iznos od 8.074.373,58€ bez Pdv-a.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 14.03.2022. godine, procjenjene vrijednosti 101.000,00€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.10. Izgradnja sanitarne deponije „Duboki do” u Herceg Novom

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.11. Postrojenje za proizvodnju električne energije na deponiji Livade

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.12. Postrojenje za proizvodnju otpadnih guma na deponiji Livade

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.13. Izgradnja sanitarne kade br.4 na deponiji Livade u Podgorici

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.14. Izgradnja II faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žabljaku

- Opština Žabljak je tokom 2022. godine dostavila projektno-teničku dokumentaciju koja je vraćena opštini na doradu i dopunu.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.15. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu

- Krajem oktobra 2022. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir Izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opštini Kolašin »po principu projektuj i izgradi«, kao i za vršenje stručnog nadzora početkom novembra 2022. godine. Nije bilo pristiglih ponuda za odabir Izvođača radova i vršenje stručnog Nadzora. Upućen je dopis Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za realno i ponovno sagledavanje vrijednosti predmetnog projekta.
- Sa privrednim društvom »Civil engineer« d.o.o. Podgorica zaključen je Ugovor br. 01 – 334/22 – 4882/1 od 14.11.2022. godine na iznos od 4.890,00 € bez PDV-a za reviziju tehničke dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.16. Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-I faza

- Budući da je Opština Bijelo Polje sklopila Ugovor za izvođenje radova za I fazu izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta Banjica, kao i da je jedan dio radova izveden, Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljen obim radova koji bi bio predmet izvođenja radova naredne faze. Procedura je u toku.

2.17. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Danilovgradu

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.18. Izgradnja kanalizacione mreže u Danilovgradu

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.19. Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom

- Uprava za kapitalne projekte je 23.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na završetku radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 670.000 € bez PDV-a. Takođe, 26.12.2022.godine raspisano je i javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora. Procijenjena vrijednost ove nabavke iznosi 40.000 € bez PDV-a. Tenderska procedura je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.20. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza

- Uprava za kapitalne projekte je 23.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na završetku radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 670.000 € bez PDV-a. Takođe,

26.12.2022.godine raspisano je i javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora. Procijenjena vrijednost ove nabavke iznosi 40.000 € bez PDV-a.

- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.21. Uspostavljanje putne funkcije hidroloških stanica Rošca, Vranjske njive, Crna poljana i Trgaj

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.22. Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.23. Neuređena odlagališta otpada i regionalni centri za obradu otpada

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.24. Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa Cites liste sa zoološkim vrtom, Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.25. Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze

- U 2022. godini u cilju realizacije predmetnog projekta zaključen je Ugovor o realizaciji sa Opštinom Tuzi na iznos od 72.013,75€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.26. Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Čatovske livade-Rožaje

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.27. Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Ibarac-Rožaje

- Projektnom dokumentacijom rukovodi opština Rožaje. Na ovom projektu nije bilo realizacije zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa od strane opštine Rožaje.

2.28. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-I faza, Bijelo Polje

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.29. Vodosnadbijevanje Pljevalja-izgradnja postrojenja za pitku vodu Plješ, Pljevlja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.30. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Breznica, Pljevlja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.31. Rekonstrukcija glavnog napojnog cjevovoda PPV Pliješ, Pljevlja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.32. Rekonstrukcija Glavnog dovoda sirove vode izvorišta Potpeć, Pljevlja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.33. Vodosnadbijevanje Donjeg Grblja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.34. Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja

- Za potrebe izrade Glavnog projekta transfer stanice u Pljevljima, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Urbanističko tehničke uslove i Projektni zadatak.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača Glavnog projekta izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom raspisano je 28.09.2022.godine. Vrijednost javne nabavke provijenjena je na iznos od 30.000,00€ bez PDV-a.

2.35. Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić

- Na osnovu dostavljenog projekta od strane Opštine Nikšić, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 30.12.2022.godine. Procijenjena vrijednost nabavke je 40.000,00€ bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

2.36. Projekat hidrogeoloških istraživanja ugljenokisjelih voda, Nedakusi-Bijelo Polje

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.37. Izgradnja vodovoda Nedakusi-Šljepašnica

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.38. Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.39. Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda Komani-Bandići

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

2.40. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići

- Sredinom 2022. godine dostavljena je dokumentacija za Rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
- U toku je usaglašavanje tehničke dokumentacije u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i ugradnju iste.
- Procijenjena vrijednost javne nabavke je 2.349.688,00€ bez PDVa-a.
- U 2022. godini nije bilo utroška sredstava po ovom projektu.

POTPROGRAM

2. b.PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ODRŽIVI RAZVOJ

2.41. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).

- **Kanalizaciona mreža**
- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
- Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- Ukupno je realizovano 2.075.745,82€ u 2022. godini.



2.42. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S“, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€.
- Rok realizacije projekta je 36 mjeseci.
- Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 414.825,93 €.

2.43. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.
- Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
- Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
- Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta. Aneks broj 5 ugovora potpisan je 20.12.2022. godine i odnosi se na produženje ugovorenog roka do 30.04.2023. bez povećanja ugovorene vrijednosti, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je šesti šestomjesečni izvještaj.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini do je utrošeno 350.258.10 €.

2.44. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave za kapitalne projekte vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
- Avansna uplata koja je bila predviđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
- Korisnici Grant Ugovora su dostavili zahtjeve za produženje implementacionog perioda. To je zahtijevano iz razloga što određene aktivnosti nijesu mogle biti realizovane zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19.
- U toku je realizacija svih 10 ugovora.
- U decembru 2022. godine, za dva ugovora dostavljeni su konačni izvještaji dok se za preostalih 8 ugovora očekuje dostavljanje konačnih izvještaja u prvoj polovini 2023. godine. Nakon odobrenja finalnih izvještaja, sve aktivnosti na ugovorima će biti završene.
- Ukupno je realizovano 589.974,01€ u 2022. godini.

PROGRAM

III. ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

POTPROGRAM

3. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA
--



3.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika Klinički centar, pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
- Projektna dokumentacija je revidovana u novembru 2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 06.12.2022. godine, a za vršioca stručnog nadzora 07.12.2022. godine i ista su u toku. Vrijednost javne nabavke iznosi 650.000,00€.
- Ukupno je realizovano 10.293,45€ u 2022. godini.

3.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici

- Adaptacijom objekata planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora i administraciju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-970/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.03.2018. godine, na iznos od 26.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidentom glavnog projekta je raspisano 01.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560//1-8834/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.12.2018. godine, na iznos od 6.240,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4658 sa izvođačem, "IGP Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.06.2020. godine, na iznos od 995.797,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-8517/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.10.2020. godine, na iznos od 23.534,5€.
- Završetak adaptacije objekata je uslovljen ugovaranjem dodatnih radova zbog potrebe za sanacijom krovnog pokrivača za objekat Doma zdravlja "Nova Varoš" i naknadnih zahtjeva korisnika za izmjenom računarske opreme, kao i zbog ostalih radova neophodnih za stavljanje oba objekta u funkciju.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje dodatnih radova je raspisano 26.08.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6616/1 sa izvođačem, "Grand design" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.12.2021. godine, na iznos od 76.373,99€.

- Za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja dodatnih radova na adaptaciji objekata Dom zdravlja Nova Varoš i Dom zdravlja Stara Varoš u Podgorici zaključen je Ugovor broj: 01-334/22-227/4 od 24.01.2022. godine sa Urbi.pro doo iz Podgorice, na iznos od 6.037,90€.
- Radovi na adaptaciji Doma zdravlja "Stara Varoš" kao i primopredaja korisniku završena je u maju 2022. godine dok su radovi i primopredaja objekta Doma zdravlja "Nova završeni u decembru 2022. godine.
- Ukupno je realizovano 226.836,16€ u 2022. godini.

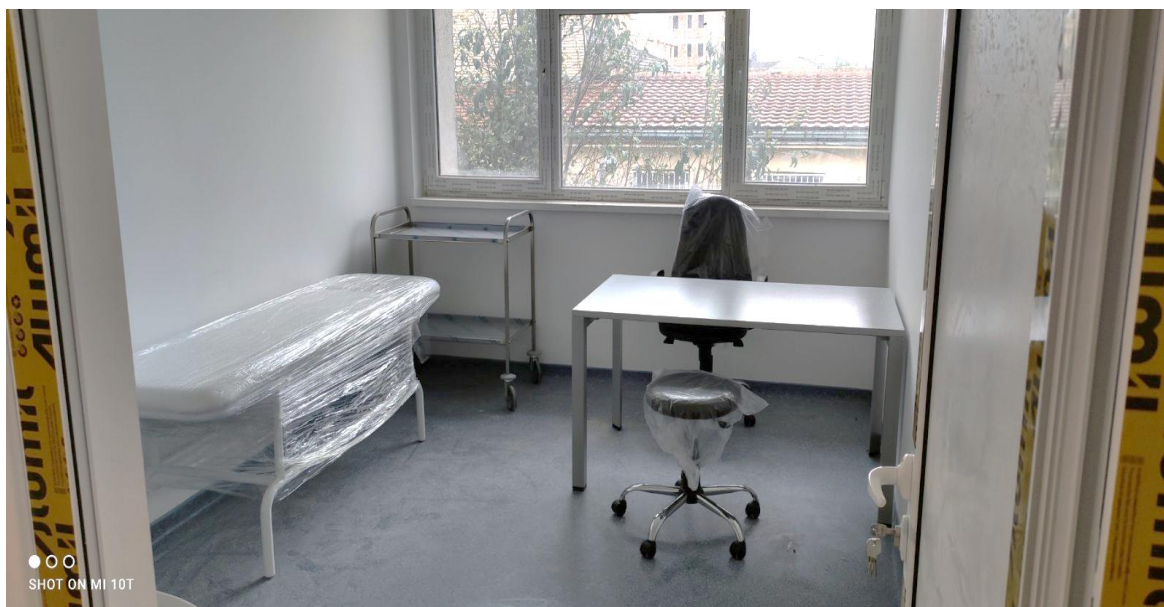

3.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici



- Objekat Klinike za mentalno zdravlje je spratnosti S+P+2. Ukupna bruto površina objekta sa suterenom iznosi 3 564,76 m².
- U suterenu su organizovani sljedeći sadržaji: tehničke prostorije, pomoćne prostorije za odlaganje rezervnih kreveta, stolova, stolica i ostalog mobilijara koji se koristi za potrebu grupnih terapija, prostorija za odlaganje arhivskog materijala, prostorija za smještanje garderobe bolesnika koji borave na klinici, prostorije za skladištenje čistog i prljavog veša, prostorije za čuvanje lijekova i pomoćna prostorija u kojoj bi se vršilo dopremanje hrane.
- Od sadržaja na nivou prizemlja planiran je dispanzer za mentalno zdravlje, kao i jedno odjeljenje stacionara namijenjeno za bolesti zavisnosti. Dispanzer za mentalno zdravlje obuhvata 4 ljekarske prostorije u kojima se vrši pregled pacijenata u zavisnosti od prirode mentalnog oboljenja, čekaonica i toaleti. Odjeljenje bolesti zavisnosti sastoji se iz smještajnog i prijemnog dijela. Smještajni dio obuhvata 4 sobe sa ukupno 11 ležaja od kojih je jedna soba predviđena za osobe sa posebnim potrebama, manja trpezarija za pacijente, blateks i toaleti za svaku sobu posebno. Prijemni dio obuhvata čekaonicu, ambulantu za davanje terapija, sobu

za medicinsku sestru, dvije ljekarske prostorije, sobu za grupne terapije i toaleti. Preostali dio prizemlja je organizovan kao administrativni sa kancelarijama direktora klinike, glavne sestre i ostalog medicinskog osoblja.

- Od sadržaja na nivou prvog sprata planirano je odjeljenje za urgentna psihotična stanja sa kapacitetom od 14 kreveta. To je dio psihijatrije u kojem su smješteni bolesnici sa najtežim oblicima bolesti. Odjeljenje je podijeljeno na muški i ženski dio i sastoji se od jedne veće, šestokrevetne sobe i sobe za potpunu izolaciju. U sredini između muškog i ženskog dijela nalazi se prostorija za medicinsko osoblje koje kroz staklene pregrade imaju stalan uvid u psihotično stanje pacijenata. Na nivou prvog sprata planirano je i odjeljenje stacionara za procesne psihoze i odjeljenje za afektivna stanja sa kapacitetom od 16 kreveta. Takođe je podijeljeno na muški i ženski dio koji se sastoji od dvije trokrevetne sobe i jedne dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama. Osim soba na ovom odjeljenju planiran je dnevni boravak za pacijente, prostorije za medicinsku sestru, prijemna ambulanta, soba za posjete i ambulanta za davanje terapija. Između ova dva odjeljenja planirane su prostorije za medicinsko osoblje kako bi na efikasan način opsluživali i vršili kontrolu pacijenta.
- Drugi sprat je poslednja etaža klinike na kojoj je planirano odjeljenje stacionara za djecu i dnevna bolnica. Odjeljenje stacionara za djecu je kapaciteta 16 kreveta i sastoji se od četiri trokrevetne sobe i dvije dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama, manja trpezarija, prostorija za medicinsku sestru, blateks, kao i ambulanta za davanje terapija. Dnevna bolnica obuhvata prostorije u kojima se vrše radne terapije, grupne i pojedinačne. Osim ova dva odjeljenja na drugom spratu se nalazi i blok prostorija za medicinsko osoblje kao i prateće prostorije, toaleti, kuhinja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2027/1 sa izvođačem, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2022. godine, na iznos od 7.250.502,72 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/22-2606/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2022. godine, na iznos od 63.888,00€.
- Klinički centar Crne Gore je prijavio građenje objekta nadležnom inspekcijskom organu dana 22.06.2023.godine.
- Završeni su radovi na izgradnji armirano betonske konstrukcije objekta.
- U toku su zidraski radovi i razvod instalacija u objektu.
- Ukupno je realizovano 1.056.030,88€ u 2022. godini.

3.4. Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Ćuković" Risan

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo revidovani glavni projekat.
- Usljed posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 17.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-1926/1 sa izvođačem radova, „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 10.05.2022. godine, na iznos od 1.397.431,72€. Vrijednost javne nabavke iznosi 1.155.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 21.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-4329/1 za preduzećem „Urbi.Pro” d.o.o., je zaključen 14.10.2022. godine. Vrijednost javne nabavke iznosi 40.000,00€.
- Sa radovima se otpočelo u novembru 2022. godine, nakon što je Korisnik oslobodio prostor predviđen za rekonstrukciju i isti su u toku.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje saobraćajnica i parking prostora ispred Bolnice, na osnovu Projektnog zadatke potpisanog od strane korisnika JZU „Vaso Čuković“, je raspisano 23.12.2022. godine i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za opremanje objekta je raspisano 29.12.2022. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.155.000,00€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

3.5. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3.6. Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dom zdravlja u City kvartu.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3.7. Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju

- Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu od strane Ministarstva zdravlja utvrđeno je da je ista nepotpuna i da nije moguće pokrenuti javne nabavke za odabir izvođača radova i stručnog nadzora.
- Nakon dostavljanja dopunjene dokumentacije od strane nadležnih organa, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

3.8. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3.9. Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, Internog i palijativne njege, Nikšić

- Ministarstvo zdravlja i Opština Nikšić nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.10. Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu tenderske dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za nabavku opreme procijenjene vrijednosti 1.930.000,00€ bez Pdv-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

3.11. Centar PET CT sa klinikom za hematologiju

- Ministarstvom zdravlja i Klinički centar Crne Gore nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.12. Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.13. Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju

- Projektu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Ulcinj.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2022. godine objavila javno nadmetanje za odabir izvođača radova čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000 €, koje je u junu poništeno iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.
- Nakon povećanja procijenjene vrijednosti radova od strane projektanta na iznos od 390.000 €, raspisano je novo javno nadmetanje u novembru 2022. godine, a ponude su otvorene u decembru i u toku je procedura vrednovanja istih.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora raspisano je u maju 2022. godine, ponude su otvorene i u toku je vrednovanje istih. Procijenjena vrijednost nabavke je 15.000€.
- Na projektu do sada nije bilo utroška sredstava.

3.14. Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama, Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koji je potpisalo i dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 30.000,00€ bez PDV-a.
- U toku je vrednovanje ponuda.

3.15. Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.16. Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koje je potpisala JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, a dostavilo Ministarstvo zdravlja, raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 90.000,00€ bez PDVa.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

3.17. Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi –opšta Bolnica Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za izvođenje radova procijenjene vrijednosti 440.000,00€ bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

3.18. Adaptacija Doma zdravlja Budva

- Ministarstvo zdravlja i JZU Dom zdravlja Budva nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.19. Adaptacija i rekonstrukcija domova zdravlja

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.20. Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.21. Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 09.12.2022.godine javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor. Procijenjena vrijednost radova iznosi 755.000€ bez PDV-a, dok za usluge stručnog nadzora vrijednost iznosi 22.650,00€ bez PDV-a.

3.22. Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti u 2022. godini.

3.23. Sanacija objekta i unapređenje funkcionisanje ambulate dr Niko Miljanić Velimlje

- Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru odabira izvođača radova i zaključila ugovor sa izvođačem radova, „Tehnogradnja“ d.o.o. iz Pljevalja na iznos 109.009,61€ sa PDV-om. Opština Nikšić je obezbijedila stručni nadzor.
- Za ugovaranje dodatnih-nepredviđenih radova, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku 29.12.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 39.000,00€.
- U toku je tenderska procedura.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

POTPROGRAM

3. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ZDRAVSTVO
--

3.24. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Projektom je obuhvaćena izgradnja objekta spratnosti su + pr + 2 sprata u kome će biti smještena Klinika za infektivne bolesti i Klinika za dermatovenerologiju. Ukupna površina koja obuhvata građevinsko područje iznosi 5.530.59m².
- Ugovorom je predviđena i nabavka medicinske opreme za potrebe potpune funkcionalnosti objekta.
- Procijenjena vrijednost radova iznosi 6.812.010,00€.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je odobrena u decembru 2021. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.06.2022. godine, a javno otvaranje ponuda je održano 30.06.2022. godine.
- Nakon završene evaluacije ponuda i odobrenja izvještaja rada Evaluacione komisije od strane EU Delegacije, zaključen je Ugovora sa odabranim izvođačem radova.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3577/1 je zaključen 07.10.2022. godine na iznos od 8.492.468,22€.
- Ugovoreni rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Procijenjena vrijednost vršenja usluge stručnog nadzora iznosi 350.000,00€.
- Uprava javnih radova je preuzela inicijativu i pripremila najavu za tendersku proceduru za vršenje stručnog nadzora. Nakon odobrenja iste od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegacije na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine. Pripremni sastanak i otvaranje ponuda je održano 21.02.2022. godine. Evaluacioni izvještaj je 11.05.2022. odobren od strane EU Delegacije.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Na realizaciji projekata do sada nije bilo utroška sredstava.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 18.07.2022. godine, a otvaranje ponuda je održano 19.07.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je zaključen 01.12.2022. godine na iznos 335.750,00€.
- Izvođač radova će biti uveden u posao u skladu sa uslovima Ugovora od strane stručnog nadzora kada se ispune sve uslovi.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini nije bilo utroškaka.



3.25. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/adaptacija i nabavka opreme za odabrane mikrobiološke laboratorije: Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, JZK Budva, JZZC Cetinje, JZK Ulcinj,
- Radovi koji se izvode odnose se na arhitektonsko/građevinske radove, vodovod/kanalizaciju, montažu mašinske (HVAC) opreme, elektro instalacija itd. u zavisnosti od uslova za buduću isporuku specijalizovane opreme.
- U dogovoru sa EU Delegacijom a u cilju realizacije projekata dogovoreno je angažovanje eksperta za pripremu Tenderske dokumentacije za izvođenje radova, vršenje stručnog nadzora i nabavku opreme. Rok za pripremu Tenderskih dokumentacija od strane eksperta je bio 2 mjeseca. Tenderske dokumentacije za sva tri ugovora su spremljene u planiranom roku.

Izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji mikrobioloških laboratorija

- Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu 07.07.2022. godine, ista je odobrena 18.07.2022.godine i zvanično objavljena 22.07.2022. godine sa rokom dostavljanja ponuda do 20.09.2022. godine.
- Javno otvaranje ponuda je održano 23.09.2022. godine. Evaluacioni izvještaj rada komisije je poslat EU Delegaciji 19.10.2022. godine na ex-ante kontrolu i isti je odobren 08.11.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-5156/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na iznos od 1.191.479,82 €.
- Rok izvođenja radova je 9 mjeseci.
- Na realizaciji projekta je utrošeno 8.041,00€ u 2022. godini.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije/adaptacije mikrobioloških laboratorija

- U saradnji sa EU Delegacijom a u cilju realizacije projekata dogovoreno je angažovanje eksperta za pripremu Tenderske dokumentacije za vršenje stručnog nadzora.
- Ugovor sa odabranim expertom je potpisan 06.05.2022. godine, kada je i izdat nalog za početak pripreme Tenderskih dokumentacija. Rok za izradu Tenderske dokumentacije je 2 mjeseca nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja.
- Tenderska dokumentacija poslata je EU Delegaciji na ex-ante odobrenje 22.07.2022. godine i ista je odobrena 02.08.2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 19.09.2022. godine. Izvještaj rada Evaluacione komisije je poslat 28.09.2022. godine i isti je odobren 05.10.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-4842/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.999,95 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.

Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških potreba

- Projektom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije : Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, - PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, PZK Budva, JZKC Cetinje, JZK Ulcinj
- Snabdijevanje će uključivati sve rezervne dijelove preporučene od strane proizvođača opreme kao i obuku osoblja nadležnih institucija i garanciju.
- Ugovor sa odabranim expertom je potpisan 06.05.2022. godine, kada je i izdat nalog za početak pripreme Tenderskih dokumentacija. Rok za izradu Tenderske dokumentacije je 2 mjeseca nakon čega će se pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja.
- Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu 12.07.2022. godine i ista je odobrena 20.07.2022. godine i zvanično objavljena 26.07.2022.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 29.09.2022. godine. Zbog velikog broja pristiglih zatjeva za pojašnjenjima od potencijalnih ponuđača, a koja su zahtijevala izmjenu Tenderske dokumentacije, rok za dostavljanje ponuda je produžen do 18.10.2022. godine, kada je bilo i javno otvaranje ponuda.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SUP/01-908/22-5074/1 je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 839.864,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.

3.26. Rekonstrukcija Laboratorije 3 nivoa

Izvođenje radova na rekonstrukciji Laboratorije 3 Nivoa za potrebe Instituta za javno zdravlje

- Od realizacije projekta odustalo Ministarstvo zdravlja, dok će sredstva namijenjena za realizaciju ovog projekta kroz Anex finansijskog sporazuma biti realocirana na druge projekte Ministarstva zdravlja.

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Laboratorije 3 Nivoa za potrebe Instituta za javno zdravlje

- Od realizacije projekta odustalo Ministarstvo zdravlja, dok će sredstva namijenjena za realizaciju ovog projekta kroz Anex finansijskog sporazuma biti realocirana na druge projekte Ministarstva zdravlja.

3.27. Radovi na izgradnji operativnog centra

Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Ugovorom je predviđena izgradnja javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije za potrebe Instituta za javno zdravlje. Planirana spratnost objekta je Po+P+2. Bruto razvijena površina objekta je 1506,48 m², a neto površina 1318,38 m².
- Glavni projekat je izrađen od strane Instituta za javno zdravlje.
- Tenderska dokumentacija je objavljena 30.03.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 30.05.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 03.06.2022.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Nakon ex-ante kontrole pripremljenog Ugovora od strane EU Delegacije, isti će biti potpisan sa odabranim Ugovaračem.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3495/1 je zaključen 27.09.2022. godine na iznos od 2.144.491,25 €.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini utrošeno je 214.449,00€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
- U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslate odabranim firmama 31.05.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
- Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena 28.09.2022. godine.
- Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci.



Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
- U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslate odabranim firmama 31.05.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
- Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena 28.09.2022. godine.
- Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci.

PROGRAM

IV. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

POTPROGRAM

4. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA
--

4.1. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i Palate pravde

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju, Baru kao i jedinstvenom sistemu pravosuđa / IKT-u. Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju. Takođe, projekat Palata pravde i rekonstrukcija stare zgrade Vlade finansirat će se iz kreditnih sredstava. Period realizacije 2018.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.800.000€.

Osnovni sud u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-326/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Osnovni sud u Nikšiću

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Podgorici i Nikšiću je raspisano 12.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-324/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "URBI PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.01.2019. godine, na iznos od 4.477,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.477,00 € za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Osnovni sud u Kotoru

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za Osnovni sud u Kotoru raspisano je 19.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-1379/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.03.2019. godine, na iznos od 4.980,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za radove u objektima sudova Podgorici, Nikšiću i Kotoru je raspisano 20.05.2019. godine. Ugovor br. 01-9464/1 sa revidentom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2019, na iznos od 13.820,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.980,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Osnovni sud u Beranama

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3283/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interforma" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.053,50€.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite naradu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.053,50€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Osnovni sud u Bijelom Polju

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za sud u Beranama i Bijelom Polju je raspisano 15.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-3284/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Interformom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2019. godine, na iznos od 4.549,60 €.
- Ugovor br. 01-7459/1 sa revidentom glavnog projekta za sudove u Beranama i Bijelom Polju, "Institutom za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.10.2019. godine, na iznos od 7.490,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta. Radovi će se finansirati iz IPA fondova.
- Na realizaciji projekta do sada je ukupno utrošeno 4.549,60€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Vrhovni sud u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača za izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije je raspisano 26.12.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti za izradu projekta postojećeg stanja objekta. Ugovor br. 01-1260/1 sa obrađivačem elaborata geodetskog snimanja lokacije, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.02.2019. godine, na iznos od 2.299,00€.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte je završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta. Obaveza Vrhovnog suda i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi glavnog projekta.
- Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 2.299,00€ za tekuće izdatke, pri čemu nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Objekat Palate pravde

- Obaveza Ministarstva pravde je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, kao i saglasnost glavnog državnog arhitekta da nije neophodno sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa, u koliko je projekat predmet donacije, nakon čega će Uprava za kapitalne projekte raspisati javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

4.2. Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu



- Planirana je izgradnja četiri objekta u kompleksu u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520m², uz dodatnih 1135m² atrijuma i otvoreni sportski poligon.
- Konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja je sproveo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom pravde.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine. Ugovor br. 01-8439/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing-invest“ d.o.o., Danilovgrad, je zaključen 04.11.2019. godine, na iznos od 86.817,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-523 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-impuls“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 8.954,00 €.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije objekata kompleksa.
- Završene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izmiještanje dalekovoda i izgradnju nove trafostanice za potrebe kompleksa.

- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Ukupno je realizovano 13.334,20€ u 2022. godini.

Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac

- U skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, Ministarstvo pravde sprovodi aktivnosti na izradi projekta "Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac". Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnou bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.
- Uprava za kapitalne projekte je u skladu sa svojim nadležnostima, sprovela procedure javnih nabavki, zaključila i realizovala ugovore za izradu i reviziju geodetskih i geotehničkih podloga za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora u sjevernoj regiji – Opština Mojkovac.
- Odluka o izboru revidenta glavnog projekta zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu je donesena 24.08.2022. godine. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac je zaključen 17.10.2022. godine br.01-334/22-4365/1 između Uprave za kapitalne projekte i Ing invest d.o.o. iz Danilovgrada. Vrijednost ugovora iznosi 59.290,00€.
- Uprava za kapitalne projekte će za potrebe izrade i revizije glavnog projekta trafostanice 2x1000 kVA sa dovodnim 10kV kablom planirati sredstva i sprovesti tenderski postupak nakon dostavljanja potpisanog projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova od strane Vašeg ministarstva.
- Uprava za kapitalne projekte će za potrebe izrade i revizije glavnog projekta vodosnabdijevanja zatvora od izvorišta Gojakovići do lokacije zatvora, planirati sredstva i sprovesti tenderski postupak nakon dostavljanja potpisanog projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova od strane Vašeg ministarstva.
- Revizija glavnog projekta je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Regulacija korita rijeke Tare

- Za izradu Glavnog projekta regulacije dijela korita rijeke Tare na dužini od cca 800m u Opštini Mojkovac, potpisan je ugovor sa firmom "HydroGis system" doo Podgorica br.ugovora 01-334/22-2777/1 od 30.06.2022.godine u iznosu od 33.396,00€ sa PDV-om.
- Za vršenje revizije na osnovu javnog nadmetanja odabrana je firma "Civil enginner" doo Podgorica, ugovor br. 01-334/22-4932/1 od 15.11.2022.godine, gdje je vrijednost ugovora 3.993,00 sa PDV-om. U toku je izrada glavnog projekta.
- Ukupno je realizovano 16.698,00€ u 2022. godini.

4.3. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija

- Objava tendera bila je 09.06.2021. godine, a krajnji rok za dostavljanje aplikacija 09.07.2021. nakon uspješno završene I faze evaluacionog procesa, objavljena je tenderska dokumentacija sa krajnjim rokom za dostavljanje ponuda do 24.12.2021. godine, nakon čega se otpočelo sa evaluacijom i vrednovanjem pristiglih ponuda. Nakon završetka evaluacionog procesa, pristupiće se potpisivanju ugovora sa odabranim ponuđačem koji je u obavezi da izradi tendersku dokumentaciju za radove za sve projekte za potrebe pravosuđa.
- Ukupno je realizovano 600,00€ u 2022. godini.

POTPROGRAM

4 b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE
--

4.4. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrtu projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.650.000,00 € (za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju).
- Ukupno je realizovano 16.214,00€ u 2022. godini.

4.5. Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i

- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4763/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na iznos od 13.809.971,09 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 24 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak radova.
- Konstantovano je obilaskom parcele na kojoj će se izvoditi radova da se na istoj nalazi dalekovod koji je potrebno izmjestiti zbog potreba nesmetanog izvođenja radova.
- Nakon stvaranja uslova od strane stručnog nadzora za izdavanje naloga za uvođenje izvođača u posao u skladu sa ugovornim obavezama, izvođač radova će biti uveden u posao.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini, utrošeno je 1.380.997,109 eura.

PROGRAM

**V. UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

POTPROGRAM

5. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR JAVNA BEZBJEDNOST I ODBRANA
--

5.1. Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite

Rekonstrukcija bivšeg pograničnog punkta Božaj

- Korisnik projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi projektnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti. Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Radovi obuhvataju rekonstrukciju migracionog centra koji će biti rekonstruisan na način da će migrantima biti pružena sva neophodna pomoć u skladu sa međunarodnim standardima.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Imajući u vidu da korisnik projekta nije dostavio Revidovani Glavni projekat, nisu se stvorili uslovi za dalju realizaciju projekta.

5.2. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00 €.

PROGRAM

VI. JAVNA BEZBIJEDNOST

POTPROGRAM

6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI

6.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekt je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
u suterenu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će se stvoriti uslovi za završetak radova I faze i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze koja će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
- U 2022. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



6.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom.
- Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar – inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „ Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00€.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02€).
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa

stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00€.

- Radovi na izgradnji su otpočeli krajem novembra 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4140/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.08.2021. godine na iznos od 976.504,29€.
- Radovi na izgradnji objekata kompleksa su završeni. Preostale su funkcionalne probe izvedenih instalacija, sistema i opreme.
- Završetak radova na objektima je prolongiran usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, podzemnih instalacija koje nisu bile prepoznate katastrom podzemnih instalacija dobijenim od strane nadležnih preduzeća, kao i usljed odlaganja iseljenja korisnika iz postojećih objekata planiranih za rekonstrukciju i rušenje. Do pojave nepredviđenih radova došlo je usljed nedostataka u projektnoj dokumentaciji koji se odnose na neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji. Otvorenom javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, ograda oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici je raspisano 05.07.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5311/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 187.022,56€.
- Ukupno je realizovano 2.296.244,78€ u 2022. godini.



PROGRAM

**VII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE
GORE**

POTPROGRAM

7. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE
--

7.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

Rekonstrukcija kompleksa kasarna "Masline" za potrebe Vojske Crne Gore

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane. Planirano je da se rekonstrukcija kompleksa odvija fazno.
- Ministarstvo odbrane je kroz prvu fazu realizacije obihvatilo rekonstrukciju dva postojeća objekta i to objekte KN18 i KN19 za potrebe logističkog bataljona i vojne policije.
- Ministarstvo odbrane je zaključilo ugovor sa izvođačem radova "Bemax" d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 2.970.291,19 € i sa vršiocem stručnog nadzora "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, vrijednosti 84.700,00 €.
- U 2020. godini su završeni svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji objekata KN18 i KN19.
- Druga faza realizacije obuhvata rekonstrukciju dva postojeća objekta KN 20 i KN 21 i za iste je krajem 2020. godine Ministarstvo odbrane zaključilo ugovore sa izvođačem radova "Bemax" d.o.o. iz Podgorice, vrijednosti 3.326.755,54€, kao i sa vršiocem stručnog nadzora "Sedam -ing" d.o.o. Podgorica, vrijednosti 103.500,00€.
- Radovi na realizaciji objekta KN 20 i KN 21 završeni su krajem 2021. godine i od strane Ministarstva odbrane početkom 2022. godine završene su i aktivnosti na tehničkom pregledu objekata.
- Ukupno je realizovano 206.418,41€ u 2022. godini.

7.2. Izgradnja objekata za prihvatanje i servisiranje vazduhoplova-hangar "Knjaz Danilo" u Golubovcima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 27.05.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.400.000,00€.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-6009/1 od 27.12.2022. godine sa privrednim društvom »Eurozox« d.o.o. Danilovgrad na iznos 2.394.492,843 € bez PDV-a.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora br. 01 – 47/22 od 27.05.2022. godine poništeno je 13.12.2022. godine budući da nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Dana 28.12.2022. godine ponovo je pokrenuta procedura odabira stručnog Nadzora za predmetni objekat. Procijenjena vrijednost iznosi 72.000,00€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

7.3. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.200.000,00€.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5249/1 od 30.11.2022. godine sa privrednim društvom »Eurozox« d.o.o. Danilovgrad na iznos 1.799.995,15 € bez PDV-a.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.05.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 66.000,00€. Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5762/1 od 20.12.2022. godine sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro“ d.o.o. Podgorica na iznos od 66.000,00€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

7.4. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici

- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva odbrane kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.

PROGRAM

VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA

PODPROGRAM

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

8.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

- Dom starih nalazi se na urbanističkoj parceli br. 33, u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Konik - Stari Aerodrom III" u Podgorica. Ukupna bruto površina objekta iznosi 11.225 m².
- Objekat je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata. Predviđen je za boravak 270 korisnika smještenih u: 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana.
- Pored smještajnih jedinica objekat sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, medicinski blok i prateće tehničke prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 23.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3108/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2017. godine, na iznos od 8.787.071,48€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača na ugradnji liftova je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9982/1 sa izvođačem na ugradnji liftova, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2019. godine, na iznos od 329.308,71€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5270/1 sa stručnim nadzorom, „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 18.12.2017. godine, na iznos od 119.836,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje nepredviđenih radova raspisano je 20.08.2020.godine. Ugovor br. 01-334/20-8275/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 399.515,05€.
- U januaru 2021. godine završeni su svi ugovoreni radovi na izgradnji objekta i uređenju terena, kao i opremanje objekta namještajem.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje završnih radova raspisano je 15.12.2021.godine. Ugovor br. 01-334/22-591/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.02.2022. godine, na iznos od 36.299,91€.
- Nakon završetka svih ugovorenih radova, vršilac tehničkog pregleda je ukazao na problematiku ugrađenih liftova u objektu sa aspekta protivpožarne zaštite, zbog nepostojanja nacionalne zakonske regulative i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast. S tim u vezi, urađena je i revidovana dodatna projektna dokumentacija na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje 14.04.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-2782/1 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.06.2022. godine, na iznos od 48.399,31€.
- Završen je tehnički pregled objekta, izdata je upotrebna dozvola i objekat je predat korisniku.
- Ukupno je realizovano 248.967,85€ u 2022. godini.



8.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću



- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjesa. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti. Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine, Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji što za posljedicu ima pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4215/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.09.2021. godine, na iznos od 231.255,83 €.
- Javno nadmetanje za izvođenje radova na nabavci i ugradnji liftova je raspisano 08.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6694/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 113.619,00 €.
- Na objektu su završeni svi radovi. U toku je procedura tehničkog prijema objekata u cilju dobijanja upotrebne dozvole.
- Ukupno je realizovano 12.425,53€ u 2022. godini.

8.3. Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

- Objekat je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni “ŠS”, u zahvatu DUP-a “Polje Zaljevo”.
- Objekat je projektovan sa spratnošću Pr+1. Ukupna bruto površina prizemlja iznosi 442,45m², dok bruto površina sprata iznosi 509,0m². Na prizemlju između ostalog su prdviđene sljedeće prostorije: senzorna soba, igraonica, dvije sobe za edukativne aktivnosti, trpezarija, kuhinja. Na spratu se nalaze prostorije za fizikalnu terapiju, kancelarije psihologa, defektologa, logopeda, sala za sastanke.
- Od strane Opštine Bar dostavljen je revidovani Glavni projekat Dnevni centar sa smetnjama u razvoju.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisano je 23.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 1.500.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 50.000,00€.


8.4. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

8.5. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na dogradnji dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 970.000 € bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. Godini

8.6. Izgradnja Doma starih u Plavu

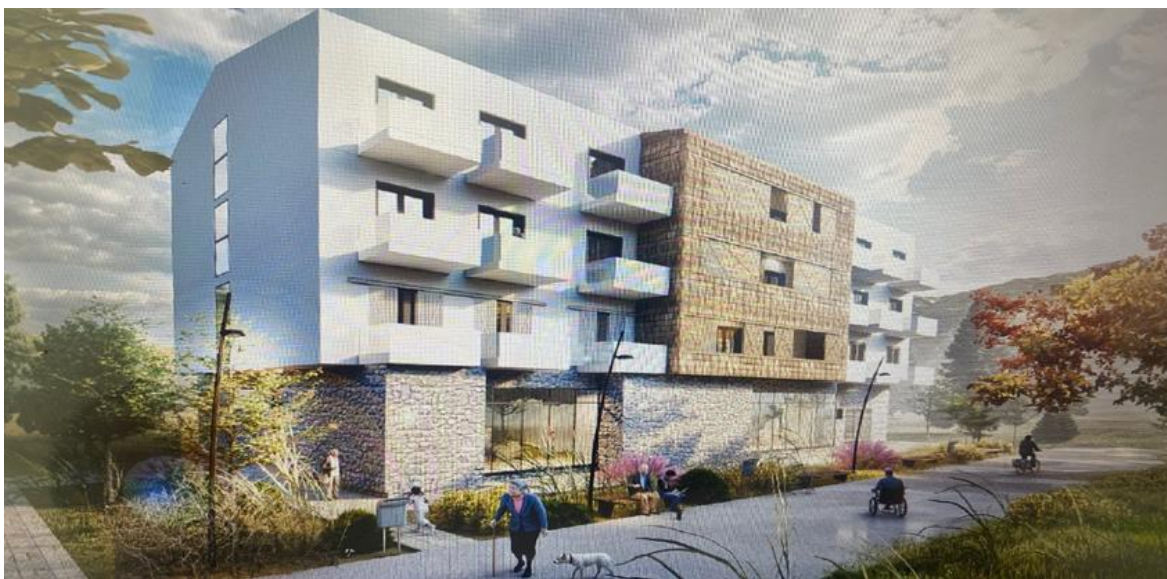

- Projektnu dokumentaciju dostavila opština Plav. Projekat izradila „Agencija za projektovanje i planiranje” Nikšić. Revident projekta „Concept project” Podgorica.
- Projektni zadatak je potpisan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.
- Projekat je urađen po osnovu Projektnog zadatka u skladu sa UT uslovima izdatim 2019.godine. od strane opštine Plav. Prema zahtjevu investitora objekat je spratnosti Su, P i 3 sprata. Ukupna neto površina objekta je 2.308,71m², a bruto površina 2.885,81m². Na tri sprata u 46 smještajnih jedinica ukupno je predviđeno 64 korisnika. Na I spratu je predviđeno 11 smještajnih jedinica za ukupno 16 korisnika, od toga 1 apartman, 6 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe, pratećim holom za boravak, prostor za medicinsko osoblje. Na II spratu je predviđeno 12 smještajnih jedinica za ukupno 22 korisnika, od toga 1 apartman, 9 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe sa pratećim holom za boravak. Na III spratu je predviđeno 13 smještajnih jedinica, od toga 1 apartman, 10 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe kao i prethodni spratovi sadrži stacionar za nepokretna i hendikepirana lica, hol za zajednički boravak sa mini kuhinjom i ostavom za čisto i prljavo rublje. Vertikalne komunikacije u objektu su tako projektovane da povezuju sve etaže objekta i sastoje se od javnog stepeništa kao i putničkog i bolničkog lifta.
- Uprava za kapitalne projekte je nakon sprovedenog postupka javne nabavke od 10.06.2022. godine zaključila ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „LD-gradnja” doo Nikšić br. 01-334/22-5395/1 od 06.12.2022. godine, na iznos od 2.854.847,49€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.10.2022. godine, a je ugovor je zaključen sa “Projectman” d.o.o. iz Podgorice br. 01-334/22-5389/1 od 06.12.2022. godine. Ugovoreni iznos je 17.990,00€.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

PROGRAM

IX. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

POTPROGRAM

9. a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

- Uprava za kapitalne projekte je sa Prijesticom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

9.1. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 307.869,50€.

9.2. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- U 2022. godini na realizaciji ovog projekta utrošeno je 536.717,25€.

9.3. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 419.483,56€.

9.4. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 221.183,64€.

9.5. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 116.161,83€.

9.6. Adaptacija prostora u d.o.o. Sportski centar Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 758.863,40€.

9.7. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 1.840.008,39€.

9.8. Unapređenje gradski, lokalnih i nekategorisanih puteva

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 1.484.018,09€.

9.9. Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 476.152,05€.

9.10. Rekonstrukciju, adaptaciju dječijeg objekta bolničkog kompleksa JZU Danilo I - objekata stare dječije bolnice i nekadašnji objekat bolnice Danilo I


- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

9.11. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem

terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.

- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave za kapitalne projekte. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih viškova radova. U toku je definisanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.
- Početkom 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova na izgradnji tribinskih prostora i izvođeni su radovi na uređenju terena. Takođe, korisnik je inovirao zahtjeve vezane za izradu terena za igru i dodatne zahtjeve na izvedenim instalacijama u cilju ekonomičnosti objekta tokom njegove eksploatacije. Krajem 2022. godine definisane su neophodne aktivnosti za završetak radova na objektu.
- Ukupno je realizovano 1.377.545,79€ u 2022. godini, od čega za kapitalne izdatke 1.347.720,22€ i tekuće izdatke 29.825,57€.
- Na realizaciji projekta je utrošeno budžetskih 132.946,80€ za tekuće izdatke, odnosno 2.952.388,33€ za kapitalne izdatke. U dosadašnjoj realizaciji FSCG je učestvovao u finansiranju iznosa od 2.238.000€ (25,48% ugovorene vrijednosti).

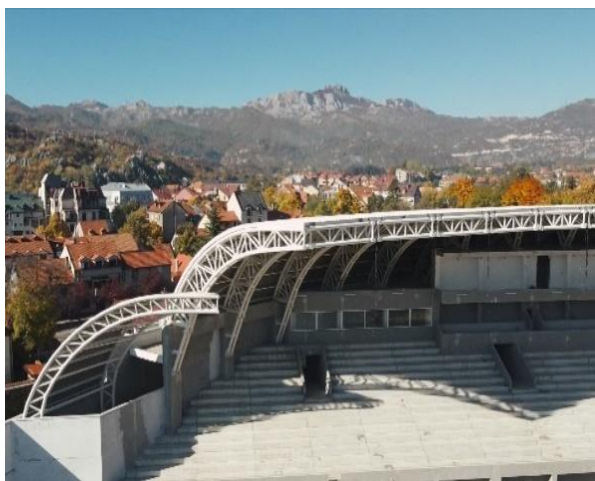



9.12. Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza

- Nije bilo realizacije u 2022. godini na ovom projektu.

9.13. Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 284.422,90€.

9.14. Izgradnja II faze pristupnog puta

- Na realizaciji ovog projekta u 2022. godini utrošeno je 135.428,23€.

9.15. Rekonstrukcija Bajičke ulice

- Nije bilo realizacije u 2022. godini na ovom projektu.

PROGRAM

X. UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

POTPROGRAM

10. a. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTO-PUTA BAR-BOLJARE
--

- Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o auto-putu donijela Odluku o imenovanju državne komisije za tehnički pregled autoputa. U skladu sa Odlukom, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori koji se realizuju u kontinuitetu.

POTPROGRAM:

**10. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR
SAOBRAĆAJ**

10.1. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT 1: Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV) i LOT 2- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS)-phase II.

Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV)

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
- Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
- Realizacija projekta je u toku.
- Na realizacija projekta u 2022. godini, nije bilo utroška.

VTMIS- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćena podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio

veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).

- Tenderska dokumentacija je objavljena 27.07.2021. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda 15.10.2021. godine. Otvaranje ponuda je održano 18.10.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 zaključen je 13.12.2021. godine, vrijednost ugovora je 1.425.000,00 €.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 08.02.2022.godine.
- Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja izdavanja početka implementacije.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisana 07.11.2022. godine čime je produžen rok implementacije za 240 dana, tj. do 14.06.2023. godine usled nemogućnosti proizvođača da potrebnu opreme proizvede u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu energetske komponente usljed posledica izazvanih pandemijom COVID-a i rata na teritoriji Evropske unije.
- Ukupno je realizovano 571.160,00€ u 2022. godini.

10.2. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
- U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU.
- Projektom je obuhvaćena oprema koja se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 je zaključen 30.11.2021. godine na iznos od 941.474,00 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
- Potpisana su dva Anexa ugovora koje su se odnosile na produženje roka implementacije do 02.02.2023. godine. Rok je produžen zbog nemogućnosti proizvođača opreme da istu proizvedu u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu usljed pandemije COVID-a.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 626.302,04€.

10.3. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPA II/CAP17/SER/01-8132/1 sa obrađivačem projekta, „B&S Europe“, je zaključen 20.11.2019. godine, na iznos od 3.659.900,00€.
- Rok realizacije projekta je 48 mjeseci.

- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 1.540.530,15€.

10.4. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom doprinosa postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja kao i pripremi projekata iz oblasti saobraćaja.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-4474/1 je zaključen 15.10.2021. godine, na iznos 1.981.040,00€.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 05.11.2021. godine.
- U toku je implementacija Ugovora.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 1.566.234,65€.

10.5. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju



- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
- Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €.
- Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
- Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
- Addendumom br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00 € a period implementacije projekta je produžen na 36 mjeseci.
- Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.

- Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekta. Glavni projekt koji je dostavljen 02.06.2021. godine je time je implementacija prve faze ugovora završena.
- Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i evaluaciju pristiglih ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Nalog za početak 2 faze ugovora izdat je 13.08.2021.godine Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice.
- Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAI/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42 €.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini do sada je utrošeno 74.623,00€.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SER/01-908/21-2171 je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
- Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini nije bilo utroška.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Svrha projekta je poboljšanje uslova prevoza i vremena putovanja na željezničkom koridoru Bar-Vrbnica. U tom kontekstu ponuđač će obezbediti građevinske radove na adaptaciji i rekonstrukciji postojeće zgrade prekogranične željezničke stanice Bijelo Polje na pruzi Bar – Vrbnica kako bi postala zajednička granična stanica Crne Gore i Srbije, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i EU standardima. Radovi će obezbediti odgovarajuće uslove za rad i omogućiti paralelnu kontrolu prekograničnih organa Crne Gore i Srbije. Ovo će isključiti potrebu za dvostrukim zaustavljanjem vozova i smanjiti carinsku kontrolu/vreme putovanja za 30 min. Ugovor o radovima će se realizovati prema Opštim uslovima za ugovore o radovima koji se finansiraju iz budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj (EDF).
- Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 18.02.2022. godine.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Prva faza izvođenja radova koja je obuhvatila isključivo lijevi dio zgrade i čitav drugi peron je završena i taj dio željezničke stanice je u potpunosti u funkciji.
- Druga faza izvođenja radova koja se tiče desnog dijela zgrade i pomoćnog objekta je počela tokom novembra 2022. godine.
- Implementacija projekta je u toku.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini do sada je utrošeno 770.048,46€.

10.6. Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj

- Korisnik projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi projektnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti. Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Radovi obuhvataju rekonstrukciju migracionog centra koji će biti rekonstruisan na način da će migrantima biti pružena sva neophodna pomoć u skladu sa međunarodnim standardima.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- Imajući u vidu da korisnik projekta nije dostavio revidovani Glavni projekat, nisu se stvorili uslovi za dalju realizaciju projekta.

10.7. Adaptacija/rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika

- Završena izrada i revizija projektne dokumentacije krajem 2021. godine.
- Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
- Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 190.000,00€.
- Nakon raspisivanja javnog nadmetanja, i evaluacije pristigle ponude, konstatovano je da dostavljena ponuda u značajnoj mjeri prevazilazi procijenjenu vrijednost projekta, čime nisu stvoreni uslovi za potpisivanje Ugovora.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

10.8. Upravljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u CG

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
- Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
- Realizacija projekta je u toku.
- Ukupno je realizovano 277.554,99€ u 2022. godini.


PROGRAM


**XI. UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG
SISTEMA, NAUKE, KULTURE I SPORTA**

POTPROGRAM

11. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA I NAUKE

11.1. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

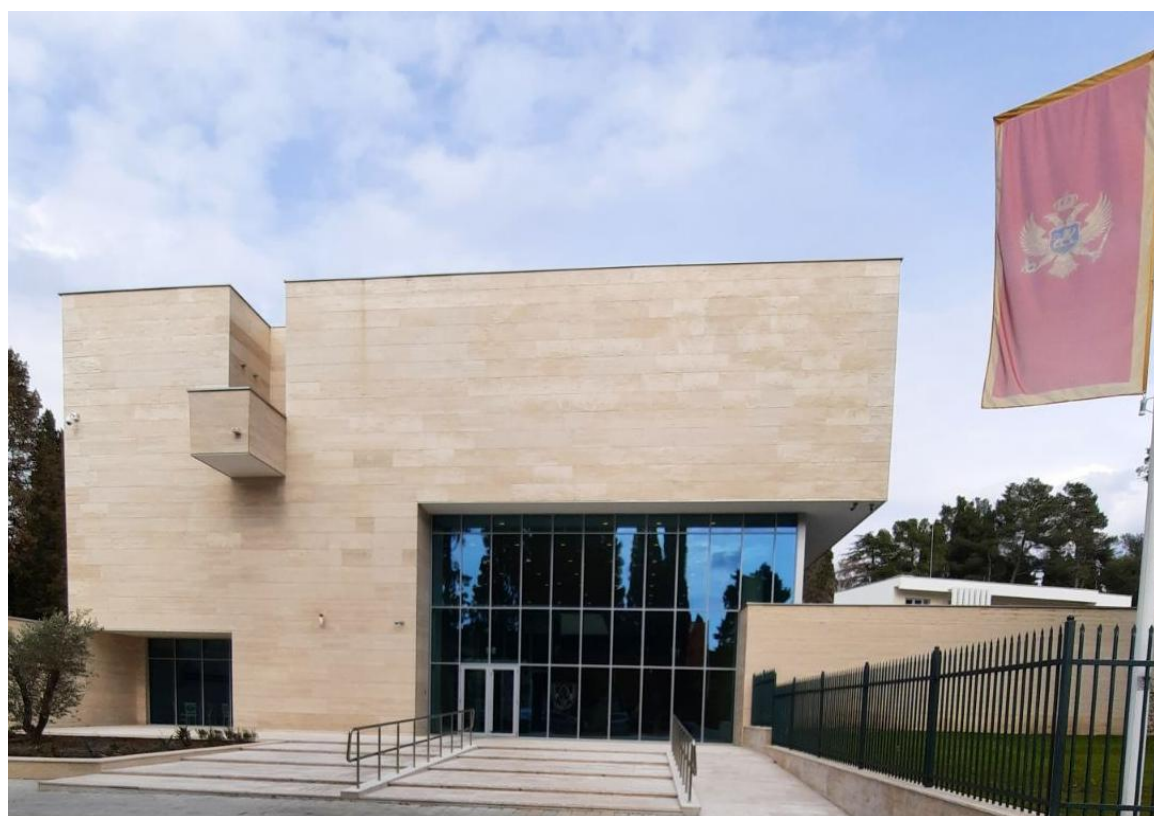

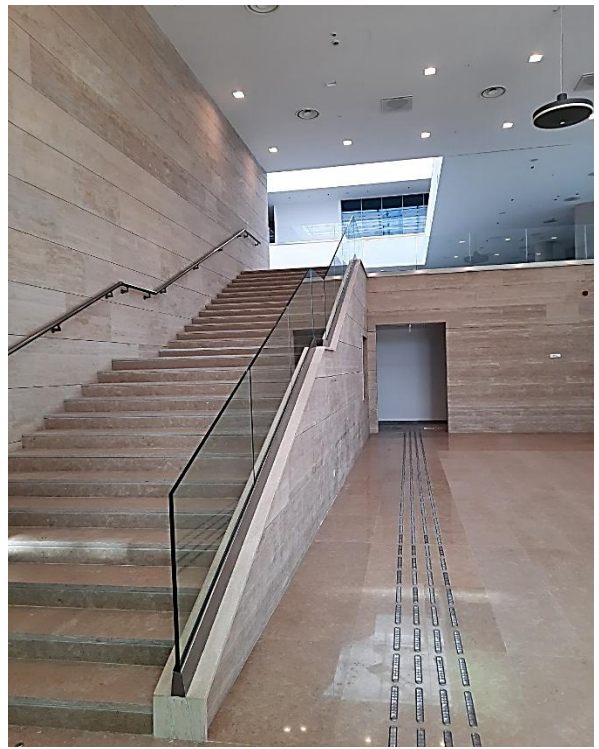

- Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
- Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00€.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji što za posledicu ima pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 11.10.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-6008/1 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2022. godine, na iznos od 115.316,63 €.
- Do kraja 2022. godine na objektu su završeni radovi na izgradnji objekta, kao i veći dio instalaterskih radova i radova na opremanju objekta. U toku su radovi na uređenju terena, kao i završni instalaterski radovi i radovi na opremanju.
- Ukupno je realizovano 3.381.358,79€ u 2022. godini.

11.2. Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja

- Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u svim opštinama po prioritetima resornog ministarstva. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Bloku VI, Podgorica

- Vrtić se nalazi na urbanističkoj parceli UP 11, u Bloku VI u Podgorici bruto površine 1.568 m² i spratnosti: suteran, prizemlje i jedan sprat, planiran za boravak 215 djece.
- Radovi na izgradnji objekta su završeni u 2021. godini.
- Ukupno je realizovano 268.390,47€ u 2022. godini.



Adaptacija postojećeg objekta JU OŠ u Dacićima u Opštini Rožaje

- Nakon što je prvobitno raspisao javno namdetanje poništeno, javno nadmetanje za izbor izvođača je ponovno raspisano 10.11.2022. godine. Ponuda izvođača „Ding” doo iz Podgorice je izabrana na iznos od 247.000,00€ bez PDV-a. Projektni zadatak je potpisan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/21-5134/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex Architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 19.10.2021. godine, na iznos od 3.700,00€ bez PDV-a.
- Kada se stvore povoljni vremenski uslovi, izvođač će biti uveden u posao.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izvođenje radova na adaptaciji krova fiskulturne sale SMŠ „Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.05.2022. godine. Sa izvođačem „Entext Inžinjeri” doo iz Podgorice 29.07.2022. godine, zaključen je ugovor br.01-334/22-3218/1 na iznos od 134.993,67 € bez PDV-a.
- Ugovor br. 01-334/21-3145/3 sa stručnim nadzorom „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog”, je zaključen 27.07.2022. godine, na iznos od 4.900,00€ bez PDV-a.
- Nakon završetka zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone izvođač je uveden u posao. Do kraja 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova.
- Ukupno je utrošeno 123.796,49€ u 2022. godini.

Izvođenje radova na sanaciji područnog odjeljenja u Sutorini OŠ „Dašo Pavličić” u Herceg Novom

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 29.07.2022. godine. Sa izvođačem „Entext Inžinjeri” doo iz Podgorice zaključen je 29.07.2022. godine ugovor br. 01-334/22-3215/1 na iznos od 163.541,70 € bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/21-3145/2 sa stručnim nadzorom, „Agencija za izgradnju i razvoj herceg Novog” , je zaključen 27.07.2022. godine, na iznos od 4.900,00€ bez PDV-a.
- Nakon završetka zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone izvođač je uveden u posao. Do kraja 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova.
- U 2022. godini utrošeno je 132.082,58 €.



11.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

11.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

11.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

11.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.

- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstava.

11.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2022. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova i ostalim opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Baru.

- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.


11.12. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.13. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- Završetkom radova i dobijanjem upotrebne dozvole na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima u kompleksu komisija za tehnički pregled je konstatovala nedostatke na objektima zajedničkih sadržaja i podzemne garaže i u cilju otklanjanja istih Uprava za kapitalne projekte je u martu 2022. godini raspisala tendersku proceduru za izbor izvođača za dodatne radove po primjedbama komisije za tehnički pregled. S obzirom da na navedeno javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda, ponovljeno je 27.12.2022. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 150.000,00€ bez PDV-a.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini

11.14. Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan" u Bijelom Polju

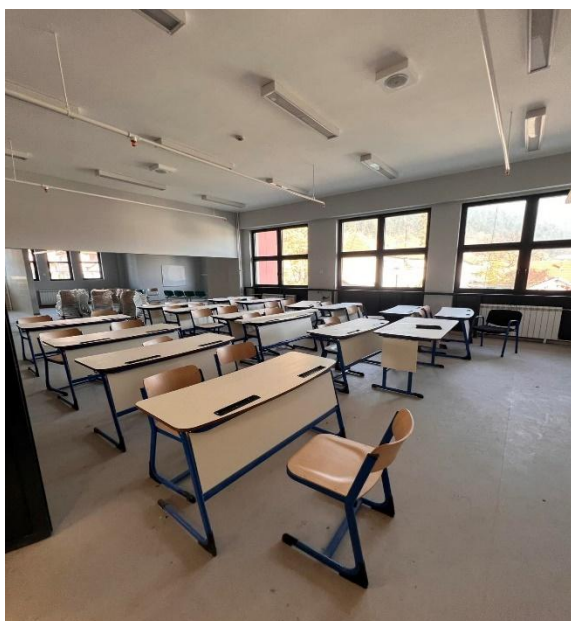

- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00€.
- Završeni su radovi na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i izradi krovne konstrukcije i krovnog pokrivača i pasarele, fasadne i unutrašnje bravarije, zidarski radovi i izrada gips kartonskih pregradnih zidova, podopolagački, keramičarski radovi, montaža sanitarija, veći dio fasaderskih radova na objektu, razvod mašinskih, elektro i instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu.
- U toku su radovi na faznom rušenju postojećeg objekta škole, radovi na izradi fasade, spoljnog popločanja, izrada ograde, molersko-farbarski radovi, montaža i povezivanje opreme mašinskih i elektro instalacija jake i slabe struje kao i opremanje objekta namještajem.
- Problematika na realizaciji projekta u toku 2019. i 2020. godine odnosila se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciji o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove raspisano je 30.10.2020. godine. Ugovor za uzvođenje dodatnih radova br.01-334/21-4112/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 24.08.2021. godine, na iznos od 1.017.555,59€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja preostalih radova raspisano je 21.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9280/1 sa stručnim nadzorom, "Sistem-mne" d.o.o. Podgorica je zaključen 06.11.2020. godine, na iznos od 18.150,00€. Radovi na izgradnji odvijali se se usporenom dinamikom, zbog kojeg je došlo do prorongiranja roka koji je uslovljen rješavanjem problematike po pitanju zahtjeva izvođača radova za uvećanje ugovorenih cijena zbog poremećaja cijena na tržištu.
- Takođe, u julu 2022. godine pojavili su se novi nepredviđeni radovi koji se odnose na priključenje objekta na vodovodnu i kanizacionu mrežu usled promjene situacije na terenu i novih uslova za priključenje objekta izdatih od nadležnog preduzeća "Vodovod Bistrica" u Bijelom Polju.
- Uprava za kapitalne projekte je u cilju rješavanja navedene tehničke problematike angažovala projektanta i revidenta za izradu projekta priključenja objekta na vodovodnu i kanizacionu mrežu i raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača koji je u toku.
- Ugovor za izradu glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3734/1 sa vršiocem usluge "ARHI KOD" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.09.2022. godine, na iznos od 1.815,00 €.
- Ugovor za reviziju glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3981/1 sa vršiocem usluge "URBI.PRO" d.o.o. Podgorica je zaključen 29.09.2022. godine, na iznos od 423,50 €.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe priključenja OŠ „Dušan Korać“, raspisano je 21.12.2022. godine procijenjene vrijednosti 52.000,00€ bez PDV-a. Tenderska procedura je u toku.
- Ukupno je realizovano 1.750.943,79 € u 2022. godini.

11.15. Naučno-tehnološki park u Podgorici

- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 3 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije. 189
- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke, kao i prijavu građenja.. Projekant glavnog projekta je "Ing-invest" d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica.



- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01- 334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđeni su dodatni radovi čije je izvođenje bilo potrebno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.
- Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01- 334/21-6693/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
- Sa radovima se nastavilo u januaru 2022. godine i do sada su izvođeni: zemljani, betonski, zidarski, bravarski radovi, izolaterski, fasaderski, kao i radovi na razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija i termotehničkih instalacija.
- Tokom izvođenja radova, utvrđena je potreba za dopunom projekta trafostanice nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izvođenje istih 30.11.2022. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost posla iznosi 355.000,00€.
- Ukupno je realizovano 1.757.029,36€ u 2022. godini od čega za kapitalne izdatke 1.737.071,62€ i tekuće izdatke 19.957,74€.

11.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.

- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

**11.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:
Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi**

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada i ovjera projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, nakon čega će se stvoriti uslovi da Uprava za kapitalne projekte raspiše javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

**11.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:
Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici**

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

**11.21. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:
Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru**

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. Godini.

**11.22. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:
Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici**

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.23. Osnovna škola u Igalu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je bila da u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovede procedure konkursa i odabere najbolje idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Igalu.

- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Uprava za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.24. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica

- Izrada idejnog rješenja, glavnog projekta rekonstrukcije toplane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 700.000,00€. Tenderska procedura je u toku.
- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.25. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-912/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 09.03.2017. godine, na iznos od 116.874,07€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6754/1 sa revidentom glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. iz Nikšića, je zaključen 23.10.2018. godine, na iznos od 8.330,00€.
- Do izmjene glavnog projekta rekonstrukcije došlo je usljed izmjene zakonske regulative koja je nalagala naknadnu izradu idejnog rješenja i pribavljanje saglasnosti glavnog državnog arhitekta. Ugovor br. 01-334/21-5135/1 sa obrađivačem izmjena glavnog projekta rekonstrukcije „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 19.10.2021. godine, na iznos od 4.500,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Ukupno je realizovano 36.556,56€ u 2022. godini.

11.26. Osnovna škola u Tivtu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.27. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi

- Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Uprava za kapitalne projekte je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-53/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 12.01.2022. godine, na iznos od 53.240,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.12.2021. godine. Ugovor br. 101-334/22-6148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 29.12.2022. godine, na iznos od 10.648,00€.
- Nakon potpisivanja ugovora projektant je izvršio obilazak objekta i obavjestio Upravu za kapitalne projekte da je za potrebe snimanja postojećeg stanja, a uzimajući u obzir stanje objekta i terena oko objekta, neophodno obezbijediti bezbjedan i siguran pristup objektu. Uprava za kapitalne projekte je sa sa preduzećem “Bokić” d.o.o. Herceg Novi zaključila Ugovor br. 01-334/22-1973/1 od 12.05.2022.godine za čišćenje lokacije na iznos od 6.050,00 €.
- Nakon raščišćavanja objekta i uklanjanja labilnih dijelova na zidovima i krovu objekta, izvršeno je geodetsko snimanje i urađeno je idejno rješenje.
- Ukupno je realizovano 6.000,00€ u 2022. godini.

11.28. Izgradnja Osnovne škole u naselju Stari Aerodrom, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.29. Izgradnja Osnovne škole u Blok 35/36, Tuški put, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.30. Sufinansiranje izgradnje vrtića „Naša Radost” na Savini

- Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, sprovodi aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
- Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom odnose se na sufinansiranje rekonstrukcije objekta vrtića i do sada je utrošeno 0,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.343.728,80€ za kapitalne izdatke.
- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo prosvjete raspisalo 09.02.2022. godine javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića “Naša Radost” na Savini, Opština Herceg Novi i isto je poništeno na osnovu člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića "Naša Radost" na Savini, Opština Herceg Novi je ponovo raspisano 21.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3216/1 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 29.07.2022. godine, na iznos od 302.264,05€.
- Izvođenje radova sa opremanjem je u završnoj fazi.
- Ukupno je realizovano 654.532,85€ u 2022. godini.

11.31. Izgradnja vrtića u Grblju

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.32. Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ „Pavle Žižić” – Njegnjevo, Bijelo Polje

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.33. Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje stručne škole Bijelo Polje

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.34. Izgradnja školske sportske dvorane JU OŠ „Džafer Nikočević” Gusinje

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.35. Izgradnja dječijeg vrtića u naselju Srpska, Golubovci

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.36. Izgradnja sportskih sala za dvije osnovne škole, Golubovci

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.37. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici

- Arhitektonski fakultet se nalazi u kompleksu Univerzitetskog centra u Podgorici. Projektnom dokumentacijom predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta Arhitektonskog fakulteta, čime će ukupna bruto površina dograđenog i rekonstruisanog objekta iznositi 5.041,12m².

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 08.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5709/1 sa izvođačem, „Stambeno“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos od 3.411.828,97€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 102.850,00€.
- Nakon potpisivanja ugovora sa vršiocem stručnog nadzora izvršiće se prijava građenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a uvođenje izvođača u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja objekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.38. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću

- Do kraja 2022. godine od strane krajnjeg korisnika nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.39. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici

- Do kraja 2022. godine od strane krajnjeg korisnika nije dostavljena kompletna dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.40. Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.41. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 27.07.2022. godine. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.930.000,00€ bez PDV-a. Krajem decembra 2022. godine pokrenuta je procedura potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca nadzora je raspisano 12.05.2022. godine za izbor najpovoljnije ponude koje još uvijek u toku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 79.000,00€ bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.42. Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović" - područno odjeljenje u Donjim Lugama

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.43. Sanacija krova i postavljanje ograde oko dvorišta OŠ "Blažo Jokov Orlandić", Bar

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.44. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" –Komani

- Krajnji korisnik je Upravi za kapitalne projekte u aprilu 2022. godine dostavio projektni zadatak za adaptaciju objekta škole OŠ „Boško Radulović u Komanima.
- Uprava za kapitalne projekte je 18.05.2022. godine potpisala ugovor br.01-334/22-2075/1 sa „Inter project d.o.o. iz Podgorice za izradu projekta adaptacije. Nakon toga Uprava je raspisala tender za izvođenje radova 07.10.2022. godine procijenjene vrijednosti 125.000,00€ bez PDV-a.
- U toku je tenderska procedura.
- Ukupno je realizovano 1.936,00€ u 2022. godini.

11.45. Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.46. Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.47. Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Radomir Mitrović" Berane

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.48. Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Polica" Berane

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.49. Izgradnja nove OŠ „Mladost” Bijelo Polje

- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.50. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić

- Sredinom 2022. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljena revidovani glavni projekat Dom digitalne revolucije u Nikšiću. Usvojenim zakonom o budžetu za 2022. godinu nisu planirana sredstva za izvođenje radova te nisu postojali uslovi za započinjanje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.51. Izgradnja III osnovne škole –opština Rožaje

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Rožaje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

- Na realizaciji projekata u 2022. godini nije bilo utroška sredstava

11.52. Izgradnja novog paviljona u sastavu OŠ „Oktoih” -Zabjelo


- Do kraja 2022. godine od strane Ministarstva prosvjete nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

POTPROGRAM



11. b. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA
--

11.53. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore – Uprave za kapitalne projekte, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijedena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem , “Roaming Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
- Završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, montaži čelične konstrukcije i pokrivanju iste aluminijumskim panelima , zidarski radovi, dio radova na izradi fasade i fasadne bravarije, malterisanju, moleraju i razvodu elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Tokom izvođenja radova Uprava za kapitalne projekte je, od strane stručnog nadzora Agencije za projektovanje i planiranje Nikšić, obavještena da je u cilju postizanja veće kategorije stadiona pokrenuta inicijativa za izmjenom projektne dokumentacije po sugestijama UEFA.
- U cilju razmatranja predložene inicijative, Opština Nikšić i Fudbalski klub “Sutjeska” su pokrenuli aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije kako bi se utvrdili finansijski i drugi faktori koji prate nastavak izgradnje kao i zakonske procedure obezbjeđenja i ugovaranja dodatnih radova.
- Nakon završetka inoviranog glavnog projekta i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta, Uprava za kapitalne projekte je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u februaru 2022. godine dostavila informaciju o nastavku realizacije predmetnog objekta kako bi u skladu sa nadležnostima istu dostavila Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem na razmatranje.
- Usvajanjem nevedene informacije, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 22.07.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je sprovedla postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Nakon okončanja navedene tenderske procedure na otvaranju zakazanom 02.11.2022. godine nije bilo pristiglih ponuda.
- Imajući u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka i utvrđeno je da je neophodno obezbjeđenje dodatnih sredstava o čemu je Uprava u decembru 2022. godine obavjestila nadležno Ministarstvo.
- Na realizaciji projekta je utrošeno 152.155,79€ u 2022. godini.

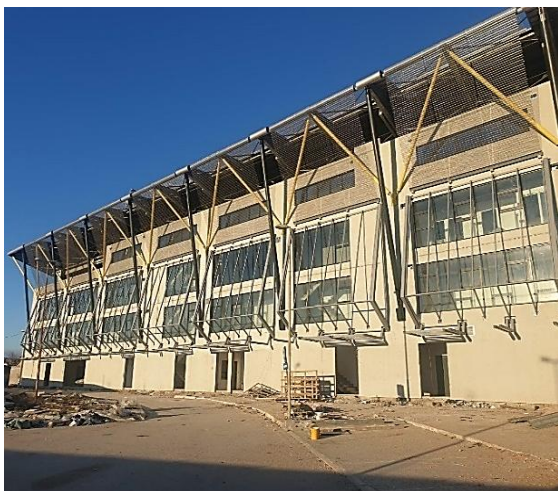

11.54. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

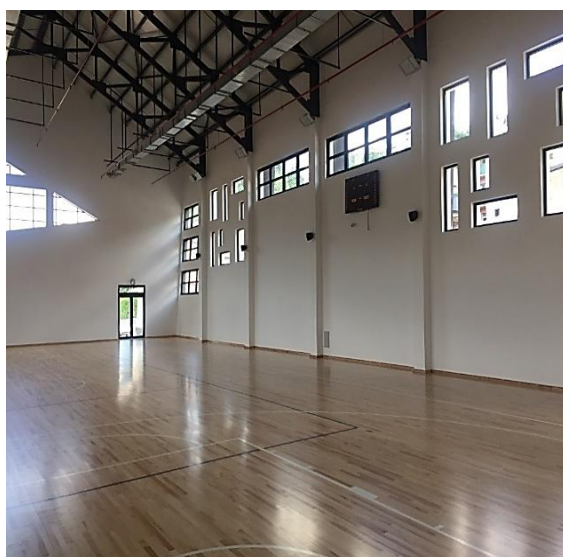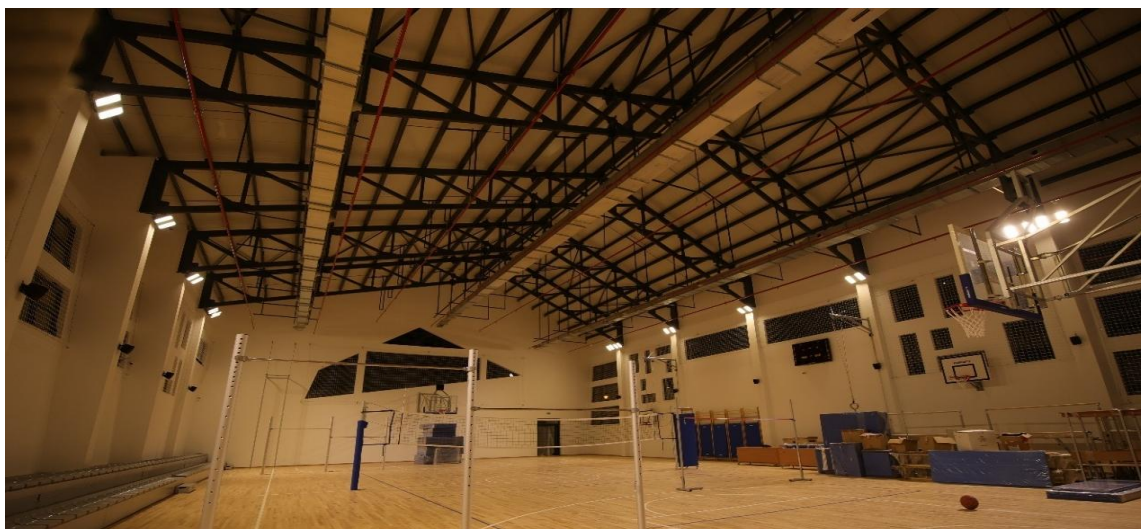

- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m², a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Rožaje.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Zaključen je ugovor 24.10.2019. godine br.01-8179/1 sa izvođačem, „Tehno-gradnja” d.o.o Pljevlja, na iznos od 1.626.827,85€ sa PDV-om. Radovi su počeli u maju 2020. godine. Zaključen je ugovor sa nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. iz Podgorice 25.10.2019. godine br.01-8230/1 na iznos 48.400,00€ sa PDV-om.
- Svi radovi na izgradnji objekta su završeni i objekat je 03.08.2022. godine zapisnikom predat krajnjem korisniku.
- Ukupno je realizovano 127.992,95€ u 2022. godini.

11.55. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru



- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Uprave za kapitalne projekte, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Uprave za kapitalne projekte iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019., 2020., 2021. i 2022. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave za kapitalne projekte.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.56. Izgradnja sportskih terena i sala

- Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena i sala na teritoriji Crne Gore, shodno utvrđenim prioritetima od strane ministarstva.
- Ukupno je realizovano 937,72€ u 2022. godini.

11.57. Izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.58. Izgradnja sportske sale JU Srednja stručna škola Pljevlja

- Obaveza Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta sprovede konkurs i odabre najbolje idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje,
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi za kapitalne projekte će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta koji će se raditi na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.59. Izgradnja sportske sale za potrebe JU OŠ “Bajo Jojić” i Srednje mješovite škole u Andrijevici

- Nakon dostavljanja projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte je u junu 2022. godine pristupila aktivnostima na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta idejnog rješenja i glavnog projekta. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Andrijevica, Osnovne škole „Bajo Jojić” i JU Srednje mješovite škole.
- Projektnim zadatkom planirana je rekonstrukcija – dogradnja sportske sale bruto površine do 1.400 m². Sadržaji obuhvataju igralište za košarku i odbojku, montažne tribine, svlačionice, prostoriju za nastavnika, spravarnicu kao i ostale tehničke i prateće prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.06.2022. godine Ugovor br. 01-334/22-5708/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 27.588,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.60. Renoviranje Doma mladih “Gorštak”

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.61. Sportska zona Kolasin-izrada projektne dokumentacije I izgradnja I faze

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.62. Pješačko biciklistička staza Dimiškin most – Kalače

- Projektom dokumentacijom je rukovala Opština Rožaje, koja je i dostavila revidovani glavni projekat, ali je 2018. godine nakon raspisivanja javne nabavke od strane Uprave za kapitalne projekte, Uprava za saobraćaj zaustavila aktivnosti zbog toga što je na tom putnom pravcu projektom predviđena treća traka i projekat biciklističke staze je stopiran.

11.63. Pokrivanje otvorenog bazena Vaterpolo i plivackog kluba Jadran na Škveru, Herceg Novi

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- **Izvođenje zanatskih i elektro instalaterskih radova na adaptaciji bazena PVK „Jadran” Škver Herceg Novi**
- Uprava za kapitalne projekte je 31.05.2022. godine pokrenula postupak male vrijednosti za izvođenje navedenih radova. Zaključen je ugovor br.01-334/22-3192/1 29.07.2022. godine sa „Inženjer Gogić” d.o.o. iz Podgorice.
- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 21.527,72€ u 2022. godini.

11.64. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo

- Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi Uprava za kapitalne projekte je raspisala poziv za obrađivača glavnog projekta Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova po sistemu »projektuj i izgradi« je raspisano 04.03.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3636/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem „Briv konstrukcion” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 4.713.850,06 €.
- Opština Herceg Novi je preuzela obavezu obezbijedenja revidenta. Upravi za kapitalne projekte do kraja 2022. godine nije dostavljeno rješenje o imenovanju revidenta projektne dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.65. Fiskulturna sala "Ivo Visin" Prčanj, Kotor

- Opština Kotor je sprovela postupak konkursnog rješenja za izradu Idejnog rješenja fiskulturne sale „Ivo Visin” u Prčnju i krajem decembra 2022. godine dostavila dokumentaciju Upravi za

kapitalne projekte na osnovu koje će biti raspisano javno nadmetanje za izradu i reviziju projektne dokumentacije.

11.66. Izgradnja gradskog bazena Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.67. Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će Uprava za kapitalne projekte ugovoriti izradu i reviziju glavnog projekta.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

11.68. Adaptacija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva

- Naručilac tehničke dokumentacije je Opština Budva i nakon dostavljanja iste 09.12.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na adaptaciji otvorenog bazena "Pizana". Procijenjena vrijednost radova iznosi 640.000,00€ bez PDV-a. Uprava za kapitalne projekte je raspisala i javno nadmetanje za vršioca stručnog nadzora 22.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 12.000,00€ bez PDV-a.
- Tehničkom dokumentacijom adaptacije postojećeg bazena planirano je da se školjka bazena u najvećoj mjeri odvoji od cirkulacije vode iz otvorenog mora formiranjem zidova bazena gdje nedostaju, a time i spriječi unošenje mulja i pjeska u bazen, kao i da se školjka bazena i hodna površina oko bazena obloži keramičkim pločicama.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača i stručnog nadzora je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

POTPROGRAM

**11.c. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR
OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I MLADI**

11.69. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

- Projektom je obuhvaćena izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SOPEES/SER/01-22/1 je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je bio 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi za kapitalne projekte.
- Ukupno je realizovano 12.633,31€ u 2022. godini.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SOPEES/SER/01-8568/1 je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 je zaključen 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od 7 mjeseci.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
- Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
 - - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN” PODGORICA
 - - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ” PODGORICA
 - - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI” PODGORICA
 - - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA
 - - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ” NIKŠIĆ
 - - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ” HERCEG NOVI
 - - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA” BIJELO POLJE
 - - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA” NIKŠIĆ
- Tokom marta 2022. godine započeti su radovi na školskim objektima.
- Anexom br 1 ugovora o radovima implementacioni period za izvođenje radova je produžen do 31.12.2022 godine.
- Na realizaciji projekta ukupno je utrošeno 269.601.82€ u 2022. godini.

PROGRAM:

XII. ZAŠTITA,OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

POTPROGRAM

12. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE
--

12.1. Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću



- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu će nakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
- Do sada su završeni radovi na zamjeni spoljnje stolarije, sanaciji krova i izradi krovnih opšiva, sanaciji fasade, zidarski, izolaterski, keramičarski i parketarski radovi u unutrašnjosti, kao i radovi na grubom razvodu hidrotehničkih i elektro instalacija.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji usljed čega je izvršena izmjena i ponovna revizija glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija. Izmjene u projektnoj dokumentaciji rezultirale su pojavom dodatnih radova za čije izvođenje je raspisano javno nadmetanje 28.09.2022. godine i isto je u toku.
- Početkom 2022. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela Rješenje o privremnoj obustavi sprovođenja konzervatorskih mjera na objektu Dvorca kralja Nikole u Nikšiću, da bi

krajem septembra iste godine donijela novo Rješenje kojim se dozvoljava nastavak sprovođenja konzervatorskih mjera, pri čemu je izvedene radove u prizemlju objekta potrebno tretirati zasebnim konzervatorskim projektom jer ne korespondiraju sa postulatima struke i konzervatorskim principima. Nakon što Opština Nikšić, kao investitor, u saradnji sa projektantima iz „Agencije za projektovanje i planiranje“ Opštine Nikšić i „Centra za konzervaciju i arheologiju“ Crne Gore, iznađe novo projektno rješenje, na koje će Uprava za zaštitu kulturnih dobara dati saglasnost, nastaviće se sa aktivnostima na rješavanju nastale problematike.

- Ukupno je realizovano 66.416,45€ u 2022. godini.

12.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i opremanju.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, Ministarstva kulture i Glavnog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a”, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.950.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Glavnog grada je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Plužine, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja”, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 285.000,00€ u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanja polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom "Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanja polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)", za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 1.300.000,00 € u 2020. i 2021. godini.
- Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Ulcinj da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

12.3. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja „Creative Hubs”

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.4. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru.

Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju

- Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od nekadašnjeg Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-7157/1 sa izvršiocom, „Was design” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na iznos od 206.000,01€.
- Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
- Uprava javnih radova je od strane izvršioca 11.11.2020. godine obaviještena da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, nakon koje bi se predmetna oprema mogla ugraditi.
- Uprava javnih radova je o navedenom tražila zvanično izjašnjenje JU Narodni muzej Crne Gore, koje je dostavljeno 13.11.2020. godine. U istom je potvrđeno da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, te da nije moguće precizirati konačne datume stvaranja neophodnih uslova za ugradnju predmetne opreme. Takođe, Uprava javnih radova je izjašnjenjem obaviještena da je JU Narodni muzej Crne Gore obezbijedio poslovni prostor u Podgorici za privremeni smještaj ugovorene opreme, do njene konačne ugradnje u depo.
- S obzirom na to da su na ovaj način u značajnoj mjeri izmijenjeni preduslovi neophodni za konačnu realizaciju ugovora, Uprava javnih radova je nakon dalje zvanične korespondencije sa

Ministarstvom kulture, JU Narodnim muzejom i izvršiocem usluge, preduzela aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora o javnoj nabavci, koje nisu bile uspješne, te ni ugovor nije realizovan.

- Na realizaciji projekta do sada nije bilo utroška sredstva.

12.5. Izgradnja objekata za izložbeni prostor na Cetinju



- Objekat se nalazi se na zahvatu DUP-UP-a Istorijsko jezgro - Cetinje. Bruto površina objekta je 635,98 m², i sastoji se od prizemlja i dvije eteže ukopane u zemlji. Objekat služi za kontemplaciju ikone Bogorodice Filermose. Nalazi se u pećini, s toga nije vidljiv spolja, niti sa jedne tačke grada, i ne nalazi se u vizuelnom i fizičkom konfliktu sa okolinom.
- Prijestonica Cetinje je sprovedila aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta .
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7297/1 sa izvođačem, „Neimar inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.12.2016. godine, na iznos od 1.594.839,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora (za zemljane radove) je raspisano 26.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1915/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 4.650,00€.
- Do sada su sprovedene aktivnosti na uvođenju izvođača u posao u septembru 2017. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole od strane Prijestonice Cetinje, kao i izrada elaborata pripremnih radova od strane izvođača radova, ali su radovi obustavljeni zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na lokaciji, ugovoreni radovi su obustavljeni i urađen je elaborat pripremnih radova kojim su predviđeni radovi na zaštiti ulaza u pećinu. S obzirom na to da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dala saglasnost na elaborat pripremnih radova, Uprava za kapitalne projekte je obustavila dalje aktivnosti na realizaciji projekta dok se ne izvrši dopuna tehničke i druge dokumentacije potrebne za izvođenje radova, a čiji izradu sprovodi Prijestonica Cetinje.
- U 2022. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave za kapitalne projekte.

12.6. Rekonstrukcija kulturnog dobra "Gradski bedem" - ostaci Onogošta u Nikšiću

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zadužena je Uprava za kapitalne projekte da realizuje projekat "Valorizacija Gradskih bedema – ostataka Onogošta, izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa, I i II faza".
- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

12.7. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju

- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Do kraja 2022. godine nije dostavljena dokumentacija od strane nadležnih organa na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svojih nadležnosti
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

12.8. Regionalni kreativni HUB u Bijelom Polju

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.9. Rekonstrukcija doma kulture "Vladimir Popović Španac"

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.10. Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru

- Krajem 2022. godine Opština Kotor je dostavila projektnu dokumentaciju za Rekonstrukciju i sanaciju bedema u Kotoru-Položaj Sveti Franjo, kao i za sanaciju šetnih staza. U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručni nadzor.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

12.11. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić

- Bruto površina objekta „Radio i televizije Nikšić” u Nikšiću površine je cca 2.019,32 m² i sastojće se iz prizemlja, I sprata, II sprata i III sprata. Na prvom spratu su predviđene kancelarije za direktora, urednika radio televizije i prostorije za sekretaricu. Takođe, na I spratu su kancelarije za pravnike, ekonomiste i direktora radija. Uz glavni studio se nalazi prostorija za režije sa pratećom REK prostorijom. Na II spratu se nalazi kongresna sala sa

garderobom, virtualni studio, arhiva, kao i lounge bar sa pratećim prostorijama. Na III spratu su predviđene prostorije za tehničke instalacije.

- Na osnovu projektne dokumentacije koju je obezbjedila Opština Nikšić - Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić, u 2022.godini se započelo sa aktivnostima na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 13.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4366/1 sa izvođačem "LD GRADNJA d.o.o. Nikšić", je zaključen 17.10.2022.godine, na iznos od 1.793.442,65€.
- Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora je potpisan između "Radio i televizije Nikšić d.o.o. Nikšić" i "RMA INŽENJERING d.o.o. Nikšić", gdje su naručilac i izvršilac saglasni da predmetna usluga bude donacija.
- Izvođač radova je uveden u posao 07.11.2022.godine i rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Do sada su izvršeni radovi na demontaži i rušenju, radovi na čeličnoj konstrukciji, armiranobetonski radovi, razvod atmosferske i fekalne kanalizacije, kao i radovi na elektro instalacijama jake struje.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za opremanje lokalne televizije Nikšić 29.12.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 800.000,00€ bez PDV-a. Tenderska procedura je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



12.12. Intervencije na objektu Dvorac Kralja Nikole na Topolici Bar

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.13. Uređenje naselja Vranjina i tvrđave Lesendro

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.14. Teatar u Ulcinju

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.15. Kino sala, Ulcinj

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.16. Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.17. Izgradnja nove zgrade Centra za kulturu, Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.18. Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.19. Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj

- Na osnovu izvedenih radova I faze, Opština Ulcinj je dostavila predmjer radova za pripremu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za izvođenje II faze rekonstrukcije ulica u Starom gradu Kalaja u Ulcinju, u skladu sa revidovanim glavnim projektom.

12.20. Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12.21. Sanacija Doma kulture na Jasenovom Polju opštine Nikšić

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

PROGRAM

XIII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

POTPROGRAM

13. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

13.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteve i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
- Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2022. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji.

Lokalni putevi i gradske saobraćajnice

Opština Berane

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 165.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 157.483,92€.

Opština Pljevlja

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 130.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 129.999,83€.

Opština Šavnik

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 100.000,00€.

Opština Gusinje

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 109.998,98€.

Opština Danilovgrad

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu

od 130.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora je utrošeno 130.000,00€.
- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 85.939,38 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

Glavni grad Podgorica

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa 810 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 2.291.974,46 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora u 2022. godini je utrošeno 1.980.891,02€.

Opština Andrijevica

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 180.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 131.461,66€.

Opština Rožaje

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4-Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 109.746,26€.

Opština Bijelo Polje

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora u 2022. godini utrošeno je 72.114,12€.

Gradska saobraćajnica - raskrsnica Mojkovačke ulice i bivše magistrale

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-210 sa obrađivačem glavnog projekta, „BMR Baošić” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 28.06.2017. godine, na iznos od 6.902,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01-811/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2019. godine, na iznos od 2.360,00€.
- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi projekat izmještanja postojećeg 10 kV kabla.
- Nakon obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova za izmještanje 10kV kabla, što je bila obaveza Opštine Bijelo Polje, izvršena je dopuna projektne dokumentacije i pribavljene su saglasnosti nadležnih institucija.
- U toku je izrada konačnog izvještaja revizije.
- Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

Opština Petnjica

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 110.000,00€.

Opština Nikšić

- U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 130.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 129.279,84€.

Opština Mojkovac

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 100.542,77€.

Opština Kotor

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 140.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

Opština Kolašin

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 110.000,00€.
- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 –Rekonstrukcija ulice,, Boška Rašovića” u iznosu od 350.000,00€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

Opština Ulcinj

- Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u urbanoj cjelini Stari grad Ulcinj



- Revidovanim projektom je obuhvaćena rekonstrukcije ulica u starom gradu u Ulcinju, sa izmjenom fekalne kanalizacije, instalacija jake i slabe struje i popločavanjem ulica. Ovaj projekat obuhvata I fazu rekonstrukcije, što podrazumijeva rekonstrukciju dvije ulice, sa pratećom infrastrukturom. Korisnik je opština Ulcinj.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.10.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-6733/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "VOIP" d.o.o. Ulcinj, je zaključen 24.12.2015. godine, na iznos od 24.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.02.2016. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 19/2-01-800/2 sa revidentom glavnog projekta, "Urban studio" d.o.o Podgorica, je zaključen 24.02.2016. godine, na iznos od 4.900,00€.
- Međutim, kako se radovi nijesu počeli izvoditi, a u međuvremenu se promijenio Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, reviziju je trebalo ponovo uraditi u skladu sa novim

zakonom. Prethodni revident nije imao potrebne licence po novom zakonu, pa je imenovan drugi revident.

- Nadmetanje za izbor novog revidenta glavnog projekta je raspisano 03.04.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku za nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-3037/1 sa revidentom glavnog projekta, "Projectman" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 4.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 06.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5318/1 sa izvođačem, "MONTAL DSD" d.o.o. Podgorica i "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2017. godine, na iznos od 474.189,14€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-92/1 sa stručnim nadzorom, "Nik Com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 15.01.2018. godine, na iznos od 9.520,00€.
- Sprovedene su pripremne aktivnosti i pregovori kako bi se izvođaču radova omogućio početak izvođenja. Izvođač radova je uveden u posao 14.02.2020. godine, međutim, nije mogao da obezbijedi potrebnu dokumentaciju za početak, pa radovi nijesu počeli.
- Stručni nadzor se u avgustu 2020. godine izjasnio da nije u mogućnosti da nastavi aktivnosti po ugovoru, s obzirom na dug vremenski period od potpisivanja ugovora.
- Nadmetanje za izbor novog stručnog nadzora je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8276/1 sa stručnim nadzorom, "MEPING PRO" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.10.2020. godine, na iznos od 10.345,50€.
- Radovi su otpočeli 24.12.2020. godine i odvijali su se usporeno zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, otežane zamjene vodovodnih instalacija zbog nepostojanja katastra podzemnih instalacija, odabira kamena za popločavanje propisanih karakteristika.
- Svi radovi su završeni u novembru 2022. godine.
- Ukupno je realizovano 131.509,28€ u 2022. godini.

Opština Bar

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bar za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 120.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

Opština Ulcinj

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Ulcinj za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 410.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 404.525,51€.

Opština Žabljak

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu

- od 110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 110.000,00€.

Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šusanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žutokrlica, Opština Bar

- Sekreterijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine bar je Upravi za kapitalne projekte dostavio revidovani Glavni projekat. Projektant je „Via project”doo iz Podgorice (br.ugovora 01-018/20-1872 od 16.07.2020. godine) i revident „Arhitektura aurea”doo iz Podgorice (br.ugovora 01-018/21-1881 od 05.07.2021. godine).
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova br.05-26/22 od 20.04.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 930.000,00€ bez PDV-a i isto je u toku.
- Za izbor stručnog nadzora je raspisana javna nabavka br.01-69/22 od 12.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 27.900,00€ bez PDV-a i isto je u toku.

Investiciono održavanje međuopštinskog puta Šavnik-Plužine-Južni durmitorski prsten, dionice Pišće-Boriče i Bezuje-Dubrovsko

- Uprava za kapitalne projekte je 10.10.2022. godine raspisala javnu nabavku br.04-82/22 za izbor izvođača radova na predmetnom projektu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 815.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5716/1 sa izvođačem radova „Mehanizacija i programat”doo iz Nikšića je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos 814.227,00€ bez PDV-a.
- Za izbor stručnog nadzora raspisana je javna nabavka br.01-83/22 od 28.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 35.000,00€ bez PDV-a.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Opština Plužine

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora do sada je utrošeno 109.843,20 €.

Opština Herceg Novi

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 145.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 131.386,04€.

Opština Tuzi

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.400.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova

i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- Na realizaciji ugovora je utrošeno 1.246.182,93€.

Opština Plav

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture liniskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 275.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 274.799,98€.
- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plav o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje, u okviru kojeg je planirano izvođenje radova na izgradnji pločastog propusta na putu Plav-Vojno selo-Gusinje u iznosu od 50.000,00€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 42.067,49€.

13.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloloutvrda i uređenje korita rijeka

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popča, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice i Svinjače. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.
- U 2022. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacija korita rijeke Ibar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obrađivač glavnog projekta je „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođačem, „Vukotić-trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.
- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze i isto je poništeno od strane Ministarstva finansija.
- Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.
- U 2022. godini nije bilo utroška sredstava.

Sanacija puta Han Garančića - Opasanica

- Predmetni put se nalazi u opštini Podgorica, u blizini naselja Veruša. Projektom je obuhvaćena sanacija potpornih zidova u koritu rijeke i izgradnja novih zidova radi stabilizacije kosina korita rijeke, asfaltiranje dijela puta i oblaganje kanala u centru Opasanice. Korisnik je Glavni grad Podgorica - Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.
- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice zaključila je ugovor sa obrađivačem glavnog projekta, „Geoprojekt Perišić” d.o.o Podgorica i revidentom JU "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6121/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2019. godine, na iznos od 429.066,25€.
- Na otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za izbor stručnog nadzora br. 01-167/19 od 24.07.2019. godine se nije niko javio, pa je putem nabavke male vrijednosti od 02.08.2019. godine, sa "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, sklopljen ugovor za vršenje nadzora u trajanju od mjesec dana. Ugovor br. 01-6172/1 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.08.2019. godine, na iznos od 2.000,00€ i u trajanju mjesec dana od dana potpisivanja ugovora.
- Nakon obustave radova i zimskog perioda, putem nabavke male vrijednosti iz marta 2020. godine, izabran je stručni nadzor "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, za vršenje nadzora do primopredaje radova. Ugovor br. 01-334/20-3022 sa stručnim nadzorom, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.840,00€, do primopredaje radova.
- S obzirom da je u toku radova došlo je do pojave viška radova u odnosu na projektovane, sproveden je pregovarački postupak za obezbjeđenje dodatnih sredstava. Ministarstvo finansija nije odobrilo pregovarački postupak. Takođe, sprovedene su aktivnosti na izmjeni projekta u vezi sa poboljšanjem sloja asfalta i izmjenom detalja kod oblaganja korita kanala kamenom.
- Završena je izgradnja novih potpornih zidova i sanirani su postojeći zidovi u koritu rijeke (izuzev zida Z4), izrada betonskog kanala za odvod površinskih voda, izrada rigola, nasipanje tampona i asfaltiranje.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano u decembru 2020. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica, izrada potpornog zida Z4, l=28m je raspisano 16.09.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-8154/1 sa izvođačem, "Avio petrol" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2020. godine, na iznos od 19.341,36€. Troškovi stručnog nadzora obuhvaćeni su kroz prethodni Ugovor.

- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 2.486,68€ u 2022. godini.

13.3. Izgradnja gradske pijace u Rožajama



- Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Rožaje.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su ugovoreni radovi I faze.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem, „Tofi” d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i objekat je predat korisniku 21.01.2021. godine.
- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača II faze sa procijenjenom vrijednošću od 245.000,00€ bez PDV-a, koji obuhvata uređenje terena sa opremom i namještajem. Nakon završetka II faze objekat će biti u funkciji.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.4. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje



- Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
- Nakon što su završeni svi ugovoreni radovi I faze, u toku je izvođenje radova II faze.
- Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radove, asfaltnerske radova i elektro instalacije.
- Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfaltnerskih radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
- Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatali hidrotehničke, elektro i asfaltnerske radove.
- Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i u toku je tehnički prijem radova.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

II faza



- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
- Završeni su radovi na probodu puta u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.
- U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltiranje radova u dužini od 3km. Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Gusinje.
- Ukupno je realizovano 42.067,49€ u 2022. godini.

13.5. Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav

- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o., je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos 9.470,00€.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku za jednostavne nabavke, za uslugu izrade projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta rekonstrukcije puta Plav – Babino Polje – Bogićevica, Opština Plav, poslat je 29.11.2021. godine.
- Za završetak projekta neophodno je da se uradi elaborat o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta. U toku su aktivnosti na pripremu dokumentacije za izbor obrađivača ovog elaborata.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.6. Izgradnja lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla, opština Bar i graničnog prelaza Božaj, opština Tuzi



- Izgradnja puta u dužini od 1,4 km, sa dvije saobraćajne trake širine 2x2,75m, sa ivičnim trakama 2x0,25m i bankinama širine 1m, ivičnjacima, asfaltnim kolovoznim zastorom debljine 6+4cm, saobraćajnom opremom i signalizacijom. Odvodnja je riješena rigolama širine 0,5m, i kanalima. Za odvod vode kroz trup puta, predviđeni su cjevasti propusti. Korisnik je opština Bar.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Obrađivač glavnog projekta je "Put inženjering" d.o.o. Podgorica, a revident "Kov atelje" d.o.o. Nikšić.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2228/1 sa izvođačem, "Putevi Bar" d.o.o. Bar, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 690.226,70€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2896 sa stručnim nadzorom, "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 14.400,00€.
- Izvođaču radova su predate tačke operativnog poligona, ali izvođač nije uveden u posao jer Opština Bar nije stvorila zakonske preduslove za uvođenje izvođača u posao.
- Dopisom Ministarstva unutrašnjih poslova od 30.07.2020. godine, naznačeno je da će se raskrsnica koja vodi prema graničnom prelazu i Albaniji riješiti saobraćajnim rješenjem na osnovu budućeg objekta zajedničkog graničnog prelaza, što se odnosi na dio puta od PR0-PR 23. Iz tog razloga, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar izdao je djelimično Rješenje kojim se odobrava izvođenje radova od PR23 do PR85.
- Izvođač radova je uveden u posao 15.12.2021. godine i svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 426.442,08€ u 2022. godini.

13.7. Putni pravac Monte Rose

- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.11.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2148/1 sa izvođačem, Konzorcijum Besix-Briv, je zaključen 24.05.2022. godine, na iznos od 10.301.160,07 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2021. godine. Krajem decembra 2022. godine pokrenuta je procedura potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova. U skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude izabran je ponuđač "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, a čija ponuda je iznosila 219.264,10€.
- U 2022. godini utrošeno je 864.645,00 € za potrebe eksproprijacije.

13.8. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu


- Obaveza Opštine je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava za kapitalne projekte na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.9. Izgradnja trga i šetališta u opština Bar

- Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i

kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €.

- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

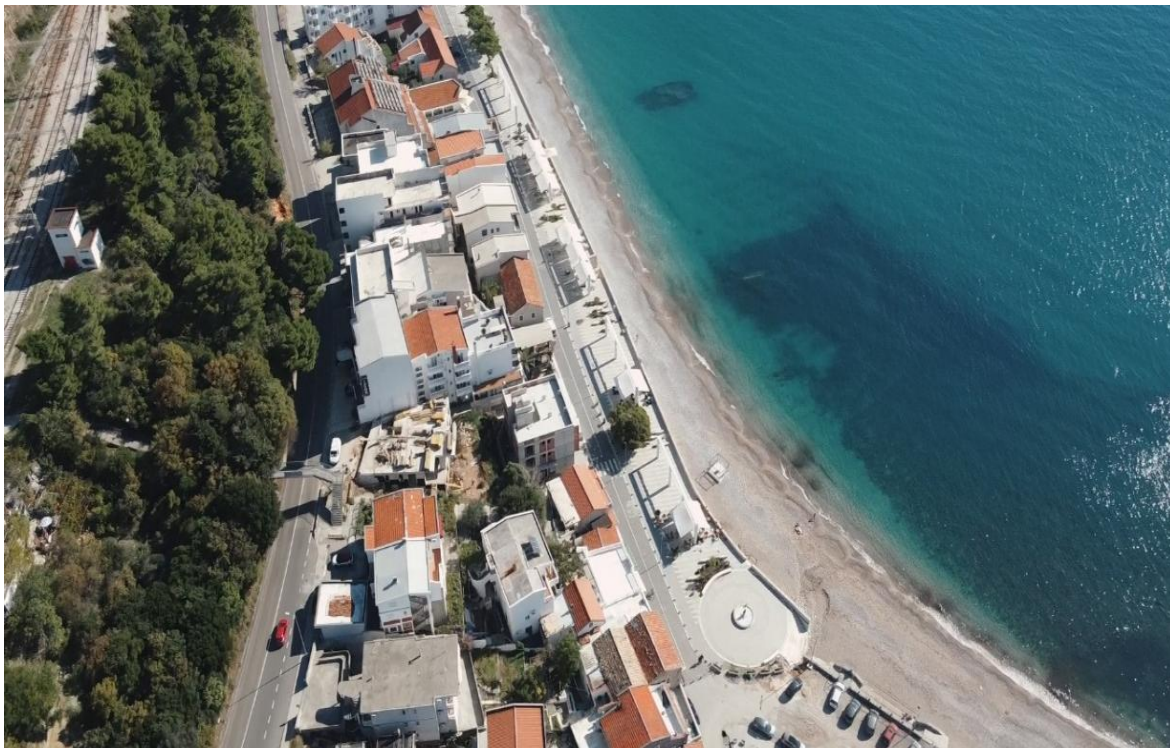

13.10. Izgradnja puta Danilovgrad Spuž, preko Martinića



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno

proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.

- Obradivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93€.
- Izvođač radova je uveden u posao 03.09. 2020. godine, ali su radovi odmah obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Radovi su više puta nastavljeni i prekidani, bez krivice izvođača radova. Uglavnom su se izvodili radovi na rekonstrukciji tri mosta, gdje nije bilo problema sa eksproprijacijom, da bi se od 25.10.2021. godine, u dogovoru sa predstavnicima Opštine Danilovgrad, radovi nastavili na dionici puta od 3+651km do 8+300km.
- Radovi se odvijaju usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, usporenog izmještanja podzemnih instalacija, što je u nadležnosti Opštine Danilovgrad, slabog odziva projektanta na zahtjeve za pojašnjenje projektne dokumentacije, nailaska na stabla skadarskog hrasta duž trase puta, za čiju zaštitu je pokrenuta inicijativa od strane Crnogorskog društva ekologa.
- Radovi su obustavljeni dok Opština Danilovgrad ne obezbijedi uslove za nastavak radova.
- Ukupno je realizovano 471.280,16€ u 2022. godini od čega je za izvedene radove 231.411,16€, a za eksproprijaciju 239.869,00€.

13.11. Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović”

- Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 04-43/22 za izbor izvođača radova i postupak jednostavne nabavke 03-9/22 za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova „Bemax” doo iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa PDV-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa „Civil engineerom” doo iz Podgorice 15.08.2022. godine br.01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa PDV-om.
- Radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 847.342,33€ u 2022.godini.

13.12. Izvođenje radova na adaptaciji seoskih puteva na području Komansko-Bandičkih sela Milati, Crvena Paprat, Mokanje i Bijela Rudina

- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula postupak javne nabavke 04-44/22 16.05.2022 za izbor izvođača radova za navedeni projekat.

- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova „Bemax”doo Podgorica 27.07.2022. godine br.01-334/22-3193/1 u vrijednosti 550.318,71€ sa PDV-om i ugovor za vršenje stručnog nadzora sa „Ding”d.o.o. iz Podgorice 28.07.2022. godine br.01-334/22-3177/5 u vrijednosti 2.298,99€.
- Radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 552.617,70€ u 2022. godini.

13.13. Izgradnja puta Srđevac – Lozna

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.14. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije..
- Na realizaciji projekta u 2022.godini ukupno je utrošeno 780.891,02€.

13.15. Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, opština Kotor

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Kotor o realizaciji programa lokalne infrastrukture –Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece u iznosu od 155.326,84€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.16. Regulacija bujičnog potoka Nemila u Meljinama, opština Herceg Novi

- Na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Opštine Herceg Novi, javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 27.08.2021. godine sa procijenjenom vrijednošću od

195.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/21-5967/1 sa izvođačem, "Briv Construction" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2021. godine, na iznos od 216.511,47€.

- Ugovor br. 01-334/21-6430/1 sa stručnim nadzorom, "Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi", je zaključen 22.12.2021. godine, na iznos od 5.808,00€.
- Radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 221.990,80€ u 2022. godini.

13.17. Izgradnja nadzemne pasarele u Bijeloj, opština Herceg Novi

- Na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Opštine Herceg Novi, javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisana su krajem 2021. godine.
- Ugovor je potpisan sa izvođačem radova „Inženjer Gogić” doo iz Podgorice 14.03.2022. godine 01-334/22-1053/1 u vrijednosti 168.123,73€ sa PDV-om. Opština Herceg Novi je obezbijedila stručni nadzor. Radovi su u završnoj fazi. Preostalo je priključenje na elektroenergetsku mrežu.
- Ukupno je realizovano 101.104,94€ u 2022. godini.



13.18. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini ukupno je utrošeno 1.200.000,00€.

13.19. Rekonstrukcija bulevara Save Kovačevića

- Glavni grad Podgorica sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.20. Rekonstrukcija puta Gusinje-Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- Ugovor je u potpunosti realizovan marta 2022. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljen revidovan Glavni projekat.
- Ukupno je realizovano 16.015,00€ u 2022. godini.
- Napomena: Predmetni ugovor se odnosio na 1. fazu dužine 1,3 km.

13.21. Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu

- Opština Plav sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- Ukupno je realizovano 82.000,00€ u 2022. godini.

13.22. Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen, sa adaptacijom planinskog doma

Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen

- Uprava za kapitalne projekte je 02.02.2022. godine raspisala javnu nabavku za sanaciju puta Kruševice-Vrbanj-Orjen. Procijenjena vrijednost radova iznosi 536.000,00€ bez PDV-a.
- Potpisan je ugovor 16.05.2022. godine br.01-334/22-2026/1 sa izvođačem „Asfalt-beton gradnja” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 419.889,12€ sa PDV-om. Zaključen je ugovor 19.05.2022. godine sa stručnim nadzorom „Ding” d.o.o. iz Podgorice br.01-334/22-2110/1 sa vrijednošću 6.655,00€ sa PDV-om.
- Svi radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 426.544,12€.

Sanacija puta Kruševice-Vrbanj-Orjen II faza Igalo

- Uprava za kapitalne projekte je 12.07.2022. godine raspisala javnu nabavku za izvođenje radova na sanaciji puta Kruševice-Vrbanj-Orjen II faza. Procijenjena vrijednost radova iznosi 296.000,00€ bez PDV-a.
- Potpisan je ugovor 07.10.2022. godine br.01-334/22-4190/1 sa izvođačem „Asfalt beton gradnja” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 356.461,16€ sa PDV-om. Zaključen je ugovor 06.10.2022. godine sa stručnim nadzorom „Ding” d.o.o. iz Podgorice br.01-334/22-4163/2 sa vrijednošću 3.993,00€ sa PDV-om.
- Svi radovi su završeni u 2022. godini.
- Ukupno je realizovano 360.454,16€.

13.23. Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Herceg Novi o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izgradnja autobuske stanice Igalo-Bare u iznosu od 392.289,69€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

13.24. Izgradnja saobraćajnice od hotela "Durmitor" do Ravnog Žabljaka

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Izgradnja kružne raskrsnice u Danilovgradu
- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izgradnja kružne raskrsnice u Danilovgradu iznosu od 85.939,38€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

13.25. Nastavak radova na zaobilaznici u Beranama

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.26. Rekonstrukcija ulice Ludviga Kube

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.27. Modernizacija lokalnog puta Hurije-Donja Lovnica-Ćosovica u Rožajama

- Projektnu dokumentaciju za ovaj projekat je izradila opština Rožaje na osnovu kojeg je potpisan ugovor sa Upravom za kapitalne projekte na osnovu programa o realizaciji lokalne infrastrukture, br.01-334/22-2952/1 od 11.07.2022. godine u iznosu od 117.441,33€, od čega tekući izdaci 35.441,33€, kapitalni izdaci 82.000,00€.
- Ukupno je realizovano 81.999,89€ u 2022. godini.

13.28. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Projektant glavnog projekta je "Via project" doo iz Podgorice, a revident "Arhitektura Aurea" doo iz Podgorice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 930.000,00€ bez PDV-a. Odluka br. 01-426/22-2522/4 o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 14.10.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg izvođača radova, "Inženjer Gogić" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 1.075.555,42 € sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.08.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 27.000,00€ bez PDV-a. Odluka br. 01-426/22-5864/1 o izboru najpovoljnije

ponude donijeta je 22.12.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 11.495,00 € sa PDV-om.

- Tenderska procedura je u toku.

13.29. Rekonstrukcija Trga "21.jul", Berane

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.30. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka

- Uprava za kapitalne projekte je 06.07.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta asfaltiranja puta Marina dolina – Radovan luka. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 20.000 € bez PDV-a i isto je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.31. Adaptacija prostora službe zaštite i spašavanja u Bijelom Polju

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.32. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 03.02.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 640.000,00€ bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br.01-334/22-2359/1, od 06.06.2022.godine, sa izvođačem radova „Krušo “d.o.o.Herceg Novi.
- Vrijednost Ugovora 750.078,48 € sa PDV-om.
- Realizacije na ovom projektu nije bilo. Izvođač radova je uveden u posao, ali radovi nijesu otpočeli zbog nedostataka u projektu.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.33. Izrada glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa

obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022 godine, na iznos od 349.941,55 €.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.34. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od „Galeba” do Titove vile

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Herceg Novi o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile u iznosu od 114.226,84€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 82.000,00€.

13.35. Rekonstrukcija šetališta „Belane” u Opštini Tivat - II faza

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Tivat za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture I niskogradnje, potprogram 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture-Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta Belane u iznosu od 114.144,84€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

13.36. Izgradnja pješačke i biciklističke staze u dužini od 10km od Doljana do Meduna

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.37. Izgradnja dijela zaobilaznice u Pljevljima od raskrsnice kod "Balkana" do raskrsnice kod "Sekcije za puteve", Pljevlja

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.38. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 19.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 1.200.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-3979/1 od 28.09.2022. godine

zaključen je sa „Briv construction” d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 1.689.160,00€ sa PDV-om.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 70.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5615/1 od 15.12.2022. godine sa GPC doo iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 39.930,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 60.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5711/1 od 19.12.2022. godine sa „GPC” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 21.634,80€ sa PDV-om.
- U toku je priprema projektne dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.39. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 2.300.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa „Briv construction” d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 2.758.800,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 150.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5613/1 od 15.12.2022. godine sa GPC doo iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 115.555,00€ sa PDV-om.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 30.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5710/1 od 19.12.2022. godine sa „GPC” d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 10.623,80€ sa PDV-om.
- U toku je priprema projektne dokumentacije.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.40. Sanacija puta Danilovgrad-Manastir Ostrog

- Nakon što je Opština Danilovgrad dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji puta Danilovgrad-Manastir Ostrog raspisano je 29.03.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 300.000,00€ bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula i postupak jednostavne nabavke 03-8/22 za vršenje stručnog nadzora 26.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.000,00€ bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala je ugovor sa izvođačem radova „Građevinarstvo i savjetovanje” doo iz Podgorice 29.07.2022. godine br.01-334/22-3192/2 u vrijednosti 354.933,32€ sa PDV-om.
- Ukupno je realizovano 228.162,73€ u 2022. godini.



13.41. Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 450.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022 godine, na iznos od 349.941,55 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 50.000,00€ bez PDV-a, koje je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.42. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje polje-Morakovo u iznosu od 884.289,69€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 738.028,57€.

13.43. Rekonstrukcija buleva „13. Jul” Nikšić

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa opštinom Nikšić o realizaciji programa lokalne infrastrukture Rekonstrukcija Bulevara „13.jul” u iznosu od 474.289,69€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

13.44. Rekonstrukcija lokalnog puta Javorovača –Njegovuđa, Žabljak

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.45. Glavna ulica u Gusinju

- Dužina saobraćajnice 230 m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sprovela je Opština Gusinje , nakon čega je dostavila revidovani glavni projekat koji je izradio “Arhing” d.o.o Bijelo Polje
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji glavne gradske saobraćajnice u Gusinju sprovela je Uprava za kapitalne projekte 08.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 850.000,00€ bez PDV-a, nakon čega je izabran najpovoljniji ponuđač “Indel-inženjering” na iznos od 894.190,00€
- Javno nadmetanje za izbor nadzornog organa je raspisano 17.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 18.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01 –334/22-5248/1 sa nadzorom “Projectman” d.o.o., je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos 13.189,00€.
- Radovi na ovom projektu će otpočeti u 2023. godini kada vremenski uslovi budu dozvolili.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.



13.46. Izgradnja bulevara u Ulcinju

- Obaveza opštine Ulcinj je da Upravi za kapitalne projekte dostavi revidovani glavni projekat, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- Ukupno je realizovano 1.008.010,00€ u 2022. godini za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

13.47. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.48. Lokalni put Rožaje (Kujevići, Hadžići, Fejzić)

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 16.02.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 110.000,00€ bez PDV-a.
- Ugovor br.01-334/22-2778/1 od 30.06.2022.godine zaključen je sa izvođačem radova „TOFI,, d.o.o. Rožaje.
- Vrijednost Ugovora 128.419,11 € sa PDV-om.
- Radovi na ovom projektus su otpočeli u julu 2022.godine i isti su završeni u oktobru 2022.godine. Dostavljen je konačni izvještaj nadzora.
- Ukupno je realizovano 128.412,47€ u 2022. godini.

13.49. Rekonstrukcija lokalnog puta Šljepašnica-Joša, putni pravac Kisjele vode

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.50. Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama

- Opština Berane je dostavila projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava za kapitalne projekte pripremila i raspisala javno nadmetanje 12.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 610.000,00€ bez PDV-a. Nakon vrednovanja nije bilo ispravne ponude i postupak je poništen odlukom od 29.11.2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 12.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 18.000,00€ bez PDV-a. U toku je tenderska procedura.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

13.51. Rekonstrukcija lokalnih puteva – Stevanovac, Jahoviće, Bjelojeviće, Juškovića Potok, Ravni, Štitarica, Slatina, Uroševina, Gostilovina, Iepenac, Žari – Mojkovac

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 –Rekonstrukcija lokalnih puteva Stevanovac, Jahoviće, Bjelojeviće, Juškovića potok, Ravni, Štitarica, Slatina, Uroševina, Gostilovina, Iepenac, Žari u iznosu od 213.200,00€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 196.403,26€.

13.52. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva – Brezojevice, Velika, Novšiće, Mašnica, Gornja Ržanica – Plav

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plav o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih puteva Brezojevice, Velika, Novšiće, Mašnica, Gornja Ržanica u iznosu od 328.000,00€.
- Na realizaciji ugovora je utrošeno 149.274,32€.

13.53. Rekonstrukcija lokalnih puteva – Bašča, Radevića Mala, Bijela crkva, Bogaje, Bukovica – Rožaje

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa opštinom Rožaje o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih puteva Bašča-Radeva mahala-Bijela crkva-Bogaje-Bukovica u iznosu od 328.000,00€.
- Na realizaciji ugovora u 2022. godini je utrošeno 327.210,91€.

13.54. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani

- Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 16.05.2022. godine za izbor izvođača radova sa procijenjenom vrijednošću od 700.000,00€ bez PDV-a i postupak jednostavne nabavke 03-9/22, 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.500,00€ bez PDV-a za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova „Bemax” doo iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa PDV-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa „Civil engineerom” doo iz Podgorice 15.08.2022. godine br.01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa PDV-om.
- Radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 847.342,33€ u 2022.godini.

13.55. Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova navedenog projekta, raspisano je 27.07.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 370.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-4788/1,

od 09.11.2022.godine, zaključen je sa izvođačem radova „ Gold Grading,, d.o.o. Berane. Vrijednost Ugovora 410.045,38 € sa PDV-om.

- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 10.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-4163/1 od 06.10.2022. godine, zaključen je sa „Ding” d.o.o. iz Podgorice.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u novembru 2022.
- Ukupno je realizovano 396.202,93€ u 2022. godini.

13.56. Izrada projektne dokumentacije za pristupni put i zaobilaznicu centralnom jezgru Virpazara

- Od strane opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.

13.57. Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar

- Od strane opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.

13.58. Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšić

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 08.04.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4330/1 sa izvođačem radova, "Akropolis" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.10.2022. godine, na iznos od 688.382,31 €, za izvođenje radova za izvođenje radova na uređenju prostora MZ Grudska mahala, Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora tokom izvođenja radova raspisano je 08.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-3782/2 sa vršiocem stručnog nadzora "Cema" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 15.09.2022. godine, na iznos od 2.285,31 €.
- Izvođač radova je uveden u posao krajem septembra 2022. godine. U toku su pripremni radovi, radovi na rušenju i demontažama kao i zemljani radovi.
- Ukupno je realizovano 202.722,16 € u 2022. godini.

13.59. Rekonstrukcija Krupačke ulice – Nikšić

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.60. Rekonstrukcija međuopštinskog puta Šavnik-Plužine –JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za izvođenje radova 10.10.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 815.000,00€. Ugovor je zaključen 19.12.2022. godine br.01-334/22-5716/1 sa izvođačem radova Mehanizacija i programat doo iz Nikšića. Vrijednost ugovora 985.214,67€ sa PDV-om.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za vršenje stručnog nadzora 11.10.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 35.000,00€. Tenderska procedura je u toku.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

**13.61. Rekonstrukcija seoskog, asfaltiranog, nekategorisanog puta
Komani-Bandići (preko Mokanja, Bijelih rudina i Malenze)**

- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula postupak javne nabavke 16.05.2022 za izbor izvođača radova za navedeni projekat sa procijenjenom vrijednošću od 460.000,00€ bez PDV-a i za vršenje stručnog nadzora 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 6.900,00€ bez PDV-a.
- Potpisan je ugovor sa izvođačem radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice 27.07.2022. godine br.01-334/22-3193/1 u vrijednosti 550.318,71€ sa PDV-om i ugovor za vršenje stručnog nadzora sa „Ding” d.o.o. iz Podgorice 28.07.2022. godine br.01-334/22-3177/5 u vrijednosti 2.298,99€.
- Radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 552.617,70€ u 2022. godini.

13.62. Izgradnja balon sale u Andrijevici

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.63. Izgradnja Vatrogasno –spasilačkog doma u Nikšiću

- U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa opštinom Nikšić o realizaciji programa lokalne infrastrukture-Izgradnja Vatrogasno-spasilačkog doma u Nikšiću u iznosu od 820.000,00€.
- Nije bilo realizacije na ovom projektu.

**13.64. Rekonstrukcija spomen kuće vojvode Gavra Vukovića,
Berane**

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

**13.65. Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima
Gračanica, rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće,
Trepča – Andrijevica**

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.66. Projektovanje i izgradnja puta Nikšićka Župa –Kapetanovo jezero

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.04.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 400.000,00€ bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 11.07.2022. godine potpisala ugovor br.01-334/22-2953/1 sa Mehanizacija i programat d.o.o. iz Nikšića za izvođenje radova na izgradnji puta Nikšićka Župa-Kapetanovo jezero u vrijednosti 482.883,17€. Stručni nadzor je obezbijedila opština Nikšić.
- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 476.127,68€ u 2022. godini

13.67. Sanacija puta Maočići Velimlje -Petrovići, dionica Maočići – Velimlje

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.04.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 830.000,00€ bez PDV-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 11.07.2022. godine potpisala ugovor br.01-334/22-2954/1 sa Mehanizacija i programat d.o.o. iz Nikšića za izvođenje radova na sanaciji puta Maočići-Velimlje –Petrovići u vrijednosti 997.074,85€. Stručni nadzor je obezbijedila opština Nikšić.
- Svi radovi su završeni.
- Ukupno je realizovano 997.017,87€ u 2022. godini.

13.68. Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09€. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Gusinje.
- U 2021. godini dostavljen je revidovani glavni projekat.
- U 2022. godini nije bilo utroška sredstava.

13.69. Rekonstrukcija puta lokalnog puta Veruša -petlja Veruša

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.70. Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

13.71. Sanacija putnog pravca Šipačno Nikšić

- U 2022. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

PROGRAM

XIV. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

POTPROGRAM

**14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA
RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I
UPRAVLJANJE**

14.1. Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

- Za potrebe smještaja administrativnih organa planirana je prenamjena već izgrađenog objekta na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića, koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Izgrađeni objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova, ukupne bruto površina cca 6.990 m².
- Završena je izrada projektnog zadatka, na osnovu kojeg će biti urađen Glavni projekat rekonstrukcije, u cilju prilagođavanja novoj namjeni, opremanja i uređenja lokacije za potrebe Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 28.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/22-1635/1 sa izvršiocom, „Arhitektonski atelje” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2022. godine, na iznos od 96.800,01€.
- Izrađen je predlog Idejnog rješenja.
- Na osnovu odluke Vlade Crne Gore broj 04-3671/2 od 23.06.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je potpisala Sporazum o raskidu ugovora sa preduzećem „Arhitektonski atelje” broj 01-334/22-3906/1, dana 26.09.2022. godine i predala kompletnu dokumentaciju Upravi za katastar i državnu imovinu.
- Ukupno je realizovano 6.050,00€ u 2022. godini



14.2. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i Cetinje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne

- Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

14.3. Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditaciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Stare Vlade Crne Gore u Podgorici, dok je za zgradu Predsjednika Crne Gore završena izrada idejnog rješenja i isto je dostavljeno Upravi za imovinu na saglasnost.
- Izrada Glavnog projekta i revizija za objekat Stare zgrade Vlade u Podgorici završena je početkom decembra 2020.godine. Vezano za dalju realizaciju po pitanju prilagođavanja objekata Stare zgrade Vlade u Podgorici, od strane predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja obavješteni smo da je došlo do poklapanja aktivnosti Uprave za kapitalne projekte i navedenog Ministarstva, te da je planirano da Delegacija EU, u dijelu realizacije IPA 2018., uvrsti u tendersku proceduru aktivnosti vezano za izbor izvođača radova za objekat "Stara zgrada Vlade" u Podgorici.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekata prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu je raspisano 25.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2229/1 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 8.107,00€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici,

Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.

- Završena je revizija glavnog projekta zgrade Uprave carina u Podgorici, kao i revizija glavnog projekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- U 2021. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova za radove na prilagođavanju zgrade državnih organa u Mojkovcu i Uprave carina u Podgorici i na isto nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2022.godini ponovljena su javna nadmetanja za izbor izvođača radova i nakon završenih tenderskih procedura zaključeni su ugovori krajem juna 2022.godine.
- Ugovor br. 01-334/22-2781/1 sa izvođačem radova "Tehno-gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 30.06.2022. godine, na iznos od 58.651,36 €, za izvođenje radova na prilagođavanje objekta zgrade državnih organa u Mojkovcu.
- Ugovor br. 01-334/22-2494/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2022. godine, na iznos od 3.630,00 €, u toku izvođenje radova na prilagođavanju objekta u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti za zgradu državnih organa u Mojkovcu.
- Ugovor br. 01-334/22-2780/1 sa izvođačem radova, "Tehno-gradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 30.06.2022. godine, na iznos od 58.487,36 €, za izvođenje radova za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekta Uprave carina u Podgorici .
- Ugovor br. 01-334/22-2494/2 sa vršiocem stručnog nadzora "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2022. godine, na iznos od 2.420,00 €, u toku izvođenje radova na prilagođavanju objekta u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti za objekat Uprave carina u Podgorici.
- Krajem 2022.godine završeni su svi ugovoreni radovi na prilogađavanju objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu kao i primopredaja istih korisniku.
- Ukupno je realizovano 116.352,14 € u 2022. godini.

Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnih projekata prilagođavnja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti objekata Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju raspisano je 10.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-944 sa obrađivačem, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020, na iznos od 4.827,90€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju završena je revizija projektne dokumentacije i ista je dostavljena Upravi za imovinu kako bi u skladu sa Zaključkom Vlade preduzeli dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.
