




CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Zakona o budžetu Crne Gore
za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

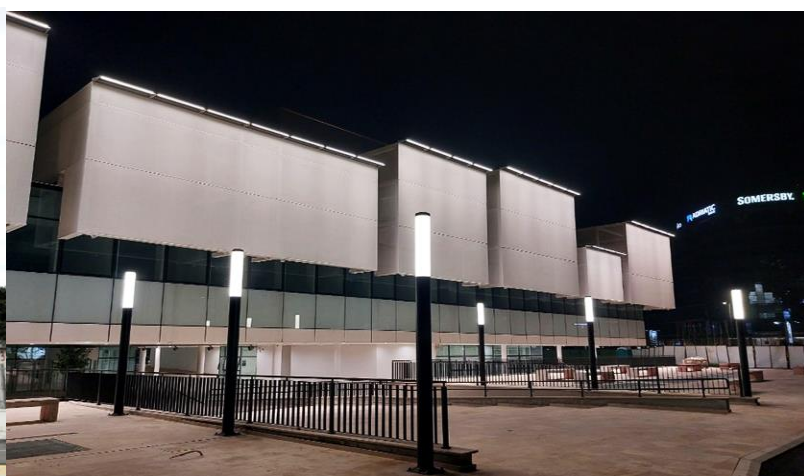

UVOD	11
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA.....	14
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA	17
I. POLJOPRIVREDA.....	35
1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST POLJOPRIVREDE.....	36
1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	37
II. TURISTIČKA DJELATNOST	38
2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin	40
2.2. Ski centar na lokalitetu „Cmiljača” u Bijelom Polju.....	41
2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	46
2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama	53
2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	57
2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	57
2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	69
2.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	71
2.9. Objekat „Kuća voća” u Andrijevići.....	71
2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule	72
2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra ”Kolašin 1450” i ”Kolašin 1600”	73
2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima ”Žarski” i ”Cmiljača”	74
2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica.....	75
2.14. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“, opština Žabljak... 75	
2.15. Eko-Katun Rujišta, Andrijevića	75
III. EKOLOGIJA I PRIRODA	76
3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	78
.....	78
3.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje80	
3.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada.....	82
3.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama.. 85	
Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, Herceg Novi	86
3.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	86
3.6. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera.....	86

3.7.	Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	87
3.8.	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	87
3.9.	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom ...	88
3.10.	Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	88
3.11.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze.....	88
3.12.	Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja..	89
	Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog cjevovoda visoke i niske zone Pliješ – grad sa povratnim cjevovodom	89
3.13.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja.	90
3.14.	Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić	90
3.15.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica	90
3.16.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići	91
3.17.	Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu.....	91
3.18.	Rekonstrukcija primarne vodovodne atmosferske kanalizacije u Kolašinu	92
3.19.	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m	92
3.20.	Vodovod “Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje	93
3.21.	Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	93
3.22.	Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici.....	94
3.23.	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću.....	94
3.24.	Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevica – sekcija II	94
3.25.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta “Merića Vrelo”, Berane	95
3.26.	Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	95
3.27.	Sanacija odlagališta Zakršnica.....	95
3.28.	Izgradnja transfer stanica u Andrijevici	96
3.29.	Izgradnja kanalizacione mreža na Vranjini, Podgorica	97
3.30.	Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje.	98
	Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-II faza.....	98
3.31.	Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak.	98
3.32.	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	99
3.33.	Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	99
3.34.	Unaprjeđenje vodovodnog Sistema “Višnjica” i “Velja Gora”, Prijestonica Cetinje..	99
3.35.	Izgradnja Sistema vodosnadbijevanja.....	99
3.36.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama	103
3.37.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija ...	104

3.38.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama.....	104
3.39.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija.....	105
3.40.	Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija.....	106
3.41.	Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori.....	106
3.42.	Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme.....	106
IV.	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	107
	POTPROGRAM	108
4.1.	Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	109
4.2.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	109
4.3.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU „Vaso Čuković” Risan.....	111
4.4.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	112
4.5.	Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica	112
4.6.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice “Danilo I” na Cetinju	113
4.7.	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	113
4.8.	Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić	113
4.9.	Nabavka magnetne resonance – “multislice scener”	113
4.10.	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju.....	114
4.11.	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	114
4.12.	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju.....	115
4.13.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama.....	115
4.14.	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	116
4.15.	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi–opšta Bolnica Berane	116
4.16.	Adaptacija Doma zdravlja Budva	117
4.17.	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama.	117
4.18.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju	118
4.19.	Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi.....	118
4.20.	Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju	118
4.21.	Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	118
4.22.	Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.....	119
4.23.	Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane	119
4.24.	Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore	119
4.25.	Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece .	120
4.26.	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova	120
4.27.	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog	

centra Crne Gore.....	123
4.28. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	124
4.29. Radovi na izgradnji operativnog centra	125
V. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA.....	127
5. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA	128
5.1. Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu	129
5.2. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija.....	130
5. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE	131
5.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa	132
5.4. Komplex UIKS u Danilovgradu.....	133
VI. JAVNA BEZBIJEDNOST	134
6.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	136
VII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE.....	141
7a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE	142
7.1. Izgradnja objekata za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima	143
7.2. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni „13.jul”	144
7.3. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici.....	144
7.4. Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni „Pero Četković” u Baru.....	144
7.5. Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni “Breza” u Kolašinu	145
7.6. Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni “Vladimir Knežević Volođa” u Pljevljima	146
7.7. Izgradnja nove zgrade u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu	146
7.8. Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni “Vladimir Knežević Volođa” u Pljevljima	146
VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA.....	147
8.1. Izgradnja Doma starih u Nikšiću	149
8.2. Projekat izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru....	150
8.3. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru..	151
8.4. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	151
8.5. Izgradnja Doma starih u Plavu	151
8.6. Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica	153
8.7. Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku.....	153
IX. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ.....	154

9.1.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	156
9.2.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada.....	156
9.3.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	156
9.4.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	156
9.5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	156
9.6.	Unapređenje turističke ponude grada	156
9.7.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica	156
9.8.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva.....	156
9.9.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa.....	156
9.10.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	157
9.11.	Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza.....	158
9.12.	Uređenje gradskih parkova “13. Jul” i “Njegošev park”	158
9.13.	Izgradnja “Lokande” sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	158
X.	UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA	159
10.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, ustupavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju.....	161
10.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.....	162
10.3.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta.....	163
10.4.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju	163
10.5.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju.....	163
XI.	ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE.....	166
11.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	169
11.3.	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić.....	169
11.4.	Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	171
11.5.	Rekonstrukcija druge faze Kaldre u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	171
11.6.	Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.....	171
11.7.	Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača.....	172
11.8.	Scensko opremanje sale JU “Centar za kulturu Danilovgrad”	172
11.9.	Rekonstrukcija Palace Drago u Kotoru	172
11.10.	Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	172
12.1.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo).....	175
12.2.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka.....	180
12.3.	Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica, Plav	181
12.4.	Putni pravac Monte Rose.....	181
12.5.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu – II faza.....	181

12.6. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar – Projekt menadžer Vladimir Vukčević	183
12.7. Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića	184
12.8. Izgradnja puta Srđevac – Lozna	184
12.9. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	185
12.10. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	185
12.11. Rekonstrukcija puta Gusinje – Vusanje	185
12.12. Izgradnja autobuske stanice Igalo - Bare	185
12.13. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlja, Bar	185
12.14. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	186
12.15. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	186
12.16. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od "Galeba" do Titove vile.....	187
12.17. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen.....	187
12.18. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen.	187
12.19. Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	187
12.20. Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	188
12.21. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	188
12.22. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	188
12.23. Rekonstrukcija bulevara „13. Jul” Nikšić	188
12.24. Glavna ulica u Gusinju.....	189
12.25. Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju.....	190
12.26. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani.....	191
Adaptacija lokalnih puteva u Komanima.....	191
12.27. Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću.....	191
12.28. Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici ...	192
12.29. Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela	192
12.30. Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	193
12.31. Rekonstrukcija puta Osoje – Pavino polje – Bijelo Polje.....	193
12.32. Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	193
12.33. Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću.....	193
12.34. Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	193
12.35. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva.....	194
12.36. Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	194
12.37. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice –	

granica BiH)	194
12.38. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	194
12.39. Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima.....	195
12.40. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu	195
12.41. Rekonstrukcija i adaptacija gradske tržnice u Plavu	195
12.42. Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	195
12.43. Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	196
12.44. Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	196
12.45. Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje.....	196
12.46. Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane.....	196
12.47. Rekonstrukcija pijace u Tuzima.....	197
12.48. Lokalni put u MZ Šekular, Berane.....	197
12.49. Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira „Sv.Trojica“ u Stanjevićima, Budva	197
12.50. Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	197
12.51. Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica.....	197
12.52. Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	198
12.53. Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti.....	198
12.54. Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi.....	198
12.55. Izgradnja trim staze oko Trebjese i Izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću	198
12.56. Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima.....	198
12.57. Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti.....	199
12.58. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima.....	199
12.59. Izgradnja sportske zone u Kolašinu	199
12.60. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti	199
XIII. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA.....	200
13.1. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	202
13.2. Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici.....	202
PROGRAM	204
XIV. RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE	204
14.1. Naučno-tehnološki park u Podgorici.....	206
14.2. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić.....	208
14.3. Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću ...	209
XV. SPORT	210

15.1.	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.....	212
15.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata.....	214
15.3.	Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	215
15.4.	Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva	215
15.5.	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru.....	215
15.6.	Izgradnja sportske hale u Plužinama – Projekt menadžeri Biljana Vukić i Aben Đokić	215
15.7.	Izgradnja olimpijskog bazena u Baru	216
15.8.	Olimpijska kuća u Podgorici.....	216
15.9.	Izgradnja balon sale u Zeti	216
	PROGRAM	217
XVI.	UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA	217
16.1.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem.....	219
16.1.	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	221
	Rekonstrukcija OŠ "Vlado Milić" u Podgorici.....	222
	Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JU OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama, Nikšić	222
	Izgradnja nove Osnovne škole u Igalu, Herceg Novi.....	222
	Izgradnja Gimnazije u Baru	222
	Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću.....	223
16.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	223
	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju	223
	Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ "Risto Ratković" u Bijelom Polju i JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane.....	223
16.3.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica	223
16.4.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica.....	224
16.5.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu	224
16.6.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici	224
16.7.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	224
16.8.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	225
16.9.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu.....	225
16.10.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Baru	225
16.11.	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Ulcinju.....	225
16.12.	Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju	226
16.13.	Izgradnja Osnovne i muzičke škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju.....	227

16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	228
16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	228
16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	229
16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	229
16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	229
16.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	229
16.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	230
16.21. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a „Univerzitetski centar”, Podgorica	230
16.22. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	230
16.23. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-	231
Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	231
16.24. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	231
16.25. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	233
16.26. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	233
16.27. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor" Masline	233
16.28. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	234
16.29. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" – Komani	234
16.30. Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić	235
16.31. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko” u Baru	235
16.32. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići” u Pečuricama, Opština Bar	235
16.33. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	236
16.34. Izgradnja sportske sale za JU OŠ „Bajo Jojić” u Andrijevići	236
16.35. Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	237
16.36. Izgradnja fiskulturne sale „Ivo Visin" Prčanj, Kotor	237
16.37. Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	238
16.38. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović" – područno odjeljenje u Donjim lugama, Opština Berane	238
16.39. Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	238
16.40. Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	238
16.41. Izgradnja paviljona u sastavu OŠ „Oktoih”, Podgorica	239
16.42. Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	239

UVOD

Zakonom o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu 128.512.127,68€, od čega je 128.486.532,61€ iz budžetskih sredstava, 4.496,28€ iz kredita, 7,12€ donacija i 21.091,67€ IPA sredstva.

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 131.313.928,65€, od čega 113.718.389,01€ iz budžetskih sredstava, 12.599.458,37€ iz IPA fondova i 4.996.081,77 iz kredita.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 264 projekta koja obuhvata i kumulativne pozicije kroz koje se realizuje veći broj podprojekata.

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala 181 postupak javnih nabavki čija vrijednost iznosi 93.929.345,89€. U istom periodu su zaključeno je 106 ugovora ukupne vrijednosti 84.295.035,8€, a koji uključuju i nabavke pokrenute u 2023. godini.

U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je imala **rekordnu finansijsku realizaciju** od osnivanja, što je naročito dobar rezultat imajući u vidu veliki broj projekata obuhvaćenih budžetom, kao i to da namnogim projektima nije bilo finansijske realizacije jer su isti kao nespremni kandidovani i uvršteni za realizaciju kroz Zakon o budžetu. Kroz Izvještaj o realizaciji za 2024. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su u toku.

Realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje Uprava za kapitalne projekte ne može uticati, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama, kao i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Prijedlog Uprave za kapitalne projekte bio je da se, u okviru obezbijedenih sredstava Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijedeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi izgradnje.

Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji) nisu dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Uprava za kapitalne projekte ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog kojih nerijetko dolazi i do obustave radova.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017) i u IPA III perspektivi (2021-2027) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2021.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćeni ovim programima je 25.

➤ U okviru CAP2016 programa u toku je realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine, gdje je korisnik Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a implementiraju se sljedeći projekti: Podrška implementaciji i praćenju upravljanja vodama, Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija i Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2016 programa iznosi 9.628.384,96 €, a do sada je realizovano 7.203.280,09 €.

➤ U okviru CAP2017 programa obuhvaćeni se sljedeći projekti: Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju, Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja, Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta, Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju, Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora i Nabavka opreme za unaprjeđenje bezbjednosti pomorske plovidbe u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2017 programa iznosi 11.224.867,55€, a do sada je realizovano 9.396.112,31€.

➤ U okviru CAP2018 programa obuhvaćeni su sljedeći projekti: Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore, Izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji mikrobioloških laboratorija, Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških laboratorija, Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije, Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica), Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2018 programa iznosi 33.484.836,53€, a do sada je realizovano 24.734.478,46€.

➤ U okviru SOPEES programa implementira se projekat adaptacije školskih objekata za pristup osoba sa invaliditetom. Ugovorena vrijednost je 797.281,12€, a do sada je realizovano 605.158,43€.

➤ U okviru IPA III, PROGRAM IPA2021 obuhvaćena je realizacija sljedećih projekata: Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme u cilju implementacije okvirne marinske direktive, Izgradnja 3 granična kontrolna mjesta na graničnim prelazima Božaj (Albanija), Kula (Kosovo) i Aerodrom Podgorica, Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori, Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija (Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju zahtjeva iz Poglavlja 27 pravne tekovine EU i povezano jačanje kapaciteta, Podrška uspostavljanju EIONET-a za sistem praćenja izvještavanja i Podrška u sprovođenju INSPIRE direktive).

Pitanje nedostataka inženjerskog kadra u Upravi za kapitalne projekte je uvijek aktuelno imajući u vidu da tržište rada ne ostavlja prostora da se u postojećim uslovima animiraju iskusni inženjeri za radne pozicije u Upravi.

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA
--

TABELA PLAĆANJA - KAPITALNI BUDŽET ZA 2024. GODINU 31.12.2024. godine			
41506	Naziv projekta	OBEZBJEĐENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2024. GODINU NAKON PREUSMJERAVANJA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2024.GODINU
		UKUPNO	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	17.808,90	7.430,36
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	43.019.789,54	38.025.436,23
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	18.525.772,99	17.971.702,51
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	1.754.338,85	1.724.386,86
19 032 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	8.306.363,89	12.168.977,23
19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	5.537.440,00	5.189.447,60
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	4.199.611,50	3.830.458,62
19 032 K05	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	270.000,00	0,00
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	1.436.048,22	1.355.590,74
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	5.481.239,79	4.759.213,33
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	1.532.305,30	7.825.600,96
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	2.160.624,34	1.925.249,68
16 002 K01	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	20.443,18	11,13
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	8.855.600,00	8.761.309,87
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosuđa	1.736.627,24	1.712.298,84
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	3.189.956,77	4.592.597,63
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	156.900,00	134.197,24

13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	9.556.238,82	8.950.611,68
17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	791.727,17	2.211.853,69
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	11.963.273,36	10.167.554,63
	SVE UKUPNO	128.512.127,68	131.313.928,83

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA
--

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2024. GODINU 31.12.2024. godine

40903	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2024. GODINU			PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2024.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO	Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	13.358,90	4.450,00	17.808,90	7.430,36	0,00	7.430,36
1.1.	Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti	4.450,89	4.450,00	8.900,89	0,00	0,00	0,00
1.2.	Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije	8.908,01	0,00	8.908,01	7.430,36	0,00	7.430,36
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	1.302.733,27	41.717.056,27	43.019.789,54	936.659,77	37.088.776,46	38.025.436,23
2.1.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	711.001,00	19.692.214,17	20.403.215,17	603.578,53	17.266.011,18	17.869.589,71
2.1.1.	Lokalni putevi km	711.001,00	19.692.214,17	20.403.215,17	603.578,53	17.266.011,18	17.869.589,71
2.3.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	4.450,00	1.184.450,00	1.188.900,00	2.831,40	1.172.514,62	1.175.346,02
2.4.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	4.450,00	0,00	4.450,00	3.448,50	0,00	3.448,50
2.5.	Putni pravac Monte Rose Tivat	2.127,31	99.900,42	102.027,73	2.126,42	99.900,42	102.026,84
2.6.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
2.9.	Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru opština Bar	8.900,00	899.100,00	908.000,00	0,00	556.098,30	556.098,30
2.10.	Izgradnja puta Danilovgrad Spuž preko Martinića	44.500,89	3.115.500,00	3.160.000,89	0,00	3.115.500,00	3.115.500,00
2.11.	Izgradnja puta Srđevac Lozna	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
2.12.	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina Podgorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.13.	Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	4.450,00	1.235.550,00	1.240.000,00	0,00	1.086.683,15	1.086.683,15
2.14.	Rekonstrukcija puta Gusinje Vusanje	0,89	209.150,00	209.150,89	0,00	195.539,37	195.539,37
2.15.	Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	4.450,00	2.630.550,00	2.635.000,00	0,00	2.257.279,39	2.257.279,39
2.16.	Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka Žabljak	23.837,00	265.879,76	289.716,76	23.837,00	265.879,76	289.716,76
2.18.	Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	4.450,89	356.000,00	360.450,89	0,00	151.213,61	151.213,61
2.19.	Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	4.450,00	1.740.550,00	1.745.000,00	0,00	1.740.549,32	1.740.549,32
2.20.	Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen	0,00	84.550,00	84.550,00	0,00	84.458,00	84.458,00
2.21.	Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen	0,00	262.605,08	262.605,08	0,00	262.605,08	262.605,08
2.22.	Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	8.900,89	436.100,00	445.000,89	7.260,00	134.169,58	141.429,58
2.30.	Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	139.200,89	0,00	139.200,89	139.176,62	0,00	139.176,62
2.31.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža- Miolje Polje-Morakovo- Nikšić	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
2.32.	Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	4.450,00	868.550,00	873.000,00	0,00	480.730,02	480.730,02
2.33.	Glavna ulica u Gusinju	8.900,00	356.000,00	364.900,00	8.900,00	356.000,00	364.900,00
2.34.	Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.35.	Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.36.	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani	17.800,00	1.444.900,00	1.462.700,00	4.598,00	1.415.481,87	1.420.079,87
2.37.	Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	44.500,00	655.000,00	699.500,00	0,00	655.000,00	655.000,00
2.38.	Uređenje trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.39.	Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	9.559,00	251.229,36	260.788,36	9.559,00	251.229,36	260.788,36
2.40.	Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu	43.610,89	890,00	44.500,89	0,00	0,00	0,00
2.41.	Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino polje - Bijelo Polje	2.330,14	89.000,00	91.330,14	2.329,25	89.000,00	91.329,25
2.42.	Rekonstrukcija ul. Branka Ćopića / Janka Vukotića u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.43.	Rekonstrukcije školske ulice u Nikšiću	4.450,00	718.550,00	723.000,00	0,00	621.944,24	621.944,24
2.44.	Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću	4.450,00	222.500,00	226.950,00	0,00	207.236,07	207.236,07
2.45.	Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva	4.450,00	1.445.000,00	1.449.450,00	0,00	1.437.674,81	1.437.674,81
2.46.	Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog	8.900,00	133.500,00	142.400,00	471,90	124.752,44	125.224,34
2.47.	Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	8.900,00	80.100,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
2.48.	Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	13.177,16	695.000,00	708.177,16	8.733,65	677.964,47	686.698,12
2.49.	Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
2.50.	Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	9.000,00	950.800,00	959.800,00	6.606,60	926.111,87	932.718,47
2.51.	Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	27.800,00	539.000,00	566.800,00	1.694,00	531.011,74	532.705,74
2.52.	Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.53.	Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	4.450,00	4.450,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
2.54.	Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosude, Gusinje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.55.	Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.56.	Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.57.	Rekonstrukcija pijace u Tuzima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.58.	Lokalni put u MZ Šekular, Berane	9.680,00	93.087,48	102.767,48	9.667,90	93.087,48	102.755,38
2.59.	Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv. Trojica" u Stanjevićima, Budva	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00
2.60.	Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.61.	Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	9.498,00	135.000,00	144.498,00	9.498,00	131.368,27	140.866,27
2.62.	Sanacija lokalnog puta Orahovo - Gornji Zatrijebač, Podgorica	3.993,00	102.000,00	105.993,00	3.993,00	101.782,04	105.775,04
2.63.	Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.64.	Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	83.900,00
2.65.	Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportstko-rekreativnog parka u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.66.	Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Tuzi u Golubovcima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.67.	Rekonstrukcija puta Tuzi - Hoti	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
2.68.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.69.	Izgradnja sportske zone u Kolašinu	4.862,65	600.000,00	604.862,65	0,00	600.000,00	600.000,00
2.70.	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	1.516.394,00	7.339.206,00	8.855.600,00	1.465.832,28	7.295.477,59	8.761.309,87

3.1.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	102.000,00	0,00	102.000,00	101.949,00	0,00	101.949,00
3.2.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	10.000,00	692.000,00	702.000,00	9.075,00	691.221,45	700.296,45
3.4.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0,00	1.358.206,00	1.358.206,00	0,00	1.354.728,70	1.354.728,70
3.5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	210.960,76	210.960,76
3.6.	Unapređenje turističke ponude grada	500.000,00	0,00	500.000,00	498.470,00	0,00	498.470,00
3.7.	Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	411.394,00	2.150.000,00	2.561.394,00	404.981,16	2.110.834,74	2.515.815,90
3.8.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	70.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00	69.516,10	1.580.000,00	1.649.516,10
3.9.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	70.000,00	689.000,00	759.000,00	69.183,97	688.869,08	758.053,05
3.10.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	35.000,00	559.000,00	594.000,00	0,00	559.000,00	559.000,00
3.11.	Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.370,65	99.862,86	106.233,51
3.12.	Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	90.000,00	0,00	90.000,00	89.128,60	0,00	89.128,60
3.13.	Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	18.000,00	0,00	18.000,00	17.157,80	0,00	17.157,80
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosuđa	235.559,24	1.501.068,00	1.736.627,24	184.575,27	1.527.723,57	1.712.298,84
4.1.	Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	26.837,24	890,00	27.727,24	25.947,24	0,00	25.947,24
4.2.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	208.722,00	1.500.178,00	1.708.900,00	158.628,03	1.527.723,57	1.686.351,60
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	6.426,12	3.183.530,65	3.189.956,77	5.911,62	4.586.686,01	4.592.597,63

4.3.	Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	6.426,12	3.183.530,65	3.189.956,77	5.911,62	4.586.686,01	4.592.597,63
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	8.050,00	148.850,00	156.900,00	0,00	134.197,24	134.197,24
5.1.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	3.600,00	148.850,00	152.450,00	0,00	134.197,24	134.197,24
13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	213.395,00	9.342.843,82	9.556.238,82	140.962,10	8.809.649,58	8.950.611,68
6.1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Izgradnja objekta za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	67.000,00	1.661.299,69	1.728.299,69	24.951,76	1.661.299,69	1.686.251,45
6.3.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	55.500,00	1.169.000,00	1.224.500,00	25.270,34	1.130.513,11	1.155.783,45
6.4.	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	79.400,00	5.587.000,00	5.666.400,00	79.245,00	5.429.596,97	5.508.841,97
6.6.	Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	0,00	78.239,81	78.239,81	0,00	78.239,81	78.239,81
6.7.	Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima	11.495,00	510.000,00	521.495,00	11.495,00	510.000,00	521.495,00
6.8.	Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima	0,00	337.304,32	337.304,32	0,00	0,00	0,00

17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	398.346,52	393.380,65	791.727,17	1.579.066,40	632.787,29	2.211.853,69
7.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	455,00	179.250,00	179.705,00	455,00	218.776,17	219.231,17
7.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	106.500,00	0,00	106.500,00	645.793,83	0,00	645.793,83
7.4.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	275.850,47	0,00	275.850,47	932.817,57	0,00	932.817,57
7.5.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	15.540,05	213.130,65	228.670,70	0,00	414.011,12	414.011,12
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	609.590,67	11.353.682,69	11.963.273,36	186.588,38	9.980.966,25	10.167.554,63
8.1.	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade MORT-a u Podgorici	50.501,78	4.023.103,48	4.073.605,26	40.064,53	3.782.656,17	3.822.720,70
8.2.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica,reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	29.500,00	0,00	29.500,00	25.291,27	0,00	25.291,27
8.3.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	3.104,40	0,00	3.104,40	3.104,37	0,00	3.104,37
8.4.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	39.000,89	289.001,00	328.001,89	0,00	48.326,42	48.326,42
8.5.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Izgradnja vodovodne mreže na hercegrovskom poluostrvu Luštica	44.500,00	712.000,00	756.500,00	3.557,40	557.794,76	561.352,16

8.7.	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	43.500,00	247.000,00	290.500,00	10.467,11	246.394,72	256.861,83
8.9.	Izgradnja centra za prihvrat životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11.	Vodosnabdijevanje Pljevalja	178.000,00	2.113.868,78	2.291.868,78	46.131,29	2.113.868,78	2.160.000,07
8.12.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	33.154,00	0,00	33.154,00	0,00	0,00	0,00
8.13.	Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	400,00	0,89	400,89	400,00	0,00	400,00
8.14.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	0,00	34.899,98	34.899,98	0,00	34.899,98	34.899,98
8.15.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	1.300,00	100,00	1.400,00	968,00	0,00	968,00
8.16.	Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
8.17.	Rekonstrukcija primarne, vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
8.18.	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	7.000,00	188.900,00	195.900,00	6.041,29	181.510,27	187.551,56
8.19.	Vodovod Seošnica - razdjelne komore za MZ Seošnica, opština Rožaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.20.	Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	4.779,50	130.805,80	135.585,30	4.779,50	130.805,80	135.585,30
8.21.	Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.22.	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.23.	Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo	10.890,00	65.110,00	76.000,00	4.683,91	64.220,00	68.903,91
8.24.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta Merića vrelo, Berane	0,00	94.398,61	94.398,61	0,00	0,00	0,00
8.25.	Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
8.26.	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
8.27.	Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	37.548,30	1.696.868,44	1.734.416,74	22.548,30	1.503.998,63	1.526.546,93
8.28.	Izgradnja transfer stanice u Andrijevići	7.961,80	641.000,00	648.961,80	7.961,80	640.120,78	648.082,58
8.29.	Izgradnja kanalizacione mreže na Vranjini, Podgorica	4.450,00	184.194,53	188.644,53	3.327,50	180.000,09	183.327,59
8.30.	Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	50.000,00	316.228,30	366.228,30	1.911,80	116.228,30	118.140,10
8.31.	Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.32.	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.33.	Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.34.	Unaprijeđenje vodovodnog sistema "Višnjica" i "Velja Gora", Prijestonica Cetinje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.35.	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja	54.450,00	486.201,99	540.651,99	5.350,31	380.141,55	385.491,86
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	892.163,44	17.633.609,55	18.525.772,99	749.557,43	17.222.145,08	17.971.702,51
9.1.	Ski centar na lokalitetu Kolašin, Kolašin	339.000,89	3.598.000,00	3.937.000,89	310.733,21	3.567.998,56	3.878.731,77
9.2.	Ski centar na lokalitetu "Čmiljača", Bijelo Polje	65.000,89	0,00	65.000,89	57.980,56	0,00	57.980,56
9.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	62.486,72	207.500,00	269.986,72	61.815,77	185.000,00	246.815,77
9.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	97.000,89	6.065.000,00	6.162.000,89	94.857,60	5.949.844,40	6.044.702,00

9.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	15.972,89	338.800,00	354.772,89	15.972,00	338.800,00	354.772,00
9.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	51.257,00	1.613.000,00	1.664.257,00	26.257,00	1.478.592,73	1.504.849,73
9.7.	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	18.242,38	1.005.554,51	1.023.796,89	9.936,05	943.944,02	953.880,07
9.8.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00	441.496,32	441.496,32
9.9.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevići	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	15.000,00	340.255,04	355.255,04	5.877,55	340.255,04	346.132,59
9.11.	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osniježavanjem	167.000,89	3.991.000,00	4.158.000,89	166.127,69	3.976.214,01	4.142.341,70
9.12.	Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
9.13.	Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
9.14.	Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15.	Eko-katun Rujišta, Andrijevića	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	853.338,85	901.000,00	1.754.338,85	1.724.386,86	0,00	1.724.386,86
10.1.	PPOV kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	403.596,46	0,00	403.596,46	556.174,48	0,00	556.174,48
10.3.	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	93.392,39	0,00	93.392,39	651.158,31	0,00	651.158,31
10.4.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

10.5.	Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija	211.800,00	0,00	211.800,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	80.000,00	0,00	80.000,00	517.071,89	0,00	517.071,89
10.7.	Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	1.800,00	901.000,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00
19 032 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	514.788,27	7.791.575,62	8.306.363,89	295.497,17	11.873.480,06	12.168.977,23
11.1.	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	14.450,89	384.450,89	398.901,78	13.815,55	259.939,09	273.754,64
11.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	14.450,89	0,89	14.451,78	9.488,19	0,00	9.488,19
11.3.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	4.731,23	6,23	4.737,46	27.225,00	0,00	27.225,00
11.3.1.	Vrtić u City kvartu	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.3.3.	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.3.4.	Vrtić na Zlatici u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.3.5.	Vrtić u Beranama	4.725,89	0,89	4.726,78	27.225,00	0,00	27.225,00
11.3.6.	Vrtić u Bijelom Polju	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.3.7.	Vrtić u Plavu	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.4.	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB I	46.499,57	111.002,67	157.502,24	86.590,00	638.829,87	725.419,87
11.4.1.	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	0,89	0,89	1,78	41.750,00	0,00	41.750,00
11.4.2.	Vrtić u Baru	46.497,79	111.000,89	157.498,68	44.840,00	638.829,87	683.669,87
11.4.3.	Vrtić u Ulcinju	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.5.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	10.474,26	8.340,21	18.814,47	10.473,37	8.339,32	18.812,69
11.6.	Izgradnja Osnovne i Muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00

11.7.	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	6,23	6,23	12,46	0,00	0,00	0,00
11.7.1.	Druha Gimnazija u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.2.	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.3.	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.4.	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.5.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.6.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.7.7.	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	0,89	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00
11.8.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a Univerzitetski centar u Podgorici	1.661,98	65.704,60	67.366,58	1.661,09	65.703,71	67.364,80
11.9.	Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	26.742,40	950.500,00	977.242,40	14.520,00	950.500,00	965.020,00
11.10.	Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	64.500,00	0,00	64.500,00	26.620,00	0,00	26.620,00
11.11.	Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	15.000,00	2.444.926,54	2.459.926,54	0,00	2.166.903,77	2.166.903,77
11.12.	Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.	Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.	Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	133.500,00	756.500,00	890.000,00	0,00	2.365.064,10	2.365.064,10
11.15.	Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	37.740,73	1.685.500,00	1.723.240,73	34.557,17	1.685.500,00	1.720.057,17
11.16.	Renoviranje OŠ "Boško Radulović" - Komani	1.839,20	6.100,00	7.939,20	1.839,20	6.060,40	7.899,60
11.17.	Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u opštini Nikšić	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.18.	Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar	0,00	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00
11.19.	Izgradnja fiskulturne sale za OŠ "Mrkojevići" u Pečuricama, opština Bar	20.900,00	795.326,47	816.226,47	12.874,40	646.925,21	659.799,61
11.20.	Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.21.	Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevi	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
11.22.	Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	25.250,00	0,00	25.250,00	25.168,00	0,00	25.168,00
11.23.	Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	45.450,00	0,00	45.450,00	18.550,00	0,00	18.550,00
11.24.	Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	5.340,00	312.460,00	317.800,00	157,00	3.008.540,50	3.008.697,50
11.25.	Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović", područno odjeljenje u donjim lugama, Berane	7.800,00	210.200,00	218.000,00	1.914,22	71.174,09	73.088,31
11.26.	Izgradnja osnovne škole u Lastvi, Tivat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.	Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.28.	Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica	19.450,00	0,00	19.450,00	10.043,98	0,00	10.043,98
11.29.	Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	77.300,00	5.460.140,00	5.537.440,00	65.104,90	5.124.342,70	5.189.447,60
12.1.	Naučno tehnološki park u Podgorici	68.400,00	4.777.600,00	4.846.000,00	65.104,90	4.500.788,61	4.565.893,51
12.2.	Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	8.900,00	678.090,00	686.990,00	0,00	623.554,09	623.554,09
12.3.	Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	259.161,50	3.940.450,00	4.199.611,50	18.210,50	3.812.248,12	3.830.458,62
13.1.	Rekonstrukcija zapadna tribina FK Sutjeska u Nikšiću	3.811,50	2.445.500,00	2.449.311,50	3.811,50	2.326.860,50	2.330.672,00
13.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3.	Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	236.450,00	4.450,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko - rekreativnog kompleksa u Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Izgradnja sportske hale u Plužinama	18.900,00	1.490.500,00	1.509.400,00	14.399,00	1.485.387,62	1.499.786,62
13.7.	Izgradnja olimpijskog bazena u Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8.	Olimpijska kuća u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.9.	Izgradnja balon sale u Zeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 032 K03	Priprojekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	15.000,00	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Inkluzija marginalnih grupa u obrazovni sistem	15.000,00	255.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	93.874,20	1.342.174,02	1.436.048,22	49.137,20	1.306.453,54	1.355.590,74
15.1.	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	31.900,00	465.100,00	497.000,00	3.980,50	464.666,11	468.646,61
15.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	34.450,00	0,00	34.450,00	19.057,50	0,00	19.057,50
15.3.	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić	9.724,20	877.074,02	886.798,22	9.099,20	841.787,43	850.886,63
15.4.	Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5.	Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6.	Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	17.800,00	0,00	17.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.7.	Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8.	Scensko opremanje sale JU "Centar za kulturu Danilovgrad"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.9.	Rekonstrukcija palate Drago u Kotoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.	Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	352.966,62	5.128.273,17	5.481.239,79	270.340,27	4.488.873,06	4.759.213,33
16.1.	Rekonstrukcija energetskog bloka trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	25.055,36	2.460.400,00	2.485.455,36	24.277,44	2.426.266,05	2.450.543,49
16.3.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan	12.113,68	744.279,40	756.393,08	0,00	230.392,57	230.392,57
16.4.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5.	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	93.610,00	0,00	93.610,00	88.865,18	0,00	88.865,18
16.6.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7.	Izgradnja urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta kliničkog centra Crne Gore u PG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8.	Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9.	Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	0,00	422.290,00	422.290,00	0,00	422.290,00	422.290,00
16.10.	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	63.111,78	893,56	64.005,34	48.400,00	0,00	48.400,00
16.11.	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	6.910,00	40.000,00	46.910,00	0,00	36.559,82	36.559,82
16.12.	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	310,00	8.090,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16.13.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	4.000,00	241.653,11	245.653,11	0,00	240.763,11	240.763,11
16.14.	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	54.450,00	46.794,93	101.244,93	46.794,93	0,00	46.794,93
16.15.	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi – opšta Bolnica Berane	3.355,80	65.309,34	68.665,14	3.355,80	65.309,34	68.665,14
16.16.	Adaptacija Doma zdravlja Budva	400,00	200,00	600,00	400,00	0,00	400,00
16.17.	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	9.140,00	444.960,33	454.100,33	9.138,66	415.296,73	424.435,39

16.18.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje dječje bolnice na Cetinju	53.010,00	890,00	53.900,00	30.571,89	0,00	30.571,89
16.19.	Izgradnja nove opšte bolnice Meljine, Herceg Novi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.	Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.21.	Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	0,00	652.312,50	652.312,50	0,00	651.995,44	651.995,44
16.23.	Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
16.22.	Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	800,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.23.	Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.24.	Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.25.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	18.900,00	0,00	18.900,00	18.536,37	0,00	18.536,37
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	144.137,48	1.388.167,82	1.532.305,30	150.834,10	7.674.766,86	7.825.600,96
17.1.	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KC CG	114.800,00	1.313.167,82	1.427.967,82	116.009,12	6.632.874,68	6.748.883,80
17.2.	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	16.699,98	74.000,00	90.699,98	17.499,98	386.193,33	403.693,31
17.3.	Radovi na izgradnji operativnog centra	12.637,50	1.000,00	13.637,50	17.325,00	655.698,85	673.023,85
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	44.700,00	2.115.924,34	2.160.624,34	19.206,39	1.906.043,29	1.925.249,68
18.2.	Izgradnja doma Starih u Nikšiću	0,00	3.886,67	3.886,67	0,00	0,00	0,00
18.3.	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	23.900,00	805.100,00	829.000,00	9.541,55	599.069,62	608.611,17
18.4.	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.5.	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	11.900,00	281.837,67	293.737,67	3.993,00	281.873,67	285.866,67
18.5.	Izgradnja Doma starih u Plavu	8.900,00	1.025.100,00	1.034.000,00	5.671,84	1.025.100,00	1.030.771,84
18.6.	Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.7.	Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 002 K01	Prijekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	12.675,00	7.750,00	20.425,00	11,13	0,00	11,13
19.1.	Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta, izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	12.711,00	7.750,00	20.461,00	11,13	0,00	11,13
	SVE UKUPNO	7.563.959,08	120.948.132,60	128.512.127,68	7.849.329,95	123.464.616,70	131.313.928,83

PROGRAM

I. POLJOPRIVREDA

POTPROGRAM

1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST POLJOPRIVREDE

1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja

- Projekat se realizuje u sklopu IPA III, AAP 2021 programa.
- Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije, izgradnja i opremanje tri granična kontrolna mjesta i jedne karantinske jedinice za zdravlje bilja, ali i nadzor nad pomenutim objektima.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAIII/CAP21/SER/01-908/24-5984/1 sa projektantom, koji će biti zadužen i za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad radovima je potpisan 07.11.2024. sa kompanijom „Urbi pro“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 150.000,00€.
- Implementacije ugovora je u toku. Idejno rješenje je kompletirano, u toku je izrada glavnog projekta.
- Kada se završi izrada projektne i tenderske dokumentacije, kao i revizija pristupiće se raspisivanju tendera za odabir izvođača radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

II. TURISTIČKA DJELATNOST

POTPROGRAM

2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Aktivnostima na realizaciji projekata "Unapređenja turističke ponude" koordinira nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje utvrđuje potrebe i prioritete i dostavlja dokumentaciju na osnovu koje Uprava za kapitalne projekte pokreće aktivnosti iz svoje nadležnosti kao naručilac posla.

2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Završeni su radovi prve faze koja je obuhvatila: putnu infrastrukturu od Ski rezorta „Kolašin 1450” do Ski rezorta „Kolašin 1600” sa izgradnjom potpornih zidova, sanaciju klizišta i izgradnja parkinga za dnevne skijaše, izgradnju bazne stanice sa sistemom vodosnadbijevanja, izgradnju žičare K8 sa pripadajućim cca 10km staza, trafostanica 35/10kW i dvije trafostanice 10/0,4kW, kao i nabavku dvije mašine za pripremu ski staza.
- Sve aktivnosti planirane za realizaciju prve faze su završene i ski centar je stavljen u funkciju krajem 2019. godine.
- Kroz drugu fazu je završena: izgradnja žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza. U toku je izgradnja garaže na lokalitetu „Kolašin 1450” i ugovorena je izgradnja hidrotehničke infrastrukture za vodosnadbijevanje i osvježavanje. U toku su javna nadmetanja za izgradnju dva ski lifta tipa „sidro” i „tanjir”.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „sidro”

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju novog fiksnog Ski lifta tipa „sidro” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4725/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine, na iznos od 2.079.855,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-5313/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni, dobijena je upotrebna dozvola, u toku su aktivnosti na primopredaji sa Investitorom – Ministarstvom turizma.
- U 2024. godini realizovano je 2.060.993,00€.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „tanjir”

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za Izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i Izgradnja novog fiksnog Ski lifta tipa „tanjir” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj i izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4726/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 1.506.315,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-5312/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni, dobijena je upotrebna dozvola, u toku su aktivnosti na primopredaji sa Investitorom – Ministarstvom turizma.
- U 2024. godini realizovano je 1.493.019,00€.

Ski staze uz žičaru K7

- Projekat se realizuju po principu “projektuj i izgradi”. Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstva.
- **Rekonstrukcija skijaške staze broj 17 u ski centru Kolašin 1600**
- Projekat se odnosi na izvođenje radova u cilju zaštite od oštećenja, kao i bezbjednog korišćenja ski staze broj 17.
- Uprava za kapitalne projekte je u tokom 2024. godine raspisala dva javna nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 243.000,00€ bez pdv-a na kojima nije bilo pristiglih ponuda. Obaveza Ministarstvo turizma je da razmotri i ponovo dostavi dokumentaciju za raspisivanje poziva za javno nadmetanje.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je

2.2. Ski centar na lokalitetu „Cmiljača” u Bijelom Polju

- Realizacija ovog projekta se odvija fazno.
- **Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača**
- U toku je usaglašavanje faza realizacije putnog pravca Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača, koje sprovodi Opština Bijelo Polje u saradnji sa nadležnim ministarstvom.
- Krajem 2024. godine Opština Bijelo Polje je dostavila projektni zadatak za izgradnju dionice Jasikovac – Cmiljača po principu “projektuj i izgradi” nakon čega je Uprava za kapitalne projekte raspisala poziv za izbor projektanta/izvođača radova, kao i za izbor revidenta i stručni nadzor. Nastavak aktivnosti na izgradnji puta, tj. realizaciji dionice Ravna Rijeka – Jasikovac, zbog tehnoloških razloga, biće nastavljen nakon ugovaranja i izgradnje dionice Jasikovac – Cmiljača.
- Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača br. 01-334/25-757/1 sa “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.02.. godine na iznos od 24.042,7€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je



Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača



- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta. Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena.
- Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare i radovi su obustavljeni do daljnjeg. Dokumentacija je proslijeđena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje na dalje postupanje, nakon čega je predmet proslijeđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Komunalnoj policiji Opštine Bijelo Polje.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-7697/2 od 08.12.2023. godine donijela Rješenje kojim se Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje proglašava nadležnim za vršenje inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole građenja. Uprava za kapitalne projekte je uputila urgenciju Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje u cilju rješavanja navedene problematike.
- U 2024. godini radovi se nisu izvodili.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je preuzelo obavezu da u saradnji sa “Skijalištima” iznađe najbolje tehničko rješenje kako bi se obezbijedila funkcionalnost ski centra i prevazišlo pitanje visinskih razlika usljed neusaglašenosti planskih dokumenata i tehničkih zahtjeva izgradnje žičare.
- Prijedlog rješenja: Kada Uprava za kapitalne projekte dobije potrebnu dokumentaciju, pokrenuće aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Primarna elektroenergetska infrastruktura

- **Izgradnja trafostanice „Cmiljača” 35/10 kV**
- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojkovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, “Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 2728/1 sa stručnim nadzorom, “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
- U 2021. godini završeni su svi radova na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad, jer nije izgrađen 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” na koji treba da se priključi trafostanica.
- Problematika: Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje stalno napajanje. Objekat nije fizički obezbijeđen. Oprema je izložena ekstremnim temperaturama, tako da može doći do oštećenja usled nepovoljnih uslova u kojima se nalazi. Garancija za garantni rok po ugovoru istekla u decembru 2023. godine (2 godine od primopredaje objekta).

- Prijedlog rješenja: Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za funkcionalno ispitivanje predmetne trafostanice.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Cmiljača" do TS 10/0,4 kV bazna stanica "Cmiljača"

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača**
- Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra "Cmiljača"
- sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
- U cilju uvođenja izvođača u posao Opština Bijelo Polje je izvršila prijavu radova.
- Od strane inspeksijskih organa dobijen je negativan odgovor na prijavu radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega je i prolongiran početak izvođenja radova, a potom i raskinut ugovor sa izvođačem „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica.
- Obaveza Opštine Bijelo Polje je da provjeri da li se listovi nepokretnosti poklapaju sa trasom vodovoda, kako bi se stvorili uslovi za ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova.

- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula procedure izrade i revizije projekta u cilju upodobljavanja projektne dokumentacije sa važećom zakonskom regulativom. Projekat je tehnički revidovan i u toku je obezbijedenje saglasnosti od nadležnih insitucija.
- Problematika: Nema je
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka žičare šestosjed Z7

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare "Z7" i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi. Radovi su se izvodili do kraja 2021. godine, nakon čega je gradilište konzervirano.
- Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza, a preostali su radovi na funkcionalnom ispitivanju gdje je neophodno obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- Problematika: U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, a za šta je neophodno prethodno izgraditi elektro - energetska infrastrukturu za koju je potrebno da Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS „Cmiljača” 35/10kV.
- Prijedlog rješenja: Potrebno je da se u saradnji sa izvođačem radova, stručnim nadzorom, projektantom, revidentom i Cedis-om utvrdi obim posla za stavljanje objekta u funkcionalno stanje.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS „Cmiljača” 35/10kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.
- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase u toku 2020. godine.
- U toku izvođenja pripremih radova i geodetskog snimanja trase dalekovoda utvrđeno je da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom Glavnom projektu usled preklapanja projektovane trase dalekovoda na pojedinim dionicama sa izgrađenim ski stazama i žičarom, usled čega je izvođač obustavio radove do izmjene projektne dokumentacije. Kako je u međuvremenu došlo do nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga, pokrenuta procedura raskida zaključenog ugovora

za izvođenje radova i isti je sporazumno raskinut 31.03.2023. godine.

- U decembru 2023. godine Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je dostavilo novi projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, na osnovu čega je Uprava za kapitalne projekte zaključila ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/23-4308/1 sa projektantom "Crta" d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.07.2023. godine na iznos od 9.619,50€.
- Ugovor br. 01-334/23-2279/1 za reviziju glavnog projekta sa revidentom "Studio projekt mne" d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijenosti 1.350.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno jer nije bilo ispravnih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u novembru 2024. godine i u toku je procedura zaključivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
- Problematika: Nema je
- U 2024. godini realizovano je 15.669,50€.

2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- U . godini ukupno je realizovano 30.541,74€.

Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo - Vrioci - Žarski katun, II faza

- Radovi I faze koji su obuhvatili proboj puta su završeni.
- Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanjenje 10 kV kabla, a asfalterški radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.
- Do sada su završeni zemljani radovi na proboju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
- Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine,

po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.

- Izrada dopune Glavnog projekta je završena.
- Zbog mnogobrojnih problema na trasi puta, Uprava za kapitalne projekte je 28.12.2022. godine raspisala javnu nabavku za izbor projektanta za izradu Glavnog projekta za završetak svih preostalih radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Da bi se nastavilo izvođenje radova na dijelu trase po dopunjenom revidovanom glavnom projektu potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/23-3703/1 od 23.06.2023. godine sa "Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica za izradu glavnog projekta za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun na iznos od 34.727,00€ i sa d.o.o. "Civil Engineer" Podgorica zaključila ugovor br. 01-334/23-3288/1 od 02.06.2023. godine za reviziju istog projekta.
- Glavni projekat za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun je revidovan i dostavljen Upravi za kapitalne projekte u oktobru 2024. godine.
- Problematika: Nakon regulisanja imovinsko pravnih odnosa, nastaviće se sa realizacijom druge faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Izvođač radova je insistirao da nastavi sa radovima na izgradnji II faze puta, za što je bilo neophodno dostaviti dokumentaciju koja će se bazirati na izmjenama obuhvaćenim projektom za završetak radova na putu Vragodo-Vrioci-Žarski katun, a po kojoj se radovi mogu nastaviti u skladu sa zaključenim Ugovorom. Kompletna dokumentacija, odobrena od strane stručnog nadzora i Naručioca, još uvijek nije dostavljena.
- Opština Mojkovac je dopisom od 24.01.. godine potvrdila da imovinski-pravni odnosi još uvijek nisu riješeni.
- Prijedlog rješenja: Nakon dostave kompletne dokumentacije i definisanja radova koji se eventualno mogu izvoditi u skladu sa Ugovorom, biće razmotren način prevazilaženja problema i precizirana mogućnost nastavka radova na trasi puta.
- U 2024. godini realizovano je 39.857,40€.

Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac



- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine.

Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Montepu" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
- Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
- Radovi na objektu nisu otpočinjali.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Uprava za kapitalne projekte je izvođaču radova dostavila obavještenje o jednostranom raskidu Ugovora, br. obavještenja 01-334/24-6591/1 od 27.11.2024. godine, s obzirom da od dana zaključivanja ugovora 22.12.2020. godine, nije bilo izvršenja ugovorenih obaveza. Od strane izvođača radova nije bilo odgovora na dopis.
- Prijedlog rješenja: Raskid ugovora.

Trasa puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m

- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, "Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od od 1.750,50€.
- Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljani u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
- Revident projekta izmijenjene trase puta "Ing-impuls" d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma "Ing-impuls" d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500 m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine,

zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom "Europrojekt" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1.936,00€.

- Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta, na koju je revident dostavio primjedbe.
- Revidovan glavni projekat je Upravi za kapitalne projekte dostavljen u julu 2023. godine.
- Raspisivanje tendera za izbor izvođača radova je prolongiran do preciziranja zahtjeva Opštine Mojkovac za izgradnjom vodovoda, koji bi ulazio u trasu projektovanog puta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 03.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7104/1 sa izvođačem "Gradnja inženjering MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2024. godine, na iznos od 982.510,81€ sa pdv-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 03.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7382/1 od 26.12.2024. godine, zaključen je sa "N&B inženjering i konsalting" d.o.o. Nikšić, na iznos 10.648,00€ sa pdv-om.
- U toku je procedura izdavanja građevinske dozvole od strane Opštine Mojkovac.
- U 2024. godini realizovano je 1.936,00€.
- Problematika: Nema je.

Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“

- Donesena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja "Žarski".
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto poništeno 16.07.2021. godine.
- Nakon što je Opština Mojkovac dostavila inovirani projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove, Uprava za kapitalne projekte raspisala je javno nadmetanje za izbor projektanta i revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6874/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Nik Com“ iz Nikšića, zaključen je 10.12.2024. godine, na iznos od 114.641,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 14.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6745/1 sa revidentom glavnog projekta, „B-Ril Inženjering“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024. godine, na iznos od 6.987,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Tokom izrade projektne dokumentacije utvrđeno je da trasa vodovoda ide preko privatnih parcela, o čemu je obaviještena Opština Mojkovac.
- Prijedlog rješenja: Obaveza Opštine Mojkovac da riješi eksproprijaciju kako bi se glavni projekat pozitivno revidovao.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski

- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi“. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju

parkirališta i uređenje terena.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac” iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta, nakon čega se otpočelo sa radovima u julu 2020. godine.
- Izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, a izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih zidova i stubova suterena ugostiteljskog objekta. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine i od tada više nisu izvođeni.
- Usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, izvođač radova je zatražio sporazumni raskid ugovora.
- Sporazum o raskidu ugovora je potpisan 24.07.2023. godine.
- Javni nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-943/1 sa izvođačem radova „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.02.. godine na iznos od 3.892.980,88€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-2116/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 24.04.2024. godine, na iznos od 121.000,00€.
- Radovi će otpočeti kada se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je



Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4

- Kapacitet žičare „Z4” je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je

raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta i otpočelo se sa radovima u 2020. godinu. Završene su aktivnosti na nabavci opreme i građevinski radovi na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Radovi se ne izvode zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Prijedlog rješenja: Obaveza Ministarstva turizma i „Skijališta Crne Gore” je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ski staze uz žičaru Z4

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo u 2020. godini. Radovi su izvođeni do polovine 2022. godine na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije. Završeno je preko 80% ugovorenih radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Da bi se počelo sa radovima, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.
- Prijedlog rješenja: Obaveza Ministarstva turizma i Skijališta Crne Gore je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV „Z4” i priključnog 10 kV kablovskog voda

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-4121/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Yawel” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5755/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Revizija glavnog projekta završena je u aprilu 2024. godine.
- S obzirom da se trafo-stanica napaja sa Ski centra “Cmiljača”, realizacija će započeti kada bude izgledno priključenje objekta na elektro-enrgetske infrastrukturu.
- U 2024. godini realizovano je 8.470,00€.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Cmiljača" do TS 10/0,4 kV bazna stanica „Žarski“

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-5928/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 9.559,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5929/1 sa revidentom glavnog projekta "Diagram" d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 6.655,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U toku je izrada projektne dokumentacije koja je uslovljena izradom projekta puta koji povezuje ski centre.
- Problematika: Trasa kablovskog voda je uslovljena sa trasom nove saobraćajnice, tako da dinamika izrade projekta zavisi od završetka projekta buduće saobraćajnice.

2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.


Putna infrastruktura

- Za izvođenje asfaltnih radova sa saobraćajnom signalizacijom i opremom regionalnog puta Daciće-Kaluđerski laz-Štedim raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova 23.06.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4890/1 sa izvođačem radova "Tofi" d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 858.163,70€.
- Ugovor br. 01-334/23-3702/1 sa stručnom nadzorom "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.06.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Radovi na projektu su otpočeli u avgustu 2023. godine i izvodili se do oktobra 2023. godine.
- Svi radovi su završeni i dostavljen je konačni izvještaj.
- U 2024. godini realizovano je 9.014,50€.



Žičara

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim”. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon” d.o.o. Sarajevo, zaključen je 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
- Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.
- U 2024. godini realizovano je 1.227.696,25€.
- Završeni su radovi na postavljanju svih dvanaest stubova i montaža polazne stanice žičare.
- Završni radovi su otpočeli u junu 2024. godine. Radovi su izvođeni na polaznoj i dolaznoj stanici, a za kompletiranje istih potrebno je završiti radove na elektroenergetskoj infrastrukturi žičare.
- Problematika: Nema je.

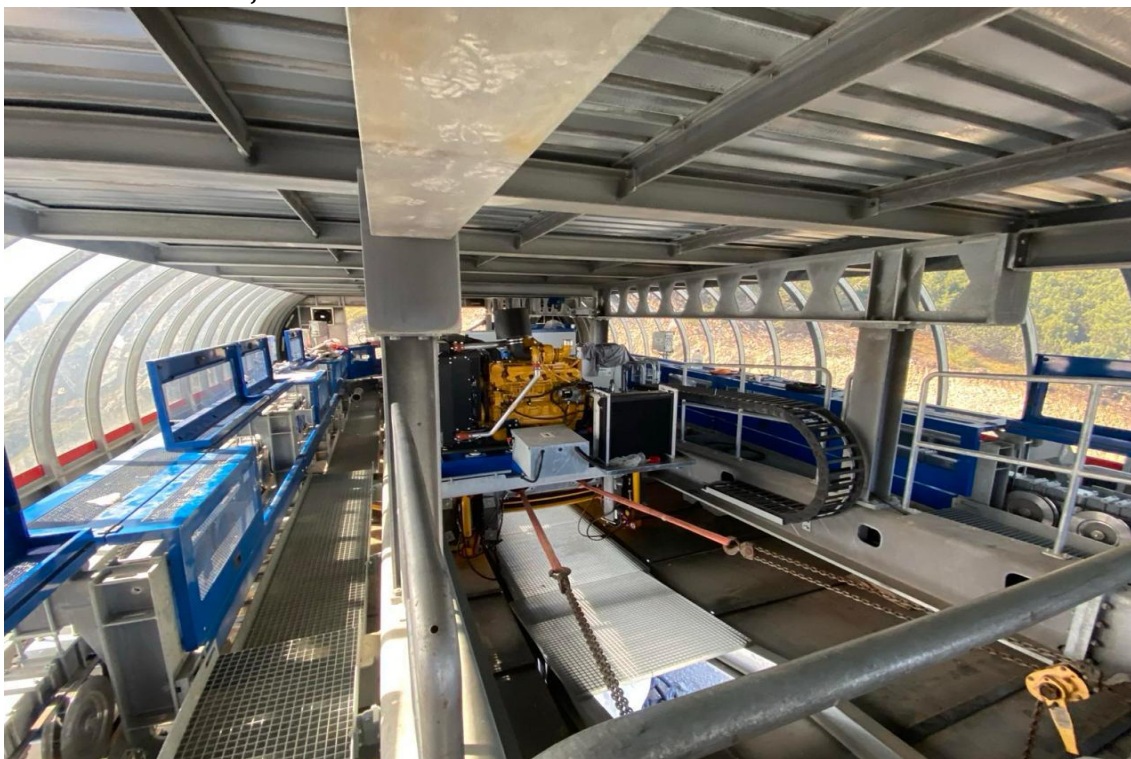



Ski staze

- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2283/1 sa izvođačem "Gradnja inženjering MNE" d.o.o Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine na iznos od 2.722.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 25.03.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4539/1 sa stručnim nadzorom "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.08.2023. godine na iznos od 36.300,00€.
- U 2023. godini su završeni radovi na stazama od 1 do 7. Radovi na sječi šumskih stabala od strane šumskog gazdinstva iz Rožaja su nastavljeni u junu 2024. godine, kao i radovi na uređenju ski staza 1, 4 i 5. Radovi su usvojenom dinamikom izvođeni do decembra 2024. godine.
- U 2024. godini realizovano je 1.173.103,38€.
- Problematika: Nema je.

Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu „Hajla“

- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.

- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je pripremio projektni zadatak i dostavilo isti Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sprovođenje konkursa za izbor idejnog rješenja.
- Nakon dostavljanja potrebe dokumentacije Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

Elektroenergetska infrastruktura

- Nakon što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Upravi za kapitalne projekte ovjerene projektne zadatke, Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za realizaciju projekta po principu „projektuj i izgradi“ za: ćeliju 35kV u TS 35/10kV „Zeleni“, podzemni vod 35kV od TS 35/10kV „Zeleni“ do TS 35/10kV „Crnja“, TS 35/10kV „Crnja“, TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 4“, TS 10/0,4kV, 1x630kVA „Nova 5“, TS 10/0,4kV, 2x1000kVA „Nova 6“ i TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 7“, TS 10,04kW Nova 8 sa podzemnim kablom, kao i za izbor revidenta i stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- Procijenjena vrijednost radova nedostajuće elektroenergetske infrastrukture iznosi 4.800.000,00€ bez pdv-a.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra „Hajla“ po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 19.05.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-5751/1, sa izvođačem radova „Eminent“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine, na iznos od 5.746.048,00.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra "Hajla" po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 25.09.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-7612/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ do.o.o. Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 38,054.50€.
- Glavni projekat je završen, prijavljen je početak radova i izvođač radova je uveden u posao u junu 2024. godine. Izvođeni su radovi na postavljanju elekro kabla u dužini od 20 km, kao i montaži trafostanica 1-8, po dinamičkom planu. Radovi su obustavljeni u decembru zbog nastupajućeg zimskog perioda.
- U 2024. godini realizovano je 1.829.129,85€.
- Problematika: Nema je.

Nabavka, transport i ugradnja hauba za zaštitu od vremenskih neprilika za korpe šestosjedne žičare na Hajli/Štedimu, Opština Rožaje za potrebe Ski centra „Hajla“

- Javno nadmetanje za nabavku, transport i ugradnju hauba za zaštitu od vremenskih neprilika za korpe šestosjedne žičare na Hajli/Štedimu, raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-962/1 sa izvođačem radova „Strucon“ d.o.o. Sarajevo, zaključen je 29.02.2024. godine na iznos od 1.445.962,10€.
- Ugovor br. 01-33/24-479/1 sa stručnim nadzorom „Infrastruktura“ d.o.o. Podgorica zaključen je 01.02.2024. godine na iznos od 7.320,5€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 1.452.012,10€.

Izrada studije hidrotehničke infrastrukture na prostoru u zahvatu Lokalne studije lokacije „Hajla i Štedim“, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za izradu studije hidrotehničke infrastrukture na prostoru u zahvatu Lokalne studije lokacije „Hajla i Štedim“, raspisano je u oktobru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-787/1 sa firmom „Flowmax“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.2024. godine na iznos od 27.830,00€.
- Studija je proslijeđena Opštini Rožaje na saglasnost.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

Izgradnja ski poligona za obuku skijaša početnika koji se sastoji od pokretne trake i tjubing staze na skijalištu na lokalitetu Savin kuk, Žabljak

- Na osnovu projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova dostavljenih od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, 01.06.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja glavnog projekta izgradnje ski poligona za obuku skijaša početnika.
- Ugovor br. 01-334/23-5913/1 sa izvođačem radova "Eurozox" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 338.800,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-3157/1 sa vršiocem revizije „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2023. godine, na iznos od 6.413,00€, a ugovor br. 01-334/23-3160/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica zaključen je 30.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 354.772,00€.

2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju


- Kroz realizaciju projekta sprovode se aktivnosti na realizaciji više podprojekata, a koji se odnose na izgradnju žičare-gondole, servisnih objekata na ulazu u žičaru, uređenje unutrašnjosti same pećine, izgradnja vizitiring centra sa regulacijom korita rijeke, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture, kao i za nabavku opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu i uređenje unutrašnjosti pećine

- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016.

godine, na iznos od 59.797,50€.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine.
- U drugoj polovini 2022. godine, radovi nisu izvođeni iz razloga što je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje kojim je utvrdila da je Uprava za kapitalne projekte – „Operater“, pričinila štetu životnoj sredini u okviru zaštićenog područja Đalovića klisure, u dijelu Đalovića pećine usljed izvođenja radova I faze, te je naložila obustavu radova na valorizaciji pećine dok se ne pribave neophodne dozvole. Usljed navedenog se nije otpočelo ni sa izvođenjem radova II faze.
- Uprava za kapitalne projekte je na donijeto rješenje uložila žalbu posredstvom advokatske kancelarije „Iusticia”, s obzirom na to da Uprava za kapitalne projekte nije Operater u postupku, a da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje je Investitor, bilo dužno da obezbijedi sve neophodne dozvole od Agencije na osnovu blagovremenih informacija dostavljenih od strane Uprave, da je postupak utvrđivanja značaja štete u životnoj sredini nepravilno i nezakonito sproveden, naročito imajući u vidu činjenicu da je Agencija za zaštitu životne sredine, i prije početka radova imala tačna, precizna i jasna saznanja o vrsti radova koji će se izvoditi na uređenju zaštićenog lokaliteta, kao i da ne postoje zakonske granice pećine i da one nikada nisu definitivno utvrđene, tako da nulto stanje same pećine nije poznato. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je donijelo rješenje br. UPII-04-351/2 od 1.8.2023. godine, kojim poništava rješenje Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-UPI-126/14 i vraća na ponovno odlučivanje.
- Agencija za zaštitu životne sredine je uradila Studiju nultnog stanja, a Ministarstvo turizma je preuzelo obavezu donošenja odluke o potrebnim aktivnostima za nastavak radova.
- Čeka se Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine vezano za mogućnost izvođenja radova ispred pećine.
- U toku je utvrđivanje potrebe izrade Elaborata za zaštitu životne sredine za radove unutar pećine.
- Problematika: Radovi su prolongirani zbog dobijanja potrebnih saglasnosti.
- Prijedlog rješenja: Za nastavak radova neophodno pribaviti potrebne saglasnosti.





Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke



Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom

potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik Opština Bijelo Polje je dostavila Upravi za kapitalne projekte ovjeren Projektni zadatak kako bi pokrenula postupak iz svoje nadležnosti.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, „Crnogoraput“ a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, "Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- *Problematika:* Ogleda se kroz nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijeđenim prilazima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala
- iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predata Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
- Sa projektantom "Inter projekt" d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
- Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
- Radovi na predmetnom projektu su nastavljeni u septembru 2022. godine, nakon što su od strane nadležnih institucija izmještene postojeće vodovodne, TK i elektro instalacije, a od strane opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte obaviještena da mještani pristaju da se izvode radovi po revidovanom glavnom projektu.
- Ukupno je realizovano 1.073.013,88€ u 2022. godini.
- I pored potvrde predstavnika Opštine Bijelo Polje da tokom izvođenja radova neće biti opstrukcija od strane mještana, te da će zahtjeve mještana Opština naknadno rješavati u sopstvenoj režiji, opstrukcije su se nastavile, a radovi izvođeni u 2022. godini su djelimično završeni.
- Prijedlog rješenja: Da bi se izbjegle konstantne obustave i produžeci roka izvođenja radova,

u 2023. godini su definisane sporne dionice na kojima se radovi nisu mogli izvoditi i raspisana je javna nabavka za izbor projektanta koji će vršiti izradu izmjene projektne dokumentacije.

- Ugovor o izradi izmjene revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije puta L1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje br. 01-334/23-42227/1 sa projektantom "Viamont" d.o.o. Kolašin zaključen je 21.07.2023. godine, na iznos od 14.399,00€.
- Ugovor o reviziji istog projekta br. 01-334/23-3634/1 sa revidentom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.06.2023. godine, na iznos od 9.438,00€.
- Revidovana izmjena glavnog projekta je Upravi za kapitalne projekte dostavljena 15.11.2023. godine i ista je vraćena revidentu na provjeru usklađenosti sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
- Radovi po izmijenjenom revidovanom glavnom projektu su nastavljani 07.05.2024. godine i završeni u julu 2024. godine.
- Uzimajući u obzir dodatne i viškove radova kao rezultat izmjene revidovanog glavnog projekta, u toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za nastavak radova na rekonstrukciji puta Gubavač-Bistrica.
- Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica je objavljeno je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6746/1 sa izvođačem radova "Konstruktor group" d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 04.12.2024. godine, na iznos od 2.323.664,93€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova je raspisano u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-789/1 sa stručnim nadzorom "Ding" d.o.o. iz Podgorice zaključen je 19.02. godine, na iznos 3.630,00€.
- Nastavak radova na rekonstrukciji puta je otpočeo u martu . godine.
- U 2024. godini realizvano je 1.437.237,85€.



Postavljanje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje

- Projektom je obuhvaćeno postavljanje javne rasvjete duž rekonstruisanog puta Gubavač-Bistrica i to na dvije dionice: Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica
- Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekt dostavila revidovani Glavni projekat. Projektant je „Arhing inženjering“ doo iz Bijelo Polja (br.ugovora 07/1-7087 od 24.07.2019. godine)i revident „Civil engineer“doo iz Podgorice (br.ugovora 07/1-14043 od 27.12.2019. godine).
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala Javno nadmetanje za izbor izvođača radova

03.07.2020. godine, koji je poništen i drugi put 14.09.2021. godine. Ugovor br.01-334/22-337/1 sa izvođačem „Ramel” d.o.o. Nikšić, zaključen je 31.01.2022.godine, na iznos od 161.771,43€ sa PDV-om.

- Stručni nadzor je izabran u postupku nabavke male vrijednosti br.03-48/20 od 06.07.2020. godine. Ugovor br.01-334/22-5940 sa stručnim nadzorom „Sistem-MNE” doo iz Podgorice, zaključen je 29.07.2020. godine, na iznos od 7.900,00€.
- Problematika: S obzirom da su radovi na postavljanju javne rasvjete uslovljeni izvođenjem radova na rekonstrukciji puta, izvođač radova je uveden u posao 12.08.2022. godine. Radovi se u ovom periodu mogu izvoditi samo na dionici puta Mirojevići-Bistrica, dok na drugoj dionici nijesu stvoreni uslovi za početak radova.
- Nastavak radova zavisi od radova na rekonstrukciji puta. Još uvijek nisu stvoreni uslovi za nastavak radova na postavljanju javne rasvjete.
- Prijedlog rješenja: Očekuje se nastavak radova u . godini, uporedo sa izvođenjem radova na projektu nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim virovima”

- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
- U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
- U cilju pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje, obaveza Ministarstvo turizma je bila da u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.



Izgradnja objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom

- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu ovjerenog Projektnog zadatka dostavljenog
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „PermonTE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.
- Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2022. godine.
- Ključevi objekta su predati Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
- Ukupno je realizovano 194.086,76€ u 2023. godini.
- Objekat nije stavljen u funkciju jer je za isti neophodno obezbijediti energetska napajanje, odnosno potrebno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitoring centar”.
- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023. godine raspisano javno nadmetanje za projektovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitoring centar” po principu “projektuj i izgradi”. Ugovor br. 01-334/204-2495/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Eminent” d.o.o. Podgorica, zaključen je 09.05.2024. godine, na iznos od 117.560,95€.
- Ugovor br. 01-334/23-7389/1 sa stručnim nadzorom “Diagram” d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 6.050,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Omogućiti prolazak kabla preko državnih parcela je uslov za dobijanje pozitivnog izvještaja revizije, a nakon dobijanja istog, izvođač radova će biti uveden u posao.
- Problematika: Zbog dobijanja neophodnih saglasnosti na prolazu kabla preko državnih parcela, prolongirano je izvođenje radova.
- Prijedlog rješenja: Ministarstvo turizma sprovodi aktivnosti na dobijanju potrebnih saglasnosti.



Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa "Đalovića pećine" ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica“ do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh". Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „YAWEL“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, „Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu“ a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019.

godine, na iznos od 29.040,00€.

- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i dobijena je upotrebna dozvola 16.12.2022. godine.
- Na osnovu Izvještaja interne Komisije CEDIS-a, Izvođač radova „Eurozox“ je zaključno sa 19.12.2024. godine otklonio nedostatke koji su bili posledica lošeg izvođenja, a na osnovu odobrenja od strane CEDIS-a. Ostale nedostatke koji su posledica neodržavanja (raskres šime, čišćenje oko stubnih mjesta, zamjena polomljenih izolatora), potrebno je sa predstavnicima CEDIS-a naći rješenje za njihovo otklanjanje, imajući u vidu da ti radovi spadaju u redovno održavanje.
- Problematika: Nije izvršeno preuzimanje objekta nakon završetka od strane CEDIS-a, jer nije završena procedura otkupa. Dok se ne otklone primjedbe CEDIS-a, objekat se ne može priključiti na distributivnu mrežu.
- Prijedlog rješenja: U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka, nakon čega će pokrenuti aktivnosti na stavljanju trafostanice u probni rad.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja TS “Bistrica” 35/10 kV



- Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
- Reviziju glavnog projekta odradio je “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, „Electroteam“ d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 3911/1 sa stručnim nadzorom, „Nikcom“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.
- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni u 2021. godini.
- U drugoj polovini 2023. godine otklonjeni svi nedostaci po preliminarnom izvještaju Komisije za tehnički prijem objekta i podnijet zahtjev CEDIS-u za privremeno priključenje objekta na distributivnu mrežu za potrebe probnog rada.
- U prvoj polovini 2024. godine izvršen je interni pregled izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDIS-a i dostavljen izvještaj 17.05.2024. godine.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

- Problematika: Objekat još uvijek ne može da se priključi na distributivnu mrežu i pusti u probni rad, jer nije pušten u rad dalekovod 35 kv Nedakusi – Bistrica.

Izgradnja TS “Manastir Podvrh” 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS “Bistrica” 35/10 kV do buduće TS “Manastir Podvrh” 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave za kapitalne projekte. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni u 2021. godini i dobijena je upotrebna 03.08.2023. godine.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nije izvršeno priključenje na distributivnu mrežu i objekat nije predat CEDIS- jer je uslovljen puštenjem u rad dalekovoda 35 KV Nedakusi – Bistrica.

Izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice STS 1x250kVA na lokalitetu Đalovića pećina

- U aprilu 2024. godine Upravi za kapitalne projekte dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je Uprava za pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, raspisano je 21.06.2024. godine, procijenjene vrijednosti 520.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je 08.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-828/1 sa izvođačem radova „Xenergy“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.. godine na iznos od 602.580,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 04.12.2024. Ugovor br. 01-334/25-808/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Inženjer Gogić“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.02.. godine na iznos od 5.377,77€.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- Radovi će otpočeti nakon izrade glavnog projekta i kada Opština Bijelo Polje obezbijedi građevinsku dozvolu.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

Žičara Đalovića pećina

- Projekat izgradnje gondole se izvodi po principu „projektuj i izgradi“. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu “projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine.

Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.
- Završene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Sa radovima se otpočelo u 2019. godini. Završeni su radovi na izgradnji pristupnih puteva, ugradnja polazne i izlazne stanice i isporučena oprema žičare.
- U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Problematika i prijedlog rješenja: Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, odnosno potrebno je da se završi procedura tehničkih pregleda i priključenja trafostanice TS 35/10 kV „Bistrica” i priključenja TS 10/0,4 kV „Žičara” na elektro energetska mrežu.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.



Vodosnabdijevanje

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbjediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018. godine, na iznos od 34.848,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekta na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i nezavisni projekat. Opština Bijelo Polje je krajem godine dostavila Projektni zadatak za “Vodosnabdijevanja i odvođenje fekalnih voda iz uslužno-servisnih objekata na prijemno-ulaznom punktu”.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem , „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Radovi su prolongirani zbog nivoa rijeke, a potom nisu izvođeni zbog situacije na globalnom tržištu cijena.
- Nakon što je Imenovani stručni nadzor „Medmex architects” d.o.o. Rožaje jednostrano raskinuo ugovor, Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa preduzećem „Infrastruktura” Podgorica ugovor br. 01-067/23-4322/1 od 25.07.2023.godine.
- Uprava za kapitalne projekte je jednostrano raskinula ugovor o javnoj nabavci br.01-334/24-3280/1 od 10.06.2024. godine sa izvođačem radova „Inženjering put”.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Izgradnja objekta planirana je fazno pri čemu svaka faza čini tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu koje će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i nakon izvršene prijave građenja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, izvođač je uveden u posao 19.09.2022. godine.
- Ukupna površina objekta je 49.067,37m², a površina I faze je 23.465,92m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Ukupan broj parking mjesta I faze je 626 za putnička vozila i 8 parking mjesta za autobuse.
- Do sada su završeni radovi na izradi armirano betonske konstrukcije objekta. Usljed nastupanja zimske sezone, radovi su privremeno obustavljeni, gradilište je konzervirano sredinom decembra 2024. godine i isti će biti nastavljeni u . godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- Dana 13.12.2024. godine Ministarstvo turizma je dostavilo Upravi za kapitalne projekte projektni zadatak za izradu glavnog projekta pristupnih saobraćajnica. Ugovor br. 01-334/24-7485/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Ding” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.12.2024. godine na iznos od 6.013,70€.
- U 2024. godini realizovano je 953.880,07€.
- U . godini ukupno je realizovano 13.974,54€.
- Problematika: Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na obračun klizne skale čija dalja primjena ima tendenciju uvećanja ugovora za više od 20%, koliko je dozvoljeno uvećanje shodno Zakonu o javnim nabavkama.
- Prijedlog rješenja: Zatraženo je mišljenje Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa u cilju rješavanja nastale problematike.



2.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za sljedeće projekte: Spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena; Park prirode "Dragišnica i Komarnica"; Valorizacija kanjona "Nevidio" gdje aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština Šavnik u skladu sa potpisanim ugovorom sa Upravom; Karaula na Prokletijama; Ulazne kapije u Nacionalnim parkovima; Kuća maslina u Baru; Rekonstrukcija planinarskog doma na Goliji. Period realizacije 2021.-. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 441.496,32 €.

Valorizacija kanjona "Nevidio"

- Opština Šavnik je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o unapređenju turističke ponude – „Valorizacija kanjona Nevidio“ u iznosu od 455.229,60 €.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

2.9. Objekat „Kuća voća” u Andrijevi

- Objekat "Kuća voća" u Andrijevi nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevi, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevi, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojace se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffè bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine.
- Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37€.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00€.
- Sa izvođenjem ugovorenih radova otpočelo se u aprilu 2018. godine i radovi su se do sredine 2019. godine odvijali planiranom dinamikom. Tokom 2019. godine, po zahtjevu bivšeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, urađen je novi tehnološki elaborate na osnovu kog je izmijenjena projektna dokumentacija za objekat proizvodnog pogona, u dijelu arhitekture, vodovodnih, elektro i mašinskih instalacija. Navedene izmjene su između ostalog podrazumijevale rušenja i demontaže već izvedenih radova na objektu proizvodnog pogona, što je za posljedicu imalo produženje ugovorenog roka za završetak radova, kao i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.

- U cilju završetka realizacije projekta, Uprava za kapitalne projekte je sprovela pregovarački postupak po odobrenju Ministarstva finansija i raspisala novi otvoreni tenderski postupak za dodatne radove, kako bi se time obuhvatili svi naknadni i dodatni radovi koji su nastali usljed propusta i izmjena u projektnoj dokumentaciji. Po osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka sa izvođačem radova "Neimar inženjering" je potpisan ugovor o izvođenju dodatnih radova, dok je otvoreni postupak obustavljen, iz razloga što predmetni objekat nije bio obuhvaćen Zakonom o budžetu za 2021. godinu, odnosno nisu bila obezbijeđena finansijska sredstva za izvođenje radova.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Takođe za predmetni objekat je u 2019. godini izrađen projekat trafostanice za potrebe napajanja objekta "Kuća voća", međutim, za isti nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije realizovan.
- Uprava za kapitalne projekte se obraćala dopisom nadležnom Ministarstvu 03.08.2021. godine, na koji nije dobijen odgovor. U martu 2022. godine je održan sastanak na kojem je usmeno saopšteno od strane predstavnika ministarstva da tehnologija proizvodnje predmetnog objekta nije konačno definisana i usvojena, kao i da nije poznato koje sirovine će se koristiti u proizvodnji.
- Do kraja 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik, nije dostavilo inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, niti je u saradnji sa Opštinom Andrijevica realizovalo aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu.
- Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 2.600.000,00€, a do sada je na isti utrošeno cca 550.000,00 €.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Kako bi se nastavilo sa daljom realizacijom projekta, neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik u skladu sa planiranom funkcijom objekta uradi inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu. Takođe, potrebno je da ministarstvo u saradnji sa Opštinom Andrijevica, pokrene i realizuje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za izgradnju iste.
- Prijedlog rješenja: Urgencija za rješavanje navedene problematike nadležnom Ministarstvu je upućena je više puta, ali Uprava za kapitalne projekte nije dobila odgovor.

2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o.

- Podgorica, zaključen je 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00€.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotecnika Montenegro” d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00€.
 - Sredinom 2022. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3273/1 sa izvođačem „Intermost” d.o.o Podgorica, je zaključen 02.06.2023. godine, na iznos 1.101,006,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Projektman”, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 23.776,5€.
 - Opština Herceg Novi je krajem decembra 2023. godine dopunila prijavu radova nadležnom inspekcijском organu čime su se stvorili uslovi za početak realizacije ugovora.
 - Izvođač radova je uveden u posao početkom 2024. godine. Tokom izvođenja radova došlo je do pojave nepredviđenih okolnosti vezano za pojavu podzemnih kablova na dijelu lokacije na kojoj se izvode radovi, kao i neusklađenosti projekta sa stanjem na licu mjesta. Izvođač je izveo dio radova i zbog neriješene problematike konzervirao gradilište zbog početka turističke sezone.
 - Sredinom 2024. godine Uprava za zaštitu kulturnih dobara je dostavila Rješenje kojim se izdaje saglasnost na konzervatorski projekat čiji sadržaj nije bio predmet ugovorne dokumentacije, te je u svrhu otpočinjanja radova bilo potrebno izvršiti dopunu revidovanog glavnog projekta i utvrditi ukupan obim posla.
 - U toku je utvrđivanje načina obezbjeđenja dopune revidovane projektne dokumentacije, kako bi se definisao status ugovora sa izvođačem radova s obzirom na novonastalu situaciju.
 - Problematika i prijedlog rješenja: Za izradu dopunjene projektne dokumentacije potrebno je raspisati novo javno nadmetanje. Opština Herceg Novi takođe sprovodi aktivnosti i upoznata je sa problematikom na predmetnom projektu.
 - U 2024. godini realizovano je 346.132,59€.

2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra “Kolašin 1450” i “Kolašin 1600”

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osniježavanje ski staza planinskih

centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.

- Opština Kolašin je u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavila potpisani projektni zadatak i UTU-uslove sa programskim zadatkom na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 03.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/24-127/1 od 13.01.2023.godine potpisan je sa projektantom/izvođačem, „Sigillum Co“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 9.183.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je 20.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-1285/1 od 03.03.2023. godine potpisan je sa revidentom „Sistem-mne_Institut“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 98.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisani su 20.12.2022.godine, Ugovor br. 01-334/23-1724/1 od 23.03.2023. godine potpisan je sa stručnim nadzorom „Sistem-mne_Institut“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 158.000,00€.
- Problematika koja se odnosi na realizaciju projekta javila se nakon javne rasparave na kojoj je izlagan Elaborat o zaštiti životne sredine projekta. Zbog odbijajućeg Rješenja Komisije koja je cijenila predmetni Elaborat, kao i pritiska određenog broja građana Investitor tj. Opština Kolašin i Vodovod Kolašin izmijenili su projektni zadatak. Nakon što su dostavili postpisani izmijenjeni projektni zadatak, Uprava za kapitalne projekte je prosljedila izmijenjene uslove CEDIS-u radi dobijanja novih uslova priključenja na osnovu kojih će projektant/izvođač pripremiti tehničku dokumentaciju, a sve kako bi Uprava kapitalnih projekata bila u mogućnosti da provjeri na koji način izmjene u projektnom zadatku utiču na realizaciju sklopljenog ugovora sa projektantom/izvođačem radova. Uprava za kapitalne projekte je 05.04.2024. godine, na osnovu dostavljenog izmijenjenog projektnog zadatka i izmijenjene odluke potpisala aneks ugovora za realizaciju predmetnog projekta br. 01-334/24-1718/1, koji je u odnosu na primarni ugovor uvećan za vrijednost od 1.423.123,94€.
- U toku je realizacija projektne dokumentacije na dionicama gdje su riješeni imovinsko pravni odnosi.
- Izvođač radova je uveden u posao 29.07.2024. godine na fazama za koje su se stekli uslovi za to tj. revidovan glavni projekat na osnovu riješenih imovinsko-pravnih odnosa faza IV i VI i na njima su se izvodili radovi do zimske sezone.
- U 2024. godini realizovano je 4.142.341,70€.
- Problematika: Lokalno stanovništvo opstruira rad I i II faze, a za koje su stečeni uslovi za izvođenje radova, sa čime je upoznata Opština Kolašin kao investitor.
- Prijedlog rješenja: Opština Kolašin u obavezi da riješi imovinsko-pravne odnose za fazu III i V fazu kako bi se stekli uslovi za dalju realizaciju projekta na ovim fazama.

2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"

Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača" žičarom

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski

- Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano

03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.
- Opštine Mojkovac i Bijelo Polje dale su saglasnost na urađeno idejno rješenje.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Glavni projekat je predat na reviziju, a zbog nepotpune projektne dokumentacije vraćen je na doradu.

2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije dostavljene od strane opštine Herceg Novi raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju panoramske gondole Igalo Ilinica u opštini Herceg Novi. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je poništila postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od 04.02.2022. godine.
- Uprava za kapitalne projekte je ponovo 30.11.2022. godine objavila javni poziv.
- Ugovor br. 01-334/23-4727/1 sa izvođačem radova „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 11.965.555,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-7606/14 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Ul. Cetinjski put bb, Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 20.945,10€.
- Ugovor br. 01-334/23-6502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o Podgorica, zaključen je 10.11.2023. godine na iznos od 119.654,48€.
- U toku je usaglašavanje idejnog rješenja sa Opštinom Herceg Novi i razmatranje statusa ugovora sa projektantom/izvođačem radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

2.14. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“, opština Žabljak

- Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti. Planirano je uređenje lokacija na panoramskoj ruti koja obilazi oko masiva Durmitora i djelimično obodom kanjona rijeke Tare, a u blizini vidikovaca, izvora, naselja i drugih lokacija.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na uređenju lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten" raspisivano je u junu, a zatim i u avgustu 2024. godine procijenjene vrijednosti 180.000,00€ bez pdv-a i na istima nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je krajem decembra 2024. godine i isto je u toku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

2.15. Eko-Katun Rujišta, Andrijevisa



- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.


PROGRAM
III. EKOLOGIJA I PRIRODA

POTPROGRAM

3. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE
--

3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

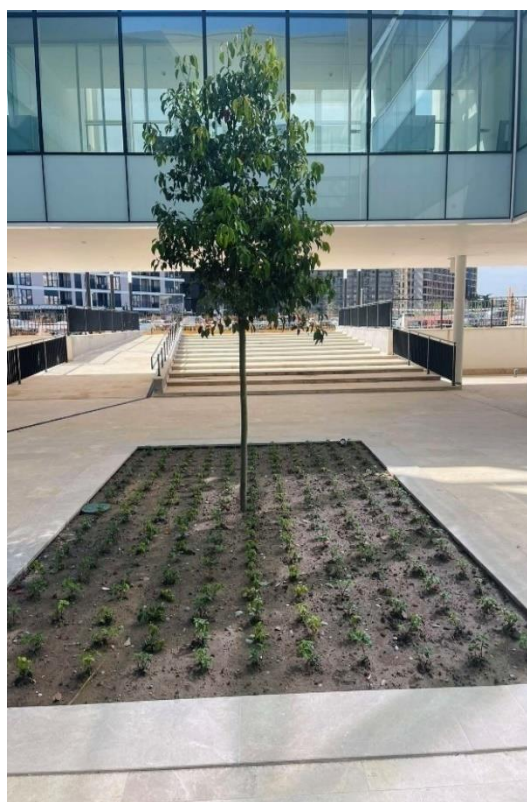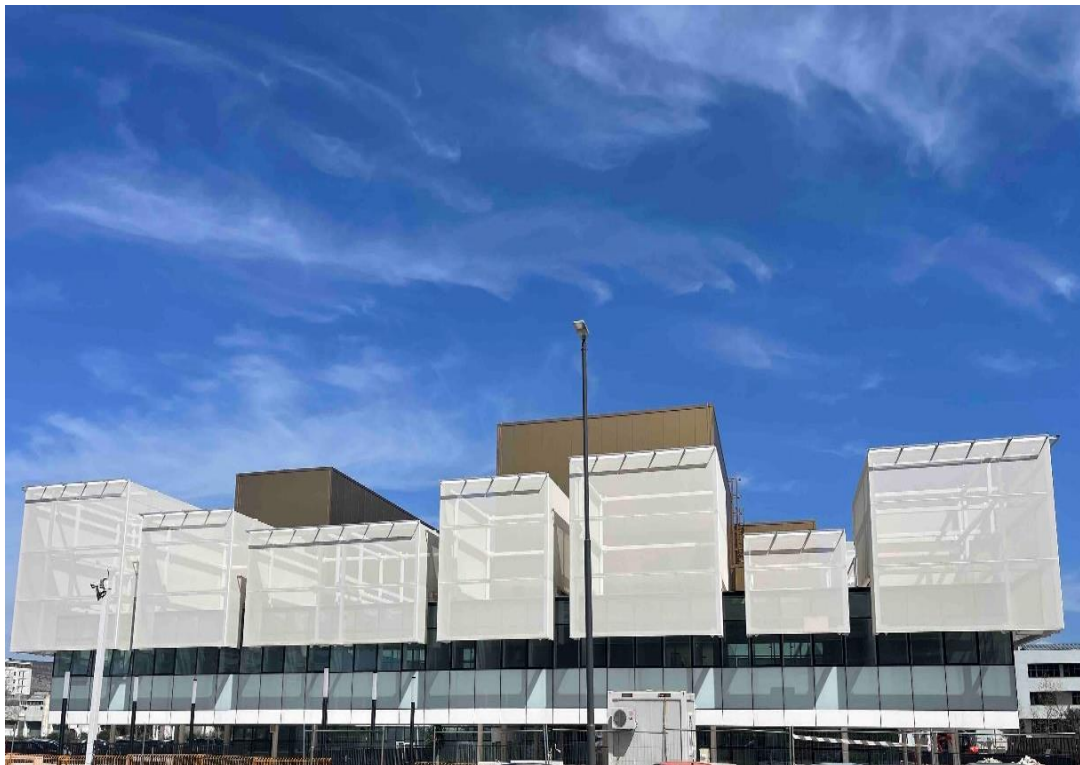

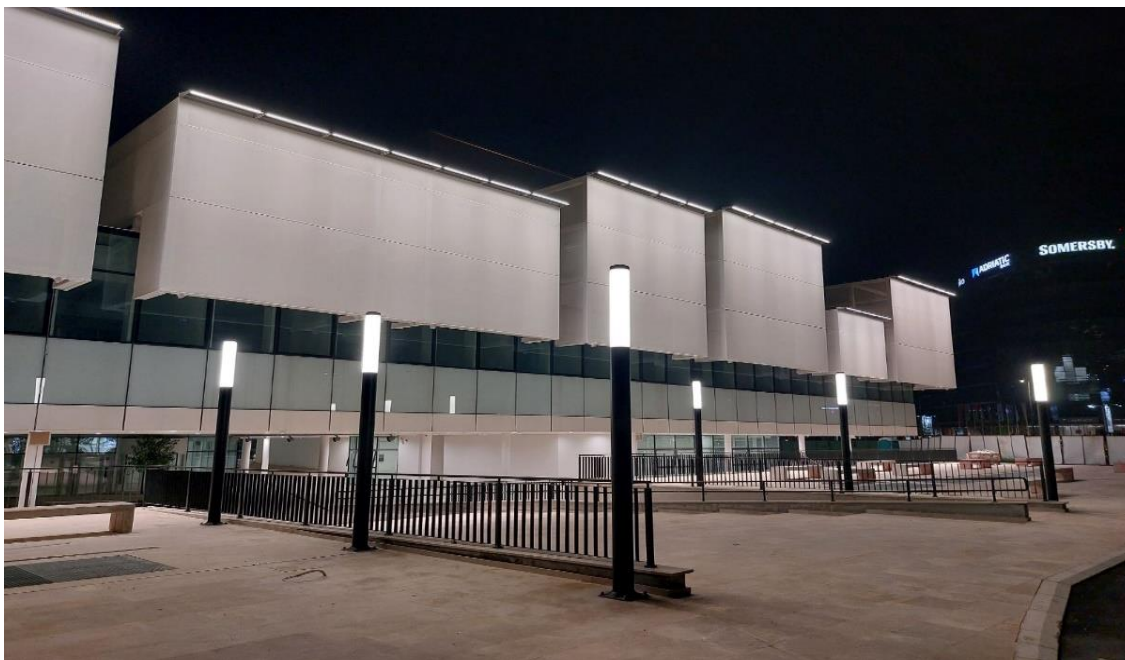

- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF–Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50€.
- Nakon što je završena izrada armirno-betonske i čelične konstrukcije objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
- Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnih nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG“ AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021.

godine na iznos od 14.904.394,84€.

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
- Početkom 2022. godine radovi su započeti i do sada su završeni radovi na sanaciji postojeće čelične konstrukcije i izradi lamelirane drvene konstrukcije, radovi na zatvaranju objekta strukturalnom fasadom, izrada fasadne obloge od lameliranih drvenih i aluminijumskih sendvič panela, krovopokrivački radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
- Svi radovi su završeni, kao i tehnički pregled objekta.
- U 2024. godini realizovano je 3.822.720,70€.

3.2. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte po prioritetima ministarstva. Projektom su obuhvaćeni podprojekti izgradnje sistema vodosnadbjevanja, kanalizacionih mreža i postrojenja za tretman otpadnih voda, sanacije nesanitarnih odlagališta otpada i izgradnja deponija, kao i projekti: regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Pljevlja, izgradnja kanalizacione mreže Kutsko polje i zaštita vodoizvorišta Opačica, Herceg Novi, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Danilovgradu, PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, kanalizacione mreže Juškovići, Ambarine, Podbišće, Opština Mojkovac, Rožajama, Kolašinu, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, fekalne kanalizacije na Žablaku, kao i za projekte: servisna zona u Gradionici, Tivat, sistem vodosnadbjevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevića, Pljevlja, Gusinje i Šavnik, II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema i II faza izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žablaku, vodosnabdijevanje Donjeg Grblja, nabavka i ugradnja opreme za potrebe vodovoda Čosovsko vrelo, Rožaje. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu

- Dužina fekalne kanalizacione mreže u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu iznosi 6 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "HydroGis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
- Problematika i prijedlog rješenja: Za potrebe izrade konačnog izvještaja revizije potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
- Problematika i prijedlog rješenja: U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenju ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
- Završeni su radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz insalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Po primarnom ugovoru završeni su radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnosti

postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.

- U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesti kako bi se sistem stavio u funkciju na osnovu čega je potpisan ugovor sa firmom "Hiperling" d.o.o. Podgorica, br. 01-334/22-1303/1 od 31.03.2022. godine u iznosu od 47.037,68€ sa pdv-om. Sve aktivnosti po ovom ugovoru za nepredviđene radove su realizovane.
- Preostale su određene pozicije iz primarnog ugovora kako bi se okončala II faza projekta, a iste će biti obrađene kada se za to stvore tehnički uslovi tj. zamućenje izvorske vode.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Korisnik nije saglasan sa izvedenim radovima i odbija da primi iste.
- Prijedlog rješenja: Sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja, koji su naručilac predmetnog projekta.

Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje

- Uprava za kapitalne projekte je 09.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 80.000,00 € bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 13.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 20.000,00 € bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 14.06.2023. godine je poništila postupak za izradu glavnog projekta jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.
- Krajem aprila 2023. godine je donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za odabir revidenta predmetne projektne dokumentacije. Ugovor br. 01-334/23-5138/1 sa revidentom "Civil engineer" d.o.o. zaključen je 08.09.2023. godine na iznos od 13,128.5€.
- Za odabir obrađivača projektne dokumentacije biće ponovo raspisano javno nadmetanje.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.3. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama, kao i drugi projekti po prioritetu ministarstva. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 25.291,27€.



Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane

- Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske

regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Tošković“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.
- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspekcijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Problematika: Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava za kapitalne projekte je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković“ pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava za kapitalne projekte navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlaštenog lica firme „Tošković“ ima elemenata krivičnog djela prevare.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Pejzažno uređenje zelenih površina specijalne namjene – zatvaranje i rekultivacija privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima, Kolašin

- U januaru 2024. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-266/1 sa obrađivačem idejnog rješenja “Projekt sistem“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.01.2024. godine na iznos od 9.667,00€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“ raspisano je 26.04.2024. godine. Zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju donešena je Odluka o poništenju postupka.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je 02.08.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5932/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica zaključen je 23.10.2024. godine na iznos od 145.200,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-6893/2 sa revidentom glavnog projekta “Ding” d.o.o. Podgorica zaključen je 10.12.2024. godine na iznos od 3.611,85€.
- U 2024. godini realizovano je 9.667,90€.
- Problematika: U toku usaglašavanje projektne dokumentacije po primjedbama revidenta, kao i izrada Elaborata procjene uticaja projekta na životnu sredinu, na osnovu Rješenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Opština Kolašin.
- Prijedlog rješenja: Zbog praćenja ugovornih obaveza ugovarača, Uprava za kapitalne projekte će uputiti dopis ka ugovaraču „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, kako bi u što skorijem roku usaglasili dokumentaciju sa primjedbama revidenta.

Izrada studije uspostavljanja primarne selekcije komunalnog otpada u Baru, izrada glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta i proširenje postojećeg reciklažnog centra i sprovođenje procjene uticaja na životnu sredinu

- U aprilu 2024. godine Upravi za kapitalne projekte dostavljena je dokumentacija od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5932/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.10.2024. godine na iznos od 145.00,00 €.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

Revizija izmijenjenog glavnog projekta fekalne kanalizacije za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima u opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora „Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija“, zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi izmijenjenog glavnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV, sa priključcima, u opštini Rožaje, dok Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na reviziji izmijenjenog glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmijenjenog glavnog projekta je raspisano 24.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-900/1 sa revidentom izmijenjenog glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 03.03.2022. godine, na iznos od 2.662,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 3.104,37€.
- Problematika: Projektant, ugovorno vezan za Ministarstvu ekologiju, održivog razvoja i razvoja sjevera, nije dostavio dopunu dokumentacije na način na koji je to zahtjevala Uprava za sobračaj kako bi izdala potrebnu saglasnost na navedeni projekat.
- Prijedlog rješenja: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovodi aktivnosti na projektu.

Izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija", zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi Izradi projektne dokumentacije Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Rožaje“ u sklopu tog projekta Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na Izradi Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže.
- Javno nadmetanje za izbor projektanta, Uprava javnih radova je raspisao sklopila ugovor sa preduzećem „Aqua engineering“ d.o.o. Podgorica br. 01-334/20-8155/1 od 07.10.2020.godine, sa rokom izrade od 5 mjeseci u iznosu od 53.600,00€.
- Za vršenje stručne revizije sklopljen je ugovor sa preduzećem „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“ ad Podgorica br. 01-334/20-8788 od 23.10.2020.

godine.

- U toku je revizija glavnog projekta. Revident je tražio saglasnost od Uprave za saobraćaj.
- Problematika: Nema je.

Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, Herceg Novi

- Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti proces javne nabavke za odabir ponuđača za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, procijenjene vrijednosti 4.897.170,00 € bez pdv-a. Takođe, u narednom periodu će biti pokrenuti procesi revizije i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.5. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, za realizaciju projekta "Toplifikacija Pljevalja", za čista i topla Pljevlja-izgradnja magistralnog toplovoda od TE Pljevlja do grada" u januaru 2022. godine potpisan je emorandum o razumijevanju između Opštine Pljevlja, Elektroprivrede Crne Gore i Uprave za Kapitalne projekte kojim se definiše namjera svih strana da učestvuju u realizaciji projekta.
- U martu je Elektroprivreda Crne Gore je oformila radnu grupu za praćenje realizacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Elektroprivrede CG, Opštine Pljevlja i Uprave za kapitalne projekte
- Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2022. godine, nakon sprovedene procedure javne nabavke, ugovorila izradu projektne dokumentacije za kompletan primarni toplovod i izvođenje radova na prvoj dionici toplovoda u dužini od cca 2,3km, po principu "projektuj i izgradi". U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Potpisan je ugovor sa EPCG po principu „projektuj i izgradi“ za izradu glavnog projekta kompletnog centralnog toplovoda i izgradnju prve dionice u dužini od cca 2,3 km.
- U toku je izrada projektne dokumentacije. Završena je i revidovana projektna dokumentacije I faze u dužini od 2,3 km.
- Javno nadmetanje za Izvođenje radova na izgradnji II I III faze primarnog toplovoda od TE Pljevlja do grada u dužini od cca 4km raspisano je u decembru 2024. godine procijenjene vrijednosti 7.346.116,8 bez pdv-a i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. i u toku je procedura zaključivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanje za izbor izvođača radova.
- U 2024. godini realizovano je 48.326,42€.
- Problematika: Nema je.

3.6. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Uprava za kapitalne projekte će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.7. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica

- Na osnovu dostavljenog revidovanog glavnog projekta od strane Opštine Herceg Novi, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabaku za odabir najpovoljnijeg Izvođača i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-677/1 sa izvođačem „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.02.2023. godine, na iznos od 9.769.992,03€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 14.03.2022. godine, ugovor br. 014-334/23-1501/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.03.2023. godine, procjenjene vrijednosti 118.580,00€.
- Izvođač je uveden u posao 07.04.2023. godine.
- U toku realizacije projekta je došlo do izmjene projekta u dijelu izmjene položaja jednog od rezervoara. Opština Herceg Novi je pripremila i dostavila izmijenjeni projekat.
- U 2024. godini je realizovano 561.352,16€.
- Problematika: Nema je.



3.8. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu

- Krajem oktobra 2022. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir Izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opštini Kolašin po principu „projektuj i izgradi”, kao i za vršenje stručnog nadzora početkom novembra 2022. godine. Nije bilo pristiglih ponuda za odabir Izvođača radova i vršenje stručnog Nadzora. Upućen je dopis Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sagledavanje vrijednosti predmetnog projekta.
- Sa privrednim društvom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je ugovor br. 01-

334/22-4882/1 od 14.11.2022. godine, na iznos od 5.916,90 za reviziju tehničke dokumentacije.

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi ponovno raspisali javno nadmetanje za odabir izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u opštini Kolašin po principu „projektuj i izgradi”.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.9. Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom

- Uprava za kapitalne projekte je 23.12.2022. godine raspisala je javno nadmetanje za odabir izvođača radova na završetku radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom. Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022.
- Ugovor br. 01-334/23-4125/1 sa izvođačem radova „Integer Smart solution“ d.o.o. Tivat, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 717,694.56€.
- Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.07.2023. godine na iznos od 14,338.5€.
- Svi radovi su završeni i predati korisniku.
- U 2024. godini realizovano je 256.861,83€.

3.10. Izgradnja centra za prihvatanje životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.11. Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze

- U 2022. godini u cilju realizacije predmetnog projekta zaključen je Ugovor o realizaciji sa Opštinom Tuzi na iznos od 72.013,75 €.
- Opština Tuzi je zaključila aneks 1 ugovora o Projektu očuvanje životne sredine, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 1.738,801.00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.12. Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja



- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4427/1 sa izvođačem konzorcijumom „Fidija“ d.o.o. Podgorica, „Ving“ d.o.o. Pljevlja, „Milanović tretman voda“ d.o.o. Kragujevac, Kolektor Sisteh Sistemi in tehnologije d.o.o. Ljubljana, zaključen je 28.07.2023. godine na iznos od 4.790.245,61€.
- Ugovor br. 01-334/23-3864/1 sa stručnim nadzorom „Ding“ d.o.o. zaključen je za izvođenje pripremnih radova na izgradnji postrojenja Pliješ 03.07.2023. godine, na iznos 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-5304/1 sa stručnim nadzorom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 83.490,00€.
- U 2024. godini realizovano je 1.184.357,32€.
- Problematika: Radovi su u zimskom periodu godine bili obustavljeni i očekuje se ponovno uvođenje izvođača u posao.
- Prijedlog rješenja: Zbog obustavljenih radova u zimskom periodu godine, izvršiće se aneks Ugovora za produženje roka.

Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog cjevovoda visoke i niske zone Pliješ – grad sa povratnim cjevovodom

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 15.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-996/1 sa „Konzorcijum Ving“ d.o.o. Pljevlja i „Permonite“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.03.2024. godine na iznos od 2.709.311€.
- Izvođač je uveden u posao 10.05.2024. godine.
- Rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Ugovor br. 01-334/24-1133/1 sa stručnim nadzorom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 08.03.2024. godine, na iznos od 53.240,00€.

- Radovi su u zimskom periodu godine su obustavljeni i očekuje se ponovno uvođenje izvođača u posao.
- U 2024. godini realizovano je 975.639,75€.

3.13. Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja

- Za potrebe izrade Glavnog projekta transfer stanice u Pljevljima, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Urbanističko tehničke uslove i projektni zadatak.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom raspisano je 28.09.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-2355/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2023. godine, na iznos od 27.104,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2277/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ingenium" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- Usled promjene zauzetosti terena, Opština Pljevlja je tražila dopunu izdatih urbanističko - tehničkih uslova od resornog Ministarstva u dijelu katastarskih parcela na kojima je planirana izgradnja objekta.
- Opština Pljevlja je izmjene urbanističko-tehničkih uslova dostavila u decembru 2023. godine.
- Završeno je Idejno rješenje na koje je saglasnost dao Glavni gradski arhitekta, u toku je izrada glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.14. Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić

- Na osnovu dostavljenog projekta od strane Opštine Nikšić, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 30.12.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4941/1 sa izvođačem radova "Ferc" d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.08.2023. godine na iznos od 24.560,58€.
- Ugovor br. 01-334/23-2617/1 sa stručnim nadzorom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.05.2023. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 400,00€.

3.15. Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevice

- U oktobru 2023. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova procijenjene vrijednosti 145.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1134/1 sa izvođačem radova „Geotin MNE“ d.o.o. i „Eurozox“ d.o.o. zaključen je 08.03.2024. godine na iznos od 174,499.88€.
- Ugovor br. 01-334/23 -7393/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U 2024. godini isplaćeno je 34.899,98€ (avans).
- Problematika: U toku je usaglašavanje projektne dokumentacije vodovoda Konjuhe sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno cjevovodom mini hidroelektrane.
- Prijedlog rješenja: Rješavati u koordinaciji sa projektantom i predstavnicima Opštine Andrijevice.

3.16. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići



- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir ponuđača koji će izvršiti nabavku opreme i instalaciju iste. Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, uslijedila je žalba Državnoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U međuvremenu je protiv odluke Državne komisije pokrenut upravni spor.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2024. godine ponovo pokrenula postupak javne nabavke za odabir dobavljača i instalatera opreme procijenjene vrijednosti 2.470.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/24-4130/1 sa „Marex technology“ d.o.o. Beograd, zaključen je 22.07.2024. godine na iznos od 2.987.019,31€.
- Prema inicijativi od strane Opštine Budva, Uprava za kapitalne projekte je sklopila aneks ugovora sa izvođačem radi nabavke nepredviđenih – dodatnih roba, radova i usluga, br. 01-334/24-7083/1 od 18.12.2024. godine, sa inoviranom vrijednošću na iznos od 3.566.125,31 sa pdv-om.
- Radovi na ugradnji opreme završeni su u februaru . godine, a u martu je izvršena funkcionalna proba objekta.
- U toku je kompletiranje dokumentacije pred okončanu situaciju.
- U 2024. godini utrošeno je 968,00€.
- Problematika: Nema je.

3.17. Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.18. Rekonstrukcija primarne vodovodne atmosfnerske kanalizacije u Kolašinu

- U 2017. godini Uprava za kapitalne projekte je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor u okviru projekta "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija" sa COWI A/S Danska, dana 16.12.2020. godine (Identification number Europe Aid/139893/IH/SER/ME), čiji je Glavni koordinator i Korisnik potpisanog Ugovora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u okviru kojeg se realizuje i izrada Glavnog projekta kanalizacione mreže u Kolašinu.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula tendersku proceduru za odabir revidenta glavnog projekta br. 01 – 17/22 od 09.03.2022. godine. Na osnovu toga ugovor br. 01-334/22 – 3631/1 sa revidentom „Civil engeneer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.09.2022. godine na iznos od 5.082,00€.
- Revident je krajem maja 2024. godine prihvatio glavni projekat i očekuje se dostava kompletne dokumentacije na način definisan ugovorom.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.19. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m



- Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena revidovana elektronska tehnička dokumentacija.
- Za odabir izvođača radova Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje 20.04.2023. godine, procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Nije bilo pristiglih

ponuda.

- Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-7881/1 sa privrednim društvom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, od 17.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Uprava za kapitalne projekte je ponovo raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova, s uvećanom procijenjenom vrijednosti od 180.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01 – 334/24 – 3368/1 po zajedničkoj ponudi „Nicos Cop“ d.o.o. Berane i „Vigoris Ecotech“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.06.2024. godine na iznos od 216,450.44€.
- U 2024. godini isplaćeno je 187.551,56€.
- Problematika: U toku je izvođenje radova, odnosno usklađivanje izvođenja radova na predmetnom kolektoru sa izvođenjem radova na izgradnji obaloutvrde.
- Prijedlog rješenja: U koordinaciji sa projektantom rešavati naredne korake.

3.20. Vodovod “Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje

- U 2024. godini Opština Rožaje je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, te hje Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-944/1 sa izvođačem radova “Vik” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.02.. godine na iznos od 448.183,36€.
- Ugovor br. 01-334/25-890/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Mecmex-arhitects” d.o.o. Rožaje, zaključen je 24.02.. godine na iznos od 6.050,00€.
- Radovi na ovom projektu će otpočeti kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.21. Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko

- Opština Plužine je dostavila projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Uprava je u novembru 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova I faze za naselja Borkovići – Dubljevići. Ugovor br. 01-334/23-7388/1 za vršenje stručnog nadzora za I fazu vodovoda Borkovići Dubljevići, sa privrednim društvom „Diagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-2569/1 sa izvođačem radova „Vigoris Ecotech“ d.o.o. Podgorica zaključen je 13.05.2024. godine i aneks ugovora br. 01-334/24-3030/1 od 29.05.2024. godine, na iznos 198.838,33€.
- Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Borkovići Dubljevići otpočelo je sredinom 2024. godine, na I fazi vodovoda, a usljed nepovoljnih vremenskih okolnosti privremeno je obustavljeno. Takođe, planirani je raspisivanja javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za II fazu izgradnje predmetnog vodovoda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izgradnju vodovoda i rezervoara u selu Goransko raspisano je u oktobru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 460.000,00€ bez pdv-a. Prvo javno nadmetanje je poništeno, a ponovo raspisano u oktobru i donijeta je odluka o izboru najpovoljnije ponude.
- Za vršenje stručnog Nadzora potpisan je Ugovor br. 01–334/25–1192/1 od 12.03.. godine sa privrednim društvom N&B inženjering i Konsalting d.o.o. Nikšić, na iznos od 11.676,50€.
- U 2024. godini realizovano je 135.585,30€.
- Problematika: Nema je.

3.22. Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođač radova na rekonstrukciji vodovoda u opštini Petnjica raspisano je u decembru 2024. godine i isto je poništeno zato što nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-816/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je 20.02.. godine na iznos od 13.854,5€.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.23. Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću

- Opština Nikšić je dostavila urbanističko-tehničke uslove i projektni zadatak na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje gradskog vodovoda u Nikšiću 18.10.2023. godine, procijenjene vrijednosti 300.000,00€.
- Raspisano je javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta 29.12.2023. godine, procijenjene vrijednosti 50.000,00€.
- Ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/24-1544/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije “Civil engeneer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.03.2024. godine na iznos od 213.444,00€, sa rokom izrade 7 mjeseci od dana dobijanja pozitivnog izvještaja o reviziji elaborata o geotehničkim svojstvima terena.
- Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta br. 01-334/24-2831/1 sa “Projectman” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.05.2024. godine na iznos od 59.290,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Projektant ne prati ugovorenu dinamiku izrade projektne dokumentacije i tvrdi da nije dobio sve ulazne podatke od strane Vodovoda Nikšić.
- Prijedlog rješenja: Organizacija sastanka sa svim relevantnim učesnicima u projektu.

3.24. Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevica – sekcija II

- Opština Andrijevica je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je tokom 2023. godine u više navrata raspisivala javno nadmetanje za odabir izvođača radova, u skladu sa inoviraniom specifikacijom – obimom radova, dostavljenim od strane Korisnika – Opština Andrijevica procijenjene vrijednosti 145.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01 – 334/24 – 2733/1 sa privrednim društvom „Inženjer Gogić” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.05.2024. godine na iznos od 155.229,69€.
- Ugovor br. 01-334/23-7391/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je od 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Izvođač je uveden u posao krajem septembra 2024. godine, a radovi su obustavljeni u decembru.
- U toku je usaglašavanje aktivnosti u koordinaciji sa opštinom Andrijevica, u cilju realizacije predmetne faze izgradnje vodovoda i pripreme predmjera za narednu fazu – rezervoara.
- U 2024. godini isplaćeno je 68.903,91€.

- U . godini ukupno je realizovano 13.023,23€.
- Problematika i prijedlog rješenja: U koordinaciji sa projektantom i predstavnicima Opštine Andrijevica rješavaju se sporna pitanja.

3.25. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta “Merića Vrelo”, Berane

- Opština Berane je u januaru 2024. godine dostavila je Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6305/1 sa izvođačem radova “Flowmax” d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.11.2024. godine na iznos od 4.828.035,14€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4996/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 118.096,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

3.26. Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane

- U 2023. godini Opština Berane dostavila je Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/24-1992/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.04.2024. godine na iznos od 9,546.90€.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-724/1 sa izvođačem radova „Gold grading” d.o.o. Berane, zaključen je 17.02. godine na iznos od 553.622,11€.
- Uvođenje izvođača u posao planirano je nakon poboljšanja vremenskih uslova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Trasa cijevi se poklapa sa trasom infrastrukture „Telekoma”.
- Prijedlog rješenja: Planirati zajednički obilazak trase sa predstavnicima „Telekoma” i donijeti odluku.

3.27. Sanacija odlagališta Zakršnica

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi za kapitalne projekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
- Izvršena je Izmjena glavnog projekta na osnovu ugovora br. 01-334/22-4931/1 od 15.11.2022.godine kao i revizija izmijenjenog glavnog projekta, ugovor br. 01-334/22-4957/1 od 16.11.2022.godine. Potreba za izmjenom glavnog projekta javila se usljed promjene količina na samom odlagalištu od perioda izrade projekta do raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa konzorcijumom, „Gradnja inženjering MNE” i „Trisoplast Mineral Liners” je zaključen 06.04.2023. godine, na iznos od 4.228.330,05 €.


- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.03.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-2779/1 sa stručnim nadzorom, "Arhiplan CG" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.05.2023. godine, na iznos 83.490,00 €.
- Radovi su počeli 08.06.2023. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Mojkovac.
- Aneks 1 ugovora br. 01-334/25-5528/2 je zaključen 03.10.2024. godine kojim se produžava rok za završetak radova do 01.07..godine.
- Zbog tehnologije građenja, ne mogu se izvoditi radovi na zatvaranju deponije u zimskom periodu, a nastavak izvođenja radova po inoviranom dinamičkom planu planiran je za 01.05.. godine.
- U 2024. godini realizovano je 1.526.546,93€.
- Problematika: Nema je.



3.28. Izgradnja transfer stanica u Andrijevići

- Objekat transfer stanice u Andrijevići je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada. Projektni zadatak je potpisala opština Andrijevića.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-7447/1 sa revidentom glavnog projekta, "Arhiplan Crna Gora" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8493/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8146/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00€.

- Radovi su počeli 2019. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Andrijevica.
- Završeni su radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
- Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
- Zbog pojave nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni poremećaj cijena roba i usluga i nemogućnost usklađivanja ugovorene cijene sa budžetskim prilikama naručioca i izvođača, zaključen ugovor za izvođenje radova je sporazumno raskinut u prvoj polovini 2023. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za preostale radove raspisano je 20.04.2023.godine. Kako nije bilo pristiglih ponuda, javno nadmetanje će biti ponovljeno kada se za to stvore uslovi.
- Ponovljeno javno nadmetanje za preostale radove raspisano 28.07.2023.godine. Ugovor br. 01-334/235750/1 sa izvođačem, "BB Solar" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.10.2023. godine, na iznos od 730.834,98€.
- Izvođač je uveden u posao 06.11.2023. godine.
- Ugovoreni radovi završeni su u julu 2024. godine i objekat predat Korisniku - Opština Andrijevica.
- U 2024. godini realizovano je 648.082,58€.
- Problematika: Objekat nije pušten u rad jer nema tehničke mogućnosti za priključenje na električnu mrežu.
- Prijedlog rješenja: Opština Andrijevica je pokrenula aktivnosti sa CEDIS-om na obezbjeđenju elektroenergetske infrastrukture.

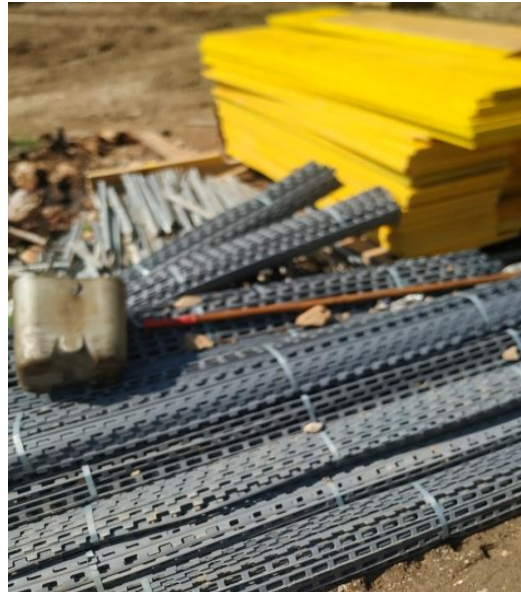

3.29. Izgradnja kanalizacione mreža na Vranjini, Podgorica

- Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine obuhvata kolektore fekalnog kanalizacionog sistema kroz naselje Vranjina, pumpnu stanicu za prempupavanje otpadnih voda i potisni cjevovod do PPOV.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1978/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis system” d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.03.2020. godine, na iznos od 8.833,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.06.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4799 sa revidentom glavnog projekta, „Sedam ing” d.o.o. Podgorica, je zaključen

25.06.2020. godine, na iznos od 3.872,00€.

- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- U 2021. godini glavni projekat je upućen Glavnom gradu Podgorica na mišljenje, kao nosiocu prava svojine kojim je trasiran kolektor.
- Putem jednostavne nabavke raspisan je tender za odabir stručnog nadzora, procijenjena vrijednost jednostavne nabavke je 8.000€.
- Za odabir izvođača radova raspisano je javno nadmetanje 09.02.2022. godine, procijenjena vrijednost javne nabavke je 236.200,00€.
- Odluka o izboru najbolje ponude donešena je 06.06.2022. godine na osnovu koje je uložena žalba. Na osnovu rješenja o žalbi, donešena je nova odluka o izboru najpovoljnije ponude 23.11.2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-1921/1 od 31.03.2023. godine potpisan je sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, na iznos od 283.466,44€.
- Ugovor o stručnom nadzoru br. 01-334/23-2276/1 potpisan je sa „Ding“ d.o.o. Podgorica na iznos od 3.327,50€.
- Izvođač je uveden u posao 13.10.2023. godine.
- Svi radovi su završeni. Primopredaja objekta je izvršena 08.05.2024. godine.
- U 2024. godini je realizovano 183.327,59€.

3.30. Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje

Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice-II faza

- Budući da je Opština Bijelo Polje sklopila Ugovor za izvođenje radova za I fazu izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta Banjica, kao i da je jedan dio radova izveden, Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena elektronska verzija revidovane projektne dokumentacije. U drugoj polovini 2022. godine je sa Opštinom Bijelo Polje usaglašavan obim radova naredne faze. Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-3006/1 od 24.05.2023. godine na iznos od 7.900,00 eura bez pdv-a sa privrednim društvom "Projectman" d.o.o. Podgorica
- Za odabir izvođača radova II faze raspisano je javno nadmetanje 05.05.2023. godine. Ugovor br. 01 – 334/23 – 6008/1 sa izvođačem "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.10.2023. godine na iznos od 748.879,859 € bez pdv-a.
- Izvođač je uveden u posao 27. 11.2023. godine. Radovi su izvođeni do kada su vremenski uslovi to dozvoljavali. Izvođenje radova je pratila problematika izmještanja podzemnih instalacija koji nise nisu bile prepoznate, ukrštanje sa izvođenjem radova na izgradnji puta Gubavač – Bistrica, imovinsko pravni problemi i slično.
- U 2024. godini realizovano je 116.228,30€.
- Problematika: U toku su aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i usklađivanja aktivnosti sa izvođenjem radova na izgradnji puta Gubavač-Bistrica.
- Prijedlog rješenja: Rješavati u koordinaciji sa projektantom i predstavnicima Opštine Bijelo Polje.

3.31. Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija, međutim, dostavljeni projekat nije usklađen sa eurokodovima. Čeka se dotavljanje usklađenog projekta od strane Opštine Žabljak, kako bi uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.32. Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U . godini ukupno je realizovano 9.655,00€.
- Problematika: Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.
- Predlog rješenja: Uprava za kapitalne projekte je pristupila usklađivanju projektne dokumentacije u skladu sa izmijenjenom zakonskom regulativom.

3.33. Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.34. Unaprjeđenje vodovodnog Sistema “Višnjica” i “Velja Gora”, Prijestonica Cetinje

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Prijestonica Cetinje je preuzela dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.35. Izgradnja Sistema vodosnadbijevanja

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte po prioritetima ministarstva. Projektom su obuhvaćeni podprojekti izgradnje sistema vodosnadbijevanja, kanalizacionih mreža i postrojenja za tretman otpadnih voda, sanacije nesanitarnih odlagališta otpada i izgradnja deponij kao i projekti: Vodosnadbijavanje II faza Žabljak; Zaštita vodoizvorišta Opačica, Herceg Novi; Nabavka i ugradnja opreme za potrebe vodovoda Ćosovsko vrelo, Rožaje; Izrada tehničke i projektne dokumentacije i studija za uređenje vodosnadbijevanja s selima Prnjavor i Bogajiće, Plav. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 385.491,86€.

Izvođenje radova na izradu vodovoda za naselje Razvršje I faza Žabljak

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5015/1 sa „Temko” d.o.o. Nikšić, zaključen je 06.09.2024. godine na znos od

252.588,53€.

- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5150/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.09.2024. godine na iznos od 7.108,00€.
- Radovi su konzervirani u zimskom periodu. Izvođač će biti ponovo uveden u radove kada se za to budu stekli povoljni vremenski uslovi.
- U 2024. godini realizovano je 150.031,68€.
- Problematika: Nema je.

Nabavku i ugradnju SCADA sistema na vodovodnom sistemu opštine Žabljak

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6408/1 sa „Vik“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.11.2024. godine na iznos od 192.976,85€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5120/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.09.2024. godine na iznos od 11.858,00€.
- U toku su aktivnosti na pripremi javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze.
- U 2024. godini realizovano je 38.595,37€.
- Problematika: Nema je.

Izgradnja vodovoda u naselju Mljetičak i Dobra sela, Opština Šavnik

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Šavnik.
- Ugovor br. 01-334/23-6198/1 sa izvođačem „Ekspert M“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.10.2023. godine na iznos od 362.940,82€.
- Ugovor br. 01-334/23-4889/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Izvođač je uveden u posao 17. novembra 2023. godine. Javno nadmetanje za odabir izvođača radova III faze raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 460.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nazora III faze raspisano je u novembru 2024. godine i isto je u toku.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova III faze.
- U 2024. godini realizovano je 165.950,73€.
- Problematika: Nema je.

Nabavka i ugradnja opreme za potrebe vodovoda Ćosovsko vrelo, Rožaje

- Javno nadmetanje je raspisano u junu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 24.660,00€ bez pdv-a, i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5101/1 sa „Vik“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.09.2024. godine na iznos od 29.463,5€.
- Oprema za hlorinatorsku stanicu predata je krajnjem Korisniku – Opštini Rožaje.
- U 2024. godini realizovano je 27.043,50€.

Izvođenje radova na adaptaciji vodovodne mreže u MZ Milješ, opština Tuzi

- Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je u aprilu 2024. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 950.000,00€ bez pdv-a. Donesena je odluka za odabir izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine.

Ugovor br. 01-334/24-7399/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.12.2024. godine na iznos od 15.730,00€.

- Donesena je odluka za izbor izvođača radova, na koju je uložena žalba.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

POTPROGRAM

**3. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ODRŽIVI
RAZVOJ**

3.36. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.

- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- **Kanalizaciona mreža**
- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana

vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.

- Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.



3.37. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
- Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S“, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€ sa inicijalnim rokom implementacije od 36 mjeseci.
- Aneks kojim se produžava rok implementacije i kojim se definisane nove aktivnosti je potpisan 28.05.2024. godine. Rok implementacije je produžen do 21.12.2024. godine.
- U toku su finalne aktivnosti.
- Do sada je realizovano tokom implementacije 2.587.200,00€.

3.38. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.
- Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
- Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
- Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Aneks broj 5 ugovora potpisan je 20.12.2022. godine i odnosi se na produženje ugovorenog roka do 30.04.2023. bez povećanja ugovorene vrijednosti, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je šesti šestomjesečni izvještaj.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
- Aneks broj 6 ugovora potpisan je 18.05.2023. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta, povećanje ugovorene vrijednosti na 3,535,135.00 € i produženje roka implementacije do 14.07.2024. godine.
- Aneks broj 7 ugovora potpisan je 06.06.2024. godine i odnosi se na smanjenje ugovorene vrijednosti na 3.535.105,00€ i produženje roka implementacije do 30.11.2024. godine.
- Implementacija je uspješno završena. U toku su aktivnosti oko finalnog plaćanja.
- Do sada je realizovano 3.027.042,97€.

3.39. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave za kapitalne projekte vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
- Avansna uplata koja je bila previđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
- U decembru 2022. godine, za dva ugovora dostavljeni su konačni izvještaji.
- U periodu od januara do juna 2023. godine šest grant ugovarača (KOD, Gorica, Expeditio, MES, CZIP, ISSP) je dostavilo konačne izvještaje i ujedno zahtjeve za finalna plaćanja.
- Nakon odobrenja finalnih izvještaja, sve aktivnosti na ugovorima su završene.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.40. Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija

- Projekat se realizuje u sklopu IPA III, AAP 2021 programa. Realizuje se kroz tri zasebne tenderske procedure: „Podrška u uspostavljanju EIONET sistema“, „Podrška u uspostavljanju INSPIRE sistema“ i „Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju zahtjeva iz Poglavlja 27 iz EU Acquis i povezanih jačanja kapaciteta“.
- Ugovor za projekat „Podrška u uspostavljanju EIONET sistema“ je potpisan 25.03. godine
- Tenderska dokumentacija za projekat „Podrška u uspostavljanju INSPIRE sistema“ je u fazi izrade.
- Tenderska dokumentacija za Projekat „Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju zahtjeva iz Poglavlja 27 iz EU Acquis i povezanih jačanja kapaciteta“ je dostavljena EU Delegaciji na kontrolu i odobravanje.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

3.41. Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je početkom 2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat „Doprinos uspostavljanja NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori“.
- Nakon obrade navedene dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte, je istu proslijedila Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na kontrolu i odobrenje.
- Dio tenderske dokumentacije je odobren i javno objavljen na eTED sajtu tokom aprila 2023. godine, rok za dostavljanje aplikacija je bio 05.06.2023. godine, nakon čega će se pristupiti otvaranju i vrednovanju pristiglih aplikacija za prvu fazu tenderskog postupka.
- Nakon uspješno završene prve faze i odobrenja preostalog dijela tenderske dokumentacije 14.12.2023. godine je otpočeo rad evaluacione komisije za drugu fazu postupka.
- Evaluacioni izvještaj je odobren od strane EU Delegacije, čime su se stekli uslovi za potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
- Ugovor je potpisan 10.05.2024. godine na iznos 1.290.000,00€ sa kompanijom „Eptisa SouthEast Europe“.
- U toku su početne aktivnosti na realizaciji ugovora.
- U 2024. godini realizovano je 517.071,89€.

3.42. Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 21.06.2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat „Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme“ na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.
- Tender za odabir dobavljača opreme je sproveden. Kako nije bilo tehnički ispravnih ponuda, isti je poništen.
- Očekuje se da Ministarstvo ekologije sprovede aktivnosti na izradi adekvatne tenderske dokumentacije, kako bi se sprovele aktivnosti na ponovnom raspisivanju tendera.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

**IV. PROGRAM
 ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

POTPROGRAM

4. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA
--

4.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika Klinički centar Crne Gore, pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
- Projektna dokumentacija je revidovana u novembru 2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 06.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa izvođačem, "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 726.000,14 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br.01-334/23-2618/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.05.2023. godine, na iznos 9.655,8 €.
- U toku je procedura izmjene i dopune projektne dokumentacije u skladu sa zakonom i potrebama korisnika.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa trenutnim stanjem na objektu i specifičnih zahtjeva korisnika tokom izvođenja radova, radovi na objektu su obustavljeni.
- Prijedlog rješenja: Dopuna tehničke dokumentacije i usaglašavanje dinamike izvođenja sa korisnikom.

4.2. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo revidovani glavni projekat.
- Objekat Klinike za mentalno zdravlje je spratnosti suteran, prizemlje i dva sprata. Ukupna bruto površina objekta sa suteranom iznosi 3 564,76 m².
- U suteranu su organizovani sljedeći sadržaji: tehničke prostorije, pomoćne prostorije i prostorije za skladištenje.
- Od sadržaja na nivou prizemlja planiran je dječija psihijatrija i poliklinički (ambulantni dio) koji obuhvata 4 ljekarske prostorije u kojima se vrši pregled pacijenata, kao i administrativne prostorije sa kancelarijama direktora klinike, glavne sestre i ostalog medicinskog osoblja.
- Od sadržaja na nivou prvog sprata planirano je odjeljenje za psihotičke poremećaje i odjeljenje za afektivna i granična stanja. Osim soba na ovom odjeljenju planiran je dnevni boravak za pacijente, prostorije za medicinsku sestru, prijemna ambulanta, soba za posjete i ambulanta za davanje terapija.
- Drugi sprat je posljednja etaža klinike na kojoj je planirano odjeljenje za bolesti zavisnosti i dnevna bolnica za parcijalnu hospitalizaciju, odnosno boravak pacijenata od 07-15h nakon čega će odlaziti kući.



- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2027/1 sa izvođačem, IGP „Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2022. godine, na iznos od 7.250.502,72 €.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/22-2606/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2022. godine, na iznos od 63.888,00€.
- Radovi su otpočeli krajem jula 2022. godine, a objekat je predat na upotrebu krajem septembra 2024. godine.
- U 2024. godini realizovano je 2.450.543,49€.

4.3. Rekonstrukcija i adaptacija JZU „Vaso Ćuković” Risan

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo glavni projekat adaptacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 17.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-1926/1 sa izvođačem radova, “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad zaključen je 10.05.2022. godine, na iznos od 1.397.431,72€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 21.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-4329/1 za preduzećem “Urbi.Pro” d.o.o. zaključen je 14.10.2022. godine, na iznos od 43.318,00€.
- Sa radovima se otpočelo u novembru 2022. godine. Nakon radova na demontaži i rušenju, stručni nadzor je ukazao na problematiku vezanu za neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta i zahtjevao izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcije objekta sa seizmičkim proračunom za stvarno stanje objekta. Krajnji korisnik je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja preuzeo obavezu obezbjeđenja dokumentacije koja omogućava nastavak radova na postojećem objektu.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje saobraćajnica i parking prostora ispred bolnice procijenjene vrijednosti 250.000,00€, na osnovu projektnog zadatka potpisanog od strane korisnika JZU „Vaso Ćuković”, raspisano je 23.12.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje za opremanje objekta (nabavka medicinske opreme) za 7 partija ukupne procijenjene vrijednosti 420.000,00€ bez pdv-a, raspisano je krajem decembra 2022. godine.
- Partija I: Digitalni rendgen aparat sa plafonskim vješanjem, procijenjena vrijednost 181.500,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-3623/1 sa dobavljačem, „Osmi red - D” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.06.2024. godine, na iznos od 145.200,00€.
- Partija II: Aparat za anesteziju, procijenjena vrijednost 30.250,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/1 sa dobavljačem, „Farmont M.P.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 30.250,00€.
- Partija III: Stacionarni ultrazvučni aparat, procijenjena vrijednost 60.500,00€ sa pdv-om. U avgustu je uložena žalba, a krajem avgusta komisija je usvojila istu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke donesena je u oktobru tekuće godine.
- Partija IV: Oprema za operacionu salu, procijenjena vrijednost 169.400,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/1 sa dobavljačem, „Farmont M.P.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 169.400,00€.
- Partija V: Električni bolnički krevet, procijenjena vrijednost 24.200,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/2 sa dobavljačem, „Farmont M.P.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Partija VI- Aparati za intenzivnu jedinicu, procijenjena vrijednost 26.015,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/2 sa dobavljačem, „Farmont M.P.” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 26.015,00€.
- Partija VII - Aparati za kabinet za preglede, procijenjena vrijednost 16.335,00€ sa pdv-om. Na javnom nadmetanju nije bilo podnijetih ponuda.
- Digitalni rendgen aparat isporučen i predat na korišćenje Korisniku, dok će ostali ugovori biti realizovani nakon završetka izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji JZU "Vaso Ćuković".
- Krajem juna 2024. godine je dostavljena izmijenjena i revidovana projektna dokumentacija

od strane korisnika.

- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i adaptaciji JZU "Vaso Čuković", raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6893/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 10.12.2024. godine na iznos od 344.369,8€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova, raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-411/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.01. godine, na iznos od 9.661,85€.
- Izvođač za dodatne radove je uveden u posao u februaru . godine i radovi su u toku.
- U 2024. godini realizovano je 230.392,57€.
- Problematika: Nema je.

4.4. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.
- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljeno prvorangirano Idejno arhitektonsko rješenje, Urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista je na inicijativu korisnika – Opšte bolnice Pljevlja, pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji Opšte bolnice u Pljevljima po principu „projektuj i izgradi“ raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5522/1 sa „Termomont“ d.o.o. Beograd i Igp „Fidija“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.10.2024. godine na iznos od 38.694.602,10€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije raspisano je u februaru 2024. godine procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Donesena je odluka o izboru najpovoljnije ponude krajem marta i na istu je uložena žalba.
- Nakon usaglasavanja sa Investitorom/Korisnikom, odnosno Ministarstvom zdravlja/JZU Opšta bolnica Pljevlja projektant je razradio idejno rješenje i na isto je dobijena saglasnost od strane Korisnika u februaru .godine.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U . godini realizovano je 3.177,76€.
- Problematika: Projektant je analizom konkursnog Idejnog rješenja utvrdio da planirani objekat znatno prekoračuje zadatu površinu u osnovi i ne zadovoljava zadati koeficijent zauzetosti iz urbanističko tehničkih uslova br. UP/I 05-332/20-78/6 izdatih dana 13.04.2020. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja, te predmetni objekat nije moguće projektovati prema navedenim urbanističko tehničkim uslovima.
- Predlog rješenja: Investitor/Korisnik, odnosno Ministarstvo zdravlja/JZU Opšta bolnica Pljevlja su preuzeli obavezu da pribave nove urbanističko tehničke uslove koji će biti u skladu sa PUP-om Pljevlja čija je izrada u toku, a kojim je predviđena veća zauzetost za predmetnu parcelu, čime bi omogućili projektovanje i izvođenje objekta prema konkursnom Idejnom rješenju i predstavlja osnov za dalju izradu Glavnog projekta.

4.5. Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dom zdravlja u City kvartu.
- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, Uprava je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta Doma zdravlja u City kvartu raspisano je u

avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7484/1 sa ponuđačem „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 30.12.2024. godine na iznos od 356.900,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 70.000,00€ bez pdv-a i donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke krajem marta.
- U toku je usaglašavanje tehnološkog projekta sa Investitorom/Korisnikom - Ministarstvo zdravlja i ZU Dom zdravlja Glavni grad na koji isti moraju dati pisanu saglasnost kako bi se nastavilo sa daljom izradom glavnog projekta.
- U 2024. godini je realizovano 88.865,18€.
- Poblematika: Nema je.

4.6. Rekonstrukcija objekata stare bolnice “Danilo I” na Cetinju

- Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu od strane Ministarstva zdravlja utvrđeno je da je ista nepotpuna i da nije moguće pokrenuti javne nabavke za odabir izvođača radova i stručnog nadzora.
- Ministarstvo zdravlja je preuzelo obavezu dorade projektne dokumentacije.
- Nakon dostavljanja dopunjene dokumentacije od strane nadležnih organa, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti na raspisivanju javne nabavke za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.7. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka.
- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.8. Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić

- Ministarstvo zdravlja i Opština Nikšić nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.9. Nabavka magnetne resonance – “multislice scener”

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala javno nadmetanje za nabavku magnetne resonance (MRI) za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić (partija I) i nabavku multislajsnog skenera (CT) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore (partija II). Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.930.000€ bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/1 sa dobavljačem PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, za partiju II: nabavka multislajsnog 4D skenera (CT) je zaključen 30.07.2024. godine, na iznos od 422.290,00 Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Kliničkom centru Crne Gore.
- Postupak javne nabavke za partiju I: nabavku magnetne resonance (MRI) za potrebe Opšte

bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić je poništen krajem novembra 2024. godine postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

- U 2024. godini realizovano je 422.290,00€.

4.10. Centar PET CT sa klinikom za hematologiju

- Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore su 30.05.2023. godine dostavili Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju po predmetnom projektu. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu iste raspisala 31.05.2023. godine javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta. Kako na predmetno javno nadmetanje nije podnijeta nijedna ponuda isto je poništeno, nakon čega se pristupilo ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja 07.07.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6067/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.10.2023. godine, na iznos od 96.800,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, je zaključen 09.11.2023. godine, na iznos od 14.760,79€.
- Obaveza projektanta je da na osnovu Idejnog rješenja urađenog od strane „Ing Invest” doo Danilovgrad na koje je prethodno dobijena saglasnosti korisnika – Klinički centar Crne Gore, kao i glavnog državnog arhitekta izradi Glavni projekat.
- Projektant je nakon analize postojećeg stanja objekta Klinike za onkologiju koji treba da se rekonstruiše za potrebe Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, obavijestio Upravu za kapitalne projekte i krajnjeg korisnika – Klinički centar Crne Gore, a o čemu je bilo upoznato i Ministarstvo zdravlja na prethodno održanim sastancima, o problematici na realizaciji ovog projekta.
- Dana 26.12.2023. godine projektant je putem dopisa zatražio pisanu saglasnost od strane korisnika – Klinički centar Crne Gore sa predlogom rješenja u smislu rušenja postojećeg objekta, odnosno sa totalnom rekonstrukcijom postojećeg objekta, na što je i dobijena saglasnost korisnika (dopis br. 03/01-37771/1 od 26.12.2023. godine).
- Nakon toga projektant je pristupio usaglašavanju Idejnog rješenja sa predstavnicima Kliničkog centra i ekspertima iz IAEA kako bi se uvažile sve potrebe, zahtjevi i sugestije u cilju što bolje i funkcionalnije organizacije prostora.
- Inovirano idejno rješenje na koje su dali saglasnost korisnik, kao i autor prvobitnog rješenja, u aprilu 2024. godine je poslato Državnom arhitekti na ponovni pregled i saglasnost.
- Nakon dobijanja saglasnosti Državnog arhitekta, krajem juna tekuće godine, stvorili su se uslovi za otpočinjanje aktivnosti na izradi glavnog projekta.
- U toku su završne aktivnosti na reviziji glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 48.400,00€.
- Problematika: Nema je.

4.11. Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Plav.
- Uprava za kapitalne projekte je krajem decembra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 340.000,00 € bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je ponovljeno krajem februara 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4389/1 sa izvođačem radova, „R&R Invest” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.08.2024. godine na iznos od 530.994,88€.
- Ugovor br. 01-334/24-1993/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civi engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.04.2024. godine na iznos od 9.425,90€.
- Radovi na ovom projektu otpočeli su 2024. godine. Do sada su završeni radovi na temeljnoj konstrukciji, a zbog nastupajućeg zimskog perioda prekinuti su u novembru 2024. godine i isti će biti nastavljani kada se stvore povoljni vremenski uslovi.

- U 2024. godini realizovano je 36.559,82€.
- Problematika: Nema je.

4.12. Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Ulcinj.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2022. godine objavila javno nadmetanje za odabir izvođača radova čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000,00 € bez pdv-a, koje je u junu poništeno iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.
- Nakon povećanja procijenjene vrijednosti radova od strane projektanta na iznos od 390.000,00 € bez pdv-a, raspisano je novo javno nadmetanje u novembru 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2505/1 sa izvođačem „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 411.399,98 € sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-3158/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 14.459,50€.
- Radovi su otpočeli početkom juna 2023. godine i isti su ubrzo obustavljeni zbog zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone i prisustva instalacija na lokaciji koja je predviđena za dogradnju objekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U . godini realizovano je 487,29€.
- Problematika: Stručni nadzor i izvođač radova su zajednički konstatovali da na osnovu postojeće projektne dokumentacije nije moguće nastaviti i završiti radove na dogradnji Doma zdravlja u Ulcinju.
- Prijedlog rješenja: Korisnik - Dom zdravlja Ulcinj je dostavio Upravi za kapitalne projekte dopunjenu projektnu dokumentaciju, te su stvoreni uslovi za nastavak izvođenja radova.

4.13. Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koji je potpisalo i dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-1172/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.02.2023. godine, na iznos od 36.300,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Projektnom dokumentacijom je obuhvaćena adaptacija 56 osnovnih i srednjih škola za potrebe stomatoloških ambulanti i to u opštinama: Andrijevića, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje, Šavnik, Tivat, Tuzi i Ulcinj.
- Nakon što je završena izrada i revizija glavnog projekta pristupilo se raspisivanju javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova na adaptaciji stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednosti 880.000,00€ bez pdv-a, je na zahtjev Ministarstva zdravlja raspisano krajem oktobra 2023. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova ponovljeno je u februaru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4390/1 sa izvođačem radova „Cema” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.08.2024. godine na iznos od 1.203.815,58€.
- Javno nadmetanje za odabir vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor 01-334/24-5417/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.09.2024. godine na iznos od 58.927,00€.
- Krajem novembra 2024. godine, nakon obavještenja od strane Ministarstva zdravlja da su se stekli uslovi za uvođenje izvođača u posao, otpočelo se sa izvođenjem radova i isti su u

toku.

- U 2024. godini realizovano je 240.763,11€.
- Problematika: Nije moguće izvoditi radove u svih 56 škola.
- Predlog rješenja: Problematiku rješava Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

4.14. Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koje je potpisala JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, a dostavilo Ministarstvo zdravlja, raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-3633/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 19.06.2022. godine, na iznos od 93,589.87€.
- Ugovor br. 01-334/23-6407/1 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, zaključen je 06.11.2023. godine, na iznos od 15.365,79 €.
- U prethodnom periodu sprovedene su aktivnosti na usaglašavanju idejnog rješenja sa stvarnim stanjem na terenu i potrebama Korisnika.
- Konačno usaglašeno idejno rješenje je u martu 2024. godine dostavljeno Državnom arhitekti na saglasnost.
- Nakon dobijanja saglasnosti Glavnog državnog arhitekta stvorili su se uslovi da projektant u avgustu 2024. godine otpočne izradu glavnog projekta.
- Nakon dobijanja saglasnosti Glavnog državnog arhitekta projektant je započeo izradu glavnog projekta.
- U toku su aktivnosti na reviziji glavnog projekta.
- Upravi za kapitalne projekte je u 2024. godini od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Bijelo Polje dostavljena projektna dokumentacija za sanaciju krova bolnice u Bijelom Polju.
- Javno nadmetanje za izvođenje radova procijenjene vrijednosti 402.000,00€ bez pdv-a raspisano je u avgustu 2024. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon dostavljanja inovirane projektne dokumentacije od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Bijelo Polje, ponovo je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova u decembru 2024. godine. Ugovor 01-334/25-1169/ sa "Volvox materials&construction" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.03.. godine na iznos od 725.979,31€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor 01-334/25-1196/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Sistem-mne” d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.03.. godine na iznos od 9.922,00€.
- U toku su pripremne aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2024. godini realizovano je 46.794,93€.
- Problematika: Nema je.

4.15. Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi-opšta Bolnica Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za izvođenje radova. Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 20.04.2023. godine na iznos od 525,868.49 €.
- Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa stručnim nadzorom, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine na iznos od 9,655.80€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine, a završeni su u septembru iste godine i objekat je predat na upotrebu.

- U 2024. godini realizovano je 68.665,14€.



4.16. Adaptacija Doma zdravlja Budva

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Budva krajem 2023.godine raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 850.000.00 bez pdv-a
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude donešena je krajem marta tekuće godine, na koju je uložena žalba i postupak je poništen u junu mjesecu.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-82/1 sa „Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 14.01.. godine na iznos od 1.123.424,48€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3429/1 sa stručnim nadzorom „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.06.2024. godine na iznos od 15,651.35€.
- Izvođač je uveden u posao krajem marta . godine.
- U 2024. godini realizovano je 400,00€.
- Problematika: Nema je.

4.17. Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama

- Uprava za kapitalne projekte je je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 09.12.2022. godine javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.
- Ugovor br. 01-334/23-1497/1 sa izvođačem radova „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 13.03.2023. godine na iznos od 861,828.51€.
- Ugovor br. 01-334/23-2818/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 17,194.10€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine, a završeni su u avgustu iste godine i objekat je predat na upotrebu.
- U 2024. godini realizovano je 424.435,39€.
- Problematika: Nema je.

4.18. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini realizovano je 30.571,89€.

4.19. Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.20. Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju

- Uprava za kapitalne projekte je krajem avgusta 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju procijenjene vrijednosti 296.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije bilo ispravnih ponuda.
- Javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4931/1 sa dobavljačem "Inter pharm" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.09.2024. godine na iznos od 358.160,00€.
- U toku je realizacija ugovora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

4.21. Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi

- Uprava za kapitalne projekte je sredinom oktobra 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, po partijama, ukupne procijenjene vrijednost 642.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/1 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju II: Automatski brojač rezidualnih leukocita je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 58.927,00€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/2 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju III: Oprema za kolekciju i procesiranje jedinica krvi je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 234.800,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/2 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju IV: Aparati za suvo otapanje krvnih komponenti je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 234.800,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-2095/1 sa dobavljačem, „Famegra” d.o.o. Podgorica, za partiju V: Uređaj za automatsku izolaciju DNK sa automatskim uzimanjem uzorka pune krvi iz epruveta vakutajner sistema je zaključen 23.04.2024. godine, na iznos od 57.830,99€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1809/1 sa dobavljačem, „Medica” d.o.o. Podgorica, za partiju VI: Real-time qPCR analizator. je zaključen 10.04.2024. godine, na iznos od 29.221,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi
- Ugovor br. 01-334/24-1982/1 sa dobavljačem, „Farmalab” d.o.o. Podgorica, za partiju VII -

Thermal Cyclor je zaključen 10.04.2024. godine, na iznos od 17.363,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi

- Donešene su odluke o poništenju postupka javne nabavke za partiju I: Centrifuga za izdvajanje krvnih komponenti, partiju VIII - Sistem za horizontalnu elektroforezu i partiju IX: Oprema za banku matičnih ćelija.
- Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi - Oprema za banku matičnih ćelija raspisano je ponovo 30.04.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5651/1 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2024. godine, na iznos od 198.433,95€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi - Centrifuga za izdvajanje krvnih komponenti ponovo je raspisano 18.11.2024. godine.
- U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora.
- U 2024. godini realizovano je 651.995,44€.
- Problematika: Nema je.

4.22. Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koje je dostavio Zavod za hitnu medicinsku pomoć krajem oktobra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju, procijenjene vrijednosti 500.000,00 € bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-3814/1 sa izvođačem radova “Refena” d.o.o. Podgorica, zaključen je 05.07.2024. godine na iznos od 678.576,65€.
- Ugovor br. 01-334/24-3516/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 20.06.2024. godine na iznos od 21.780,00€.
- Radovi su u završnoj fazi, osim radova u Bijelom Polju. Korisnik je Upravi za kapitalne projekte dostavio neophodnu dopunjenu projektну dokumentaciju. U toku je utvrđivanje obima posla i statusa ugovora sa izvođačem radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U . godni nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

4.23. Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine, procijenjene vrijednosti 523.660,6€ i isto je poništeno.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnih nadmetanja za izbor zvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

4.24. Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore krajem 2023. godine raspisala javno nadmetanje za nabavku linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore. Ugovor br. 01-334/24-4081/1 sa dobavljačem PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica,

zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 3.802.304,00€.

- U toku je realizacija ugovora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

4.25. Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.26. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova

- Višegodišnji projekat. Aktivnosti na realizaciji projekata sprovodi Uprava za kapitalne projekte po iskazanim prioritetima Ministarstva zdravlja. Procijenjena vrijednost 5.000.000,00 eura. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta, donacija i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2024.-2026. godina.
- U 2024. godini realizvano je 18.536,37€.

Adaptacija i rekonstrukcija domova zdravlja

- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljena projektna dokumentacija po predmetnom projektu, ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova i na adaptaciji prostorija Doma zdravlja u Kolašinu, raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 260.000,00 bez pdv-a i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 7.900,00 bez pdv-a i isto je poništeno.
- U toku su aktivnosti na ponovnom rapsivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Problematika: Nema je.

Izgradnja novog Urgentnog centra i dnevne bolnice OB Berane - Projekt menadžer Safet Tahirović

- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljena projektna dokumentacija po predmetnom projektu, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Rekonstrukcija operacionog bloka OB Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva zdravlja preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javna nadmetanja za izbor izvođača radova raspisiva su u oktobru 2024. i januaru . godine procijenjene vrijednosti 658.205,1€ i ista su poništena.
- U toku su aktivnosti na ponovnom rapsivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Problematika: Nema je.

Adaptacija i modernizacija operacionog bloka i jedinice intezivnog liječenja u SB Risan

- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljena projektna dokumentacija po predmetnom projektu, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Adaptacija terasa na paviljonima bolnice u Brezoviku

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane

Ministarstva zdravlja i Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić” Brezovik, Nikšić, raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 160.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno zbog neispravnosti ponuda.

- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-306/1 sa "La collina inženjering" Podgorica, zaključen je 27.01.. godine na iznos od 185.801,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1375/1 sa "N&b inženjering i konsalting" d.o.o. Nikšić, zaključen je 24.03.. godine na iznos od 4.356,00€.
- U toku je procedura uvođenja izvođača radova u posao.
- Problematika: Nema je.

Adaptacija bolničke kuhinje OB Nikšić

- Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Nikšić i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 590.000,00€ raspisano je u julu 2024. godine i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7164/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 20.12.2024. godine na iznos od 700.767,14€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-693/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.02.. godine na iznos od 5.868,50€.
- Izvođač radova je uveden u posao u martu . godine.
- U . godini realizovano je 140.153,43€.
- Problematika: Izvođač radova je uočio nedostatke u dijelu mašinskih instalacija za šta je saglasan i stručni nadzor. Korisnik je uradio izmjenu i reviziju glavnog projekta i poslao zahtjev za izmjenu ugovora javne nabavke za navedeni projekat mašinskih instalacija u cilju normalne funkcije kuhinje i cjelokupnog objekta.
- Prijedlog rješenja: Aneks ugovora zbog ostalih faza izvođenja radova, a koje su povezane sa mašinskim radovima te kako ne bi došlo do kašnjenja roka za završetak radova.

Dječiji dispanzer u Nikšiću

- Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva zdravlja i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu i oktobru 2024. godine i isto je poništeno.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Problematika: Nema je.


Izrada studije izvodljivosti za novu zgradu Zavoda za HMP Podgorica

- Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljena projektna dokumentacija po predmetnom projektu, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

POTPROGRAM

4.b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR ZDRAVSTVO
--

4.27. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

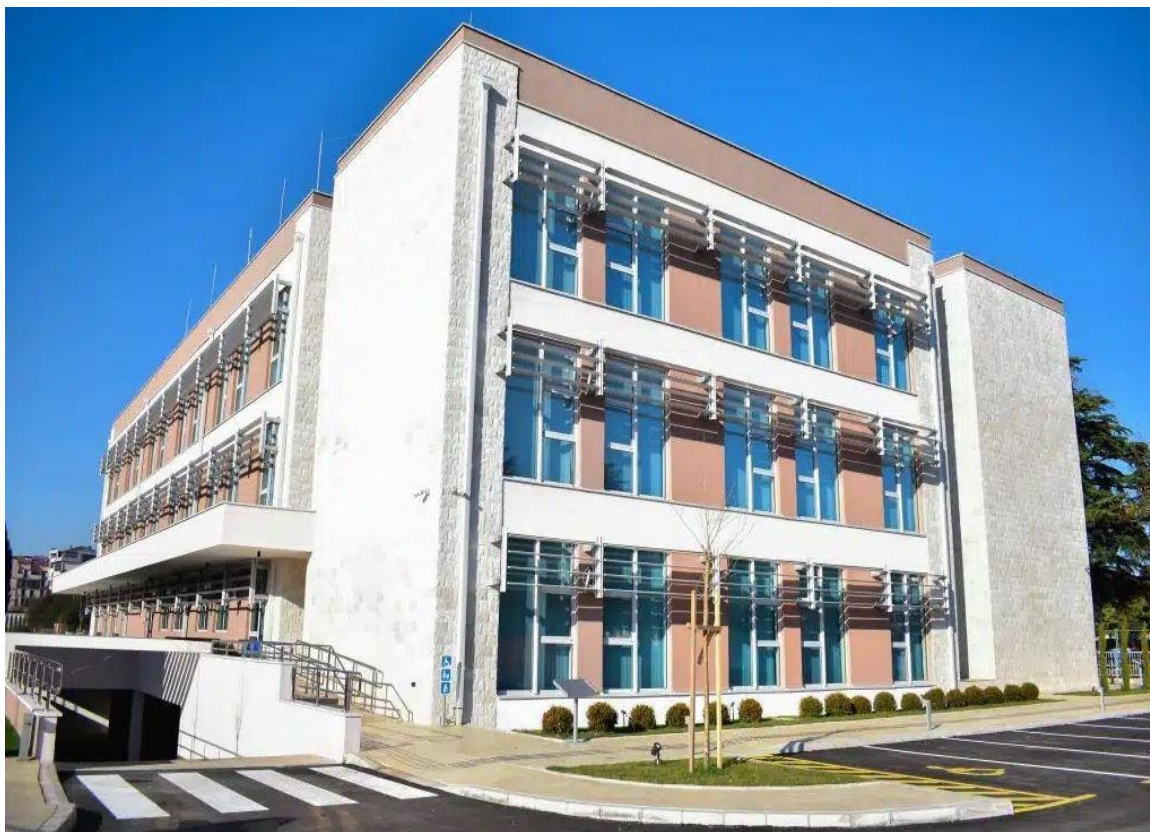

- Projektom je obuhvaćena izgradnja objekta spratnosti su + pr + 2 sprata u kome će biti smještena Klinika za infektivne bolesti i Klinika za dermatovenerologiju. Ukupna površina koja obuhvata građevinsko područje iznosi 5.530.59m².
- Ugovorom je predviđena i nabavka medicinske opreme za potrebe potpune funkcionalnosti objekta.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontorulu i ista je odobrena u decembru 2021. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.06.2022. godine, a javno otvaranje ponuda je održano 30.06.2022. godine. Nakon završene evaluacije ponuda i odobrenja izvještaja rada Evaluacione komisije od strane EU Delegacije, zaključen je Ugovor sa odabranim izvođačem radova.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3577/1 je zaključen 07.10.2022. godine na iznos od 8.492.468,22€.
- Svi radovi su završeni i objekat je pušten u rad. U toku je garantni period od godinu dana.
- U 2024. godini realizovano je 6.748.883,80€.

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Nakon odobrenja najave za tendersku proceduru od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine. Pripremni sastanak i otvaranje ponuda je održano 21.02.2022. godine. Evaluacioni izvještaj je 11.05.2022. odobren od strane EU Delegacije.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija je poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 18.07.2022. godine, a otvaranje ponuda je održano 19.07.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/SER/01-908/22-4381/1 je zaključen 01.12.2022. godine na iznos 335.750,00€ sa kompanijom „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“ u konzorcijumu sa „Genesis project d.o.o. Podgorica“, dok je Addendum br.1 Ugovora potpisan 19.07.2023. godine.
- Izvještavanje i druge aktivnosti se realizuju u skladu sa ugovorom.
- U toku je garantni period od godinu dana.
- Četvrti privremeni izvještaj je odobren.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

4.28. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/adaptacija i nabavka opreme za odabrane mikrobiološke laboratorije: Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, JZK Budva, JZZC Cetinje, JZK Ulcinj,
- Radovi koji se izvode odnose se na arhitektonsko/građevinske radove, vodovod/kanalizaciju, montažu mašinske (HVAC) opreme, elektro instalacija itd. u zavisnosti od uslova za buduću isporuku specijalizovane opreme.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-5156/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na

iznos od 1.191.479,82€.

- Ugovoreni rok izvođenja radova je 9 mjeseci.
- Izvođač je uveden u posao 17.02.2023. godine.
- Period implementacije ugovora je produžen do 15.02.2024. godine.
- Radovi su završeni i u toku je garantni period.
- U 2024. godini realizovano je 403.693,31€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije/adaptacije mikrobioloških laboratorija

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-4842/1 je zaključen 30.11.2022. godine sa ugovaračem „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, na iznos od 49.999,95€.
- Inicijalni rok implementacije za realizaciju ugovora je 21 mjesec.
- Ugovoreni rok je produžen do prvog maja, kako bi se garantni period uskladio sa ugovorom o radovima.
- Implementacija ugovora se sprovodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.
- U 2024. godini realizovano je 17.499,98€.

Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških potreba

- Projektom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije : Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, - PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, PZK Budva, JZKC Cetinje, JZK Ulcinj
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SUP/01-908/22-5074/1 je zaključen 02.12.2022. godine sa ugovaračem PDG DOO, na iznos od 839.864,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
- Nalog za početak perioda implementacije je izdat 01.03.2023. godine.
- Period implementacije ugovora je produžen do 22.12.2023. godine.
- Sva oprema je isporučena, instalirana i prihvaćena u skladu sa ugovorom.
- U 2024. godini realizovano je 138.808,00€.

4.29. Radovi na izgradnji operativnog centra

Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Ugovorom je predviđena izgradnja javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije za potrebe Instituta za javno zdravlje. Planirana spratnost objekta je Po+P+2. Bruto razvijena površina objekta je 1506,48 m², a neto površina 1318,38 m².
- Glavni projekat je izrađen od strane Instituta za javno zdravlje.
- Tenderska dokumentacija je objavljena 30.03.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 30.05.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 03.06.2022.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Nakon ex-ante kontrole pripremljenog Ugovora od strane EU Delegacije, isti će biti potpisan sa odabranim Ugovaračem.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3495/1 je zaključen 27.09.2022. godine na iznos od 2.144.491,25€. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Rok implementacije ugovora je produžen do 31.03.2024. godine.
- Svi radovi su završeni, u toku je garantni period.
- U 2024. godini realizovano je 673.023,85€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
- U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslate odabranim firmama 31.05.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
- Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena 28.09.2022. godine.
- Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 24 mjeseca.
- Ugovor je produžen do 18.06., kako bi se uskladio garantni rok sa ugovorom o radovima.
- Stručni nadzor dostavlja redovne mjesečne izvještaje.
- Ugovor se realiuje u skladu sa ugovornim obavezama. U toku je period obavještanja o nedostacima (DLP).
- U 2024. godini je realizovano 17.325,00€.



PROGRAM

V. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

POTPROGRAM

5. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA
--

5.1. Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

- U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.
- U decembru 2014. godine usvojen je drugi Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, prioritet je razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih finansijskih sredstava putem zajma CEB-a.
- Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova UIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.
- Konsultantske usluge za izradu tehničke i druge dokumentacije su finansirane grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000,00 €.
- U skladu sa glavnim projektom, predračunska vrijednost izvođenja radova i opremanja objekta je vrijednosti 29.699.885,48€. Procijenjena vrijednost realizacije pratećih infrastrukturnih komponenti projekta (rekonstrukcija pristupnog puta, regulacija rijeke Tare, izgradnja trafostanice sa dovodnim kablom i izgradnja vodovodne mreže za potrebe zatvora) iznosi 7.000.000,00€.
- Ukupna vrijednost realizacije svih projekata iznosi apriksimativno 37.000.000,00€. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. decembra 2022. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta zatvora, kojim koordinira Ministarstvo pravde, kao i aktivnosti na projektovanju i reviziji pratećih infrastrukturnih komponenti projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja infrastrukture za potrebe objekta UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV i priključnog 10 kV kablovskog voda

- Ugovor br.01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Diagram" d.o.o. Podgorica zaključen je 27.04.2023. godine na iznos 9.619,50€.
 - Ugovor br. 01-334/23-5759/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 06.10.2023. godine na iznos 8.470,00€.
 - U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika i prijedlog rješenja: Potrebna izmjena Odluke o izgradnji objekta od opšteg interesa od strane Opštine Mojkovac, kako bi se završila revizija glavnog projekta.

Izgradnja nove hidrotehničke infrastrukture na trasi od izvorišta Gojakovići do objekta UIKS-a

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije raspisano je 04.08.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Ingenium" d.o.o. Podgorica zaključen je 16.10.2023. godine na iznos 17.477,24€.
- Ugovor br. 01-334/23-5707/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Revizija glavnog projekta je završena u martu 2024. godine.
- U 2024. godini realizovano je 25.947,24€.

5.2. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija

- Ugovor sa turskom firmom „Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company” je potpisan 20.04.2022. godine. Ugovor se sastojao iz dvije faze: Prva faza koja je uspješno završena je podrazumijevala izradu tenderske dokumentacije za 4 LOTA u oblasti pravosuđa. Druga faza podrazumijeva stručni nadzor nad izvođenjem radova za ugovorena 2 LOTA: LOT2 - Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu i LOT1 - Izvođenje radova na objektima (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica) za potrebe UIKS-a.
- Vrijednost ugovora je 678.850,00€ sa rokom implementacije od 43 mjeseca.
- U toku je druga faza realizacije ugovora koja se odnosi na nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji 7 objekata sudstva, kao i 4 objekata u kompleksu UIKS-a.
- U 2024. godini realizovano je 1.686.351,60€.

POTPROGRAM

5. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE

5.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrt projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 potpisan je 30.11.2022. godine sa konzorcijumom LD „Gradnja” d.o.o., „Ramel” d.o.o., „Eurozox” d.o.o. i „Ening” d.o.o. na iznos od 3.434.508.01€.
- Izvođač je 22.03.2023 zvanično uveden u posao.
- Istog dana počeli su radovi na Osnovnom sudu u Kotoru i Nikšiću, a nakon toga i radovi na Osnovnom sudu u Podgorici, Osnovnom sudu u Beranama i Osnovnom i Višem sudu u Bijelom Polju.
- Radovi na svim sudovima su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 1.510.621,06€.

5.4. Kompleks UIKS u Danilovgradu



- Ugovor br. CPA/MNE/IPAI/CAP18/WKS/01-908/22-4763/1 zaključen je sa „Fidija“ d.o.o. 01.12.2022. godine, na iznos od 13.809.971,09 €.
- Radovi se odnose na izgradnju sljedećih objekata: multifunkcionalni objekat, specijalna zdravstvena ustanova, prijavnica i otvoreni zatvor.
- Konstantovano je obilaskom parcele na kojoj će se izvoditi radova da se na istoj nalazi dalekovod koji je potrebno izmjestiti zbog potreba nesmetanog izvođenja radova.
- Projekti, kao i revizija istih za izmještanje dalekovoda od 10 kv i 35 kv su kompletirani. Izmještanje se jednim dijelom vrši na privatnoj parceli. Ministarstvo pravde u saradnji sa nadležnim institucijama i stranama uključenim u projektu je ušlo u proceduru sprovođenja javnog interesa kako bi se sprovela eksproprijacija nepokretnosti i omogućilo nesmetanje odvijanje radova.
- Eleborat eksproprijacije kao i procjena nepokretnosti su završeni. Neophodno je obezbijediti sredstva u kapitalnom budžetu.
- Kako se zbog pomenutih dalekovoda radovi ne mogu odvijati u punom kapacitetu na svim objektima, rok je produžen do 02.12..
- U 2024. godini realizovano je 4.592.597,63€.

PROGRAM
VI. JAVNA BEZBIJEDNOST

POTPROGRAM

6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNOSTI
--

6.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekt je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaji:
- u suteranu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
- u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
- na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
- u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
- na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova je preuzelo obavezu rješavanja spornih pitanja sa privatnim licima.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 200.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7429/1 sa izvođačem radova "Tehnogradnja" d.o.o. Pljevlja, zaključen je 27.12.2024. godine na iznos od 358.846,14€.
- Javno nadmetanje za izbor vršica stručnog nadzora nad izvođenjem radova II faze raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6939/1 sa stručnim nadzorom "Ingenium" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.12.2024. godine na iznos od 9.196,00€.
- Radovi II faze odnose se na uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem, kao i sve preostale radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju.
- Izvođač će biti uveden u posao kada se za to stvore uslovi.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.



6.2. Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom.
- Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar-inženjering” d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00€.
- Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem „Neimar -inženjering” d.o.o. Podgorica, zaključen je 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.

- Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02€).
- Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba koje nisu mogle otpočeti, jer je bilo neophodno da se izgradi nova trafostanica sa koje bi se obezbijedilo trajno napajanje objekta.
- U 2024. godini završeno je priključenje objekta magacina na novu trafostanicu. U toku je otklanjanje primjedbi po izvještaju stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 Kv, 2x630 kVA i VN kabla je ponovo raspisano 16.10.2020. godine i isto je poništeno iz razloga što je prije isteka roka za podnošenje ponuda ocijenjeno da je potrebno bitno izmijeniti tendersku dokumentaciju.
- Nakon toga Ivestitor - Ministarstvo unutrašnjih poslova je pristupilo izradi nove projektne dokumentacije za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 Kv, 2x1000 kVA i VN kabla i ista je dostavljena u junu 2022. godine Upravi na dalje postupanje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici je raspisano 05.07.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5311/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 187.022,56€.
- Svi ugovoreni radovi na izgradnji trafostanice su završeni u februaru 2023. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00€.
- Radovi na izgradnji su otpočeli krajem novembra 2019. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4140/1 sa izvođačem radova, „Čelebić” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.08.2021. godine na iznos od 976.504,29€.
- Radovi na izgradnji objekata kompleksa su završeni i izvršena je primopredaja 20.10.2023. godine.
- Završetak radova na objektima je prolongiran usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, podzemnih instalacija koje nisu bile prepoznate katastrom podzemnih instalacija dobijenim od strane nadležnih preduzeća, kao i usljed odlaganja iseljenja korisnika iz postojećih objekata planiranih za rekonstrukciju i rušenje. Do pojave nepredviđenih radova došlo je i usljed neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji. Otvorenim javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, ograda oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.
- U 2024. godini realizovano je 134.197,24€.





PROGRAM

VII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

POTPROGRAM

7a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE
--

7.1. Izgradnja objekata za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-6009/1 od 27.12.2022. godine zaključen je sa privrednim društvom „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad na iznos od 2.897.336,33€.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora raspisano u maju 2022. godine poništeno je 13.12.2022. godine budući da nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Krajem decembra 2022. godine ponovo je pokrenuta procedura odabira stručnog nadzora za predmetni objekat. Ugovor br. 01-334/23-1502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.03.2023. godine na iznos od 62.920,00€.
- Svi radovi su završeni. U toku su aktivnosti na tehničkom pregledu, koje sprovodi Ministarstvo odbrane.
- U 2024. godini realizovano je 1.686.251,45€.
- Problematika: Nema je.

Izvođenje radova na izmještanju instalacija toplovoda, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Golubovcima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1120/1 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 07.03.. godine na iznos od 98.388,33€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-627/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.02.. godine na iznos od 5.082,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.



7.2. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni „13.jul”


- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.200.000,00€.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5249/1 od 30.11.2022. godine sa privrednim društvom „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad na iznos od 2.177.994,12€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5762/1 godine sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2022. na iznos od 79.860,00€.
- Početkom izvođenja predmetnih radova od strane svih uključenih u realizaciju projekta, utvrđeno je postojanje podzemnih instalacija elektro-energetske infrastrukture na lokaciji izgradnje objekta, čije izmještanje se sprovodi prema procedurama CEDIS-a i za čije izmještanje je potrebna saglasnost nadležne institucije, kao i brojni nedostaci u projektnoj dokumentaciji koji za posljedicu imaju produžetak roka završetka izvođenja radova. Kako do prolongiranja izvođenja radova nije došlo krivicom izvođača, a što je potvrđeno i izjašnjenjem stručnog nadzora, zaključen je anex ugovora za produžetak roka.
- Radovi su u završnoj fazi.
- U toku je utvrđivanje ukupnog obima posla s obzirom na dopunjenu projektnu dokumentaciju koju je dostavilo Ministarstvo odbrane.
- U 2024. godini realizovano je 1.155.783,45€.
- Problematika: Nema je.

7.3. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

7.4. Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni „Pero Četković” u Baru

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Lokacija objekta je u kasarni „Pero Četković u Baru. Komanda Mornarice Vojske Crne Gore je spratnosti Pr + 2, ukupne bruto površine 2.099,85m². Na nivou prizemlja i prvog sprata su prostorije za potrebe Komande Mornarice Vojske Crne Gore, a drugi sprat je predviđen za potrebe Mornaričkog operativnog centra (MOC).
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u Baru, raspisano je 12.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4884/1 sa izvođačem radova, Konzorcijumom „Fidija” d.o.o. Podgorica i „Termomont” d.o.o. Beograd, je zaključen 25.08.2023. godine, na iznos od 11.510.352,82€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-6902/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.12.2023. godine, na iznos od 181.500,00€.
- Na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Ministarstva odbrane, izvođač je uveden u posao 06.12.2023. godine.
- U toku su molersko farbarski i instalaterski radovi u unutrašnjosti objekta, kao i radovi na uređenju terena.
- U 2024. godini realizovano je 5.508.841,97€.
- Problematika: Nema je.

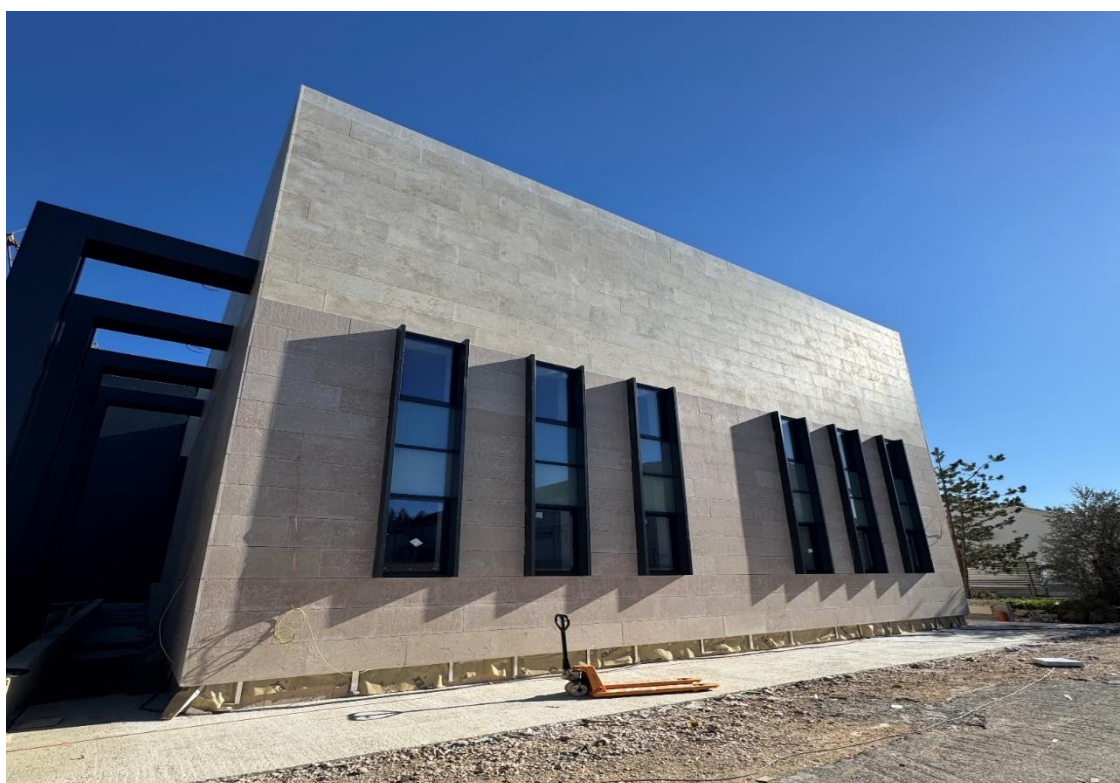

7.5. Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni “Breza” u Kolašinu

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Ugovor br. 01-334/23-5752/1 sa izvođačem radova „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 766.057,98€.
- Aktivnosti na ugovaranju stručnog nadzora sprovelo je Ministarstvo odbrane.
- Završeni su radovi na rušenju i demontaži.

- U toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za dodatne radove, a u skladu sa izmijenjenom projektnom dokumentacijom.
- U 2024. godini realizovano je 78.239,81€.
- Problematika: Radovi su obustavljeni u martu 2024. godine zbog nepredviđenih okolnosti u postojećem stanju objekta. Izvršena je izmjena projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane.
- Prijedlog rješenja: Nakon ugovaranja dodatnih radova, definisaće se i rok za završetak istih.

7.6. Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni “Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2023. godine. S obzirom da na navedenom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, isto je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4079/1 sa izvođačem radova „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 1.136.521,58€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5411/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.09.2024. godine na iznos od 45.980,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u oktobru 2024. godine i do sada su završeni svi grubi građevinski radovi, kao i zidarski i stolarski radovi. Ostali radovi se izvode po ugovorenoj dinamici.
- U 2024. godini realizovano je 521.495,00€.
- Problematika: Nema je.

7.7. Izgradnja nove zgrade u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu

- U 2024. godini je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane, te je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1354/1 sa izvođačem radova „Fidija” d.o.o. Podgorica, zaključen je 21.03. godine na iznos od 5.079.581,9€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 130.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

7.8. Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni “Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima

- U julu 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.355.611,5€ i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova kao i javnog nadmetanja za izbor vršioca stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

PROGRAM

VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA

POTPROGRAM

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

8.1. Izgradnja Doma starih u Nikšiću



- Opština Nikšić dostavila je Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti. Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine, Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130€.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4215/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.09.2021. godine, na iznos od 231.255,83 €.
- Javno nadmetanje za izvođenje radova na nabavci i ugradnji liftova je raspisano 08.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6694/1 sa izvođačem, „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 113.619,00€.
- Na objektu su završeni svi radovi. Pimopredaja objekta je izvršena 28.02.2023. godine.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

8.2. Projekat izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

- Opštine Bar dostavila je Upravi za kapitalne projekte je revidovani glavni projekat.
- Objekat je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni “ŠŠ”, u zahvatu DUP-a “Polje Zaljevo”.
- Objekat je projektovan sa spratnošću Pr+1. Ukupna bruto površina prizemlja iznosi 442,45m², dok bruto površina sprata iznosi 509,0m². Na prizemlju između ostalog su prdviđene sljedeće prostorije: senzorna soba, igraonica, dvije sobe za edukativne aktivnosti, trpezarija, kuhinja. Na spratu se nalaze prostorije za fizikalnu terapiju, kancelarije psihologa, defektologa, logopeda, sala za sastanke.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisano je 23.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 1.500.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 50.000,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-3861/1 sa izvođačem radova „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, zaključen je 03.07.2023. godine na iznos od 1.633.938,61€.
- Ugovor br. 01-334/23-5914/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 25.935,14€.
- Izvođač je uveden u posao 22.11.2023. godine.
- U toku su građevinsko zanatski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, radovi na elektroinstalacijama jake i slabe struje, kao i radovi na mašinskim instalacijama.
- Potpisan je aneks 2 ugovora za produženje roka, br. 01-077/25-1072/5 sa izvođačem radova „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, od 05.03.. godine u trajanju do 01.06.. godine.

- U 2024. godini realizovano je 608.611,17€.
- Problematika: Usljed izmjene projekta došlo je do produženja ugovorenog roka za izvođenje objekta.
- Prijedlog rješenja: Potpisan aneks za produženje roka, projektant dostavio izmjene glavnog projekta.

8.3. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

8.4. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na dogradnji dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 505.000€ bez pdv-a , na kojem nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je ponovljeno u decembru 2023. godine procijenjene vrijednosti 725.000,00€ bez pdva-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1658/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 03.04.2024. godine na iznos od 876,534.1€.
- Ugovor br. 01-334/24-1596/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 26.620,00€.
- Izvođač je uveden u posao sredinom juna 2024. godine i radovi su u toku.
- U 2024. godini realizovano je 285.866,67€.
- Problematika: Nema je.

8.5. Izgradnja Doma starih u Plavu

- Opština Plav je dostavila revidovani glavni projekat.
- Prema zahtjevu investitora objekat je spratnosti Su, P i 3 sprata. Ukupna neto površina objekta je 2.308,71m², a bruto površina 2.885,81m². Na tri sprata u 46 smještajnih jedinica ukupno je predviđeno 64 korisnika. Na I spratu je predviđeno 11 smještajnih jedinica za ukupno 16 korisnika, od toga 1 apartman, 6 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe, pratećim holom za boravak, prostor za medicinsko osoblje. Na II spratu je predviđeno 12 smještajnih jedinica za ukupno 22 korisnika, od toga 1 apartman, 9 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe sa pratećim holom za boravak. Na III spratu je predviđeno 13 smještajnih jedinica, od toga 1 apartman, 10 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe kao i prethodni spratovi sadrži stacionar za nepokretna i hendikepirana lica, hol za zajednički boravak sa mini kuhinjom i ostavom za čisto i prljavo rublje. Vertikalne komunikacije u objektu su tako projektovane da povezuju sve etaže objekta i sastoje se od javnog stepeništa kao i putničkog i bolničkog lifta.
- Uprava za kapitalne projekte je nakon sprovedenog postupka javne nabavke od 10.06.2022. godine zaključila ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „LD-gradnja“ d.o.o. Nikšić br. 01-334/22-5395/1 od 06.12.2022. godine, na iznos od 2.854.847,49€.



- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.10.2022. godine, ugovor br. 01-334/22-5389/1 sa „Projectman” d.o.o. iz Podgorice, zaključen je 06.12.2022. na iznos od 21.767,90€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
- U toku je opremanje objekta.
- U 2024. godini realizovano je 1.030.771,84€.

- U . godini realizovano je 252.351,01€.
- Problematika: Nema je.

8.6. Izgradnja objekta velike gustine naseljenosti, Podgorica

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

8.7. Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku

- Opština Šavnik je u julu 2024. godine dostavila Upravi za kapitalne projekte revidovan glavni projekat, a kako bi Uprava za kapitalne projekte sprovela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano je u oktobru 2024. godine, zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju donešena je Odluka o poništenju postupka.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-755/1 sa „Marting project” d.o.o. Podgorica zaključen je 18.02.. godine na iznos od 17.224,35€.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

PROGRAM

IX. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

POTPROGRAM

9. a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

- Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

9.1. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 101.949,00€.

9.2. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 200.000,00€.

9.3. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 700.296,45€.

9.4. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 1.354.728,70€.

9.5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno 210.960,76€.

9.6. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 498.470,00€.

9.7. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 2.515.815,90€.

9.8. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 1.649.516,10€.

9.9. Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 758.053,05€.

9.10. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave za kapitalne projekte. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.
- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih viškova radova. U toku je definisanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.
- Početkom 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova na izgradnji tribinskih prostora i izvođeni su radovi na uređenju terena. Takođe, korisnik je inovirao zahtjeve vezane za izradu terena za igru i dodatne zahtjeve na izvedenim instalacijama u cilju ekonomičnosti objekta tokom njegove eksploatacije. Krajem 2022. godine definisane su neophodne aktivnosti za završetak radova na objektu i raspisan je poziv za javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova.
- Na osnovu usaglašavanja zahtjeva krajnjeg korisnika pripremljena je tehnička dokumentacija i u julu 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača dodatnih radova na izgradnji fudbalskog stadiona, procijenjene vrijednosti 1.321.000,00€ na kom nije bilo pristiglih ponuda.
- U decembru 2023. godine ponovljen je tenderski postupak. Ugovor br. 01-334/24-1630/1 sa izvođačem dodatnih radova „Ramel“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 02.04.2024. godine na iznos od 1.597.203,15€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova raspisano je krajem jula 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3998/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.07.2024. godine na iznos od 48.400,00€.
- U toku je izvođenje radova. Zbog tehnologije izvođenja fudbalskog terena, radovi se izvode u skladu sa vremenskim prilikama, dok su ostali radovi u završnoj fazi.
- U 2024. godini realizovano je 559.000,00€.



9.11. Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 106.233,51€.

9.12. Uređenje gradskih parkova “13. Jul” i “Njegošev park”

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 89.128,60€.

9.13. Izgradnja “Lokande” sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika

- Na realizaciji ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 17.157,80€.

PROGRAM

X. UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

POTPROGRAM

10. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR SAOBRAĆAJ
--

10.1. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSV i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT 1: Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV) i LOT 2- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS)-phase II.

Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV)

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
- Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
- Realizacija projekta je u toku.
- Na realizaciji projekta utrošeno je 276.981,03 €.
- Tri radionice na kojima su učestvovali korisnici su održane u Baru, u skladu sa ugovorom.
- Angažovan je dobavljač opreme koja treba da bude isporučena u sklopu ovoga ugovora, od strane ugovarača.
- Sva oprema je isporučena i sistem je pušten u produkciju. Garantni rok od godinu dana je u toku.
- Rok je produžen kroz Aneks br. 2 koji je potpisan 03.02.. godine do 30.09..
- U 2024. godini realizovano je 219.231,17€.

VTMIS- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćena podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u

poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).

- Tenderska dokumentacija je objavljena 27.07.2021. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda 15.10.2021. godine. Otvaranje ponuda je održano 18.10.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 zaključen je 13.12.2021. godine, vrijednost ugovora je 1.425.000,00 €.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 08.02.2022.godine.
- Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja izdavanja početka implementacije.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisan 07.11.2022. godine čime je produžen rok implementacije za 240 dana, tj. do 14.06.2023. godine usled nemogućnosti proizvođača da potrebnu opremu proizvede u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu energetske komponente usljed posledica izazvanih pandemijom COVID-a i rata na teritoriji Evropske unije.
- Aneksa ugovora br. 2 je potpisan 05.07.2023. godine, kojim se rok završetka implementacije produžava do 14. marta 2024. godine.
- Rok implementacije je produžen do 14.09.2024. godine kroz adendum broj 3, odobren od strane EU.
- Krajnji rok za implementaciju ugovora je bio 12.12.2024. kada su i sve aktivnosti završene
- Sva oprema je isporučena i instalirana u skladu sa ugovorom.
- U 2024. godini realizovano je 33.308,16€.

10.2. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
- U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU.
- Projektom je obuhvaćena oprema koja se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 je zaključen 30.11.2021. godine na iznos od 941.474,00 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
- Potpisane su tri izmjene ugovora koje su se odnosile na produženje roka implementacije do 24.03.2023. godine. Rok je produžen zbog nemogućnosti proizvođača opreme da istu proizvedu u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu usljed pandemije COVID-a.
- Posljednji sertifikat o prihvatanju opreme je potpisan 24.03.2023. godine, kada je isporučen finalni dio opreme, čime je zvanično završen period implementacije ugovora.
- 26.04.2023. godine, u marini u Baru je organizovana prezentacija opreme kojoj su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva kapitalnih

investicija, Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanja lukama, ugovarača, Uprave za kapitalne projekte, medija.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

10.3. Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPA II/CAP17/SER/01-8132/1 sa obrađivačem projekta, „B&S Europe”, je zaključen 20.11.2019. godine, na iznos od 3.659.900,00€.
- Rok realizacije projekta je 48 mjeseci.
- U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
- Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 1.540.530,15€.
- U toku 2023. godine na projektu su se osim odobravanja eksperata za korisnike (Uprava za kapitalne projekte, Ministarstvo kapitalnih investicija i Željeznica Crne Gore), održali i treninzi za korisnike.
- Sve aktivnosti na projektu su završene.
- U 2024. godini realizovano je 645.793,83€.

10.4. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom doprinosa postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja kao i pripremi projekata iz oblasti saobraćaja.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-4474/1 je zaključen 15.10.2021. godine, na iznos 1.981.040,00€.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 05.11.2021. godine.
- Glavni projekti za pod-projekat „Putevi“ za svih 11 crnih tačaka su predati reviziji na komentare.
- Za pod-projekat „Željeznica“ glavni projekti su predati na komentare reviziji.
- Zbog kašnjenja u odabiru revizione komisije za pod-projekat Željeznica rok je inicijalno produžen do 05.04..
- Zahtjev za dodatno produženje roka do 05.07. je poslat EU Delegaciji na odobrenje.
- U 2024. godini realizovano je 396.862,86€.

10.5. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom

Polju



- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
- U . godini realizovano je 226.600,61€.

Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €.
- Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
- Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
- Addendumom br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00 € a period implementacije projekta je produžen na 36 mjeseci.
- Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.
- Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekta. Glavni projekt koji je dostavljen 02.06.2021. godine je time je implementacija prve faze ugovora završena.
- Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i evaluaciju pristiglih ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Nalog za početak II faze ugovora izdat je 13.08.2021. godine Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice.
- Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Sve aktivnosti koji se tiču nadzora nad izvođenjem radova su završeni. U toku su aktivnosti oko finalnih plaćanja.
- Do sada je utrošeno je 181.165,00€.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/SER/01-908/21-2171 je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
- Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Svrha projekta je poboljšanje uslova prevoza i vremena putovanja na željezničkom koridoru Bar–Vrbnica. U tom kontekstu ponuđač će obezbediti građevinske radove na adaptaciji i rekonstrukciji postojeće zgrade prekogranične željezničke stanice Bijelo Polje na pruzi Bar – Vrbnica kako bi postala zajednička granična stanica Crne Gore i Srbije, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i EU standardima. Radovi će obezbediti odgovarajuće uslove za rad i omogućiti paralelnu kontrolu prekograničnih organa Crne Gore i Srbije. Ovo će isključiti potrebu za dvostrukim zaustavljanjem vozova i smanjiti carinsku kontrolu/vreme putovanja za 30 min. Ugovor o radovima će se realizovati prema Opštim uslovima za ugovore o radovima koji se finansiraju iz budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj (EDF).
- Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 18.02.2022. godine.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Prva faza izvođenja radova koja je obuhvatila isključivo lijevi dio zgrade i čitav drugi peron je završena i taj dio željezničke stanice je u potpunosti u funkciji.
- Druga faza izvođenja radova koja se tiče desnog dijela zgrade i pomoćnog objekta je počela tokom novembra 2022. godine.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisan 19.04.2023. godine koji se odnosio na produženje roka implementacije ugovora do 31.05.2023. godine. Zbog izvođenja dodatnih radova, cijena ugovora je uvećana na 2.092.412,55€.
- Period implementacije ugovora je produžen do 18.11.2023. godine.
- Radovi su završeni i nakon isteka garantnog roka izdat je Sertifikat o finalnom prihvatanju radova.
- U 2024. godini realizovano je 414.011,12€.


PROGRAM

XI. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

POTPROGRAM

11. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE
--

11.1. Rekonstrukcija objekta “Dvorca Kralja Nikole” u Nikšiću

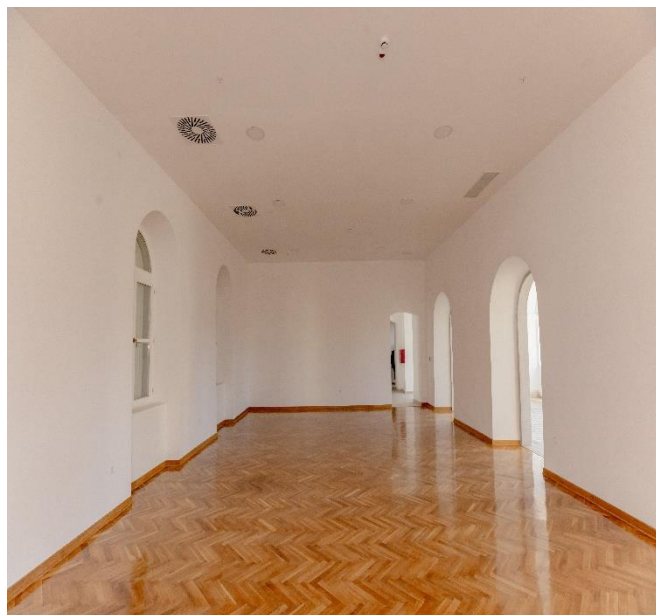

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu čenakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
- Svi ugovoreni radovi koji se izvode na osnovu revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije objekta, koji je Upravi za kapitalne projekte dostavila Opština Nikšić, su završeni i u toku je završno čišćenje objekta.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji usljed čega je izvršena izmjena i ponovna revizija glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija. Izmjene u projektnoj dokumentaciji rezultirale su pojavom dodatnih radova za čije izvođenje je raspisano javno nadmetanje 28.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-28/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 10.01.2023. godine, na iznos od 361.658,98€.
- Završeni su radovi na ugradnji termotehničkih i sprinkler instalacija.
- Početkom 2022. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela Rješenje o privremenoj obustavi sprovođenja konzervatorskih mjera u prizemlju ulaznog dijela objekta, do izdavanja novih konzervatorskih uslova 24.05.2023. godine. Na osnovu izdatih uslova Opština Nikšić je obezbijedila izradu novog konzervatorskog projekta i pribavila ponovnu saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara 30.08.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6885/1 za izvođenje radova u prizemlju ulaznog dijela objekta sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.12.2023. godine, na iznos od 31.459,99€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi i u toku je pribavljanje stručnog mišljenja na izvedene radove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu objekta od strane stručnog nadzora, nakon čega će se izvršiti primopredaja objekta korisniku.
- U 2024. godini realizovano je 468.646,61€.
- Problematika: Nema je.

11.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture


- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata po prioritetima ministarstva. Projektom je obuhvaćena i: rekonstrukcija kule „Lazara Sočica”, opremanje depoa Ministarstva kulture i rekonstrukcija i adaptacija dva doma kulture u Tuzima. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 19.057,50€.
-

11.3. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić

- Opština Nikšić je dostavila revidovani glavni projekat.
- Bruto površina objekta „Radio i televizije Nikšić” u Nikšiću površine je cca 2.019,32 m² i

sastojaće se iz prizemlja, I sprata, II sprata i III sprata. Na prvom spratu su predviđene kancelarije za direktora, urednika radio televizije i prostorije za sekretaricu. Takođe, na I spratu su kancelarije za pravnike, ekonomiste i direktora radija. Uz glavni studio se nalazi prostorija za režije sa pratećom REK prostorijom. Na II spratu se nalazi kongresna sala sa garderoberom, virtuelni studio, arhiva, kao i lounge bar sa pratećim prostorijama. Na III spratu su predviđene prostorije za tehničke instalacije.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 13.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4366/1 sa izvođačem "LD GRADNJA d.o.o. Nikšić", je zaključen 17.10.2022.godine, na iznos od 1.793.442,65€.
- Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora je potpisan između "Radio i televizije Nikšić" d.o.o. Nikšić i "RMA INŽENJERING d.o.o. Nikšić", gdje su naručilac i izvršilac saglasni da predmetna usluga bude donacija.
- Izvođač radova je uveden u posao 07.11.2022.godine i rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Aneks ugovora br. 01-334/23-3360/1 o građenju vezano za produženje roka, potpisan je između naručioca i izvođača radova 06.06.2023. godine sa novim rokom završetka do 07.11.2023. godine. Anex je produžen zbog nedostataka i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji, kao i zbog nepovoljne vremenske situacije koja u datom periodu nije dozvolila radove kada su se izvršavali radovi na konstrukciji, fasadi, krovovima i izolaciji, koji tehnološki zavise od vremenskih uslova.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za opremanje lokalne televizije Nikšić 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-4479/1 sa izvođačem radova „Telemont“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.07.2023. godine na iznos od 937.598,18€.
- Ugovor br. 01-334/23-1922/1 sa stručnim nadzorom „Europroject“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.03.2023. godine na iznos od 6.534,00€.
- U decembru 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji lokalnog radio televizijskog centra u Nikšiću. Ugovor br. 01-334/24-1835/1 sa izvođačem radova „Telemont“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.04.2024. godine na iznos od 270,103.02€.
- Ugovor br. 01-334/24-897/1 sa stručnim nadzorom „Hill construction“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.2.2024. godine na iznos od 6.050,00€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi i objekat je predat korisniku.
- U 2024. godini realizovano je 850.886,63€.

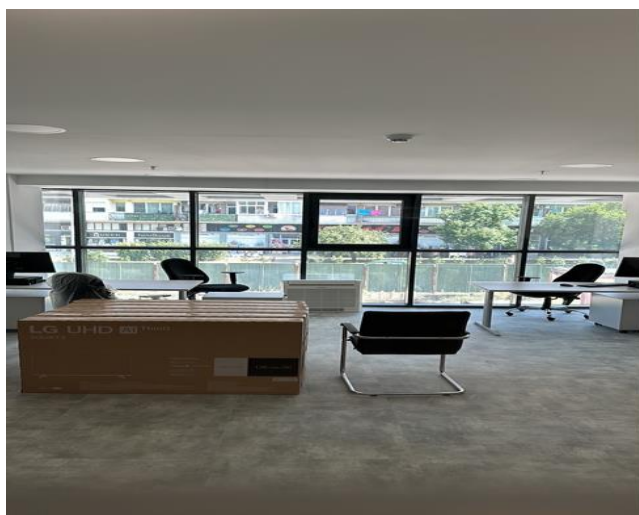



11.4. Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

11.5. Rekonstrukcija druge faze Kaldreme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj

- Rekonstrukcija I faze kaldreme u Starom gradu kalaja je završena i očekuje se rekonstrukcija druge faze.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: U cilju uspješnog realizovanja ove investicije, a uzimajući u obzir probleme na koje je izvođač radova naišao tokom izvođenja radova I faze, neusaglašenost projekta sa stvarnim stanjem na terenu i izmijenjene potrebe Korisnika u odnosu na period izrade projektne dokumentacije, Opština Ulcinj preuzela je obavezu dorade projektne dokumentacije.
- Prijedlog rješenja: Dostava projektne dokumentacije za izvođenje II faze, prilagođene potrebama investitora. Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

11.6. Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću

- Nakon dostavljanja potpisanog projektog zadatka od strane Islamske zajednice, Uprava za kapitalne projekte je 18.10.2023. godine raspisala javno nadmetanje za Izradu konzervatorskog projekta sanacije Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.
- Ugovor br. 01-334/23-6778/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Cetinje, zaključen je 27.11.2023. godine na iznos od 17.000,00€.
- Završena je izrada projektne dokumentacije.
- Na više raspisanih javna nadmetanja za izbor izvođača radova tokom 2024. godine, procijenjene vrijednosti 159.000,00 bez pdv-a nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2024. godini realizovano je 17.000,00€.
- Problematika: Nema je.

11.7. Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Glavnog grada Podgorica, Uprava za kapitalne projekte je 20.05.2024. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 2.429.000,00€ bez pdv-a. Na javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 2.456.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u martu . godine, procijenjene vrijednosti 150.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

11.8. Scensko opremanje sale JU “Centar za kulturu Danilovgrad”

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena nepotpuna projektna dokumentacija.
- Potrebno je da Opština Danilovgrad dostavi dopunjenu projektnu dokumentaciju kako bi Uprava na osnovu iste pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

11.9. Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Ministarstva kulture, Uprava za kapitalne projekte je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 550.000,00€ bez pdva-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku je dopuna projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, nakon čega će Uprava sprovesti aktivnosti na raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

11.10. Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

POTPROGRAM

12. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

12.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Projekte izgradnje lokalne infrastrukture realizuju lokalne samouprave izuzev već započetih projekata koje realizuje Uprava za kapitalne projekte. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije, izvođenje radova za projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, shodno iskazanim prioritetima lokalnih samouprava i Prijestonice Cetinje. Aktivnosti na realizaciji projekata sprovode: Uprava za kapitalne projekte, opštine, glavni grad i prijestonica. Ukupna vrijednost investicije 15.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 17.869.589,71€.

Lokalni putevi i gradske saobraćajnice

Glavni grad Podgorica

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala Ugovor sa Glavnim gradom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 800.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 687.561,09€.

Prijestonica Cetinje

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Prijesticom Cetinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 200.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 195.182,98€.

Opština Pljevlja

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 800.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 788.571,68€.

Opština Šavnik

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u

iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- U 2024. godini realizovano je 100.000,00€.

Opština Gusinje

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 250.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 367.600,29€.

Opština Danilovgrad

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.041.906,00 €.

Opština Andrijevica

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 500.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 595.775,15€.

Opština Rožaje

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 200.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 199.782,47€.

Opština Bijelo Polje

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 600.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- U 2024. godini realizovano je 796.175,68€.

Opština Petnjica

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 150.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 149.999,78€.

Opština Nikšić

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Mojkovac

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.200.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.045.414,61€.

Opština Kolašin

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.500.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.469.413,33€.

Opština Ulcinj

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Ulcinj za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.200.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 107.913,00€.

-

Opština Žabljak

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.400.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.393.071,88€.

Opština Plužine

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 100.000,00€.

Opština Tuzi

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 4.700.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 4.860.970,07€.

Opština Plav

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 2 ugovora sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture liniskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 900.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.252.677,33.

Opština Berane

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 2 ugovora sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture liniskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 2.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.444.038,65€.

Opština Zeta

- U 2024. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Zeta za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 1.081.461,80€.

Opština Bar

- U 2024. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bar za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2024. godini realizovano je 192.073,90€.

12.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Ibar, Bistrice, Gračanice i drugih po prioritetima ministarstva. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 1.175.346,02€.

Regulacija korita rijeke Ibar



- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obradivač glavnog projekta je "Hydrogis System" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođčem, „Vukotić-trade” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj” d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.
- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze i isto je poništeno od strane Ministarstva finansija.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom.
- Prijedlog rješenja: Obaveza Opštine Rožaje je riješi imovinsko-pravne odnose na terenu.

12.3. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica, Plav

- Put Plav – Bogićevica kao dio budućeg regionalnog puta Plav – Dečane je ukupne dužine cca 17,5 km.
- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnog projekta „Civil engineer“ d.o.o., zaključen je 09.12.2019. godine, na iznos od 9.470,00€.
- Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta odradila je firma „Geoprojekt“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br. 01-334/23-5277/1 zaključen je 14.09.2023. godine na iznos od 19.951,37€.
- Ugovor br. 01-334/23-5967/1 sa revidentom elaborata je „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.10.2023. godine na iznos od 3.448,50€.
- U 2024. godini realizovano je 3.448,50€.
- Problematika: Zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa projektnim zadatkom došlo je do raskida ugovora sa projektantom „Ding“ d.o.o. Podgorica.
- Prijedlog rješenja: Potrebno je sprovesti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor novog obrađivača glavnog projekta.

12.4. Putni pravac Monte Rose

- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano u novembru 2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2148/1 sa izvođačem, Konzorcijum Besix-Briv, zaključen je 24.05.2022. godine, na iznos od 10.301.160,07€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano u decembru 2021. godine. Ugovor br. 01/334-23-422/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, zaključen je 27.01.2023. godine na iznos od 219.264,10€.
- Tokom 2023. godine nije završena eksproprijacija, što je obaveza Opštine Herceg Novi, te izvođač nije uveden u posao.
- Sredinom juna 2024. godine izvođač je uveden u posao, na dijelu na kom jer riješena eksproprijacija.
- U 2024. godini realizovano je 102.026,84€.
- Problematika: Zbog neriješene eksproprijacije i ostalih nedostataka u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je predložio raskid ugovora.
- Prijedlog rješenja: U toku je pribavljanje potrebne dokumentacije od strane izvođača za sprovođenje procedure raskida ugovora.


12.5. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu – II faza

- Opština Plav je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Druga faza izvođenja radova obuhvata radove na rekonstrukciji saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturuom i trotoarima.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4534/1 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 08.08.2024. godine na iznos od 988.372,59€.
- Ugovor br. 01-334/24-3654/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Infrastruktura“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.06.2024. godine, na iznos od 9.438,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli krajem avgusta 2024. godine i do sada su završeni

iskopi na terenu, atmosferska i kanalizaciona mreža kao i asfaltni radovi. Radovi su obustavljeni u decembru 2024. godine i isti će biti nastavljeni kad se za to stvore povoljni vremenski uslovi.


- U 2024. godini realizovano je 932.718,47€.
- Problematika: Nema je.



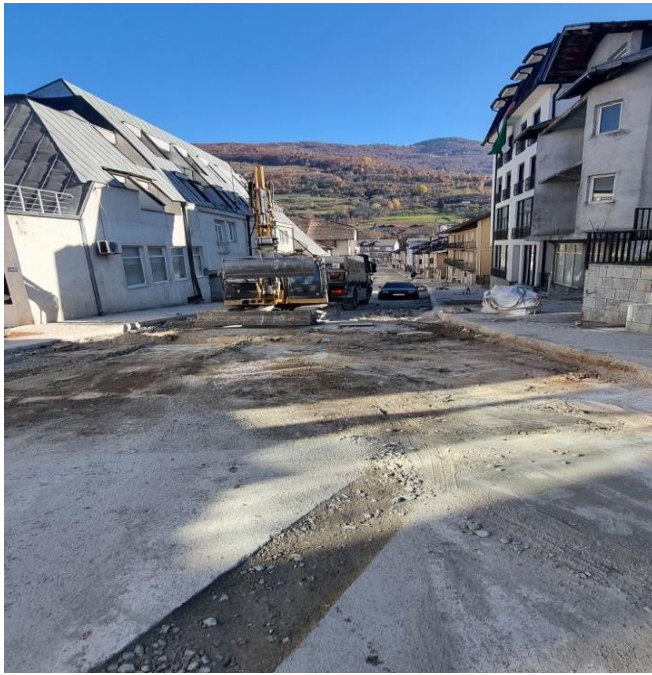

12.6. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar – Projekt menadžer Vladimir Vukčević

- Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze. Zahvat obuhvata cca 4.800 m² šetališta sa pratećim sadržajima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €.
- Revidovani glavni projekat je obezbijedilo JP Morsko dobro Crne Gore. Projektant glavnog projekta je "Arhitektonski studio AIM" d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je "Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4063 sa izvođačem, „IGP Fidija” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 968.383,36€, od čega će Opština Bar obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000,00 €. Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore predvidjelo je iznos od 425.000,00 €, a Uprava javnih radova obezbijediti iznos od 443.383,36 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 17.02.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2501 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 26.299,35€.
- Do sada je utrošeno 26.200,35€ za tekuće izdatke, odnosno 424.438,12€ za kapitalne izdatke.
- Na realizaciji projekta utrošeno je 450.638,47€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
- Ugovor o realizaciji projekta Rekonstrukcija obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru – faza II izvođenje radova, zaključen je između Vlade Crne Gore, Opštine Bar i Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore.
- JP Morsko dobro je preuzelo dalju realizaciju projekta, raspisano je javno nadmetanje i ugovoreno izvođenje radova II faze.
- U 2024. godini realizovano je 556.098,30€.

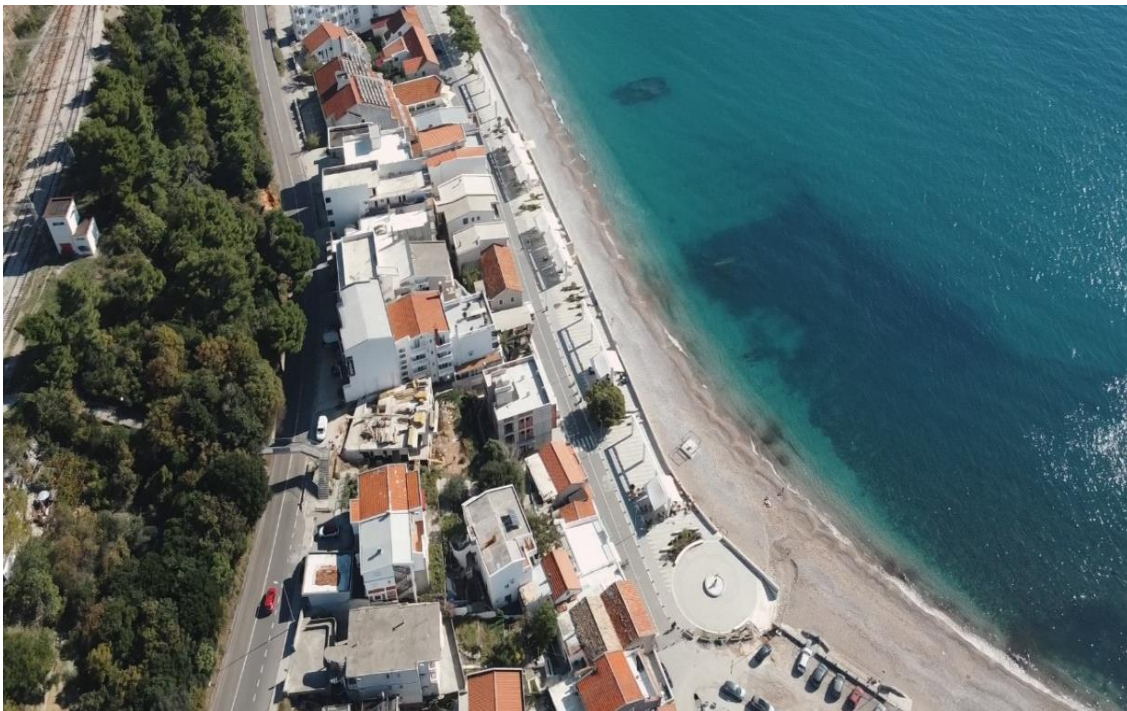

12.7. Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića

- Uprava za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića” u iznosu od 890.000,00€.
- U 2024. godini realizovano je 3.115.500,00€.

12.8. Izgradnja puta Srđevac – Lozna

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.
- Prijedlog rješenja: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje.

12.9. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.
- Glavni grad Podgorica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 7 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture za izvođenje radova na rekonstrukciji Zmaj Jovine ulice u iznosu od 445,000,00 €.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
-

12.10. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.
- Glavni grad Podgorica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 7 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje za izvođenje radova na rekonstrukciji Bulevara Veljka Vlahovića u iznosu od 1.240,000,00€.
- U 2024. godini realizovano je 1.086.683,15€.

12.11. Rekonstrukcija puta Gusinje – Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- Krajem 2021. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Ugovor br. 01-334/23-30/1 sa izvođačem radova „Indel inženjering“, zaključen je 10.01.2023. godine na iznos od 1.028.354,26€.
- Ugovor br.01-334/23-148/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.01.2023. godine, na iznos od 11.737,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
- Do sada su završeni radovi na probouju puta u dužini od 600 m, nastavak radova se očekuje nakon izmjene projektne dokumentacije od strane projektanta.
- U 2024. godini realizovano je 195.539,37€.
- Problematika: Radovi se trenutno ne izvode.
- Prijedlog rješenja: Zbog propusta u tenderskoj dokumentaciji i stvarnog stanja na terenu, neophodno je ponovno snimanje terena, te da projektant predloži rješenje novonastale situacije.

12.12. Izgradnja autobuske stanice Igalo - Bare

- Opština Herceg Novi je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 2 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izgradnja autobuske stanice Igalo – Bare“ u iznosu od 31,000,00€.
- U 2024. godini realizovao je 2.257.279,39€.

12.13. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Projektant glavnog projekta je „Via project“ d.o.o. iz Podgorice, a revident „Arhitektura Aurea d.o.o. iz Podgorice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosila je 930.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/23-534/1 zaključen je

01.02.2023. godine sa izvođačem radova „Inženjer Gogić“ d.o.o. iz Podgorice na iznos 1.075.555,42€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.08.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosila je 27.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/23-146/1 zaključen je 16.01.2023. godine sa vršiocem stručnog nadzora "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 11.495,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nakon priprema za početak radova na realizaciji projekta, od strane Opštine Bar je dostavljena informacija da je na Rješenje UPI-07-041/22-467/10 izjavljena žalba, te da je novim Rješenjem UPI-07-041/22-467/15 žalba usvojena i da se postupak za izdavanje odobrenja za izgradnju obustavlja do pravosnažnog okončanja postupka.
- Dana 31.05.2024. godine, Opština Bar je dostavila informaciju da Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje nije u mogućnosti da izda odobrenje za izvođenje radova, dok se ne riješe sporni imovinsko pravni odnosi.
- Dopisom 01-334/25-1136/2 od 17.03. godine, Opština Bar je dostavila informaciju da je i dalje na snazi prekid postupka do okončanja spora vezano za imovinsko pravne odnose.
- Prijedlog rješenja: Potrebno je da Opština Bar dostavi dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

12.14. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka

- Uprava za kapitalne projekte je 06.07.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta asfaltiranja puta Marina dolina – Radovan luka.
- Ugovor br. 01-334/23-2507/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Geotechnics, Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.04.2023. godine, na iznos od 20.207,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5528/1 sa izvođačem radova „Bemax“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.10.2024. godine na iznos od 1.329.398,78€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4996/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 6.292,00€.
- Izvođač još nije uveden u posao zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
- U 2024. godini realizovano je 289.716,76€.
- Problematika: Nema je.

12.15. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 03.02.2022. godine. Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/22-2359/1 sa izvođačem radova „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi, zaključen je 06.06.2022. godine, na iznos od 750.078,48€.
- Realizacije na ovom projektu nije bilo. Izvođač radova je uveden u posao, ali radovi nijesu otpočeli zbog nedostataka u projektu.
- Ugovor je raskinut.
- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.
- Opština Herceg Novi zaključila je aneks 4 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo – Bare“ u iznosu od 1.215.000,00€.
- U 2024. godini realizovano je 151.213,61€.
- U . godini realizovano je 26.000,00€.

12.16. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od "Galeba" do Titove vile

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.
- Opština Herceg Novi je sa Upravom za kapitalne projekte potpisala aneks 4 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta u Igalu od Galeba do Titove Vile“ u iznosu od 10.000,00€.
- U 2024. godini realizovano je 1.740.549,32€.

12.17. Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 19.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 1.200.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br.01-334/22-3979/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa „Briv construction“ d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 1.689.160,00€ sa pdv-om.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5615/1 sa „GPC“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.12.2022. godine na iznos od 39.930,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5711/1 sa „GPC“ d.o.o. Podgorice zaključen je 19.12.2022. godine na iznos od 21.634,80€.
- Izvođač je uveden u posao 05.06.2023. godine.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 84.458,00€.

12.18. Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 2.300.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa „Briv construction“ d.o.o. iz Kotora na iznos od 2.758.800,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 150.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-5613/1 sa „GPC“ d.o.o. iz Podgorice zaključen je 15.12.2022. godine na iznos od 555,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 30.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-5710/1 sa „GPC“ d.o.o. iz Podgorice zaključen je 19.12.2022. godine na iznos od 10.623,80€.
- Opština Kotor je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – „Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen“ u iznosu od 640,000,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 262.605,08€.

12.19. Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama

- Nakon dostavljenog revidovanog glavnog projekta od strane Opštine Berane, Uprava za kapitalne projekte je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova raspisano je u junu 2023. godine procijenjene vrijednosti 504.122,98€ bez pdv-a, i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u oktobru 2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/24-1191/1 sa izvođačem radova „Gold Grading“ d.o.o. Berane, zaključen je 12.03.2024. godine na iznos od 570,132.95€.
- Ugovor br. 01-334/24/1825/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica,

zaključen je 10.04.2024. godine na iznos od 9,559,00€.

- Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2024. godine.
- U 2024. godini realizovano je 141.429,58€.
- Problematika: U avgustu 2024. godine radovi su obustavljeni zbog propusta u projektnoj dokumentaciji.
- Prijedlog rješenja: Potrebno je da projektant izvrši dopunu projektne dokumentacije, kako bi radovi bili nastavljani.

12.20. Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022. godine, na iznos od 349.941,55 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku je dopuna projektne dokumentacije.
- U 2024. godini realizovano je 139.176,62€.
- Problematika: Nema je.

12.21. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne zaključila dostavila projektnu dokumentaciju u 2023. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5706/1 sa Eurozox d.o.o. danilovgrad, zaključen je 11.10.2024. godine na iznos od 2.812.682,86€.
- U toku su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- U . godini ukupno je realizovano 562.536,57€.


12.22. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju krajem januara . godine, kako bi Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova će vršiti Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.23. Rekonstrukcija buleva „13. Jul” Nikšić

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Nikšić.
- Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 4 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture - Rekonstrukcija Bulevara „13.jul” u iznosu od 305.000,00€.
- U 2024. godini realizovano je 480.730,02€.

12.24. Glavna ulica u Gusinju

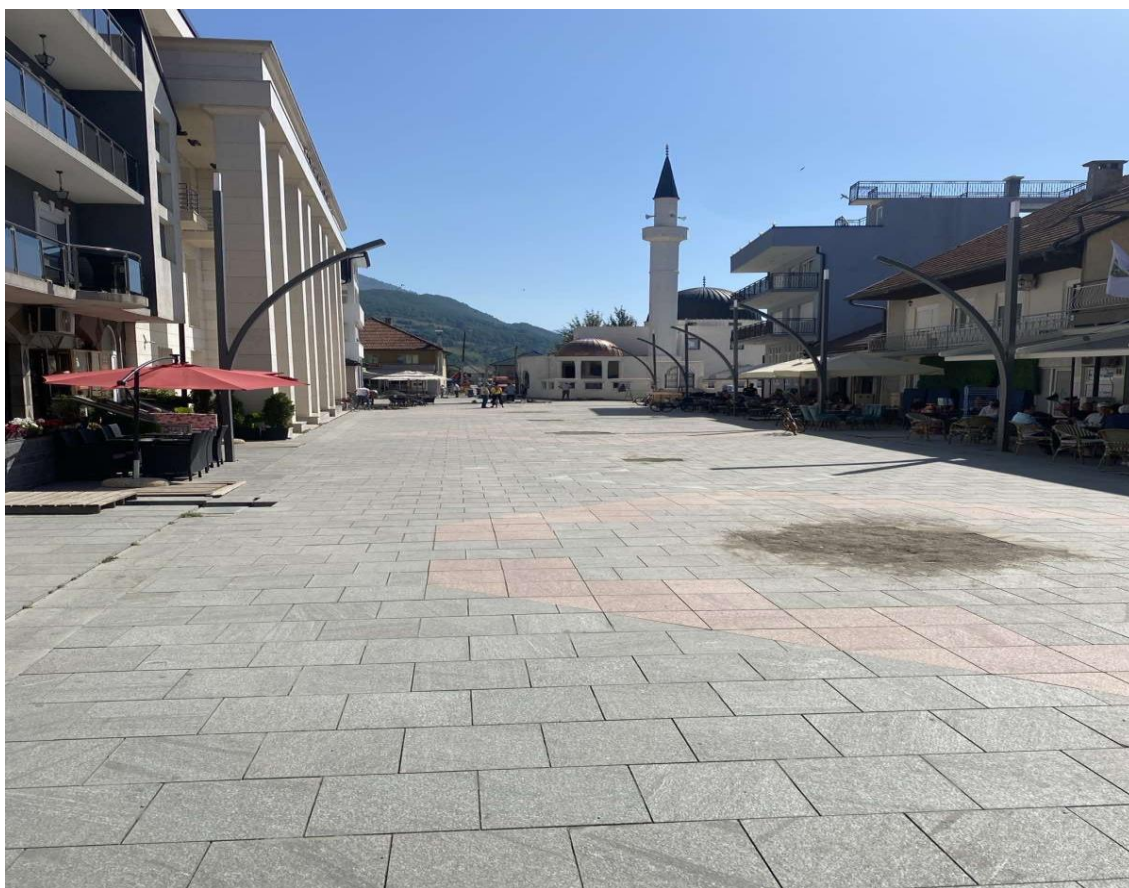



- Dužina saobraćajnice 230 m.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sprovela je Opština Gusinje, nakon čega je dostavila revidovani glavni projekat koji je izradio "Arhing" d.o.o. Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji glavne gradske saobraćajnice u Gusinju sprovela je Uprava za kapitalne projekte 08.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 850.000,00€ bez pdv-a, nakon čega je izabran najpovoljniji ponuđač "Indel-inženjering", sa kojim je zaključen ugovor na iznos od 894.190,00€.
- Javno nadmetanje za izbor nadzornog organa je raspisano 17.08.2022. godine. Ugovor br. 01 -334/22-5248/1 sa stručnim nadzorom "Projectman" d.o.o., zaključen je 30.11.2022. godine, na iznos od 13.189,00€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine.
- Svi radovi na ovom projektu su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 364.900,00€.

12.25. Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju

- Obaveza opštine Ulcinj je da Upravi za kapitalne projekte dostavi revidovani glavni projekat, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- Ukupno je realizovano 1.008.010,00€ u 2022. godini za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Upravi za kapitalne projekte još uvijek nije dostavljen revidovani glavni projekat.
- Prijedlog rješenja: Očekuje se dostavljanje projektne dokumentacije od strane Opštine Ulcinja.

12.26. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani

- Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 16.05.2022. godine za izbor izvođača radova sa procijenjenom vrijednošću od 700.000,00€ bez pdv-a i postupak jednostavne nabavke 03-9/22, 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.500,00€ bez pdv-a za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa pdv-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice 15.08.2022. godine br. 01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa pdv-om.
- Predmetni radovi su završeni.

Adaptacija lokalnih puteva u Komanima

- Od strane Glavnog grada Podgorica, Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija - Elaborat o adaptaciji lokalnih puteva u Komanima, urađen od strane „Inter project” d.o.o. iz Podgorice.
- U postupku otvorene javne nabavke br. 04-34/23 od 12.07.2023. godine, izabran je najpovoljniji izvođač radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice i sa istim je zaključen ugovor br. 01-426/23-7154/2 od 14.12.2023. godine na iznos 1.069.840,13€.
- Sa stručnim nadzorom „N&B inženjering i konsalting” d.o.o. iz Nikšića je putem zahtjeva za podnošenje ponuda za jednostavnu nabavku br. 03-12/23 od 04.07.2023. godine, zaključen ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova, br. 01-334/23-5423/1 od 21.09.2023. godine na iznos 4.598,00€.
- Realizacija je otpočela odmah nakon prijave radova adaptacije od 21.12.2023. godine.
- Radovi su završeni u februaru 2024. godine i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U 2024. godini realizovano je 1.420.079,87€.

12.27. Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 2.066.115,70€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-433/1 sa izvođačem radova „L-gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 30.01.. godine na iznos od 3.021.920,04€.
- Opština Nikšić je obezbijedila privremeni stručni nadzor, dok je Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izbor stalnog vršioca stručnog nadzora u februaru . godine i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2024. godini realizovano je 655.000,00€.
- Problematika: Nema je.



12.28. Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija od strane Glavnog grada Podgorica, na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.29. Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela

- Od strane opštine Šavnik dostavljena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju djelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, na osnovu koje je objavljena tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-23/23 od 18.05.2023. godine za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Kako po predmetnom postupku nije bilo dostavljenih ponuda, postupak je poništen.
- Opština Šavnik je dostavila novi zahtjev za realizaciju projekta sa smanjenim obimom radova, na osnovu čega je ponovo raspisana javno nadmetanje u septembru 2023. godine i izabran najpovoljniji izvođač radova "Akropolis" d.o.o iz Nikšića, sa kojim je zaključen ugovor br. 01-334/23-7330/1 od 20.12.2023. godine na iznos 251.370,52€.
- Ugovor br. 01-334/23-3156/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Ding" d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2023. godine na iznos 9.559,00€.
- Početak radova je odložen dok se stvore povoljni vremenski uslovi za izvođenje.
- Izdato je rješenje kojim se odobrava rekonstrukcija lokalnog puta.
- Radovi su otpočeli 04.07.2024. godine i završeni u ugovorenom roku, 22. avgusta 2024. godine. Dostavljena je okončana situacija i konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U skladu sa zahtjevom za realizacijom II faze projekta, Opština Šavnik je u julu dostavila projekat adaptacije djelova lokalnog puta, na osnovu kojeg je u oktobru 2024. godine

raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji djelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, opština Šavnik II faza. Ugovor br. 01-334/24-7107/1 sa najpovoljnijim izvođačem radova „AG Infoplan“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.12.2024. godine na iznos 513.464,49€.

- Ugovor br. 01-334/24-5628/1 sa stručnim nadzorom „Civil Engineer“ d.o.o. iz Podgorice zaključen je od 08.10.2024. godine na iznos od 6.594,50€.
- Dana 21.03. godine, Opštini Šavnik je dostavljena dokumentacija i upućen zahtjev da prijavi radove adaptacije, kako bi se otpočelo sa izvođenjem.
- U 2024. godini realizovano je 260.788,36€.
- Problematika: Nema je.

12.30. Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Danilovgrad je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – ‘Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu’ u iznosu od 44.500,89€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.31. Rekonstrukcija puta Osoje – Pavino polje – Bijelo Polje

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Bijelo Polje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija puta Osoje – Pavino polje – Bijelo Polje” u iznosu od 106,800,89€.
- U 2024. godini realizovano je 91.329,25€.

12.32. Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.33. Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila je aneks 2 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija školske ulice” u iznosu od 905,000,00€.
- U 2024. godini je realizovano 621.944,24€.

12.34. Rekonstrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila je aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – “Rekonstrukcija ulice Voja Deretića” u iznosu od 226,950,00€.
- Svi radovi na predmetnom projektu su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 207.236,07€.

12.35. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Budva je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 4 ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – “Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva” u iznosu od 1.200.000,00 €.
- U 2024. godini realizovano je 1.437.674,81€.

12.36. Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg manastira

Ostrog

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Danilovgrad je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila je aneks 1 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – “Sanacija dionice puta između donjeg i gornjeg manastira Ostrog” u iznosu od 142.400,00€.
- Svi radovi na predmetnom projektu su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 125.224,34€.

12.37. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH)

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29“ (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH) u iznosu od 89.000,00 €.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.38. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti



- Objekat je prizemni, bruto površine cca 1.200 m2. U centralnom dijelu je planiran pijačni dio sa 30 tezgi za voće i povrće i 10 tezgi za domaću radinost. Ostali sadržaji: ribara, mesara, pekara, poslovni prostori, tehničke prostorije, cvjećare, prostor za prodaju mliječnih proizvoda i jaja, administrativni prostor, poslovni prostori, tehničke prostorije i ostali prateći prostori. U okviru parcele planiran je parking prostor sa 31 parking mjestom, od kojih su 2 mjesta predviđena za lica sa invaliditetom.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2023. godine, dok je javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano krajem decembra 2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/24-1810/1 sa izvođačem radova „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.04.2024. godine na iznos od 2.154.168,82€.
- Ugovor br. 01-334/24-2571/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ing Invest“ d.o.o.

Danilovgrad, zaključen je 13.05.2024. godine na iznos od 70,603.50€.

- Izvođač je uveden u posao u junu 2024. godine i radovi su u toku.
- U 2024. godini realizovano je 686.698,12€.
- U . godini ukupno je realizovano 133.982,75€.
- Problematika: Nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosu na dijelu parcele, što onemogućava izvođenje radova u punom kapacitetu.
- Prijedlog rješenja: Rješavanje problematike je u nadležnosti Opštine Zeta.

12.39. Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima

- Opština Tuzi je Upravi za kapitalne projekte krajem januara . godine dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.40. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Plav.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-909/1 sa izvođačem radova „Tofi” d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.02.2024. godine na iznos od 1.599.888,47€.
- Ugovor br. 01-334/25-719/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Asfalt-beton gradnja”, zaključen je 14.02.. godine na iznos od 9.062,00€.
- Radovi su otpočeli krajem februara . godine i izvode se planiranom dinamikom.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.41. Rekonstrukcija i adaptacija gradske tržnice u Plavu

- Opština Plav je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava za kapitalne pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Bruto površina tržnice je 774,20 m², spratnost P+1, kapaciteta 18 tezgi na prizemlju, odnosno 42 na sprat
- gdje je planirana tekstilna pijaca.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4079/1 sa izvođačem radova „Tehno gradnja“ d.o.o. Pljevlja, zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 597.000,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-3665/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.06.2024. godine na iznos od 8.470,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u julu 2024. godine i do sada su završeni grubi građevinski radovi, kao i zidarski, stolarski i instalaterski radovi.
- Zbog nastupajućeg zimskog perioda radovi su obustavljeni u decembru 2024. godine i nastaviće se kada vremenski uslovi to dozvole.
- U 2024. godini realizovano je 532.705,74.
- Problematika: Nema je.

12.42. Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin

- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Kolašin u januaru 2024. godine, sprovedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 10.04.2024. godine procijenjene vrijednosti 3.820.000,00€ bez pdv-a
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.04.2024. godine procijenjene

vrijednosti 70.000,00€ bez pdv-a.

- Kako na objavljenom tenderu za izbor izvođača radova nije bilo zainteresovanih ponuđača, Upravi za kapitalne projekte je od strane Opštine Kolašin dostavljen zahtjev za ponovnim raspisivanjem tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, uz povećanje procijenjene vrijednosti za 5%.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1192/2 i sa najpovoljnijim ponuđačem konzorcijum IGP Fidija d.o.o. Podgorica, "Hill Construction" d.o.o Podgorica i UCC "Montekop" d.o.o. Kolašin, zaključen je 12.03.. godine na iznos 4.839.998,79€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova je raspisano u aprilu 2024. godine- Ugovor br. 01-334/24-5044/1 i sa najpovoljnijim ponuđačem "Projectman" d.o.o. iz Podgorice zaključen je od 09.09.2024. godine na iznos 82.280,00€.
- Opštini Kolašin je upućen zahtjev da obezbijedi građevinsku dozvolu, kako bi se otpočelo sa realizacijom projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.43. Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština.
- Opština Herceg Novi je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – "Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom" u iznosu od 360.000,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.44. Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosude, Gusinje

- Opština Gusinje je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 304.150,00€ bez pdv-a.
- U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.45. Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje

- Opština Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekte dostavi projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava za kapitalne projekte preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 31.03.. godine procijenjene vrijednosti 240.000,00 bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.46. Izgradnja saobraćajnice prema novom vrtiću, Berane

- Opština Berane je Upravi za kapitalne projekte u februaru . godine dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.47. Rekonstrukcija pijace u Tuzima

- Opština Tuzi je Upravi za kapitalne projekte krajem januara . godine dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.48. Lokalni put u MZ Šekular, Berane

- Opština Berane je dostavila Upravi za kapitalne projekte dostavi projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava za kapitalne projekte pripremila tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2023. godine, procijenjene vrijednosti 79.000,00€ bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/23-6726/1 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 23.11.2023. godine na iznos od 93.087,72€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 102.755,38€.

12.49. Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira „Sv.Trojica“ u Stanjevićima, Budva

- Opština Budva je dostavila Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7041/1 sa izvođače radova „Nicos kop“ d.o.o. Berane, zaključen je 17.12.2024. godine na iznos od 528.710,78€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6407/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Genesis Project“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.11.2024. godine na iznos od 5.929,00€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Radovi se ne izvode zbog potrebe da Opština Budva dopuni projektnu dokumentaciju.

12.50. Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici

- Obaveza Glavnog grada Podgorica je da Upravi za kapitalne projekte dostavi projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Glavnog grada Podgorica je 23.01.. godine dostavila Urbanističko-tehničke uslove i prvonagrađeno Idejno rješenje i obavijestila da je u toku izrada Projektnog zadatka.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.51. Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica

- Glavni grad Podgorica je dostavio Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-3102/1 sa izvođačem radova „Geo-Put Project“ zaključen je 31.05.2024. godine na iznos od 134.901,09€.
- Ugovor br. 01-334/24-2264/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.04.2024.

godine na iznos od 9.498,50€.

- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 140.866,27€.

12.52. Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica

- Glavni grad Podgorica je dostavio Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2024. godine, na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovljeno javno nadmetanje raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4860/1 sa izvođačem radova „Geo-Put Project“ zaključen je 29.08.2024. godine na iznos od 101.783,91€.
- Ugovor br. 01-334/24-5016/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 3.993,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 105.775,04€.

12.53. Izgradnja pristupnog puta sa mostom za manastir Vranjina u Zeti

- Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.54. Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Opštine Tuzi, na osnovu koje je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u novembru 2024. godine, sa procijenjenom vrijednošću od 8.810.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji.
- Opština Tuzi je u januaru . godine dostavila dopunjenu projektnu dokumentaciju i u toku su aktivnosti na pripremi ponovnog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 150.000,00€ i isto je u toku.
- U 2024. godini realizovano je 83.900,00€.
- Problematika: Nema je.

12.55. Izgradnja trim staze oko Trebjese i Izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću

- U februaru . godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljen izmijenjeni revidovani glavni projekat od strane Agencije za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- U toku su aktivnosti na pripremi raspisivanja javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.56. Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.57. Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je od strane Opštine Tuzi dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisana su u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-367/1 sa izvođačem radova "Putevi Bar" d.o.o. Bar, zaključen je 29.01. godine na iznos od 2.116.085,23€. Ugovor br. 01-334/24-7390/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.12.2024. godine na iznos od 68.728,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

12.58. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

12.59. Izgradnja sportske zone u Kolašinu

- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Kolašin u januaru 2024. godine, sprovedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6313/1 sa izvođačem radova „Pnp Perovišić“ d.o.o., zaključen 12.11.2024. godine je godine na iznos od 3.024.313,24€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4603/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.08.2024. godine na iznos od 53.482,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2024. godini realizovano je 600.000,00€.
- Problematika: Nema je.

12.60. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Zeti

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XIII. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

POTPROGRAM

13. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA – SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE

13.1. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i oblića polj
- e. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju tokom 2020. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je dostavljena Upravi za imovinu kako bi u skladu sa Zaključkom Vlade preduzeli dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Krajem 2020. godine završena je izrada glavnog projekta prilagođavanja objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu. Nakon završenog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i potpisivanja ugovora u junu 2022. godine, krajem iste godine završeni su svi ugovoreni radovi na prilagođavanju objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu kao i primopredaja istih korisniku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
-

13.2. Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavanja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, "Entasis" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64€.
- Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
- Izrada Glavnog projekta i revizija za objekat Stare zgrade Vlade u Podgorici završena je početkom decembra 2020. godine, dok smo po pitanju dalje realizacije navedenog objekta od strane predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja obavješteni da je došlo do poklapanja aktivnosti Uprave za kapitalne projekte i navedenog Ministarstva, te da je planirano da Delegacija EU, u dijelu realizacije IPA 2018., uvrsti u tendersku proceduru aktivnosti vezano za izbor izvođača radova za objekat "Stara zgrada Vlade" u Podgorici.
- Završena je izrada idejnog rješenja za objekat Zgrade Predsjednika Crne Gore i nakon usaglašavanja više varijantnih rješenja po potrebama korisnika inovirano Idejno rješenje je dostavljeno je Upravi za katastar i državnu imovinu u decembru 2020. godine. Dopisom korisnika Uprave za katastar i državnu imovinu od septembra 2021. godine, obavješteni smo da je u interesu očuvanja i zaštite eventualnih kulturnih vrijednosti predmetnog objekta potrebno pribaviti mišljenje od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Uprava za zaštitu kulturnih dobara iskazala je potrebu da se izvrši obilazak objekta kako bi se upoznali sa planiranim radovima te smo Upravi za katastar i državnu imovinu uputili urgenciju i dostavili potrebne podatke kako bi odredili termin obilaska navedenog objekta. Uprava za katastar i državnu imovinu se još uvijek nije izjasnila po navedenom.

- Problematika: Prolongiranje rokova izrade Glavnih projekata nastupilo je usljed usaglašavanja Idejnog rješenja i pribavljanja saglasnosti na isto od strane korisnika objekata.
- Prijedlog rješenja: Nakon dobijanja mišljenja i saglasnosti na Idejno rješenje pristupiće se izradi Glavnog projekta. Ugovoreni rok završetka istog je 2 mjeseca od dostavljanja saglasnosti na Idejno rješenje.

PROGRAM
XIV. RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE


POTPROGRAM

14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI NAUKE
--

14.1. Naučno-tehnološki park u Podgorici

- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke, kao i prijavu građenja. Projekant glavnog projekta je „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica.
- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 30 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđeni su dodatni radovi čije je izvođenje bilo potrebno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.



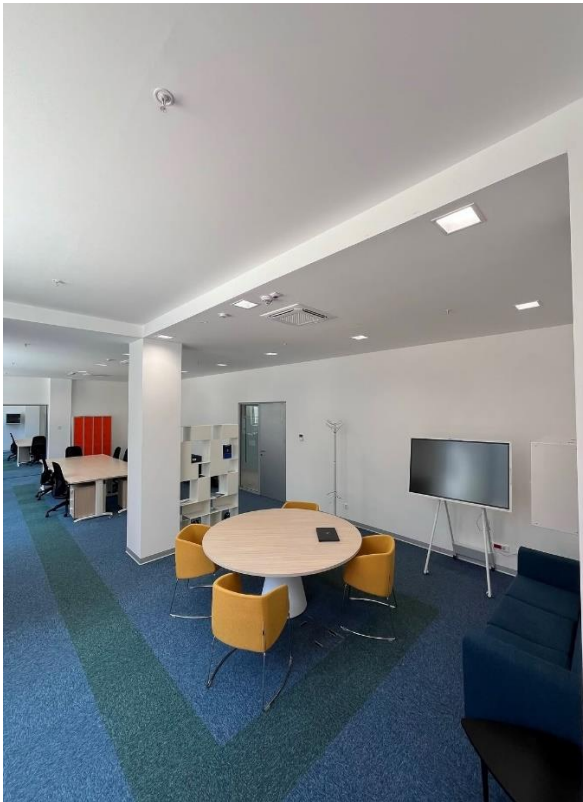

- Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01- 334/21-6693/1 sa izvođačem „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
- Sa radovima se nastavilo u januaru 2022. godine i isti su u završnoj fazi.
- Tokom izvođenja radova, utvrđena je potreba za dopunom projekta trafostanice nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izvođenje istih 30.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2674/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 391.145,00€.
- Radovi na trafostanici su završeni, osim u dijelu povezivanja napojnog kabla na postojeći kablovski 10kV vod TS „Podgorica IV“ do TS „Poljoprivredni Institut“ koji je moguć nakon dobijanja upotrebne dozvole trafostanice. Sva neophodna dokumentacija za tehnički prijem je predata korisniku koji će organizovati komisiju za tehnički prijem izvedenih radova na trafostanici, a nakon što nadležni Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice donese rješenje o imenovanju komisije. Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja komisije za tehnički prijem i upotrebne dozvole od nadležnog Sekretarijata, korisnik će pokrenuti dalju proceduru priključenja trafostanice na distributivnu mrežu kod nadležnog preduzeća CEDIS doo Podgorica.
- Nakon što je od strane Naučno-tehnološkog parka dostavljen projekat opremanja objekta 04.05.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova sa opremanjem. Ugovor br. 01-334/23-4728/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2023. godine, na iznos od 1.703.816,97€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja dodatnih radova sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici je raspisano 31.07.2023. godine. Ugovor br. 01-334/20-6408/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 48.400,000€.
- Tek nakon stavljanja trafostanice pod napon, a nakon toga i samog objekta, krajem aprila 2024. godine stvorili su se uslovi za ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme, kao i pribavljanje stručnih nalaza (atesta) za tehničku ispravnost instalacija.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu.
- U 2024. godini realizovano je 4.565.893,51€.

14.2. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić

- IPC Tehnopolis je Upravi za kapitalne projekte sredinom 2022. godine dostavio projektну dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dijela postojećeg objekta za potrebe izgradnje Doma digitalne revolucije. Nakon javnog nadmetanja i sprovedenih aktivnosti Uprava je 26.06.2023. godine donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.
- Ugovor br. 01-334/234-192/1 sa izvođačem radova Društvo „LD Gradnja” za izgradnju i promet d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.07.2023. godine, na iznos od 724,550.22€.
- Vršenje stručnog nadzora sprovodi Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić.
- Na osnovu zahtjeva opštine Nikšić, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova krajem aprila 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4338/2 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 30.07.2024. godine na iznos od 284.343,95€.
- U toku je izvođenje završnih radova.
- U 2024. godini realizovano je 623.554,09€.
- Problematika: Nema je.

14.3. Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću

- Opština Nikšić je 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na kongresnoj multimedijalnoj sali raspisano je u oktobru 2023. godine i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.645.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4602/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.08.2024. godine na iznos od 43.802,00€.
- Ponovno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-155/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 20.01.. godine, na iznos od 2.295.382,41€.
- Izvođač je uveden u posao u februaru . godine. U toku je izvođenje radova.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

PROGRAM

XV. SPORT


POTPROGRAM

15. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA
--

15.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

- Fudbalski savez Crne Gore je ugovorio izradu glavnog projekta Rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.
- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore – Uprave za kapitalne projekte, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijeđena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem, „Roaming Montenegro“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
- Tokom izvođenja radova Uprava za kapitalne projekte je, od strane stručnog nadzora Agencije za projektovanje i planiranje Nikšić, obavještena da je neophodno pristupiti izmjeni projektne dokumentacije u cilju usaglašavanja kategorije stadiona po standardima UEFA.
- U cilju razmatranja predložene inicijative, Opština Nikšić i Fudbalski klub „Sutjeska“ su pokrenuli aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije kako bi se utvrdili finansijski i drugi faktori koji prate nastavak izgradnje kao i zakonske procedure obezbjeđenja i ugovaranja dodatnih radova.
- Nakon završetka inoviranog glavnog projekta i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta, Uprava za kapitalne projekte je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u februaru 2022. godine dostavila informaciju o nastavku realizacije predmetnog objekta kako bi, u skladu sa nadležnostima, istu dostavila Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem na razmatranje.
- Usvajanjem nevedene informacije, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 22.07.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Po predmetnom javnom nadmetanju, do utvrđenog roka, nije bilo pristiglih ponuda.
- Imajući u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka i utvrđeno je da je neophodno obezbjeđenje dodatnih sredstava o čemu je Uprava u decembru 2022. godine obavjestila nadležno Ministarstvo. Zaključkom br. 07-011/23-434/2, donesenim na 39. Sjednici Vlade Crne Gore održane 2. februara 2023. godine, data je saglasnost za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine FK Sutjeska u Nikšiću je raspisano 27.03.2023. godine.
- Ugovor za dodatne radove br. 01-334/23-4428/1 sa izvođačem radova „Roaming Montenegro“ iz Nikšića zaključen je 24.07.2023. godine na iznos od 993.298,68€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi, dobijen konačni izvještaj i objekat je predat korisniku na upotrebu krajem jula 2024. godine.
- U 2024. godini realizovano je 2.330.672,00€.



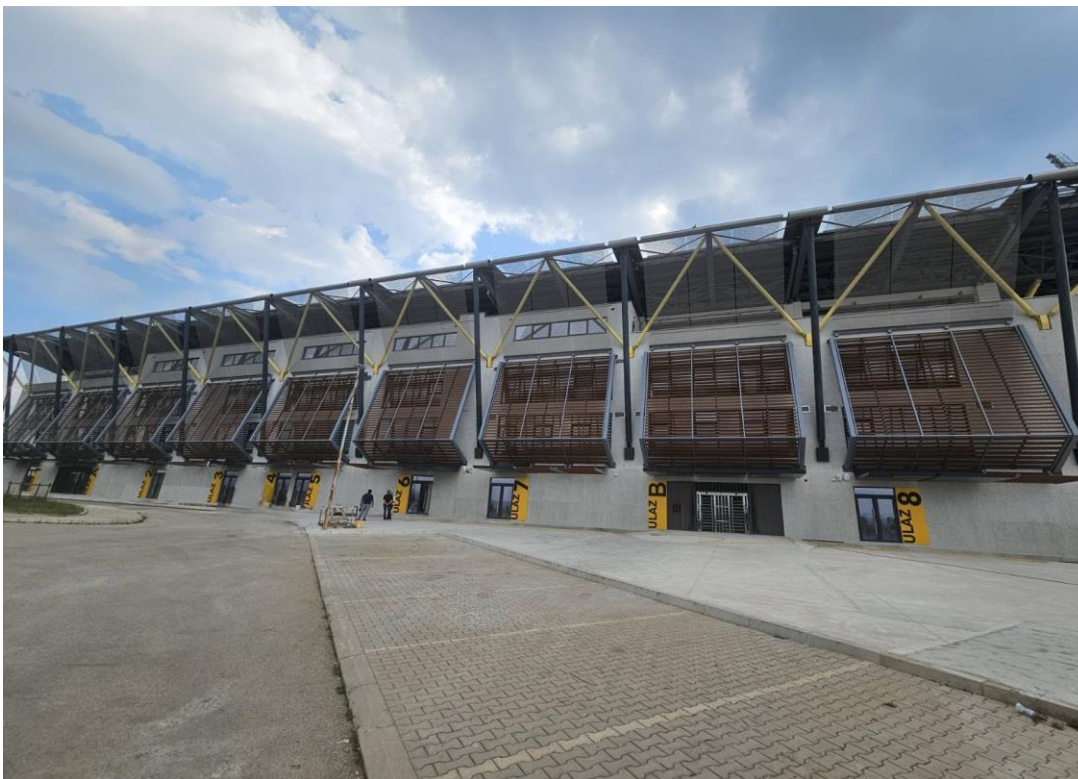

15.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji sportskih objekata po prioritetima ministarstva kao i za projekte: Izgradnja balon sale u Andrijevići; Rekonstrukcija 3 sportska igrališta na teritoriji Opštine Zeta; Rekonstrukcija terena za odbojku i tenis na gradskom stadionu „Pod Golubinjom“ u Pljevljima. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.

Rekonstrukcija terena za odbojku i tenis na gradskom stadionu „Pod Golubinjom“ u Pljevljima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine procijenjene vrijednosti 56.565,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7105/1 sa izvođačem radova „Tangram system“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.12.. godine na iznos od 67.741,73€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-723/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.02.. godine na iznos od 2.299,00€.
- U toku je uvođenje izvođača u posao.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

15.3. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo

- Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi Uprava za kapitalne projekte je raspisala poziv za obrađivača glavnog projekta Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova po sistemu „projektuj i izgradi” je raspisano 04.03.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3636/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem „Briv konstrukcion” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 4.713.850,06€.
- Revizija glavnog projekta je završena.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

15.4. Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva

- Naručilac tehničke dokumentacije je Opština Budva i nakon dostavljanja iste 09.12.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na adaptaciji otvorenog bazena “Pizana”. Tehničkom dokumentacijom adaptacije postojećeg bazena planirano je da se školjka bazena u najvećoj mjeri odvoji od cirkulacije vode iz otvorenog mora formiranjem zidova bazena gdje nedostaju, a time i spriječi unošenje mulja i pijeska u bazen, kao i da se školjka bazena i hodna površina oko bazena obloži keramičkim pločicama.
- Procijenjena vrijednost radova iznosila je 640.000,00€ bez pdv-a. Na javno nadmetanje za izbor izvođača radova nije bilo pistiglih ponuda.
- Nakon dorade i dopune projektne dokumentacije i usaglašavanja iste sa euro kodovima od strane Opštine Budva u 2024. godini ni nakon 4 raspisanih javnih nadmetanja procijenjene vrijednosti iznosi 1.200.000,00€ bez pdv-a za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala i javno nadmetanje za vršioca stručnog nadzora 22.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 12.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora ponovo je raspisano u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 25.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

15.5. Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

15.6. Izgradnja sportske hale u Plužinama – Projekt menadžeri Biljana Vukić i Aben Đokić

- Opština Plužine je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Opštini Plužine, u obuhvatu detaljnog urbanističkog plana „Centar”. Ukupna bruto površina objekta 2985.63m², spratnost objekta P+2.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2023. godine i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u martu 2024. godine. Ugovor

br. 01-334/24-3380/1 sa I.G.P. „Fidija” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.06.2024. godine na iznos od 4.723.032,70€.

- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1597/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 102.850,00€.
- Izvođač je uveden u posao i izvođeni su zemljani radovi. Usljed nastupanja zimske sezone, radovi su privremeno obustavljeni, gradilište je konzervirano sredinom decembra 2024. godine i isti će biti nastavljeni u . godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2024. godini realizovano je 1.499.786,62€.
- Problematika: Nema je.



15.7. Izgradnja olimpijskog bazena u Baru

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

15.8. Olimpijska kuća u Podgorici

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

15.9. Izgradnja balon sale u Zeti

- Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Bar, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

•

PROGRAM

XVI. UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA

POTPROGRAM

16. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR OBRAZOVANJE
--

16.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

- Projektom je obuhvaćena izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:

Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač „Entasis” d.o.o. Podgorica.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/ISOPEES/SER/01-22/1 je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je bio 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi za kapitalne projekte.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/ISOPEES/SER/01-8568/1 je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€ sa kompanijom „Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAI/ISOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 sa "GOKYOL INSAAT ve SANAYII A.S" zaključen je 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od 7 mjeseci.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
- Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
 - - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN” PODGORICA
 - - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ” PODGORICA
 - - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI” PODGORICA
 - - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA
 - - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ” NIKŠIĆ
 - - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ” HERCEG NOVI
 - - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA” BIJELO POLJE
 - - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA” NIKŠIĆ
- Tokom marta 2022. godine izvođač radova je uveden u posao na školskim objektima.
- Aneksom broj 1 ugovora o radovima implementacioni period za izvođenje radova je produžen do 31.12.2022. godine, a Administrativnim nalogom do 29.02.2024. godine.
- Radovi nisu završeni u predviđenom roku pa je Uprava za kapitalne projekte kao Ugovorno tijelo preduzela neophodne aktivnosti u skladu sa ugovornim mogućnostima. Naplaćena je garancija za dobro izvršenje posla i raskinut ugovor sa izvođačem radova.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova kako bi se završili preostali radovi.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

POTPROGRAM

16. b. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI OBRAZOVANJA

16.1. Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata obrazovanja po prioritetima ministarstva. Period realizacije 2022-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.735.537,19€ i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 40.000,00 i isto je u toku.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

Adaptacija krova vrtića JPU "Vukosava Ivanović" Bar

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 296.634,4€ i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7356/1 sa „Tehno gradnja” d.o.o. Pljevlja i „Arhiplan Cg” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.12.2024. godine na iznos od 357.769,79€.
- Ugovor br. 01-334/24-4936/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica zaključen je 03.09.2024. godine na iznos od 9.438,00€.
- Radovi na projektu će biti započeti 1. jula . godine na zahtjev Korisnika, nakon završetka školske godine.
- U 2024. godini realizovano je 3.997,84€.
- Problematika: Nema je.

Adaptacija školskog dvorišta JU Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović” – Podgorica

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 145.207,54€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje je raspisano u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6003/1 sa ponuđačima „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica, „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica sa podugovaračem „D&D-ing” d.o.o. Berane, zaključen je 28.10.2024. godine na iznos od 174.514,59€.
- Ugovor br. 01-908/24-4910/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.09.. godine na iznos od 7.139,00€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2024. godini realizovano je 98.722,77€.
- Problematika: Nema je.

Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za adaptaciju sistema grijanja raspisano je u julu 2024. godine.
- JU Srednja ekonomska škola Mirko Vešović- Ugovor broj 01-334/24-6736/3 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024, na iznos od 140.525,49€.
- U 2024. godini realizovano je 28.105,09.
- JU OŠ „Polica”, Berane - Ugovor broj 01-334/24-6736/1 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024 na iznos od 198.380,36€.
- U 2024. godini realizovano je 39.676,07€.

- JU OŠ „Kekec“, Sutomore i JU OŠ „Zarija Vujošević“, Zeta - Ugovor broj 01-334/24-6736/3 sa izvođačem radova „Ening“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024 na iznos od 467.175,81€.
- U 2024. godini realizovano 93.435,16€.
- JU OŠ „18 Oktobar“, Bioče i JU OŠ „Vojin Popović“, Drezga - Ugovor broj 01-334/24-6244/1 sa izvođačem radova „Thermia“ d.o.o. Podgorica zaključen je 08.11.2024 na iznos od 240.731,50€.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad adaptacijom sistema grijanja, raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 19.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Problematika: Nema je.

Izvođenje radova na sanaciji krova na objektu OŠ "Dašo Pavičić" u Sutorini

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje radova na sanaciji krova na objektu OŠ Dašo Pavičić raspisano je u novembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-930/1 sa „Entext inženjering“ d.o.o. Podgorica, zaljučen je 27.02.2024. godine na iznos od 42.341,29€.
- Zbog neusaglašenosti predmjera i predračuna sa stvarnim stanjem na terenu, kao i pojavom nepredviđenih radova, ugovor sa izvođačem je raskinut.

Rekonstrukcija OŠ "Vlado Milić" u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JU OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama, Nikšić

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 129.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovna javna nadmetanja raspisivana su u avgustu i oktobru 2024. godine procijenjene vrijednosti 165.285,00€ bez pdv-a na istima nije bilo pristiglih ponuda.
- Krajem decembra 2024. godine ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji škole JU OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja nove Osnovne škole u Igalu, Herceg Novi

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja Gimnazije u Baru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede

konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji fiskulturnih sala i sportskih terena za potrebe objekata obrazovanja po prioritetima ministarstva. Period realizacije 2022-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.
- U 2024. godini realizovano je 9.488,19€.

Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ "Risto Ratković" u Bijelom Polju i JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektni zadatak, na osnovu čega je Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju fiskulturne sale JU OŠ "Risto Ratković" u Bijelom Polju i JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-827/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.. godine na iznos od 60.379,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije raspisano je krajem decembra 2024. godine, procijenjene vrijednosti 20.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2024. godine dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u martu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-421/1 sa projektantom „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica zaključen je 30.01. godine na iznos od 121.000,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Tuškom putu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Zlatici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Beranama

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u januaru 2024. godine dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-2652/1 sa projektantom „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.05.2024. godine na iznos od 54.450,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 27.225,00€.
- Problematika: Nema je.

16.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Baru

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Baru.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 90.750,00 sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-4122/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 89.540,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-4885/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.546,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor 01-334/24-7106/1 sa „BB Solar“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.12.2024. godine na iznos od 3.194.149,32€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 65.000,00€ bez pdv-a. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donešena je 17.02.. godine.
- U toku je žalbeni postupak kod državne komisije za žalbe.
- U 2024. godini realizovano je 683.669,87€.

16.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Ulcinju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4124/1 sa projektantom „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 22.990,00€.

- Ugovor br. 01-334/23-2284/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je revizija projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.12. Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod“. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- Završetkom radova i dobijanjem upotrebne dozvole na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima u kompleksu komisija za tehnički pregled je konstatovala nedostatke na objektima zajedničkih sadržaja i podzemne garaže i u cilju otklanjanja istih Uprava za kapitalne projekte je u martu 2022. godini raspisala tendersku proceduru za izbor izvođača za dodatne radove po primjedbama komisije za tehnički pregled za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje dodatnih radova po primjedbama komisije za tehnički pregled raspisano je 27.12.2022. godine, Ugovor za izvođenje dodatnih radova br. 01-334/23-2506/1 sa izvođačem „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 181.476,10€. Radovi za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok završeni su početkom 2024. godine, izdata je upotrebna dozvola i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Ugovor br: 01-334/23-3866/1 od 03.07.2023. godine za vršenje stručnog nadzora nad dodatnim radovima za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok zaključen je sa „Urbi pro“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 6.037,90€.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena. Shodno prioritetima Univerziteta Crne Gore, kao sledeća faza realizacije kompleksa Akademije umjetnosti, planirana je izgradnja Fakulteta dramskih umjetnosti i u toku su aktivnosti na kompletiranju projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom od strane korisnika.
- U 2024. godini realizovano je 18.812,69€.
- Problematika: Nema je.

16.13. Izgradnja Osnovne i muzičke škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju



- Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu previđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, „Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00€.
- Problematika na realizaciji projekta u toku 2019. i 2020. godine odnosila se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciji o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove raspisano je 30.10.2020. godine. Ugovor za uzvođenje dodatnih radova br.01-334/21-4112/1 sa izvođačem, „Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 24.08.2021. godine, na iznos od 1.017.555,59€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja preostalih radova raspisano je 21.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9280/1 sa stručnim nadzorom, „Sistem-mne” d.o.o. Podgorica je zaključen 06.11.2020. godine, na iznos od 18.150,00€.
- Radovi na izgradnji odvijali se se usporenom dinamikom, zbog kojeg je došlo do

prorongiranja roka koji je uslovljen rješavanjem problematike po pitanju zahtjeva izvođača radova za uvećanje ugovorenih cijena zbog poremećaja cijena na tržištu.

- Takođe, u julu 2022. godine pojavili su se novi nepredviđeni radovi koji se odnose na priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu usled promjene situacije na terenu i novih uslova za priključenje objekta izdatih od nadležnog preduzeća "Vodovod Bistrica" u Bijelom Polju.
- Uprava za kapitalne projekte je u cilju rješavanja navedene tehničke problematike angažovala projektanta i revidenta za izradu projekta priključenja objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
- Ugovor za izradu glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3734/1 sa vršiocem usluge "ARHI KOD" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.09.2022. godine, na iznos od 1.815,00 €.
- Ugovor za reviziju glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju br: 01-334/22-3981/1 sa vršiocem usluge "URBI.PRO" d.o.o. Podgorica je zaključen 29.09.2022. godine, na iznos od 423,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe priključenja OŠ „Dušan Korać“, raspisano je 21.12.2022. godine procijenjene vrijednosti 52.000,00€ bez PDV-a. Na navedeno javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon odluke o poništenju postupka od 13.02.2023. godine, ponovo su pokrenute aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za ugovaranje radova na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu kao i preostalih završnih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje završnih radova na izgradnji OŠ „Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, raspisano je 31.03.2023. godine. Ugovor za izvođenje završnih radova br. 01-334/23-3145/1 sa izvođačem, "Unipred" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 529.821,329 €.
- Za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja završnih radova na izgradnji OŠ „Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, zaključen je ugovor br. 01-334/23-3507/1 od 13.06.2023. godine sa „Sistem – mne“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 9.670,00 €.
- Svi radovi na objektu su završeni 01.09.2023. godine i isti je predat korisniku na upotrebu.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte nakon čega je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta za Osnovnu školu u City kvartu raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-223/1 sa „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22.01.. godine na iznos od 204.490,00€.
- Javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-81/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.01.. godine na iznos od 16.698,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.20. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.21. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru

DUP-a „Univerzitetski centar”, Podgorica

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.04.2022. godine, procijenjene vrijednost iznosi 700.000,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-450/1 sa izvođačem radova „Conrex” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.01.2023. godine na iznos od 834.562,08€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 67.364,80€.

16.22. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica


- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
- S obzirom na veličinu i složenost objekta, predviđeno je da se rekonstrukcija odvija u više faza. Nakon što je Korisnik definisao prioritetne radove i dostavio tehničku specifikaciju koja se odnosi na zamjenu postojeće fasadne bravarije i radove na sanaciji fasade, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 28.11.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-2395/1 sa izvođačem radova „M solutions” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.04.2024. godine na iznos od 1.148.326,77€.
- Javno nadmetanje za izbor za izbor vršioca stručnog nadzora 29.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1328/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Genesis project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.03.2024. godine na iznos od 14.520,00€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2024. godini realizovano je 965.020,00€.
- Problematika: Nema je.

16.23. Rekonstrukcija objekata Zadružbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi

- Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Uprava za kapitalne projekte je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-53/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 12.01.2022. godine, na iznos od 53.240,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.12.2021. godine. Ugovor br. 101-334/22-6148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 29.12.2022. godine, na iznos od 10.648,00€.
- Nakon potpisivanja ugovora projektant je izvršio obilazak objekta i obavjestio Upravu za kapitalne projekte da je za potrebe snimanja postojećeg stanja, a uzimajući u obzir stanje objekta i terena oko objekta, neophodno obezbijediti bezbjedan i siguran pristup objektu. Uprava za kapitalne projekte je sa sa preduzećem „Bokić” d.o.o. Herceg Novi zaključila ugovor br. 01-334/22-1973/1 od 12.05.2022. godine za čišćenje lokacije na iznos od 6.050,00 €.
- Nakon raščišćavanja objekta i uklanjanja labilnih dijelova na zidovima i krovu objekta, izvršeno je geodetsko snimanje i urađeno je idejno rješenje. Krajem 2023. godine dobijena je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na urađeno idejno rješenje i započelo se sa izradom glavnog projekta.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 26.620,00€.
- Problematika: Nema je.

16.24. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici

- Arhitektonski fakultet je Upravi za kapitalne projekte dostavio revidovani glavni projekat.
- Arhitektonski fakultet se nalazi u kompleksu Univerzitetskog centra u Podgorici. Projektnom dokumentacijom predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta Arhitektonskog fakulteta, čime će ukupna bruto površina dograđenog i rekonstruisanog objekta iznositi 5.041,12m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 08.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5709/1 sa izvođačem, „Stambeno” d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos od 3.411.828,97€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-369/1 sa stručnim nadzorom „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” iz Podgorice, je zaključen 25.01.2023. godine, na iznos od 32.827,30€.

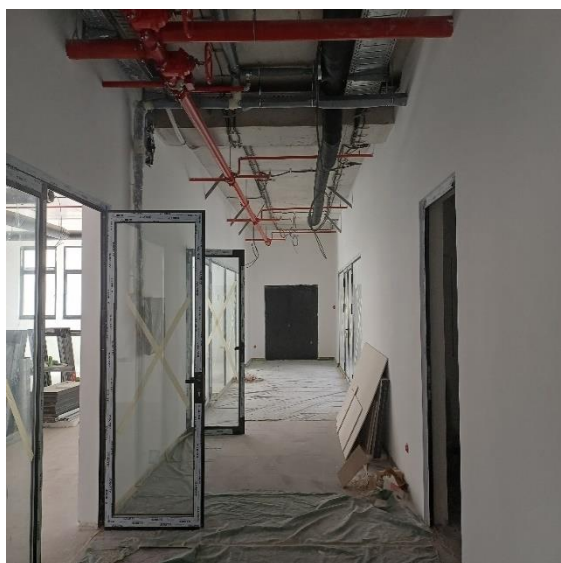

- Izvršena je prijava građenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i izvođač je uveden u posao 01.03.2023. godine.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke u projektnoj dokumentaciji što je za posljedicu imalo izradu izmjena i dopuna glavnog projekta od strane Arhitektonskog fakulteta i pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 28.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1586/1 sa izvođačem radova „Stambeno“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 721.658,22€.
- U toku su podopolagački i instalaterski objekti u unutrašnjosti objekta, kao i radovi na

uređenju terena.

- U 2024. godini realizovano je 2.166.903,77€.
- Problematika: Nema je.

16.25. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojih je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, raspisivano je u maju, a zatim u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 2.105.000,00€ bez pdv-a i na istim nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.26. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici

- Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na dopuni i doradi projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljen revidovani glavni projekat, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.27. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor“ Masline

- Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo revidovan glavni projekat.
- Ukupna površina objekta je 5.761,11 m².
- Objekat se sastoji od 3 etaže, podrum, prizemlje i prvi sprat i projektovana je za 1100 učenika u dvije smjene. U podrumu škole predviđeni su toaleti, garderobe, multimedijaska učionica, biblioteka, produženi boravak, pomoćne i tehničke prostorije (uključujući podstanicu za termotehničke instalacije). U prizemlju škole predviđene su učionice, kabineti, hol, zbornica, kancelarija direktora i drugog osoblja (pomoćnici direktora, sekretar, računovođa, psiholog, pedagog, defektolog), toaleti, tehničke i pomoćne prostorije. Na prvom spratu škole predviđene su učionice, hol, toaleti, tehničke i pomoćne prostorije.
- Projekat će se finansirati iz sredstava Evropske investicione banke, granta Bilateralne Donor Grupe i Vlade Crne Gore.
- Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti koje se odnose na ugovaranje izvođenja radova. Ugovaranje vršenja stručnog nadzora nad građenjem škole sprovodi Ministarstvo prosvjete.
- Ugovor za vršenje stručnog nadzora nad građenjem škole je potpisalo Ministarstvo prosvjete sa kompanijom "Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company".
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 sa konzorcijumom LD „Gradnja“ d.o.o, „Ramel“ d.o.o., „Eurozox“ d.o.o. i „Ening“ d.o.o., potpisan je 24.08.2023. godine na iznos od 6.967.177,01€.
- U toku su završni radovi na izgradnji objekta.
- U 2024. godini realizovano je 2.365.064,10€.
- Problematika: Nema je.

16.28. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat

- Opština Tivat je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 27.07.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-29/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 10.01.2023. godine na iznos od 4.716.740,29€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-4821/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22.08.2023. godine, na iznos od 94.911,19€.
- Izvođač radova je uveden u posao 27.09.2023. godine.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2024. godini realizvano je 1.720.057,17€.
- Problematika: Nema je.



16.29. Renoviranje OŠ "Boško Radulović" – Komani

- Krajnji korisnik je Upravi za kapitalne projekte u aprilu 2022. godine dostavio projektni zadatak za adaptaciju objekta škole OŠ „Boško Radulović” u Komanima.
- Uprava za kapitalne projekte je 18.05.2022. godine potpisala ugovor br. 01-334/22-2075/1 sa „Inter project” d.o.o. iz Podgorice za izradu projekta adaptacije. Nakon toga Uprava je raspisala tender za izvođenje radova 07.10.2022. godine.
- Ugovor broj 01-333/23-1232/1 sa izvođačem radova „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 01.03.2023. na iznos od 150.150,99€. Ugovor broj 01-334/23-1500/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Cema” d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.03.2023. godine na iznos od 3.494,48€.
- Završeno je izvođenje radova i objekat je predat na upotrebu korisniku.

Uređenje terena

- Ugovor broj 01-334/23-5498/1 sa izvođačem radova „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad,

- zaključen je 25.09.2023. na iznos od 184.918,43€ za izvođenje radova na uređenju terena.
- Ugovor broj 01-334/23-5689/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 9.196,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2024. godini realizovano je 7.899,60€.

16.30. Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u Opštini Nikšić

- U toku su aktivnosti usaglašavanja potreba od strane Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Nakon što potrebna dokumentacija bude dostavljena Upravi za kapitalne projekte, Uprava će pokrenuti aktivnosti na nabavci vozila.
- Krajem 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za nabavku autobusa za gradski i dački prevoz procijenjene vrijednosti 410.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6678/1 sa „Ben kov” d.o.o. Tivat, zaključen je 02.12.2024. godine na iznos od 499.596,9€.
- Završena je primopredaja autobusa od strane dobavljača i predstavnika Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

16.31. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko” u Baru

- Osnovna škola „Meksiko” je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Baru, KO Polje, opština Bar. Površina objekta je 2.370 m², spratnosti prizemlje i sprat.
- Osnovna škola dostavila je projektnu dokumentaciju za sanaciju krovnog pokrivača u postojećim gabaritima.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.02.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7534/1 sa izvođačem „M Solutions” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.12.2024. godine, na iznos od 263.931,25€.
- Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7394/1, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 6.050,00€.
- Uzimajući u obzir ugovorne obaveze, vremenske uslove i bezbjednost učenika dogovoreno je da se prijava radova izvrši 15 dana prije kraja školske godine, kako bi radovi započeli nakon završetka školske godine.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
-
- Problematika: Nema je.

16.32. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići” u Pečuricama, Opština Bar

- Opština Bar je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
 - Objekat se nalazi u dvorištu Osnovne škole „Mrkojevići” Pečurice, Opština Bar.
 - Predviđena spratnost objekta je prizemlje i sprat. Dimenzije fiskulturne sale su 30.65x20.00m.
 - Fiskulturna sala posjeduje: sportski teren, tribine kapaciteta 184 sjedišta, dvije svlačionice sa toaletima, pet toaleta, špet kancelarija, salu za sastanke i šest tehničkih prostorija.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-784/1 sa izvođačem radova „Kalamper” d.o.o. Bar, zaključen je 20.02.2024. godine na iznos od 1.164.422,34€.
 - Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7611/1, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 32.186,00€.
- Završeni su zemljani i armirano betonski radovi, a u toku su radovi na izradi čelične krovne

konstrukcije.

- U 2024. godini realizovano je 659.799,61€.
- Problematika: Radovi su obustavljeni zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji na koje je ukazao stručni nadzor.
- Prijedlog rješenja: Opština Bar, kao nosilac izrade i revizije glavnog projekta, je preuzela potrebne aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije nakon čega će se stvoriti uslovi za nastavak i završetak realizacije ovog projekta.



16.33. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektnu dokumentaciju, te je Uprava za kapitalne projekte na osnovu iste, pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.850.000,00€ bez pdv-a, i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-612/1 sa „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.02.. godine na iznos od 2.348.223,75€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je krajem decembra 2024. godine, procijenjene vrijednosti 60.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.34. Izgradnja sportske sale za JU OŠ „Bajo Jojić” u Andrijevici

- Nakon dostavljanja projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte je u junu 2022. godine pristupila aktivnostima na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta idejnog rješenja i glavnog projekta. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Andrijevica, Osnovne škole „Bajo Jojić” i JU Srednje mješovite škole.
- Projektnim zadatkom planirana je rekonstrukcija – dogradnja sportske sale bruto površine do 1.700 m². Sadržaji obuhvataju igralište za košarku i odbojku, montažne tribine,

- svlačionice, prostoriju za nastavnika, spravarnicu kao i ostale tehničke i prateće prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.06.2022. godine Ugovor br. 01-334/22-5708/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2022.godine, na iznos od 27.588,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-819/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.02.2023. godine na iznos od 4.658,50€. S obzirom da je po prvobitnom idejnom rješenju projektantska procijenjena vrijednost izgradnje objekta prevazilazila iznos investicije opredijeljen kroz obrazloženje projekta u budžetu, izvršena je racionalizacija idejnog rješenja.
- Završena je revizija projektne dokumentacije krajem februara . godine.
- U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.35. Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici

Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole "Ing. Marko Radević", Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak za adaptaciju fiskulturne sale za potrebe JU „Ing. Marko Radević”, Podgorica.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je 07.11.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-7294/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2023. godine na iznos od 17.908,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7348/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Arhiplan” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2023. godine na iznos od 7.260,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-1797/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 09.04.2024. godine na iznos od 9.607,40€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisivano je u aprilu, a zatim i u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 592.014,7€ i na istim nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje sa uvećanom procijenjenom vrijednošću raspisano je u oktobru 2024. godine i isto je poništeno zbog neispravnih ponuda.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2024. godini realizovano je 25.168,00€.
- Problematika: Nema je.

16.36. Izgradnja fiskulturne sale „Ivo Visin” Prčanj, Kotor

- Opština Kotor je dostavila projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta izgradnje fiskulturne sale „Ivo Visin” u Prčnju raspisano je u novembru 2023. godine i isto je ponovljeno u decembru 2023. godine procijenjene vrijednosti 30.000,00€ bez pdv-a. Dva puta je podnesena žalba na donesenu odluku, stoga je postupak kod Državne komisije za kontrolu rada javnih nabavki.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6677/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.12.2024. godine na iznos od 5.638,6€.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 18.550,00€.

- Problematika: Nema je.

16.37. Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U aprilu 2024. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 6.000.000,00€ bez pdv-a, kao i javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora.
- Ugovor br. 01-908/24-4323/1 sa „Kozorcijumom „LD gradnja“, „Ramel“ i „Ening Nikšić“ d.o.o., zaključen je 05.08.2024. godine, na iznos od 7.204.772,28€.
- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbjeđuje stručni nadzor nad izvođenjem rješenja.
- U toku je je vrednovanje pristiglih ponuda.
- U 2024. godini realizovano je 3.008.697,50€.
- Problematika: Nema je.

16.38. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović“ – područno odjeljenje u Donjim lugama, Opština Berane

- Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2023. godine dostavilo projektni zadatak Upravi za kapitalne projekte.
- Ugovor o izradi glavnog projekta rekonstrukcije br. 01-334/23-3636/1 sa preduzećem „Urbi.pro“, zaključen je 19.06.2023. godine na iznos od 9.667,90€.
- Ugovor o vršenju revizije br. 01-334/23-36511 sa preduzećem „Arhiplan CG“, zaključen 20.06.2023. godine na iznos od 8.349,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7607/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ingenium“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3573/1 sa ponuđačem „Gold Grading“ d.o.o. Berane i podugovaračem „Civil Engineer“ Podgorica, zaključen je 24.06.2024. godine na iznos od 356.235,83€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2024. godini realizovano je 73.088,31€.
- Problematika: Nema je.

16.39. Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine procijenjene vrijednosti 1.121.992,45€ i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 22.600,00€ i isto je poništeno.
- U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Nema je.

16.40. Izgradnja novog vrtića u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-269/1 sa „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 24.01. godine na iznos od 1.979.583,46€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine.

Ugovor br. 01-334/25-428/1 sa „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.01. godine na iznos od 15.651,35€.

- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
- Problematika: Radovi se ne izvode.
- Prijedlog rješenja: Obaveza Opštine Nikšić je da izmjesti trafostanicu, koja se nalazi na parceli koja je predviđena za izgradnju vrtića, nakon čega će otpočeti radovi.

16.41. Izgradnja paviljona u sastavu OŠ „Oktoih”, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor projektanta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi”, raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7193/1 sa „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2024. godine na iznos od 2.831.400,00€.
- Ugovor br. 01-334/25-328/1 sa revidentom „Institut za razvoj i istraživanje” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.01. godine na iznos od 7.502,00€.
- U toku su aktivnosti na izradi glavnog projekta.
- U 2024. godini realizovano je 10.043,98€
- Problematika: Nema je.

16.42. Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.
