



**CRNA GORA**  
**UPRAVA JAVNIH RADOVA**

Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta  
za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine



Februar 2020. godine

## **SADRŽAJ**

<b>SADRŽAJ</b> .....	<b>3</b>
<b>REZIME</b> .....	<b>9</b>
<b>TABELARNI PREGLED REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA</b> .....	<b>21</b>
<b>REALIZACIJA PO OBJEKTIMA</b> .....	<b>34</b>
<b>1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA</b>	
<b>ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA</b> .....	<b>35</b>
1.1. <i>Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici</i> .....	36
1.2. <i>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa</i> .....	36
1.3. <i>Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici</i> .....	38
1.4. <i>Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje I upotrebu licima smanjene pokretljivosti</i> .....	39
1.5. <i>Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju</i> .....	40
1.6. <i>Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju</i> .....	41
1.7. <i>Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ I PJP na Zlatici, u Podgorici</i> .....	42
1.8. <i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici</i> .....	43
1.9. <i>Rekonstrukcija kompleksa kasarna "Masline" za potrebe Vojske Crne Gore</i> .....	43
1.10. <i>Objekti za potrebe Državne revizorske institucije Monstat-a</i> .....	43
1.11. <i>Objekat za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Hrvatskoj</i> .....	44
1.12. <i>Objekti za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac</i> .....	44
<b>2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE</b> .....	<b>45</b>
2.1. <i>Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici</i> .....	46
2.2. <i>Rekonstrukcija objekta "Dvorac kralja Nikole" u Nikšiću</i> .....	47
2.3. <i>Hitne sanacione mjere i nabavka opreme za objekte kulture</i> .....	47
2.4. <i>Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs"</i> .....	48
2.5. <i>Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture</i> .....	49
2.6. <i>Muzej savremene umjetnosti u Podgorici</i> .....	49
2.7. <i>Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju</i> .....	49
<b>3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA</b> .....	<b>50</b>
3.1. <i>Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru</i> .....	51
3.2. <i>Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru</i> .....	52
3.3. <i>Izgradnja sportskih terena i sala</i> .....	53
3.4. <i>Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću</i> .....	54
3.5. <i>Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama</i> .....	54

3.6. Izgradnja školske sportske dvorane u Gusinju	54
3.7. Izgradnja otvorenog bazena-kupališta u Pljevljima	55
3.8. Rekonstrukcija zapadne tribune stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	55
3.9. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	56
<b>4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE</b>	<b>57</b>
4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	58
4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	61
4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	62
4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja	62
4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	64
4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	66
4.7. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih Sistema	67
4.8. Sanacija odlagališta u Plavu	67
4.9. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina u Rožajama	68
4.10. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	68
4.11. Vodovod Šavnik	69
4.12. Vodovod Ćosovsko vrelo u Rožajama	69
<b>5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>70</b>
5.1. Rekonstrukcija "Ribarske ulice" u Plavu	71
5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu	71
5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	72
5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju	80
5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	81
5.6. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	82
5.7. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci- Njegnjevo u Bijelom Polju	83
5.8. Izgradnja gradske pijace u Rožajama	83
5.9. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje	84
5.10. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu	85
5.11. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica u Plavu	86
5.12. Izgradnja mosta u Haremima u Beranama	86
5.13. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu	86
5.14. Putni pravac Monte-Rose	86
5.15. Rekonstrukcija trga u Plavu	86
5.16. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar	87

<b>6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA .....</b>	<b>88</b>
6.1. <i>Rekonstrukcija energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici</i> .....	89
6.2. <i>Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici</i> .....	89
6.3. <i>Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici</i> .....	89
6.4. <i>Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici</i> .....	89
<b>7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA.....</b>	<b>91</b>
7.1. <i>Izgradnja Doma starih u Podgorici</i> .....	92
7.2. <i>Izgradnja Doma starih u Nikšiću - II faza</i> .....	93
7.3. <i>Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići" u opštini Cetinje</i> .....	93
7.4. <i>Dom starih u Plavu</i> .....	94
7.5. <i>Dom starih u Rožajama</i> .....	94
<b>8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA.....</b>	<b>95</b>
8.1. <i>Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a</i> .....	96
8.2. <i>Izgradnja objekta vrtića u Rožajama</i> .....	98
8.3. <i>Vrtić u City kvartu u Podgorici</i> .....	99
8.4. <i>Izrada Glavnog projekta rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici</i> .....	100
8.5. <i>Izgradnja objekta Srednje stručne škole u gradskoj opštini Golubovci u Podgorici</i> .....	100
8.6. <i>Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja</i> .....	101
8.7. <i>Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima u Podgorici</i> .....	101
8.8. <i>Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici</i> .....	102
8.9. <i>Rekonstrukcija objekta O.Š. u Baću i Kalačima, opština Rožaje</i> .....	102
8.10. <i>Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje I rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom</i> .....	102
8.11. <i>Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju</i> .....	103
8.12. <i>Izgradnja Osnovne škole u Rožajama</i> .....	103
8.13. <i>Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, Bijelo Polje</i> .....	104
8.14. <i>OŠ "Lovćenski partizanski odred" na Cetinju</i> .....	104
8.15. <i>Naučno-tehnološki park u Podgorici</i> .....	104
8.16. <i>Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju</i> .....	105
8.17. <i>Osnovna škola "Karabuško polje" u Tuzima</i> .....	107
8.18. <i>Sprovođenje javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a</i> .....	107
<b>9. UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE.....</b>	<b>108</b>
9.1. <i>Ski centar na lokalitetu "Kolašina 1600"</i> .....	109
9.2. <i>Ski centar na lokalitetu "Cmiljača" u Bijelom Polju</i> .....	114

9.3. Ski centar na lokalitetu "Žarski" Mojkovac	117
9.4. Ski centar na lokalitetu "Hajla" u Rožajama	120
9.5. Ski centar na lokalitetu "Durmitor" Žabljak	121
9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	123
9.7. Turistička infrastruktura- izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	128
9.8. Objekat "Kuća voća" u Andrijevici	129
9.9. Objekat nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	130
9.10. Objekat "Kuće vina" u opštini Bar	131
9.11. Izrada projekta rekonstrukcija Kanli Kule u Herceg Novom	131
9.12. Nacionalni parkovi	131
9.13. Uređenje Ali-pašinih izvora u Gusinju	133
<b>10. ZAKON O PRIJESTONICI</b>	<b>134</b>
10.1. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	135
10.2. Sanacija sportskih sala SRC Cetinje	135
10.3. Izgradnja I rekonstrukcija distributivne mreže snadbijevanja vodom Cetinja	135
10.4. Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks	135
10.5. Izgradnja saobraćajnice ulice Vojvode Boža i raskrsnice ulice prema ulici Sava Burića	135
10.6. Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos"	135
10.7. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	136
10.8. Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci	136
10.9. Prihvatište za napuštene kućne ljubimce (azil)	136
10.10. Izgradnja I rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja	136
10.11. Kupovina nekretnina I učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	136
10.12. Izrada tehničke I druge dokumentacije	136
10.13. Izgradnja I opremanje "Centra za kulturu Prijestonice"	137
10.14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	137
10.15. Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju	137
10.16. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju	137
10.17. Kupovina nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a	137
<b>11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA</b>	<b>138</b>
11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama	139
11.2. Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	140
11.3. Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru	141
11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos –Trebešica"	142
11.5. Demontaža postojeće, nabavka I montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	143


11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	143
11.7. Podrška u pripremi projekata za sektore Zaštite životne sredine I Klimatskih akcija	143
11.8. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	144
11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	144
11.10. Podrška u implementaciji, monitoring i izvještavanju u oblasti upravljanja hemikalijama, IPPC, kvalitetom vazduha, buka, zaštite prirode, civilne zaštite i klimatske akcije	144
11.11. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini	144
11.12. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	145
11.13. Monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS II)	145
11.14. Nabavka opreme za sprječavanje zagađenja mora motornim uljem sa plovila	145
11.15. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta I usklađivanje sa EU ACQUIS u oblasti saobraćaja	145
11.16. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori	145
11.17. Rekonstrukcija željezničke stanice u Bijelom Polju	146
11.18. SOPEES-Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje I socijalne politike	146
<b>12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA</b>	<b>148</b>
<b>13. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM</b>	<b>149</b>
13.1. Stambeni objekti u Beranama	150
13.2. Dom starih u Nikšiću	151

**REZIME**



Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirano je da Uprava javnih radova realizuje sredstva u ukupnom iznosu od 72.490.327,42€, od čega je 62.291.827,42€ iz opštih izvora, 16.500,00€ iz kreditnih izvora, 101.000,00€ donacija i 10.081.000,00€ IPA sredstva.

U skladu sa tim svi projekti Kapitalnog budžeta, kao što je definisano Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom opredijeljena su sredstva na sledeći način:

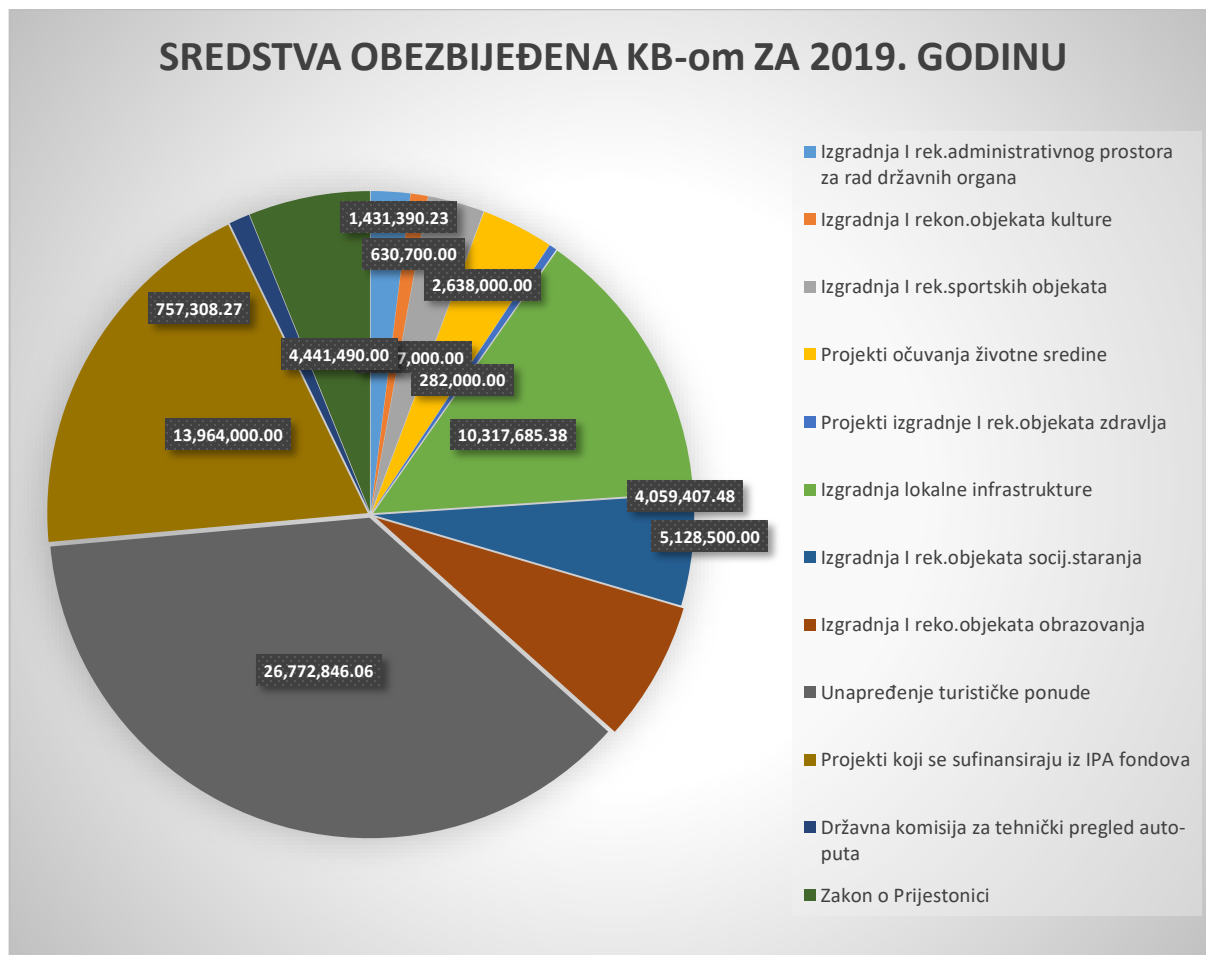

Kapitalnim budžetom je predviđeno da Uprava javnih radova sprovodi aktivnosti na realizaciji 138 projekata koji se finansiraju iz sledećih izvora:

- Opšti prihodi: 102 projekata
- Opšti prihodi uz sufinansiranje (donacije stranih Vlada i organizacija): 12 projekata
- Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa, kreditnih sredstava Evropske investicione banke, uz sufinansiranje iz opštih prihoda: 18 projekata
- Kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope, uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a: 6 projekata (Projekti Dječijih vrtića - projekat izgradnje dječijeg vrtića Baru, Ulcinju,, Pljevljima, Bloku 6 u Podgorici, Tuzima kao i projekat rekonstrukcije vrtića).

U članu 10 Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

- "Sanitarne deponije"
- "Vodosnabdijevanje i otpadne vode"

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

- "Projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa"
- "Projekat unapređenja obrazovanja"
- Dječiji vrtić u Baru
- Dječiji vrtić u Ulcinju
- Dječiji vrtić u Pljevljima
- Dječiji vrtić u Bloku VI u Podgorici
- Dječiji vrtić u Tuzima
- Rekonstrukcija vrtića.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u članu 11 propisano je: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to za projekte čija je realizacija otpočela:

Donacije stranih Vlada i organizacija:

- Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici
- Sanacija deponije na Žabljaku
- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Vranjini
- Sanacija odlagališta u Plavu
- Izgradnja O.Š. u Sukobinu, Ulcinj

Bespovratna sredstva iz predpristupnih IPA programa:

- Za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja, sanaciju nesanitarnih odlagališta otpada, projekte saobraćajne infrastrukture i projekte iz oblasti tehničke pomoći.




Uprava javnih radova je u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine sklopila **217** ugovora i to:

- 84 ugovora za izvođenje radova
- 60 ugovora za vršenje stručnog nadzora
- 28 ugovora za izradu projektne dokumentacije
- 38 ugovora za vršenje revizije
- 7 ugovora za usluge

Ukupna vrijednost svih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.2019. godine zaključno sa 31.12.2019. godine iznosi **90.059.818,90 €**.

U februaru 2019. godine Uprava javnih radova sklopila je Ugovor sa Prijestonicom Cetinje o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" koji obuhvata 17 projekata, a ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ovog Ugovora iznose **4.960.000,00 €**. Ovi projekti obuhvaćeni su Kapitalnim budžetom kroz program Zakon o Prijestonici.

U avgustu 2019.godine Uprava javnih radova sklopila je Ugovor o realizaciji projekta Izgradnje trga I šetališta u Sutomoru- II faza sa Opštinom Bar I Morskim dobrom Crne Gore gdje je obaveza Vlade Crne Gore da u 2019.godini splati sredstva u vrijednosti do **100.000,00 €**, a u 2020. i 2021.godini preostala sredstva u vrijednosti do **380.925,21 €**.

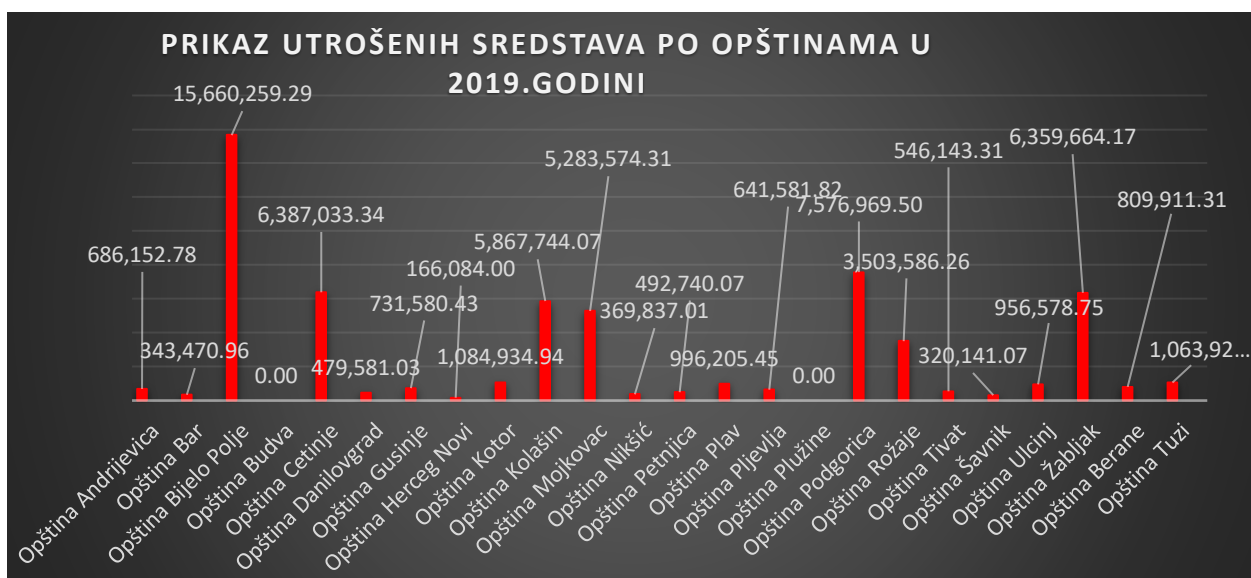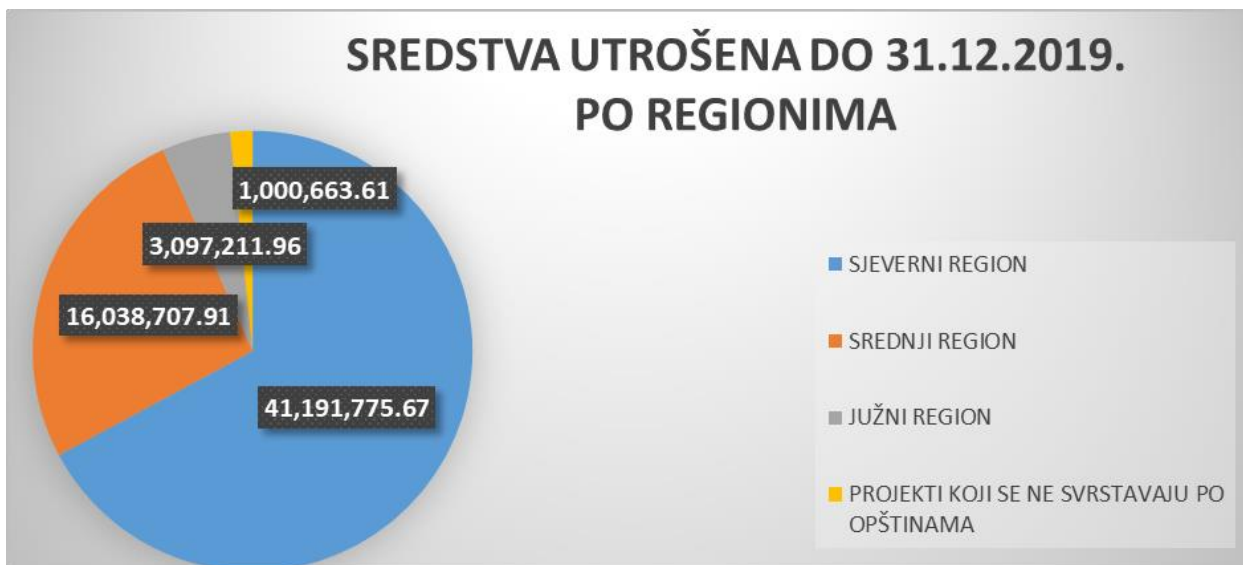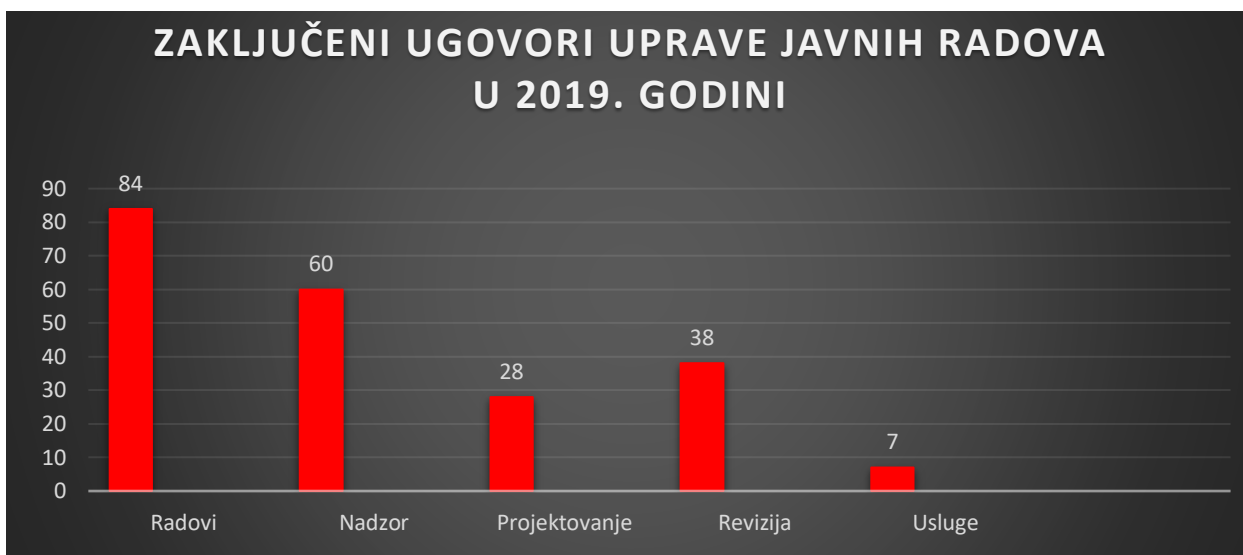

	<b>UKUPNA PLAĆANJA PO OPŠTINAMA</b>	<b>REALIZOVANO OD 01.01. DO 31.12.2019. godine - €</b>
1.	Opština Andrijevica	686,152.78
2.	Opština Bar	343,470.96
3.	Opština Berane	809,911.31
4.	Opština Bijelo Polje	15,498,893.93
5.	Opština Budva	0.00
6.	Opština Cetinje	6,387,033.34
7.	Opština Danilovgrad	479,581.03
8.	Opština Gusinje	731,580.43
9.	Opština Herceg-Novi	166,084.00
10.	Opština Kotor	1,084,934.94
11.	Opština Kolašin	5,867,744.07
12.	Opština Mojkovac	5,283,574.31
13.	Opština Nikšić	369,837.01
14.	Opština Petnjica	492,740.07
15.	Opština Plav	996,205.45
16.	Opština Pljevlja	641,581.82
17.	Opština Plužine	0.00
18.	Opština Podgorica	7,738,334.86
19.	Opština Rožaje	3,503,586.26
20.	Opština Tivat	546,143.31
21.	Opština Tuzi	1,063,921.67
22.	Opština Šavnik	320,141.07
23.	Opština Ulcinj	956,578.75
24.	Opština Žabljak	6,359,664.17
	Projekti IPA-e koji se ne svrstavaju po opštinama, a odnose se na usluge i robe	0.00
	Projekti KB koji se ne svrstavaju po opštinama	1,000,663.61
	Državna komisija za tehnički pregled autoputa	731,676.48
	<b>UKUPNO realizovano u 2019.:</b>	<b>62,060,035.63</b>

**\*Tabelarni prikaz potrošnje sredstava po programima\***

	<b>KAPITALNI BUDŽET (EUR)</b>	<b>Realizacija Stanje na 31.12.2019.</b>	<b>Realizacija u odnosu na godišnji KB (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</b>	<b>1.431.390,23 €</b>	<b>1.400.846,79 €</b>	<b>97,86 %</b>
<b>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</b>	<b>630.700,00 €</b>	<b>625.141,66 €</b>	<b>99,11 %</b>
<b>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</b>	<b>2.067.000,00 €</b>	<b>2.055.079,18 €</b>	<b>99,42 %</b>
<b>Izgradnja lokalne infrastrukture</b>	<b>10.317.685,38 €</b>	<b>10.292.959,18 €</b>	<b>99,76 %</b>
<b>Projekti očuvanja životne sredine</b>	<b>2.638.000,00 €</b>	<b>2.577.444,76 €</b>	<b>97,70 %</b>
<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</b>	<b>282.000,00 €</b>	<b>269.288,40 €</b>	<b>95,49 %</b>
<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</b>	<b>4.059.407,48 €</b>	<b>3.951.120,57 €</b>	<b>97,33 %</b>
<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke</b>	<b>5.128.500,00 €</b>	<b>5.573.156,79 €</b>	<b>108,67 %</b>
<b>Unapređenje turističke ponude</b>	<b>26.772.846,06 €</b>	<b>26.740.674,23 €</b>	<b>99,87 %</b>
<b>Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova</b>	<b>13.964.000,00 €</b>	<b>3.398.059,91 €</b>	<b>24,33 %</b>
<b>Državna komisija za auto put Bar- Boljare</b>	<b>757.308,27 €</b>	<b>748.783,47 €</b>	<b>98,87 %</b>
<b>Zakon o Prijestonici</b>	<b>4.441.490,00 €</b>	<b>4.427.480,69 €</b>	<b>99,68 %</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>72.490.327,42 €</b>	<b>62.060.035,63 €</b>	<b>85,61%</b>

Uprava javnih radova je u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine raspisano je **186** javnih nadmetanja čija ukupna vrijednost iznosi **128.554.880,00 €**.

Napominjemo da je Plan javnih nabavki usvojen 31. januara 2019. godine i da u mjesecu januaru nije bilo raspisivanja javnih nadmetanja.

Uprava javnih radova je u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine realizovala sredstva u ukupnom iznosu od 72.490.327,42 € što je 85,61 % ukupno opredijeljenih sredstava Kapitalnim budžetom za 2019. godinu.

**Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlaštenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava, u 2018. godini donijela sljedeće Zaključke koji se odnose na rad Direkcije javnih radova:**

**1. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.12.2018. godine** zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da do 31.januara 2109.godine pripremi plan zapošljavanja u Upravi javnih radova i pokrene proceduru u skladu sa planom u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja i izvršavanja obaveza proisteklih iz finansijskih sporazuma.

- Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Uprava javnih radova da do kraja februara 2019. godine pokrene proceduru realizacije aktivnosti planiranih za završetak radova na projektu »Sanacija nesanitarnog odlagališta »Čafe« u Baru.

- Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da do 31.januara 2109.godine informiše Vladu o statusu realizacije projekta »Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane«.

- Zadužuju se Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, uključeni u realizaciju Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za Crnu Goru CAP 2014 da u saradnji sa Ugovornim tijelima preduzmu sve neophodne radnje u cilju uspješne realizacije projekata.

**2. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.12.2018. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Uprava javnih radova da Kapitalnim budžetom za 2020.godinu planira sredstva u iznosu od 46.000,00 € za izradu tehničke dokumentacije, shodno Akcionom planu prilagođavanja objekata javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti.

- Zadužuje se Uprava javnih radova da Kapitalnim budžetom za 2020.godinu planira sredstva u iznosu od 251.170,00 € za izvođenje radova na prilagođavanju objekata, shodno Akcionom planu prilagođavanja objekata javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti.

**3. Vlada Crne Gore je na sjednici od 28.02.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Uprava javnih radova da u roku od 30 dana od dostavljanja kompletne dokumentacije neophodne za raspisivanje javnog nadmetanja raspiše tender za izradu tehničke dokumentacije za objekat na uglu ulice Stanka Dragojevića i Bulevara Ivana Crnojevića koji će biti ustupljen Ministarstvu pravde i Ministarstvu vanjskih poslova.

- Zadužuje se Uprava javnih radova da raspiše tender za odabir najpovoljnijeg izvođača za završetak građevinskih radova nakon što se za to stvore uslovi završetkom izrade i revizije Glavnog projekta.

**4. Vlada Crne Gore je na sjednici od 14.03.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuju se ministri i starješine samostalnih organa uprave da na kolegijumima s rukovodnim kadrom obezbijede redovno prisustvo rukovodioca ili službenika zaduženog za odnose sa javnošću.

- Vlada je usvojila informaciju o realizaciji projekta »Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću«.

- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić, VD direktora Uprave javnih radova, da u ime Vlade potpiše Ugovor o realizaciji projekta »Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću«.

- Zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Upravom javnih radova planira sredstva u okviru godišnjih zakona o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu u ukupnom iznosu od 3.300.000 € na ime kofinansiranja projekta.

#### **5. Vlada Crne Gore je na sjednici od 21.03.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave javnih radova koji je dostavljen aktom Ministarstva održivog razvoja i turizma br: 101-392/6 od 15.03.2019.godine.

#### **6. Vlada Crne Gore je na sjednici od 11.04.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Uprava javnih radova da do 30.04.2019.godine pripremi Plan zapošljavanja i pokrene proceduru u skladu sa planom.

- Zadužuju se Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i Uprava javnih radova da do 31.03.2019. izvrše efikasno raspoređivanje službenika u dijelu praćenja pojedinačnih ugovora u okviru implementacije Godišnjih i Višegodišnjih akcijskih programa u cilju efikasnijeg tretmana postojećih rizika i da o tome obavijeste Nacionalnog službenika za ovjeravanje.

#### **7. Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.05.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila informaciju o sporazumnom raskidu ugovora o građenju i ugovora o vršenju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vrtića u Baru.

- Vlada je prihvatila sporazum o raskidu ugovora o građenju između Uprave javnih radova i »LD gradnja« doo Nikšić, »Ivkon« doo Nikšić i »Telemont« doo Podgorica.

- Vlada je prihvatila sporazum o raskidu ugovora o uslugama vršenja nadzora između Uprave javnih radova i konzorcijuma »Ing-invest« doo Danilovgrad, »Urbi-pro« doo Podgorica, »Montinspekt« doo Podgorica i »Geoprojekt Perišić« doo Podgorica.

- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić, VD direktora Uprave javnih radova da u ime Vlade potpiše sporazumne raskide ugovora.

#### **8. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.06.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Uprava javnih radova da do 15.jula 2019.godine Nacionalnom službeniku za ovjeravanje pripremi i dostavi poseban plan obuka za službenike angažovane u periodu decembar 2018.- maj 2019.godine kao i da ih dostavi Upravi za kadrove u cilju uključivanja specifičnih obuka u Plan Uprave za kadrove za 2020.godinu.

- Zadužuju se implementacione agencije Uprava javnih radova i Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći da nastave sa informisanjem nacionalnog službenika za ovjeravanje o glavnim aktivnostima na pojedinačnim projektima iz domena svoje nadležnosti.

#### **9. Vlada Crne Gore je na sjednici od 04.07.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila informaciju o realizaciji projekta »Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru« opština Bar II faza radova.

- Vlada je prihvatila ugovor o realizaciji projekta »Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru« opština Bar II faza radova.

- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić, VD direktora Uprave javnih radova da u ime Vlade potpiše navedeni ugovor.

- Zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Upravom javnih radova, planira sredstva u okviru godišnjih Zakona o budžetu za 2020. i 2021.godinu u ukupnom iznosu od 380.925,21 € na ime kofinansiranja projekta za II fazu radova.

#### **10. Vlada Crne Gore je na sjednici od 11.07.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuju se potrošačke jedinice budžeta Crne Gore da, na osnovu rezultata ankete, od 30.septembra tekuće godine izvrše zaključivanje optimalnog broja sporazumnih prestanaka radnog odnosa u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru budžeta potrošačkih jedinica.
- Zadužuju se organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država, a preporučuje državnim organima, sudstvu, državnom tužilaštvu i jedincama lokalne samouprave da donesu rješenje o prestanku radnog odnosa licima koja su zaključila radni odnos na određeno vrijeme, nakon isteka roka na koji je odnos zasnovan, sa tim što se radni odnos ne može produžiti do 31.decembra 2019.godine bez prethodne saglasnosti Užeg kabineta.

#### **11. Vlada Crne Gore je na sjednici od 01.08.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuju se organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država, a preporučuje državnim organima, sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave da obustave zapošljavanje zasnovanim radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme do 31.decembra 2019.godine. Uz izuzetak, moguće je zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme uz saglasnost Užeg kabineta.
- Zadužuju se organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država, a preporučuje državnim organima, sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave da donesu rješenja o prestanku radnog odnosa licima koja su zaključila radni odnos na određeno vrijeme, nakon isteka roka na koji je odnos zasnovan, s tim što se radni odnos ne može produžiti do 31.decembra 2019.godine bez prethodne saglasnosti Vlade.
- Zadužuju se Uprava javnih radova i Uprava za saobraćaj da, iz okvira svojih nadležnosti, do 15. septembra 2019.godine dostave Ministarstvu finansija procjenu vrijednosti rangiranih projekata kao i dinamiku realizacije projekata iz tačke 1 ovih zaključaka.
- Zadužuju se potrošačke jedinice prvog nivoa da, u koordinaciji sa potrošačkim jedinicama nad kojima vrše nadzor, zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava za 2020.godinu dostave Ministarstvu finansija, najkasnije do 10.septembra.

#### **12. Vlada Crne Gore je na sjednici od 05.09.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Ministarstvo pravde da formira Projektni odbor, iz reda rukovodnih lica Ministarstva pravde, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Uprave javnih radova i Opštine Mojkovac, kao i da organizuje i koordinira njegov rad.

#### **13. Vlada Crne Gore je na sjednici od 12.09.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije, datim u izvještaju o reviziji uspjeha Uspješnost uspostavljanja, vođenje kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa, broj:40116/19-023-20/31 od 25.juna 2019.godine, kao i o preduzetim aktivnostima i statusu realizacije Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine.
- Zadužuju se svi državni organi da preduzmu mjere i radnje kako bi se ispunile preporuke Državne revizorske institucije.

#### **14. Vlada Crne Gore je na sjednici od 03.10.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Implementaciona agencija - Uprava javnih radova da do 1. novembra 2019. godine izvijesti Nacionalnog službenika za ovjeravanje o finalizaciji pokrenutih postupaka za zapošljavanje.



#### **15. Vlada Crne Gore je na sjednici od 10.10.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Uprava javnih radova da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, pripremi Idejno rješenje budućeg zajedničkog graničnog prelaza ZGP u Ckla.
- Zadužuje se Uprava javnih radova da, shodno zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova, za 2020 godinu u Budžetu Crne Gore planira sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju budućeg ZGP na Ckla, u cilju završetka ZGP Ckla do kraja 2020. godine.
- Zadužuje se Uprava javnih radova da, na osnovu zahtjeva Opštine Bar, od 18.06.2018.godine, izrađenog Idejnog rješenja za put Ckla – granica s Republikom Albanijom, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi – plan Budžeta za 2020.godinu, u cilju završetka puta Ckla-granica sa Republikom Albanijom i povezivanje putnog pravca Ckla-Zogaj do kraja 2020.godine.

#### **16. Vlada Crne Gore je na sjednici od 24.10.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2019.godinu s predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte.
- Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.
- Zadužuju se ministri i starješine drugih organa uprave da, do 31.decembra 2019.godine, preduzmu neophodne aktivnosti na zaključivanju sporazuma o prestanku radnog odnosa sa zaposlenim u skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, koju je Vlada donijela na sjednici od 24.oktobra 2019.godine.

#### **17. Vlada Crne Gore je na sjednici od 31.10.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Ministarstvo finansija da preusmjeri sredstva i to: Uprava javnih radova, na izdatak 4630-otplata obaveza iz prethodnog perioda iznos od 9.808,48 €.
- Zadužuje se Uprava javnih radova da nastavi s aktivnostima na realizaciji projekta.
- Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Upravom javnih radova, planira sredstva u okviru godišnjih Zakona o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 9.280.000,00€, za nastavak finansiranja projekta „Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici“.

#### **18. Vlada Crne Gore je na sjednici od 14.11.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-5936, od 24.oktobra 2019.godine.
- Vlada je prihvatila Ugovor o realizaciji programa „Projekti očuvanja životne sredine „-projekat „Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja.“
- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić, direktor Uprave javnih radova, da u ime Vlade, potpiše Ugovor iz tačke 2 ovih zaključaka.

#### **19. Vlada Crne Gore je na sjednici od 28.11.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić, direktor Uprave javnih radova, da u ime Vlade, potpiše Protokol.
- Zadužuje se Uprava javnih radova da iz Kapitalnog budžeta za 2019. godinu u okviru programa 812: - Projekti očuvanja životne sredine, sa pozicije „Izgradnja i rekonstrukcija sistema vododijevanja“, za

realizaciju projekta „Vodosnabdijevanje naselja Berislavci – Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci, izvrši plaćanje sredstava izvođaču radova, u ukupnom iznosu od 75.699,87 €, na osnovu ovjerenih faktura od strane nadzora i naručioca posla („Vodovod i kanalizacija,, doo Podgorica i Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci).

#### **20. Vlada Crne Gore je na sjednici od 05.12.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vlada je usvojila informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2019.godinu s predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte.

#### **21. Vlada Crne Gore je na sjednici od 12.12.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Vladaje usvojila Informaciju o obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekta „Snabdijevanje vodom Donje i Gornje Lješanske nahije“.

- Ovlašćuje se Rešad Nuhodžić , direktor Uprave javnih radova, da u ime Vlade, potpiše Protokol.

- Zadužuje se Uprava javnih radova da, iz Kapitalnog budžeta za 2019.godinu, u okviru Programa: 812- Projekti očuvanja životne sredine, s pozicije „Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja“, za realizaciju projekta „Snabdijevanje vodom Donje i Gornje Lješanske nahije“, izvrši plaćanje sredstava izvođaču radova, u ukupnom iznosu od 100.000,00 €, na osnovu ovjerenih faktura od strane nadzora i naručioca posla (Glavni grad Podgorica, doo „Vodovod i kanalizacija“).

- Zadužuje se Uprava javnih radova da isplati izvođaču radova do 300.000,00€ za izvedene radove na desnom rukavcu rijeke Bojane po dostavljenim privremenim situacijama od strane Uprave za vode.

#### **22. Vlada Crne Gore je na sjednici od 19.12.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Zadužuje se Ministarstvo finansija da shodno odredbama člana 46 Zakon o budžetu I fiskalnoj odgovornosti, neutrošena sredstva Kapitalnog budžeta za 2019.godinu kod Uprave javnih radova (41506) preusmjeri.

#### **23. Vlada Crne Gore je na sjednici od 26.12.2019. godine donijela sledeće zaključke:**

- Ovlašćuje se zakonski zastupnik Crne Gore Zaštitnik imovinski pravnih interesa Crne Gore i Rešad Nuhodžić, direktor Uprave javnih radova, da zakluče vansudsko poravnanje sa Novi Volox-om. Vlada je saglasna da se spor riješi u postupku za posredovanje Crne Gore zaključenjem vansudskog poravnania, na ime plaćanja naknadnih radova, u iznosu od 110.590,23 €, izvedenih od strane „Novi Volvox“ doo Podgorica na adaptaciji objekta bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kroz Kapitalni budžet Uprave javnih radova realizuje i projekte obuhvaćene Operativnim programom za IPA komponenta III „Regionalni razvoj“ koji se finansiraju 85% iz EU fondova i 15% iz Kapitalnog budžeta, kao i projekte Regionalnog stambenog programa – RHP koji nisu finansijski prepoznati kroz Kapitalni budžet s obzirom na to da se finansiraju kroz fond osnovan pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora.

Crna Gora je krajem aprila 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj“ U decembru 2014. godine je potpisan finansijski sporazum, što je stvorilo uslove da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, a koji se odnose na projekte očuvanja životne sredine, projekte unapređenja željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i na tehničku pomoć za jačanje kapaciteta Operativne strukture.

U 2015. godini otpočelo se sa realizacijom projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA komponentu III „Regionalni razvoj“ i na osnovu dokumentacije dostavljene od strane korisnika i nadležnih

institucija, Uprava javnih radova je pristupila pripremi tenderske dokumentacije i raspisivanju međunarodnih javnih nadmetanja u skladu sa PRAG pravilima.

Po tom osnovu povučeno je iz IPA fondova ukupno 1.347.443,12 €, čime je u potpunosti ostvaren plan povlačenja sredstava za koja je krajnji rok bio 31. decembar 2015. godine.

Zajednički regionalni program o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljena lica (Regionalni stambeni program – RHP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

Cilj regionalne inicijative je da doprinese rješavanju produžene raseljenosti najugroženijih izbjeglica i raseljenih lica nakon konflikta 1991.-1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori iz 1999. godine, između ostalog kroz pružanje trajnih stambenih rješenja.

Razvojna Banka Savjeta Evrope (CEB - Council of Europe Development Bank) je za RHP osnovala fond pod nazivom „Fond regionalnog stambenog programa“ (RHP fond) kako bi se prikupili doprinosi donatora.

U svojstvu finansijske institucije, CEB između ostalog isplaćuje investicione grantove za subvencije iz sredstava RHP fonda Partnerskim zemljama za finansiranje potprojekata u sklopu Stambenih projekata za zemlju koji ispunjavaju određene kvalifikacione kriterijume, a nakon odluke Skupštine donatora.

Prema potpisanom Implementacionom sporazumu, čija revizija predstoji u narednom periodu, RHP u Crnoj Gori ima za cilj da obezbijedi dugotrajno rješenje stambenog pitanja za 1.177 izbjeglih porodica (6.063 osoba), koje su prema kriterijima UNHCR prepoznate kao najranjivije. Doprinos Crne Gore ogleda se prvenstveno u dodjeli zemljišta i obezbjeđivanju primarne infrastrukture.

Procijenjeni troškovi Programa:

- Ukupna vrijednost projekta: 27.696.000 eura;
- Donatorska sredstva: (85 %), tj. 23.542.000 eura;
- Kontribucija države (Ministarstvo i opštine): (min 15%), tj. 4.154.000 eura (kroz obezbjeđivanje lokacije, infrastrukture, tehničko-projektne dokumentacije);

Vlada Crne Gore je na sjednici od 9. aprila 2015. godine umjesto PROCON-a zadužila Upravu javnih radova, da u saradnji sa menadžerskim timom Ministarstva rada i socijalnog staranja, implementira Regionalni stambeni program.

Sporazumom o implementaciji o donaciji definisano je da se sve procedure u okviru ovog programa sprovode u skladu sa Vodičem za nabavku dobara, radova i usluga- Banke za razvoj Savjeta Evrope i Priručnikom za nabake.

U prethodnom periodu Uprava javnih radova je završila aktivnosti na izgradnji stambenog objekta u Nikšiću sa 62 stambene jedinice, radove na izgradnji 17 stambenih objekata sa 171 stambenom jedinicom na lokaciji Kamp Koniku u Podgorici, kao i izgradnju i opremanje objekta Doma za stara lica u Pljevljima sa 37 smještajnih jedinica. Za realizovane objekte pribavljena je upotrebna dozvola i objekti su predati korisnicima na upotrebu.

U martu 2019. godini pribavljena je upotrebna dozvola za izgrađena 4 stambena objekta u Beranama sa 94 stambene jedinice i objekti su predati korisnicima na upotrebu.

Takođe, u septembru 2019. godine započeta je realizacija projekta rekonstrukcije postojećeg objekta za potrebe Doma starih u Nikšiću – I faza sa 104 smještajne jedinice, dok će II faza kojom će projekat biti završen biti finansiran kroz Kapitalni budžet.

**TABELARNI PREGLED REALIZACIJE KAPITALNOG BUDŽETA  
ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE**

	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2019. GODINU			IZVORI FINANSIRANJA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2019.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
<b>1.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</b>	<b>282,700.00</b>	<b>1,148,690.23</b>	<b>1,431,390.23</b>		<b>255,008.48</b>	<b>1,145,838.31</b>	<b>1,400,846.79</b>
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	10,000.00	0.00	<b>10,000.00</b>	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	15,000.00	5,000.00	<b>20,000.00</b>	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	11,159.40	4,965.63	<b>16,125.03</b>
1.3.	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	5,000.00	0.00	<b>5,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1.4.	Akcioni plan prilagodavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	10,000.00	156,000.00	<b>166,000.00</b>	Opšti prihodi	6,141.00	155,498.81	<b>161,639.81</b>
1.5.	Rekonstrukcija administrativnog objekat u Gusinju	0.00	500.00	<b>500.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1.6.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	1,500.00	23,000.00	<b>24,500.00</b>	Opšti prihodi	1,500.00	22,983.74	<b>24,483.74</b>
1.7.	Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici	165,000.00	463,000.00	<b>628,000.00</b>	Opšti prihodi	164,048.32	462,372.13	<b>626,420.45</b>
1.8.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	45,700.00	0.00	<b>45,700.00</b>	Opšti prihodi	43,070.00	0.00	<b>43,070.00</b>

1.9.	Rekonstrukcija kompleksa kasarna "Masline" za potrebe Vojske Crne Gore	0.00	500.00	<b>500.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1.10.	Objekti za potrebe Državne revizorske institucije i Monstat-a	0.00	500.00	<b>500.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1.11.	Objekat za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Hrvatskoj	0.00	500,190.23	<b>500,190.23</b>	Opšti prihodi	0.00	500,018.00	<b>500,018.00</b>
1.12.	Objekti za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac	30,500.00	0.00	<b>30,500.00</b>	Opšti prihodi	29,089.76	0.00	<b>29,089.76</b>
<b>2.</b>	<b>Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</b>	<b>25,700.00</b>	<b>605,000.00</b>	<b>630,700.00</b>		<b>21,441.66</b>	<b>603,700.00</b>	<b>625,141.66</b>
2.1.	Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici	21,500.00	559,500.00	<b>581,000.00</b>	Opšti prihodi	21,344.86	559,202.57	<b>580,547.43</b>
2.2.	Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću	700.00	0.00	<b>700.00</b>	Opšti prihodi	96.80	0.00	<b>96.80</b>
2.3.	Hitne sanacione mjere i nabavka oprema za objekte kulture	0.00	24,500.00	<b>24,500.00</b>	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	24,108.38	<b>24,108.38</b>
2.4.	Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs"-Bar	0.00	21,000.00	<b>21,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	20,389.05	<b>20,389.05</b>
2.5.	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>

2.6.	Muzej savremene umjetnosti u Podgorici	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2.7.	Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju	1,500.00	0.00	<b>1,500.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>3.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</b>	<b>57,000.00</b>	<b>2,010,000.00</b>	<b>2,067,000.00</b>		<b>45,579.18</b>	<b>2,009,500.00</b>	<b>2,055,079.18</b>
3.1.	Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru	2,000.00	0.00	2,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.2.	Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bučin" u Kotoru	17,500.00	1,065,000.00	1,082,500.00	Opšti prihodi	17,414.92	1,064,532.02	1,081,946.94
3.3.	Izgradnja sportskih terena i sala	5,000.00	108,300.00	113,300.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	1,777.76	108,272.52	110,050.28
3.4.	Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	8,893.50	0.00	8,893.50
3.5.	Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	2,500.00	0.00	2,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.6.	Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju	2,500.00	0.00	2,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.7.	Izgradnja otvorenog bazena - kupališta u Pljevljima	2,500.00	0.00	2,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.8.	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	2,000.00	0.00	2,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
3.9.	Izgradnja Fudbalskog stadiona na Cetinju	18,000.00	836,700.00	854,700.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	17,493.00	836,695.46	854,188.46
<b>4.</b>	<b>Projekti očuvanja životne sredine</b>	<b>279,042.00</b>	<b>2,358,958.00</b>	<b>2,638,000.00</b>		<b>235,877.44</b>	<b>2,341,567.32</b>	<b>2,577,444.76</b>

4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje	10,000.00	0.00	10,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00 kredit 1.000,00	9,258.89	0.00	9,258.89
4.2.	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	47,000.00	834,000.00	881,000.00	Opšti prihodi	46,785.40	833,904.92	880,690.32
4.3.	Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	5,000.00	112,000.00	117,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	0.00	111,710.23	111,710.23
4.4.	Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja	23,042.00	941,958.00	965,000.00	Opšti prihodi	20,062.76	941,737.80	961,800.56
4.5.	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	2,000.00	309,000.00	311,000.00	Opšti prihodi	1,771.36	308,218.55	309,989.91
4.6.	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	134,000.00	0.00	134,000.00	Opšti prihodi	130,000.00	0.00	130,000.00
4.7.	Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica	41,000.00	50,000.00	91,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	22,040.70	45,196.59	67,237.29
4.8.	Sanacija odlagališta u Plavu	7,000.00	77,000.00	84,000.00	Opšti prihodi	4,558.33	71,170.01	75,728.34
4.9.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica - Radetina, Rožaje	5,000.00	30,000.00	35,000.00	Opšti prihodi	1,400.00	29,629.22	31,029.22
4.10.	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
<b>5.</b>	<b>Izgradnja lokalne infrastrukture</b>	<b>348,859.00</b>	<b>9,968,826.38</b>	<b>10,317,685.38</b>		<b>344,792.58</b>	<b>9,948,166.60</b>	<b>10,292,959.18</b>
5.1.	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>	Opšti prihodi	787.56	0.00	<b>787.56</b>
5.2.	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja šetališta i uređenje prostora Jalovišta u Mojkovcu	16,923.00	894,000.00	<b>910,923.00</b>	Opšti prihodi	16,604.05	893,829.26	<b>910,433.31</b>



<b>5.3.</b>	<b>Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema</b>	<b>244,136.00</b>	<b>5,387,826.38</b>	<b>5,631,962.38</b>	Opšti prihodi	<b>243,351.72</b>	<b>5,386,841.12</b>	<b>5,630,192.84</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>Lokalni putevi km</b>	<b>189,136.00</b>	<b>3,916,826.38</b>	<b>4,105,962.38</b>	Opšti prihodi	<b>189,044.91</b>	<b>3,916,745.67</b>	<b>4,105,790.58</b>
5.3.1.1	Opština Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	115,494.37	115,494.37
5.3.1.2	Opština Berane	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	2,196.15	310,528.67	312,724.82
5.3.1.3	Opština Pljevlja	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	444,505.67	444,505.67
5.3.1.4	Opština Šavnik	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	199,981.50	199,981.50
5.3.1.5	Opština Gusinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	6,742.02	203,822.03	210,564.05
5.3.1.6	Opština Danilovgrad	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	43,375.23	356,166.28	399,541.51
5.3.1.7	Opština Podgorica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	96.80	199,989.82	200,086.62
5.3.1.8	Opština Plav	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	2,420.00	56,439.24	58,859.24
5.3.1.9	Opština Andrijevica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	11,314.50	238,685.50	250,000.00
5.3.1.10	Opština Rožaje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	158,571.02	158,571.02
5.3.1.11	Opština Bijelo Polje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	51,250.00	298,750.00	350,000.00
5.3.1.12	Opština Herceg Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	54,373.77	54,373.77
5.3.1.13	Opština Petnjica	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	1,000.00	372,029.20	373,029.20
5.3.1.14	Opština Nikšić	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	334,052.13	334,052.13
5.3.1.15	Opština Mojkovac	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.3.1.16	Opština Kolašin	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	25,376.07	262,247.48	287,623.55
5.3.1.17	Opština Ulcinj	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	3,667.46	130,321.24	133,988.70
5.3.1.18	Opština Žabljak	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	41,606.68	180,787.75	222,394.43
5.3.1.19	Opština Kotor	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.2.</b>	<b>Gradske saobraćajnice</b>	<b>55,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,526,000.00</b>	Opšti prihodi	<b>54,306.81</b>	<b>1,470,095.45</b>	<b>1,524,402.26</b>
5.3.2.1	Gradska saobraćajnica u Bijelom Polju	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	6,729.24	51,103.58	57,832.82
5.3.2.2	Gradska saobraćajnica u Gusinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	1,210.55	6,174.87	7,385.42
5.3.2.3	Gradske saobraćajnica u Andrijevići	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	101,186.41	101,186.41
5.3.2.4	Gradske saobraćajnica u Pljevljima	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.3.2.5	Gradska saobraćajnica u Šavniku	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.3.2.6	Gradske saobraćajnica u Cetinje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	2,299.00	53,430.03	55,729.03
5.3.2.7	Gradske saobraćajnica u Nikšiću	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.3.2.8	Gradska saobraćajnica u Ulcinju	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	6,029.33	0.00	6,029.33
5.3.2.9	Gradske saobraćajnica u Baru	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	993.36	0.00	993.36

5.3.2.10	Gradske saobraćajnica u Podgorici	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	968.00	24,000.00	24,968.00
5.3.2.11	Gradska saobraćajnica u Danilovgradu	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	968.00	49,981.76	50,949.76
5.3.2.12	Gradske saobraćajnica na Žabljaku	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	5,929.00	312,040.12	317,969.12
5.3.2.13	Gradske saobraćajnice u Beranama	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.3.2.14	Gradske saobraćajnica u Kolašin	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	913.85	134,799.69	135,713.54
5.3.2.15	Gradske saobraćajnica u Mojkovac	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	26,598.56	610,183.25	636,781.81
5.3.2.16	Gradske saobraćajnica u Rožaje	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	1,667.92	127,195.74	128,863.66
5.3.2.17	Gradske saobraćajnica u H. Novi	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.4.	Rekonstrukcija mosta "Radovan Pavičević" na rijeci Zeti u Danilovgradu	500.00	0.00	500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.5.	Izgradnja gradske pijace u Gusinju	10,000.00	400,000.00	410,000.00	Opšti prihodi	9,583.20	399,650.26	409,233.46
5.6.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	18,000.00	1,580,000.00	1,598,000.00	Opšti prihodi	17,876.76	1,579,527.40	1,597,404.16
5.7.	Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama	5,000.00	70,000.00	75,000.00	Opšti prihodi	4,999.20	69,804.29	74,803.49
5.8.	Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju	0.00	1,000.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.9.	Izgradnja gradske pijace u Rožajama	12,000.00	337,000.00	349,000.00	Opšti prihodi	11,968.42	336,720.32	348,688.74
5.9.	Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	1,000.00	264,000.00	265,000.00	Opšti prihodi	702.96	263,272.83	263,975.79
5.10.	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav	3,000.00	190,100.00	193,100.00	Opšti prihodi	2,248.59	190,070.97	192,319.56
5.11.	Rekonstrukciji puta Plav-Bogičevica, Plav	800.00	0.00	800.00	Opšti prihodi	702.96	0.00	702.96
5.12.	Izgradnja mosta u Haremima, Berane	0.00	1,000.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

5.13.	Lokalni put Ckla - granica Albanije, opština Bar	500.00	0.00	500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
5.14.	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu	31,500.00	428,000.00	459,500.00	Opšti prihodi	31,474.17	427,979.38	459,453.55
5.15.	Izgradnja trga i šetališta u Sutormoru	500.00	0.00	500.00	Opšti prihodi	499.99	0.00	499.99
5.16.	Rekonstrukcija trga u Plavu	4,000.00	415,900.00	419,900.00	Opšti prihodi	3,993.00	400,470.77	404,463.77
5.17.	Putni pravac Monte-Rose	0.00	0.00	0.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
<b>6.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja</b>	<b>44,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>282,000.00</b>		<b>32,788.40</b>	<b>236,500.00</b>	<b>269,288.40</b>
6.1.	Rekonstrukcija energetske blok- trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>	Opšti prihodi	48.40	0.00	<b>48.40</b>
6.2.	Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici	33,000.00	1,000.00	<b>34,000.00</b>	Opšti prihodi	32,740.00	0.00	<b>32,740.00</b>
6.3.	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	5,000.00	0.00	<b>5,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
6.4.	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	5,000.00	237,000.00	<b>242,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	236,500.00	<b>236,500.00</b>
<b>7.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</b>	<b>56,000.00</b>	<b>4,003,407.48</b>	<b>4,059,407.48</b>		<b>51,577.88</b>	<b>3,899,542.69</b>	<b>3,951,120.57</b>
7.1.	Izgradnja Doma starih u Podgorici	52,000.00	3,904,407.48	<b>3,956,407.48</b>	Opšti prihodi	51,577.88	3,899,542.69	<b>3,951,120.57</b>
7.2.	Izgradnja Doma starih u Nikšiću	1,000.00	25,000.00	<b>26,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>

7.3.	Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići", opština Cetinje	1,000.00	25,000.00	<b>26,000.00</b>	Opšti prihodi	0.00	0.00	<b>0.00</b>
7.4.	Dom starih u Plavu	1,000.00	25,000.00	<b>26,000.00</b>	Opšti prihodi/Donacija	0.00	0.00	<b>0.00</b>
7.5.	Dom starih u Rožajama	1,000.00	24,000.00	<b>25,000.00</b>	Opšti prihodi/Donacija	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>8.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja</b>	<b>185,500.00</b>	<b>4,943,000.00</b>	<b>5,128,500.00</b>		<b>171,936.21</b>	<b>5,401,220.58</b>	<b>5,573,156.79</b>
<b>8.2.</b>	<b>Dječji vrtići iz kredita CEB-a</b>	<b>40,700.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>667,700.00</b>	<b>Opšti prihodi kredit 8.000,00</b>	<b>60,576.62</b>	<b>1,272,587.57</b>	<b>1,333,164.19</b>
8.2.1.	Vrtić u Baru	11,200.00	267,000.00	278,200.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	11,136.50	265,629.14	276,765.64
8.2.2.	Vrtić u Ulcinju	17,000.00	5,000.00	22,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	16,560.72	0.00	16,560.72
8.2.3.	Vrtić u Pljevljima	2,000.00	100,000.00	102,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	169.40	0.00	169.40
8.2.4.	Vrtić u Bloku VI, Podgorica	2,000.00	100,000.00	102,000.00	Opšti prihodi kredit 2.000,00	0.00	0.00	0.00
8.2.5.	Vrtić u Tuzima	6,500.00	150,000.00	156,500.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	31,500.00	1,006,958.43	1,038,458.43
8.2.6.	Sprovođenje Javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova	2,000.00	5,000.00	7,000.00	Opšti prihodi kredit 1.000,00	1,210.00	0.00	1,210.00
8.3.	Izgradnja objekta vrtića u Rožajama	9,400.00	495,000.00	504,400.00	Opšti prihodi	9,331.12	494,464.16	503,795.28
8.4.	Vrtić u City kvartu	0.00	5,000.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.5.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	19,500.00	5,000.00	24,500.00	Opšti prihodi	1,500.00	0.00	1,500.00
8.6.	Izgradnja objekta Srednja stručne škole, Gradska opština Golubovci, Podgorica	19,000.00	1,361,000.00	1,380,000.00	Opšti prihodi	18,514.26	1,353,088.27	1,371,602.53
8.7.	Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja	2,000.00	10,000.00	12,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00

8.8.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica	2,000.00	5,000.00	7,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.9.	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1,000.00	0.00	1,000.00	Opšti prihodi	861.84	0.00	861.84
8.10.	Rekonstrukcija objekta O.Š. u Baču i Kalačima, Rožaje	1,000.00	0.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.11.	Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi	5,000.00	0.00	5,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.12.	Izgradnja Osnovne i muzičke škole "Dušan Korać" u Bijelom Polju	24,000.00	1,366,000.00	1,390,000.00	Opšti prihodi	23,919.00	1,365,286.34	1,389,205.34
8.13.	Izgradnja Osnovne škole u Rožajama	37,400.00	0.00	120,000.00	Opšti prihodi	37,280.00	0.00	37,280.00
8.14.	Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje	1,000.00	90,000.00	91,000.00	Opšti prihodi	484.00	0.00	484.00
8.15.	OŠ "Lovčenski partizanski odred" na Cetinju	2,000.00	5,000.00	7,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.16.	Naučno-tehnološki park u Podgorici	2,000.00	30,000.00	32,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
8.17.	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	18,500.00	924,000.00	942,500.00	Opšti prihodi	18,489.87	915,794.24	934,284.11
8.18.	OŠ Karabuško polje, opština Tuzi	1,000.00	5,000.00	6,000.00	Opšti prihodi	979.50	0.00	979.50
8.19.	Sprovođenje Javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	0.00	15,000.00	15,000.00	Opšti prihodi Kredit 3.500,00	0.00	0.00	0.00
<b>9.</b>	<b>Unapređenje turističke ponude</b>	<b>1,371,469.99</b>	<b>25,401,376.07</b>	<b>26,772,846.06</b>		<b>1,358,963.63</b>	<b>25,381,710.60</b>	<b>26,740,674.23</b>
9.1.	Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin	130,300.00	2,530,700.00	2,661,000.00	Opšti prihodi	129,590.17	2,530,666.55	2,660,256.72
9.2.	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	411,329.99	9,035,439.07	9,446,769.06	Opšti prihodi	410,714.38	9,035,400.65	9,446,115.03

9.3.	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	86,000.00	2,323,000.00	2,409,000.00	Opšti prihodi	85,569.51	2,322,562.05	2,408,131.56
9.4.	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	23,000.00	1,740,000.00	1,763,000.00	Opšti prihodi	22,855.12	1,739,651.32	1,762,506.44
9.5.	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	148,140.00	5,581,937.00	5,730,077.00	Opšti prihodi	147,656.67	5,581,180.68	5,728,837.35
9.6.	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	469,700.00	3,795,300.00	4,265,000.00	Opšti prihodi	469,494.00	3,794,876.36	4,264,370.36
9.7.	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	70,000.00	163,800.00	233,800.00	Opšti prihodi	69,743.67	163,730.41	233,474.08
9.8.	Objekat "Kuća voća" u Andrijevići	4,000.00	49,000.00	53,000.00	Opšti prihodi Donacija 1.000,00	3,572.40	48,137.11	51,709.51
9.9.	Objekat nacionalne "Kuće maslina" sa sjedištem u Baru	13,000.00	20,000.00	33,000.00	Opšti prihodi	12,933.69	17,089.15	30,022.84
9.10.	Objekat "Kuća vina" u opštini Bar	3,000.00	0.00	3,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.11.	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	2,000.00	13,200.00	15,200.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
9.12.	Nacionalni parkovi	4,000.00	149,000.00	153,000.00	Opšti prihodi	3,325.02	148,416.32	151,741.34
9.13.	Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju	7,000.00	0.00	7,000.00	Opšti prihodi	3,509.00	0.00	3,509.00
<b>10</b>	<b>Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova</b>	<b>5,674,000.00</b>	<b>8,290,000.00</b>	<b>13,964,000.00</b>		<b>554,448.64</b>	<b>2,843,611.27</b>	<b>3,398,059.91</b>
10.1.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	287,000.00	2,700,000.00	2,987,000.00	IPA Opšti prihodi Kredit	226,203.41	236,641.56	462,844.97
10.2.	Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju	15,000.00	5,000.00	20,000.00	IPA Opšti prihodi	14,546.19	0.00	14,546.19
10.3.	Sanacija odlagališta "Čafe" u Baru	120,000.00	280,000.00	400,000.00	IPA Opšti prihodi	14,800.00	0.00	14,800.00
10.4.	Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici "Kos - Trebešica"	170,000.00	3,650,000.00	3,820,000.00	IPA Opšti prihodi	124,611.67	2,606,969.71	2,731,581.38
10.5.	Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica"	115,000.00	5,000.00	120,000.00	IPA Opšti prihodi	70,213.98	0.00	70,213.98

10.6.	Izgradnja klinike za Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	57,000.00	0.00	57,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.7.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	50,000.00	5,000.00	55,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.8.	Priprema projekata za sektore Zaštite životne sredine i Klimatskih promjena	740,000.00	0.00	740,000.00	IPA Opšti prihodi	47,203.69	0.00	47,203.69
10.9.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom	275,000.00	0.00	275,000.00	IPA Opšti prihodi	28,743.93	0.00	28,743.93
10.10.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	800,000.00	0.00	800,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.11.	Podrška u implementaciji, monitoringu i izvještavanju u oblasti upravljanja hemikalijama, IPPC, kvalitetom vazduha, buka, zaštita prirode, civilna zaštita i klimatske akcije	425,000.00	0.00	425,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.12.	Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini	365,000.00	0.00	365,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.13.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	70,000.00	5,000.00	75,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.14.	Monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS II)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.15.	Nabavka opreme za spriječavanje zagađenja mora motornim uljem sa plovila	5,000.00	1,440,000.00	1,445,000.00	IPA Opšti prihodi	169.40	0.00	169.40
10.16.	Jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađivanje sa EU ACQUIS u oblasti saobraćaja	975,000.00	0.00	975,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.17.	Podrška u pripremi projekata iz oblasti saobraćaja	705,000.00	0.00	705,000.00	IPA Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
10.18.	Rekonstrukcija željezničke stanice u Bijelom Polju	200,000.00	100,000.00	300,000.00	IPA Opšti prihodi	27,956.37	0.00	27,956.37
<b>11.</b>	<b>Zakon o Prijestonici</b>	<b>282,500.00</b>	<b>4,158,990.00</b>	<b>4,441,490.00</b>		<b>279,643.24</b>	<b>4,147,837.45</b>	<b>4,427,480.69</b>
11.1.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	0.00	250,000.00	250,000.00	Opšti prihodi	0.00	250,000.00	250,000.00

11.2.	Sanacija sportskih sala SRC Cetinje	0.00	1,000.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.3.	Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže snabijevanja vodom Cetinja	6,500.00	650,000.00	656,500.00	Opšti prihodi	6,050.00	649,908.96	655,958.96
11.4.	Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks	39,000.00	179,000.00	218,000.00	Opšti prihodi	38,217.45	178,685.79	216,903.24
11.5.	Izgradnja saobraćajnice ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića	85,500.00	0.00	85,500.00	Opšti prihodi	85,500.00	0.00	85,500.00
11.6.	Rekonstrukcija ul. Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos"	10,500.00	0.00	10,500.00	Opšti prihodi	10,496.75	0.00	10,496.75
11.7.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	40,000.00	461,000.00	501,000.00	Opšti prihodi	39,903.38	460,096.62	500,000.00
11.8.	Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci	0.00	1,000.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.9.	Prihvatilište za napuštene kućne ljubimce (azil)	0.00	1,000.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.10.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja	4,500.00	50,000.00	54,500.00	Opšti prihodi	4,144.46	49,692.53	53,836.99
11.11.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	0.00	60,000.00	60,000.00	Opšti prihodi	0.00	59,453.55	59,453.55
11.12.	Izrada tehničke i druge dokumentacije	95,500.00	0.00	95,500.00	Opšti prihodi	95,331.20	0.00	95,331.20
11.13.	Izgradnja i opremanje "Centra za kulturu Prijestonice"	1,000.00	0.00	1,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.14.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	0.00	2,500.00	2,500.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.15.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju	0.00	2,000.00	2,000.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.16.	Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju	0.00	1,490.00	1,490.00	Opšti prihodi	0.00	0.00	0.00
11.17.	Kupovina nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Opšti prihodi	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>12</b>	<b>Državna komisija za tehnički pregled auto puta</b>	<b>755,308.27</b>	<b>2,000.00</b>	<b>757,308.27</b>	Opšti prihodi	<b>748,783.47</b>	<b>0.00</b>	<b>748,783.47</b>
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>9,362,079.26</b>	<b>63,128,248.16</b>	<b>72,490,327.42</b>		<b>4,100,840.81</b>	<b>57,959,194.82</b>	<b>62,060,035.63</b>



**REALIZACIJA PO OBJEKTIMA**

**1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA  
ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA**

## 1.1. Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

Status projekta: U toku

- Za potrebe smještaja administrativnih organa planirana je prenamjena već izgrađenog objekta koji se nalazi na uglu Bulevara "Ivana Crnojevića" i Ulice "Vaka Đurovića", a koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Izgrađeni objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova i ukupne je bruto površina cca 6.990m<sup>2</sup>.
- Završena je izrada projektnog zadatka za Glavni projekta rekonstrukcije predmetnog objekta, u cilju prilagođavanja novoj namjeni i stavljanja u funkciju, opremanja namještajem i opremom i uređenja lokacije.



## 1.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa

Status projekta: U toku

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju i drugim opštinama po prioritetima, rekonstrukciji i izgradnji objekata Ministarstva pravde i Tužilaštva u Podgorici, kao i drugih objekata po prioritetima.

- **Osnovni sud u Podgorici**

Status projekta: U toku

- U decembru 2019. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta adaptacije Osnovnog suda u Podgorici.
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta, formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Finansiranje radova planirano je kroz IPA program.

- **Osnovni sud u Nikšiću**

Status projekta: U toku

- U decembru 2019. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta adaptacije i rekonstrukcije segmenta objekta Osnovnog suda u Nikšiću
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta, formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

- **Osnovni sud u Kotoru**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija Glavnog projekta adaptacije Osnovnog suda u Kotoru.
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta, formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, sanaciji krovne konstrukcije i pokrivača, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

- **Osnovni sud u Beranama**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija Glavnog projekta adaptacije Osnovnog suda u Beranama.
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta, formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

- **Osnovni sud u Bijelom Polju**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija Glavnog projekta adaptacije Osnovnog suda u Beranama.
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta , formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

- **Osnovni sud u Bijelom Polju**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija Glavnog projekta adaptacije Osnovnog suda u Beranama.
- Projektom dokumentacijom planirani su radovi na poboljšanju energetske efikasnosti objekta , formiranju jednošalterskog sistema koji će omogućiti efikasniji rad suda, kao i prilagođavanju objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

- **Vrhovni sud u Podgorici**

Status projekta: U toku

- Obaveza Korisnika i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije fasade i unutrašnjosti objekta, na osnovu kojeg će se pristupiti izradi Glavnog projekta.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja postojećeg objekta isti dostavila Korisniku.

- **Državno tužilaštvo u Podgorici**

Status projekta: U toku

- Za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Tužilačkog savjeta – Sekretarijata, planirana je izgradnja novog objekta površine cca 12.000 m<sup>2</sup> na lokaciji koji se nalazi na uglu Bulevara "Ivana Crnojevića" i Ulice "Vaka Đurovića", u neposrednoj blizini izgrađenog objekta koji je prvobitno planiran za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
- Komisija zadužena za pripremu projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta objekta Državnog tužilaštva isti je kompletirala i dostavila korisniku na saglasnost.

### **1.3. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici**

Status projekta: U toku



- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu.
- životne sredine (EMIF– Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica. Objekat sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi 10.020m<sup>2</sup>, od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m<sup>2</sup>, a nadzemnih cca 5.360 m<sup>2</sup>. Izgradnja objekta se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi,

grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.

- Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Izvođenje radova je otpočelo krajem 2012. godine i do kraja 2014. godine završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, dok je čelična konstrukcija završena krajem marta 2015. godine. Objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze. U cilju nastavka izvođenja radova na izgradnji objekta, sprovedene su aktivnosti na usaglašavanju tenderske dokumentacije sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
- Krajem 2017. godini raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Predmetno javno nadmetanje je poništeno.
- Tokom 2019. godine Uprava javnih radova je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma pokrenula aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za sve preostale radove na izgradnji objekta, kako bi isti bio stavljen u funkciju.

#### **1.4. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje I upotrebu licima smanjene pokretljivosti**

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je Akcioni plan za 2014. godinu prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, po prioritetima i kroz više godina.
- Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritarno prilagođavanje u opštinama Podgorica, Nikšić i Berane.
- U prethodnom periodu završena je izrada i revizija Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- U 2016. godini završeni su svi radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Republički fond za zdravstveno osiguranje u Podgorici, Osnovni sud u Podgorici i Ekonomski fakultet u Podgorici.
- U 2017. godini završeni su radovi na prilagođavanju sljedećih objekata: Dom zdravlja u Beranama, Opšta bolnica u Beranama, Dom zdravlja u Nikšiću i Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik u Nikšiću.
- U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na prilagođavanju preostalih objekata iz Akcionog plana, a to su: objekat JZU Opšta bolnica u Nikšiću, objekat Ministarstva finansija i radovi koji se odnose na postavljanje taktilnih traka, oznaka pristupačnosti i orjentacionih planova na 5 objekata iz Akcionog plana, tj. na radove koji su revidovanim Glavnim projektima predviđeni u II fazi realizacije. Navedeni radovi završeni su tokom 2019. godine.
- Krajem 2019. godine završeni su radovi na prilagođavanju objekta Ministarstva finansija u Podgorici, čime su završene sve aktivnosti vezano za prilagođavanje 13 prioriternih objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa Akcionim planom za 2014. godinu, koji je donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 31. oktobra 2013. godine.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17. januara 2019. godine, kojim je donijet novi Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, planirano je prilagođavanje sljedećih 6 objekata: zgrada predsjednika Crne Gore; stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici; zgrada državnih organa u Mojkovcu, poslovne prostorije Direkcije za saobraćaj u Podgorici i objekat Ministarstva kulture na Cetinju.

- Uprava javnih radova je tokom 2019. godine, nakon dostavljanja projektnih zadataka od strane Uprave za imovinu, raspisala javna nadmetanja za izbor obrađivača Glavih projekata i reviziju projektne dokumentacije za prilagođavanje nevedenih objekata.
- U toku je procedura potpisivanja ugovora sa obrađivačem projekta za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Direkcije za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju, nakon čega će se pristupiti izradi projektne dokumentacije.
- Za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici kao i Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i Zgrade državnih organa u Mojkovcu u toku je procedura vrednovanja pristiglih ponuda.
- Takođe, u toku su i aktivnosti na potpisivanju Ugovora za reviziju glavnih projekata za sve navedene objekte.

## 1.5. Rekonstrukcija administrativnog objekta u Gusinju

Status projekta: Završen



- Aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije za potrebe administrativnog objekta sprovodila je Opština Gusinje.
- Bruto površina objekta iznosi 1.130 m<sup>2</sup> i spratnosti je prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju objekta, na prvom i drugom spratu smješteni su kancelarijski prostori sa pratećim sanitarnim prostorijama, dok su na poslednjoj etaži sljedeći sadržaji: skupštinska sala za 30 odbornika, prostorija za prevodioce, prostorija za novinare, multifunkcionalna sala i sanitarni blok.
- Prije formiranja Opštine Gusinje, Opština Plav je sprovodila aktivnosti na rekonstrukciji postojećeg objekta i realizovala grube građevinske radove.
- Nakon toga, od 2015. godine aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je opština Gusinje.
- Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu predstavljala su učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu korisniku početkom januara 2019. godine.

## 1.6. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju

Status projekta: U toku

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove, spratnosti suterena, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412 m<sup>2</sup>.
- U sklopu objekta formirane su dvije odvojene cjeline koje imaju zasebne ulaze: Stanica policije Gusinje i Filijala za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaji i to: u suterenu je pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao; u prizemlju je hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu; na spratu je stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji i to : u prizemlju je ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet, a na spratu je ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- U prizemlju postojećeg objekta je stambena jedinica površine 52 m<sup>2</sup> koja je u vlasništvu privatnog lica.
- U 2016. godini Uprava javnih radova je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze na adaptaciji poslovnog prostora za potrebe stanice policije i filijale Uprave unutrašnjih poslova. Radovi I faze obuhvataju građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama na objektu.
- U 2017. godini izabran je izvođač radova, potpisan je ugovor i otpočelo je izvođenje radova I faze.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi osim radova na izradi fasade koje onemogućava vlasnik stambene jedinice.
- Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice koja je u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će Uprava javnih radova pristupiti pripremi tenderske dokumentacije za ove radove koji obuhvataju uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.





## 1.7. Izgradnja kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe Korisnika, u skladu sa kojim se otpočelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
- U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom. Ukupna bruto površina kompleksa iznosi oko 5.350 m<sup>2</sup>.
- U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i na osnovu iste pristupilo se raspisivanju javnih nadmetanja za fazno izvođenje radova na izgradnji objekata kompleksa u skladu sa prioritetima korisnika.
- U okviru I faze u 2018. godini ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji objekta magacina sa opremanjem. Usled pojave nepredviđenih radova na izmještanju instalacija, koje nisu bile prepoznate katastrofom podzemnih instalacija, pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na izgradnji objekta bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača radova, zbog čega su istom naplaćeni penali usled prekoračenja ugovorenog roka. U toku su zanatski radovi i radovi na montaži opreme instalacija.
- U 2019. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova na rušenju postojećih i izgradnji preostalih novih objekata smještajnog kompleksa SAJ i PJP na Zlatici (administrativno smještajni objekat, sportski objekat, objekat za dresuru pasa, garaže i drugi sadržaji). Izvođač je uveden u posao krajem novembra 2019. godine. U toku su zemljani i armirano betonski radovi.



## 1.8. Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

Status projekta: U toku



- Predviđena je rekonstrukcija i nadgradnja postojećeg objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Beogradskoj ulici u Podgorici. Planirana bruto površina objekta iznosi cca 6.000 m<sup>2</sup> i u objektu su planirani sljedeći sadržaji: biblioteka, galerija, depo i ostali administrativni i naučni sadržaji.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, sprovelo je konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nadgradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta CANU-a. Dodijeljene su nagrade, a prvonagrađeno konkursno rješenje implementirano je kroz plansku dokumentaciju na osnovu koje su izdati UTU-i za izgradnju predmetnog objekta.
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, nakon čega je Uprava javnih radova krajem godine raspisala javna nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

## 1.9. Rekonstrukcija kompleksa kasarna “Masline” za potrebe Vojske Crne Gore

Status projekta: U toku

- Aktivnosti na faznoj realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane koje je i izradilo projektну dokumentaciju.
- U skladu sa prioritetima, prva faza realizacije obuhvatila je rekonstrukciju dva postojeća objekta M18 i M19 za potrebe logističkog bataljona i vojne policije.
- Ministarstvo odbrane je zaključilo ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom, dok Uprava javnih radova na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vrši prenos sredstava.

## 1.10. Objekti za potrebe Državne revizorske institucije Monstat-a

Status projekta: U toku

- Obaveza Korisnika i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će se pristupiti izradi Glavnog projekta.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja lokacije predviđene za izgradnju predmetnog objekta i isti dostavila Korisniku.

## 1.11. Objekt za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Hrvatskoj

Status projekta: Završen

- U skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu utrošena su na kupovinu objekta za potrebe diplomatskog predstavništva Crne Gore u Zagrebu.

## 1.12. Objekti za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u opštinama Danilovgrad i Mojkovac

Status projekta: U toku



- Nakon sprovedenog konkursa od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, na osnovu prvonagrađenog idejnog arhitektonskog rješenja, krajem 2019. godine ugovorena je izrada i revizija Glavnog projekta novih objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u opštini Danilovgrad.
- Projektnim zadatkom planirana je izgradnja 4 objekta u sklopu kompleksa u Danilovgradu: prijavnica, otvoreni zatvor, specijalna zdravstvena ustanova i multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 7520 m<sup>2</sup>, uz dodatnih 1135 m<sup>2</sup> atrijuma i otvoreni sportski poligon.
- Izgradnja objekata biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.

## **2. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA KULTURE**

## 2.1. Nadgradnja i rekonstrukcija objekata bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici

Status projekta: U toku



- U toku su završene aktivnosti na rekonstrukciji i dogradnji bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m<sup>2</sup> u kojem će, nakon završetka radova, biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola
- Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.

- Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, rekonstruišu se za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- U 2017. godini potpisan je Ugovor sa Izvođačem radova za izvođenje radova na ugradnji scenske, audio i video tehnike koncertnih dvorana, postavljanju akustičnih panela i nabavci opreme za potrebe Crnogorske kinoteke, a izvođenje radova nastavljeno je i u 2018. i 2019. godini i isto je obuhvatilo i izgradnju nove trafostanice.
- U 2019. godini svi su završeni svi radovi osim funkcionalnih proba ugrađenih sistema. U 2020. godini planiran je završetak funkcionalni proba i svečano otvaranje objekta.

## 2.2. Rekonstrukcija objekta “Dvorac kralja Nikole” u Nikšiću

Status projekta: U toku

- Dvorac kralja Nikole u Nikšiću je izgrađen 1900. godine, površine je 2.970 m<sup>2</sup> i sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja. U objektu su smješteni Zavičajni muzej, gradska biblioteka, galerija, arhiv i depoi.
- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Opštine Nikšić, raspisana su javna nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje predmetnih radova i vršenje stručnog nadzora i ista su u toku.

## 2.3. Hitne sanacione mjere i nabavka opreme za objekte kulture

Status projekta: U toku

- Izvođenje radova na dogradnji JU "Zahumlje" u Nikšić




- U 2019. godini ugovoreno je izvođenje radova na dogradnji objekta JU "Zahumlje" u Nikšić.
- U prizemlju su planirane nove kancelarije, bina i sala, dok je na 1. spratu planirano: muška i ženska svlačionica, muzička soba, sala, prostorije za šivenje, kuhinja i klub.
- U toku je izvođenje grubih građevinskih radova dogradnje novih 300 m<sup>2</sup> objekta.

## 2.4. Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs"

Status projekta: U toku

- **Adaptacija objekta palate za uspostavljanje "Creativ Hub"-a u Baru**



- Projektну dokumentaciju adaptacije palate u Baru za potrebe "Creativ Hub"-a obezbjedilo je Ministarstvo kulture. U prizemlju objekta, u prostoru nekadašnje konobe, organizovan je multifunkcionalni prostor koji treba da zadovolji informativnu, uslužnu i komercijalnu djelatnost, osmišljen kao prostor za druženje, odmor, prostor za kratke konsultacije, sastanke sa strankama, informativni pult i prodajni prostor. Na prvom spratu organizovan je radni prostor za primijenjeno vajarstvo. Na drugom spratu organizovan je kreativni prostor za umjetnike koji se bave fotografijom, grafikom, modelovanjem. Na trećem spratu organizovana je smještajna zona za umjetnike.
- Uprava javnih radova je krajem 2019. godine ugovorila izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora i isti su u toku.

## **2.5. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Obaveza Ministarstva kulture je da dostavi neophodnu dokumentaciju, urbanističko-tehničke uslove, projektne zadatke, idejna rješenja na osnovu kojih bi Uprava javnih radova pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## **2.6. Muzej savremene umjetnosti u Podgorici**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Obaveza Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## **2.7. Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- U toku su aktivnosti na izradi i reviziji Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Zetski dom na Cetinju koje sprovodi Ministarstvo kulture.
- Nakon što projektna dokumentacija bude dostavljena Upravi javnih radova ista će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.



### **3. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA**

### 3.1. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Kotoru

Status projekta: U toku



- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora kao i izvođenja radova na objektu.
- Shodno Ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenom u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Direkcije javnih radova, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, učešće Vlade Crne Gore posredstvom Direkcije javnih radova iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11€.
- Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m<sup>2</sup>.
- Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
- U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- U 2017. godini i 2018. godini odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
- U 2019. godini nije bilo realizacije zbog usaglašavanja projektne dokumentacije čije aktivnosti sprovodi Opština Kotor.

## 3.2. Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru

Status projekta: U toku



- Objekat bazena čija je rekonstrukcija u toku, nalazi se na katastarskoj parceli površine cca 5980 m<sup>2</sup>, dok je bruto površina objekta 5.400 m<sup>2</sup>.
- Na prizemnoj etaži objekta su smještene četiri zasebne svlačionice za sportiste sa sanitarnim čvorovima i garderobama, velika teretana, sauna i tursko kupatilo sa svlačionicama i tuševima, priručna ambulanta za antidoping kontrole, prostorije za delegata i sudije, biletarnica, dvije posebne svlačionice sa tuševima za posjetioce, prostorijeVK „Primorac“ i tehničke prostorije. Na gornjoj etaži, etaži ispod tribina, nalazi se osam kancelarija, sala za sastanke i sanitarni čvorovi namijenjeni zaposlenima i publici, s obzirom na to da je ovo pristupna etaža tribinama.
- Tribine za gledaoce projektovane su za 1.405 sjedećih mjesta, a u ovom prostoru su smještene još i prostorija za novinare, režiju i kamermane.
- U 2017. godini završeni su radovi I faze koji su obuhvatili sanaciju čelične i betonske konstrukcije, izradu revizionih staza i sanaciju krovnog pokrivača i fasadnih površina.
- Nakon dva poništena javna nadmetanja za izbor izvođača radova II faze, tokom 2017. i 2018. godine, krajem 2018. godine je raspisano novo javno nadmetanje, nakon čega je i potpisan ugovor sa Izvođačem

radova početkom 2019. godine, a sa radovima se otpočelo krajem februaru u skladu sa zahtjevom korisnika.

- II faza rekonstrukcije obuhvata sve preostale radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju, odnosno radove na instalacijama jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehničkim i splinker instalacijama, kao i instalacije bazenske tehnike, radove na uređenju terena i opremanju objekta namještajem i sportskom opremom.
- Izvođenje radova je pratila problematika koja se odnosila na pojavu nepredviđenih radova usljed propusta u projektnoj dokumentaciji i propadanja objekta zbog neodržavanja, kao i nemogućnost Opštine Kotor da obezbijedi lokaciju za deponovanje građevinskog šuta. Takođe, usljed nedovoljnog angažovanja izvođača radova (nedovoljan broj radnika na objektu, neblagovremeno ukazivanje na neusaglašenosti i propuste iz projektne dokumentacije, kasno uvođenje podizvođača u posao) radovi nisu završeni u utvrđenom roku. Dalje prolongiranje završetka radova krivicom izvođača rezultiraće naplatom ugovornih penala.
- U toku su radovi na montaži fasadne baravarije, zanatski radovi, radovi na instalacijama jake i slabe struje i mašinskih instalacija.
- Završetkom radova II faze objekat će biti stavljen u funkciju.

### **3.3. Izgradnja sportskih terena i sala**

- **Sportski tereni u Beranama**

Status projekata: U toku

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji sportskih terenam u Beranama je tri puta raspisivano i ista su poništena iz razloga što nije pristigla ni jedna ponuda.

- **Sportski teren u Šavniku**

Status projekata: Završen

- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Šavnik, zaključen je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji sportskog terena.
- U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji tribina, hidrotehničkim i elektro instalacijama, kao i ograda oko igrališta. Zbog zimske sezone gradilište je konzervirano, a preostali radovi na ugradnji podne obloge i isporuka mobilijara završeni su u 2019. godini.

- **Sportski tereni na Žabljaku**

Status projekata: Završen

- U 2017. godini završena je ugradnja vještačke podloge na sportskom terenu na Žabljaku, koji je izgrađen u I fazi radova. U 2018. godini završena je adaptacija svlačionica. Opština Žabljak je realizovala projekat u skladu sa potpisanim protokolom sa Upravom javnih radova.

- **Sportski tereni u Andrijevici**

Status projekata: Završen

- U 2019. godini završena je izgradnja sportskog terena za male sportove sa igralištem za djecu sa opremanjem u Andrijevici, u neposrednoj blizini Doma kulture.

- **Sportsko igralište u MZ Bukovica**

Status projekata: Završen

- U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji igrališta za Osnovnu školu u Bukovici koji su obuhvatili asfaltiranje igrališta i montažu pratećih elemenata igrališta za sport.

### 3.4. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

Status projekta: U toku



- U 2019. godini završena je izrada Glavnog projekta sportske sale koja je locirana u krugu školskog centra „Tvrtko Bijelić“, u neposrednoj blizini školskog objekta, u ulica Narodne omladine u Nikšiću.
- Objekat sadrži fiskulturnu salu sa gledalištem, planiranu za potrebe fakulteta i za sportska takmičenja-srednji nivo takmičenja, odnosno regionalna takmičenja, takmičenja lokalnih i malih klubova, trening i rekreaciju. Uz salu planirane su garderobe, spravarnica, kancelarije i druge pomoćne prostorije. Bruto površina objekta je 1.000 m<sup>2</sup>.
- U 2020. godini planirano je raspisivanje javnih nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

### 3.5. Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama

Status projekta: U toku

- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama.
- Ukupna površina novoprojektovanog dograđenog objekta iznosi 1360 m<sup>2</sup>, a u njemu su planirani sljedeći sadržaji: fiskulturna sala sa igralištem za košarku dimenzionisanim po FIBA standardima sa sportskom opremom, igralište za odbojku sa sportskom opremom, gledalište sa montažnim tribinama, prostor za takmičare i službena lica, kao i aneks uz fiskulturnu salu sa pratećim sadržajima.
- Krajem 2019. godine zaključeni su ugovor o građenju i ugovor o vršenju stručnog nadzora, a sa radovima će se otpočeti kada se stvore povoljni vremenski uslovi.

### 3.6. Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju

Status projekta: U toku

- Školska sportska dvorana u Gusinju je locirana u zahvatu plana „Plan uređenja naselja Gusinje“.
- Objekat je spratnosti visoko prizemlje, površine 2.180 m<sup>2</sup>, sa sljedećim sadržajima: glavni ulaz sa biletarnicom i sanitarnim blokom, igralište za rukomet, košarku i odbojku, tribine za gledaoce kapaciteta 500 mjesta, prostorija za rekvizite, svlačionice za učenike i nastavnike sa toaletom i tuševima, kancelarije za zaposlene, kao i tehničke prostorije. Prostor dvorane je osim za razne vrste sportova planiran da se koristi i za druga dešavanja kao što su koncerti, plesne večeri, plesna takmičenja, proslave i mnoga druga društvena dešavanja. U okviru parcele formirana je interna saobraćajnica parking sa 70 parking mjesta za vozila i 4 parking mjesta za autobuse.

- Tehnička dokumentacija za predmetni objekat je izrađena i revidovana 2014. godine u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.
- U oktobru 2017. godine došlo je do promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti građevinarstva, u skladu sa kojim je neohodno prilagoditi tehničku dokumentaciju školsko sportske dvorane u Gusinju, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji.
- S obzirom na to da je Plan uređenja naselja Gusinja prestao da važi istekom vremena za koji je donijet, nakon usvajanja PUP-a od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, sagledaće se dalji koraci i procedure oko realizacije projekta izgradnje sportske dvorane u Gusinju.

### **3.7. Izgradnja otvorenog bazena-kupališta u Pljevljima**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza opštine je da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### **3.8. Rekonstrukcija zapadne tribune stadiona FK Sutjeska u Nikšiću**

Status projekta: U toku

- Opština Nikšić je, uz podršku Fudbalskog saveza Crne Gore, sprovedla aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije zapadne tribune fudbalskog stadiona u Nikšiću.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa na poziciji gdje se nalazi postojeća tribina, koja se ruši. u sklopu objekta predviđene su sledeće prostorije: prostorija za službene predstavnike, prostorija za sportiste, prostorija za medije, prostorija za gledaoce i VIP gledaoce, prostorija za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske prostorije, tehničke prostorije.
- Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi cca 6.200 m<sup>2</sup>. Tribine su ukupnog kapaciteta 3233 gledalaca.
- Zaključkom Vlade Crne Gore zaduženo je Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Upravom javnih radova planira sredstva u okviru godišnjeg zakona o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu u ukupnom iznosu od 3.300.000.00 €, na ime kofinansiranja projekta .
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja, Uprava javnih radova je u decembru 2019. godine potpisala ugovor sa izvođačem radova. Uvođenje izvođača u posao planirano je početkom januara 2020. godine.

### 3.9. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

Status projekta: U toku



- Zaključkom Vlade Crne Gore započeta je realizacija projekta kojim se utvrđuju obaveze po pitanju izrade projektne dokumentacije, kao i obezbjeđenja finansija od strane Fudbalskog saveza Crne Gore i Prijestonice Cetinje, dok će preostala sredstva biti obezbijedena kroz Kapitalni budžet, u skladu sa mogućnostima, kao učešće Vlade Crne Gore u sufinansiranju projekta. Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-2514 od 27. jula 2017. godine zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova planira sredstva u Kapitalnom budžetu za 2018. godinu u iznosu do 1.395.000,00 €, u 2019. godini, sredstva u iznosu do 1.500.000,00 € i u 2020. godini sredstva u iznosu do 1.500.000,00 €, na ime kofinansiranja projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju.
- U 2016. završena je izrada i revizija Glavnog projekta kojom je kordinirala Prijestonica Cetinje.
- Nakon završene procedure javnog nadmetanja izabran je najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova i isti su započeti u novembru 2017. godine. Izvođač radova je "Erlang" d.o.o. Podgorica, a vrijednost ugovora je 8.784.604,06€. Stručni nadzor vrši "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica, a vrijednost posla je 174.930,00€.
- U 2018. godini nastavljeno je sa radovima na izgradnji objekta. U toku su radovi na izradi armirano betonske konstrukcije istočne, zapadne i sjeverne tribine.
- U 2019. godini nastavilo se sa izvođenjem radova na armirano betonskoj i čeličnoj konstrukciji objekta kao i na grubom razvodu instalacija.

#### **4. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE**



## 4.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje

Status projekata: U toku

- U periodu od 2008. godine, odvijaju se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezano za rješavanje trajnog skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i za izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za njihovu realizaciju iz domaćih izvora nedostatna, dio ovih projekata planiran je da se finansira kroz instrument predpristupne pomoći IPA programa, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.
- Koordinator ovih projekata je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

### • **Izrada Glavnog projekta za odvođenje atmosferskih voda sa područja Ulcinjskog polja**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Nisu stvoreni uslovi za početak realizacije projekta. Korisnik nije dostavio neophodnu dokumentaciju na osnovu koje bi Uprava javnih radova pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

### • **Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima**

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Mininistarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ.
- Radovi na rekonstrukciji filterske stanice su ugovoreni i isti su u toku.

### • **Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu.
- Opština Mojkovac je u saradnji sa nadležnim Ministarstvom održivog razvoja i turizma radove rekonstrukcije i izgradnje fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića potoka i Ambarina kandidovala za finansiranje kroz IPA fondove.

- **Vodovodna i kanalizaciona mreža u Kolašinu**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti



- U 2017. godini Uprava javnih radova je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Kolašin su kandidovali finansiranje projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja kroz IPA fond. Planirano je da se postrojenje gradi po principu "projektuj i izgradi" po žutoj knjizi Fidika, a kanalizaciona mreža na osnovu Glavnog projekta za koji su u toku aktivnosti na pripremi projektnog zadatka. Na osnovu dostavljenog projektnog zadatka, Uprava javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.

- **Glavni projekat kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja**

Status projekta: U toku

- U prethodnom periodu ugovorena je izrada prethodne hidrotehničke studije i Glavnog projekta za kanalisanje i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja. Nakon što je Studija izrađena u julu 2016. godine dostavljena je Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Prijestonici na saglasnost.
- Nakon što su u 2018. godini dobijene finalne smjernice Ministarstva održivog razvoja i turizma Studija je usvojena, a nakon pribavljajna urabnističko-tehničkih uslova i kompletiranja projektnih zadataka u 2019. godini otpočelo se sa izradom Glavnih projekata i aktivnosti na izradi su u toku.
- Radovi na kanalisanju i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja su kandidovani za finansiranje kroz IPA fond.

- **Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže za naselja na Cetinju**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Nisu stvoreni uslovi za početak realizacije projekta. Korisnik nije dostavio neophodnu dokumentaciju na osnovu koje bi Uprava javnih radova pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- **Glavni projekat II i III faze kanalizacione mreže u Rožajama**

Status projekta: U toku

- Izmjene i dopune Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Rožajama su završene.
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Opština Rožaje su kandidovali finansiranje projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja kroz IPA fond. Planirano je da se postrojenje gradi po principu "projektuj i izgradi" po žutoj knjizi Fidika, a kanalizaciona mreža za II i III fazu na osnovu Glavnog projekta za koji je Uprava javnih radova raspisala javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije.

- **Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac**

Status projekta: U toku

- Opština Mojkovac je dostavila projektnu dokumentaciju za izgradnju nedostajuće fekalne kanalizacije u ulici "Vojislava Šćepanovića". U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

- **Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik**

Status projekta: U toku



- U 2019. godini ugovoreni su radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku, izvođač je uveden u posao i otpošlo se sa radovima.
- Zbog loših vremenskih uslova, krajem 2019. godine radovi su konzervirani i isti će biti nastavljeni u 2020. godini.

## **4.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada**

Status projekata: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata sanacije postojećih odlagališta otpada za više opština na sjeveru Crne Gore, kao i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

### **• Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu**

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- U 2019. godini potpisan je Ugovor za izvođenje radova, izvođač je uveden u posao i radovi su izvođeni do pred kraj 2019. godine, kada su prekinuti zbog nepovoljnih meteoroloških uslova i isti će biti nastavljeni u 2020. godini, čim se za to stvore uslovi.

### **• Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem u Beranama**

Status projekta: U toku

- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta. Iste godine objavljeno je javno nadmetanje za izvođenje radova koje je poništeno zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji iste u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova i isto je u toku.

### **• Transfer stanica u Andrijevici**

Status projekta: U toku

- U 2017. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- Krajem 2018. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova, a izvođač je uveden u posao u septembru 2019. godine nakon rješavanja, u saradnji sa lokalnom upravom, određenih problema vezanih za pristup lokaciji objekta.
- Radovi su izvođeni do pred kraj 2019. godine, kada su prekinuti zbog nepovoljnih meteoroloških uslova i isti će biti nastavljeni u 2020. godini, čim se za to stvore uslovi.

### **• Transfer stanica u Pljevljima**

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i opština Pljevlja su dostavili projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove neophodne za izradu Glavnog projekta.
- Kako postoje određene neusaglašenosti između projektnog zadatka i dostavljenih UTU-a, u toku su provjere i usaglašavanje istih, nakon čega će se u 2020. godini pristupiti raspisivanju javnih nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.

### 4.3. Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

Status projekta: U toku

- Uprava javnih radova je u 2014. godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju hidrotehničkim tunela u Mojdežu, opština Herceg Novi. Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze. Radovi I faze podrazumijevali su sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350m. Radovi su se odnosili na tunelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela.
- Radovi II faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela. Da bi se imao uvid u zatečeno stanje postojećeg tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije II faze, potrebno je isti u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Za ove radove raspisano je javno nadmetanje početkom 2016. godine, donešena je odluka o najpovoljnijem ponuđaču, ali je zbog žalbe tenderski postupak je poništen.
- U martu 2018. godine ponovno je raspisan tender za izvođenje radova i u junu 2018. godine je potpisan Ugovor sa odabranim izvođačem radova. S obzirom da se radovi mogu izvoditi samo u sušnom periodu, kada je nivo podzemnih voda u tunelu najniži, isti su otpočeli krajem avgusta i isti su se odvijali planiranom dinamikom sve do polovine novembra kada više uslovi to nisu dozvoljavali.
- Sa radovima se nastavilo u julu 2019. godine i izvođeni su do novembra 2019. godine, uz stalno obrušavanje i nanošenje novih količina zemljanog materijala, kada su prekinuti zbog povećanog priliva voda.
- Za nastavak realizacije projekta potrebno je dati tehnička rješenja i uraditi projektnu dokumentaciju.



### 4.4. Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima na realizaciji projekata izgradnje sistemima vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Andrijevića i drugim opštinama po prioritetima Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.

- **Vodovod Krkori III faza**

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodozahvata i izgradnji hlorne stanice na izvorištu Krkori, kao i radovi na izgradnji cjevovoda od izvorišta prema hlornoj stanici u dužini od 1,85 km.
- U 2016. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji preostalih 1,45 km cjevovoda. Takođe, raspisano je javno nadmetanje i ugovoreno izvođenje radova na opremanju hlorne stanice i spajanju vodozahvata sa izgrađenim cjevovodom. Svi ugovoreni radovi završeni su u 2017. godini.
- Takođe, u 2017. godini, raspisano je i javno nadmetanje i ugovoreno je izvođenje radova III faze koja obuhvata izgradnju 7 km primarnog cjevovoda od hlorne stanice ka gradu i dogradnju vodozahvatne građevine sa pratećom opremom.
- U 2018. godini Izvođač je uveden u posao i radovi su izvođeni dok su to dozvoljavali meteorološki uslovi. Radovi na postavljanju cjevovoda i rekonstrukciji vodozahvata su većinom odrađeni i preostala je ugradnja opreme u 2019. godini.
- Od strane opštine Andrijevica obaviješteni smo da zbog skučenosti prostora i zauzetosti istog od strane privatnih investitora, nije moguće pristupiti objektu vodozahvata i završiti preostale radove tokom većeg dijela 2019. godine. Uslovi za nastavak radova su stvoreni u novembru 2019. godine i isti se nalaze u završnoj fazi.



- **Rezervoar “Gradiošnica” i sistem vodosnadbijevanja u Tivtu**

Status projekta: Završen

- U 2018. godini završen je postupak javnih nabavki, izabran je Izvođač radova i ugovoreni su radovi.
- U 2018.godini planirani su radovi na izgradnji rezervoara, što predstavlja I fazu realizacije projekta. Izvođač je uveden u posao, ali su radovi obustavljeni jer Opština Tivat nije bila riješila imovinsko-pravne probleme u vezi sa pristupnim putem do lokacije rezervoara. Navedena problematika je riješena krajem 2018.godine i Izvođač je ponovo uveden u posao i otpočeo sa izvođenjem radova.
- Radovi su zbog vremenskih prilika obustavljerni u zimskom periodu i nastavljeni su u martu 2019. godine u otežanim uslovima zbog skućenosti lokacije i rješavanja pitanja odvoza viška materijala materijala iz iskopa od strane Opštine, zbog čega je i potpisan Anex ugovora za produženje roka.
- Zbog određenog kašnjenja vezanog za obaveze odvoza viška materijala od strane Opštine kao i vremenskih prilika u aprilu i maju 2019. godine, radovi su intezivno nastavljeni tek u junu 2019. godine i isti su završeni do kraja godine.
- U 2020. godini su planirane aktivnosti na predaji objekta Korisniku.

- **Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta "Gojakovići" u Mojkovcu**

Status projekta: U toku

- U 2018. godini, na osnovu tehničke dokumentacije koju je pribavila opština Mojkovac, raspisano je javno nadmetanje za izbor Izvođača radova na Rekonstrukciji i zaštiti vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu.
- Potpisan je ugovor za izvođenje radova, a izvođač nije uveden u posao u 2019. godini jer opština Mojkovac nije riješila imovinsko pravne odnose i stvorila uslove za prijavu radova.
- Aktivnosti će biti nastavljene u 2020. godini kada opština Mojkovac riješi pomenutu problematiku.

- **Izgradnja vodovoda "Zaton", Bijelo Polje**

Status projekta: U toku

- Krajem 2019. godine zaključen je ugovor sa izvođačem za izvođenje radova na izgradnji vodovoda "Zaton0 u Bijelom Polju.
- U 2020. godini izvođač će biti uveden u posao čim se za to stvore povoljni vremenski uslovi.


## **4.5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama**

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira aktivnostima kojima se realizuju projekti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sistema za odvođenje otpadnih voda.
- Projekat se realizuje u kontinuitetu.
- **Glavni projekat izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacione mreže DUP-a »Šavnik –Jug« i »Šavnik- Sjever«**

Status projekta: U toku

- Izgradnjom nedostajuće fekalne kanalizacione mreže omogućit će se da se objekti koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu priključe na istu, što će stvoriti uslove da u ranijem periodu izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u punom kapacitetu.
- U septembru 2019. godine potpisan je Ugovor za izvođenje radova u iznosu od 304.971,87€ i otpočelo se sa izvođenjem radova, a isti su izvođeni dok su to dozvoljavale vremenske prilike.
- U 2020. godini radovi će biti nastavljeni čim to dozvole vremenski uslovi.



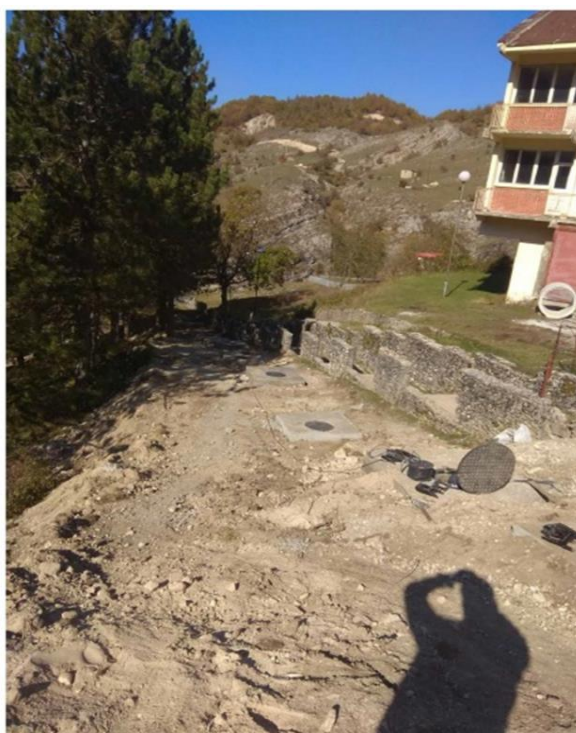

- **Kanalizaciona mreža na Vranjini**

Status projekta: U toku

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Glavni grad Podgorica dostavili su projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove za izradu Glavnog projekta klanalizacione mreze za naselje Vranjina.
- U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije.

- **Izgradnja objekta Fekalne kanalizacije LSL “Kovačka dolina I”, Žabljak**

Status projekta: U toku

- U 2019. potpisan je ugovor za izvođenje radova, izvođač je uveden u posao i radovi su se odvijali dok su to dozvoljavali vremenski uslovi.
- Radovi su trenutno konzervirani, usled nepovoljnih vremenskih uslova i nastaviće se u 2020. godini.

#### **4.6. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja**

Status projekta: U toku

- Nabavku i distribuciju peleta Uprava javnih radova i Opština Pljevlja su realizovali na način što je Uprava javnih radova je izvršila transfer sredstava u skladu sa Ugovorom kojim se Opština Pljevlja obavezala da obezbijedi isporuku peleta, u iznosu od 130.000 eura.
- Opština Pljevlja je bila naručilac Glavnog projekta toplane, magistralnog cjevovoda i podstanice (centralna energetska stanica-CES) za toplifikaciju Pljevalja. Uprava javnih radova je u 2018. godini raspisala javno nadmetanje i ugovorila izvođenje radova I faze koja obuhvata izgradnju dva kotla ukupne snage 6.5MW i izgradnju objekta toplane na Radosavcu. Radovi nisu započeli s obzirom na to da Opština Pljevlja nije obezbijedila građevinsku dozvolu.
- Opština Pljevlja je u septembru 2019. godine obavijestila Upravu javnih radova da je odustala od zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole prema Ministarstvu održivog razvoja i turizma i o tome ih obavijestila pisanim putem, kao i da je Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić u okviru ekološke rekonstrukcije

Termoelektrane Pljevlja predvidjela radove na izgradnji baznog, vršnog i rezervnog izvora toplifikacije grada, tako da će značajno ubrzati realizaciju ovog projekta. Toplana na Radosavcu je bila predviđena da bude rezervna u slučaju gradnje toplotnog izvora iz Termoelektrane Pljevlja, što je sad nepotrebno jer se isti gradi u TE Pljevlja.

- Opština Pljevlja je predložila da se preostala sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 720.000eura utroše za:

-Izradu projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja i reviziju istog

-Izradu projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja pljevalja od kapije Termo elektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima

-Reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja pljevalja od kapije Termo elektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima

-Eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje primarnog toplovoda

-Sprovođenje mjera energetske efikasnosti

Navedene aktivnosti nisu sprovedene u 2019. godini.

#### 4.7. Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih Sistema

Status projekta: U toku



- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju infrastrukture za unapređenje postojeće mreže meteoroloških i hidroloških stanica i obuhvata IV faze.
- U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture I faze koja je obuhvatila 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica.
- U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji infrastrukture II faze koja je obuhvatila izgradnju 5 padavinskih i 5 hidroloških stanica i raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za zvođenje radova III faze koja obuhvata 15 padavinskih i 7 hidroloških stanica i IV faze. koja obuhvata rekonstrukciju meteoroloških stanica u tri opštine.

#### 4.8. Sanacija odlagališta u Plavu

Status projekta: U toku

- U 2016. godini potpisan je donatorski Ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, o zajedničkoj realizaciji projekta, sa ušćem

po 50% u ukupnoj vrijednosti Ugovora. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi“. CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela krajem 2016. godine.

- Reviziju i nadzor finansira Vlada Crne Gore posredstvom Uprave javnih radova.
- U 2018. godini završena je izrada Glavnog projekta. Početak radova planiran je za jul 2018. godine, ali se radovi nisu izvodili zbog neriješenih odnosa sa građanima. Krajem 2018. godine opština Plav je riješila sporove sa građanima, čime su se stvorili uslovi da se sa radovima započne u 2019. godini.
- U 2019. godini radovi su započeti čim su se za to stekli povoljni vremenski uslovi i isti su završeni krajem 2019. godine, osim radova na ozelenjavanju koji će se realizovati u 2020. godini u skladu sa vegetativnim periodom planiranog rastinja.

#### **4.9. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina u Rožajama**

Status projekta: U toku



- U 2017.godini raspisano je javno nadmetanje za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda na području Bukovica-Radetina u Rožajama.
- U 2018. godini, ugovoreni su radovi I faze i isti su završeni.
- U 2019. godini nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova II faze donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i u toku je potpisivanje Ugovora. Radovi su obuhvatali distributivni cjevovod u dužini od 12 km, izgradnju kaptaže i objekta za smještaj pratećih elemenata za uredno snabdijevanje 150 potrošača za koliko je ovaj projekat i predviđen.
- Vodovod će na korišćenje Opštini Rožaje biti predat u 2020. godini.

#### **4.10. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera**

Status projekta: U toku

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Tokom 2017. godine opština je sprovodila aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za Studiju izvodljivosti.
- U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na izradi Studije na osnovu koje će se pristupiti izradi Glavni projekat zaštite Plavskog jezera.
- Od strane Opštine obaviješteni smo da je završena izrada Studije izvodljivosti i da su u toku aktivnosti na pripremi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije.

#### 4.11. Vodovod Šavnik

Status projekta: U toku

- Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji vododvoda.

#### 4.12. Vodovod Ćosovsko vrelo u Rožajama

Status projekta: U toku



- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- U 2015. godini Uprava javnih radova je izradila Glavni projekat i završeni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju kaptaže, hlorne stanice, cjevovoda između njih u dužini od 100 m i elektroenergetskog priključka za hlornu stanicu.
- U 2016. godini ugovoreno je izvođenje radova II faze koji obuhvataju izgradnju cjevovoda za vodosnadbijevanje MZ Ćosovića i MZ Gornja Lovnica i isti su završeni.
- U 2017. godini izvođeni su radovi III faze na primarnom cjevovodu u dužini od 2500 m sa iskopima i postavljanjem cijevi, sve dok su to dozvaljali vremenski uslovi. U 2018. godini radovi III faze su završeni.
- Takođe, u 2018. godini ugovoreno je za izvođenje radova IV faze izgradnje vodovoda čime bi realizacija ovog projekta biti kompletirana. U 2019. godini radovi su nastavljeni i izvodili su se do kada su vremenski uslovi to dozvoljavali.
- Radovi na ovoj fazi će biti nastavljeni u 2020. godine sa kojom će biti i završen kompletan projekat.

## **5. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE**

## 5.1. Rekonstrukcija “Ribarske ulice” u Plavu

Status projekta: U toku

- Rekonstrukcija “Ribarske ulice” obuhvata radove na saobraćajnici dužine od cca 540 m, sa dvije kolovozne trake širine po 2,75 m i jednostranim trotoarom, izradu vodovoda, fekalne kanalizacije i javne rasvjete.
- Radovi na ovom projektu su ugovoreni sa preduzećem „Putevi Bar“, ali se nisu izvodili u 2019 god. zbog obaveza koje je Opština Plav preuzela za radove na izgradnji potpornog zida u dužini od 140 m na početku puta.
- Izvođač radova na ovom projektu će otopčeti sa radovima u 2020. godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi, a rok završetka radova je 3 mjeseca od datuma uvođenja u posao.

## 5.2. Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu

Status projekta: U toku



- U 2019. godini izvođeni su radovi na izgradnji pratećeg sadržaja šetališta pored rijeke Tare, a koji su se odnosili na izgradnju pješačkih staza sa pratećom rasvjetom. Preostali radovi biće ugovoreni i završeni u 2020. godini, a odnose se na pejzažnu arhitekturu.
- U 2019. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova I faze izgradnje pješačkog mosta – pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje.
- Tokom 2019. godine završeni su radovi na izgradnji rasponske konstrukcije mosta, izrada spiralne rampe, ugranja čelične ograde mosta, izrada i montaža čeličnih konstrukcija nadstrešnica i stubova na rampi. Zbog niskih temperatura preostali radovi na izradi hidroizolacije armirano betonskih površina su obustavljeni.
- U 2020. godini planirano je ugovaranje i završetak preostalih radova na izgradnji pasarele.

### 5.3. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Status projekata: U toku

- Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica realizuju lokalne samouprave u kontinuitetu.
- Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2019. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju. Naime, u 2019. godini Uprava javnih radova je sa opštinama zaključila ugovore u određenom iznosu za realizaciju projekata u okviru programa "Izgradnja lokalne infrastrukture", i to za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- Projekti za koje je Uprava javnih radova zaključila ugovore za projektantima, revidentima, izvođačima radova i stručnim nadzorom prije potpisivanja predmetnih ugovora, ostaju u nadležnosti Uprave.

- **Lokalni putevi i gradske saobraćajnice**

- **Opština Berane**



- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 300,000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

#### **Modernizacija lokalnog puta za Petnjik**

- U septembru 2019. godine su otpočeli radovi na modernizaciji lokalnog puta u Opštini Berane-putni pravac za Petnjik, u dužini od 600m. Svi ugovoreni radovi su završeni.

#### **Izgradnja ulica kod pomoćnih terena, Crpna stanica - OŠ Vuk Karadžić, L = 413m**

- Obaveza Opštine Berane je rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Nakon što opština obezbjedi uslove za prijavu građenja, izvođač će biti uveden u posao.

- **Opština Pljevlja**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 250.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- **Opština Šavnik**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- **Opština Gusinje**

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Lokalni put Gusinje-Vusanje**

- U toku je zaključivanje ugovora za obrađivačem za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta lokalnog puta Gusinje-Vusanje.

**Rekonstrukcija "Kosovske ulice"**

- Radovi se odnose na rekonstrukciju gradske saobraćajnice u dužini od 330 m. Završeni su radovi na izradi kanalizacione mreže, a preostali su radovi na asfaltiranju koji će biti završeni kada vremenski uslovi to dozvole, u 2020. godini.

- **Opština Danilovgrad**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Modernizacija lokalnih puteva dužine 2,5 km**

- Svi radovi su završeni u 2018. godini osim radova na ugradnji asfaltnog zastora.
- Početkom 2019. godini preostali radovi su nastavljeni i završeni.

**Sanacija klizišta Šobajići**

- Nakon što Opština Danilovgrad dostavi revidovan Glavni projekat sanacije klizišta, Uprava javnih radova će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

**Put Danilovgrad – Spuž**

- Završena je izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad-Spuž, dionica Gorica-Burum i raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.




- **Opština Podgorica**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Rekonstrukcija lokalnog puta Han Garančića-Opasanica**

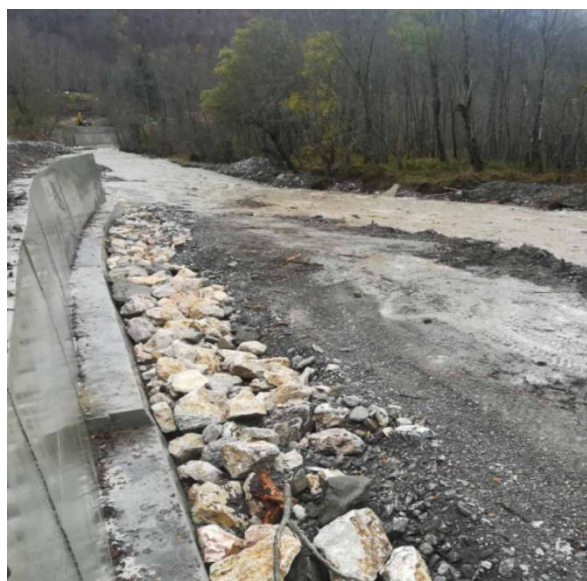

- Radovi na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica započeli su u septembru 2019. godine i obuhvataju rekonstrukciju puta i izradu potpornih zidova. Radovi su obustavljeni u decembru 2019. godine i biće nastavljani kada to dozvole vremenski uslovi.

- **Opština Andrijevica**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Ulica Branka Deletića**


- Radovi na rekonstrukciji trotoara u ulici "Branka Deletića" i izgradnjom javne rasvjete su započeli u 2018. godini a u 2019. godini su nastavljeni i završeni.

- **Uređenje spomen parka „Knjaževac”**

- Opština Andrijevica je za potrebe uređenja spomen parka „Knjaževac” izradila projektну dokumentaciju za koju je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

- **Opština Rožaje**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

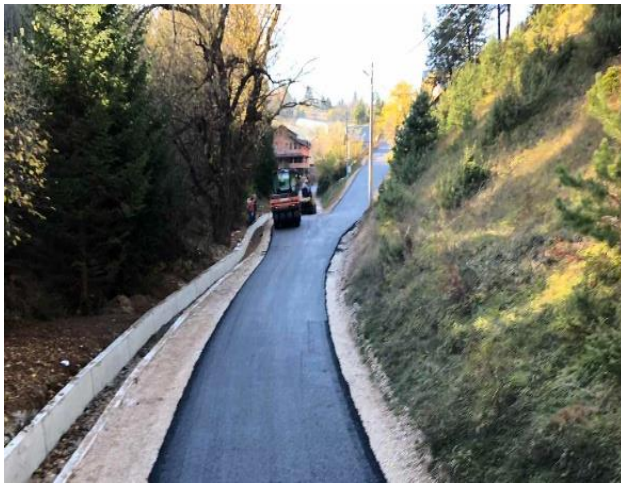

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

### **Sandžačka ulica**

- Radovi na ovoj ulici u dužini od 330 m su izvođeni u dvije faze.
- U I fazi izrađena je fekalna i atmosferska kanalizaciju, a u II fazi završno je postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje ulce.
- Svi radovi su završeni u novembru 2019. godine.

### **Ulica ka Hurijama**

- Radove na ovoj ulici obuhvatali su izradu potpornih zidova, tamponiranje, i asfaltiranje u dužini od 150 m.
- Svi radovi su završeni u novembru 2019. godine.

### **Jukov potok**

- Radove na ovoj ulici obuhvatali su izradu abarmiranobetonskog korita za otpadne vode u dužini od 200 m, kao i asfaltiranje putnog pravca u dužini od 660 m.
- Svi radovi su završeni u oktobru 2019. godine.

### **Opština Bijelo Polje**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 350.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

### **Izgradnja puta Gubavač-Bistrica dužine cca 8,7 km**

- U 2019. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta izgradnje puta Gubavač-Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice i raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

### **Sanacija kosine na saobraćajnici u Bijelom Polju**

- U 2019. godini završeni su radovi na sanaciji kosine u "Mojkovačkoj ulici" u Bijelom Polju. Urađena je zaštita kosina prirodnim jutanim vlaknima sa hidrosjetvom, na jednom dijelu i heksagonalnim žičanim pletivom na drugom dijelu kosine.

### **Rekonstrukcija puta Srđevac-Lozna-Sipanje**

- U 2019. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Srđevac –Lozna-Sipanje.
- U decembru 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za I fazu rekonstrukcije puta, u dužini 4,2km.



### **Gradska saobraćajnica u Resniku I faza**

- Krajem 2018. godine započeti su radovi I faze koji su se izvodili uz prolongiranje usled neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nedostataka u projektnoj dokumentaciji.
- Prva faza radova obuhvata pripreme i zemljane radove, ugradnju tampona, izradu atmosferske i fekalne kanalizacije, radove na visokonaponskoj i niskonaponskoj kablovskoj mreži. U ovoj fazi ugovorena je i modernizacija saobraćajnice u industrijskoj zoni.
- Gradilište je konzervirano tokom zimskog perioda.

### **Gradska saobraćajnica u Resniku II faza**

- Radovi II faze su ugovoreni i obuhvataju završne radove gornjeg stroja, kolovoznu konstrukciju i izgradnju javne rasvjete.
- Sa radovima II faze otpočeće nakon završetka radova I faze.

### **Gradska saobraćajnica - Raskrsnica ulica "Mojkovačka" - bivša magistrala**

- Revident je tehnički prihvatio projekat, međutim CEDIS nije dao saglasnost na isti, zahtijevajući da se uradi poseban projekat izmještanja postojećeg 10 kv kabla.

### **• Opština Petnjica**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 250.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

### **• Opština Nikšić**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 500.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

### **• Opština Mojkovac**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 250.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

### **Modernizacija lokalnog puta Pržišta-Žarski katun**

- U novembru 2018. godine zaključen je ugovor za modernizaciju lokalnog puta Pržišta-Žarski katun -I faza u dužini 2km. Radovi su završeni u 2019. godini.
- U 2019. godini završena je i modernizacija II faze lokalnog puta Pržišta-Žarski katun u dužini 2 km.

### **Rekonstrukcija ulice pored groblja**

- U 2018. godini završena je projektna dokumentacija za ulicu pored groblja i potpisan je ugovor za izvođenje radova I faze. Radovi su obustavljeni zbog loših vremenskih uslova i isti su nastavljeni u 2019. godini.
- U 2019. godini ugovoreni su i radovi II faze rekonstrukcije ulice pored groblja. Radovi obje faze su završeni čime je završena i rekonstrukcija ulice.

- **Opština Kolašin**

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 250.000€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.


Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Modernizacija lokalnog puta Manastir Morača-Bare Radovića**


- U 2019. godini završeni su radovi na modernizaciji lokalnog puta Manastir Morača-Bare Radovića u opštini Kolašin, u dužini od 1km.

**Rekonstrukcija gradskih ulica u Kolašinu**

- Nakon raskida ugovora sa odabranim izvođačem radova za rekonstrukciju gradskih ulica u Kolašinu u dužini 1,5km, raspisan je novi tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
- Radovi su ugovoreni i završeni u 2019. godini.

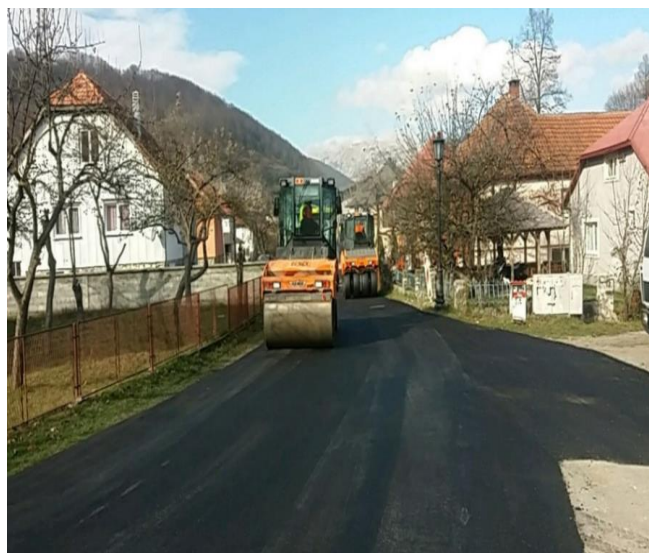

- **Opština Ulcinj**

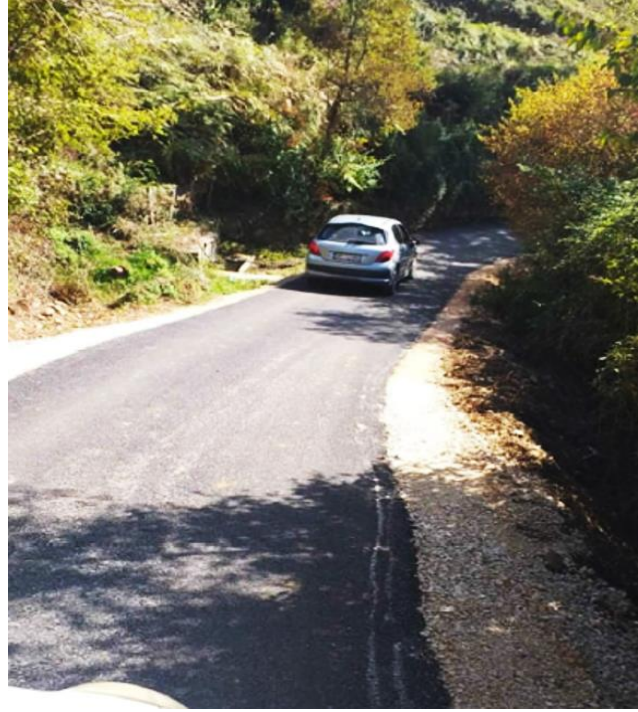

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Modernizacija lokalnog puta u naselju Kolomza**

- Modernizacija lokalnog puta u naselju Kolomza, u opštini Ulcinj, realizovana je u dvije faze, svaka dužine po 1,2km. Radovi obje faze su završeni.

**Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Ulcinju**

- Ugovor za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u urbanoj cjelini Stari grad u Ulcinju je potpisan u decembru 2017. godine.
- Nakon usaglašavanja projektne dokumentacije sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara i važećom zakonskom regulativom, početak izvođenja prve faze radova planiran je u 2020. godini.

- **Opština Bar**

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

**Izgradnja lokalnog puta Ckla-granica sa Albanijom**

- Krajem 2019. Godine raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Ckla-granica sa Albanijom.

**Izgradnja pothodnika u Sutomoru**

- U 2018. godini zaključen je ugovor za izgradnju pothodnika u Sutomoru, a na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Bar.
- Tokom 2019. godine usaglašavana je organizacija gradilišta sa zahtjevima Željezničke infrastrukture Crne Gore po pitanju zaštite infrastrukturnih postrojenja i organizovanja željezničkog saobraćaja za vrijeme izgradnje pothodnika.

- Imajući u vidu zahtjeve Željezničke infrastrukture Crne Gore, a koje nisu obuhvaćeni ugovorom sa izvođačem radova, dalje aktivnosti na realizaciji projekta zavisice od usaglašavanje predmetne problematike Opštine Bar kao naručioca projekta i ŽICG.

## • Opština Žabljak

- U 2019. godini Uprava javnih radova je potpisala Ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa **810 - Izgradnja lokalne infrastrukture**, a sredstva u iznosu od 200.000 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

### **Rekonstrukcija gradske ulice "Vojvode Mišića"**

- U 2018. godini zaključen je ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju gradske ulice "Vojvode Mišića".
- Sa radovima će se početi nakon što opština rješi imovinsko-pravne odnose, čime će se stvoriti uslovu za prijavu građenja i uvođenje izvođača u posao.

### **Rekonstrukcija ulice od gradske tržnice do stadiona**

- U 2018. godini zaključen je ugovor za rekonstrukciju saobraćajnice i izvođač je uveden u posao, ali su radovi obustavljeni zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.
- Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Opštine Žabljak, izvođač radova je u 2019. godini završio sa radovima. Ova saobraćajnica predstavlja nastavak ulice "Vojvode Mišića".

### **Rekonstrukcija saobraćajnice od hotela „Durmitor“ do rampe na ulasku u NP Crno jezero**

- Planirano je izvođenje radova na saobraćajnici od hotela „Durmitor“ do rampe na ulasku u NP Crno jezero, s parking prostorom. Da bi se otpočelo sa predmetnim radovima prethodno je potrebno izraditi infrastrukturu na potezu od hotela "Durmitor" do Crnog jezera, a čija je izgradnja obustavljena na zahtjev građana.

## • Prijestonica Cetinje

Iz prethodnog perioda realizuju se projekti:

### **Izgradnje infrastrukture za socijalno ugrožene kategorije**

- U 2018. godini ugovoreni su radovi na izgradnje infrastrukture za socijalno ugrožene kategorije.
- Radovi su nastavljeni u 2019. godini i isti su završeni.

## **5.4. Izgradnja gradske pijace u Gusinju**

Status projekta: U toku

- Objekat gradske pijace u Gusinju je ukupne bruto površine 763 m<sup>2</sup>, spratnosti prizemlje i potkrovlje.
- U prizemlju objekta su planirani sljedeći sadržaji: zelena pijaca, mliječna pijaca, mokri čvor, mokri čvor za invalide, kotlarnica i kancelarija. Prostor u potkrovlju predviđen je za komunalnu službu i službu zaštite i spašavanja. Obje ove službe imaju poseban hodnik i poseban ulaz.
- Za potrebe komunalne službe projektovan je zaseban hodnik, mokri čvor i 4 kancelarije. Za potrebe službe zaštite i spašavanja projektovan je zaseban hodnik, garderoba, mokri čvor, 2 kancelarije, kuhinja sa trezarijom, dnevni boravak, spavaća soba i učionica.

- Radovi II faze obuhvataju građevinsko zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije jake i slabe struje, termotehničke instalacije, radove na izradi infrastrukturnih priključaka i opremanje objekta i u toku je izvođenje istih.



## 5.5. Izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

Status projekta: U toku

- **Regulacija potoka u Petnjici**
- U 2017. godini, nakon što je Opština Petnjica dostavila projektну dokumentaciju, na osnovu iste je raspisano javno nadmetanje na regulaciji potoka u Petnjici, odabran izvođač radova i zaključen ugovor.
- Radovi su izvođeni u 2018. i 2019. godini, a nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, završeni su u septembru 2019. godine.
- U 2019. godini predstavnik Petnjice je dostavio Projekat i reviziju Glavnog projekta, nakon našeg dopisa kojim je tražena dopuna projekta i cjelokupna revizija. Pripremljen je predmjer i poslat na raspisivanje tendera, osim tendera za radove, u toku su aktivnosti na pokretanju nabavki za male vrijednosti kako bi obezbijedili nadzor istih.
- **Nastavak uređenja korita rijeke Grnčar u urbanom dijelu nizvodno od škole do mosta na ulasku u Gusinje**
- Uređenje korita rijeke Grnčar realizuje se fazno.
- U prethodnom periodu završeni su radovi I i II faze, a u 2019. godini završeni su i radovi III faze.
- U septembru 2019. godine zaključen je ugovor i otpočelo se sa radovima IV faze uređenja korita rijeke Grnčar i isti su zbog visokog vodostaja obustavljeni.
- Završekom ove faze, biće završeni svi radovi planirani na uređenju korita.
- **Regulacija korita rijeke Zlorečice**
- Nakon što je izvođač sa kojim je zaključen ugovor 2018. Godine odustao od posla, u 2019. godini ponovno je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova a regulaciji korita rijeke Zlorečice.
- **Regulacija korita Lima dionica B u Andrijevići**
- U 2019. godini završeni su svi ugovoreni radovi na regulaciji korita Lima dionica B u Andrijevići, a koji su sa prekidima izvođeni od 2017. godine.



- **Regulacija korita rijeke Lim uzvodno od mosta u Zorićima u opštini Andrijevica**
- U 2019. godini završeni su svi ugovoreni radovi na na regulaciji korita rijeke Lim uzvodno od mosta u Zorićima, a koji su sa prekidima izvođeni od 2017. godine.
- **Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici**
- Krajem 2019. godine zaključen je ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta regulacije Popče i kanalizacione mreže u Petnjici i izrada projektne dokumentacije je u toku.
- **Uredjenje korita rijeke Ibar**



- U 2018. godini ugovoreni su radovi I faze koji su obuhvatili izgradnju obaloutvrde sa lijeve i desne strane Ibra u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže. Radovi I faze su završeni u decembru 2019. godine.
- U 2019. godini raspisano je javno nadmetanja za izbor izvođača radova II faze i isto je u toku.

## 5.6. Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama

Status projekta: U toku



- Regionalne stočne pijace planirane su u naselju Talum, na lokaciji uz most preko rijeke Lim na regionalnom putu Berane - Rožaje.
- Komplex stočne pijace u Beranama prostire se na površini od 3.352 m<sup>2</sup>.
- Projektovani sadržaj su: objekat portirnice sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe za utovar i istovar životinja, boksovi za životinje, kavezi za živinu i sitne životinje. U sklopu pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3,50m koja opslužuje sve sadržaje u okviru kompleksa. U sjevernom dijelu pijace predviđen je parking prostor sa 6 parking mjesta za kamione. Na lokaciji pored stočne pijace izgrađen je parking za posjetioce sa pristupnom saobraćajnicom širine 5,5 m i 45 parking mjesta.
- U julu 2018. godine izvođač radova je, na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Berane, započeo radove I faze koji su obuhvatali i radove na izradi parkinga za posjetioce i isti su završeni krajem 2018. godine.
- U 2019. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova II faze na izgradnji regionalne stočne pijace koje je neophodno izvesti da bi se objekat stavio u funkciju, a koji se odnose na radove na izradi osočare, preostalog dijela boksova i stajališta za životinje, kaveza za živinu i sitne životinje, betonskih korita za pojenje životinja, izradu nedostajućeg dijela ograde oko kompleksa stočne pijace i kontrolnih rampi na ulazu u kompleks.
- Radovi II faze su većim dijelom završeni.
- Na osnovu dostavljene dopune projektne dokumentacije od strane Opštine Berane, raspisno je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji javne rasvjete u okviru kompleksa stočne pijace i priključenju na elektroenergetsku mrežu i isto je u toku.
- Završetkom ovih radova biće završeni svi radovi na izgradnji kompleksa pijace.

## 5.7. Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci- Njegnjevo u Bijelom Polju

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2019. godini planirana je izgradnja nedostajuće infrastrukture do pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju. Obaveza opštine je da dostavi neophodnu projektnu dokumentaciju kako bi se na osnovu iste pokrenula procedura raspisivanja javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## 5.8. Izgradnja gradske pijace u Rožajama

Status projekta: U toku





- U toku je izgradnja gradske pijace ukupne bruto površine 1.370 m<sup>2</sup>. Projektovana spratnost objekta je prizemlje i dva sprata. U prizemlju budućeg objekta planirani su sljedeći sadržaji: u prizemlju zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor.
- U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava javnih radova je na osnovu iste raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije.
- U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su radovi I faze izgradnje objekta.
- U toku je usaglašavanje radova II faze koji će obuhvatiti uređenje terena parcele i opremanje namještajem, čime će svi radovi na izgradnji objekta biti završeni.

## 5.9. Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo- Gusinje

Status projekta: U toku

- Uprava javnih radova je izradila projektnu dokumentaciju rekonstrukcije puta Plav - Vojno selo u Gusinju.
  - Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
  - Nakon što je završena I, II, III i IV faza u toku je izvođenje radova V faze.
  - U 2018. godini zaključen je ugovor sa izvođačem radova V faze koji je, nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane opštine, pristupio izvođenju radova na saniranju postojeće saobraćajnice od grada prema Vojnom selu. Radovi su zbog nepovoljnih vremenskih uslova u 2018. godini obustavljeni, a u maju 2019. godine nastavljeni.
  - Dužina puta u ovoj fazi je 1200m, a do sada je odrađeno oko 1000m u dužini i sve prateće pozicije po projektu, odnosno odrađeni su hidrotehnički radovi, radovi elektro instalacija, kao i priprema podloge puta za asfalterske radove koji se nisu mogli završiti zbog nastupajućeg zimskog perioda.
  - Završetkom V faze i ugovorenih asfalterskih radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.
- **Most na rijeci Vruji u Plavu**

- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na rijeci Vruji koja čini sastavni dio rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje.
  - U 2018. godini potpisan je Ugovor sa izvođačem radova koji je, nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa, pristupio izvođenju radova na saniranju postojeće saobraćajnice od grada prema Vojnom selu.
  - U aprilu 2019. godine izvođač je odustao od realizacije ugovora, te je s toga Uprava javnih radova u oktobru 2019. godine ponovo raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- **Saobraćajnica od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji**
  - U toku je revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije saobraćajnice od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji.



## 5.10. Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu

Status projekta: U toku



- Radovi na rekonstrukciji "Prnjavorske ulice" izvode su u dvije faze, na osnovu projektne dokumentacije koju je obezbjedila Opština Plav.
- Radovi I faze završeni su 2018. godini.
- Radovi II faze otpočeli su u septembru 2019. godine i isti su krajem godine obustavljeni usled nepovoljnih vremenskih uslova.

### **5.11. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica u Plavu**

Status projekta: U toku

- U 2019. godini, na osnovu od strane Opštine Plav dostavljenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača Idejnog rješenja i Glavnog projekta i isto je u toku.

### **5.12. Izgradnja mosta u Haremima u Beranama**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza opštine je da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### **5.13. Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu**

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnju trafostanice NDTs 10/0,4 kV i 10 kV infrastrukturnog priključka, kao i izgradnju saobraćajnice za Biznis zonu u Opštini Mojkovac.
- U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija trafostanice i infrastrukturnog priključka i saobraćajnice.
- U 2019. godini zaključen je ugovor za izvođenje radova na saobraćajnici i isti su u završnoj fazi, a izvodili su se do kada su to dozvoljavali vremenski uslovi.
- Krajem 2019. godine, nakon ponovljene procedure javne nabavke, ugovoreni su radovi na izgradnji trafostanice i infrastrukturnog priključka i isti će otpočeti u 2020. godini.

### **5.14. Putni pravac Monte-Rose**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza opštine je izrada projektne dokumentacije za putni pravac Monte - Rose, a nakon što ista bude dostavljena, Uprava javnih radova će raspisati javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### **5.15. Rekonstrukcija trga u Plavu**

Status projekta: U toku

- Usled nedostatka javnih površina za okupljanje stanovnika Plava, određena je lokacija za izgradnju gradskog trga u vidu prenamjene dijela školskog dvorišta u javnu površinu. Projektnim rešenjem se predviđa uklapanje postojećeg zdravog i visokodekorativnog zelenila, a stabla planirana za uklanjanje se nadoknađuju sadnjom novih sadnica visokodekorativnih vrsta. Ukupna površina uređenja platoa je 3.308 m<sup>2</sup>.
- Sa radovima na izgradnji trga otpočelo se sredinom 2019. godine i isti su u završnoj fazi, obustavljeni usled nepovoljnih vremenskih uslova. Nastavak radova se očekuje čim se za to steknu povoljni vremenski uslovi.



## 5.16. Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar

Status projekta: U toku



- Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze.
- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane JP Morsko dobro Crne Gore, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova II faze koja obuhvata zahvat od oko 4.800m<sup>2</sup> šetališta sa pratećim sadržajima.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je poništeno i u toku je ponovno raspisivanje.
- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, finansiranje II faze radova planirano je kroz Kapitalni budžet uz učešće Opštine Bar i JP Morsko dobro Crne Gore.

## **6. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVLJA**

## **6.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici**

Status projekta: U toku

- Na osnovu projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika ugovorena je izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcija energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.
- U toku je usaglašavanje projektnog rješenja sa korisnikom i projektantom.

## **6.2. Rekonstrukcija i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici**

Status projekta: U toku

- U 2019. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacija objekata Doma zdravlja "Nova varoš" i Doma zdravlja "Stara varoš" u Podgorici i Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- Planirano je privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Stara Varoš" organizovanjem: prostorije za fizikalnu terapiju, edukaciju, izabranog doktora, kao i ostali administrativni i prateći sadržaji. Takođe, planirano je i privođenje namjeni sprata objekta Doma zdravlja "Nova Varoš" uređenjem prostorije za laboratoriju, savjetovalište, ginekologiju, izabranog doktora, administraciju.

## **6.3. Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici**

Status projekta: Nisu sprovedene aktivnosti

- Obaveza Ministarstva zdravlja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.

## **6.4. Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici**

Status projekta: U toku

- U 2019. godine Uprava javnih radova je zaključila ugovor sa izvođačem radova na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra.
- Završeni su radovi na dijelu objekta za potrebe prostora laboratorije za CMGI, a radovi na adaptaciji prostora za potrebe Dnevne bolnice su u završenoj fazi.
- Takođe, krajem 2019. godine Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za radove na izradi prilaza CMGI laboratorije i nabavku namještaja i opreme za rekonstruisani prostor.





## **7. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA**

## 7.1. Izgradnja Doma starih u Podgorici

Status projekta: U toku



- Dom za stare osobe u Podgorici je spratnosti: podrum, prizemlje i 3 sprata i ukupne bruto površine 11.230 m<sup>2</sup>. Objekat je predviđen za boravak 270 korisnika, a pored smještajnih jedinica sadržaće dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, prostorije za upravu, medicinski blok, prateće tehničke prostorije. Objekat će sadržati odvojene cjeline za dementne korisnike i za korisnike koji su na dnevnom boravku.
- Sa radovima se otpočelo krajem 2017. godine, a radovi su se izvodili i u 2018. godini.
- U 2019. godini je nastavljeno sa radovima i isti su se odvijali ugovorenom dinamikom.
- Do sada su završeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske i krovne konstrukcije objekta, zidarski, krovopokrivački i bravarski radovi. U toku su fasaderski, keramičarski, molersko-farbarski, podopolagački i instalaterski radovi, kao i radovi na uređenju terena.

## 7.2. Izgradnja Doma starih u Nikšiću - II faza

Status projekta: U toku



- Opština Nikšić je koordinirala izradu i reviziju Glavnog projekta.
- Realizacija ovog projekta planirana je fazno, pri čemu se prva faza izgradnje objekata finansira kroz RHP program, a druga faza kroz Kapitalni budžet.
- Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti.
- Novoprojektovani smještajni objekti su spratnosti podrum, prizemlje, sprat i mansarda. Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m<sup>2</sup>.
- Krajem 2019. Godine zaključen je ugovor sa izvođačem radova II faze.
- Na objektima su završeni pripremni radovi, radovi na rušenjima i demontažama, kao i ojačanje ravne krovne ploče za potrebe izrade mansardnog potkrovlja. U toku su radovi na radioničkoj izradi i montaži drvene krovne konstrukcije, radionička izrada fasadne bravarije, radovi na grubom razvodu instalacija, izrada konstrukcija gipskartonskih zidova.

## 7.3. Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići" u opštini Cetinje

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Aktivnostima na realizaciji projekta koordinira JU "Lovćen Bečići".
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## **7.4. Dom starih u Plavu**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranja je da u saradnji sa opštinom dostavi Upravi javnih radova projektну dokumentaciju na osnovu koje bi se pristupilo raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## **7.5. Dom starih u Rožajama**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranje je da u saradnji sa opštinom dostavi Upravi javnih radova projektну dokumentaciju na osnovu koje bi se pristupilo raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## **8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA**

## 8.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića iz kredita CEB-a

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na raspisivanje javnih konkursa za izbor najboljih urbanističko-arhitektonskih idejnih rješenja, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz kredita CEB-a, a učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a.

### • Vrtić u Baru

Status projekta: Završen

- U 2019. godini, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne, Uprava javnih radova je završila radove na privremenom uređenju/sanaciji terena nekadašnjeg gradilišta vrtića u Baru.
- Radovi su se odnosili na: grubo raščišćavanje terena, uklanjanje šteta, otpada i nevezanog materijala, uklanjanje oštećenih betonskih staza zajedno sa ivičnjacima, zatrpavanje rupa i rovova, popravke oštećenog amfiteatra, uklanjanje gradilišnih ograda, ravnanje terena uz nasipanje šljunkovito-pjeskovito-humusoidnim materijalom, sadnju 87 stabala čempresa visine 3-3,50m, sanitarno-higijenske mjere na postojećim stablima, kao i sadnju 180 sadnica padajućeg ruzmarina.

### • Vrtić u Ulcinju

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovelo konkurs i odabralo najbolje idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju.
- Nakon što idejno rješenje i projektni zadatak budu dostavljeni, Upravi javnih radova će pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača Glavnog projekta na osnovu prvonagrađenog idjenog rješenja.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### • Vrtić u Pljevljima

Status projekta: U toku



- Izgradnja objekta vrtića u Pljevljima predviđena je u naselju Guke. Objekat će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 500m<sup>2</sup>, projektovane za smještaj 67 djece. U objektu su planirani sljedeći

sadržaji: radna soba za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarija, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije.

- U objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 400 djece (tri obroka dnevno), koja će zadovoljiti potrebe na nivou JU „Eko bajka” u Pljevljima.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Uprava javnih radova je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja ugovorila izradu Glavnog projekta.
- U 2019. godini, nakon što je završena izrada i revizija Glavnog projekta, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa CEB procedurama. Kako na javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda to je nakon provjere procijenjene projektantske vrijednosti ista uvećana.
- Ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova i isto je u toku.

### • **Vrtić u Bloku VI u Podgorici**

Status projekta: U toku



- Izgradnja vrtića predviđena je u naselju Blok VI u Podgorici. Objekat će biti ukupne bruto površine 1.515 m<sup>2</sup> i planiran je za boravak 215 djece.
- U objektu su planirani sljedeći sadržaji: radne sobe za jaslne grupe, radne sobe za grupe vrtića, kancelarije, čajna kuhinja, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je raspisalo konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Guke, a Uprava javnih radova je na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja ugovorila izradu Glavnog projekta.
- U 2019. godini, nakon što je završena izrada i revizija Glavnog projekta, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa CEB procedurama i isto je u toku.

### • **Vrtić u Tuzima**

Status projekta: Završen

- Izgradnja vrtića u Tuzima započela je u maju 2018. godine.



- Radovi na objektu odvijali su se u skladu sa planiranom dinamikom i isti su završeni početkom jula 2019. godine, nakon čega se pristupilo proceduri pribavljanja upotrebne dozvole i vrtić je otpočeo sa radom u septembru 2019. godine.
- Objekat sadrži 11 radnih soba planiranih za 200 djece, multifunkcionalni prostor, kuhinju, prostorije za zaposlene kao i ostale prateće sadržaje. Šest soba je namijenjeno potrebama vrtića, a 5 radnih soba za dio jaslica, bruto površine 1.400 m<sup>2</sup>



- **Sprovođenje javnih konkursa, izrada I revizija tehničke dokumentacije I izgradnja I rekonstrukcija predškolskih ustanova**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje javnih konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za vrtić u Plavu, jaslice i vrtić u Beranama, jaslice i vrtić u Bijelom Polju, u Podgorici jaslice i vrtić u bloku 35-36, naselju Stari aerodrom i City kvartu, Zlatici i ostalim opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete. U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## 8.2. Izgradnja objekta vrtića u Rožajama

Status projekta: U toku



- Izrada i revizija Glavnog projekta vrtića završena je u 2018. godini.
- Objekat je projektovan kao savremeno i funkcionalno zdanje, kapaciteta oko 100 djece, ukupne bruto površine 1.120 metara kvadratnih. Imaće devet prostorija namijenjenih za dnevni boravak djece, od kojih četiri za jaslice, prostorije za vaspitače, kuhinju, administrativni blok, multifunkcionalni prostor sa garderoberima, višenamjensku salu i ostale prateće sadržaje.
- Radovi na izgradnji vrtića otpočeli su u maju 2019. godine.
- Do sad su završeni radovi na rušenju postojećeg objekta, a na izgradnji novog završeni su: grubi građevinski radovi, zidarski radovi, ugrađena je fasadna stolarija, kao i pokrivački radovi.

### 8.3. Vrtić u City kvartu u Podgorici

Status projekta: Nije bilo aktivnosti



- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

#### **8.4. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici**

Status projekta: U toku

- U toku je revizija Glavnog rprojekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici u kojem se nalaze elektrotehnički, mašinski, metalurško-tehnološki i prirodno-matematički fakultet, bruto površina objekta je cca 20.000 m<sup>2</sup>.
- U skladu sa novom zakonskom regulativom o planiranju prostora i izgradnji objekata, idejno rješenje je poslato Univerzitetu Crne Gore u cilju pribavljanja saglasnosti od strane Glavnog državnog arhitekta. Nakon što predmetna saglasnost bude pribavljena, nastaviće se za izradom i revizijom projektne dokumentacije.

#### **8.5. Izgradnja objekta Srednje stručne škole u gradskoj opštini Golubovci u Podgorici**

Status projekta: Završen



- Objekat Srednje stručne škole u Golubovcima, ukupne bruto površine 5.480 m<sup>2</sup>, sastoji se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu se nalaze nastavne prostorije, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina od 500 gledalaca.
- Radovi na izgradnji objekta škole su otpočeli u januaru 2017. godine i isti su završeni u avgustu 2019. godine.

## 8.6. Izgradnja i opremanje objekta O.Š. u Gukama, Pljevlja

Status projekta: Završen



- Izgradnja osnovne škole u Gukama u opštini Pljevlja realizovana je fazno.
- U 2011. godini je završena I faza radova koja je obuhvatila izgradnju Lamele „A” u okviru koje su učionice.
- U 2017. godini završeni su radovi na izgradnji II faze koja je obuhvatila izgradnju Lamele „B” – administrativni dio i Lamele „C” – fiskulturna sala. Takođe, raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na opremanju lamela „B” i „C”.
- U 2018. godini završeni su svi radovi na opremanju objekta i spoljnih terena, a nakon pribavljanja upotrebne dozvole, objekat je predat na korišćenje.

## 8.7. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima u Podgorici

Status projekta: U toku

- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## 8.8. Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar" u Podgorici

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon dostavljanja urbanističko-tehničkih uslova i projektnog zadatka od strane korisnika, Uprava javnih radova je za rekonstrukciju toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica, zaključila ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta.
- U 2019. godini dobijen je pozitivan izvještaj na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i započeta je revizija projekta koja je u završnoj fazi.

## 8.9. Rekonstrukcija objekta O.Š. u Baću i Kalačima, opština Rožaje

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština Rožaje.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## 8.10. Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje I rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom

Status projekta: Nije bilo aktivnosti



- Projektom sanacije klizišta na Savini, za potrebe izgradnje i rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom, planirana je realizacija više podprojekata u skladu sa prioritetima Ministarstva prosvjete.
- U 2016. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta sanacije klizišta za potrebe sanacije vrtića JPU "Naša radost" na Savini. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije u 2018. godini završeni su radovi na sanaciji ovog klizišta, a koji su obuhvatili izradu potporne konstrukcije sa dva reda bušenih šipova prečnika 100cm, sa naglavnom gredom debljine 100cm i potpornim zidom ukliještenim u naglavnu gredu visine 2.5m.
- U 2016. godini završeni su hitni sanacioni radovi na objektu JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2018. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta za sanaciju klizišta sa neophodnim geomehničkim istraživanjima za objekat JU OŠ "Milan Vuković".
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

## 8.11. Izgradnja Osnovne i muzičke škole “Dušan Korać” u Bijelom Polju

Status projekta: U toku



- Osnovna škola će imati suteran, prizemlje i sprat na površini od oko 8.000 m<sup>2</sup>, a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Sadržaće 20 učionica opšte namjene, šest kabineta za specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije.
- Za muzičku školu predviđene su četiri učionice za grupnu i devet učionica za individualnu nastavu, četiri vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
- Nastava u postojećem objektu Osnovne škole neće biti prekidana za vrijeme radova. Novo zdanje će se nalaziti na trenutno slobodnom dijelu parcele, dok su umjesto postojećih školskih objekata planirani sportski tereni i slobodne površine.
- Radovi na izgradnji objektu su započeti krajem marta 2019. godine.
- Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom i u toku su radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije nadzemnih etaža, zidarski i izolaterski radovi.

## 8.12. Izgradnja Osnovne škole u Rožajama

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Opština Rožaje sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2018. godini završena je izrada Glavnog projekta. Obaveza Opštine Rožaje je rješavanje imovisko-pravnih odnosa.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.



### **8.13. Fiskulturna sala OŠ “Pavle Žižić” u Njegnjevu, Bijelo Polje**

Status projekta: U toku

- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- Za potrebe kompletiranja konkursne dokumentacije, Uprava javnih radova je završila izradu elaborata geodetskog snimanja postojećeg objekta i isti dostavila korisniku.

### **8.14. OŠ “Lovčenski partizanski odred” na Cetinju**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### **8.15. Naučno-tehnološki park u Podgorici**

Status projekta: U toku

- Ministarstvo nauke je sprovelo aktivnosti na izradi i reviziji Glavnog projekta naučno-tehnološkog parka. Postojeći objekat, čija izgradnja je počela na UP broj 12, DUP "Univerzitetski centar" - Izmjene i dopune, Opština Podgorica, kroz projektну dokumentaciju prilagođen je potrebama naučno - tehnološkog parka Crne Gore koji predstavlja važan dio cjelokupne državne strukture za razvoj inovativnih i tehnoloških kompanija koje imaju visok potencijal rasta i razvoja, te potencijal izvoza.
- Ukupna bruto površina objekta je cca 14.200 m<sup>2</sup>, a spratnost je suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta se nalazi garažni prostor sa 120 parking mjesta, od čega je 5% parking mjesta za osobe sa posebnim potrebama. Dio parking mjesta je predviđen za potrebe punjača za elektronska

vozila. Osim postojeće namjene za garažiranje, suterenska etaža sadrži sve prateće tehničke prostorije za ovaj tip objekta, trafostanicu i agregat, pomoćne magacine i četiri radionice različitog tipa sa toaletima.

- Objekat na nivou prizemlja sadrži reprezentativni pristupni plato kao i atrijum sa različitim sadržajima. U prizemlju su smješteni kancelarijski prostori modularnog tipa, co-working inkubatori - radionice sa većim brojem radnih mjesta, kafe bar, manja kuhinja, toaleti, tehničke prostorije i magacin.
- Na prvom spratu su planirani takođe modularni kancelarijski prostori, sala za sastanke, co-working inkubatori - radionice sa većim brojem radnih mjesta, četiri laboratorije, foaje, toaleti i čajna kuhinja.
- Na drugom spratu se nalaze modularni kancelarijski prostori, sala za sastanke, co-working inkubatori - radionice sa većim brojem radnih mjesta, administrativni dio naučno tehnološkog parka, dvije velike konferencijske sale kapaciteta 200 mjesta i 85 mjesta, prijemni dio za sale za sastanke sa gardeobom, tugostiteljski sadržaji za keternig, toaleti.
- Nakon što je krajem 2019. godine revidovan Glavni projekat dostavljen, Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova i isto je u toku.




## 8.16. Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju



Status projekta: U toku

- Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju planirana je na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
- Realizacija ovog projekta odvija se fazno.
- Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok, ukupne bruto površine 4.980 m<sup>2</sup>. Objekat zajedničkih kulturnih sadržaja je bruto površine 1.010 m<sup>2</sup> i obuhvata sljedeće sadržaje: izložbene i multimedijalne prostore, knjižaru i administrativni blok sa pratećim sadržajima. Podzemna garaža je bruto površine 3.970 m<sup>2</sup>, kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže je i energetske blok sa tehničkim prostorijama. Izgradnja I faze završena je krajem 2014. godine, a nakon izgradnje infrastrukturnih priključaka stvorili su se uslovi za pokretanje procedure pribavljanja upotrebne dozvole.



- Uprava javnih radova je u aprilu 2015. godine potpisala Ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa. Navedeni radovi su završeni u 2017. godini i u narednom periodu planirane su aktivnosti na tehničkom prijemu objekta.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, kao sljedeća faza realizacije projekta planirana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Nakon završene procedure javnog nadmetanja Uprava javnih radova je početkom oktobra 2015. godine potpisala Ugovor o građenju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Projektovana bruto površina objekta iznosi cca 5.100 m<sup>2</sup>. Objekat je razuđene osnove različite spratnosti i sastoji se od prizemlja, jednog i dva sprata. Jedan dio objekta se zadržava kao revitalizovano nasljeđe industrijske arhitekture nekadašnjeg „Oboda”, dok ostalo predstavlja novoizgrađenu strukturu. Objekat je predviđen za održavanje nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, dizajna i fotografije. Krajem 2017. godine završeni su radovi na izgradnji Fakulteta likovnih umjetnosti.
- U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, Uprava javnih radova je u februaru 2019. godine zaključila Ugovor za izvođenje radova na uređenju dijela terena Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti i opremanju Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju. Ugovoreni radovi obuhvataju kancelarijsku i školsku opremu, kao i opremu neohodnu za održavanje stručne nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, fotografije i dizajna uključujući i dio radova na uređenju terena, pristupne saobraćajnice, trotoare i prateće radove za nesmetan pristup objektu. Radovi na uređenju terena završeni su u oktobru 2019. godine i u toku su završni radovi na montaži isporučene opreme za potrebe Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.
- Takođe, u cilju pribavljanja upotrebne dozvole tokom novembra 2019. godine pokrenuta je i procedura tehničkog prijema za objekat Fakulteta likovnih umjetnosti i kotlarnice u sklopu kompleksa.

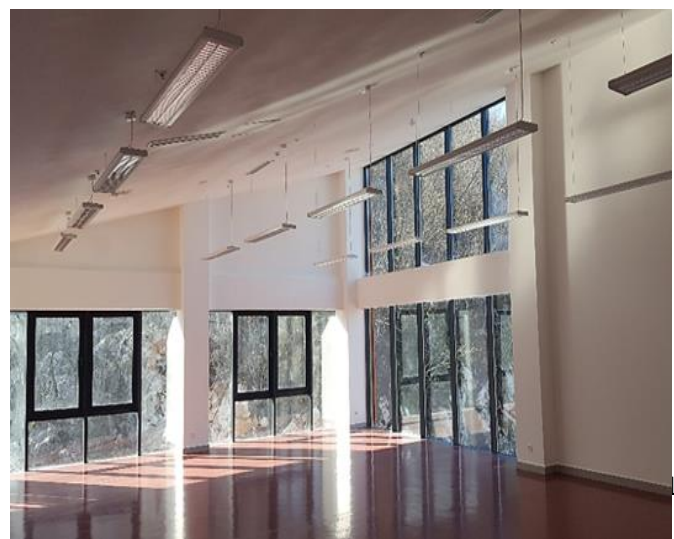

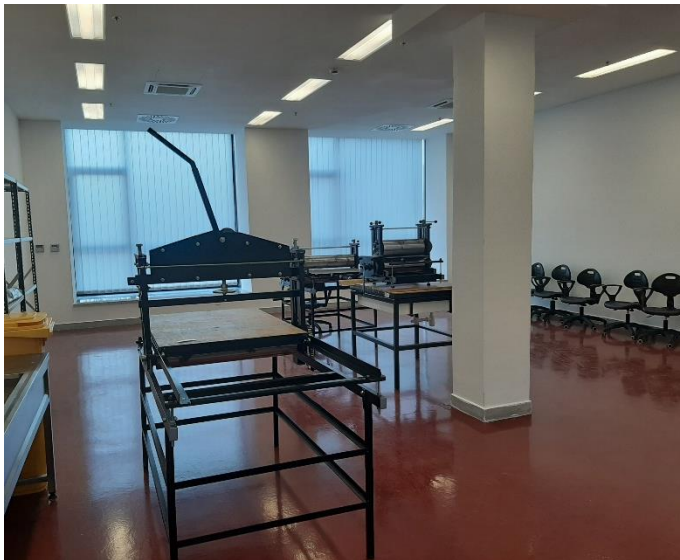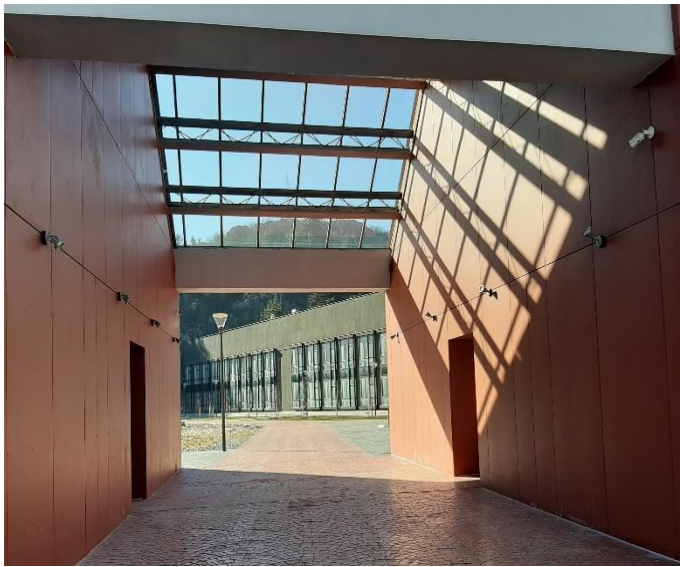

### 8.17. Osnovna škola “Karabuško polje” u Tuzima

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Obaveza Ministarstva prosvjete i Ministarstva održivog razvoja i turizma je da sprovedu proceduru konkursa za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg će Uprava javnih radova ugovoriti izradu i reviziju Glavnog projekta.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### 8.18. Sprovođenje javnih konkursa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- Radi se o višegodišnjem projektu, a sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku oprema za objekte: nova Gimnazija u Podgorici, OŠ na Zabjelu u Podgorici, OŠ u City kvartu u Podgorici, OŠ Karabuško polje, Vrtić na Zabjelu, Vrtić u naselju Tabačina u Kotoru, Vrtić u naselju Momišići u Podgorici, adaptaciju i opremanje osnovnih srednjih stručnih škola i ostalih objekata po prioritetu Ministarstva prosvjete.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova

## **9. UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE**

## 9.1. Ski centar na lokalitetu "Kolašina 1600"

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
  - Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice sa pratećim sadržajima, primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
  - Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza (izgradnja sistema vodosnadbjevanje, akumulacionog jezera i sistema za osnježavanje).
- 
- **Rekonstrukcija puta "Kolašin 1450"- "Kolašin 1600"**

Status projekta: U toku



- Radovi na izgradnji putne infrastrukture od ski rezorta "Kolašin 1450" Jezerine do Ski rezorta "Kolašin 1600" su u završnoj fazi. Njihov završetak je uslovljen izgradnjom potpornih zidova I i II faze. Izgradnja potpornih zidova I faze je završena, a izgradnja potpornih zidova II faze će biti završena kada to dozvole vremenski uslovi.
- Nakon izrade potpornih zidova, preostalo je da se na trasi puta, u dužini od 200m, uradi asfalt i odbojna ograda.

- **Parking za dnevne skijaše**

Status projekta: U toku

- Svi ugovoreni radovi na izgradnji parkinga za dnevne skijaše završeni su 2018. godini.

- **Vodosnabdijevanje uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Kolašin 1600“**

Status projekta: Završen

- Završeni su radovi na kaptaži broj 1 i na izgradnji rezervoara krajem 2018. godine, čime su stvoreni uslovi da se omogući snadbijevanje vodom uslužno-servisnih objekata prije početka zimske sezone.
- Urađen je cjevovod od kaptaže br. 2 do rezervoara krajem 2019. godine.

- **Trafostanica 35/10 kV „Jezerine“**

Status projekta: Završen

- Projekat je realizovan po sistemu „projektuj i izgradi“.
- Svi radovi na projektu su završeni.

- **Žičara “K8”**

Status projekta: Završen





- Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin 1600mm-Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnežavanja staza.
- Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni i objekat je u februaru 2019. godine pušten u funkciju.

- **Ski staze uz žičaru "K8"**

Status projekta: U toku

- U toku je izrada Glavnog projekta za izgradnju ski staza uz planiranu žičaru "K8" na skijalištu "Kolašin 1600" u Kolašinu, koje se realizuju po principu "projektuj i izgradi".
- Ugovorena je izgradnja novih cca 2 km ski staza sa pratećom opremom i signalizacijom, zacijevljenje potoka u dužini od cca 70 m i proširenje platoa polazne stanice, koji predstavljaju I fazu, do će izvođač kroz II fazu izvoditi radove na izgradnji novih cca 4 km ski staza uz žičaru „K8” sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Nove ski staze su projektovate na način da sa postojećim stazama uz žičaru „K8” budu funkcionalno povezane i čineći jednu cjelinu.

- **Žičara "K7" - povezivanje "Kolašin 1450"- "Kolašin 1600"**

Status projekta: U toku

- Prostornim planom posebne namjene "Bjelasica i Komovi" predviđena je izgradnja isklopive šestosjedne žičare K7 čijom izgradnjom će se povezati skijališta "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600".
- Uprava javnih radova u 2019. godini raspisala i ugovorila izgradnju predmetne žičare po principu "projektuj i izgradi". U toku je izrada tehničke dokumentacije.
- Početak radova planiran je u 2020. godini nakon što se završi postupak eksproprijacije i revizije tehničke dokumentacije.

- **Ski staze uz žičaru "K7"**

Status projekta: U toku

- U toku je izrada Glavnog projekta za izgradnju ski staza uz planiranu žičaru "K7", koje se realizuju po principu "projektuj i izgradi"
- Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.

- **Nabavka mehanizacije**

Status projekta: U toku

- U 2018. godini zaključen je ugovor za nabavku mehanizacije. Isporučena su dva ratraka i dvoje motornih sanki.



- **Bazna stanica**

Status projekta: Završen

- Završena je izgradnja objekta bazne stanice površine 1.600m<sup>2</sup> od čega je 310m<sup>2</sup> terasa, a koji je realizovan po principu "projektuj i izgradi".





## 9.2. Ski centar na lokalitetu “Cmiljača” u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
  - Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
  - Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Ravna Rijeka-Jasikovac 5,5 km**
    - Završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu trase gdje postoje imovinsko pravni problemi u dužini od 350m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija.
    - Preostali su radovi na sanaciji klizišta koja su se pojavila u toku izvođenja radova, nakon čega će se otpočeti sa završnim radovima na asfaltiranju i saobraćajnoj signalizaciji i opremi na kompletnoj dionici.
  - **Jasikovac - Cmiljača 10 km**
    - U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10km.
    - U završnoj fazi je izvođenje zemljanih radova, potpornih konstrukcija, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvođenja radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.



- **Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta privremenog objekta za potrebe razvoja ski centra "Cmiljača"**



- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i pripadajućim zelenim platoima, izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja na katastarskoj parceli obuhvaćenoj urbanističko-tehničkim uslovima, uključujući trafostanicu i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda, izradu vodovodnog priključka objekta do vodovodnog čvora za koji je izrađena projektna dokumentacija na nivou Glavnog projekta, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena na katastarskoj parceli obuhvaćenoj urbanističko-tehničkim uslovima.
- Ugovorena je izrada Glavnog projekta (I i II faze) i izgradnja (I faze) bazne stanice (princip: "projektuj i izgradi"), kao i revizija istog.
- U toku je izrada Glavnog projekta. Projektovana površina objekta je cca 2.000 m<sup>2</sup>.
- **Primarna elektroenergetska infrastruktura TS 35/10**




- Završena je izrada projektne dokumentacije.
- Potpisan je ugovor za izgradnju trafostanice TS 35/10kW sa dalekovodom. Izvođač je uveden u posao, a radovi se otežano izvode usled nepostojanja pristupnih puteva.

- Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 35kV za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“, a u toku je pribavljanje građevinske dozvole za složeni inženjerski posao.
- Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“ – opremanje ćelije 35kv “Ribarevina”, a sa radovima će se otpočeti nakon pribavljanja saglasnosti CEDIS-a.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača“**



- Završena je izrada hidrotehničke studije izvodljivosti i Glavni projekat vodosnabdijevanja bazne stanice.
- Krajem 2019. godine zaključen je ugovor za izvođenje radova.
- U toku je postupak eksproprijacije, nakon čega će se stvoriti uslovi za prijavu građenja, kada to omoguće vremenski uslovi.
- **Nabavka žičare šestosjeda “Z7”**

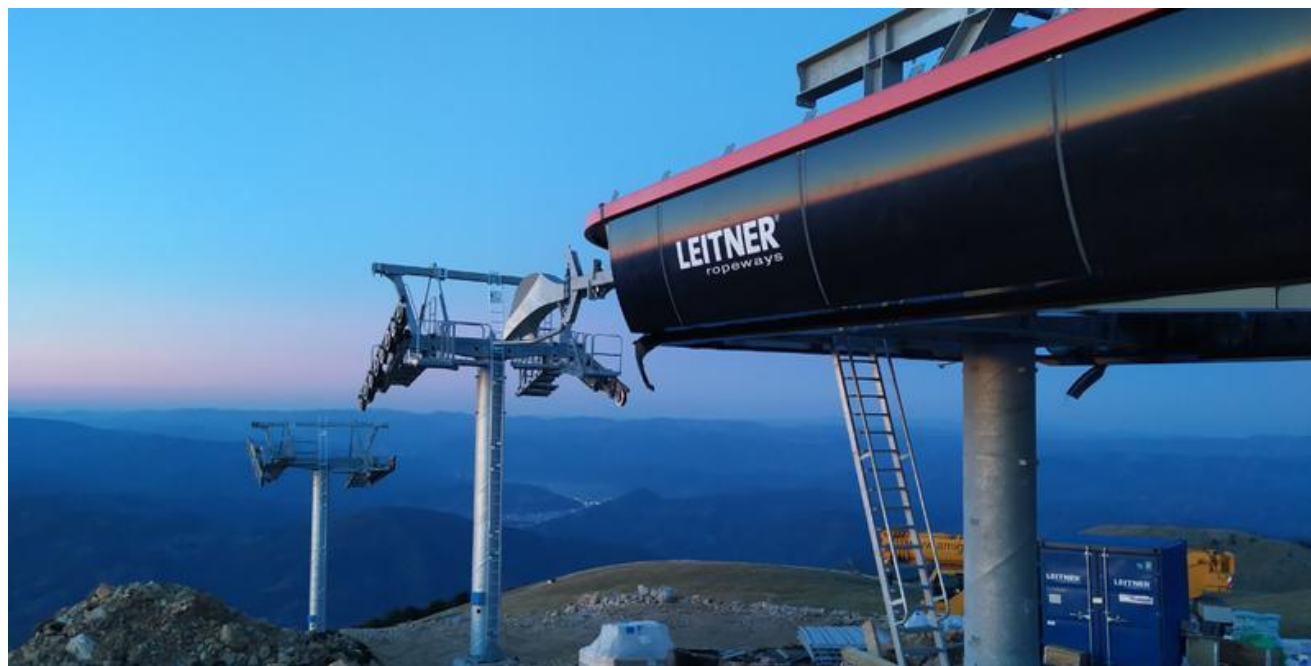


- Zaključen je ugovor za realizaciju projekta po principu “projektuj-izgradi”, a ugovorena je izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i radovi na izgradnja isklopive šestosjedne žičare “Z7”, Idejnog rješenja, Glavnog projekta i radovi na izgradnji 3 km ski staza žičare “Z7” predviđenih Detaljnom razradom na lokalitetu i usluge izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta sistema vještačkog osnježavanja na lokaciji „Cmiljača” u Opštini Bijelo Polje. Završena je izrada projektne dokumentacije.
- U toku je izvođenje radova na izgradnji žičare.

### 9.3. Ski centar na lokalitetu “Žarski” Mojkovac

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Izvođenje radova na izgradnji puta Vrago do-Vrioci-Žarski katun II faza- potporni zidovi**

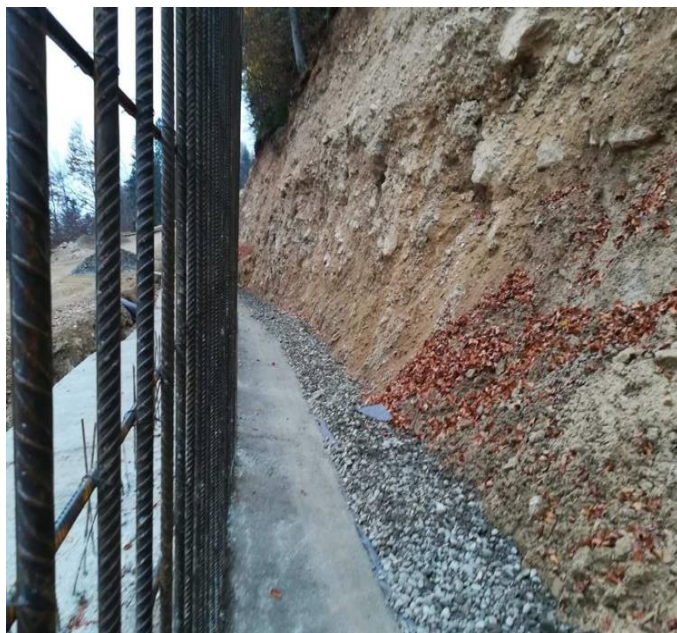

- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Vrago do – Vrioca-Žarski katun u dužini od 5,3km.
- Završeni su zemljani radovi, potporne konstrukcije, a preostali su radovi na sanaciji klizišta i nestabilnih kosina koje su se pojavile u toku izvođenja radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- **Regionalni put Mojkovac-Vragodo-Lubnica dužine 8,5 km**
- Izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije putnog pravca Regionalni put Mojkovac-Vrago do (budućeg regionalnog puta) je pruzela Uprava za saobraćaj.
- **Most na rijeci Tari- povezivanje regionalnog sa magistralnim putem cca L=220 m**
- Izradu projektne dokumentacije preuzela je Uprava za saobraćaj.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski “**
- Donešena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja “Žarski”.
- **Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe Ski centra “Žarski”**



- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnju izvoda instalacija infrastrukturnih priključaka na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima, uključujući trafostanicu i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima.
- U aprilu 2019. godine potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta (I i II faza) i izgradnju (I faza) bazne stanice po principu: „projektuj i izgradi“). Projektovana površina objekta je cca 2.000 m<sup>2</sup>.
- Završena je izrada Glavnog projekta I i II faze, i u toku je revizija istog.

- **Izgradnja šestosjedne isklopive žičare “Z4”**



- U 2019. godini potpisan je raspisan je ugovor za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju žičare po principu „projektuj i izgradi“.
- Završena je izrada Glavnog projekta i u toku je njegova revizija.

- **Elektroenergetska infrastruktura**

- Primarna elektroenergetska infrastruktura je u sklopu izgradnje Ski centra Cmiljača. U toku je uvođenje izvođača radova u posao na izgradnji trafostanice 35/10 kv.

- **Adaptacija objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu**

- Poslovni prostor se sastoji od ulaznog hodnika, stepeništa, toaleta, portirnice i čajne kuhinje u prizemlju. Na spratu se nalazi veliki centralni hodnik sa osam prostorija raspoređenih oko njega. Površina objekta iznosi 188.90m<sup>2</sup>.
- U toku su aktivnosti na: suvomontažne radovi - oblaganje zidova i plafona GK pločama postavljenim preko Al-konstrukcije dok je konstrukcija između potkonstrukcije ispunjavana staklenom vunom. Pored navedenih radova, rađeno je i na ugradnji klima uređaja na plafonskoj potkonstrukciji.

## 9.4. Ski centar na lokalitetu “Hajla” u Rožajama

Status projekta: U toku

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- **Putna infrastruktura**



- Realizacija projekta rekonstrukcije putnog pravca Rožaje- Štedim realizuje se fazno.
- Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 7,2km, a preostalo je izvođenje asfaltnih radova na kompletnoj dionici, sa čime će projekat biti završen.

- **Žičara**
  - Zaključen je ugovor za realizaciju projekta žičare šestosjeda po principu "projektuj i izgradi"
  - U 2019. godini potpisan je ugovor za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju isklonive šestosjedne žičare kao i izradu idejnog rješenja ski staza po principu „projektuj i izgradi“.
  - U 2019. godine završena je izrada Idejnog rješenja i dijela Glavnog projekta.
- **Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla"**
  - U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000m<sup>2</sup>, koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predvidjeti i parkiralište za automobile i autobuse.
  - Krajem decembra 2019. godine donesena je odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Hajla" u Rožajama.

## 9.5. Ski centar na lokalitetu "Durmitor" Žabljak

Status projekta: U toku

- Realizacija projekta Ski centra na lokalitetu "Savin kuk" na Žabljaku planirana je fazno.
- **Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ski staze dužine cca 1,5 km**
  - Projekat se realizuje po principu "projektuj i izgradi".
  - U oktobru 2017. godine završena je izrada Glavnog projekta.
  - Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalni parkovi sprovode aktivnosti na izmjenama granica zona zaštite, što je neophodno da bi se stvorili uslovi za izdavanje građevinske dozvole.
  - Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju cca 21 km staza**
  - Početkom 2019. godine završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
  - Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- **Izgradnja prilaznih puteva dužine 1,5 km- put kuća Stijepovića-Savin kuk**
  - Svi radovi na izgradnji puta završeni su u 2018. godini. Dužina izgrađenog puta iznosi cca 1.000 metara, širine kolovoza je 2 x 2,75 m, sa tri potporna zida ukupne dužine 77 metara.
  - Preostalo je ugovaranje radova na sanaciji nestabilnih kosina, za koje je u toku vrednovanje pristiglih ponuda za izbor izvođača radova.



- **Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice Usjek-Motički gaj, dužine cca 5km**
- U 2018. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je predata Opštini u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radovi na rekonstrukciji puta su ugovoreni i sa istima će se otpočeti kada se za to stvore uslovi.
- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju “Suvog boba”**
- U toku je revizija projektne dokumentacije.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- **Vodosnadbijevanje ski centra**
- Završeni su radovi na izgradnji I faze sistema vodosnadbijevanja ski centra koja je obuhvatila rekonstrukciju gradske vodovodne mreže, izgradnju akumulacionog jezera na lokalitetu Savin kuk i dovođenje vode sa Modrog jezera do akumulacionog jezera.
- Za ovaj projekat potpisan je donatorski ugovor između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije (CMSR) kojim su definisana donatorska sredstva u iznosu do 900.000€, dok je ukupna ugovorena vrijednost radova iznosila 3.200.000€.
- Proceduru ugovaranja radova sproveo je CMSR.
- **Nabavka žičare sa izgradnjom ski staza**
- Potpisan je ugovor za nabavku žičare sa izgradnjom 4 km ski staza po sistemu “projektuj i izgradi”.
- Glavni projekat je završen i isti je predat na reviziju. Izvođač radova sprovodi aktivnosti na nabavci opreme.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.
- **Elektroenergetska infrastruktura**
- U 2019. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće elektonergetske infrastrukture za ski centar. U toku je usaglašavanje Projektnog zadatka sa CEDIS-om i Opštinom Žabljak.
- Nakon završetka projektne dokumentacije planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.

- **Osnježavanje ski staza**

- U 2019. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sistema za osnježavanje ski staza. Skijališta Crne Gore su dostavila Projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove. Započete su aktivnosti za raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije.
- Za dalje aktivnosti na realizaciji projekta čekaju se instrukcije nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u svijetlu Izvještaja misije Savjetodavne unije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine Nacionalnog parka Durmitor.


- **Izgradnja parking za dnevne skijaše**



- U 2018. godini završeno je izvođenje radova za modernizaciju postojećeg parkinga za dnevne skijaše površine cca 3.500 m<sup>2</sup>, sa 83 parking mjesta za putnička vozila, 4 za invalidna lica i 1 za autobuse.

## 9.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

Status projekta: U toku

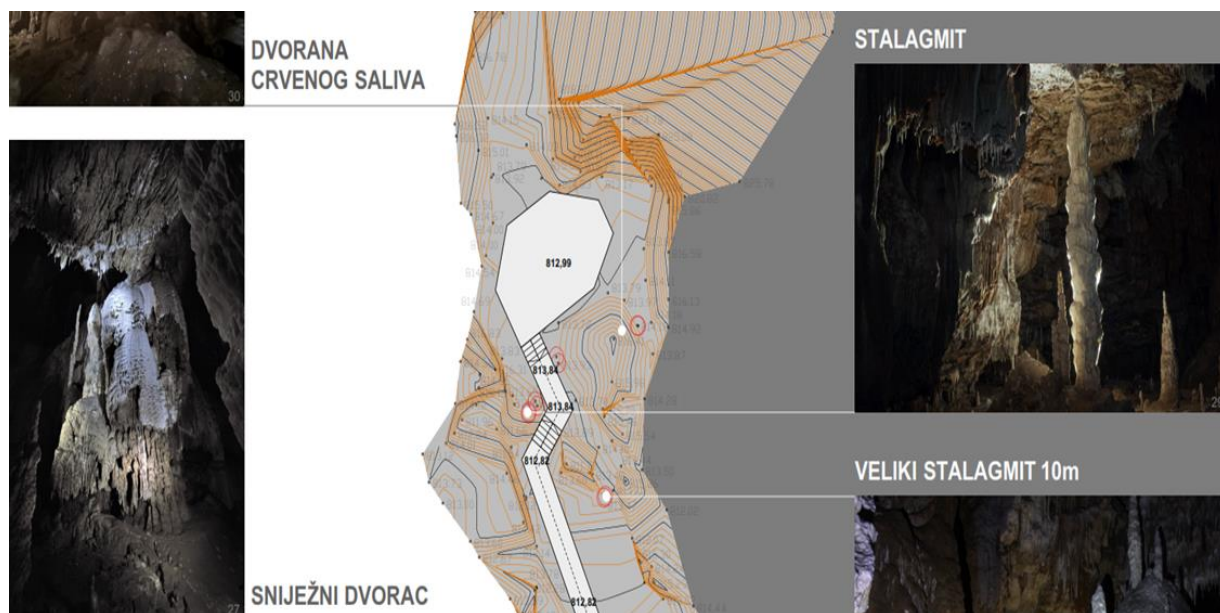

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra.
- **Pristupni put Bistrica- Manastir Podvrh**



- U toku je fazno izvođenje radova na izgradnji puta Bistrica – Manastir Podvrh u dužini od cca 5,7km.
- U završnoj fazi je izvođenje zemljanih radova, potpornih konstrukcija, a preostalo je polaganje elektroenergetskih kablova, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije, kao i radovi na sanaciji nestabilne kosine koje su se pojavile u toku izvođenja radova. Nakon završetka ovih radova, preostalo je i izvođenje radova na gornjem stroju puta na kompletnoj dionici.
- U toku je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica - Mojsir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice.

- **Izgradnja turističke staze od manastira “Podvrh” do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”**
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Projektant je dostavio korigovano Idejno rješenje u skladu sa sugestijama revidenta, i isto je poslato na saglasnost Glavnom državnog arhitekti.
- **Elektroenergetska infrastruktura**
- Za potrebe elektro napajanja kompleksa “Đalovića pećine” ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice “Nedakusi”, izgradnja trafostanice 35/10kV “Bistrica”, dalekovod 35kV “Nedakusi – Bistrica”, kabal od TS Bistrica do buduće TS Manastir Podvrh, kao i TS Manastir Podvrh.
- Za projekte elektroenergetske infrastrukture završena je izrada proejktne dokumentacije i u toku su pripremne aktivnosti kako bi izvođači sa povoljnim vremenskim uslovima bili uvedeni u posao.
- **Žičara**
- Potpisan je ugovor za izgradnju žičare (gondola) dužine cca 1.700m kapaciteta 75 osoba na sat po principu "projektuj i izgradi".
- Završena je izrada projektne dokumentacije i u toku je izvođenje radova.





- **Idejno rješenje i Glavni projekat turističke valorizacije – uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu**



- Završena je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta, i u toku je završna faza revizije projekat turističke valorizacije – uređenja dijela “Đalovića pećine“ sa pratećim objektima na ulazu u pećinu.
- Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji pratećih objekata na ulazu u pećinu za I i II faze čime će svi radovi na valorizaciji pećine i izgradnji pratećih objekata biti izgrađeni.
- **Vodosnadbijevanje**
- U 2018. godini započeta je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda iz uslužno – servisnih objekata u okviru aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje. Idejno rješenje je izrađeno i usvojeno, a u skladu sa istim nije moguće nastaviti sa izradom Glavnog projekta dok se ne izvede i ne ispita istražni bunar u zoni manastira Podvrh što je planirano u 2019. godini, za šta je upućen zahtjev nadležnoj instituciji.

- **Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za put Gubavač- Bistrica 8,7 km**
- U 2019. godini završena je izrada i revizija Glvanog projekta, na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- **Izgradnja objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom**



- U oktobru 2019. godine pribavljena je saglasnost glavnog gradskog arhitekta na Idejno rješenje objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima.
- Krajem 2019. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i izradnju objekta vizitoring centra, površine 500 m<sup>2</sup> po principu "projektuj i izgradi".
- **Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
- U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije regulacije dijela korita rijeke Bistrice na osnovu koje je krajem godine raspisano javno nadmetanje za odabir Izvođača radova i stručnog nadzora.

## 9.7. Turistička infrastruktura- izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

Status projekta: U toku

- **Izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru**
- Ministarstvo kulture je izradilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava javnih radova raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova i isto je u toku.
  
- **Venecijansko bijenale**
- Uprava javnih radova vrši prenos sredstava za potrebe finansiranja projekata "Venecijansko bijenale", a na osnovu ovjerene dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
  
- **Centra za prihvata životinja sa CITES liste u Beranama**
- Nakon što je Uprava javnih radova raskinula ugovor sa obrađivačem Idejnog rješenja i Glavnog projekta Centra za prihvata životinja sa CITES liste u Beranama, aktivnosti na daljoj realizaciji projekata preuzela je Opština Berane.
  
- **Postavljanje spomen obilježja "Lesendro"**
- Ministarstvo kulture je izradilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava javnih radova raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova i isto je u toku.
  
- **Spomen park Knjaževac**
- Opština Andrijevica je izradila projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava javnih radova raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova i isto je u toku.
  
- **Panoramske rute**
- **Postavljanje turističke signalizacije na panoramskim rutama u Crnoj Gori**
- Ugovoreni su radovi za postavljanje turističke signalizacije na Panoramskim rutama "Kruna Crne Gore" i "More i visine", kao i rutama koje ih povezuju i isti su završeni.
  
- **Izrada projektne dokumentacije za uređenje lokacija-objekata na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“ u opštini Žabljak**
- Realizaciju projekta koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je naručilo izradu projektne dokumentacije i istu dostavilo Upravi javnih radova u cilju raspisivanja javnog nadmetanja za izvođenje radova. Kako dostavljena dokumentacija nije bila revidovana, sproveden je postupak za izbor revidenta.
- U 2019. godini se odvijaju aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije i ista je u završnoj fazi nakon čega će se stvoriti uslovi za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.

## 9.8. Objekat "Kuća voća" u Andrijevici

Status projekta: U toku



- Objekat "Kuće voća" u Andrijevici nalazi se na parceli br.823/3 KO Andrijevica, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevici, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta "Kuće voća" u Andrijevici je 1.636,27 m<sup>2</sup> i sastojće se od proizvodnog pogona - 924,60 m<sup>2</sup>, edukativno-poslovnog bloka 557,85 m<sup>2</sup> i Izložbeno prodajnog prostora, caffe bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m<sup>2</sup>.
- U 2016. godini Ministarstvo održivog razvoja i turizma je završilo aktivnosti na sprovođenju Konkursa za izbor Idejnog arhitektonskog rješenja i potpisalo Ugovor za izradu Glavnog projekta.
- U 2017. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji objekta "Kuće voća" i potpisan je ugovor. U aprilu 2018. godine, nakon stvaranja povoljnih vremenskih uslova, radovi su otpočeli.
- Do sada su završeni zemljani radovi, radovi na izradi betonske konstrukcije i potpornih zidova objekta proizvodnog pogona i bunkera, administrativno-edukativnog bloka i izložbeno prodajnog prostora i pješačkog mosta, radovi na zidanju pregradnih zidova, radovi na montaži čelične krovne konstrukcije proizvodnog pogona, radovi na izradi izolacije, drenaže i zatrpavanju ukopanih zidova, kao i radovi na izradi razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije.
- Usljed izmjene projekta tehnologije proizvodnje po osnovu zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i usljed nedovoljnog angažovanja izvođača radova došlo je do prolongiranja roka izvođenja radova, pa je konačan rok za završetak istih kraj avgusta 2020. godine.



## 9.9. Objekat nacionalne “Kuće maslina” sa sjedištem u Baru

Status projekta: U toku



- Objekat nacionalne „Kuće maslina“ sadrži suteran, prizemlje i jedan sprat. Objekat je proizvodnog, edukativnog, turističkog i komercijalnog karaktera.
- U 2019. godini završene je izrada i revizija Glavnog projekta i na osnovu istog je raspisano javno nadmetanje i zaključen ugovor za izvođenje radova na izgradnji objekta.
- Sa radovima se otpočelo krajem oktobra 2019. godine.

## 9.10. Objekat “Kuće vina” u opštini Bar

Status projekta: U toku

- U pitanju je višegodišnji projekat, a sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2019. godinu odnosila su se na sprovođenje Javnog konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i početak radova.
- Obaveza Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je da dostavi neophodnu dokumentaciju za pokretanje daljih aktivnosti na realizaciji projekta.

## 9.11. Izrada projekta rekonstrukcija Kanli Kule u Herceg Novom

Status projekta: U toku

- U 2017. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja, u martu je potpisan ugovor sa obrađivačem Glavnog projekta rekonstrukcije-konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom.
- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja moraju biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog Glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
- U skladu sa ovim zaključkom pripremljena je tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije sanacije klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule.
- U 2019. godine potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta šireg područja Kanli Kule.
- U toku je izrada projekta Geotehničkih istraživanja.

## 9.12. Nacionalni parkovi

Status projekta: U toku

- **Parking na Kraljevom kolu**



- Na lokaciji Kraljev kolo u NP Biogradska gora predviđena je izgradnja i uređenje parking prostora za vozila posjetilaca Biogradskog jezera, kao i prostora za smještaj dva turistička voza koji će saobraćati na relaciji Kraljevo kolo - Biogradsko jezero.
- U 2019. godini je završena izrada idejnog rješenja i elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

- **Nabavka vozila (dva turistička voza) za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo-Biogradsko jezero**



- U 2018. godini sproveden je otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dva turistička vozila za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo- Biogradsko jezero.
- Ugovor o javnoj nabavci zaključen je u julu 2018.godine,. Projekat u iznosu do 130.800,00 € finansirala je Privredna komora Crne Gore, po osnovu ugovora sa Nacionalnim parkovima dodjeli sredstava u okviru Projekta "Razvoj niskonaponskog turizma u CG" gdje je UNDP implementacioni partner.
- U 2019. godini izvršena je isporuka turističkih vozova na lokaciju u okviru NP Biogradska gora.

- **Izgradnja nedostajuća infrastruktura od hotela Durmitor do Crnog jezera**

- Uprava javnih radova je raspisala javno nadmetanje i isto je obustavljeno na zahtjeva građana. Sve aktivnosti na ovom projektu su obustavljene.

- **Izgradnja parking prostora duž saobraćajnice od mosta kod hotela Durmitor do rampe na ulazu u Nacionalni park**

- U 2018. godini radovi su obustavljeni zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu, kao i potrebe da se izvrši dopuna projektne dokumentacije za nedostajuću infrastrukturu. Obaveza Opštine Žabljak je da kompletira projektnu dokumentaciju.
- S obzirom da su građani zahtjevali obustavu realizacije projekta izgradnje nedostajuće infrastrukture koja uslovalja i ovaj projekat, dalje aktivnosti na izgradnji parking prostora su obustavljene.

- **Revitalizacija Žugića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, opština Pljevlja**



- U 2017. godini na tri raspisana javna nadmetanja za izvođenje radova za rekonstrukciju objekata Centra za rafting u postojećim gabaritima nije bilo pristiglih ponuda.
  - Nakon četvrtog tendera potpisan je ugovor za izvođenje radova.
  - Radovi su završeni 2019. godine. Predstoji procedura tehničkog prijema objekta.
- 
- **Rekonstrukcija bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno istraživačkog centra**  
U 2019. godini nije bilo aktivnosti u nadležnosti Uprave javnih radova.

### **9.13. Uređenje Ali-pašinih izvora u Gusinju**

Status projekta: U pripremi

- U 2019. godini Uprava javnih radova je izradila idejno arhitektonsko rješenje sanacije prostora Ali-pašinih izvora u Gusinju.
- Obaveza Opštine je da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma razmotri potrebu raspisivanju konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

## **10. ZAKON O PRIJESTONICI**

Uprava javnih radova je sa Prijesticom Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti prijestonice Cetinje" u skladu sa kojim prijestonica Cetinje sprovodi sev aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.

### **10.1. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice**

Status projekta: U toku

- U sklopu ovog projekta realizovana je nabavka: tri vozila, didaktičke opreme za "Montesori kabinet" u JU "Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom", specijalnog vozila za vatrogasce, kombija za prevoz đaka, 5 podzemnih kontejnera za smeće i kompjuterske opreme.

### **10.2. Sanacija sportskih sala SRC Cetinje**

Status projekta: Nije bilo aktivnosti

- U 2019. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

### **10.3. Izgradnja I rekonstrukcija distributivne mreže snadbijevanja vodom Cetinja**

Status projekta: U toku

- Potpisan je Ugovor za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju i sanaciju cjevovoda PK Velja Gora - PK Lašor, izradu distributivnog cjevovoda na istoj dionici (1.600 m, ukupno 3,6 km) i otpočelo se sa realizacijom.

### **10.4. Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks**

Status projekata: U toku

- Završena je izrada projektne dokumentacije spajanja ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića kroz Univerzitetski centar. Završeni su radovi I faze.
- U toku je izrada tehničke dokumentacije za izmještanje trafostanice i izrada elaborata rušenja rezervoara koji se nalaze na trasi planirane saobraćajnice (II faza realizacije).

### **10.5. Izgradnja saobraćajnice ulice Vojvode Boža I raskrsnice ulice prema ulici Sava Burića**

Status projekta: U toku

- Završena je izrada Glavnog projekta Izgradnje saobraćajnice za nastavak ul. Vojvode Boža, priključak oko objekta UP78 i nedostajućeg dijela ul. Sava Burića.
- Još uvijek nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

### **10.6. Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina I izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos"**

Status projekta: U toku

- Završena je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ul. Aleksandra Puškina od Mojčkovačke ulice do Bulevara.
- Na raspisanom javnom nadmetanju za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda.

## **10.7. Unapređenje gradskih, lokalnih I nekategorisanih puteva**

Status projekta: U toku

- Završeni su radova na: presvlačenju lokalnih puteva, sanaciji lokalnih puteva u selu Građani i sanaciji kolovoza na gradskim saobraćajnicama i sanaciji potpornih zidova na lokalnom putu Rijeka Crnojevića - Dujeva - Virpazar i MZ Ljubotinj.

## **10.8. Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci**

Status projekta: U toku

- Završena je izrada Elaborata za projekat Izgradnje stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci. Planirano je raspisivanje javnog konkursa za odabir najpovoljnijeg idejnog rješenja. Čeka se ovjera elaborate parcelacije za formiranje UP i da državni arhitekta pokrene procedure sprovođenja javnog konkursa.

## **10.9. Prihvatište za napuštene kućne ljubimce (azil)**

Status projekta: U toku

- Formirana je komisija za međuopštinsku saradnju Prijestonice Cetinje i opštine Bar sa ciljem iznalaženja odgovarajuće lokacije. Očekuje se prijedlog Opštine Bar po pitanju lokacije na njihovoj teritoriji.

## **10.10. Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja**

Status projekta: U toku

- Izdati su urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju i rekonstrukciju kapele na Čevu. Urađen je projektni zadatak. Glavnom državnom arhitekti upućen je zahtjev za sprovođenje javnog konkursa za odabir idejnog arhitektonskog rješenja. Geodetska podloga je urađena i dostavljena Glavnom državnom arhitekti. Završeno je javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja za koje autor vrši dopunu po instrukcijama članova komisije.
- Završeno je asfaltiranje ulica Nova 5, 6 i 8.

## **10.11. Kupovina nekretnina I učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja**

Status projekta: U toku

- Završena je izrada i revizija tehničke dokumentacije za izgradnju manjeg objekta za potrebe socijalnog stanovanja. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

## **10.12. Izrada tehničke I druge dokumentacije**

Status projekta: U toku

- Projekat Vučedolske ulice - faza hidrotehnike se ne može završiti zbog povezanosti sa podacima iz hidrotehničke studije čija je izrada u toku. Očekuje se pribavljanje podataka projekta kanalizacija i odvođenja poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora u Donjem Polju do tunela Belveder sa sanacijom Glavnog ponora.
- Završena je izrada : nivelacionog plana za Ulicu Baja Pivljanina i dio ulice Vuka Mićunovića, Glavnog projekta za nastavak ulice Vojvode Boža, priključak oko objekta UP78 i nedostajući dio ulice Sava Burića, Monografije Cetinja, Projekta postojećeg stanja za OŠ "Lovčenski partizanski odred", Elaborata geodezije za trasu Velja Gora – Lašor, Projekat parking prostora Univerzitetskog centra, Glavnog projekta rekonstrukcije tranzitnog i distributivnog cjevovoda na trasi PK "Velja gora" - PK "Lašor", Elaborata geodezije za trase : "Vodoizvorište Drušići - rezervoar Jelenak" i PS "Podgor" - PK "Velja Gora", Elaborata za rušenje rezervoara za mazut, Konzervatorskog projekta adaptacije fasade objekta na Rijeci Crnojevića i Projekta izgradnje ulice od Aleksandra Lesa Ivanovića do Puškinove.

### 10.13. Izgradnja I opremanje "Centra za kulturu Prijestonice"

Status projekta: U toku

- U toku su aktivnosti na pribavljanju podataka za izradu Projektnog zadatka.

### 10.14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

Status projekta: U toku

- Urađen je prijedlog faza realizacije po kojem treba izvršiti izmjenu i dopunu Glavnog projekta, koji takođe treba i prilagoditi novom Zakonu. U toku su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.


### 10.15. Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju

Status projekta: U toku

- U toku je prikupljanje dokumentacije, u saradnji sa JZU "Danilo I" i Ministarstvom zdravlja, koju je potrebno dostaviti Glavnom državnom arhitekti za raspisivanje javnog konkursa za odabir idejnog arhitektonskog rješenja. Zaključen je sporazum sa Ministarstvom zdravlja o međusobnim obavezama za realizaciju projekta.

### 10.16. Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju

Status projekta: U toku



- U prethodnom periodu Prijestonica Cetinje je sprovodila aktivnosti na izradi Glavnog projekta za izgradnju podzemnog objekta za izložbeni prostor u prostoru prirodne pećine posvećenog kontemplaciji ikone Bogorodice Filarmose.
- U 2017. godini potpisan je ugovor za izvođenje radova i nakon pribavljanja građevinske dozvole, izvođač je uveden u posao. Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na lokaciji, ugovoreni radovi su obustavljeni i urađen je Elaborat pripremnih radova kojim su predviđeni radovi na zaštiti ulaza u pećinu. Elaborat je usaglašen između projektanta, nadzora i izvođača i isti dostavljen Upravi za zaštitu kulturnih dobara na saglasnost.
- U 2019. godini nije bilo aktivnosti.

### 10.17. Kupovina nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a

Status projekta: U toku

- Za projekat kupovine nekadašnjeg kompleksa Gornjeg OBOD-a zaključen je kupoprodajni ugovor i izvršena je uplata dijela sredstava predviđenih Kapitalnim budžetom za 2019. godinu.



## **11. PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA**

## 11.1. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

Status projekta: Završen

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
  - U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
  - U 2018. i 2019. godini, za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Kapitalnog budžeta.
- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**



- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2016. godine.  
U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- **Kanalizaciona mreža**
  - Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan 2016. godine. Radovi su završeni.
- **Unaprijeđenje Sistema vodosnabdijevanja**
  - Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, objekata na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, potpisan je 2017. godine.
  - Radovi su završeni.



## 11.2. Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju

Status projekta: Završen



- Realizacija projekta je obuhvatila izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” na Cetinju.

- Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj“, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- U 2016. godini, potpisan je ugovor sa izvođačem radova po FIDIC Žutoj knjizi - „projektuj i izgradi“. U 2016. godini raspisano je javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka“ na Cetinju, odabran izvođač radova i potpisan ugovor.
- U 2017. godini, nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije i pribavljena građevinska dozvola izvođač je uveden u posao. Prilikom početka radova pojavio se problem dodatne količine otpada i nelegalno odloženih automobilskih guma. Nakon rješavanja navedenog problema od strane Prijestonice Cetinje, radovi su otpočeli i isti su u toku.
- U 2018. godini svi radovi su završeni.

### 11.3. Sanacija odlagališta “Ćafe” u Baru

Status projekta: U toku



- Projekat se realizovao po principu „projektuj i izgradi“ kroz dva ugovora: Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova i Ugovor o reviziji Glavnog projekta i nadzoru nad izvođenjem.
- Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova je raskinut novembra 2018. godine.
- U skladu sa FIDIC procedurama, Uprava javnih radova je uputila firmi „Mesogeos S.A.“ prijedlog za Amicable settlement sa procjenom potraživanja po više osnova.
- Tim povodom, predstavnici firme „Mesogeos“ su iskazali spremnost da urade novo tehničko rješenje i dostave finansijsku ponudu za završetak radova. Presentacija novog tehničkog rješenja planirana je za januar 2020. godine u Upravi javnih radova, uz prisustvo nadzorne službe koja je na isto dostavila svoje stručno mišljenje.
- Stručno mišljenje, sa preporukama za izradu inoviranog Glavnog projekta, prosljeđeno je firmi „Mesogeos“ i zatraženo dostavljanje finansijske ponude.
- Ukoliko pregovori ne budu dali rezultate, Uprava javnih radova će, u skladu sa FIDIC procedurama, odluku o svojim potraživanjima i naplati štete nakon raskida ugovora, zatražiti od Tijela za rješavanje sporova (DAB).
- Takođe, ukoliko se ne postigne dogovor sa firmom „Mesogeos“ oko nastavka radova, u skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-309 od 17.01.2019. godine, raspisaće se javno nadmetanje za nastavak i završetak realizacije projekta po principu „projektuj i izgradi“.

- S tim u vezi, u 2019. godini potpisan je ugovor sa stručnim konsultantima o pripremi Projektnog zadatka sa predlogom rješenja, bližim uslovima za izvođenje radova na sanaciji i procjenom investicije za raspisivanje javnog nadmetanja po principu „projektuj i izgradi“. Projektni zadatak je dostavljen Upravi javnih radova i isti je potpisan od strane Opštine Bar u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
- Zahtjevi za aktiviranje avansne garancije i garancije za dobro izvršenje ugovora, nakon potpisivanja od strane EU Delegacije, poslani su osiguravajućem društvu „Siguria“ sa Kosova, koje je izdalo garancije. Kako je „Siguria“ odbila da plati zahtijevana potraživanja, Uprava javnih radova je ugovornu i ostalu dokumentaciju vezanu za garancije, prosljedila Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore u cilju pokretanja sudskog spora radi prinudne naplate, u smislu čl. 53 Zakona o državnoj imovini. U proteklom periodu smo više puta, pismenim i usmenim putem, tražili od Zaštitnika da nas informiše o preduzetim koracima ali još uvijek nemamo informaciju da li je sudski spor pokrenut.
- Ugovor za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova je još uvijek na snazi do 30.03.2020. godine, a s obzirom na ugovorenu ulogu „INGOB“ da postupa kao Tijelo za rješavanje sporova (DAB), zavisice i njegovo dalje angažovanje.

#### 11.4. Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici “Kos -Trebešica”

Status projekta: Završen



- Projekat se finansira iz sredstava IPA II-Nacionalni program 2014. i nacionalnog budžeta.
- Projektom je predviđena rekonstrukcija pruge od stanica Kos do stanica Trebešica u dužini cca 6,75 km. Rekonstrukcija obuhvata zamjenu zastorne prizme, drvenih pragova, šina i kontaktne mreže. Na ovoj sekciji postoji 7 mostova ukupne dužine 476m i 12 tunela ukupne dužine 4.372 m.
- Nakon završenih procedura javnih nabavki u decembru 2018.godine potpisani su ugovori sa Izvođačem radova i Nadzorom nad izvođenjem radova.
- Sbi ugovoreni radovi su završeni.

## **11.5. Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne-vučne podstanice “Trebešica”**

Status projekta: završen

- Realizacija projekta podrazumjeva izradu Glavnog projekta i izgradnju nove elektro vučne podstanice „Trebešica”. Projekat se finansira 85% iz sredstava IPA komponente III „Regionalni razvoj”, dok 15 % predstavlja nacionalno učešće.
- Nakon završenog postupka javne nabavke, krajem 2015. godine potpisan je Ugovor sa ponuđačem koji će projekat realizovati po Žutoj FIDIC knjizi po principu “projektuj i izgradi”.
- Javno nadmetanje za konsultantske usluge, koje podrazumijevaju reviziju projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, nakon dva neuspješna postupka, rezultiralo je potpisivanjem Ugovora u 2016. godini.
- Završena je izrada i revizija Glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, nakon čega se otpočelo sa izvođenjem radova u avgustu 2017. godine. Svi radovi na izgradnji i isporuci složene opreme završeni su u kraćem roku od predviđenog čime su se stvorili uslovi za povlačenje 100% sredstava iz IPA fondova.
- U skladu sa FIDIC procedurama krajem 2019. godine izdat je »taking-over» sertifikat, a nakon što je korisnik ŽICG sproveo proceduru nabavke i ugradnje elektro-ormara nastavljena je procedura tehničkog prijema i pribavljanja upotrebne dozvole objekta.

## **11.6. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti I Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore**

Status projekta: U toku

- Izrada Glavnog projekta predmetne klinike je završena u maju 2017. godine prije stupanja na snagu novog zakona i na crnogorskom je jeziku. Potrebno je usaglasiti postojeći Glavni projekat sa važećom zakonskom regulativom, prevesti Glavni projekat na engleski jezik i pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu sa PRAG pravilima i FIDIC-om.
- Nakon sastanaka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, DEU, CFCU, projektantom i revidentom Projekatn je započeo usaglašavanje Glavnog projekta.
- Aktivnosti prevođenju Glavnog projekta sprovodi CFCU.

## **11.7. Podrška u pripremi projekata za sektore Zaštite životne sredine i Klimatskih akcija**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U 2019. godini objavljen je poziv za dostavljanje aplikacija od strane zainteresovanih ponuđača do kraja avgusta.
- Usled nedovoljnih kapaciteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma rad Evaluacione komisije za vrednovanje pristiglih aplikacija je prolongiran do daljnjeg, odnosno dok članovi Komisije ne završe obaveze vrednovanja na drugom projektu.

## **11.8. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja otpadom**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na upravljanje otpadom iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Cilj ovog projekta je da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva održivog razvoja i turizma i ostalih korisnika za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za ugovor o uslugama za podršku implementaciji i monitoring upravljanja otpadom.
- U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.

## **11.9. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama**

Status projekta: U toku

- Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede. Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor je potpisan u novembru 2019. godine.
- Rok realizacije projekta je 36 mjeseci, odnosno do novembra 2022. godine, i projekat se realizuje planiranom dinamikom.

## **11.10. Podrška u implementaciji, monitoring i izvještavanju u oblasti upravljanja**

### **hemikalijama, IPPC, kvalitetom vazduha, buka, zaštite prirode, civilne zaštite i klimatske akcije**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na tehničku podršku za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija.
- U 2019. godini objavljen je poziv za dostavljanje aplikacija od strane zainteresovanih ponuđača do kraja jula.
- Evaluacione komisije za vrednovanje pristiglih aplikacija je počela sa radom krajem jula mjeseca, i vredovanje je i dalje u toku.

## **11.11. Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na oblast zaštite životne sredine i klimatskih akcija. Svrha ovog ugovora je da podrži proces transpozicije i razvija institucionalni kapacitet za strateško planiranje, sprovođenje pravnih regulativa u oblasti životne sredine, u skladu sa akcionim planom o životnoj sredini i klimatskim akcijama 2018-2020. godina.
- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za ugovor o uslugama.

- Usled nedovoljnih kapaciteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma rad Evaluacione komisije za vrednovanje pristiglih aplikacija je prolongirana i počela sa radom u decembru 2019. godine.

### **11.12. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U 2019. godini pripremljena je sva potrebna dokumentacija za raspisivanje grant šeme.

### **11.13. Monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS II)**

Status projekta: U toku

- Obaveza Ministarstva saobraćaja i pomorstva je da dostavi nacrt tenderske dokumentacije.

### **11.14. Nabavka opreme za sprječavanje zagađenja mora motornim uljem sa plovila**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za nabavku opreme.
- U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.

### **11.15. Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanje sa EU ACQUIS u oblasti saobraćaja**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
- Ugovor je potpisan u novembru 2019. godine.
- Rok realizacije projekta je 48 mjeseci, odnosno do novembra 2023. godine, i projekat se realizuje planiranom dinamikom.

### **11.16. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a svrha projekta je da doprinese postizanju napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja.



- U 2019. godini je sprovedena tenderska procedura za ugovor o uslugama za podršku a pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja.
- U toku je vrednovanje pristiglih ponuda.

### **11.17. Rekonstrukcija željezničke stanice u Bijelom Polju**

Status projekta: U toku

- **Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- Uslijed nezainteresovanosti ponuđača tenderska procedura je pokrenuta treći put. U toku je revidovanje tenderske dokumentacije u skladu sa sugestijama i komentarima EU Delegacije, a u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, nakon čega će se javno nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije objaviti.

- **Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**

Status projekta: U toku

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- U 2019. godini tenderska dokumentacija je pripremljena i odobrena od strane EU Delegacije, i javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije će se objaviti, nakon potpisivanja ugovora za izradu glavnog projekta.

- **Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju**

- Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.
- Nacrt tenderske dokumentacije biće završen nakon revizije Glavnog projekta.
- Ugovarač za izradu Glavnog projekta je po projektnom zadatku dužan da izradi tendersku dokumentaciju za radove, nakon čega će se raspisati javno nadmetanja za izbor izvođača radova.

### **11.18. SOPEES-Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje I socijalne politike**

Status projekta: U toku

Uprava javnih radova ima ulogu Implementacione agencije za aktivnost koja predviđa jedan infrastrukturni projekat, i koja se tiče uključivanja marginalizovanih grupa u obrazovni sistem. Krajnji korisnik je Ministarstvo prosvjete, a svrha projekta je adaptacija školskih zgrada za potrebe osoba sa invaliditetom i osoba sa poteškoćama u kretanju. Uprava realizuje jedan projekat koji obuhvata tri ugovora, i to:

- **Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju**

- U 2019. godini je sprovedeno javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
- **Revizija Glavnog projekta adaptacije školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju**
- U 2019. godini tenderska dokumentacija je pripremljena i odobrena od strane EU Delegacije, i tender će se objaviti, nakon potpisivanja ugovora za izradu glavnog projekta.
- **Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera**
- Nacrt tenderske dokumentacije biće završen nakon revizije Glavnog projekta.
- Ugovarač za izradu Glavnog projekta je po projektom zadatku dužan da izradi tendersku dokumentacije za radove, nakon čega će se raspisati javno nadmetanja za izbor izvođača radova.

## **12. DRŽAVNA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED AUTOPUTA**

- Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije za tehnički pregled autoputa. U skladu sa Odlukom, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori koji se realizuju kontinuitetu.

## **13. REGIONALNI STAMBENI PROGRAM**

## 13.1. Stambeni objekti u Beranama

Status projekta: Završen



- Projekat je obuhvatio izgradnju 4 stambena objekta, ukupne bruto površine cca 7.000 m<sup>2</sup>, sa ukupno 94 stambene jedinice za smještaj 271 korisnika.
- U 2017. otpočeli su radovi na izgradnji objekata.
- Krajem 2018. godine završeni su svi planirani radovi na izgradnji objekta izuzev dijela radova na uređenju terena, jer su isti zavisili od završetka radova na infrastrukturnom priključenju, a što je bila obaveza Opštine Berane.
- Krajem marta 2019. godine završeni su svi radovi na objektima. Objekti su dobili upotrebnu dozvolu i isti su useljeni.

## 13.2. Dom starih u Nikšiću

Status projekta: U toku



- Opština Nikšić je koordinirala izradu i reviziju Glavnog projekta.
- Realizacija ovog projekta planirana je fazno, pri čemu se prva faza izgradnje objekata finansira kroz RHP program, a druga faza kroz Kapitalni budžet.
- Izgradnjom objekata koji se realizuju I fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica. Pored izgradnje administrativnog objekta sa kuhinjom i smještajnih objekata sa 52 smještajne jedinice, projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti.
- Novoprojektovani smještajni objekti su spratnosti podrum, prizemlje, sprat i mansarda, dok je administrativni objekat spratnosti prizemlje i sprat. Ukupna bruto površina objekata je 4.925 m<sup>2</sup>.
- U 2019. godini raspisan je poziv za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i vršioca stručnog nadzora, nakon čega je potpisan ugovor za izvođenje radova. Radovi su započeli u septembar 2019. godine.
- Na objektima su završeni radovi na rušenju i demontažama, zemljani radovi, izrada armirano betonske konstrukcije nadogradnje administrativnog objekta, konstruktivno ojačanje tavanica na smještajnim objektima. U toku je izrada armirano betonske konstrukcije liftovskih okana, izrada drvene krovne konstrukcije, krovopokrivački i limarskim radovi, radovi na hidroizolaciji ukopanih zidova, izrada pregradnih gipskartonskih zidova, ako i grubi razvod instalacija.
