



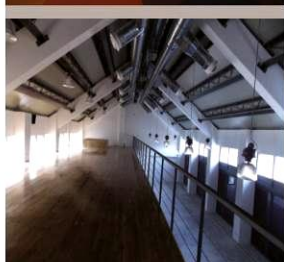

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA ZA period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

2014.

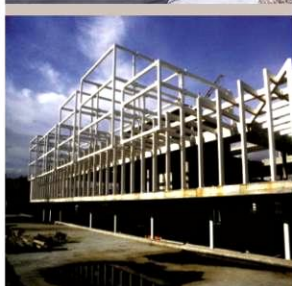

Decembar 2014. godine

SADRŽAJ:

1. REZIME.....	7
2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA	
 za period od 01.01.2014. god. do 31.12.2014. godine	15
3. REALIZACIJA PO OBJEKTIMA.....	30
I. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	31
I.1. Kupovina objekta Kampa na Zlatici.....	32
I.2. Izgradnja objekta Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti.....	32
I.3. Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine	33
I.4. Izgradnja objekta Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma.....	35
I.5. Nadgradnja objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Opštini Kotor	36
I.6. Raspisivanje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog	37
rješenja Nove zgrade Skupštine Crne Gore.....	37
I.7. Bivša zgrada MUP-a u Opštini Podgorica.....	38
I.8. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup,	
kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	39
I.9. Administrativni objekat u Opštini Mojkovac	39
I.10. Adaptacija i opremanje administrativnog prostora u Opštini Podgorica.....	40
I.11. Izgradnja i opremanje zatvorske kuhinje u Zavodu za izvršenje krivičnih	
sankcija u Spužu	40
II. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture.....	42
II.1. Nadogradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici	
za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola	42
II.2. Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture u Opštini Mojkovac - III faza.....	43
II.3. Centar kulture u Opštini Pljevlja	44
II.4. Rekonstrukcija objekta KIC-a „18. Septembar” u Opštini Nikšić.....	46
II.5. Adaptacija prostora pozorišta „Scena 213” u Opštini Nikšić.....	47
II.6. Rekonstrukcija i restauracija Dvorca Kralja Nikole u Opštini Nikšić.....	48
II.7. Izrada Master plana korišćenja objekta Doma revolucije u Nikšiću	48
II.8. Muzej savremene umjetnosti Crne Gore u Opštini Podgorica	49

II.9. Zgrada bivšeg zatvora u Opštini Kotor	49
II.10. Dvorski kompleks na Kruševcu u Opštini Podgorica	49
II.11. Cetinje - grad kulture.....	50
III. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata.....	55
III.1. Izgradnja objekta sportske dvorane u Opštini Berane	55
III.2. Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Murinu, Opština Plav	57
III.3. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Sportskog centra na Žabljaku	58
III.4. Sportska sala u Opštini Andrijevica	59
III.5. Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom	60
III.6. Stadion na Cetinju	60
III.7. Sportski kompleks u Opštini Kolašin.....	61
IV. Projekti očuvanja životne sredine.....	63
IV.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje.....	64
IV.2. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Šavnik	64
IV.3. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Berane	64
IV.4. Kanalizaciona mreža u Opštini Plav	65
IV.5. Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Opštini Berane	65
IV.6. Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove Vode u Opštini Berane.....	65
IV.7. Kanalizaciona mreža u Opštini Rožaje	66
IV.8. Izgradnja deponije u Opštini Pljevlja.....	66
IV.9. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju	66
IV.10. Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku.....	67
IV.11. Mojdež - II faza, Opština Herceg Novi	67
V. Izgradnja lokalne infrastrukture.....	69
V.1. Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica - Opština Pljevlja.....	70
V.2. Izgradnja cjevovoda za MZ Boan - II faza	71
V.3. Rekonstrukcija gradske tržnice u Opštini Bijelo Polje	72
V.4. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštini Kolašin.....	73
V.5. Unapređenje infrastrukture u zoni nacionalnih parkova u Crnoj Gori	73
V.6. Rekonstrukcija zatvorenog bazena u Opštini Kotor.....	74
V.7. Rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na vodovodu „Krkori” u Opštini Andrijevica	75
V.8. Rekonstrukcija studentskog trga na Cetinju	75
V.9. Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici, Opština Rožaje	75
V.10. Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Opštini Rožaje.....	76
V.11. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	76

VI. Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva.....	89
VI.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Nacionalnog 90	90
centra za transfuziju krvi u Opštini Podgorica	90
VI.2. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra	91
sa Urgentnim centrom u Opštini Berane	91
VI.3. Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.....	92
VI.4. Izgradnja objekta Klinike za neurologiju i neurohirurgiju u okviru.....	92
DUP-a KBC u Opštini Podgorica	92
VII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja.....	93
VII.1. Izgradnja izbjegličkog kampa na Koniku–Sarajevski proces/Beogradska inicijativa..	94
VII.2. Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Rožaje.....	95
VII.3. Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” u Opštini Podgorica.....	95
VIII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja.....	96
VIII.1.Izgradnja dječijeg vrtića i jaslica u Ulici Lenke Jurišević u Opštini Bijelo Polje	97
VIII.2.Izgradnja Akademija umjetnosti na Cetinju	99
VIII.3.Nadogradnja objekta Osnovne škole „Mrkojevići” u Opštini Bar	99
VIII.4.Izgradnja objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Opštini Podgorica ...	101
VIII.5.Izgradnja objekta Studentskog doma u Opštini Nikšić	102
VIII.7.Dječiji vrtići u Opštinama Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja	103
VIII.8.Izrada projektne dokumentacije za Srednju stručnu školu u Golubovcima.....	106
VIII.9.Izrada projektne dokumentacije za školsko-gradsku halu u Gusinju	107
VIII.10.Izgradnja inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis” u Opštini Nikšić	107
VIII.11.Vrtić u Opštini Tivat.....	108
VIII.12.Univerzitetski centar u Beranama	108
IX.Granični prelazi.....	110
IX.1. Granični prelaz Božaj	111
IX.2. Granični prelaz Zatrijebačka Cijevna	111
X. Zakon o Dinastiji Petrović Njegoš.....	112
X.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Stambenog objekta na Cetinju	113
XI. Hitna pomoć i prevencija poplava.....	114
XI.1. Izgradnja mosta Zorići-Andrijevice, Opština Andrijevice.....	115
XI.2. Regulacija rijeke Lim od ušća Zlorečice do mosta u Seocima, Opština Andrijevice....	116
XI.3. Regulacija korita rijeke Zlorečice, Opština Andrijevice.....	116
XI.4. Regulacija korita Plavske rijeke, Opština Plav	117
XI.5. Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u	117
Gusinje i izgradnja pješačkog mosta, Opština Plav	117

XI.6. Regulacija rijeke Vruje u Gusinju.....	118
XI.7. Regulacija Jaseničke rijeke i sanacija vodovoda u Opštini Plav.....	118
XI.8. Sanacija lokalnog puta Gusinje-Grebaje, Opština Plav.....	119
XI.9. Regulacija korita rijeke Lim, Opština Berane	120
XI.10.Regulacija korita rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta Prošćenje, Opština Mojkovac - III faza.....	121
XI.11.Regulacija korita rijeke Tare, Opština Kolašin - II i III faza	121
XI.12.Regulacija korita rijeke Plašnice, Opština Kolašin	122
XI.13.Sanacija klizišta na putu za Liješnje, Opština Kolašin.....	123
XI.14.Sanacija lokalnog puta za Vranješnicu, Opština Kolašin.....	124
XI.15.Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru, Opština Bar.....	125
XI.16.Sanacija gradske saobraćajnice od Ribarstva prema centru Rijeke Crnojevića, Opština Cetinje	125
XI.17.Sanacija lokalnog puta u Štoju, Opština Ulcinj.....	125
XI.18.Sanacija mostova i izgradnja pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanacija temelja potpornih zidova, Opština Šavnik	126
XI.19.Sanacija pješačke staze u Virpazaru, Opština Bar	126
XI.20.Sanacija mreže lokalnih puteva, Opština Plav	127
XI.21.Sanacija klizišta Krnjača i Smoljevica.....	127
XI.22.Sanacija lokalnog puta za Štitaricu, Opština Mojkovac	127
XI.23.Sanacija mreže lokalnih puteva Frutak - Danilovgrad.....	128
XII. Unapređenje turističke ponude.....	129
XII.1. Izmještanje ikone Bogorodice Filermose, Opština Cetinje	129
XII.2. Rekonstrukcija restorana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin	130
XII.3. Izrada Glavnog projekta za valorizaciju Đalovića pećine, Opština Bijelo Polje	131
XII.4. Izrada projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioca-Žarski katun, Opština Mojkovac.....	131
XII.5. Asfaltiranje puta od Ravne rijeke do Jasikovca, Opština Bijelo Polje.....	131
XII.6. Nabavka žičara na lokalitetu „Kolašin 1600” - Opština Kolašin i Cmiljača - Opština Bijelo Polje	132
XII.7. Remont žičara na lokalitetu „Savin kuk” na Žabljaku	133
XII.8. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja pčelarske kuće, Opština Danilovgrad...	134
XII.9. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja fabrike za preradu voća i povrća, Opština Kolašin	135
XII.10.Kampovi za mobilne kuće	135
XII.11.Rekonstrukcija apartmana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin	136
XII.12.Putni pravac Jasikovac-Cmiljača, Opština Bijelo Polje	136
XII.13.Katun Šiška, Opština Kolašin.....	136
XII.14.Revitalizacija jezera Ponikvice, Opština Danilovgrad	136

XII.15.Rekonstrukcija hotela „Gorske oči”, Opština Žabljak	137
XII.16.Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje-Štedin, Opština Rožaje	137

XIII. Kupovina stambenih objekata i infrastrukture.....138

XIV. Izrada detaljnog plana za uže jezgro Petnjice, izrada projektne dokumentacije za administrativni objekat, Opština Petnjica 139

1. REZIME

Kapitalnim budžetom za 2014. godinu je planirano da Direkcija javnih radova realizuje sredstva u iznosu od 58.847.500,00 € (Zakon o budžetu Crne Gore za 2014. godinu, Sl. list CG br. 61, od 30. decembra 2013. godine).

Svi projekti Kapitalnog budžeta, kao što je i definisano Zakonom o budžetu za 2014. godinu, grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom obezbijedena su sredstva na sljedeći način:

- Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa	7.653.500,00 €
- Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	7.685.000,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	2.700.000,00 €
- Projekti očuvanja životne sredine	3.482.000,00 €
- Izgradnja lokalne infrastrukture	8.974.000,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	2.517.000,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	553.000,00 €
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	5.800.000,00 €
- Granični prelazi	135.000,00 €
- Zakon o Dinastiji Petrović Njegoš	70.000,00 €
- Hitna pomoć i prevencija od poplava	1.500.000,00 €
- Unapređenje turističke ponude	7.728.000,00 €
- Kupovina stambenih objekata i infrastrukture	10.000.000,00 €
- Izrada detaljnog plana za uže jezgro Petnjice, izrada projektne dokumentacije za administrativni objekat u Petnjici	50.000,00 €.

Kapitalnim budžetom je planirano da Direkcija javnih radova sprovodi aktivnosti na realizaciji 164 projekta od čega je planirano da se iz:

- opštih prihoda realizuje 132 projekta,
- opštih prihoda uz sufinansiranje - donacije stranih Vlada realizuje 1 projekat,
- kreditnih sredstava Evropske investicione banke za program Hitne pomoći i sanacije od poplava realizuje 23 projekta,
- kreditnih sredstava Evropske investicione banke sufinansira izgradnja sanitarnih deponija i PPOV za 4 projekta,
- opštih prihoda uz sufinansiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke realizuje 1 projekat - projekat Katastra (LAMP),
- kreditnih sredstava Evropske razvojne banke uz učešće sredstava iz opštih prihoda za izmirenje obaveza PDV-a realizuju 3 projekta – projekti Dječijih vrtića.

U članu 9. Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu stoji: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Donacija Vlade Republike Italije za projekat:

- Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma

U članu 13. Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu stoji: „Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja” i to:

Kredit Evropske investicione banke (EIB) za projekte:

- Sanitarne deponije,
- Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
- Hitne mjere za prevenciju i sanaciju posljedica od poplava

Kredit Evropske razvojne banke (CEB) za projekte:

- Dječiji vrtić u Zagoriču,
- Dječiji vrtić i jaslice na Starom aerodromu,
- Dječiji vrtić i jaslice u Baru

Kredit Svjetske banke za projekat:

- Projekat katastra (LAMP).

Navedeno podrazumijeva da će prvobitno usvojena sredstva u Kapitalnom budžetu, ali i sama realizacija, dodatno biti uvećana po osnovu realizacije navedenih kreditnih, odnosno donatorskih aranžmana. Po ovom osnovu, u 2014. godini dodatno je povučeno **332.219,56 €**.

Vlada Crne Gore je shodno svojim ovlašćenjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadležnih ministarstava, do 31. decembra 2014. godine donijela sljedeće Zaključke:

- Zaključak Vlade CG br. 08-282/3 od 20. februara 2014. godine

Zadužuje se Direkcija javnih radova da, iz sredstava kapitalnog budžeta, sa stavke – Izgradnja objekata socijalnog staranja Sarajevski proces – Kamp Konik, prenese sredstva, u iznosu od 225.000,00 eura, Agenciji za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić za izradu projektne i planske dokumentacije.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2014/2 od 1. avgusta 2014. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da izvrši prenos sredstava sa pozicije 4413 Kapitalni izdaci – program izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata kulture – projekat Cetinje grad kulture, u iznosu od 500.000 eura, Prijestonici Cetinje, na ime kofinansiranja projekta rekonstrukcije objekta Ruskog poslanstva i stvaranja uslova za preseljenje Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija na Cetinje.

- Zaključak Vlade CG br. 08-1969/4 od 4. septembra 2014. godine

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi realizacije projekta izgradnje i opremanja zatvorske kuhinje i prihvatila Predlog za preusmjerjenje sredstava.

Potreban iznos za realizaciju ovog projekta, koji je predviđen mjerom 3.3.20. Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23, obezbijediće se iz Kapitalnog budžeta (ušteta koje je ostvarila Direkcija javnih radova u okviru projekta 804 – Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa), i to:

- sa pozicije 4147 – Konsultantske usluge, projekti i studije, iznos od 120.000,00 €;
- sa pozicije 4413 – Izdaci za građevinske objekte, iznos od 230.000,00 €.

Sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 € preusmjeriće se na potrošačku jedinicu Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2724/3 od 4. decembra 2014. godine

Zadužuje se Direkcija javnih radova da Investiciono-razvojnem fondu Crne Gore izvrši prenos sredstava, u iznosu od 115.000,00 eura, s pozicije 4413 – Kapitalni budžet Crne Gore, za potrebe TC „Durmitor” odnosno nabavku opreme za skijalište „Savin kuk”.

- Zaključak Vlade CG br. 08-2816/2 od 12. decembra 2014. godine

Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova da izvrši plaćanje sa ušteta kod projekta „Unapređenje turističke ponude” (projektni kod 826)

- sa izdatka 4413 - Izdaci za građevinske objekte – 1.140.000,00 € i
- sa izdatka 4147 - Konsultantske usluge, studije i projekti – 60.000,00 €

za nastavak realizacije projekta „Hitna pomoć i prevencija poplava” (projektni kod 824) u iznosu od 1.200.000,00 €.

- Zaključak Vlade CG br. 08-3117/2 od 26. decembra 2014. godine

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta izgradnje stadiona na Cetinju.

Vlada je prihvatila Ugovor o realizaciji projekta izgradnje stadiona na Cetinju.

Ukupna sredstva obezbijedena Kapitalnim budžetom, uključujući kredite, donacije i Zaključke Vlade iznose 59.179.719,56 €.

Vrijednost sredstava koje je Direkcija javnih radova ukupno realizovala do 31.12.2014. godine iznosi 44.577.205,31 €, odnosno 75,32 % planiranih sredstava.

Od realizovanih sredstava u iznosu od 44.577.205,31 €, iz opštih prihoda realizovano je 43.389.695,05 €, iz kreditnih sredstava 855.290,70 € i iz donacija 332.219,56 €.

Takođe, pored naprijed navedenih sredstava realizovano je i **1.015.940,28 €** kroz sufinansiranje Republike Slovenije, posredstvom CMSR-a, za izgradnju Sportske hale na Žabljaku i Reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku. Ova sredstva nisu prikazana

kroz realizaciju Kapitalnog budžeta, jer su ista direktno isplaćena izvođačima radova od strane CMSR-a.

Od ukupno realizovanih sredstava po regijama je:

- **31.02 %** realizovano za projekte u sjevernom regionu;
- **43.14 %** realizovano je za projekte u centralnom regionu, pri čemu je najveći broj projekata realizovan u Podgorici, kao administrativnom centru Crne Gore;
- **2.25 %** realizovano za projekte u južnom regionu;
- **23.59 %** realizovano za projekte koji se ne mogu vezati za određeni region (Kupovina stambenih objekata i infrastrukture, Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti, Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu).

Direkcija javnih radova je u periodu od 01. januara do 31. decembra u okviru svojih aktivnosti sprovela 147 postupaka javnih nadmetanja, od čega 146 otvorena postupka javne nabavke i 1 pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Direkcija javnih radova, u periodu do 31. decembra 2014. godine, zaključila je 99 ugovora, od čega 59 ugovora o izvođenju radova, 21 ugovor za vršenje stručnog nadzora i revizije tehničke dokumentacije i 19 ugovora za izradu Glavnog projekta.

Do kraja 2014. godine, od ukupnog broja projekata, za čiju realizaciju je zadužena Direkcija javnih radova, završene su aktivnosti na 70 projekata, a koje se odnose na izvođenje radova, izradu projektne dokumentacije i transfere sredstava, i to:

Opština Andrijevica: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,5 km; Radovi na izgradnji mosta - Zorići; Radovi na regulaciji rijeke Lim od ušća Zlorečice do mosta u Seocima;

Opština Bar: Radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice Rutke-Pobrđe u Sutomoru; Radovi na nadogradnji OŠ „Mrkojevići“;

Opština Berane: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 4,5 km; Radovi na regulaciji korita rijeke Lim; Radovi na opremanju objekta Univerzitetskog centra;

Opština Bijelo Polje: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,0 km; Radovi na rekonstrukciji i sanaciji gradskih saobraćajnica; Radovi na izgradnji dječijeg vrtića u Ulici Lenke Jurišević;

Opština Cetinje: Radovi na rekonstrukciji dvora kralja Nikole–II faza; Radovi na rekonstrukciji Čermakove ulice; Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,35 km; Radovi na sanaciji reljefa Crne Gore; Radovi na sanaciji fasade i ugradnji video nadzora u Vladinom domu; Radovi na sanaciji Glavnog objekta biblioteke „Đurđe Crnojević“; Francusko poslanstvo – elektroinstalacije slabe struje; Adaptacija Ruskog poslanstva – transfer sredstava; Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu – izmirenje obaveza iz prethodnog perioda; Stadion – transfer sredstava;

Opština Danilovgrad: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,5 km; Radovi na izgradnji Pčelarske kuće; Radovi na sanaciji puta Frutak-Danilovgrad;

Opština Kolašin: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,0 km; Radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu za Liješnje; Radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice Palih Partizanki; Radovi na sanaciji lokalnog puta za Vranješticu; Radovi na izgradnji šetališta pored rijeke Tare; Radovi na rekonstrukciji Sportske sale; Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju Doma mladih „Gorštak”;

Opština Kotor: Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju zatvorenog bazena;

Opština Mojkovac: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 1,5 km; Radovi na sanaciji lokalnog puta za Štitaricu; Radovi na regulaciji rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta Prošćenje III faza; Radovi na rekonstrukciji i opremanju Doma kulture-III faza; Radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice;

Opština Nikšić: Radovi na rekonstrukciji Bulevara 13. jul; Radovi na rekonstrukciji objekta KIC-a „18. septembar”;

Opština Petnjica: Radovi na sanaciji mreže lokalnih puteva 2,5 km;

Opština Plav: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,5 km; Radovi na sanaciji lokalnog puta Gusinje-Grebaje; Radovi na regulaciji korita Plavske rijeke; Radovi na izgradnji Sportsko-rekreativnog centra – Murino; Radovi na regulaciji rijeke Vruje; Radovi na regulaciji Jaseničke rijeke i sanaciji vodovoda; Izrada Glavnog projekta za školsko-gradsku halu u Gusinju; Izrada Glavnog projekta za regulaciju korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u Gusinje i izgradnju pješačkog mosta;

Opština Plužine: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,0 km;

Opština Podgorica: Radovi na adaptaciji Dvorskog kompleksa na Kruševcu; Srednjoročno rješavanje stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa na Koniku; Izgradnja atmosferske kanalizacije na lokalnom putu Rogami-Pričelje; Izrada Glavnog projekta graničnog prelaza Zatrijebačka-Cijevna; Izrada Glavnog projekta za Srednju stručnu školu u Golubovcima; Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” – naknada za opremanje građevinskog zemljišta; Kamp na Zlatici – transfer sredstava;

Opština Pljevlja: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,0 km; Radovi na rekonstrukciji Ulice Boška Buhe;

Opština Rožaje: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,5 km; OŠ „Bać”; Rekonstrukcija gradskog vodovoda – transfer sredstava;

Opština Žabljak: Radovi na izgradnji sportske dvorane; Radovi na obezbjeđenju stabilne električne energije motela „Radovan-Luka”; Radovi na asfaltiranju Durmitorskog prstena; Remont žičara na lokalitetu „Savin kuk”; Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,0 km; Rekonstrukcija hotela „Gorske oči” – transfer sredstava;

Opština Šavnik: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 3,5 km; Radovi na izgradnji cjevovoda za MZ Boan, Radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice;

Opština Ulcinj: Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u dužini od 2,0 km; Radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice;

Projekat koji se ne može vezati za neku od opština: Kupovina stambenih objekata i infrastrukture; Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.

Do 31.12.2014. godine, Direkcija javnih radova započela je aktivnosti na realizaciji još 72 projekta i iste su u toku, dok 22 projekta nije realizovano.

U ukupnoj realizaciji u 2014. godini za kapitalne izdatke izdvojeno je **42.144.176,71 €**. Radove na realizaciji projekata je gotovo u cjelosti realizovala domaća građevinska operativa. Iznos realizacije za naknade za gradsko-građevinsko zemljište, kao i iznos koji su ostvarile konsultatske firme (izrada tehničke dokumentacije, revizije, stručni nadzori i slično) ostvaren je u ukupnom iznosu od **2.433.028,60 €**.

Broj građevinskih firmi koje su izvodile radove, a angažovane su posredstvom Direkcije javnih radova je 28, dok je u kategoriji projektantskih i konsultantskih preduzeća bilo angažovano njih 31.

Vrlo značajan projekat koji Direkcija javnih radova realizuje već četvrtu godinu za redom, a koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, jeste projekat „Hitne pomoći i prevencije od poplava”. U okviru ovog projekta, u periodu od 2011 – 2014. godine, realizovan je 61 projekat i utrošena su sredstva u iznosu od **8.690.116,22 €**, od čega je u 2014. godini realizovano **1.659.583,86 €** i to: **855.290,70 €** iz kreditnih sredstava i **804.293,16 €** iz opštih prihoda. Najveći dio radova se odnosio na sanaciju mostova, puteva, klizišta, regulaciju vodotokova i izgradnju i sanaciju vodovoda. Kroz realizaciju ovog projekta planirana je pomoć lokalnim upravama, prije svega na sjeveru države, u cilju saniranja i prevencija od poplava najugroženijih područja kako bi se unaprijedio i dodatno olakšao život ljudi u tim područjima. Realizacijom ovog projekta, za koji su obezbijeđena kreditna sredstva Evropske investicione banke preduzete su i preduzimaju se interventne mjere kako bi se uspostavila lokalna saobraćajna komunikacija i obezbijedila sigurnost ugroženih objekata i imovine u zoni vodotokova.

Niz zadnjih godina u toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekata vezano za rješavanje trajnog pitanja skladištenja čvrstog otpada u Crnoj Gori, kao i pitanja izgradnje kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u više opština u Crnoj Gori, pretežno na sjeveru države. S obzirom na to da se radi o projektima velikog obima radova, velike investicione vrijednosti, a da su sredstva za realizaciju navedenih projekata iz domaćih izvora nedostatna, planirana je realizacija ovih projekata kroz instrument pretpristupne pomoći IPA III „Regionalni razvoj”, kao i kroz kreditne aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama. Rješavanjem ovih pitanja Crna Gora će unaprijediti

stanje životne sredine, što će svakako dodatno doprinijeti njenoj daljoj promociji kao ekološke države.

Crna Gora je krajem aprila 2014. godine dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) za realizaciju projekata obuhvaćenih Operativnim programom za IPA III „Regionalni razvoj”, a u decembru 2014. godine je potpisan finansijski sporazum, što je stvorilo uslove da u 2015. godini otpočne realizacija projekata obuhvaćenih Operativnim programom, nakon što pripremljena dokumentacija za raspisivanje javnih nadmetanja bude prihvaćena i odobrena od strane Evropske komisije, u skladu sa propisanim procedurama.

Bez obzira na ekonomsku i finansijsku krizu koja je bila prisutna u prethodnom periodu, realizacija Kapitalnog budžeta bitan je instrument funkcionisanja i kontinuiranog obavljanja privredne aktivnosti, a javni radovi definisani na tržišnim principima poslovanja, izraz su legitimnog učešća države u kreiranju poslovnog i privrednog ambijenta. Kapitalno investiranje i politika javnih radova kroz realizaciju Kapitalnog budžeta omogućava svim učesnicima ovog programa da uz očekivane multiplikativne efekte dodatno dinamiziraju ekonomsku aktivnost i podstaknu rast i razvoj. Kroz realizaciju Kapitalnog budžeta omogućeno je poboljšanje lokalne infrastrukture, stvaranje uslova za rad državnih organa, kulturnih institucija, organa socijalnog staranja, zdravstvenih institucija, uz politiku što ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

Podgorica, 31.12.2014. godine

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

***2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA
za period od 01.01.2014. god. do 31.12.2014. godine***

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
1.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa</i>	1.227.200,00	5.811.500,00	7.038.700,00	685.185,02	5.305.934,25	5.991.119,27
1.1.	Kamp na Zlatici	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	973.909,97	973.909,97
1.2.	Objekt CANU-a u Podgorici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici*	320.000,00	2.332.500,00	2.652.500,00	270.235,82	2.258.873,72	2.529.109,54
1.4.	Eko-zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici*	311.200,00	750.000,00	1.061.200,00	287.416,70	1.183.751,35	1.471.168,05
1.5.	Državno tužilaštvo u Kotoru	130.000,00	140.000,00	270.000,00	10.004,83	0,00	10.004,83
1.6.	Nova zgrada Skupštine CG u Podgorici	300.000,00	100.000,00	400.000,00	4.908,75	0,00	4.908,75
1.7.	Bivša zgrada MUP-a CG u Podgorici	20.000,00	580.000,00	600.000,00	31.382,22	372.025,13	403.407,35
1.8.	Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	131.000,00	269.000,00	400.000,00	71.062,20	0,00	71.062,20
1.9.	Administrativni objekat u Mojkovcu	15.000,00	415.000,00	430.000,00	10.174,50	317.663,92	327.838,42
1.10.	Adaptacija i opremanje administrativnog prostora u Podgorici	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	199.710,16	199.710,16
1.11.	ZIKS - Izgradnja i opremanje zatvorske kuhinje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
2.	<i>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</i>	639.700,00	7.045.300,00	7.685.000,00	61.838,72	6.108.874,37	6.170.713,09
2.1.	Muzički centar Crne Gore u Podgorici	169.600,00	2.830.400,00	3.000.000,00	4.694,47	2.883.763,79	2.888.458,26
2.2.	Dom kulture u Mojkovcu - III faza	8.100,00	291.900,00	300.000,00	5.907,32	211.449,96	217.357,28
2.3.	Centar kulture u Pljevljima	50.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Bioskop „18. septembar” u Nikšiću	17.000,00	183.000,00	200.000,00	32.780,32	1.092.440,95	1.125.221,27
2.5.	„Scena 213” u Nikšiću	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.996,69	4.996,69
2.6.	Adaptacija objekta Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću	30.000,00	320.000,00	350.000,00	7.605,64	181.763,27	189.368,91
2.7.	Dom revolucije u Nikšiću	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Muzej savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Zgrada bivšeg zatvora u Kotoru	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Dvorski kompleks na Kruševcu, Podgorica	0,00	225.000,00	225.000,00	4.550,00	245.907,75	250.457,75
2.11.	Cetinje – grad kulture	185.000,00	2.315.000,00	2.500.000,00	6.300,97	1.488.551,96	1.494.852,93
2.11.1.	Nabavka opreme za rad JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.	Sanacija reljefa Crne Gore	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.374,56	95.374,56

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
2.11.3.	II faza rekonstrukcije Dvorca Kralja Nikole sa pripadajućim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	148.429,22	148.429,22
2.11.4.	Glavni projekat rekonstrukcije unutrašnjosti Kraljevskog pozorišta Zetski dom i početak radova	80.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	43.661,58	43.661,58
2.11.5.	Sanacija fasade i ugradnja video nadzora na Vladinom domu	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	179.123,80	179.123,80
2.11.6.	Dogradnja objekta Državnog arhiva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.7.	Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu	0,00	230.000,00	230.000,00	1.719,47	80.470,24	82.189,71
2.11.8.	Projekat uređenja okoline Ćipura i Biljarde - Cetinje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.9.	Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP - Cetinje	25.000,00	500.000,00	525.000,00	4.581,50	500.000,00	504.581,50
2.11.10.	Projektna dokumentacija i radovi na Vladičinoj kuli na Karuču, Rodnoj kući Kralja Nikole, Rodnoj kući vladike Rada i kući Toma Petrovića	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.	Sanacija Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	441.492,56	441.492,56
2.11.11.1.	Glavni objekat biblioteke	0,00	292.540,00	292.540,00	0,00	287.540,79	287.540,79
2.11.11.2.	Centralni depo knjiga	0,00	158.197,00	158.197,00	0,00	119.870,65	119.870,65
2.11.11.3.	Zgrada bivšeg Francuskog poslanstva	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00	34.081,12	34.081,12

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
3.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata</i>	141.600,00	2.308.400,00	2.450.000,00	96.775,56	1.915.607,76	2.012.383,32
3.1.	Sportska dvorana u Beranama	41.600,00	1.250.400,00	1.292.000,00	10.995,60	823.387,73	834.383,33
3.2.	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra, Murino – opština Plav	10.000,00	190.000,00	200.000,00	17.850,00	435.000,00	452.850,00
3.3.	Sportska hala na Žabljaku	25.000,00	233.000,00	258.000,00	47.503,61	157.220,03	204.723,64
3.4.	Sportska sala u Andrijevići	40.000,00	0,00	40.000,00	6.199,90	0,00	6.199,90
3.5.	Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom	10.000,00	140.000,00	150.000,00	10.918,25	0,00	10.918,25
3.6.	Stadion na Cetinju	10.000,00	490.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3.7.	Sportski kompleks u Kolašinu	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.308,20	0,00	3.308,20
4.	<i>Projekti očuvanja životne sredine</i>	891.100,00	2.340.900,00	3.232.000,00	135.674,10	790.194,28	925.868,38
4.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	374.100,00	25.900,00	400.000,00	78.701,00	18.104,90	96.805,90
4.2.	Kanalizaciona mreža i PPOV u Šavniku	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	PPOV i kanalizacione mreže u Beranama	40.000,00	135.000,00	175.000,00	29.752,00	0,00	29.752,00
4.4.	Kanalizaciona mreža u Plavu	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Beranama	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
4.6.	Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove vode u Beranama	50.000,00	350.000,00	400.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.7.	Kanalizaciona mreža u Rožajama	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Izgradnja deponije u Pljevljima	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.10.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku*	20.000,00	480.000,00	500.000,00	7.413,70	480.959,97	488.373,67
4.11.	Mojdež - II faza, Herceg Novi	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	17.207,40	291.129,41	308.336,81
5.	<i>Izgradnja lokalne infrastrukture</i>	<i>621.350,00</i>	<i>8.714.650,00</i>	<i>9.336.000,00</i>	<i>412.224,51</i>	<i>7.065.817,62</i>	<i>7.478.042,13</i>
5.1.	Infrastruktura u MZ Bukovica	5.000,00	495.000,00	500.000,00	18.337,87	500.357,43	518.695,30
5.2.	Cjevovod za MZ Boan	2.000,00	64.000,00	66.000,00	0,00	28.427,89	28.427,89
5.3.	Rekonstrukcija gradske tržnice u Bijelom Polju	17.600,00	760.400,00	778.000,00	31.017,80	759.698,62	790.716,42
5.4.	Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštini Kolašin*	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
5.5.	Unapređenje infrastrukture u zoni nacionalnih parkova u Crnoj Gori	7.000,00	333.000,00	340.000,00	2.200,00	259.244,96	261.444,96
5.6.	Rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru	30.000,00	0,00	30.000,00	104.303,50	0,00	104.303,50
5.7.	Rekonstrukcija vodozahvata Krkori (hlorna stanica), Andrijevića	0,00	70.000,00	70.000,00	2.496,03	52.996,65	55.492,68
5.8.	Rekonstrukcija studentskog trga na Cetinju	10.000,00	340.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
5.9.	Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici, Rožaje	25.000,00	495.000,00	520.000,00	54.740,00	0,00	54.740,00
5.10.	Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Rožajama	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	77.599,40	77.599,40
5.11.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	524.750,00	5.862.250,00	6.387.000,00	199.129,31	5.292.492,67	5.491.621,98
5.11.1.	Lokalni putevi 42,5 km	73.750,00	2.051.250,00	2.125.000,00	25.722,49	2.093.629,37	2.119.351,86
5.11.1.1.	Opština Rožaje 2,5 km			125.000,00	5.950,00	122.748,64	128.698,64
5.11.1.2.	Opština Andrijevica 2,5 km			125.000,00	0,00	123.855,20	123.855,20
5.11.1.3.	Opština Berane 4,5 km			150.000,00	1.600,00	206.423,81	208.023,81
5.11.1.4.	Opština Petnjica 2,5 km			125.000,00	0,00	121.980,95	121.980,95
5.11.1.5.	Opština Mojkovac 1,5 km			75.000,00	300,00	70.376,37	70.676,37
5.11.1.6.	Opština Pljevlja 3 km			150.000,00	399,99	145.704,20	146.104,19
5.11.1.7.	Opština Žabljak 2 km			100.000,00	4.900,00	90.956,76	95.856,76
5.11.1.8.	Opština Kolašin 3 km			150.000,00	4.165,00	138.465,35	142.630,35
5.11.1.9.	Opština Cetinje 2,35 km			100.000,00	1.785,00	97.449,01	99.234,01
5.11.1.10.	Opština Plužine 2 km			100.000,00	0,00	48.552,00	48.552,00
5.11.1.11.	Opština Šavnik 4,5 km			175.000,00	952,00	241.709,47	242.661,47
5.11.1.12.	Opština Nikšić			150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.11.1.13.	Opština Danilovgrad 3,5 km			175.000,00	3.000,00	293.070,54	296.070,54

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
5.11.1.14.	Opština Ulcinj 2 km			125.000,00	1.540,00	91.205,08	92.745,08
5.11.1.15.	Opština Plav 3,5 km			125.000,00	1.130,50	158.611,17	159.741,67
5.11.1.16.	Opština Bijelo Polje 3 km			150.000,00	0,00	138.183,63	138.183,63
5.11.1.17.	Opština Podgorica			25.000,00	0,00	4.337,19	4.337,19
5.11.2.	Gradske saobraćajnice	451.000,00	3.811.000,00	4.262.000,00	173.406,82	3.198.863,30	3.372.270,12
5.11.2.1.	Gradska saobraćajnica u Rožajama - rekonstrukcija	2.500,00	177.500,00	180.000,00	6.989,16	228.172,51	235.161,67
5.11.2.2.	Gradska saobraćajnica u Rožajama - izgradnja pješačke staze od Kalača do Koljena	25.000,00	125.000,00	150.000,00	12.795,42	0,00	12.795,42
5.11.2.3.	Gradske saobraćajnice u Beranama - Projekat i izrada mosta u Haremima i rekonstrukcija saobraćajnice	50.000,00	100.000,00	150.000,00	37.814,17	71.505,24	109.319,41
5.11.2.4.	Gradska saobraćajnica u Šavniku - rekonstrukcija i izgradnja gradske saobraćajnice u opštini Šavnik	3.000,00	97.000,00	100.000,00	2.796,50	241.304,33	244.100,83
5.11.2.5.	Gradska saobraćajnica u Kolašinu - rekonstrukcija Ulice Palih partizanki	6.000,00	214.000,00	220.000,00	7.894,90	290.907,39	298.802,29
5.11.2.6.	Gradska saobraćajnica u Plavu - rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje, dionica Jezerska ulica	97.000,00	1.003.000,00	1.100.000,00	21.098,70	373.781,88	394.880,58

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
5.11.2.7.	Gradska saobraćajnica u Andrijevići - rekonstrukcija glavnog trga	32.000,00	198.000,00	230.000,00	13.156,45	128.400,00	141.556,45
5.11.2.8.	Gradska saobraćajnica u Bijelom Polju - rekonstrukcija gradskog trga	12.500,00	187.500,00	200.000,00	499,80	20.000,00	20.499,80
5.11.2.9.	Gradska saobraćajnica u Mojkovcu – Ulica Vojislava Šćepanovića II faza	19.000,00	151.000,00	170.000,00	4.000,00	206.263,33	210.263,33
5.11.2.10.	Gradska saobraćajnica u Pljevljima - rekonstrukcija Ulice Boško Buha	3.000,00	222.000,00	225.000,00	15.265,60	283.725,01	298.990,61
5.11.2.11.	Gradska saobraćajnica u Danilovgradu - rekonstrukcija Gorica pružni prelaz	8.000,00	412.000,00	420.000,00	7.687,50	332.150,28	339.837,78
5.11.2.12.	Gradska saobraćajnica na Cetinju - rekonstrukcija Čermakove ulice	2.000,00	93.000,00	95.000,00	2.439,50	86.989,64	89.429,14
5.11.2.13.	Gradska saobraćajnica u Nikšiću - rekonstrukcija Bulevara 13. jul	27.000,00	493.000,00	520.000,00	12.228,40	622.749,39	634.977,78
5.11.2.14.	Gradska saobraćajnica u Ulcinju - rekonstrukcija gradske saobraćajnice	2.000,00	98.000,00	100.000,00	0,00	74.145,51	74.145,51
5.11.2.15.	Gradska saobraćajnica u Podgorici - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice kružni tok Mojanovići - kružni tok Goričani	20.000,00	0,00	20.000,00	16.310,02	0,00	16.310,02

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
5.11.2.16.	Gradska saobraćajnica u Mojkovcu - Izrada projekt. dokum. za Ulicu Nemanjića u Rudnici	20.000,00	0,00	20.000,00	4.792,30	0,00	4.792,30
5.11.2.17.	Gradska saobraćajnica u Budvi - izrada projekt. dokum. za rekonstrukciju puta na Toplišu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.11.2.18.	Gradske saobraćajnice Sutomore rekonstr. gradske saobraćajnice Rutke - Pobrđe	22.000,00	240.000,00	262.000,00	7.638,40	238.768,79	246.407,19
6.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</i>	<i>183.100,00</i>	<i>3.453.900,00</i>	<i>3.637.000,00</i>	<i>116.072,25</i>	<i>3.451.868,46</i>	<i>3.567.940,71</i>
6.1.	Zavod za transfuziju krvi u Podgorici	93.100,00	1.613.900,00	1.707.000,00	74.466,16	1.646.511,94	1.720.978,10
6.2.	Poliklinički centar sa Urgentnim centrom u Beranama	40.000,00	1.490.000,00	1.530.000,00	41.606,09	1.455.356,52	1.496.962,61
6.3.	Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6.4.	Klinika za neurologiju, Podgorica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</i>	<i>257.800,00</i>	<i>469.200,00</i>	<i>727.000,00</i>	<i>242.817,85</i>	<i>105.160,26</i>	<i>347.978,11</i>
7.1.	Izgradnja izbjegličkog kampa na Koniku Sarajevski proces/ Beogradska inicijativa*	234.800,00	390.200,00	625.000,00	230.152,70	105.160,26	335.312,96
7.2.	Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama	12.000,00	79.000,00	91.000,00	1.547,00	0,00	1.547,00
7.3.	Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović“, Podgorica	11.000,00	0,00	11.000,00	11.118,15	0,00	11.118,15

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
8.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja</i>	456.100,00	5.347.400,00	5.803.500,00	246.977,98	3.849.028,74	4.096.006,72
8.1.	Dječiji vrtić i jaslice u Ulici Lenke Jurišević - Bijelo Polje	28.000,00	552.000,00	580.000,00	38.218,40	648.418,91	686.637,31
8.2.	Akademije umjetnosti na Cetinju - objekat zajedničkih sadržaja	42.100,00	1.461.400,00	1.503.500,00	50.790,77	1.329.356,19	1.380.146,96
8.3.	OŠ „Mrkojevići” u Baru	6.000,00	144.000,00	150.000,00	16.924,49	146.797,35	163.721,84
8.4.	Sportska dvorana Univerziteta CG u Podgorici	50.000,00	850.000,00	900.000,00	25.258,32	1.316.202,35	1.341.460,67
8.5.	Studentski dom u Nikšiću	41.000,00	109.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	OŠ „Bać”, Opština Rožaje	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	147.924,54	147.924,54
8.7.	Dječji vrtići iz kredita CEB-a	130.000,00	930.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
8.8.	Srednja stručna škola u Golubovcima	50.000,00	0,00	50.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00
8.9.	Školsko-sportska hala u Gusinju - Plav	19.000,00	131.000,00	150.000,00	52.996,00	0,00	52.996,00
8.10.	Inovaciono-preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić	85.000,00	500.000,00	585.000,00	4.940,00	0,00	4.940,00
8.11.	Vrtić u Opštini Tivat	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8.12.	Univerzitetski centar u Beranama	5.000,00	195.000,00	200.000,00	0,00	260.329,40	260.329,40
9.	<i>Granični prelazi</i>	80.000,00	55.000,00	135.000,00	73.678,50	0,00	73.678,50
9.1.	Granični prelazi	80.000,00	55.000,00	135.000,00	73.678,50	0,00	73.678,50
10.	<i>Zakon o Dinastiji Petrović Njegoš</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Izgradnja stambenog objekta u Bajicama na Cetinju	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
11.	<i>Hitna pomoć i prevencija od poplava</i>	62.000,00	1.438.000,00	1.500.000,00	29.257,34	826.033,36	855.290,70
11.1.	Izgradnja mosta Zorići-Andrijevića			70.000,00	5.475,00	0,00	5.475,00
11.2.	Regulacija rijeke Lim od ušća Zlorečice do mosta u Seocima - Andrijevića			80.000,00	3.927,00	44.995,10	48.922,90
11.3.	Regulacija rijeke Zlorečice - Andrijevića			50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Regulacija korita Plavske rijeke - Plav			159.500,00	0,00	158.893,90	158.893,90
11.5.	Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u Gusinje i izgradnja pješačkog mosta - Plav			10.000,00	2.856,00	0,00	2.856,00
11.6.	Regulacija rijeke Vruje u Gusinju - Plav			65.000,00	0,00	0,00	0,00
11.7.	Regulacija Jeseničke rijeke i sanacija vodovoda - Plav			103.500,00	1.000,00	101.130,89	102.130,89
11.8.	Sanacija lokalnog puta Gusinje-Grebaje - Plav			65.000,00	1.785,00	60.505,55	62.290,55
11.9.	Regulacija rijeke Lima - Berane			100.000,00	0,00	95.776,77	95.776,77
11.10.	Regulacija rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta Prošćenje III faza - Mojkovac			144.000,00	700,00	131.015,42	131.715,42
11.11.	Regulacija rijeke Tare II i III faza - Kolašin			150.000,00	1.626,34	40.908,50	42.534,84
11.12.	Regulacija rijeke Plašnice - Kolašin			40.000,00	0,00	14.950,00	14.950,00
11.13.	Sanacija klizišta na lokalnom putu za Liješnje - Kolašin			45.000,00	3.190,00	40.858,60	44.048,60

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
11.14.	Sanacija lokalnog puta za Vranješnicu - Kolašin			26.000,00	2.499,20	17.432,48	19.931,68
11.15.	Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru - Bar			70.000,00	4.998,00	0,00	4.998,00
11.16.	Sanacija glavne saobraćajnice od Ribarstva prema centru Rijeke Crnojevića - Cetinje			40.000,00	0,00	0,00	0,00
11.17.	Sanacija lokalnog puta u Štoju - Ulcinj			37.000,00	0,00	0,00	0,00
11.18.	Sanacija mostova i izgradnja pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanacija temelja potpornih zidova - Šavnik			93.000,00	0,00	81.963,23	81.963,23
11.19.	Sanacija pješačke staze u Virpazaru - Bar			40.000,00	0,00	0,00	0,00
11.20.	Sanacija mreže lokalnih puteva - Plav			32.000,00	0,00	0,00	0,00
11.21.	Sanacija klizišta Krnjača i Smoljevica			30.000,00	0,00	0,00	0,00
11.22.	Sanacija lokalnog puta za Štitaricu - Mojkovac			30.000,00	1.200,00	21.988,34	23.188,34
11.23.	Sanacija mreže lokalnih puteva Frutak-Danilovgrad			20.000,00	0,00	15.614,58	15.614,58
12.	<i>Unapređenje turističke ponude</i>	706.000,00	6.477.300,00	7.183.300,00	332.526,77	2.725.657,61	3.058.184,38
12.1.	Izmještanje ikone Bogorodice Filermose, Cetinje	150.000,00	250.000,00	330.000,00	138.425,00	0,00	138.425,00
12.2.	Rekonstrukcija restorana NP Biogradska gora, Kolašin	23.000,00	0,00	93.000,00	2.227,18	65.314,96	67.542,14
12.3.	Izrada Glavnog projekta za valorizaciju Đalovića pećine, Bijelo Polje	129.300,00	0,00	129.300,00	24.990,00	0,00	24.990,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
12.4.	Izrada projektne dokumentacije za put Vragodo-Vrioca-Žarski katun, Mojkovac	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Asfaltiranje puta od Ravne rijeke do Jasikovca 5,5 km Bijelo Polje	20.000,00	595.000,00	295.000,00	2.499,00	85.085,00	87.584,00
12.6.	Nabavka žičare na lokalitetu „Kolašin 1600” i Cmiljače u Bijelom Polju	150.000,00	3.326.000,00	3.476.000,00	952,00	191.066,94	192.018,94
12.7.	Remont žičara na lokalitetu „Savin kuk” na Žabljaku	20.000,00	780.000,00	795.000,00	8.950,00	746.264,36	755.214,36
12.8.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja pčelarske kuće u Danilovgradu	50.000,00	150.000,00	525.000,00	53.013,35	461.400,03	514.413,38
12.9.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja fabrike za preradu voća i povrća - Kolašin	50.700,00	149.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.10.	Kampovi za mobilne kuće	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.11.	Apartmani Biogradska gora - Kolašin	10.000,00	75.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12.12.	Putni pravac Jasikovac-Cmiljača, Bijelo Polje	6.000,00	194.000,00	200.000,00	11.317,50	0,00	11.317,50
12.13.	Katun Šiška, Kolašin	2.000,00	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.14.	Revitalizacija jezera Ponikvice, Danilovgrad	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.15.	Rekonstrukcija hotela „Gorske oči” na Žabljaku	25.000,00	420.000,00	445.000,00	25.000,00	420.000,00	445.000,00
12.16.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje-Štedin u dužini od 7 km - Rožaje	45.000,00	355.000,00	400.000,00	17.385,90	0,00	17.385,90
12.17.	Durmitor nacionalni park Žabljak	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO ZA 2014. GODINU			REALIZOVANO DO 31.12.2014. GODINE		
		Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)	Tekući izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	UKUPNO (€)
12.18.	Odluka Vlade br. 08-2816 od 12.12.2014.	0,00	0,00	0,00	47.766,84	756.526,32	804.293,16
13.	<i>Kupovina stambenih objekata i infrastrukture</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
14.	<i>Izrada detaljnog plana za uže jezgro Petnjice, izrada projektne dokumentacije za administrativni objekat u Petnjici</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	5.385.950,00	53.461.550,00	58.847.500,00	2.433.028,60	42.144.176,71	44.577.205,31

3. REALIZACIJA PO OBJEKTIMA

I. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

I.1. Kupovina objekta Kampa na Zlatici

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 03-7921/4 od 17. novembra 2011. godine i Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa, zaključenog između Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija i Glavnog grada br. 06-4359/1 od 25.11.2011. godine, utvrđena je obaveza kupovine objekta Kampa na Zlatici, za potrebe trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice Uprave policije.
- ❑ U 2014. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **973.909,97 €**.

I.2. Izgradnja objekta Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti

Status projekta:

U toku




- ❑ Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 63 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2” – izmjene i dopune u Podgorici, na uglu Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Vaka Đurovića.
- ❑ Objekat je bruto površine 6.990 m² i sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i šest spratova.
- ❑ U novoprojektovanoj zgradi CANU-a je planirano: 70 kancelarija, 7 sala za sastanke, 2 laboratorije akademskog kluba, čitaonice, 3 depoa, 2 arhive, kao i ostale prateće tehničke prostorije.
- ❑ Sa radovima na izgradnji objekta se započelo krajem 2010. godine.
- ❑ U prethodnom periodu su završeni radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, radovi na oblaganju fasadnih zidova cijepanim kamenom, radovi na izradi ventilirajuće kamene fasade i polustrukturalnih fasada, kao i radovi na grubom razvodu vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija, kao i dio radova na izradi unutrašnjih hidro-izolacija, gips kartonskih zidova, cementnih košuljica i postavljanju fasadnih brisoleja.
- ❑ U ovoj godini gradilište je konzervirano zbog nedostatka finansijskih sredstava.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak izvođenja radova.



I.3. Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine

Status projekta:

U toku

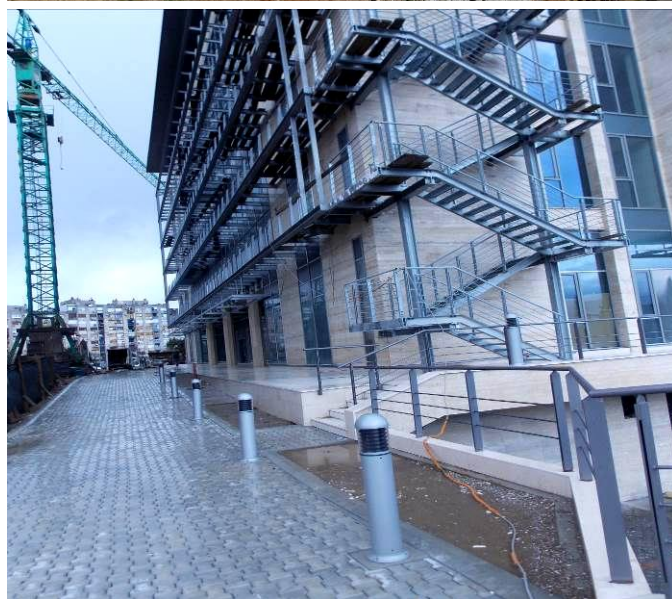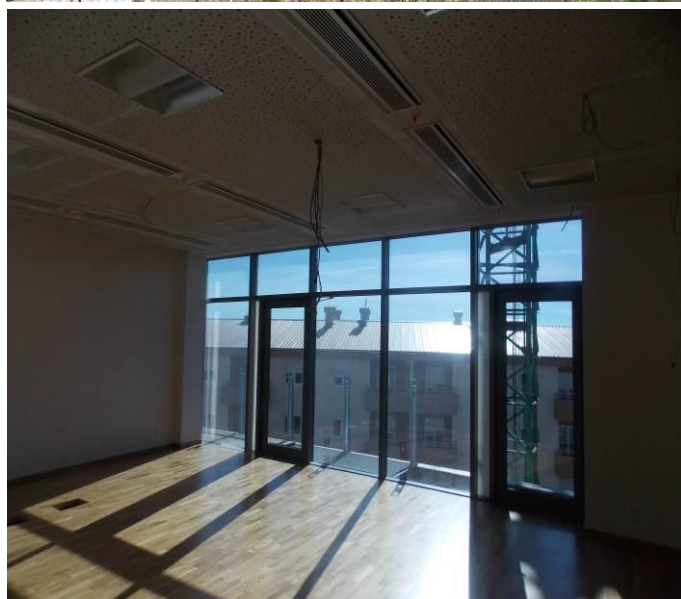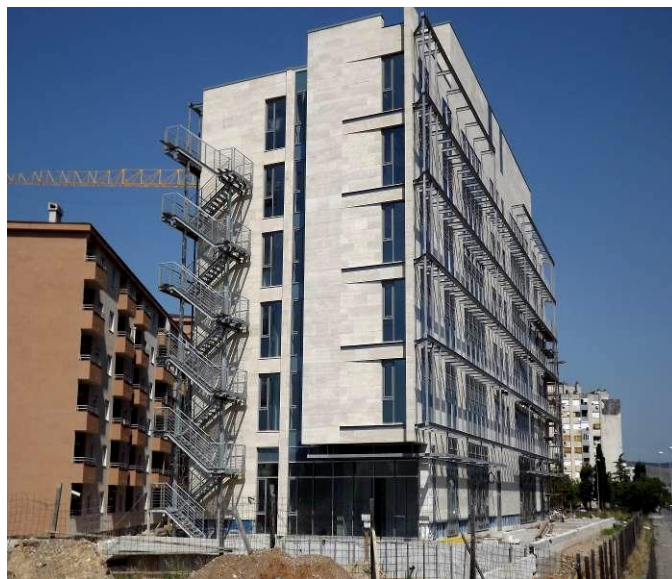

- ❑ Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine se finansira kroz Kapitalni budžet Crne Gore i iz kredita Svjetske banke.
- ❑ Na osnovu prvonagrađenog konkursnog rada u 2010. godini završena je izrada projektne dokumentacije.
- ❑ Objekat Uprave za nekretnine je lociran u sklopu urbanističke parcele br. 2 u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona” – Izmjene i dopune, u Podgorici.
- ❑ Objekat sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i pet spratova.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta iznosi cca 8.600 m², od čega je površina podzemnih etaža 2.780 m², a nadzemnih 5.820 m².
- ❑ U novoprojektovanom poslovnom objektu funkcionalno su organizovani sadržaji Uprave za nekretnine i Područne jedinice Podgorica, za cca 220 radnih mjesta.
- ❑ U objektu je planirano: 100 kancelarija, 6 kabineta sa predprostorom i toaletima, 13 šaltera sa prostorom za stranke, 5 sala za sastanke, 2 multimedijalne sale kapaciteta 30 i 70 mjesta, restoran sa kuhinjom kapaciteta 30 mjesta, prostorije za tehničku opremu i održavanje objekta, server sale, arhive, magacini, ostali tehnički i prateći sadržaji, kao i garažiranje vozila, na drugom nivou suterena, sa 40 parking mjesta.
- ❑ Sa radovima na izgradnji objekta se započelo sredinom 2011. godine i u prethodnom periodu su završeni radovi na: montaži fasadne bravarije, kamenih fasadnih obloga sa pripadajućom izolacijom, izradi gips kartonskih zidova i bravarskih pregrada, montaža spuštenih plafona, kao i dio radova na elektro, mašinskim i instalacijama vodovoda i kanalizacije i radova na infrastrukturnim priključcima.
- ❑ U toku su završni radovi na montaži rasvjete, sistemskih podova, sanitarnih elemenata i opreme termotehničkih i elektro instalacija.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak svih radova na objektu.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **2.529.109,54 €**.

I.4. Izgradnja objekta Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma

Status projekta:

U toku

- ❑ Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF – Environment Montenegro-Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- ❑ Energetski efikasna zgrada je namijenjena za smještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- ❑ Planirana lokacija objekta je u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica, na urbanističkoj parceli br. 9. Objekat će sadržati podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina objekta iznosi cca 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m².

- ❑ U 2011. godini je urađen, a potom i revidovan Glavni projekat (koji je zajedno sa Idejnim projektom bio donacija Italijanske Vlade) i pribavljena je građevinska dozvola.
- ❑ Izgradnja objekta se realizuje fazno.
- ❑ I faza izgradnje objekta predmet je zajedničkog finansiranja Crnogorske strane (43,81%) i Italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- ❑ Izgradnju II faze finansira Italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- ❑ Krajem 2012. godine se otpočelo sa izgradnjom, i do kraja 2014. godine su završeni radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije, kao i radovi na izradi hidroizolacije ukopanih zidova.
- ❑ U toku su završni radovi na izradi čelične konstrukcije.
- ❑ Za narednu godinu planiran je početak radova II faze čiji početak uslovljava završetak radova I faze.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.471.168,05 €**.



I.5. Nadgradnja objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Opštini Kotor

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je nadogradnja postojećeg objekta SDK Kotor, koji se sastoji od suterena i prizemlja.
- ❑ Nadograđeni objekat će sadržati 13 kancelarija, prostorije za prepoznavanje, prostoriju za zadržavanje osumnjičenih, arhivu, salu za sastanke i ostale prateće tehničke prostorije.
- ❑ Nakon što je završena izrada i revizija projektne dokumentacije za nadgradnju bivšeg objekta SDK-a ukupne bruto površine cca 905 m² za potrebe tužilaštva u Kotoru, završena je procedura pribavljanja građevinske dozvole.
- ❑ U 2013. godini je raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i isto je poništeno.
- ❑ U 2014. godini je ponovo raspisano javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača, potpisan je Ugovor sa izabranim izvođačem radova i pribavljena je građevinska dozvola.
- ❑ Početak radova je planiran nakon iseljenja prostorija Centralne banke Crne Gore.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **10.004,83 €** za administrativne troškove.



I.6. Raspisivanje konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Nove zgrade Skupštine Crne Gore

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2011. godini stručni tim Direkcije javnih radova je izradio Studiju mogućih rješenja za obezbjeđenje prostora za rad Skupštine Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, na osnovu koje je donešen Zaključak Vlade o izboru lokacije Nove zgrade Skupštine Crne Gore.

- ❑ Zaključkom Vlade br. 03-7377/3 od 29.12.2011. godine, definisano je raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja na predmetnoj lokaciji i to u dvije varijante: a) rekonstrukcija i adaptacija stare zgrade Vlade u Ulici Jovana Tomaševića i izgradnja novog objekta u neposrednoj blizini, i b) rušenje postojećeg i izgradnja novog objekta na istoj urbanističkoj parceli.
- ❑ U 2012. godini stručni tim je, u saradnji sa predstavnicima Skupštine, izradio Projektni zadatak u dijelu definisanja budućeg kapaciteta i prostornih sadržaja objekta Skupštine.
- ❑ U 2014. godini Skupština je sprovodila aktivnosti na utvrđivanju granica buduće lokacije, nakon čega je izvršeno geodetsko snimanje lokacije.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na raspisivanju konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Nove zgrade Skupštine Crne Gore.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **4.908,75 €** za izradu geodetskih podloga.

I.7. Bivša zgrada MUP-a u Opštini Podgorica

Status projekta:

U toku

- ❑ Tokom prvog kvartala 2014. godine je završena projektna dokumentacija za adaptaciju dijela bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Ulici Serdara Jola Piletića u Podgorici.
- ❑ Realizacija projekta je planirana fazno.
- ❑ I faza obuhvata adaptaciju postojeće šalter sale u dijelu prizemlja objekta, koji je namijenjen za izdavanje dokumenata i registraciju vozila, i čija korisna površina iznosi oko 320 m².
- ❑ Kao II faza planirana je adaptacija prizemlja i prvog sprata ukupne korisne površine oko 1.550 m², kao i sanacija krova i fasade objekta.
- ❑ Prostor je planiran za potrebe sljedećih službi: sektor za vanredne situacije i upravnih poslova, kancelarije za upravnu inspekciju, kancelarije za inspektore za strance, kancelarije službe za prijem azilanata, biro za investicije i biro za smještaj i ishranu.
- ❑ Potpisan je ugovor za izvođenje radova I i II faze i radovi su u toku.
- ❑ U prethodnom periodu završeni su radovi na demontaži i izvedeni dio instalaterskih i zanatskih radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak izvođenja radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **403.407,35 €**.



I.8. Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Status projekta:

U toku

- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma je izradilo Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti za 2014. godinu.
- ❑ Akcioni plan sadrži listu objekata u javnoj upotrebi za prioritetno prilagođavanje u 2014. godini u Opštinama Podgorica, Nikšić, Berane i Pljevlja.
- ❑ Shodno Akcionom planu, raspisano je javno nadmetanje i ugovorena izrada Glavnih projekata za prilagođavanje objekata za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti.
- ❑ Izrada projektne dokumentacije je završena i raspisano je javno nadmetanje za radove na prilagođavanju objekata: Centar za socijalni rad, Poreske uprave i prve faze radova za objekat Ekonomskog fakulteta u Podgorici i isto je u toku.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **71.062,20 €** za izradu projektne dokumentacije.

I.9. Administrativni objekat u Opštini Mojkovac

Status projekta:

U toku



- ❑ U 2013. godini završena je izrada Glavnog projekta administrativnog objekta zgrade Opštine u Mojkovcu.
- ❑ Lokacija za gradnju objekta se nalazi u centru grada, na mjestu postojeće zgrade Opštine koja je predviđena za rušenje.
- ❑ Planirani objekat se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne bruto površine 1.290m².
- ❑ U objektu su planirani administrativni prostori za opštinske službe, kao i sekretarijate, agencije i direkcije čiji je osnivač Opština Mojkovac. Takođe, planirana je multifunkcionalna sala kapaciteta 50 sjedišta, kao i tehnički blok i pomoćne prostorije.
- ❑ U 2014. godini je potpisan ugovor sa izvođačem radova i u prethodnom periodu su završeni radovi na izradi AB konstrukcije objekta, kao i grubi razvod elektro i ViK instalacija.
- ❑ U toku su radovi na postavljanju oplata za izradu krovne ploče objekta, kao i izrada pregradnih zidova u prizemlju i na I spratu objekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **327.838,42 €**.

I.10. Adaptacija i opremanje administrativnog prostora u Opštini Podgorica

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini su planirane aktivnosti na adaptaciji administrativnog prostora Direkcije javnih radova, a koje se odnose na izvođenje građevinsko-zanatskih radova, instalaterskih radova i opremanju.
- ❑ U toku je izvođenje završnih radova na planiranoj adaptaciji.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **199.710,16 €**.

I.11. Izgradnja i opremanje zatvorske kuhinje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

Status projekta:

U toku

- ❑ Na osnovu Zaključka Vlade, a nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, tokom oktobra 2014. godine raspisano je javno nadmetanje za adaptaciju i opremanje zatvorske kuhinje i isto je u toku.

II. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

II.1. Nadogradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog protokola

Status projekta:

U toku





- ❑ Planirana je rekonstrukcija i dogradnja bivšeg objekta Doma vojske Crne Gore u Podgorici, bruto površine 9.165 m², u kojem će nakon završetka radova biti smješteni Muzički centar, Crnogorska kinoteka i svečana dvorana za potrebe državnog Protokola.
- ❑ Muzički centar će zauzimati najveći prostor i u njemu će biti smješteni: velika koncertna sala maksimalnog kapaciteta 500 mjesta, mala koncertna sala kapaciteta 190 mjesta, sale simfonijskog i narodnog orkestra, prostorije za izvođače, klub umjetnika, prostor namijenjen publici. Za potrebe Crnogorske kinoteke predviđen je prostor u kome će biti smješteni depoi za arhiviranje filmova i video građe, sala za projekcije, biblioteka, administrativne prostorije, kao i neophodni prateći sadržaji.
- ❑ Postojeći restoranski prostor sa kuhinjom i svim pratećim sadržajima, kao i sa prostorom ljetnje bašte u produžetku, biće rekonstruisani za potrebe svečane sale koja će, između ostalog, služiti i za potrebe državnog Protokola. Na II i III spratu projektovani su administrativno-komercijalni prostori, sa pripadajućim komunikacijama i sanitarnim čvorovima.
- ❑ Radovi na rekonstrukciji objekta su započeti tokom 2009. godine. U prethodnom periodu je završen veći dio radova na izradi ventilirajuće kamene fasade i postavljanju alu-panela na fasadnim i krovnim površinama, montaži pregradnih gips-kartonskih zidova i spuštenih plafona, kao i montaži sprinkler instalacija i instalacija slabe i jake struje. Takođe, završena je izrada cementnih košuljica u objektu, izrada pregrada na sjevernoj terasi, postavljanje kamenih ploča i ograde na zapadnoj terasi.
- ❑ U toku su radovi na uređenju terena, izrada termotehničkih i elektro instalacija, radovi na montaži glavnog lifta, radovi na montaži fasadne bravarije, kamenorezački radovi, kao i radovi na montaži unutrašnjih vrata u administrativnom dijelu objekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **2.888.458,26 €**.

II.2. Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture u Opštini Mojkovac - III faza

Status projekta:

Završen

- ❑ Sredinom 2014. godine, nakon završene procedure javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, započeti su radovi III faze na objektu. Ugovornom dokumentacijom su predviđeni radovi na bini objekta i to: zamjeni poda i moleraj zidova, izrada vodovodnog priključka za sprinkler instalacije, izrada temeljnog uzemljivača sa gromobranskom zaštitom, kao i ugradnja scenske tehnike sa ozvučenjem i osvjetljenjem sale.
- ❑ Završeni su svi planirani radovi na objektu.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **217.357,28 €**.

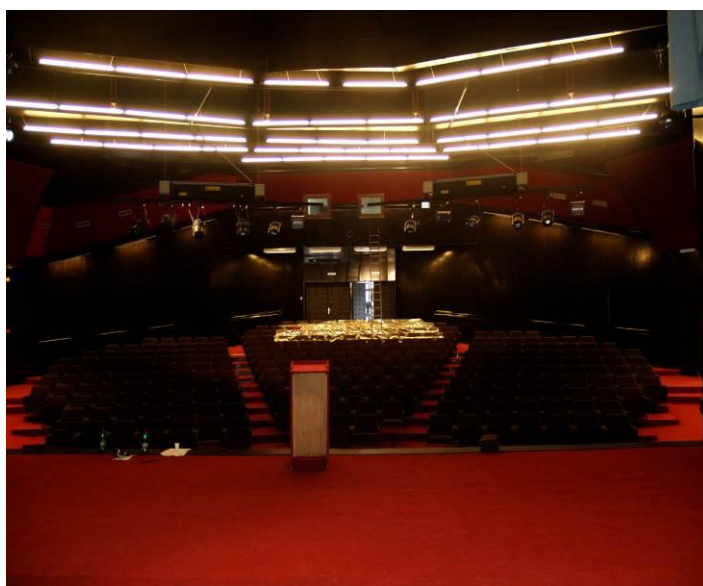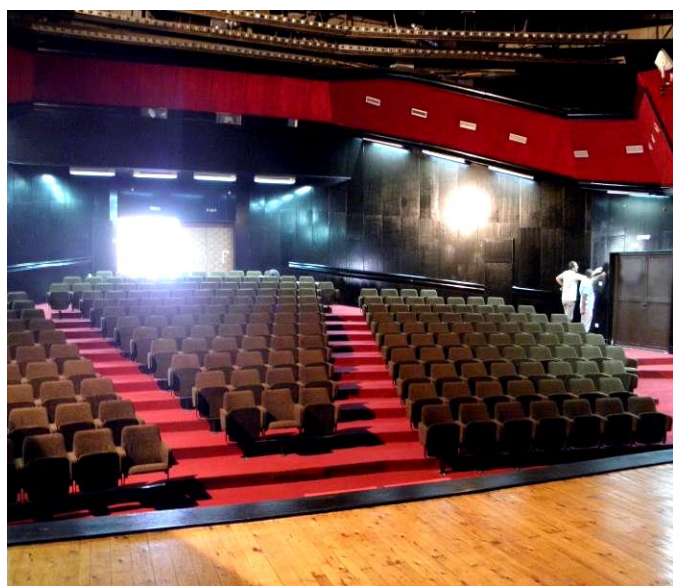


II.3. Centar kulture u Opštini Pljevlja

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat rekonstrukcije objekta Doma kulture u Pljevljima implementirali su stručna služba Opštine Pljevlja, Ministarstvo kulture, a u koordinaciji sa Direkcijom javnih radova.
- ❑ U 2011. godini su završeni svi građevinski instalaterski radovi na rekonstrukciji objekta, a u 2012. godini su završeni ugovoreni enterijerski radovi, koji su se odnosili na dvoranu i prateće sadržaje.
- ❑ U toku 2014. godine tri puta su raspisivana javna nadmetanja, jer su prva dva javna nadmetanja poništena i procedura za izbor izvođača radova je u toku.

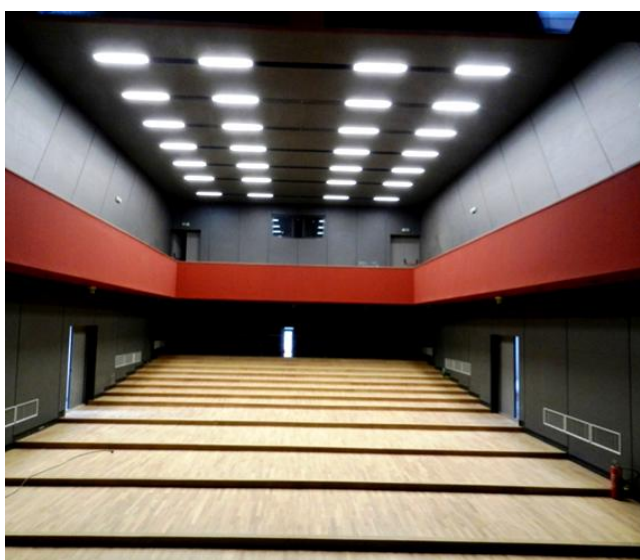

II.4. Rekonstrukcija objekta KIC-a „18. Septembar” u Opštini Nikšić

Status projekta:

Završen



- ❑ Objekat KIC-a „18. Septembar” je smješten u okviru DUP-a „Stara Varoš” - Jug, Izmjene i dopune u Nikšiću.
- ❑ Objekat sadrži suteran, prizemlje i dva sprata, dok je ukupna bruto površina prostora koji se rekonstruisao oko 2.790 m².
- ❑ Suteran je namijenjen smještaju tehničkog bloka. U prizemlju objekta se nalazi prostor za održavanje predstava, scena sa gledalištem sa 313 sjedišta i dodatnih 153 sjedišta na galeriji. Glavni ulazni hol u prizemlju i bočni foajei su osmišljeni kao prostor za održavanje mini prezentacija i konferencija za štampu. Takođe, u prizemlju objekta organizovane su garderobe sa zasebnim ulazom za glumce i novoprojektovanim ulazom za unos dekora. Spratni djelovi objekta, oko i iza sale i scene, organizovani su i povezani u komercijalnu i upravno-administrativnu cjelinu. Ovdje se nalazi kafe klub, zatim prostor za klub umjetnika i baletska sala. Na drugom spratu se nalaze prostorije projekcione kabine i pripadajućeg magacinskog prostora, kontrolna soba za audio i video efekte - režija svijetla i tona.
- ❑ Rekonstrukcija objekta se realizovala fazno.
- ❑ I faza rekonstrukcije, koju je realizovala opština Nikšić, obuhvatala je radove na fasadi (postavljanje termo panela), zamjenu fasadne bravarije, rekonstrukciju krova i izradu čelične nadstrešnice.
- ❑ II faza rekonstrukcije je obuhvatala radove unutar objekta i to: građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim i sprinkler instalacijama. Svi radovi II faze su završeni u maju 2014. godine.
- ❑ III faza rekonstrukcije je obuhvatala završne građevinsko-zanatske radove u dvorani, opremanje objekta scenskom tehnikom i mehanikom, scenskim osvjetljenjem, audio sistemom, sistemom kinoprikazivanja, opremanje namještajem bioskopske dvorane, garderoba, administrativno-kancelarijskog prostora.
- ❑ Svi radovi III faze rekonstrukcije su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.125.221,27 €**.

II.5. Adaptacija prostora pozorišta „Scena 213” u Opštini Nikšić

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Planirane su aktivnosti na adaptaciji prostora pozorišta „Scena 213” u Nikšiću, koje se odnose na adaptaciju garderoba sa sanitarnim blokovima za glumce, te instalacije termotehnike i scenske tehnike, mehanike i osvjetljenja.
- ❑ U 2014. godini nisu sprovedene predmetne aktivnosti, osim u dijelu hitnih sanacionih mjera na krovu i garderobama na zahtjev Opštine Nikšić, za šta je u 2014. godini realizovano ukupno **4.996,69 €**.

II.6. Rekonstrukcija i restauracija Dvorca Kralja Nikole u Opštini Nikšić

Status projekta:

U toku

- ❑ Dvorac Kralja Nikole se nalazi u neposrednoj blizini centra grada, u zahvatu DUP-a „Mrkošnica 2” u Nikšiću. U bližoj okolini se nalazi glavni gradski trg, gradski park, kao i crkva Sv. Vasilija. Dvorac je više puta rekonstruisan, posljednji put 1984. godine, i danas se koristi za potrebe: Zavičajnog muzeja, galerije, biblioteke i državnog arhiva.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta iznosi cca 2.900 m² i spratnosti je: prizemlje, sprat i potkrovlje.
- ❑ Objekat Dvorca je u izrazito lošem stanju zbog čega su neophodni hitni sanacioni radovi radi sprečavanja daljeg propadanja, kao i izrada Glavnog projekta sanacije i adaptacije.
- ❑ Direkcija javnih radova je uradila Elaborat investiciono-tehničkog održavanja objekta u dijelu krova i spoljne stolarije, na osnovu kojeg je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova.
- ❑ U prethodnom periodu je završena sanacija krovnog pokrivača, a u toku je izvođenje radova na zamjeni spoljne stolarije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **189.368,91€**.



II.7. Izrada Master plana korišćenja objekta Doma revolucije u Nikšiću

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Planirano je da Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Ministarstvom kulture, formira radni tim za izradu konceptualnog arhitektonsko-prostornog rješenja objekta („Studija potencijala”).
- ❑ Aktivnosti nisu realizovane.
- ❑ Raspisano je javno nadmetanje za izradu zaštitne ograde oko objekta, ali je isto poništeno.

II.8. Muzej savremene umjetnosti Crne Gore u Opštini Podgorica

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, na lokaciji u okviru DUP-a „Spomen park Kruševac-izmjene i dopune” u Podgorici.
- ❑ Korisnik, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, razmatrao je ideje i mogućnosti izgradnje muzeja na drugoj lokaciji, i planirane aktivnosti nisu realizovane.

II.9. Zgrada bivšeg zatvora u Opštini Kotor

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirano je izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta za potrebe Ministarstva kulture.
- ❑ Ministarstvo kulture je sprovodilo aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U toku su javna nadmetanja za hitnu sanaciju krova i izradu Glavnog projekta sanacije cijelog objekta.

II.10. Dvorski kompleks na Kruševcu u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen

- ❑ Dvorac Petrovića se nalazi u užem centru grada u okviru lokacije „Spomen park Kruševac” u Podgorici.
- ❑ Sa radovima na adaptaciji objekta se otpočelo krajem 2012. godine.
- ❑ U 2013. godini su završeni radovi I faze koji su se odnosili na adaptaciju objekta i opremanju prvog sprata za potrebe Fondacije Petrović Njegoš.
- ❑ U 2014. godini su izvođeni radovi II faze na adaptaciji prizemlja i potkrovlja Dvorca Petrovića i adaptaciji pomoćnog objekta „Bašte” u okviru dvorskog kompleksa prema zahtjevima korisnika.
- ❑ Svi ugovoreni radovi II faze su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **250.457,75 €**.



II.11. Cetinje - grad kulture

Status projekta:

- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.494.852,93 €**.

II.11.1. Nabavka opreme za rad JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG

U toku

- ❑ Realizaciju projekta je sprovodilo Ministarstvo kulture.
- ❑ U 2014. godini je dva puta raspisano javno nadmetanje za nabavku opreme za rad JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, na koja nisu pristigle ispravne ponude.
- ❑ Početkom novembra 2014. godine je pokrenut pregovarački postupak i procedura je u toku.

II.11.2. Sanacija reljefa Crne Gore

Završen

- ❑ Projekat je realizovao Narodni muzej Crne Gore.
- ❑ U 2014. godini je završeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- ❑ Završeni su svi planirani radovi na sanaciji reljefa.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **95.374,56 €**.



II.11.3. Rekonstrukcija Dvorca Kralja Nikole sa pripadajućim sadržajima - II faza

Završen

- ❑ U 2014. godini su planirani radovi II faze rekonstrukcije objekta Dvorca.
- ❑ Narodni muzej Crne Gore je sprovodio aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za odabir izvođača radova.
- ❑ Završene su sve aktivnosti na realizaciji radova II faze.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **148.429,22 €**.



II.11.4. Glavni projekat rekonstrukcije i rekonstrukcija unutrašnjosti Kraljevskog pozorišta Zetski dom

U toku

- ❑ Nakon dobijanja potrebnih saglasnosti i izrade projektnog zadatka raspisano je javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ U toku je izrada projektne dokumentacije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **43.661,58 €**.

II.11.5. Sanacija fasade i ugradnja video nadzora u Vladinom domu

Završen

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodio je Narodni muzej Crne Gore.
- ❑ U 2014. godini je završena izrada projektne dokumentacije za sanaciju fasade i na isti je dobijena saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
- ❑ Nakon sprovedene procedure javnog nadmetanja za odabir izvođača radova potpisan je ugovor.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **179.123,80 €**.



II.11.6. Dogradnja objekta Državnog arhiva

Nije realizovan

- ❑ U 2014. godini su planirani radovi na dogradnji objekta Državnog arhiva.
- ❑ Realizacija projekta je uslovljena usaglašavanjem postojeće projektne dokumentacije sa izradom i usvajanjem planske dokumentacije za istorijsko jezgro Cetinje.
- ❑ Kako planska dokumentacija nije usvojena, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekta.

II.11.7. Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu

Završen

- ❑ Planirana sredstva se odnose na izmirenje preostalih obaveza iz prethodnog perioda po osnovu izvođenja radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **82.189,71 €**.

II.11.8. Projekat uređenja okoline Ćipura i Biljarde

Nije realizovan

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Prijestonica Cetinje.
- ❑ Projektna dokumentacija nije završena i projekat nije realizovan.

II.11.9. Adaptacija Ruskog poslanstva

U toku

- ❑ U toku je revizija Glavnog konzervatorskog projekta. Nositelj izrade projekta je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Na osnovu Zaključka Vlade izvršen je transfer sredstava Prijestonici Cetinje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **504.581,80 €**.

II.11.10. Projektna dokumentacija i radovi na Vladičinoj kuli na Karuču, Rodnoj kući kralja Nikole, Rodnoj kući vladike Rada i kući Toma Petrovića

Nije realizovan

- ❑ U 2014. godini je planirana izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na Vladičinoj kuli na Karuču, Rodnoj kući kralja Nikole, Rodnoj kući vladike Rada i kući Toma Petrovića.
- ❑ Realizaciju projekta sprovodio je Centar za konzervaciju i arheologiju, koji je bio zadužen za izradu projektne dokumentacije.
- ❑ Aktivnosti nisu realizovane.

II.11.11. Sanacija Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“

- ❑ Aktivnosti je sprovodila Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **441.492,56 €**.



II.11.11.1. Glavni objekat biblioteke

Završen

- ❑ U 2014. godini su potpisani ugovori i završeni radovi na sanaciji podrumске etaže Glavnog objekta biblioteke (Italijansko poslanstvo), kao i radovi na uređenju parka oko objekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **287.540,79 €**.

II.11.11.2. Centralni depo knjiga

U toku

- ❑ U 2014. godini su potpisani ugovori i završeni radovi na sanaciji krova Depoa knjiga, kao i radovi na izradi sigurnosnog sistema za odvod poplavnih voda iz podruma objekta.

- ❑ Takođe, u decembru 2014. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za sanaciju Depoa knjiga.
- ❑ Procedura javnog nadmetanja je u toku.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno 119.870,65 €.

II.11.11.3. Zgrada bivšeg francuskog poslanstva

Završen

- ❑ U 2014. godini je potpisan ugovor i završeni radovi na adaptaciji objekta bivšeg francuskog poslanstva u dijelu elektroinstalacija slabe struje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno 34.081,12 €.

III. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

III.1. Izgradnja objekta sportske dvorane u Opštini Berane

Status projekta:

U toku



- ❑ Objekat sportske dvorane u Beranama je smješten u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa u neposrednoj blizini gradskog stadiona.
- ❑ Kapacitet dvorane je 2.100 gledalaca, od čega je 560 sjedišta na teleskopskim tribinama, dok ukupna bruto površina objekta iznosi cca 5.350 m².
- ❑ Godine 2009. je potpisan Ugovor za radove I faze, koja obuhvata izvođenje zemljanih, betonskih, armirano-betonskih radova.
- ❑ Na izgradnji objekta su završeni radovi na iskopima, izradi temeljne konstrukcije, armirano-betonske konstrukcije objekta, stepeništa, stubova i ramova za tribine.
- ❑ Godine 2013. je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze.
- ❑ U 2014. godini je potpisan ugovor za izvođenje radova II faze, koja obuhvata sve radove za stavljanje objekta u funkciju.
- ❑ Tokom 2014. godine su se odvijali radovi na zidanju, malterisanju objekta, izradi i montaži bravarije, čelične konstrukcije i grubom razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i kompletna krovna konstrukcija i paneli za krovni pokrivač su izrađeni i transportovani na gradilište.

- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **834.383,33 €**.

III.2. Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Murinu, Opština Plav

Status projekta:

Završen



- ❑ Planirano je da objekat sportsko-rekreativnog centra u Murinu predstavlja multifunkcionalni kompleks, bruto površine cca 300 m², sa dva otvorena višenamjenska sportska terena sa tribinama, kapaciteta cca 700 mjesta za sjedjenje.
- ❑ U 2013. godini Direkcija javnih radova je izradila Idejno rješenje i Projektni zadatak, na osnovu čega je Opština Plav izdala Urbanističko-tehničke uslove, nakon čega je raspisano javno nadmetanje po sistemu „projektuj i izgradi”. Nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem i izrade projektne dokumentacije, sredinom maja 2014. godine, otpočelo se sa izvođenjem radova.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **452.850,00 €**.



III.3. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Sportskog centra na Žabljaku

Status projekta:

Završen

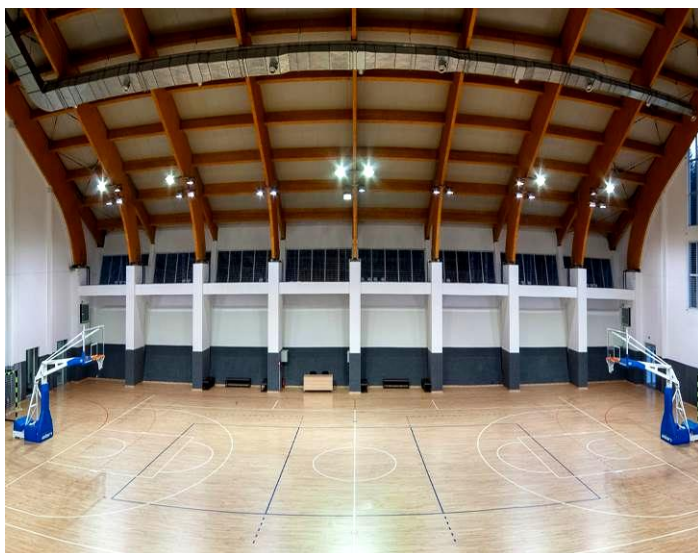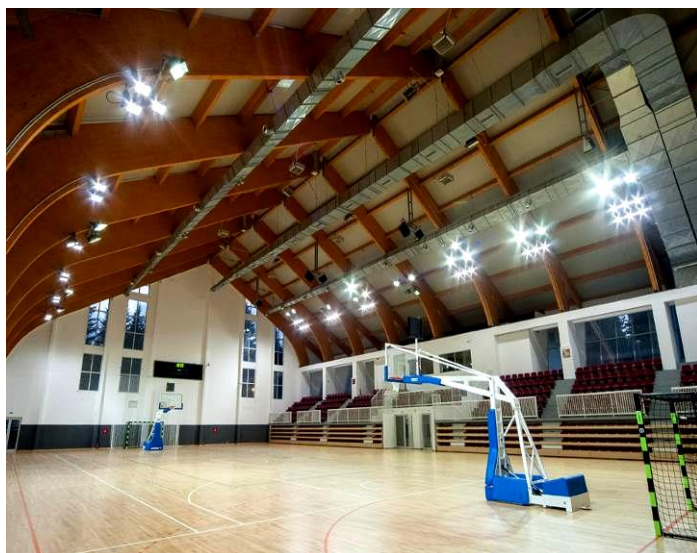

- ❑ Realizacija projekta izgradnje i opremanja Sportskog centra na Žabljaku se finansirala kroz Kapitalni budžet Crne Gore i donaciju Republike Slovenije, posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj – CMSR i uz učešće Opštine Žabljak, po principu „projektuj i izgradi”.
- ❑ U ukupnoj vrijednosti izgradnje Vlada Crne Gore je učestvovala sa 55%, dok je Republika Slovenija učestvovala sa 45%. Učešće Opštine Žabljak je bilo obezbjeđenje lokacije za izgradnju objekta i oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
- ❑ U 2012. godini Direkcija javnih radova je izradila Idejno arhitektonsko rješenje objekta Sportskog centra na Žabljaku, u skladu sa zahtjevima i potrebama budućeg Korisnika.
- ❑ Nakon završene izrade i revizije projektne dokumentacije započeta je izgradnja Sportskog centra na lokaciji uz magistralni put Žabljak-Mojkovac.
- ❑ Objekat Sportskog centra je ukupne bruto površine 3.155 m² i sadrži višenamjensku sportsku dvoranu ukupnog kapaciteta 548 sjedišta, garderobe za sportiste i sudije, ambulantu, teretanu, kuglanu, ugostiteljske i administrativne prostorije, kao i prateće pomoćne i tehničke prostorije.
- ❑ Dvorana je, osim za razne vrste sportova, predviđena i za održavanje koncerata i drugih društvenih dešavanja.
- ❑ Opremanje dvorane je vršeno u skladu sa važećim FIBA, FIVB i IHF standardima za odigravanje utakmica košarke, odbojke i rukometa, a što se konkretno odnosi na podlogu - parket u dvorani, tribine, sportsku opremu, kao i potrebni nivo instalacija.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini, kroz Kapitalni budžet, realizovano je ukupno **204.723,64 €**.
- ❑ Učešće u sufinansiranju Republike Slovenije u 2014. godini iznosi **588.291,23 €**, i ova sredstva su direktno uplaćena izvođaču radova od strane CMSR-a.

III.4. Sportska sala u Opštini Andrijevica

Status projekta:

Nije realizovan



- ❑ Planirana je izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu ukupne bruto površine do 2.000 m², kapaciteta 300-500 mjesta.
- ❑ U 2014. godini je izvršena analiza planske dokumentacije Opština Andrijevica u cilju definisanja lokacije i urbanističke provjere za mogućnost izgradnje sportske sale, na osnovu čega je izrađeno i usaglašeno sa Opštinom Idejno rješenje i projektni zadatak.
- ❑ Opština je započela proceduru privođenja namjeni lokacije buduće sportske dvorane, kako bi se stvorile mogućnosti za pribavljanje UTU-a, ali procedura nije privedena kraju i projekat nije realizovan.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **6.199,90 €** za administrativne troškove i troškove snimanja lokacije.

III.5. Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom

Status projekta:

U toku

- ❑ Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju pomoćnih terena u Opštini Mojkovac i u Opštini Žabljak.
- ❑ Potpisani su ugovori i izabrani izvođači radova.
- ❑ Za narednu godinu je planirano izvođenje radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **10.918,25 €** za izradu projektne dokumentacije.

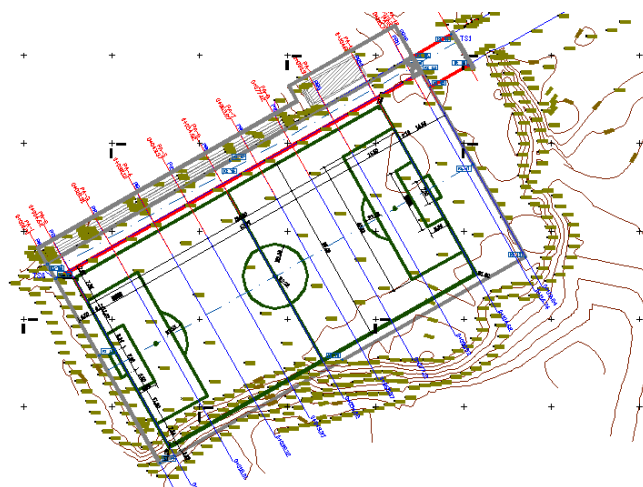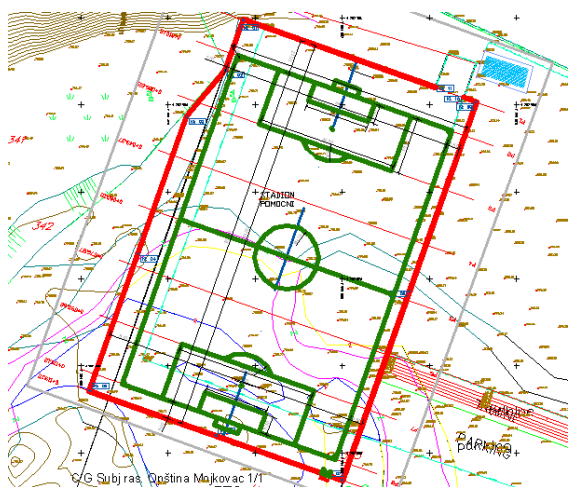

III.6. Stadion na Cetinju

Status projekta:

Završen

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Prijestonica Cetinje.
- ❑ U 2014. godini na osnovu Zaključka Vlade izvršen je transfer u iznosu od **500.000,00 €**, kao učešće Vlade Crne Gore.

III.7. Sportski kompleks u Opštini Kolašin


Status projekta:

Rekonstrukcija Sportske sale i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Doma mladih „Gorštak”, u okviru Sportskog kompleksa u Kolašinu

- ❑ Sportski kompleks se nalazi u širem centru grada Kolašina, u neposrednoj blizini hotela „Bjanka”.
- ❑ U prethodnom periodu su izvođeni radovi na rekonstrukciji Sportske sale, sa ciljem da se obezbijede adekvatni uslovi za njeno korišćenje tokom cijele godine. Takođe je planirano da se rekonstrukcijom i adaptacijom objekta Doma mladih „Gorštak”, smještenog u neposrednoj blizini, poboljša kvalitet pružanja ugostiteljskih usluga u ovom objektu.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **3.308,20 €**.

III.7.1. Rekonstrukcija Sportske sale

Završen

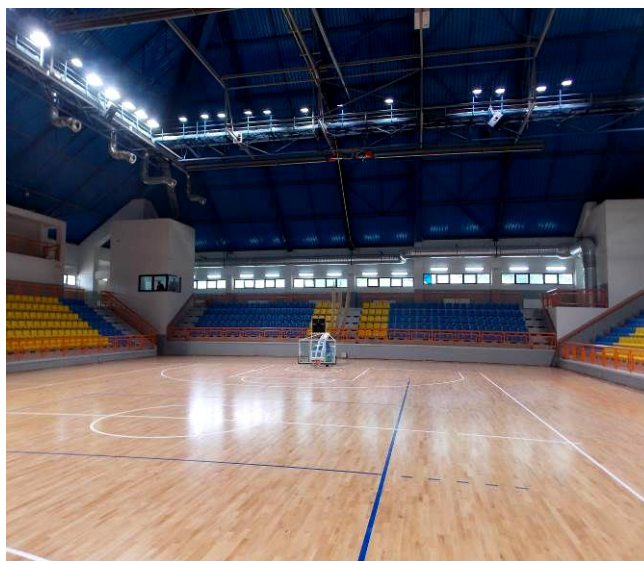

- ❑ Realizacija aktivnosti na rekonstrukciji sportske sale se odvijala fazno.
- ❑ U 2012. godini su završeni radovi na termotehničkim instalacijama započeti u 2011. godini, kao i preostala funkcionalna ispitivanja sistema.
- ❑ U toku 2013. godine je urađen Elaborat procjene potrebnih sredstava za stavljanje objekta Sportske sale u funkciju, a kojim su obuhvaćeni planirani radovi na opremanju sale, zamjeni parketa na borilištu, sanaciji fasade, adaptaciji tribina, svlačionica, prostorija za sudije, kao i ostalih pratećih prostora, završena procedura za izbor izvođača radova. Kako je objekat zbog nagomilanog duga isključen sa elektrodistributivne mreže, radovi su se odvijali usporenom dinamikom.
- ❑ Najveći dio radova na rekonstrukciji objekta je završen u 2013. godini.
- ❑ U 2014. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji ulazne nadstrešnice i ugradnji elektroinstalacija i opreme.

III.7.2. Rekonstrukcija Doma mladih „Gorštak”

Završen

- ❑ U 2012. godini Direkcija javnih radova je izvršila snimanje postojećeg objekta Doma mladih „Gorštak”.
- ❑ U 2013. godini je izabran obrađivač projektne dokumentacije i otpočelo se sa izradom Glavnog projekta.
- ❑ Bruto površina objekta je cca 1.000 m² i posjeduje prizemlje, sprat i potkrovlje.
- ❑ U 2014. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta.



IV. Projekti o uvanja  ivotne sredine

IV.1. Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

Status projekta:

U toku

- ❑ Koordinator projekta izgradnje sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
- ❑ Radovi na izgradnji deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanja se planiraju u narednom periodu, a zavise od stvaranja urbanističkih uslova od strane lokalnih samouprava i operatera regionalnih deponija, kao i mogućnosti obezbjeđenja kreditnih i donatorskih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija.
- ❑ Sva dokumentacija izrađena u prethodnom periodu koristila se u pregovorima oko kreditnih sredstava sa Evropskom investicionom bankom, kao i za razradu operativnog plana za korišćenje pretpristupnih IPA fondova.
- ❑ U 2014. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta u Beranama, kao i Idejnog projekta za kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rožajama, a u toku je revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže za četiri naselja u Ulcinju.
- ❑ U toku su procedure javnih nadmetanja za izradu projektne dokumentacije za više projekata po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **96.805,90 €**.

IV.2. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Šavnik

Status projekta:

U toku

- ❑ Nakon dostavljanja Projektnog zadatka i UTU-a od strane Opštine Šavnik, raspisano je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju kanalizacione mreže i izgradnje PPOV.
- ❑ Procedura javnog nadmetanja je okončana i potpisan je Ugovor krajem 2014. godine.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na izradi dokumentacije.

IV.3. Kanalizaciona mreža i PPOV u Opštini Berane

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže i izgradnje PPOV u Opštini Berane je uvršten u IPA komponentu III. Crna Gora je dobila akreditaciju za sprovođenje decentralizovanog implementacionog sistema krajem aprila 2014. godine, dok je finansijski sporazum potpisan u decembru 2014. godine.

- ❑ Za narednu godinu su planirane aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja, nakon odobrenja od strane Evropske komisije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **29.752,00 €** za završetak izrade Glavnog projekta.

IV.4. Kanalizaciona mreža u Opštini Plav

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u Opštini Plav je prvobitno bio uvršten u IPA komponentu III.
- ❑ S obzirom na stepen izrađenosti projektne dokumentacije, problema vezanih lokaciju i sl., zaključeno je da projekat ne može biti pripremljen na vrijeme kako bi bio finansiran iz IPA sredstava.
- ❑ Krajem 2014. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije i isto je u toku.
- ❑ Za narednu godinu su planirane aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

IV.5. Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Opštini Berane

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ U 2014. godini je planirano da se nakon dostavljanja Projektnog zadatka i UTU-a od strane Opštine Berane i Ministarstva održivog razvoja i turizma pristupi raspisivanju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg obrađivača dokumentacije, ali ove aktivnosti nisu realizovane.
- ❑ Projekat unapređenja sistema vodosnabdijevanja u Beranama je uvršten u IPA komponentu III i u 2015. godini će se nastaviti aktivnosti u okviru Operativnog programa IPA III.

IV.6. Sanacija postojećeg odlagališta čvrstog otpada na lokaciji Vasove Vode u Opštini Berane

Status projekta:

U toku

- ❑ U toku 2014. godine Opština Berane i Ministarstvo održivog razvoja i turizma su izradili Nacrt projektnog zadatka, za čiju provjeru i usklađivanje je zatraženo da Centar za ekotoksikološka ispitivanja izvrši kategorizaciju otpada.
- ❑ Nakon sprovedene procedure pregovaračkog postupka zaključen je ugovor za kategorizaciju otpada, na osnovu čijih rezultata će se izraditi konačna verzija Projektnog zadatka u 2015. godini i raspisati javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg obrađivača.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **2.600,00 €**.

IV.7. Kanalizaciona mreža u Opštini Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ Projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u Opštini Rožaje je prvobitno bio uvršten u IPA komponentu III.
- ❑ S obzirom na stepen izrađenosti projektne dokumentacije, problema vezanih lokaciju i sl., zaključeno je da projekat ne može biti pripremljen na vrijeme kako bi bio finansiran iz IPA sredstava.
- ❑ Krajem 2014. godine je raspisano javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije i isto je u toku.
- ❑ Za narednu godinu planirane su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

IV.8. Izgradnja deponije u Opštini Pljevlja

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ U 2014. godini je planirana izrada Glavnog projekta izgradnje deponije nakon što Opština završi izradu Studije izvodljivosti.
- ❑ Planirano je da se projekat realizuje kroz IPA III komponentu, ali projekat neće biti realizovan, jer prethodno izrađena projektna dokumentacija nije dala dovoljno dobru argumentaciju za neophodnost izgradnje deponije i iskazala je visoke troškove koji utiču na dugoročnu finansijsku održivost projekta.

IV.9. Sanacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Prijestonica Cetinje je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Procon-om pripremila tendersku dokumentaciju za raspisivanje javnog nadmetanja po principu „projektuj i izgradi”.
- ❑ Realizacija projekta je planirana putem kreditnog zaduženja Prijestonice kod međunarodnih finansijskih institucija. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom opredijeljena su za reviziju projektne dokumentacije i angažovanje stručnog nadzora i ove aktivnosti nisu realizovane.
- ❑ Kako Prijestonica nije u mogućnosti da se kreditno zaduži, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je realizaciju projekta uvrstilo u Operativni program IPA III.

IV.10. Izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku

Status projekta:

U toku

- ❑ U maju 2014. godine je potpisan donatorski ugovor između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i CMSR-a, po kome je učešće Republike Slovenije i Crne Gore po 50%, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi CMRS.
- ❑ Sredstva opredijeljena Kapitalnim bužetom za ovaj projekat predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u realizaciji.
- ❑ Završeni su radovi na pripremi i raščišćavanju lokacije, izradi temeljne konstrukcije objekta hale, izradi većeg dijela konstrukcije hale, kao i konstrukciji pratećih objekata.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak realizacije projekta.
- ❑ U 2014. godini, kroz Kapitalni budžet, realizovano je ukupno **488.373,67 €**.
- ❑ Učešće u sufinansiranju Republike Slovenije u 2014. godini iznosi **427.649,05 €**, i ova sredstva su direktno uplaćena izvođaču radova od strane CMSR-a.



IV.11. Mojdež - II faza, Opština Herceg Novi

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini je izrađena projektna dokumentacija i izvršen odabir izvođača radova za sanaciju i rekonstrukciju potkopa tunela Mojdež I faza u dužini od cca 350 m.
- ❑ Radovi su u toku.
- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su radovi na ulaznom portalu, izradi šipova, a započeti su radovi na iskupu novog profila tunela i probijeno je preko 50 m.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova I faze, čime će se stvoriti uslovi za potpun uvid u stanje oštećenja potkopa i izradu projektne dokumentacije za realizaciju radova II faze.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **308.336,81 €**.



V. Izgradnja lokalne infrastrukture

V.1. Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica - Opština Pljevlja

Status projekta:

U toku



- ❑ Radovi na rekonstrukciji infrastrukture u MZ Bukovica u kontinuitetu se izvode od 2008. godine i u dosadašnjem periodu ukupno je izgrađeno: 70 stambenih objekata ukupne površine 3.133,02 m² sa priključenjem istih na elektro i kanalizacionu mrežu; pomoćni objekti površine 1.320,69 m²; 23,1 km sekundarne mreže-prilaznih puteva; sanirano 18,5 km postojećeg asfaltnog puta; asfaltirano 8,5 km novog puta; nasuto i sanirano 51,1 km primarnih lokalnih puteva i sanirano i rekonstruisano 14 km elektrodistributivne mreže.
- ❑ U 2014. godini su nastavljeni i završeni svi ugovoreni radovi na izgradnji 12 individualnih stambenih objekata, započeti u 2013. godini.
- ❑ Takođe, u 2014. godini raspisano je javno nadmetanje i izabran je izvođač radova za izgradnju novih 15 individualnih stambenih objekata.
- ❑ U prethodnom periodu su završeni radovi na ukrovljavanju svih 15 objekata, a gradilišta su konzervirana i nastavak radova je planiran za narednu godinu.
- ❑ U drugoj polovini jula mjeseca 2014. godine, u skladu sa prioritetima Udruženja Bukovičana, raspisano je javno nadmetanje za proboj trase lokalnog puta tzv. „prstena” u dužini od cca 4.5 km. Svi ugovoreni radovi na proboju trase puta su završeni.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak na završetku 15 individualnih stambenih objekata.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **518.695,30 €**.

V.2. Izgradnja cjevovoda za MZ Boan - II faza

Status projekta:

Završen

- ❑ MZ Boan je jedna od najvećih mjesnih zajednica na području opštine Šavnik i shodno tome, u saradnji sa Opštinom, planirana je izgradnja cjevovoda za kvalitetno snabdijevanje vodom u ovoj mjesnoj zajednici.
- ❑ Tokom 2013. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova i sa istim se otpočelo.
- ❑ U 2014. godini nastavilo se sa izvođenjem ugovorenih radova i isti su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **28.427,89 €**.

V.3. Rekonstrukcija gradske tržnice u Opštini Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

- ❑ Glavnim projektom, čiju izradu je finansirala Opština, planirana je rekonstrukcija tržnice.
- ❑ U 2013. godini je raspisano javno nadmetanje i izabran je izvođač radova.
- ❑ U 2014. godini je potpisan ugovor o građenju sa izvođačem radova i otpočelo se sa radovima.
- ❑ U prethodnom periodu su završeni radovi na demontaži postojeće bravarije, rušenju postojećih pregradnih zidova od blok opeke u prizemlju objekta, radovi na zidanju zidova ytong blokovima, radovi na skidanju postojećeg behatona na platou ispred objekta tržnice i postojeće obloge na spratu objekta, radovi montaži i farbanju čelične konstrukcije, razvod vik, elektro i mašinskih instalacija, kao i armirano-betonski radovi na izradi konstrukcije parkinga preko rijeke Lješnice.
- ❑ U toku su radovi na montaži krovnih panela, izradi gips kartonskih zidova i spuštenih plafona, bravarski radovi i keramičarski radovi.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **790.716,42 €**.



V.4. Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Opštini Kolašin

Status projekta:

Završen

- ❑ Projekat izgradnje šetališta pored rijeke Tare, u dužini od oko 1.200 m, realizovala je Opština Kolašin.
- ❑ Učešće Direkcije javnih radova u realizaciji navedenog projekta iznosi **95.000,00 €**.
- ❑ Svi radovi su završeni.



V.5. Unapređenje infrastrukture u zoni nacionalnih parkova u Crnoj Gori

Status projekta:

- ❑ U 2013. godini su sprovedene aktivnosti u zoni nacionalnih parkova, shodno prioritetima koje je definisalo JP „Nacionalni Parkovi Crne Gore”, a koje imaju za cilj unapređenje turističkih kapaciteta i same turističke ponude.
- ❑ U 2014. godini su nastavljene i završene sve aktivnosti započete u prethodnoj godini.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **261.444,96 €**.

Obezbjedenje stabilne električne energije motela „Radovan Luka” u NP Durmitor

Završen



- ❑ U 2014. godini je nastavljeno i završeno obezbjeđenje stabilne električne energije motela „Radovan Luka” u NP Durmitor.

Asfaltiranje 5 km Durmitorskog prstena, NP Durmitor

Završen



- ❑ Završeni su planirani radovi na asfaltiranju Durmitorskog prstena NP Durmitor, u dužini od 5 km.

V.6. Rekonstrukcija zatvorenog bazena u Opštini Kotor

Status projekta:

Završen

- ❑ Planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju zatvorenog bazena „Nikša Bućin” u Kotoru, ukupne kvadrature cca 5.900 m².
- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje, potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije i ista je završena.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **104.303,50 €**.



V.7. Rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na vodovodu „Krkori” u Opštini Andrijevica

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je rekonstrukcija vodozahvata i izgradnja hlorne stanice na vodovodu „Krkori”.
- ❑ Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova na kojem nije bilo pristiglih ponuda.
- ❑ Nakon ponovljenog javnog nadmetanja zaključen je ugovor za izvođenje radova i isti su u toku.
- ❑ Završeni su radovi na izradi bazena hlorinarnice, kao i radovi na izradi konstrukcije objekta hlorinarnice i isti će biti nastavljeni u narednoj godini, kada to dozvole vremenske prilike.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **55.492,68 €**.



V.8. Rekonstrukcija studentskog trga na Cetinju

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Planirano je da se izvedu radovi na realizaciji projekta nakon što Prijestonica Cetinje izradi projektnu dokumentaciju.
- ❑ Kako ista nije izrađena, aktivnosti nisu realizovane.

V.9. Izgradnja seoskog vodovoda u Lovnici, Opština Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirano je da se u 2014. godini izradi projektna dokumentacija, kao i početak radova.

- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje i odabran je obrađivač projektne dokumentacije i završena je izrada Glavnog projekta.
- ❑ Za narednu godinu je planirano izvođenje radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **54.740,00 €** za izradu Glavnog projekta.

V.10. Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Opštini Rožaje

Status projekta:

Završen

- ❑ Projekat rekonstrukcije gradskog vodovoda koordinirala je Opština Rožaje. Opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u realizaciji navedenog projekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **77.599,40 €** kroz transfer sredstava.


V.11. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Status projekta:

- ❑ Realizacija projekta lokalne infrastrukture višestruko je značajna: prije svega modernizacijom i izgradnjom lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica razvija se mreža puteva koja unapređuje kvalitet života građana na način da skraćuje vrijeme potrebno za savladavanje prostorne distance, dodatno olakšava pristup određenim geografskim područjima, posebno ljudima na sjeveru države, omogućava se kvalitetniji, jednostavniji i efikasniji protok ljudi i roba i stvara kvalitetna infrastrukturna baza za razvoj poljoprivrede, šumarstva i drugih privrednih djelatnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **5.491.621,98 €**.

V.11.1. Lokalni putevi

- ❑ Završeni su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u ukupnoj dužini od 42.35 km, sa akcentom na sjever države, gdje je realizovano oko 81,5 % navedenih aktivnosti, kao vid pomoći lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **2.119.351,86 €**.

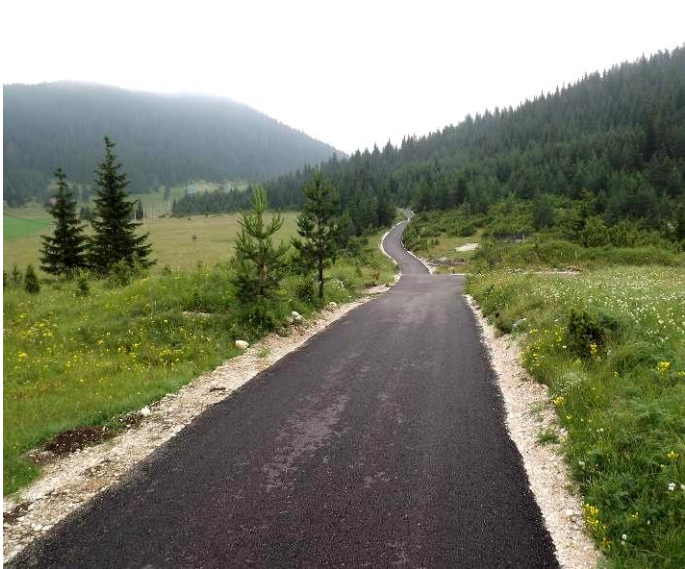

5.11.1.1. Opština Rožaje

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **128.698,64 €**.

5.11.1.2. Opština Andrijevica

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **123.855,20 €**.

5.11.1.3. Opština Berane

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 4,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **208.023,81 €**.

5.11.1.4. Opština Petnjica

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **121.980,95 €**.

5.11.1.5. Opština Mojkovac

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 1,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **70.676,37 €**.

5.11.1.6. Opština Pljevlja

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 3,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **146.104,19 €**.

5.11.1.7. Opština Žabljak

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **95.856,76 €**.

5.11.1.8. Opština Kolašin

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 3,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **142.630,35 €**.

5.11.1.9. Opština Cetinje

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,35 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **99.234,01 €**.

5.11.1.10. Opština Plužine

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **48.552,00 €**.

5.11.1.11. Opština Šavnik

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 4,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **242.661,47 €**.

5.11.1.12. Opština Nikšić

- ❑ Na zahtjev Opštine Nikšić planirana sredstva za modernizaciju 3 km lokalnih puteva su preusmjerena za početak radova na rekonstrukciji Trebješke ulice.

5.11.1.13. Opština Danilovgrad

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 3,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **296.070,54 €**.

5.11.1.14. Opština Ulcinj

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 2,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **92.745,08 €**.

5.11.1.15. Opština Plav

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 3,5 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **159.741,67 €**.

5.11.1.16. Opština Bijelo Polje

Završen

- ❑ Završena je modernizacija lokalnih puteva u dužini od 3,0 km.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **138.183,63 €**.

5.11.1.17. Opština Podgorica

Završen

- ❑ Završena je izrada atmosferske kanalizacije za priključni lokalni put Rogami-Pričelje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **4.337,19 €**.


V.11.2. Gradske saobraćajnice

- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **3.372.270,12 €**.

V.11.2.1. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Rožaje

U toku

- ❑ U skladu sa potpisanim protokolom završeni su radovi na izgradnji donjeg stroja desnog kraka Ulice Rifata Burdžovića IV, u dužini od 1.100 m, dogovoreni u 2013. godini.
- ❑ U 2014. godini je planirana realizacija gradske saobraćajnice „Carine”, gdje je učešće Direkcije javnih radova u iznosu od 250.000 €, od čega 180.000 € u 2014. godini i 70.000 € u 2015. godini.
- ❑ Krajem 2014. godine je izabran izvođač radova i otpočelo se sa radovima.
- ❑ Završeni su svi radovi na polaganju hidrotehničkih instalacija (atmosferska kanalizacija), kao i na polaganju TK i elektro instalacija (javna rasvjeta).
- ❑ Takođe, završeni su radovi na tamponiranju, ugradnji ivičnjaka i ugradnji prvog sloja asfaltnog zastora u dužini od 50 m.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **235.161,67 €**.

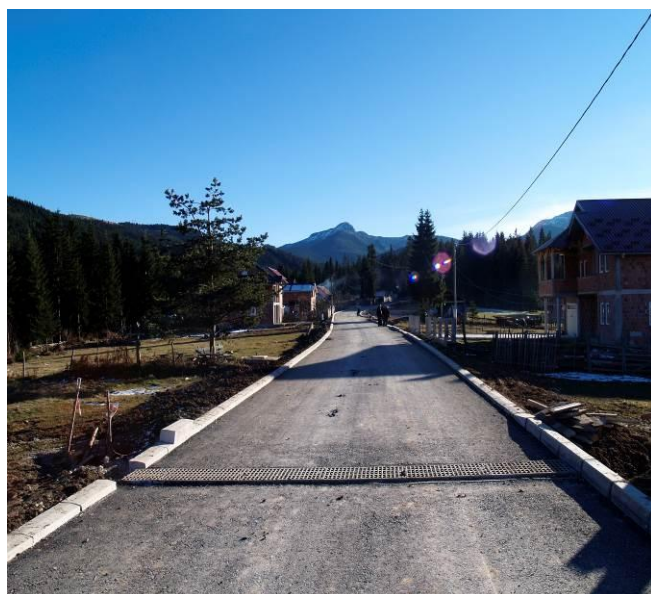

V.11.2.2. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja pješačke staze od Koljena do Kalača u Opštini Rožaje

U toku

- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze od Koljena do Kalača u Opštini Rožaje.
- ❑ U toku je izrada projektne dokumentacije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **12.795,42 €**.

- ❑ U 2014. godini su nastavljene i završene radove na izgradnji gradske saobraćajnice započete u 2013. godini, kao i izrada Idejnog projekta mosta na obilaznici i Glavnog projekta prilaznih saobraćajnica, započetih u 2013. godini.
- ❑ U 2014. godini Opština Berane je dostavila prijedlog Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta u Haremima sa prilaznim saobraćajnicama. Analizom Projektnog zadatka i prostorno planske dokumentacije utvrđeno je da ne postoje urbanističke pretpostavke za izdavanje UTU-a. Neophodno je da Opština sprovede aktivnosti na dopuni planske dokumentacije.
- ❑ Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u Beranama, po prioritetima uprave.
- ❑ Završeni su radovi na rekonstrukciji Ulice 4. Crnogorske, dok su radovi na rekonstrukciji Ulice Terano i paralelne ulice započeti i isti konzervirani zbog loših vremenskih uslova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **109.319,41 €**.



- ❑ U 2013. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije za radove na rekonstrukciji i izgradnji gradskih saobraćajnica u dužini od cca 600 m.
- ❑ U 2014. godini nastavljeni su i završeni radovi započeti u 2013. godini.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **244.100,83 €**.

V.11.2.5. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Kolašin

Završen

- ❑ U 2014. godini, nakon završene procedure javnog nadmetanja i odabira izvođača radova, otpočelo se sa radovima na rekonstrukciji Ulice Palih partizanki.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **298.802,29 €**.



V.11.2.6. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Plav

- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **394.880,58 €**.

V.11.2.6.1. Rekonstrukcija lokalnog puta Plav-Vojno selo-Gusinja, nastavak Jezerske ulice do Vojnog sela

U toku

- ❑ U 2013. godini je, nakon završene procedure javnog nadmetanja, potpisan ugovor sa izvođačem radova.
- ❑ U 2014. godini, nakon što je opština riješila imovinsko-pravne odnose i obezbijedila građevinsku dozvolu, izvođač je uveden u posao.
- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su radovi na proboju trase, izradi nasipa, polaganju hidrotehničkih, TK i elektro instalacija, ugradnji ivičnjaka i betoniranju trotoara u dužini cca 600 m.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.



V.11.2.6.2. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica „Ribarske” i „Kosovske” i rekonstrukcija mosta na rijeci Vruji

U toku

- ❑ U 2014. godini je planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica „Ribarske” i „Kosovske”, kao i početak radova. Takođe, planirana je i izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta na Vruji.
- ❑ Odabrani su obrađivači projektne dokumentacije.
- ❑ Izrada projekata za „Ribarsku” i „Kosovsku” je u toku, a završena je izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Vruji.
- ❑ Izvođenje radova na Ribarskoj ulici je planirano u 2015. godini.

V.11.2.7. Rekonstrukcija glavnog gradskog trga u Opštini Andrijevica

U toku

- ❑ U 2014. godini je Direkcija javnih radova raspisala Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja užeg gradskog jezgra u Opštini Andrijevica. S obzirom na to da nijedan od pristiglih radova nije u potpunosti zadovoljio zahtjeve i smjernice Projektnog zadatka i Konkursne dokumentacije, stručni žiri je dodijelio samo II nagradu.
- ❑ Nakon završene tenderske procedure potpisan je ugovor za realizaciju projekta po principu „projektuj i izgradi” i otpočelo se sa izradom projektne dokumentacije.
- ❑ Za narednu godinu je planiran završetak radova na rekonstrukciji glavnog gradskog trga.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **141.556,45 €** na osnovu ugovorenog avansa.

V.11.2.8. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Bijelo Polje – rekonstrukcija gradskog trga

Nije realizovan

- ❑ U 2014. godini su nastavljeni i završeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji gradskih saobraćajnica, započeti u 2013. godini.
- ❑ Za 2014. godinu je planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog gradskog trga, što je bila obaveza Opštine Bijelo Polje, ali ove aktivnosti nisu realizovane.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **20.499,80 €** za završetak radova započetih u 2013. godini.

V.11.2.9. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Mojkovac

Završen

- ❑ U 2013. godini završeni su radovi I faze na rekonstrukciji Ulice Vojislava Šćepanovića u dužini od 520 m, a u 2014. godini je planirano izmirenje obaveza za izvedene radove.
- ❑ Takođe, u 2014. godini ugovoreni su radovi na nastavku Ulice Vojislava Šćepanovića, dionica prema željezničkoj stanici, i isti su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **210.263,33 €**.



V.11.2.10. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Pljevlja

U toku

- ❑ U 2014. godini su ugovoreni radovi na rekonstrukciji Ulice Boška Buhe u dužini cca 200 m.
- ❑ Svi radovi su završeni.
- ❑ Takođe, krajem godine ugovoreni su radovi na rekonstrukciji Ulice Vuka Kneževića, koja predstavlja nastavak Ulice Boška Buhe.
- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su radovi na postavljanju hidrotehničkih instalacija (atmosfera, fekalna kanalizacija i vodovod), kao i instalacije TK i elektro (javna rasvjeta).
- ❑ Takođe, završena je ugradnja ivičnjaka. Preostali su radovi na postavljanju asfaltnog zastora.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **298.990,61 €**.



V.11.2.11. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Danilovgrad

U toku

- ❑ U 2013. godini je raspisano javno nadmetanje i izabran je obrađivač projektne dokumentacije za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije puta: pružni prelaz Sekulići-Gorica u dužini od 850 m.
- ❑ Završena je izrada i revizija projekta.
- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje i odabran je izvođač radova za rekonstrukciju puta Pružni prelaz- Sekulići- Gorica u dužini od 850 m.
- ❑ Do kraja 2014. godine završeni su svi radovi na iskopima, izradi nasipa, postavljanju hidrotehničkih instalacija (atmosferska, kanalizacija i vodovod) i elektro i TK instalacija. Takođe, završeni su obložni potporni betonski zidovi, a na jednom dijelu trase je ugrađen jedan sloj asfaltnog zastora.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak preostalih radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **339.837,78 €**.



V.11.2.12. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Opštini Cetinje

Završen

- ❑ U 2013. godini je raspisano javno nadmetanje i izabran je najpovoljniji izvođač radova na rekonstrukciji Čermakove ulice u dužini od cca 275 m i radovi su otpočeli.
- ❑ U 2014. godini nastavljeni su i završeni svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji Čermakove ulice.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **89.429,14 €**.



V.11.2.13. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Nikšić

U toku



- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **634.977,78 €**.

Bulevar 13. jul

- ❑ U 2014. godini je završeno javno nadmetanje za odabir izvođača radova za rekonstrukciju Ulice 13. jul na potezu od Malog mosta prema Carevom mostu, uključujući pružni prelaz u dužini od cca 530 m.
- ❑ Radovi su otpočeli i isti završeni u ugovorenom roku.

Rekonstrukcija Trebješke ulice

- ❑ Na zahtjev Opštine, planirana sredstva za modernizaciju 3 km lokalnih puteva su preusmjerena za početak radova na rekonstrukciji Trebješke ulice.
- ❑ U 2014. godini je završeno javno nadmetanje za odabir izvođača radova za rekonstrukciju Trebješke ulice.
- ❑ Nakon pribavljanja građevinske dozvole otpočelo se sa radovima.
- ❑ Krajem godine radovi su otpočeli i isti su obustavljeni zbog loših vremenskih uslova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.



V.11.2.14. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj

Završen



- ❑ Krajem 2014. godine su ugovoreni radovi na rekonstrukciji i sanaciji gradskih saobraćajnica u Ulcinju, u skladu sa prioritetima Opštine Ulcinj, kada se i započelo sa radovima.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **74.145,51 €**.

V.11.2.15. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Opštini Podgorica

U toku

- ❑ U 2014. godini je završena izrada projektne dokumentacije za Velji put u Golubovcima.
- ❑ U toku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnog puta Pričelje-Brestica.
- ❑ Nakon što je Gradska Opština Golubovci dostavila Projektni zadatak i UTU-e početkom oktobra mjeseca 2014. godine, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice od kružnog toka u Mojanovićima do kružnog toka u Goričanima i isto je u toku.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **16.310,02 €**.

V.11.2.16. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Opštini Mojkovac

U toku

- ❑ Na osnovu ponovnog javnog nadmetanja za izradu projekta rekonstrukcije Ulice Nemanjića, odabran je obrađivač projektne dokumentacije i potpisan je ugovor.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **4.792,30 €**.

V.11.2.17. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Opštini Budva

U toku

- ❑ Nakon što je Opština Budva dostavila Projektni zadatak i UTU-e sredinom oktobra mjeseca 2014. godine, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije za izradu projekta rekonstrukcije Ulice Topliš i isto je u toku.

V.11.2.18. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Sutomoru u Opštini Bar

Završen

- ❑ U 2014. godini je raspisano i završeno nadmetanje i odabran je izvođač radova za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Sutomoru u Opštini Bar.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **246.407,19 €**.



VI. Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva

VI.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi u Opštini Podgorica

Status projekta:

U toku

- ❑ Izgradnja Nacionalnog centra za transfuziju krvi je planiran u krugu Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.
- ❑ Bruto površina objekta iznosiće cca 3.000 m² i spratnosti je: suteran, prizemlje i četiri sprata.
- ❑ Planirano je da objekat u funkcionalnom smislu obuhvati tri cjeline namijenjene: davaocima krvi, pacijentima KC i zaposlenima. U objektu su planirani sljedeći sadržaji: laboratorije, ambulate, ljekarske sobe, administrativni blok sa multifunkcionalnom salom, korisničke prostorije za pripreme mobilnih ekipa i ostale prateće i tehničke prostorije.
- ❑ Nakon odabira Izvođača, u aprilu 2013. godine otpočelo se sa radovima na izgradnji objekta.
- ❑ U toku su radovi na uređenju terena i finoj montaži instalacija.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.720.978,10 €**.



VI.2. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra sa Urgentnim centrom u Opštini Berane

Status projekta:

U toku



- ❑ Projektom dokumentacijom je predviđena dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta krila „B” za potrebe Doma zdravlja i Opšte bolnice u Beranama, lociranog u okviru DUP-a „Medicinski centar”.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta, sa novoprojektovanom prizemnom toplom vezom sa postojećim objektom Opšte Bolnice, iznosi cca 3.113 m².
- ❑ Dio objekta koji pripada Domu zdravlja sadrži prizemlje i tri sprata, i korisne je površine cca 1.115 m². U ovom dijelu je planiran smještaj Centra za djecu sa posebnim potrebama, Centra za mentalno zdravlje, Centra za prevenciju, Službe za fizikalnu terapiju, mikrobiologiju i parazitologiju, kao i higijensko epidemiološke službe sa pratećim prostorijama (arhive, magacini, komunikacije, sanitarne prostorije, garderobe, tehničke prostorije).
- ❑ Drugi dio objekta sadrži prizemlje i dva sprata i korisne je površine cca 1.290 m². Ovaj dio objekta pripada Opštoj bolnici i ovdje je predviđen smještaj ambulanti (hirurška, ortopedska, pedijatrijska, ORL, neurološka i ginekološka), apoteke i prostorija za administraciju sa salom za sastanke i pratećim sadržajima.
- ❑ U 2013. godini je, nakon sprovedene procedure postupka javnog nadmetanja, odabran Izvođač radova i otpočelo se sa radovima.

- ❑ U prethodnom periodu su završeni: grubi građevinski i građevinsko-zanatski radovi, izrada krovne konstrukcije sa podaščavanjem, letvisanjem, hidroizolacijom i pokrivanjem krova, izrada cementnih košuljica, izrada pregradnih gipsanih kartonskih zidova, ugradnja zidne i podne keramike, ugradnja spuštjenih plafona, izrada fasade, ugradnja fasadne bravarije i molersko farbarski radovi. Takođe, na objektu je završen grubi razvod instalacija, montaža sanitarija u mokrim čvorovima, izrada sprinkler instalacija.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak preostalih radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.496.962,61 €**.

VI.3. Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu

Status projekta:

Završen

- ❑ Shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 06-164/4 od 16. februara 2012. godine, prihvaćen je Sporazum o realizaciji programa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu.
- ❑ Protokolom br. 19/2-01-3401/1 od 12.02.2013. godine, zaključenim između Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Direkcije javnih radova, definisano je da sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2014. godinu Direkcija javnih radova transferiše Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **350.000,00 €**.

VI.4. Izgradnja objekta Klinike za neurologiju i neurohirurgiju u okviru DUP-a KBC u Opštini Podgorica

Status projekta:

U toku

- ❑ Objekat čija se izgradnja planira, lociran je u okviru Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.
- ❑ Planirana bruto površina objekata iznosi oko 5.000 m², spratnosti: suteran, prizemlje i dva sprata.
- ❑ U objektu su planirani sadržaji u skladu sa potrebnim i savremenim standardima za ovu vrstu djelatnosti: operacioni blok, dnevna bolnica, ambulate, sala za fizikalnu terapiju, laboratorije, apoteka, bolničke sobe, odjeljenje za intenzivnu njegu, administrativni blok, multimedijalna sala, kao i prateće tehničke i pomoćne prostorije.
- ❑ U septembru 2014. godine KBC je dostavio Projektni zadatak, nakon čega je raspisano javno nadmetanje i isto je u toku.

VII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

VII.1. Izgradnja izbjegličkog kampa na Koniku – Sarajevski proces/Beogradska inicijativa

Status projekta:

VII.1.1. Trajno rješavanje stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa na Koniku u Opštini Podgorica **Završen**

- ❑ U cilju trajnog rješavanja stambenih potreba interno raseljenih lica i stanovnika kampa na Koniku u Podgorici, Direkcija javnih radova je izradila Glavni projekat stambenih jedinica i višenamjenskog objekta .
- ❑ Na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i projektnog zadatka definisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, a koji je usaglašen sa predstavnicima Delegacije Evropske unije, projektovano je 99 stambenih jedinica ukupne bruto površine cca 6.400 m² i višenamjenski objekat ukupne bruto površine cca 2.000 m², sa sadržajima za potrebe zdravstva, prosvjete i administracije.
- ❑ U 2012. godini završena je procedura javnog nadmetanja i odabran je projektant.
- ❑ U 2013. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta stambenih jedinica i Višenamjenskog objekta.
- ❑ Početkom juna 2014. godine pribavljene su građevinske dozvole za stambene objekte od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.
- ❑ Izgradnju navedenih objekata realizovaće Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

VII.1.2. Srednjoročno rješavanje stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa na Koniku u Opštini Podgorica **Završen**



- ❑ Shodno zaključku Vlade Crne Gore iz septembra 2012. godine, izvođeni su radovi na pripremi terena za postavljanje kontejnera, kao srednjoročno rješenje, za smještaj porodica čije su stambene jedinice izgorjele u požaru tokom ljetnjih mjeseci.
- ❑ U 2012. godini izvedena je većina radova na izradi pristupnih betonskih staza i betonskih platoa na kojima su smješteni kontejneri, kao i radova na izradi eletrotehničkih i hidrotehničkih instalacija.
- ❑ Svi ugovoreni radovi završeni su početkom 2013. godine.
- ❑ U 2013. godini raspisano je javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izradi platoa i prateće infrastrukture za postavljanje stotinu novih kontejnera.
- ❑ U 2014. godini nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta i iste su završene.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **335.312,96 €**, od čega je Opštini Nikšić, u skladu sa Zaključkom Vlade, prenešeno **225.000,00 €**.

VII.2. Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ Planirana je izgradnja objekta Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Opštini Rožaje bruto površine 375 m², spratnosti prizemlje i potkrovlje.
- ❑ U prizemlju objekta su planirane prostorije za boravak djece (soba za dnevne aktivnosti, soba za kineziterapiju, senzorna soba, sanitarni čvorovi), trpezarija sa kuhinjom i kuhinjskom ostavom, kotlarnica i vešeraj, kao i kancelarija za koordinatora Dnevnog centra, koja je direktno povezana sa dnevnim sadržajima radi što boljeg nadzora. U potkrovlju objekta su planirane prostorije za administraciju (zajednička prostorija za rad osoblja, prostorija za logopeda, defektologa, pedagoga i psihologa), dvije kancelarije i sanitarni čvorovi.
- ❑ U 2013. godini je potpisan ugovor sa Izvođačem radova i sa radovima će se otpočeti nakon što Opština Rožaje završi aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole.
- ❑ U 2014. godini su nastavljene aktivnosti na kompletiranju projektne dokumentacije, odnosno pribavljanju građevinske dozvole, što je obaveza Opštine Rožaje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.547,00 €** za administrativne troškove.

VII.3. Dnevni centar za djecu i mlade „Ljubović” u Opštini Podgorica

Status projekta:

Završen

- ❑ Sredstva su se odnosila na plaćanje naknade za opremanje građevinskog zemljišta.
- ❑ Za narednu godinu je planirano plaćanje preostale naknade za opremanje građevinskog zemljišta, shodno ugovoru.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **11.118,15 €**.

VIII. Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja

VIII.1. Izgradnja dječijeg vrtića i jaslica u Ulici Lenke Jurišević u Opštini Bijelo Polje

Status projekta:

Završen



- ❑ Bruto površina objekta iznosi cca 1.300 m², a spratnosti je podrum, prizemlje i sprat. Objekat je predviđen za boravak 210-oro djece.
- ❑ U objektu su projektovani sljedeći sadržaji: u podrumu objekta je smještena kotlarnica sa pratećim prostorijama; na prizemnoj etaži planirana su tri dnevna boravka za djecu uzrasta 3-5 godina, centralni hodnik sa garderoberima ispred radnih soba, višenamjenski prostor (predstave, izložbe, igra djece u zimskom periodu), trpezarija, kuhinja, trijaža, pomoćne i tehničke prostorije; na spratu objekta je predviđeno pet dnevnih boravaka, od kojih tri za djecu od dvije do tri godine i dvije za djecu do dvije godine, centralni hodnik sa garderoberima ispred radnih soba, biblioteka sa didaktikom, prostorija za vaspitačice i administrativni dio, koji čine tri kancelarije, sanitarne i pomoćne prostorije.
- ❑ U 2013. godini je, nakon ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja, potpisan ugovor o građenju sa Izvođačem radova i otpočelo se sa radovima.
- ❑ Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **686.637,31 €**.



VIII.2. Izgradnja Akademija umjetnosti na Cetinju

Status projekta:

U toku

- ❑ Izgradnja Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti je planirana na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod”, uz zonu Istorijskog jezgra Cetinja.
- ❑ Predmetna lokacija zahvata površinu od 3.15 ha.
- ❑ Na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja iz oktobra 2008. godine, koje je i implementirano u plansku dokumentaciju, Direkcija javnih radova je marta 2010. godine ugovorila izradu Idejnog i Glavnog projekta.
- ❑ U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekti zajedničkih sadržaja.
- ❑ Bruto površina kompleksa iznosi cca 21.870m².
- ❑ Realizacija ovog projekta se odvija fazno.
- ❑ Radovi I faze obuhvataju izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetskim blokom, ukupne bruto površine 4.980 m².
- ❑ Objekat podzemne garaže i objekat zajedničkih kulturnih sadržaja su locirani u centralnom dijelu kompleksa i predstavljaju jedinstvenu konstruktivnu cjelinu.
- ❑ Podzemna garaža je bruto površine cca 3.970 m², kapaciteta 126 parking mjesta. Pored osnovne funkcije, u sklopu garaže je predviđen i energetski blok sa tehničkim prostorima.
- ❑ Objekat zajedničkih sadržaja je bruto površine cca 1.010 m² sa sljedećim sadržajima: izložbeni i multimedijalni prostori, knjižara, lokali za iznajmljivanje, kao i administrativni blok sa pratećim sadržajima.
- ❑ Radovi II faze predviđaju, u skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, izgradnju objekta Fakulteta likovnih umjetnosti.


- ❑ Radovi III faze predviđaju izgradnju objekata Fakulteta dramskih umjetnosti i Muzičke akademije, dok je kroz IV fazu planirana izgradnja objekta za Apartmanski smještaj.
- ❑ Tokom 2011. godine je završena izrada Idejnog projekta kompleksa i Glavnog projekta dijela kompleksa - I faze, a sa radovima se otpočelo u 2012. godini.
- ❑ U prethodnom periodu su završeni radovi na izgradnji objekta zajedničkih sadržaja.
- ❑ Takođe, krajem 2014. godine je raspisano javno nadmetanje za odabir izvođača radova na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka u kompleksu.
- ❑ Početkom 2015. godine je planiran završetak radova na priključivanju objekta na elektroenergetsku infrastrukturu.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.380.146,96 €**.

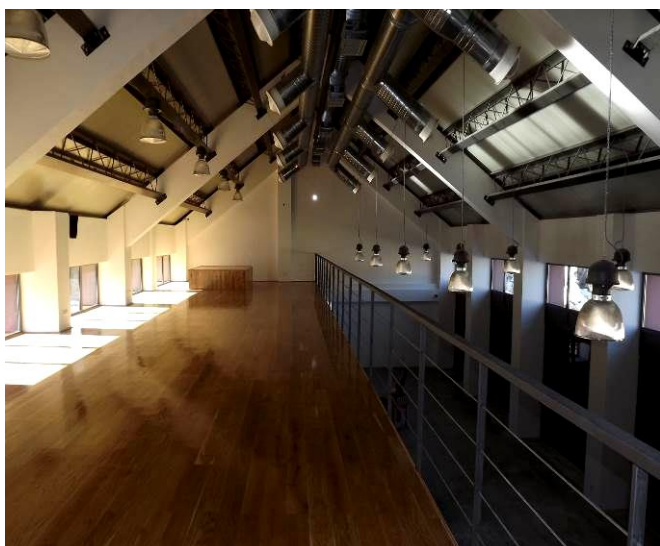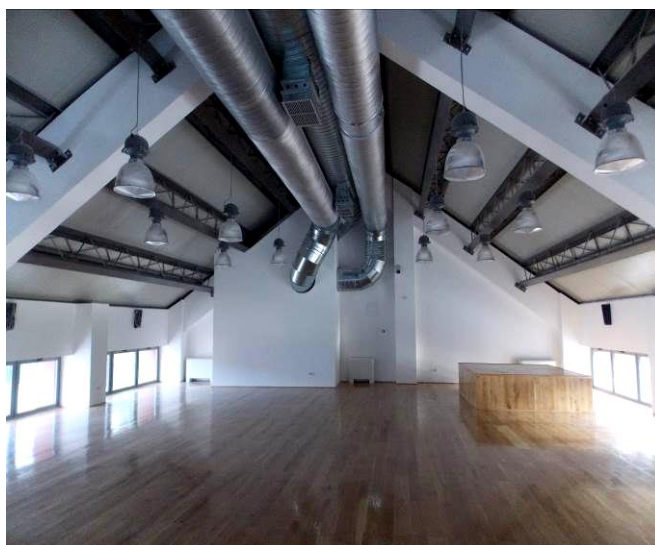

VIII.3. Nadogradnja objekta Osnovne škole „Mrkojevići” u Opštini Bar

Status projekta:

Završen

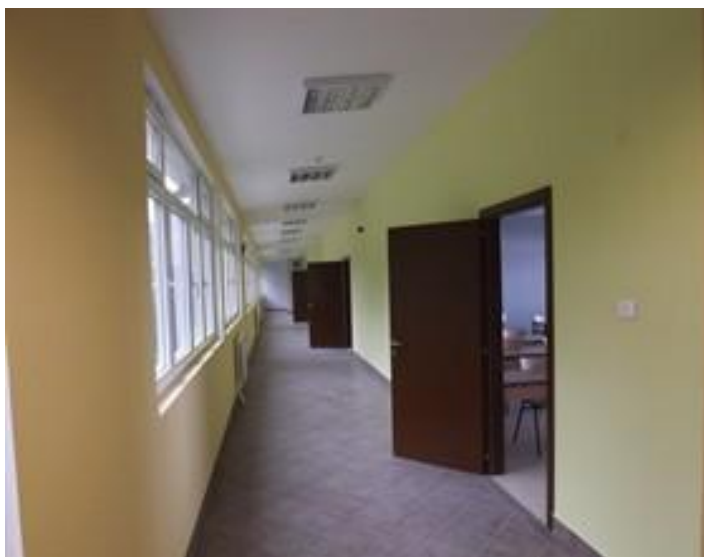

- ❑ Nadogradnja objekta OŠ „Mrkojevići” u Baru je planirana usljed nedostatka prostora za kvalitetno odvijanje nastave.
- ❑ Projektom je bila predviđena nadogradnja prizemne lamele, pri čemu su dobijeni sljedeći sadržaji: tri učionice, kancelarija direktora i komunikacije. Takođe, planirana je dogradnja i nadogradnja aneksa sa sanitarnim prostorijama.
- ❑ Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **163.721,84 €**.

VIII.4. Izgradnja objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Opštini Podgorica

Status projekta:

U toku



- ❑ Početkom 2012. godine Direkcija javnih radova je na osnovu inoviranih zahtjeva Univerziteta Crne Gore, Ministarstva prosvjete i sporta i Studentskog parlamenta UCG, u smislu prostornih kapaciteta i sadržaja, izradila Idejno arhitektonsko rješenje objekta Sportske dvorane Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
- ❑ Lokacija Sportske dvorane se nalazi u okviru kompleksa „Univerzitetskog centra”.
- ❑ Ukupna bruto površina objekta iznosi cca 3.290 m². Projektom je predviđeno da objekat sadrži prizemlje i sprat sa pratećim sadržajima i multimedijalnim centrom.
- ❑ Višenamjenska dvorana je namijenjena odigravanju svih vrsta malih sportova, a projektna rješenja omogućavaju organizaciju koncertnih i raznih kulturnih dešavanja.
- ❑ Maksimalni kapacitet dvorane je 805 mjesta za sjedenje, kada su uz fiksne betonske tribine postavljene i „teleskopske tribine”.
- ❑ Objekat sadrži: garderobe za sportiste i sudije, teretanu, administrativni prostor, ambulantu, multimedijalni centar kapaciteta 250 mjesta, kao i tehničke i pomoćne prostorije.
- ❑ U 2013. godini izabran je Izvođač radova i u oktobru se otpočelo sa izgradnjom objekta.
- ❑ U prethodnom periodu su završene aktivnosti na raščišćavanju lokacije, izmještanju instalacija vodovoda i atmosferske kanalizacije i izmještanju trase toplovoda sa predmetne parcele. Na izgradnji objekta su završeni radovi na izradi armiranobetonske konstrukcije objekta i izradi čelične krovne konstrukcije i krovnog pokrivača.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na izgradnji objekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **1.341.460,67 €**.

VIII.5. Izgradnja objekta Studentskog doma u Opštini Nikšić

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Novi objekat Studentskog doma sa objektom zajedničkih sadržaja se nalazi u sklopu DUP-a „Studentsko-fakultetskog centra” u Nikšiću. Planirana bruto površina objekata iznosi cca 7.000 m².
- ❑ Planirano je da objekat Studentskog doma sadrži suteran, visoko prizemlje i pet spratova, dok je spratnost objekta zajedničkih sadržaja suteran i visoko prizemlje.
- ❑ Planirani kapacitet objekta je 360 mjesta i zajedno sa postojećim, rekonstruisanim domom i anexom zajedničkih sadržaja, formiraće jednu funkcionalnu cjelinu za smještaj i boravak studenata i učenika. Novi objekat Studentskog doma pozicioniran je paralelno u odnosu na postojeći objekat Doma, čiji je kapacitet 250 mjesta.
- ❑ U objektu zajedničkih sadržaja planirani su: ulazni hol sa recepcijom, trpezarija kapaciteta oko 200 mjesta, kuhinja, čitaonica, teretana, administrativni prostor, kao i tehničke i pomoćne prostorije.
- ❑ Realizacija projekta je planirana po principu javno-privatnog partnerstva, raspisano je javno nadmetanje tokom 2012. godine. Nakon neuspjelih pregovora sa potencijalnim ponuđačem javni poziv je poništen.
- ❑ U 2014. godini, dva puta je raspisivano javno nadmetanje po principu „privatno-javno partnerstvo”, na kojima nije bilo zainteresovanih ponuđača.

VIII.6. Osnovna škola „Bać” u Opštini Rožaje

Status projekta:

Završen



- ❑ Planirana je dogradnja Aneksa na postojećem objektu školske zgrade OŠ „Bać” u opštini Rožaje. U dograđenom dijelu objekta su planirani sljedeći sadržaji: 4 učionice, 2 kancelarije, fiskulturna sala sa garderobama i prostorijom za rekvizite, sanitarni blokovi, prateći sadržaji i komunikacije. Ukupna bruto površina dograđenog dijela objekta iznosiće 865 m².
- ❑ Potpisan je protokol između Opštine Rožaje i Direkcije javnih radova o preuzetim obavezama na realizaciji ovog projekta.
- ❑ Realizaciju projekta sprovodila je Opština Rožaje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **147.924,54 €**.

VIII.7. Dječiji vrtići u Opštinama Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja

Status projekta:



- ❑ Vlada Crne Gore, u ime Ministarstva prosvjete i sporta i posredstvom Ministarstva finansija, obratila se Razvojnoj banci Savjeta Evrope (CEB) sa zahtjevom za dodjelu kreditnih sredstava za djelimično finansiranje infrastrukture u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
- ❑ Sredinom juna mjeseca 2013. godine Administrativni odbor Razvojne banke Savjeta Evrope je odobrio kreditnu liniju u iznosu od 10 miliona eura, na osnovu čega je potpisan ugovor o uslovima i načinu korišćenja kreditnih sredstava.

- ❑ Iz sredstava kredita je planirana izgradnja 7 novih vrtića, i to: 4 u Podgorici i po jedan vrtić u Baru, Ulcinju i Pljevljima. U 2014. godini su započete aktivnosti na realizaciji tri vrtića.
- ❑ Tokom realizacije projekta je planirano da Direkcija javnih radova bude jedinica za implementaciju projekta, Ministarstvo prosvjete u ulozi Agencije za implemetaciju projekta, a Ministarstvo finansija budući korisnik kredita.

VIII.7.1. Dječiji vrtić u Zagoriču, Opština Podgorica

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića u Zagoriču u Podgorici je planiran u Ulici Velimira Stojanovića, na urbanističkoj parceli broj UP 568, u zahvatu DUP-a „Zagorič 1” - izmjene i dopune u Podgorici.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 1.400 m², za smještaj 200 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: 5 radnih soba za jaslene grupe, 6 radnih soba za grupe vrtića, 3 kancelarije, čajnu kuhinju, prostorije za trijažu i ostale prateće prostorije.
- ❑ U ovoj godini je potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije i Idejno rješenje je poslato CEB-u na saglasnost.
- ❑ Planirani rok za završetak izrade projektne dokumentacije je do kraja marta 2015. godine, nakon čega će se raspisati tender za izvođače radova.

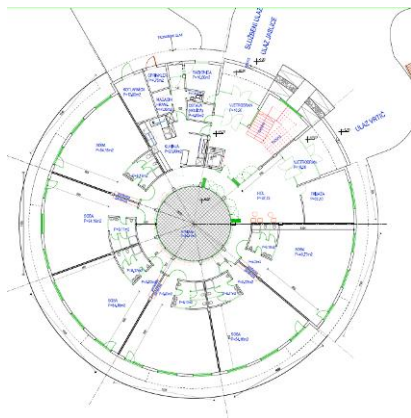


VIII.7.2. Dječiji vrtić na Starom Aerodromu, Opština Podgorica

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića na Starom Aerodromu u Podgorici planiran je preko puta Doma zdravlja, na uglu Cvijetne ulice i Ulice Mirka Banjevića, na urbanističkoj parceli broj UP 2090/975, u zahvatu DUP-a „Konik – Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 3.000 m², za smještaj 375 djece.


- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: 8 radnih soba za jaslene grupe, 12 radnih soba za grupe vrtića, 8 kancelarija, fiskulturna sala, biblioteka, prostorije za trijažu, prostorije za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ostale prateće prostorije.
- ❑ Takođe, u objektu je planirana Centralna kuhinja, po HACCP standardima, kapaciteta dovoljnog za proizvodnju hrane za 3000 djece (tri obroka dnevno) i koja će zadovoljiti potrebe na nivou Javne ustanove „Đina Vrbica“, kao i vešeraj za potrebe 3000 djece, sa svim pratećim sadržajima.
- ❑ U ovoj godini je potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije i Idejno rješenje je poslato CEB-u na saglasnost.
- ❑ Planirani rok za završetak izrade projektne dokumentacije je do kraja marta 2015. godine, nakon čega će se raspisati tender za izvođače radova.

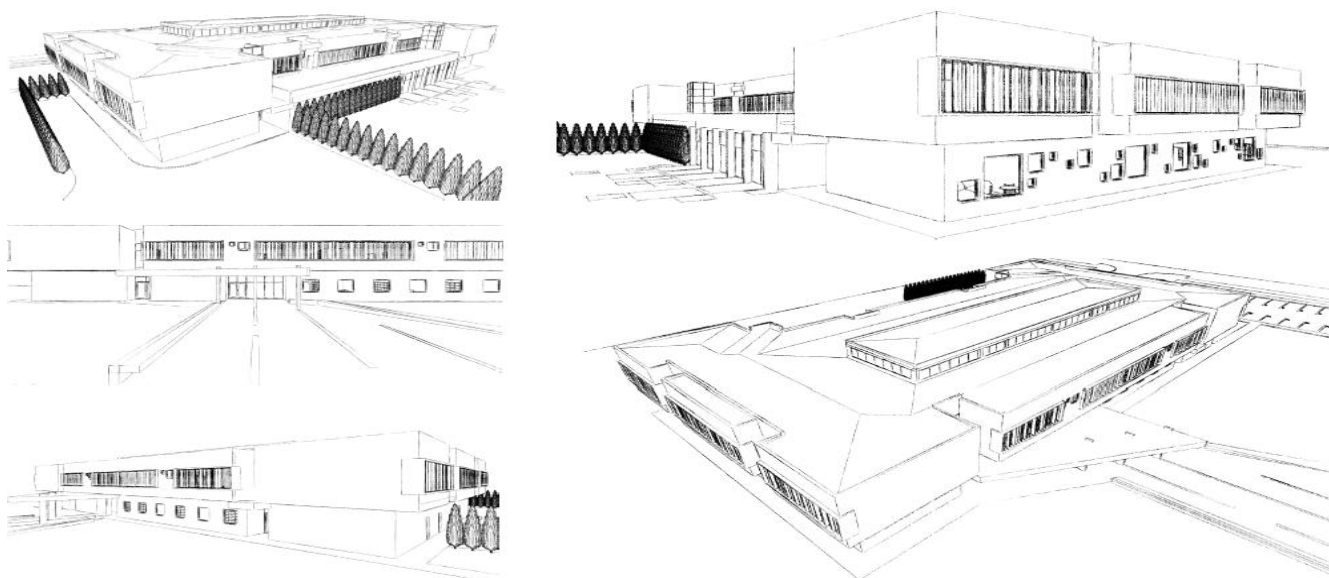

VIII.7.3. Dječiji vrtić u Baru

U toku

- ❑ Budući objekat vrtića u Baru je planiran u neposrednoj blizini osnovne škole u Baru, na urbanističkoj parceli broj 4 u zoni „G“, po DUP-u „Topolica I“ - izmjene i dopune u Baru.
- ❑ Objekat vrtića će sadržati prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 2.956,20 m², za smještaj 370 djece.
- ❑ U objektu su planirani sljedeći sadržaji: 6 radnih soba za jaslene grupe, 8 radnih soba za grupe vrtića, 4 kancelarije, sala za zajedničke aktivnosti, biblioteka, kuhinja sa svim pratećim prostorijama za cca 600 obroka, prostorije za trijažu i ostale tehničke prostorije.
- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova koje je poništeno.
- ❑ U toku su pripreme aktivnosti za raspisivanje novog tendera.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak radova.

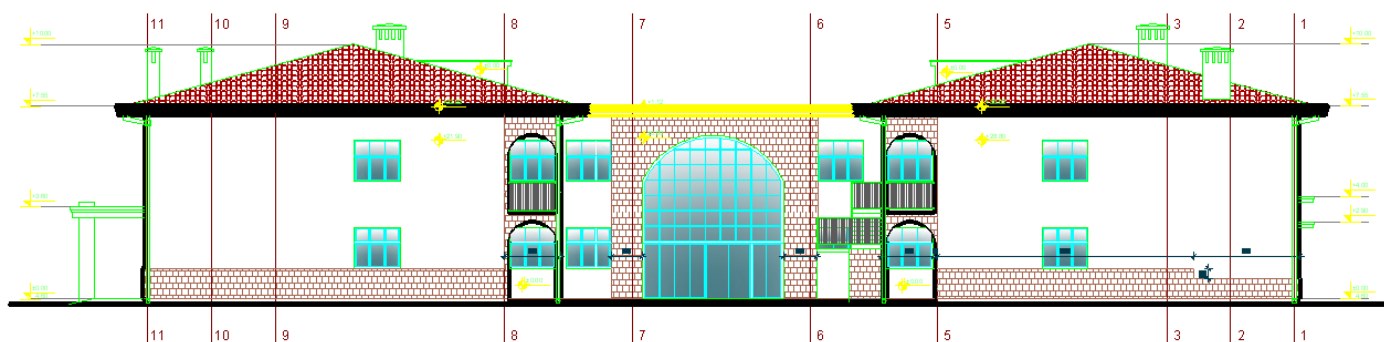

III.8. Izrada projektne dokumentacije za Srednju stručnu školu u Golubovcima

Status projekta:

Završen



- ❑ U 2013. godini, nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pribavljeni su Urbanističko-tehnički uslovi i raspisano javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Planirani objekat, ukupne bruto površine oko 5.480 m², sastoji se iz prizemlja i sprata i predviđen je za boravak 750 učenika sa radom u dvije smjene. U objektu su predviđene nastavne prostorije, prostorije za upravu, nastavnike i ostalo osoblje, kao i fiskulturna sala sa kapacitetom tribina do 500 gledalaca.
- ❑ U 2014. godini odabran je obrađivač projektne dokumentacije.
- ❑ Završena je izrada Glavnog projekta i revizija istog.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **57.850,00 €**.

VIII.9. Izrada projektne dokumentacije za školsko-gradsku halu u Gusinju

Status projekta:

Završen

- ❑ Planirana bruto površina objekta je cca 2.100 m² i namijenjena je odvijanju nastave fizičkog vaspitanja Osnovne škole i za potrebe rekreacije građana u vannastavnom terminu.
- ❑ U 2013. godini Direkcija javnih radova je izradila Idejno rješenje i Projektni zadatak, nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor obrađivača Glavnog projekta.
- ❑ U 2014. godini završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **52.996,00 €**.



VIII.10. Izgradnja inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis” u Opštini Nikšić

Status projekta:

U toku



- ❑ Strateškim planom za uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka koji je usvojen na sjednici Vlade u decembru 2012. godine, predviđen je internacionalni princip izgradnje tehnoparkova u Crnoj Gori.
- ❑ Ministarstvo nauke u saradnji sa stručnim timom Direkcije javnih radova raspisalo je javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije rekonstrukcije bivšeg Doma vojske u Nikšiću za potrebe „Tehnopolisa”. Nakon dva neuspjela tendera, u ovoj godini izabran je obrađivač projektne dokumentacije.
- ❑ Objekat je spratnosti suteran, prijemlje i sprat, ukupne planirane površine 1.925 m², sa sljedećim sadržajima: administrativni prostor sa salom za sastanke, multifunkcionalna sala, laboratorijske prostorije, prostor za DATA centar, kafe bar i ostale pomoćne i tehničke prostorije.
- ❑ U 2014. godini je završena izrada i revizija Glavnog projekta i raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **4.940,00 €** za administrativne troškove.

VIII.11. Vrtić u Opštini Tivat

Status projekta:

Nije realizovan


- ❑ Sredstva opredijeljena za ovaj projekat su obezbijedena za opremanje objekta.
- ❑ Kako je Opština Tivat u međuvremenu završila aktivnosti na opremanju objekta, navedena sredstva nisu aktivirana i realizovana.

VIII.12. Univerzitetski centar u Beranama

Status projekta:

Završen

- ❑ Rekonstrukcijom dijela Doma zdravlja u Studentski dom, za potrebe Univerzitetskog centra, izgrađen je objekat bruto površine cca 5.370m², odnosno korisne površine od 4.600 m², spratnosti: nisko prizemlje, prizemlje i dva sprata.
- ❑ Ukupan broj soba iznosi 134 predviđenih za smještaj 202 studenata, od čega je 20 ležaja za studente sa posebnim potrebama. Površine soba su od 6.5 m² do 20 m², koje su planirane kao jednokrevetne i dvokrevetne. Uz dvije studentske sobe je planiran po jedan sanitarni čvor sa predprostorom.
- ❑ Projektom rekonstrukcije u objektu su izgrađeni sljedeći sadržaji: prostorije stručne službe, čitaonica, kabineti, višenamjenske sale, učionice za praktičnu nastavu, holovi sa recepcijom, trpezarija, kuhinja i preostali prateći sadržaji.
- ❑ Tokom 2013. godine je raspisano javno nadmetanje za opremanje objekta i nakon završene procedure žalbenog postupka potpisan je Ugovor u septembru 2014. godine.
- ❑ Završne su aktivnosti na isporuci i montaži namještaja i opreme u objektu.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **260.329,40 €**.

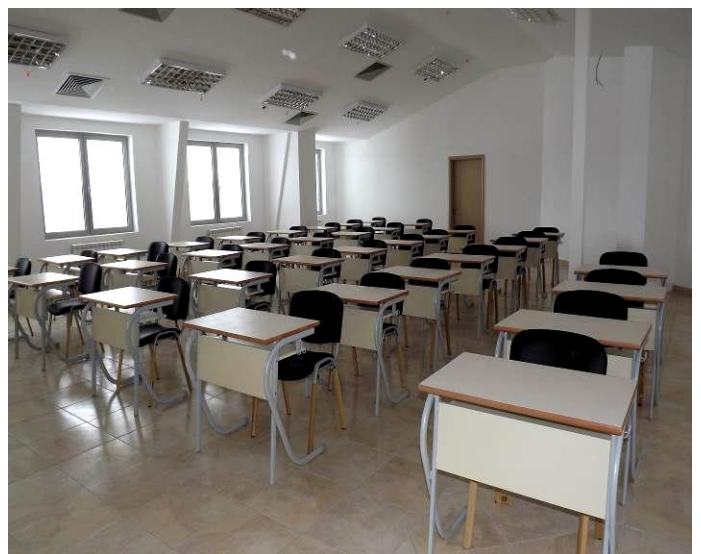

IX. Granični prelazi

IX.1. Granični prelaz Božaj

Status projekta:

U toku

- ❑ Aktivnosti na realizaciji projekta je koordinirao MUP CG, u saradnji sa predstavnicima albanske strane.

IX.2. Granični prelaz Zatrijebačka Cijevna

Status projekta:

Završen

- ❑ Početkom 2014. godine je raspisano javno nadmetanje i odabran je obrađivač projektne dokumentacije za izgradnju graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna.
- ❑ Završena je izrada Glavnog projekta i revizija istog.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **73.678,50 €**.



X. Zakon o Dinastiji Petrović Njegoš

X.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja Stambenog objekta na Cetinju

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Planirana je izgradnja stambenog objekta – Rezidencija Princa Nikole Petrovića Njegoša u Bajicama na Cetinju, na lokaciji koja je bila predmet otkupa zemljišta u skladu sa Zakonom o Dinastiji Petrović Njegoš.
- ❑ U 2012. godini budući korisnik objekta je izradio Idejno-arhitektonsko rješenje kojim je predviđeno da stambeni objekat - Zeleni dvor, sadrži prizemlje i sprat, bruto površine cca 310 m². Zbog specifičnog arhitektonskog izraza, koji je u velikoj mjeri uslovljen terenom, objekat sadrži nekoliko terasa natkrivenih pergolama. Posebna pažnja kod projektovanja rezidencije je posvećena povećanju energetske efikasnosti objekta i maksimalnom iskorišćenju obnovljivih izvora energije, a što se odnosi na proizvodnju električne energije (fotonaponski paneli), zeleni krov, prikupljanje kišnice i tretiranje otpadnih voda, dvostruku ventilaciju i niz arhitektonskih detalja koji utiču na energetske efikasnost objekta.
- ❑ Nije se pristupilo raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača projektne dokumentacije kako Korisnik nije dostavio Urbanističko-tehničke uslove.

XI. Hitna pomoć i prevencija poplava

- ❑ Radovi na sanaciji posljedica od poplava iz 2010. godine, izvođeni su u 2011, 2012, 2013. i 2014. godini.
- ❑ U okviru ovog projekta, do 2014. godine realizovano je 7.030.531,74 € a najveći dio radova odnosio se na sanaciju mostova, puteva, klizišta, regulaciju vodotokova, izgradnju i sanaciju vodovoda i obaloutvrda. Kroz realizaciju ovog projekta planirana je pomoć lokalnim upravama, prije svega na sjeveru države, u cilju saniranja i prevencije od poplava najugroženijih područja kako bi se unaprijedio i dodatno olakšao život ljudi u tim područjima. Realizacijom ovog projekta, za koji su obezbijedena kreditna sredstva Evropske investicione banke, preduzete su i preduzimaju se interventne mjere kako bi se uspostavila lokalna saobraćajna komunikacija i obezbijedila sigurnost ugroženih objekata i imovine u zoni vodotokova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **855.290,70 €** iz kreditnih sredstava, kao i **804.293,16 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.
- ❑ U 2014. godini su se sprovodile sljedeće aktivnosti:

XI.1. Izgradnja mosta Zorići-Andrijeva, Opština Andrijeva

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2013. godini započeti su radovi na izgradnji drumskog mosta i pristupnih puteva u naselju Zorići u Opštini Andrijeva.
- ❑ Takođe, u okviru ovog projekta ugovoreni su i radovi na regulaciji korita rijeke Lim uzvodno od mosta.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **5.475,00 €** iz kreditnih sredstava, kao i **182.071,78 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.2. Regulacija rijeke Lim od ušća Zlorečice do mosta u Seocima, Opština Andrijevica

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2014. godini su nastavljene radovi započeti u 2013. godini i isti su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **48.922,90 €** iz kreditnih sredstava, kao i **172.218,23 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.3. Regulacija korita rijeke Zlorečice, Opština Andrijevica

Status projekta:

U toku



- ❑ U 2013. godini su započeti radovi na regulaciji korita rijeke Zlorečica - II faze u Opštini Andrijevića, koji su zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i loših vremenskih uslova obustavljeni. Početkom oktobra mjeseca 2014. godine radovi su nastavljani i odvijali su se dok su to dozvoljavali vremenski uslovi.
- ❑ Takođe, ugovoreni su radovi III faze, koji se odnose na regulaciju korita rijeke Zlorečice na dijelu uliva u rijeku Lim.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **67.257,05 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.

XI.4. Regulacija korita Plavske rijeke, Opština Plav

Status projekta:

Završen



- ❑ U 2013. godini je izabran izvođač radova i sa radovima se otpočelo krajem septembra mjeseca prošle godine i isti su obustavljeni zbog loših vremenskih uslova krajem 2013. godine.
- ❑ U 2014. godini nastavljani su i završeni svi ugovoreni radovi.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **158.893,90 €** iz kreditnih sredstava, kao i **68.173,47 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.

XI.5. Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulazu u Gusinje i izgradnja pješačkog mosta, Opština Plav

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2014. godini raspisano je javno nadmetanje i odabran je obrađivač projektne dokumentacije.
- ❑ Izrađena je i završena projektna dokumentacija.

- ❑ U 2014. godini realizovano je **2.856,00 €** iz kreditnih sredstava, kao i **9.164,70 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade .

XI.6. Regulacija rijeke Vruje u Gusinju

Status projekta:

Završen

- ❑ Radovi na regulaciji korita rijeke Vruje su izvođeni u 2012. godini i isti su bili obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Nakon što su riješeni imovinsko-pravni odnosi i stvoreni povoljni vremenski uslovi, radovi su nastavljani.
- ❑ Svi planirani radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **71.557,15 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.7. Regulacija Jaseničke rijeke i sanacija vodovoda u Opštini Plav

Status projekta:

Završen

- ❑ U februaru 2014. godine se otpočelo sa radovima na lokaciji Jaseničke rijeke, čiji vodostaj nije uticao na izvođenje radova, kao i sa radovima na sanaciji vodovodne mreže koji su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
- ❑ Isti radovi su nastavljani.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **102.130,89 €** iz kreditnih sredstava, kao i **11.704,48 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.8. Sanacija lokalnog puta Gusinje-Grebaje, Opština Plav

Status projekta:

Završen


- ❑ U 2013. godini je zaključen ugovor sa izvođačem i otpočelo se sa radovima koji su zbog loših vremenskih uslova bili obustavljeni.
- ❑ U 2014. godini nastavljani su i završeni svi ugovoreni radovi.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **62.290,55 €** iz kreditnih sredstava.



XI.9. Regulacija korita rijeke Lim, Opština Berane

Status projekta:

Završen

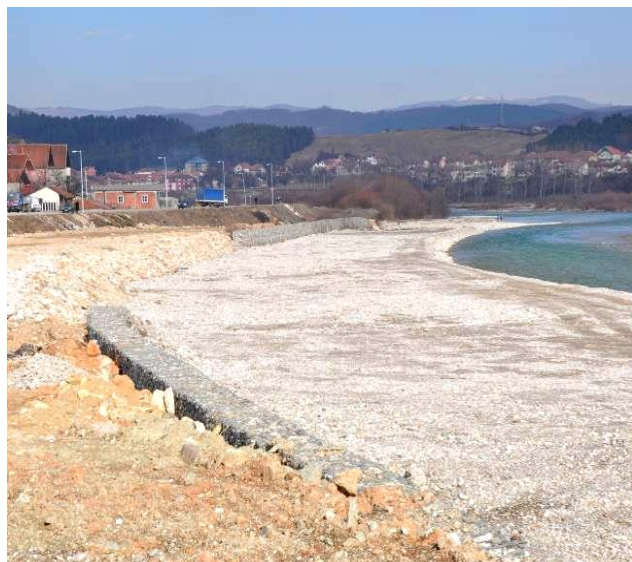

- ❑ U 2013. godini su završeni radovi na regulaciji korita rijeke Lim na lokaciji „A” i „B” - uzvodno od glavnog gradskog mosta.
- ❑ U februaru 2014. godine nastavljeni su radovi na lokaciji „C” nizvodno od mosta na magistralnom putu Berane-Rožaje.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **95.776,77 €** iz kreditnih sredstava, kao i **46.868,10 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.

XI.10. Regulacija korita rijeke Tare za zaštitu lokalnog puta Prošćenje, Opština Mojkovac - III faza

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2014. godini raspisano je javno nadmetanje i odaban je najpovoljniji izvođač radova na regulaciji korita rijeke Tare – III faza.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **131.715,42 €** iz kreditnih sredstava, kao i **76.026,14 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.11. Regulacija korita rijeke Tare, Opština Kolašin - II i III faza

Status projekta:

U toku

- ❑ Radovi na izgradnji obaloutvrde su se odvijali fazno u zavisnosti od obezbijedenih sredstava i vremenskih uslova i odnosili su se na regulaciju rijeke Tare, a podrazumijevaju vraćanje rijeke Tare u svoje korito, produbljivanje korita, kao i izradu desne obaloutvrde korita od kamena.
- ❑ Radovi I faze regulacije rijeke Tare su obuhvatali potez od Bećove bare do novog mosta (650 m) i potez kod starog mosta uključujući ušće rijeke Svinjače (450 m). Svi ugovoreni radovi I faze su završeni.
- ❑ Radovi II faze obuhvataju regulaciju rijeke Tare na potezu od novog do starog mosta u dužini od 1.520 m. U prethodnom periodu su završeni radovi na uređenju korita rijeke.

- U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje, odabran je izvođač radova II faze – ugradnja gabiona. Radovi su započeti krajem godine i isti su zbog loših vremenskih uslova obustavljeni.
- Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ Radovi III faze obuhvataju regulaciju korita rijeke Tare uzvodno od Bećove bare, regulaciju korita rijeke Svinjače i potoka Pažanj.
- ❑ Radovi III faze – regulacija korita rijeke Svinjače i potoka Pažanj su izvođeni krajem 2014. godine i isti su zbog loših vremenskih uslova obustavljeni.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **42.534,84 €** iz kreditnih sredstava, kao i **67.970,62 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.12. Regulacija korita rijeke Plašnice, Opština Kolašin

Status projekta:

U toku



- ❑ U 2013. godini su nastavljene radovi, započeti u 2012. godini, na sanaciji korita rijeke Plašnice u Opštini Kolašin. Zbog velikog vodostaja tokom godine i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, radovi su izvođeni smanjenim intezitetom.
- ❑ U drugoj polovini 2014. godine su nastavljene radovi na lokacijama gdje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, i isti su zbog loših vremenskih uslova obustavljeni.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **14.950,00 €** iz kreditnih sredstava.

XI.13. Sanacija klizišta na putu za Liješnje, Opština Kolašin

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2013. godini je potpisan ugovor sa Izvođačem radova za sanaciju klizišta na tri lokaliteta.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **44.048,60 €** iz kreditnih sredstava.



XI.14. Sanacija lokalnog puta za Vranješnicu, Opština Kolašin

Status projekta:

Završen

- ❑ U maju 2014. godine se otpočelo sa radovima na sanaciji lokalnog puta za Vranješnicu u Opštini Kolašin.
- ❑ Svi ugovoreni radovi su završeni.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **19.931,68 €** iz kreditnih sredstava.



XI.15. Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru, Opština Bar

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Glavni projekat rekonstrukcije mosta u Virpazaru dostavila je Opština Bar.
- ❑ Krajem 2013. godine, nakon završene procedure javnog nadmetanja odabran je izvođač radova.
- ❑ Početkom 2014. godine, Direkcija javnih radova je obaviještena od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara da je istorijsko jezgro Virpazara pod zaštitom te institucije. Na osnovu toga, UZDK nije dala saglasnost na rekonstrukciju mosta, tako da aktivnosti na realizaciji projekta nisu sprovedene.
- ❑ Krajem 2014. godine je završena izrada projektne dokumentacije za sanaciju postojećeg mosta.
- ❑ Nakon dostavljanja građevinske dozvole od strane opštine Bar, za narednu godinu je planiran početak i završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **4.998,00 €** iz kreditnih sredstava, za tekuće izdatke.

XI.16. Sanacija gradske saobraćajnice od Ribarstva prema centru Rijeke Crnojevića, Opština Cetinje

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Prijestonica Cetinje je preuzela obavezu pribavljanja projektne dokumentacije, nakon čega je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
- ❑ Kako projekat nije dostavljen od strane Prijestonice Cetinje, aktivnosti nisu realizovane.

XI.17. Sanacija lokalnog puta u Štoju, Opština Ulcinj

Status projekta:

Nije realizovan


- ❑ Opština Ulcinj je preuzela obavezu pribavljanja projektne dokumentacije, nakon čega je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
- ❑ Kako projekat nije dostavljen od strane Opštine Ulcinj, aktivnosti nisu realizovane.

XI.18. Sanacija mostova i izgradnja pješačkih mostova u Godijeljima i Donjoj Bukovici i sanacija temelja potpornih zidova, Opština Šavnik

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2013. godini je izabran izvođač radova za izgradnju pješačkih mostova u Godeljima i Donjoj Bukovici i sanaciju temelja potpornih zidova u Opštini Šavnik.
- ❑ U 2014. godini se započelo sa radovima, ali zbog visokog vodostaja radovi na sanaciji temelja su odloženi za narednu godinu.
- ❑ Za narednu godinu se planira nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **81.963,23 €** iz kreditnih sredstava, kao i **2.388,28 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.

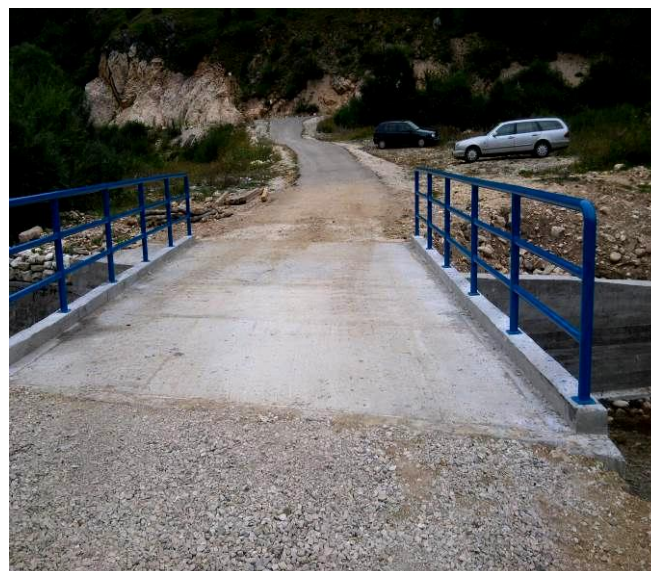

XI.19. Sanacija pješačke staze u Virpazaru, Opština Bar

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Opština Bar je preuzela obavezu pribavljanja projektne dokumentacije, nakon čega je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
- ❑ Do kraja 2014. godine projekat nije dostavljen od strane Opštine Bar i aktivnosti nisu realizovane.

XI.20. Sanacija mreže lokalnih puteva, Opština Plav

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini, nakon drugog javnog nadmetanja, odabran je izvođač radova za sanaciju mreže lokalnih puteva u Opštini Plav. Izvođenje radova je otpočelo i odvijalo se dok su to dozvoljavali vremenski uslovi.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **27.703,20 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade.



XI.21. Sanacija klizišta Krnjača i Smoljevica

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini, nakon izrade projektne dokumentacije i odabira izvođača radova za sanaciju klizišta Smoljevica, potpisan je ugovor.
- ❑ Za narednu godinu je planiran početak i završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **1.190,00 €** iz opštih prihoda na osnovu Zaključka Vlade, za izradu geodetskih podloga.

XI.22. Sanacija lokalnog puta za Štitaricu, Opština Mojkovac

Status projekta:

Završen

- ❑ U 2012. godini su započeti i završeni radovi I faze koji su se odnosili na izgradnju tri mosta, izradu kamene obaloutvrde i sanaciju trupa puta.

- ❑ U 2013. godini su započeti i završeni radovi II faze koji su se odnosili na ugradnju asfaltnog zastora.
- ❑ U 2014. godini su nastavljani i završeni svi preostali radovi II faze.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **23.188,34 €** iz kreditnih sredstava.



XI.23. Sanacija mreže lokalnih puteva Frutak - Danilovgrad

Status projekta:

Završen

- ❑ Realizovana sredstva se odnose na izmirenje obaveza iz prethodnog perioda.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **15.614,58 €**.

XII. Unapređenje turističke ponude

XII.1. Izmještanje ikone Bogorodice Filermose, Opština Cetinje

Status projekta:

U toku

- ❑ Realizaciju projekta je koordinirala Opština Cetinje.
- ❑ Završena je izrada projektne dokumentacije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **138.425.00 €**.

XII.2. Rekonstrukcija restorana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin

Status projekta:

U toku

- ❑ JP „Nacionalni parkovi Crne Gore” je preuzelo obavezu pribavljanja projektne dokumentacije i istu dostavio Direkciji javnih radova.
- ❑ Krajem avgusta 2014. godine je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova I faze.
- ❑ Odabran je izvođač radova i otpočelo se sa radovima.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak i završetak radova.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **67.542,14 €**.



XII.3. Izrada Glavnog projekta za valorizaciju Đalovića pećine, Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za izradu prethodne Studije izvodljivosti.
- ❑ Nakon raspisanog javnog nadmetanja potpisan je ugovor.
- ❑ Aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti su u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planirano raspisivanje javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta valorizacije Đalovića pećine u Opštini Bijelo Polje.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **24.990,00 €**.

XII.4. Izrada projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioca-Žarski katun, Opština Mojkovac

Status projekta:


U toku

- ❑ Od strane Opštine Mojkovac je dostavljen Projektni zadatak i izdati su UTU-i i raspisano je javno nadmetanje za realizaciju projekta puta u dužini od 12 km.
- ❑ Nakon procedure javnog nadmetanja, odabran je obrađivač projektne dokumentacije i ista je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.

XII.5. Asfaltiranje puta od Ravne rijeke do Jasikovca, Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

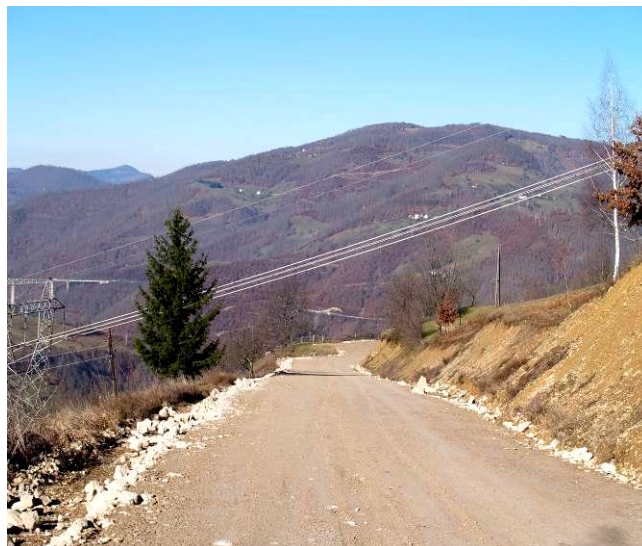

- ❑ U 2014. godini završeno je javno nadmetanje po sistemu „Projektuj i izgradi” za izradu Glavnog projekta u dužini od 6 km i izvođenje radova u dužini od 5 km I faze.
- ❑ Završena je izrada projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo krajem 2014. godine nakon pribavljanja građevinske dozvole.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **87.584,00 €**.

XII.6. Nabavka žičara na lokalitetu „Kolašin 1600” - Opština Kolašin i Cmiljača - Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma je novembra 2010. godine izradilo „Prostorni plan posebne namjene Bjelasica –Komovi” čiji je cilj da se obezbijedi jasna „vizija” za budući karakter ovog prostora, kao seta naselja međunarodne turističke eko-destinacije u okviru održive zajednice.
- ❑ Prostornim planom posebne namjene definisani su kapaciteti i tipovi žičara.
- ❑ Kako ni na jednoj lokaciji ne postoji neophodna prateća infrastruktura (putna, elektro i hidrotehnička) u 2014. godini planirano je raspisivanje javnih nadmetanja za izradu projektne dokumentacije i početak radova.
- ❑ Obezbjeđenjem osnovne infrastrukture, koja bi se realizovala kroz Kapitalni budžet Crne Gore, stvorili bi se preduslovi za dalji razvoj, kao i izgradnju kompleksa hotelsko-turističkog naselja i pratećih sadržaja, koji bi se finansirali kroz privatna ulaganja.
- ❑ Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u obavezi da pribavi UTU-e sa mjestima priključenja i izradi Projektne zadatke.
- ❑ Realizacija projekta planirana je da se odvija u dvije faze i nastaviće se u narednim godinama.
- ❑ Prva faza realizacije podrazumijeva: izradu elektroenergetske mreže, putne infrastrukture sa parkingom, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski liftova, ski staza, izgradnju objekata sa pratećim sadržajima i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- ❑ Druga faza realizacije podrazumijeva: izgradnju akumulacionih jezera i izradu sistema za osnježavanje staza.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **192.018,94 €**.

XII.6.1. Kolašin

- ❑ Planirano je Projektovanje, izgradnja, nabavka i ugradnja opreme nove isklopive šestosjedne žičare/lifta, po sistemu „Projektuj i izgradi” K8/D6C na lokalitetu Kolašin 1600mm-Troglava 2070mm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat.
- ❑ U toku su javna nadmetanja za izgradnju primarne trafostanice 35/10kV na lokaciji Jezerine po principu „Projektuj i izgradi” i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju lokalnog puta u dužini od 2.3 km.
- ❑ Završeno je javno nadmetanje za izgradnju objekata bazne stanice takođe po principu „Projektuj i izgradi” i potpisan ugovor sa izvođačem radova.

XII.6.2. Bijelo Polje

- ❑ Planirano je projektovanje, izgradnja, nabavka i ugradnja opreme nove isklopive četvorosjedne žičare/lifta, po sistemu „Projekuj i izgradi” Z9/D4C na lokalitetu Cmiljača 1.610 mnm, inicijalnog kapaciteta 1.400 skijaša na sat.
- ❑ Tokom 2014. godine ugovoreni su radovi na rekonstrukciji puta od Ravne rijeke do Jasikovca po principu „Projektuj i izgradi”. Nakon izrade projektne dokumentacije i dobijene građevinske dozvole otpočelo se sa radovima na putnom pravcu Latinska kosa-Jasikovac (L=5km) i isti su u toku, dok je za putni pravac Ravna rijeka (magistrala) - Latinska kosa (L=700m) u toku izrada projektne dokumentacije.

XII.7. Remont žičara na lokalitetu „Savin kuk” na Žabljaku

Status projekta:

Završen



- ❑ U 2014. godini planirano je raspisivanje javnog nadmetanja za generalni remont žičara u skijalištu „Savin kuk” i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- ❑ Od strane Turističkog centra „Durmitor” dostavljen je „Izveštaj o izvršenoj analizi-2013” izrađen od strane firme „Pro alpin” kojim je obuhvaćeno stvarno stanje ski-liftova na skijalištu „Savin kuk” i informacioni Predmjer i predračun radova.
- ❑ Investiciono-razvojni fond Crne Gore je dostavio Predmjer i predračun radova na osnovu kojeg su raspisana javna nadmetanja za generalni remont žičare „Ski lift 1”- dvosjed, remont „Ski lifta 1”-tanjirača, remont „Ski lifta 2”-sidro i remont „Ski lifta 3”, nabavku i ugradnju dječijeg ski lifta, ugradnju softvera za elektronski sistem naplate, kao i nabavku opreme za hitnu službu i neophodne signalizacije.
- ❑ Završeni su svi planirani radovi.
- ❑ Odlukom Vlade Crne Gore, broj 08-2724/3 od 4.12.2014. godine, izvršen je transfer sredstava Investiciono razvojnom fondu za nabavku neophodne mehanizacije.
- ❑ U 2014. godini realizovano je **755.214,27 €**.

XII.8. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja pčelarske kuće, Opština Danilovgrad

Status projekta:

Završen



- ❑ Izgradnja Pčelarske kuće - poslovnog objekta za potrebe Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, planirana je u mjestu Grbe, Opština Danilovgrad.
- ❑ Izgradnja objekta se finansira sredstvima Kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore, dok je učešće opštine Danilovgrad u realizaciji ove investicije obezbjeđenje lokacije.
- ❑ Direkcija javnih radova je u 2014. godini uradila Idejno rješenje u skladu sa zahtjevima i potrebama budućeg Korisnika.
- ❑ Objekat je spratnosti prizemlje i sprat, ukupne bruto površine cca 625,00 m². U prizemlju su predviđena tri proizvodna pogona sa pratećim skladišnim i prodajnim prostorima i to za: sterilizaciju i preradu voska; otkup, prihvatanje i pakovanje meda; invertovanje šećera i proizvodnju pogača. Na spratu objekta su planirane kancelarije Saveza pčelara Crne Gore i multifunkcionalna sala kapaciteta 100 mjesta.
- ❑ Na osnovu Idejnog rješenja je urađen Projektni zadatak i raspisano javno nadmetanje po principu „projektuj i izgradi” i odabran je izvođač radova.
- ❑ Završeni su svi ugovoreni radovi.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **514.413,38 €**.

XII.9. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja fabrike za preradu voća i povrća, Opština Kolašin

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Ministarstvo poljoprivrede je odustalo od realizacije projekta i nije dostavilo Projektni zadatak za izgradnju fabrike za preradu voća i povrća, pa planirane aktivnosti na realizaciji projekta nisu realizovane.

XII.10. Kampovi za mobilne kuće

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Nakon što je Direkciji dostavljen projekat od strane JP „Nacionalni parkovi Crne Gore”, krajem 2014. godine raspisano je javno nadmetanje za objekat mobilne kuće u okviru Nacionalnih parkova Durmitor.
- ❑ Isto je poništeno s obzirom na to da nije pristigla nijedna ponuda.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnost.

XII.11. Rekonstrukcija apartmana u NP „Biogradska gora”, Opština Kolašin

Status projekta:

U toku

- ❑ Nakon što su od strane JP „Nacionalni parkovi Crne Gore” dostavljeni potrebni podaci, raspisano je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, koje je u toku.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.

XII.12. Putni pravac Jasikovac-Cmiljača, Opština Bijelo Polje

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje nakon čega je odabran obrađivač projektne dokumentacije.
- ❑ U toku je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **11.317,50 €**.

XII.13. Katun Šiška, Opština Kolašin

Status projekta:

Nije realizovan

- ❑ Na predlog JP „Nacionalni parkovi Crne Gore” projekat nije realizovan, a sredstva opredijeljena za ovaj projekat su preusmjerena na realizaciju projekta Rekonstrukcije restorana u NP „Biogradska gora”.

XII.14. Revitalizacija jezera Ponikvice, Opština Danilovgrad

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini je raspisano javno nadmetanje za revitalizaciju jezera Ponikvice po sistemu „Projektuj i izgradi”.
- ❑ Odabran je izvođač radova i u toku je izrada projektne dokumentacije.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.

XII.15. Rekonstrukcija hotela „Gorske oči”, Opština Žabljak

Status projekta:

Završen

- ❑ Projekat se realizuje kroz transfer sredstava.
- ❑ U 2014. godini, kroz transfer sredstava, realizovano je ukupno **445.000,00 €**.

XII.16. Rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje-Štedin, Opština Rožaje

Status projekta:

U toku

- ❑ U 2014. godini je završeno javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije.
- ❑ Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi.
- ❑ Za narednu godinu je planiran nastavak aktivnosti.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **17.385,90 €**.

XIII. Kupovina stambenih objekata i infrastrukture

Kupovina stambenih objekata i infrastrukture

Završen

- ❑ Realizacija ovog projekta je planirana kroz transfer sredstava.
- ❑ U 2014. godini realizovano je ukupno **10.000.000,00 €**.

XIV. Izrada detaljnog plana za uže jezgro Petnjice, izrada projektne dokumentacije za administrativni objekat, Opština Petnjica

Izrada detaljnog plana za uže jezgro Petnjice, izrada projektne dokumentacije za administrativni objekat, Opština Petnjica **U toku**

- ❑ Nakon što je Opština krajem 2014. godine dostavila Projektni zadatak i UTU-e, raspisano je javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije i isto je u toku.
- ❑ Planirana je izgradnja administrativnog objekta ukupne površine 1.480 m², koji će posjedovati suteran, prizemlje, sprat i potkrovlje, sa administrativnim prostorijama za rad opštinskih službi, tehničkim i pomoćnim prostorijama.
