



Ministarstvo finansija

Podgorica, septembar 2025. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNOG BUDŽETA ZA DRUGI KVARTAL 2025. GODINE




REALIZACIJA KAPITALNOG BUDŽETA NA KRAJU DRUGOG KVARTALA 2025. GODINE

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Službeni list CG", br. 11/2025) za **Kapitalni budžet** su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **280 miliona eura**, što je za 33 miliona više u odnosu na Kapitalni budžet za 2024. godinu. Navedeni iznos je planiran za realizaciju 346 aktivnosti (projekata) ukupne procijenjene vrijednosti 4,114 milijardi eura, koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj i Ministarstva javnih radova (bivša Uprava za kapitalne projekte).

Od ukupno opredijeljenog iznosa za Kapitalni budžet u 2025. godini čak 100 miliona eura (35% od ukupnog Kapitalnog budžeta) je planirano za nastavak izgradnje projekta „Autoput Bar-Boljare“, odnosno za početak realizacije druge dionice od Mateševa do Andrijevice čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 650 miliona eura, a koja se sprovodi po tenderskim procedurama EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj).

U PRVIH ŠEST MJESECI 2025. GODINE za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore **potrošeno je 51.368.041,91 €** ili 18% od ukupno zakonski planiranog iznosa, od čega je 40,43 mil.€ plaćeno iz opštih prihoda budžeta, 9,52 mil.€ iz kredita, a 1,41 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).

Grafik 1: Pregled izvršenja Kapitalnog budžeta u 2025. po svim izvorima finansiranja

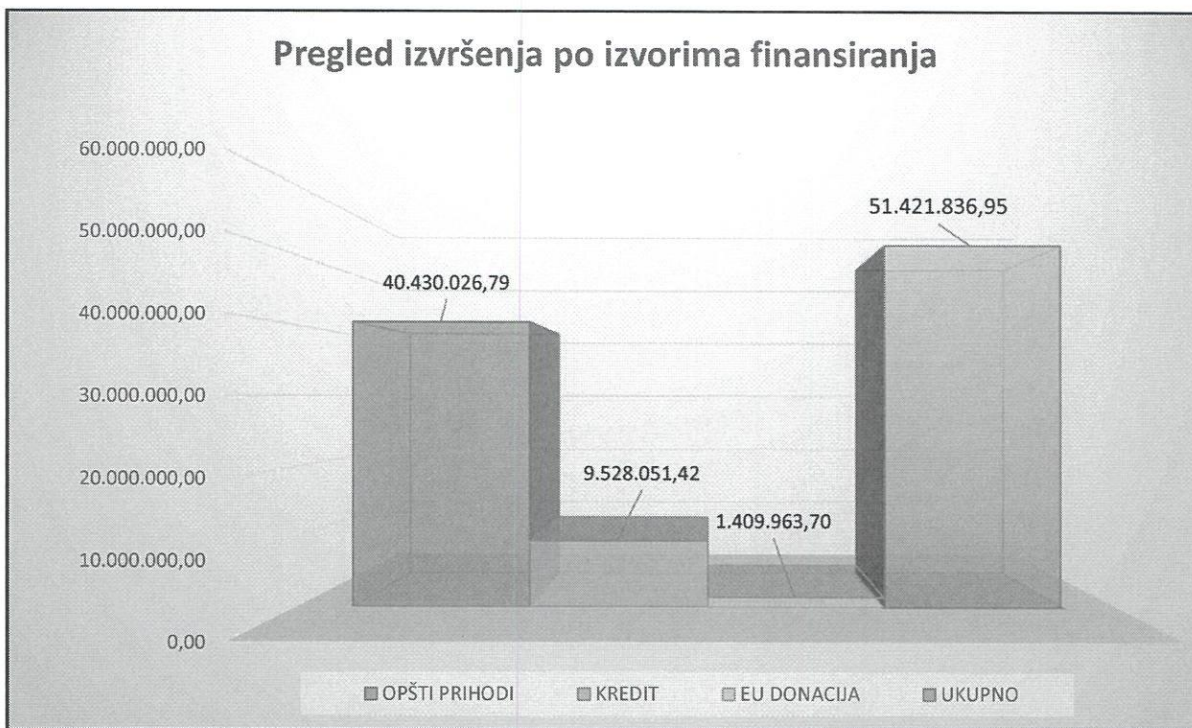


U prva dva mjeseca tekuće godine na snazi je bilo privremeno finansiranje usljed kašnjenja u donošenju Zakona o budžetu za 2025. godinu, što je za posljedicu imalo odloženo započinjanje aktivnosti na novim projektima a shodno tome i slabiju realizaciju u odnosu na prethodnu godinu za oko 10 miliona eura.

Navedeno je uticalo da u prvom kvartalu imamo usporenu dinamiku izvršenja već započetih projekata iz prethodnih godina, što je iziskivalo realokaciju neutrošenih sredstava u okviru novoformirane potrošačke jedinice Ministarstvo javnih radova kako bi se omogućio nesmetani nastavak realizacije istih i izmirivanje dospjelih akumuliranih obaveza.

Dodatno, realizacija Kapitalnog budžeta na kraju dugog kvartala je za 5 miliona veća u odnosu na uporedni posmatrani period za 2023. godinu (36 mil.€), kada je realizacija bila na istom nivou od 18% u odnosu na planirana sredstva.

Grafik 2: Uporedni prikaz izvršenja Kapitalnog budžeta u 2025. i 2024. godini na kraju drugog kvartala

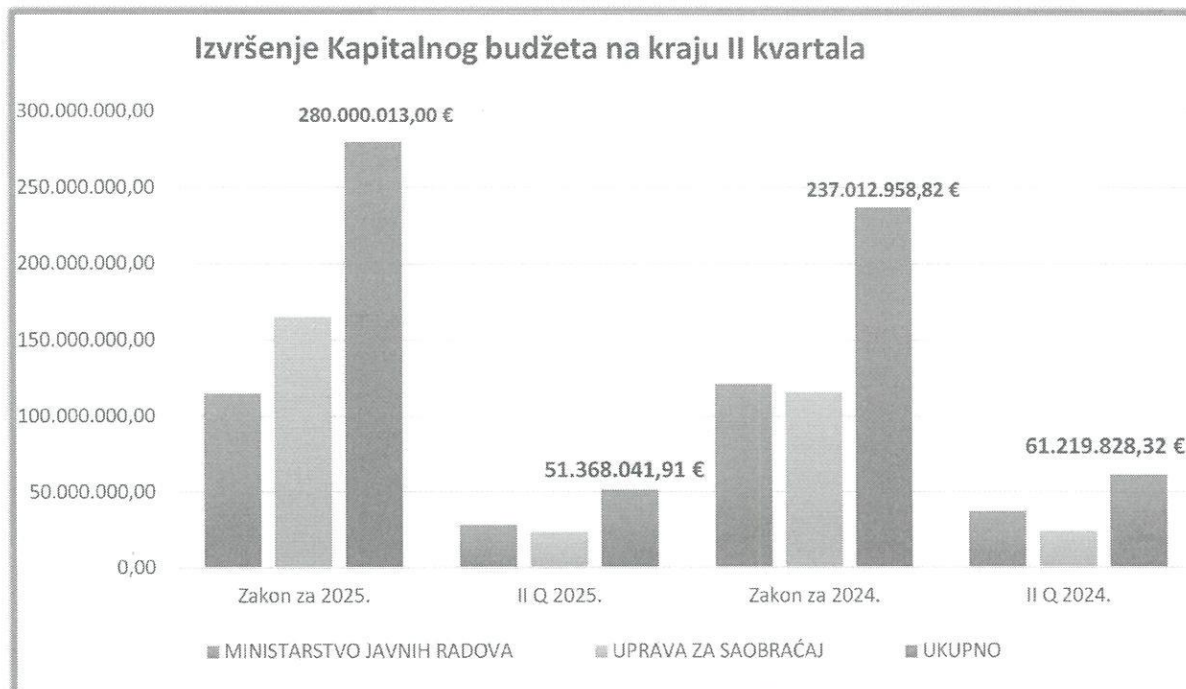

Posmatrajući samo potrošnju iz budžetskih sredstava (opšti prihodi) bez iznosa opredijeljenih za autoput, ista je na ukupnom iznosu od 40,43 mil.€ ili 22% od ukupno zakonski planiranog iznosa bez autoputa (179,98 mil.€), što je za 8,91 mil.€ manje nego u uporednom periodu prošle godine (49,34 mil.€) kada je izvršenje bilo na nivou od 33%. Realizacija sredstva iz EU donacija je takođe niža u odnosu na prošlu godinu (3,97 mil.€ manja) iz razloga što su u prošloj godini završena dva velika IPA projekta (dvije klinike i operativni centar u Podgorici). Međutim, povlačenje sredstava iz ugovorenih kredita ove godine ide značajno boljom dinamikom, odnosno 3,82 mil.€ više nego prethodne godine, jer su u prvoj polovini tekuće godine značajno bržom dinamikom realizuju projekti izgradnje bulevara Tivat-Jaz i rekonstrukcije puta Lepenac-Berane.

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta Ministarstva javnih radova, za sprovođenje 271 projekta (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 1,901 milijardi eura, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu opredijeljeno je 115,00 mil.€, što je 41% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2025. godinu..

Na kraju drugog kvartala 2025. godine za projekte koje realizuje Ministarstvo javnih radova plaćeno je ukupno 28,23 mil.€, odnosno 25% od ukupne zakonski planirane sume, što je za 9,03 miliona manje u odnosu na 2024. godinu kada je plaćeno 37,26 mil.€ (31% od ukupno planirane za 2024. godinu). Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 26,80 mil.€ ili 23% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 0,01 mil.€, a iz EU donacija 1,41 mil.€ (IPA projekti). Nakon organizacione promjene u Vladi (transformacija Uprave za kapitalne projekte u Ministarstvo javnih radova), kao i odobrene realokacije sredstava u drugom kvartalu ove godine došlo je do aktivnijih proceduralnih aktivnosti u realizaciji projekata u ovom dijelu implemenatcije kapitalnog budžeta.

- ✓ U okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 165,00 mil.€ (59% od ukupno planiranog Kapitalnog budžeta), od čega je za sprovođenje 74 projekta, ukupne procijenjene vrijednosti 1,24 milijardi eura, opredijeljeno 65,00 mil.€ (23%), dok je za Autoput Bar-Boljare, izgradnju dionice Mateševo-Andrijevića i projektovanje drugih dionica autoputa, čija je procijenjena vrijednost 650 mil.€, opredijeljeno 100,01 mil.€ što je 36% od ukupnog Kapitalnog budžeta.

U prvih šest mjeseci 2025. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je 23,14 mil.€, odnosno 14% od ukupne zakonski planirane sume, što je za 0,82 miliona manje nego prethodne godine kada je plaćeno 23,96 mil.€ (21% od ukupno planirane za 2024. godinu). Od navedenog, iz budžetskih sredstava (opšti prihodi) potrošeno je ukupno 13,63 mil.€, dok je iz kredita plaćeno 9,51 mil.€ što je za oko 4,78 miliona više nego prethodne godine kada je u istom periodu plaćeno 4,73 mil.€.

Tabela 1: Izvršenje Kapitalnog budžeta po potrošačkim jedinicama za 2025. i 2024. godinu

POTROŠAČKA JEDINICA	IZVOR FINASIRANJA	ZAKON 2024	II Q 2025.		II Q 2024	
MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA	BUDŽET	114.999.921,00	26.804.153,50	23%	30.905.759,31	25%
	KREDIT	49,00	16.700,00		975.678,46	
	EU DONACIJA	26,00	1.409.963,70		5.379.061,69	
	DONACIJA	4,00	0,00		0,00	
	UKUPNO	115.000.000,00	28.230.817,20	25%	37.260.499,46	31%
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	BUDŽET	75.000.003,00	13.625.873,29	18%	19.231.304,89	17%
	KREDIT	45.000.009,00	9.511.351,42		4.728.023,97	
	EU DONACIJA	45.000.000,00	0,00		0,00	
	DONACIJA	1,00	0,00		0,00	
	UKUPNO	165.000.013,00	23.137.224,71	14%	23.959.328,86	21%
UKUPNO	svi izvori	280.000.013,00	51.368.041,91	18%	61.219.828,32	26%
Ukupno sa autoputem	BUDŽET	189.999.924,00	40.483.821,83	21%	50.137.064,20	21%
Ukupno bez autoputa	BUDŽET	179.983.924,00	40.430.026,79	22%	49.345.996,50	33%

- ✓ U dijelu realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta – nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevića, ali i projektovanje ostalih dionica duž ucrtane trase autoputa, aktivnosti se sprovode u skladu sa planiranom dinamikom od strane „Monteput“ DOO, a shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2025.

U skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), završena je prva faza tenderskog postupka za izbor izvođača radova (pretkvalifikacija) za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevića. U toku je evaluacija pristiglih ponuda, a po njenom okončanju očekuje se formalno odobrenje EBRD-a na predloženu listu kvalifikovanih ponuđača, čime će se steći uslovi za sprovođenje druge faze, upućivanje poziva za dostavljanje finalnih ponuda.

Kada je riječ o izboru konsultanta za vršenje stručnog nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova (inženjera) za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevice, pretkvalifikacioni postupak je uspješno završen, a finalna faza tendera za dostavljanje ponuda kvalifikovanim ponuđačima je raspisana i trenutno je u toku. Takođe, u završnoj fazi je ugovaranje usluga tehničke i upravljačke podrške implementaciji projekta (PIU Support) za dionicu Mateševo-Andrijevice, a u skladu sa pravilima EBRD-a, te se angažman PIU konsultanta očekuje u trećem kvartalu.

NAPOMENA: Vlada Crne Gore je 24. jula tekuće godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj zaključilo Ugovor o kreditu i Ugovor o projektu za finansiranje i realizaciju projekta izgradnje druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, kojim je definisano da Crna Gore dobije 150 miliona bespovratnih sredstava i 200 miliona povoljnog kredita. Navedeno će omogućiti nesmetanu realizaciju predmetnog projekta i isplatu avansa odmah po potpisivanju ugovora sa izabranim izvođačem radova po principu „projektuj i izgradi“, što će dalje u značajnoj mjeri rasteretiti finansiranje Kapitalnog budžeta iz opštih prihoda budžeta i omogućiti bržu dinamiku realizacije drugih kapitalnih projekata u posljednjem kvartalu tekuće godine kao i za započinjanje novih projekata u narednom periodu.

U dijelu realizacije drugih aktivnosti definisanih Zakonom o budžetu za realizaciju kapitalnog projekta Autoputa Bar–Boljare, u toku je izrada idejnih projekata za dionice:

- Smokovac-Tološi, dužine cca 10 km, ukupna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 791.582 € sa PDV-om i do sada je izvršena uplata avansa u iznosu od 79.158,20 € (10% vrijednosti ugovora);
- Andrijevice-Berane-Boljare, dužine cca 50 km, ukupna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 4.421.340,00 € sa PDV-om i do sada je isplaćen avans u iznosu od 442.134,00 € (10% od ugovora);
- Tološi-Virpazar, dužine cca 41,5 km; u toku je tenderska procedura za izbor projektanta za izradu idejnog projekta. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 4.961.000,00 €.
- Virpazar-Bar (petlja Zaljevo), dužine cca 23 km, ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi 2.864.675,00,00 € sa uračunatim PDV-om.

ZAKLJUČCI

- Usmjereno efikasnijoj realizaciji kapitalnih projekata, Ministarstvo finansija u saradnji sa implementacionim jedinicama prati izvršenje svakog pojedinačnog projekta na mjesečnoj osnovi uz upotrebu elektornskog sistema za upravljanje budžetom (BIMS) i shodno tome priprema ovaj Izvještaj, sa ciljem unaprijedjenja transparentnosti uz informisanje javnosti u vezi sa dinamikom realizacije Kapitalnog budžeta za 2025. godinu.
- Na kraju drugog kvartala 2025. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 51,37 mil.€ ili 18% od ukupno planiranog iznosa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu. Uslijed kašnjenja u donošenju Zakona u skupštinskoj proceduri u prvom kvartalu ove godine, u posmatranom periodu realizacija Kapitalnog budžeta manja je za 9,85 mil.€ u odnosu na isti period prošle godine. Od realizovanog iznosa iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 40,43 mil.€, iz kredita 9,53 mil.€, dok je 1,41 mil.€ plaćeno iz EU donacija (IPA projekti).
- Za projekte koje realizuje Ministarstvo javnih radova (prethodno Uprava za kapitalne projekte) plaćeno je ukupno 28,23 mil.€ ili 25% od ukupno planirane sume, odnosno 9,03 miliona manje nego prošle godine. Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 26,80 mil.€ ili 23% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 0,01 mil.€, a iz EU donacija 1,41 mil.€ (IPA projekti). Nakon realokacije sredstava u drugom kvartalu ove godine i organizacionih promjena u ovoj implemetacionoj jedinici, započeta je stabilna realizacija kapitalnih projekata.
- Za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je ukupno 23,14 mil.€ ili 14% od ukupno planirane sume, odnosno svega 0,82 miliona manje nego prošle godine. Od navedenog iznosa iz budžetskih sredstava potrošeno je ukupno 13,63 mil.€, dok je iz kredita plaćeno 9,51 mil.€ što je za oko 4,78 miliona više nego prethodne godine kada je u istom periodu plaćeno 4,73 mil.€. Dinamika izvršenja u ovoj implementacionoj jedinici intenzivnija je u narednom periodu godine uslijed obima plaćanja u okviru velikih projekata, kao što su projekti izgradnje bulevara Tivat-Jaz i rekonstrukcije puta Lepenac-Berane.
- U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monteput DOO“ je u 2024. godini završio pretkvalifikacioni proces za izbor izvođača radova i stručnog nadzora izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a i FIDIC-ovim uslovima, kao i pravnim propisima Crne Gore. U toku je evaluacija prijave i odobrenje liste od strane EBRD-a, nakon čega će se sprovesti druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača. Zaključeni Ugovor o kreditu i Ugovor o projektu za finansiranje i realizaciju projekta izgradnje druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, kreira dalje osnove stabilnog finansiranja ovog strateškog projekta.

**Prilog 1: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata u okviru Ministarstva javnih radova i
Uprave za saobraćaj, odobrenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu**

Rb	Programski kod i naziv projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u okviru kapitalnog budžeta Ministarstva javnih radova (organizacioni kod 43701)	Procijenjena vrijednost	Iznos predviđen za 2025. god.	Ugovorena vrijednost	Realizovano do 2025. god.	Izvršenje u 2025. god.
1	11 052 K01 001 - Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	2.000.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
2	11 052 K01 002 - Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	2.850.000,00	10.000,00	2.799.860,92	2.612.751,91	0,00
3	11 052 K02 001 - Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije	1.000.000,00	10.003,00	7.430,36	7.430,36	0,00
4	12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	45.000.000,00	5.002,00	299.082,60	251.523,90	0,00
5	12 024 K01 004 - Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	680.000,00	305.181,00	5.110.743,17	4.269.076,75	0,00
6	12 024 K02 001 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	4.450.000,00	300.401,00	0,00	0,00	0,00
7	12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	14.110.000,00	3.003.001,00	13.810.243,15	7.751.393,79	310.915,24
8	13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	650.000,00	160.000,00	627.868,98	242.515,97	0,00
9	13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske CG	5.000.000,00	100.000,00	6.485.246,73	6.356.755,67	0,00
10	13 025 K01 002 - Izgradnja objekta za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	3.500.000,00	60.000,00	3.063.726,66	2.923.191,28	0,00
11	13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	3.200.000,00	60.000,00	2.257.854,12	2.208.705,71	0,00
12	13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	6.850.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
13	13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	12.000.000,00	1.550.000,00	11.691.852,80	7.810.912,53	1.034.890,58
14	13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	1.100.000,00	1.000.000,00	766.057,97	154.534,91	0,00
15	13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima	1.200.000,00	1.000.000,00	1.184.921,58	521.495,00	253.325,64
16	13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima	1.750.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
17	13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	5.500.000,00	900.000,00	5.079.581,90	0,00	1.015.916,38
18	15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin	40.000.000,00	5.003,00	38.227.263,73	36.195.155,80	2.262,70
19	15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	60.000.000,00	2.300.001,00	22.307.874,22	16.460.552,58	343.158,39
20	15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	29.500.000,00	630.001,00	22.988.503,44	14.289.816,90	301.041,46
21	15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32.000.000,00	2.500.002,00	25.013.128,98	20.640.242,64	1.124.736,71
22	15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	19.000.000,00	5.003,00	14.369.396,91	9.417.468,26	84,70
23	15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32.000.000,00	615.002,00	27.072.084,90	19.747.982,37	509.367,74
24	15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	30.000.000,00	1.010.001,00	10.093.421,35	8.496.014,37	13.974,54
25	15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	5.000.000,00	110.000,00	3.749.568,33	3.319.741,95	0,00
26	15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevi	2.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	5.500.000,00	5.000,00	1.457.672,90	646.562,59	0,00
28	15 019 K01 013 - Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem	25.000.000,00	2.000.001,00	9.495.353,29	4.142.341,70	22.017,33
29	15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	12.000.000,00	5.001,00	44.140,00	0,00	0,00
30	15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	12.500.000,00	500.002,00	12.106.155,12	0,00	0,00
31	15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
32	15 019 K01 030 - Izgradnja gondole od centra Kolašina do Ski centra Kolašin 1600	60.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	20.000.000,00	100.000,00	302.000,00	201.949,00	0,00

34	15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	300.000,00	200.000,00	1.317.969,50	994.050,81	43.106,52
35	15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	300.000,00	200.000,00	2.718.242,25	2.060.708,05	0,00
36	15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	2.000.000,00	1.500.000,00	5.179.767,19	3.339.409,74	1.170.394,66
37	15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	12.950.000,00	500.000,00	3.030.315,96	1.846.298,47	125.836,40
38	15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada	800.000,00	700.000,00	1.982.853,86	1.203.883,06	40.066,57
39	15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	2.000.000,00	1.700.000,00	10.771.946,53	8.722.798,46	1.177.150,73
40	15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	1.500.000,00	1.200.000,00	7.142.006,73	5.922.665,56	1.174.162,66
41	15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	1.000.000,00	900.000,00	5.556.038,02	4.037.474,79	590.847,50
42	15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	11.000.000,00	200.000,00	8.740.673,40	7.250.460,97	851.953,85
43	15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	2.450.000,00	700.000,00	810.000,00	104.176,51	116.379,97
44	15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	11.500.000,00	800.000,00	818.000,00	17.157,80	0,00
45	15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	2.750.000,00	300.000,00	390.000,00	89.128,60	0,00
46	15 030 K01 022 - Izgradnja žičare Lovćen - Cetinje	60.000.000,00	200.003,00	200.003,00	0,00	0,00
47	16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	7.500.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
48	17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	2.200.000,00	158.000,00	2.119.072,58	1.067.362,20	127.707,20
49	17 019 K02 004 - Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1.000.000,00	1.002,00	943.417,02	943.417,02	0,00
50	17 019 K02 006 - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	2.000.000,00	60.200,00	1.984.629,66	1.588.421,66	146.474,73
51	17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	2.515.000,00	56.202,00	2.564.446,82	2.204.403,96	246.855,61
52	17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo)	25.000.000,00	1.050.001,00	19.505.499,22	831.215,16	360.100,08
53	17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	5.000.000,00	10.000,00	6.717.505,51	4.856.620,26	0,00
54	17 020 K04 006 - Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
55	17 020 K04 007 - Rekonstrukcija puta Plav-Bogičevića, Plav	12.000.000,00	1.005.000,00	118.082,83	46.401,46	0,00
56	17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose	16.000.000,00	5.001,00	11.385.553,17	967.155,84	0,00
57	17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	2.550.000,00	310.000,00	2.859.210,43	1.240.700,06	1.086.011,30
58	17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića	5.900.000,00	105.000,00	6.416.743,72	3.917.243,72	1.883.519,05
59	17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna	8.350.000,00	5.000,00	2.483.583,02	246.198,30	0,00
60	17 020 K04 015 - Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	2.500.000,00	5.000,00	1.404.155,82	1.404.155,82	0,00
61	17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	6.200.000,00	1.005.000,00	3.203.766,05	3.203.766,05	0,00
62	17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje	3.500.000,00	205.000,00	1.073.530,26	417.268,47	0,00
63	17 020 K04 029 - Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	5.700.000,00	1.215.000,00	3.480.000,00	3.046.778,52	399.484,52
64	17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	1.300.000,00	5.000,00	1.087.050,44	0,00	0,00
65	17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	2.800.000,00	810.000,00	1.359.527,78	289.716,76	0,00
66	17 020 K04 047 - Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	820.000,00	31.000,00	814.041,89	351.029,90	26.000,00
67	17 020 K04 050 - Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	3.400.000,00	10.000,00	3.514.226,86	3.446.848,30	0,00
68	17 020 K04 059 - Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	700.000,00	105.000,00	579.631,45	141.429,58	0,00
69	17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	10.000.000,00	70.000,00	357.016,55	173.970,78	0,00
70	17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	6.000.000,00	1.020.000,00	4.364.808,55	742.478,57	562.536,57

71	17 020 K04 062 - Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	2.000.000,00	305.000,00	928.000,00	480.730,02	300.000,00
72	17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju	3.600.000,00	5.000,00	1.008.010,00	1.008.010,00	0,00
73	17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	6.000.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
74	17 020 K04 070 - Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75	17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović"	4.000.000,00	5.000,00	2.292.552,56	2.267.422,20	0,00
76	17 020 K04 092 - Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	4.050.000,00	1.004.000,00	3.900.242,04	701.294,51	336.155,33
77	17 020 K04 093 - Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
78	17 020 K04 099 - Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	15.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	800.000,00	400.000,00	780.988,50	260.788,36	0,00
80	17 020 K04 114 - Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
81	17 020 K04 119 - Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću	2.500.000,00	905.000,00	2.500.000,00	703.255,83	68.536,83
82	17 020 K04 130 - Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Čanju	13.500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
83	17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva	3.250.000,00	1.200.000,00	3.250.000,00	1.437.674,81	452.292,64
84	17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L29 (Donje Crkvice-Gornje Crkvice-granica BiH)	300.000,00	205.000,00	200.000,00	181.243,96	0,00
85	17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	2.500.000,00	805.000,00	2.224.772,32	686.698,12	193.451,12
86	17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	7.600.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
87	17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	385.000,00	350.000,00	360.891,12	0,00	0,00
88	17 020 K04 150 - Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	3.500.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
89	17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	4.990.000,00	5.000,00	4.922.278,79	0,00	0,00
90	17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	660.000,00	410.000,00	615.638,62	532.705,74	5.082,00
91	17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	1.300.000,00	305.000,00	997.810,59	932.718,47	54.904,56
92	17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	2.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
93	17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima	1.950.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, BD	870.000,00	560.000,00	534.639,78	0,00	0,00
95	17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u PG	7.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96	17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	2.700.000,00	105.000,00	144.399,60	140.866,27	0,00
97	17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	780.000,00	105.000,00	105.776,91	105.775,04	0,00
98	17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	12.000.000,00	1.050.000,00	595.800,00	83.900,00	0,00
99	17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću	3.210.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
100	17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima	450.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti	2.700.000,00	550.000,00	2.184.813,23	0,00	423.217,05
102	17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	4.500.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
103	17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu	7.000.000,00	810.000,00	3.077.795,24	600.000,00	4.862,65
104	17 020 K04 170 - Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku	2.650.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
105	17 020 K04 171 - Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin	1.000.000,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
106	17 020 K04 172 - Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane	3.700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
107	17 020 K04 173 - Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnjica, Bijelo Polje	3.900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
108	17 020 K04 174 - Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
109	17 020 K04 175 - Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Gušinja	600.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
110	17 020 K04 176 - Rekonstrukcija ulice Donji Pažanj, Kolašin	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
111	17 020 K04 177 - Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu	2.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

112	17 020 K04 178 - Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja	1.750.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
113	17 020 K04 180 - Izgradnja lokalnog puta Tuzi-Mataguži, II faza	4.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
114	17 020 K04 181 - Uređenje korita rijeke Ibar	1.280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
115	17 020 K04 182 - Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku	1.020.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
116	18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	16.000.000,00	5.000,00	15.355.198,99	13.961.203,80	0,00
117	18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	5.000.000,00	10.000,00	4.259.097,24	3.488.389,79	103.124,29
118	18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	5.000.000,00	10.000,00	2.670.497,73	2.215.004,37	0,00
119	18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	15.000.000,00	2.020.002,00	1.472.175,40	1.359.415,32	0,00
120	18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	2.500.000,00	5.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
121	18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	11.000.000,00	550.000,00	9.888.572,03	970.103,01	66.423,05
122	18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvrat životinja sa CITES liste sa zooškim vrtom, Berane	19.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	5.700.000,00	500.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
124	18 003 K01 035 - Vodosnabdijevanje Pljevalja	11.000.000,00	1.500.000,00	8.045.488,04	4.228.000,94	872.514,97
125	18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	2.500.000,00	15.000,00	33.154,00	0,00	0,00
126	18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	2.000.000,00	5.000,00	30.889,58	28.769,66	0,00
127	18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	200.000,00	160.000,00	174.499,88	34.899,98	0,00
128	18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	3.600.000,00	505.000,00	2.987.987,31	968,00	1.694.121,00
129	18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	7.000.000,00	5.000,00	226.009,43	187.551,56	0,00
130	18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje	550.000,00	5.000,00	454.232,15	0,00	0,00
131	18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	600.000,00	260.000,00	312.905,13	135.585,30	0,00
132	18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	590.000,00	340.000,00	13.854,50	0,00	0,00
133	18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	10.000.000,00	305.001,00	272.734,00	0,00	0,00
134	18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevići	500.000,00	290.000,00	164.788,69	68.903,91	13.023,23
135	18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, BA	5.200.000,00	810.001,00	4.946.131,14	0,00	0,00
136	18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	700.000,00	180.000,00	545.169,01	0,00	0,00
137	18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	10.000.000,00	95.001,00	0,00	0,00	0,00
138	18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	5.000.000,00	10.000,00	4.311.820,05	3.421.936,34	0,00
139	18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	4.500.000,00	410.000,00	915.703,62	113.255,25	0,00
140	18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosfere kanalizacije u Mojkovcu	4.520.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	7.800.000,00	510.000,00	12.559,00	0,00	9.655,00
142	18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	2.150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
143	18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnabdijevanja	5.000.000,00	10.002,00	33.334,08	30.914,08	0,00
144	18 003 K01 070 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsićko-Poličkog	900.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
145	18 003 K01 071 - Izgradnja šetališta i kanalizacije od "Titove vile" do Hotela "Iberostar" u Njivicama - faza C	3.650.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
146	18 003 K01 072 - Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaze "Oko" do glavnog gradskog bazena na ŽB	1.650.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
147	18 003 K01 073 - Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku	1.850.000,00	700.000,00	204.834,85	38.595,37	122.980,52
148	18 003 K01 074 - Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

149	18 003 K01 075 - Vodosnadbjevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Šavnik	600.000,00	355.000,00	373.272,32	232.110,30	125.769,55
150	18 003 K01 076 - Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine	600.000,00	500.000,00	11.676,50	0,00	0,00
151	18 003 K01 077 - Adaptacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi	1.200.000,00	620.000,00	15.730,00	0,00	0,00
152	18 003 K01 078 - Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak	310.000,00	305.000,00	259.606,33	150.031,68	0,00
153	18 003 K01 079 - Fekalna i atmosferska kanalizacija za Ski centar Kolašin 1600	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
154	18 003 K01 080 - Glavni kolektor fekalne kanalizacije Ski centar Kolašin 1400	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
155	18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	13.700.000,00	60.000,00	14.028.588,89	13.408.350,66	0,00
156	18 003 K02 003 - Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	4.380.000,00	150.000,00	3.239.312,39	2.592.512,39	436.446,77
157	18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	3.550.000,00	14.000,00	3.547.044,89	3.038.982,86	0,00
158	18 003 K02 011 - Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	751.000,00	1.551,00	731.435,51	714.420,29	0,00
159	18 003 K02 013 - Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	1.290.000,00	48.101,00	1.291.071,89	517.071,89	0,00
160	18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	3.500.000,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00
161	18 003 K02 015 - Podrška u uspostavljanju EIONET sistema u Crnoj gori	700.000,00	42.120,00	700.000,00	0,00	0,00
162	18 003 K02 016 - Podrška u implementaciji INSPIRE direktive	200.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
163	18 004 K01 001 - Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", Podgorica	60.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
164	19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	790.000,00	193.000,00	798.107,87	605.559,18	1.388,69
165	19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	10.000.000,00	10.002,00	5.735.939,80	2.857.585,89	40,47
166	19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	5.000.000,00	10.002,00	1.891.685,98	1.877.904,44	1.475,39
167	19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, PG	7.000.000,00	105.002,00	130.425,90	0,00	0,00
168	19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, PG	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, PG	2.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, PG	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
171	19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	3.800.000,00	5.000,00	61.044,50	27.225,00	0,00
172	19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
173	19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	1.100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
174	19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	5.000.000,00	5.000,00	2.402.729,83	1.958.966,98	16.700,00
175	19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	7.200.000,00	510.002,00	3.612.628,83	1.005.135,59	0,00
176	19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	2.600.000,00	5.000,00	49.019,72	28.055,72	0,00
177	19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20.500.000,00	5.000,00	9.161.981,54	8.905.999,68	0,00
178	19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	6.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
179	19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u PG	6.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, PG	12.000.000,00	5.000,00	16.698,00	0,00	0,00
181	19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	3.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	3.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	2.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekata Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	15.000.000,00	520.000,00	1.388.733,34	1.183.041,57	196.323,12
186	19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić, HN	1.000.000,00	5.000,00	69.938,00	32.620,00	0,00

187	19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	5.600.000,00	510.001,00	5.843.547,85	3.329.408,49	332.712,78
188	19 032 K04 027 - Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću	20.000.000,00	5.000,00	2.211.631,02	0,00	0,00
189	19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	650.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19 032 K04 029 - Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	7.100.000,00	1.005.000,00	9.968.116,10	3.759.438,59	876.267,93
191	19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	5.760.000,00	1.005.000,00	4.811.651,47	1.861.749,24	32.375,51
192	19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đlački prevoz u Opštini Nikšić	500.000,00	505.000,00	499.596,90	0,00	499.596,90
193	19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru	300.000,00	250.000,00	269.981,25	0,00	0,00
194	19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, Opština Bar	1.550.000,00	1.010.000,00	1.196.590,33	659.999,61	0,00
195	19 032 K04 047 - Izgradnja fiskultume sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	3.000.000,00	510.000,00	2.348.223,75	0,00	469.644,75
196	19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ “Bajo Jojić” u Andrijevi	4.000.000,00	5.000,00	32.246,50	13.794,00	18.452,50
197	19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	10.000.000,00	520.000,00	34.721,40	25.168,00	0,00
198	19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	2.500.000,00	5.000,00	51.413,60	18.550,00	0,00
199	19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	4.860.000,00	1.000.000,00	7.214.609,26	3.008.697,50	991.443,16
200	19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ “Radomir Mitrović” - područno odjeljenje u Donjim lugama, Berane	5.500.000,00	210.000,00	374.794,83	73.070,31	104.686,84
201	19 032 K04 055 - Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	1.400.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
202	19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	2.050.000,00	420.000,00	1.995.231,81	0,00	395.916,69
203	19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ “Oktoih”, Podgorica	2.000.000,00	1.520.000,00	2.848.945,98	10.043,98	0,00
204	19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	3.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	19 032 K04 059 - Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima	1.235.000,00	500.000,00	1.046.813,16	161.216,32	326.419,93
206	19 032 K04 060 - Adaptacija školskog dvorišta SEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica	176.000,00	176.000,00	174.514,59	98.722,77	60.590,16
207	19 032 K04 061 - Adaptacija krova i vrtića JPU “Vukosava Ivanović”, Bar	373.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
208	19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	6.700.000,00	5.000,00	6.005.438,55	5.975.388,86	0,00
209	19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	5.000.000,00	10.000,00	241.556,73	46.886,00	484,00
210	19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	6.000.000,00	5.000,00	4.713.850,05	0,00	0,00
211	19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	4.000.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
212	19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru	4.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213	19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama	5.200.000,00	1.550.000,00	4.825.882,70	1.499.786,62	158.487,06
214	19 038 K01 010 - Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru	18.250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
215	19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	19 038 K01 013 - Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom	26.500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
217	19 038 K01 014 - Natrkivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici	10.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
218	19 038 K01 015 - Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u Centar za smještaj sportista, PV	14.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219	19 038 K01 016 - Izgradnja zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima	9.700.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
220	19 038 K01 017 - Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero , Pljevlja	12.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici	13.000.000,00	10.000,00	13.705.516,79	12.382.069,02	234.690,30
222	19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	2.300.000,00	305.001,00	1.318.334,17	623.554,09	300.000,00
223	19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	2.500.000,00	510.001,00	2.339.184,41	0,00	459.076,48
224	20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta “Dvorca Kralja Nikole” u Nikšiću	5.000.000,00	10.000,00	1.869.621,06	1.726.869,08	0,00
225	20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata funkciji razvoja kulture	5.000.000,00	10.001,00	826.514,92	160.018,93	0,00
226	20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar , Nikšić	5.000.000,00	55.001,00	3.192.111,13	3.176.756,90	0,00
227	20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldre u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	1.800.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
228	20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	330.000,00	215.000,00	26.559,00	17.000,00	0,00
229	20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	3.800.000,00	5.000,00	2.892.779,88	0,00	0,00

230	20 021 K01 031 - Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	750.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
231	20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	20.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	1.000.000,00	5.000,00	743.043,65	10.341,85	0,00
233	21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu	4.900.000,00	820.001,00	2.190.075,06	346.201,13	431.147,61
234	21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40.000.000,00	2.000.001,00	38.799.387,75	104.185,65	3.777,76
235	21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica	21.000.000,00	455.000,00	454.815,18	88.865,18	1.815,84
236	21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	2.100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	2.400.000,00	1.050.000,00	422.290,00	422.290,00	0,00
238	21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	15.000.000,00	125.007,00	111.560,79	48.400,00	0,00
239	21 011 K01 012 - Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	825.000,00	370.001,00	540.420,78	36.559,82	25.139,43
240	21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	1.200.000,00	5.001,00	425.859,47	0,00	14.340,22
241	21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	3.000.000,00	550.001,00	1.308.601,58	282.036,21	0,00
242	21 011 K01 016 - Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	15.000.000,00	105.000,00	844.816,97	46.794,93	0,00
243	21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane	740.000,00	5.000,00	535.524,29	425.546,80	0,00
244	21 011 K01 018 - Adaptacija Doma zdravlja Budva	1.300.000,00	420.000,00	1.139.475,83	400,00	224.684,90
245	21 011 K01 021 - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	920.000,00	5.000,00	1.132.734,16	1.011.665,84	4.000,00
246	21 011 K01 026 - Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju	4.200.000,00	5.000,00	30.572,19	30.572,19	0,00
247	21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	360.000,00	360.000,00	358.160,00	0,00	0,00
248	21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	780.000,00	100.000,00	742.539,74	651.995,44	0,00
249	21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	800.000,00	260.000,00	21.780,00	0,00	0,00
250	21 011 K01 031 - Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	750.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	21 011 K01 032 - Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	3.900.000,00	505.000,00	3.802.304,00	0,00	0,00
252	21 011 K01 033 - Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonantologiju Instituta za bolesti djece	5.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	21 011 K01 034 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	5.000.000,00	5.000,00	18.536,37	18.536,37	0,00
254	21 011 K01 035 - Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici	199.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
255	21 011 K01 036 - Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje	1.530.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
256	21 011 K01 037 - Sistem grijanja i hlađenja u JZU "Dom zdravlja Cetinje"	300.000,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
257	21 011 K01 038 - Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
258	21 011 K01 039 - Adaptacija i rekonstrukcija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG	1.220.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
259	21 011 K01 040 - Adaptacija prostorija u OB Bar za potrebe programa BabyFriendly	730.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
260	21 011 K01 041 - Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku	160.000,00	165.000,00	190.157,32	0,00	0,00
261	21 011 K01 042 - Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšić	600.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
262	21 011 K01 043 - Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić	730.000,00	520.000,00	706.635,64	0,00	140.153,43
263	21 011 K01 044 - Adaptacija DZ Kolašin	325.000,00	325.000,00	9.559,00	0,00	0,00
264	21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	9.205.000,00	590.002,00	10.937.217,10	8.650.292,30	919.809,21
265	21 011 K02 002 - Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	2.100.000,00	12.967,00	1.965.296,72	1.965.296,72	112.571,52
266	21 011 K02 004 - Radovi na izgradnji operativnog centra	2.200.000,00	2.500,00	2.193.893,47	1.985.226,09	0,00
267	22 025 K01 007 - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1.700.000,00	825.000,00	1.659.873,74	816.108,24	218.901,02
268	22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	1.200.000,00	495.000,00	903.154,10	285.866,67	62.028,70
270	22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu	4.150.000,00	700.000,00	3.476.133,36	1.727.251,08	252.351,01
271	22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	1.450.000,00	515.000,00	17.224,35	0,00	484,00
		1.901.320.000,00	115.000.000,00	666.333.689,16	373.317.686,10	28.230.817,20

Rb	Programski kod i naziv projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj (organizacioni kod 42703)	Procijenjena vrijednost	Iznos predviđen za 2025. god.	Ugovorena vrijednost	Realizovano do 2025. god.	Izvršenje u 2025. god.
1	17 020 K01 002 - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	67.800.000,00	90.000,00	66.651.638,76	64.168.858,95	461.907,46
2	17 020 K01 004 - Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići	9.330.000,00	3.090.000,00	7.788.247,52	2.559.724,64	413.493,49
3	17 020 K01 006 - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i B.Polja	19.000.000,00	601.000,00	1.492.960,00	0,00	0,00
4	17 020 K01 009 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova	34.500.000,00	4.065.000,00	29.157.013,38	28.547.094,78	337.608,68
5	17 020 K01 010 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara	75.500.000,00	5.001.001,00	53.915.261,77	8.484.526,23	4.704.711,73
6	17 020 K01 011 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	65.600.000,00	4.000.000,00	35.731.859,52	23.604.484,90	4.692.159,68
7	17 020 K01 013 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar	25.000.000,00	88.002,00	49.610,00	0,00	0,00
8	17 020 K01 014 - Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo	39.550.000,00	2.075.000,00	33.339.227,09	36.870.448,65	1.240.684,02
9	17 020 K01 016 - Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza	16.150.000,00	160.000,00	168.190,00	142.961,50	0,00
10	17 020 K01 017 - Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor	40.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
11	17 020 K01 018 - Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - Vragodo	4.000.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	17 020 K01 019 - Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje	7.250.000,00	570.000,00	7.611.934,02	6.446.237,20	120.274,83
13	17 020 K01 021 - Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac	48.650.000,00	205.000,00	0,00	0,00	18.476,50
14	17 020 K01 022 - Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute	15.000.000,00	2.820.000,00	12.071.988,04	1.477.223,38	1.590.213,25
15	17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	10.000.000,00	1.020.000,00	601.683,12	0,00	1.810.482,01
16	17 020 K01 027 - Putni prelazi	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	17 020 K01 028 - Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije	25.000.000,00	1.920.001,00	0,00	0,00	341.795,32
18	17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari	8.322.000,00	241.001,00	6.747.238,00	0,00	0,00
19	17 020 K01 035 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska	2.300.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
20	17 020 K01 036 - Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice	24.480.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
21	17 020 K01 037 - Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir	24.720.000,00	205.000,00	107.690,17	97.890,19	0,00
22	17 020 K01 040 - Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Pljevlja-Mihajlovica, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje	1.500.000,00	300.001,00	1.492.960,00	1.213.300,00	0,00
23	17 020 K01 041 - Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz	3.000.000,00	300.000,00	2.488.905,00	2.363.098,76	268.212,23
24	17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna	1.100.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
25	17 020 K01 043 - Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	69.600.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00
26	17 020 K01 045 - Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)	10.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	17 020 K01 046 - Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju	5.510.000,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00
28	17 020 K01 048 - Rekonstrukcija dijela puta Podgorica – Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik	19.400.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
29	17 020 K01 057 - Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka	34.000.000,00	305.000,00	150.400,00	24.296,50	0,00
30	17 020 K01 058 - Rekonstrukcija tunela Vrmac	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	17 020 K01 063 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	14.600.000,00	98.000,00	88.850,30	0,00	0,00
32	17 020 K01 065 - Izrada rasvjete u tunelu "Ključ" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin	240.000,00	306.000,00	239.789,63	182.707,85	26.229,87
33	17 020 K01 066 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen	630.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
34	17 020 K01 067 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva	5.000.000,00	700.000,00	947.938,62	352.331,39	299.998,60
35	17 020 K01 070 - Uvođenje Inteligentnih transportnih sistema (ITS) na magistralnim i regionalnim putevima	1.550.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

36	17 020 K01 072 - Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica - Bioča	14.350.000,00	1.500.000,00	11.471.201,29	1.134.112,63	0,00
37	17 020 K01 073 - Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate	14.200.000,00	3.350.000,00	11.078.319,29	29.096.687,81	747.688,62
38	17 020 K01 078 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han	6.000.000,00	610.000,00	0,00	0,00	661,62
39	17 020 K01 079 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-Jasenovo polje	15.220.000,00	2.090.000,00	15.119.820,29	3.502.105,29	3.151.446,29
40	17 020 K01 081 - Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi	12.000.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
41	17 020 K01 082 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-11 Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“-izgradnja bulevara	35.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
42	17 020 K01 083 - Rekonstrukcija mag.puta M-1, dionica Sutomore-ulaz u Bar – izgradnja Bulevara	19.230.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
43	17 020 K01 091 - Izgradnja tunela „Lokve“	20.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44	17 020 K01 092 - Unapređenje baze putnih podataka	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
45	17 020 K01 096 - Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane - Riđani	7.100.000,00	1.080.000,00	6.427.593,88	0,00	0,00
46	17 020 K01 097 - Rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići – R.Crnojevića sa rekonstrukcijom kamenog mosta	17.500.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	34.175,64
47	17 020 K01 099 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane – Rožaje	89.000.000,00	504.002,00	0,00	0,00	0,00
48	17 020 K01 118 - Adaptacija regionalnog puta R-13 Podgorica - Mateševo, dionica Bioče-Veruša	21.500.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
49	17 020 K01 120 - Rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi-Podgorica, od apoteke do skretanja za Sukuruć	2.176.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
50	17 020 K01 121 - Adaptacija regionalnog puta Mateševo-Andrijevića, prevoj Trešnjevnik	1.650.000,00	510.000,00	1.504.972,89	245.553,50	0,00
51	17 020 K01 122 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka na ulazu u Virpazaru	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52	17 020 K01 123 - Izgradnja magistralnog puta Podvade - Trpezi - Kalače, I faza	6.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53	17 020 K01 124 - Izgradnja magistralnog puta Petnjica - Haništa sa graničnim prelazom sa Srbijom	30.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	17 020 K01 125 - Izrada rasvjete u tunelu "Mogren"	550.000,00	510.000,00	401.965,65	39.847,12	405.941,32
55	17 020 K01 126 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-18 Bar-Sutorman-Virpazar	64.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
56	17 020 K02 001 - Obilaznica Rožaje, II faza	33.640.000,00	3.100.000,00	19.778.320,09	17.516.617,65	0,00
57	17 020 K02 007 - Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić	30.245.000,00	2.080.000,00	14.548.800,98	912.776,54	0,00
58	17 020 K02 008 - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane - Grnčar	361.000,00	61.000,00	312.231,03	301.007,94	11.223,11
59	17 020 K03 001 - Autoput Bar-Boljare	650.000.000,00	100.016.000,00	0,00	0,00	53.795,04
60	17 020 K03 002 - Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61	17 020 K05 003 - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica	350.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
62	17 020 K05 004 - Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	1.540.000,00	304.000,00	812.755,62	0,00	0,00
63	17 020 K05 010 - Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina	990.000,00	5.000,00	20.267,50	19.416,26	0,00
64	17 020 K05 012 - Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin	1.655.000,00	408.000,00	24.079,00	23.019,52	0,00
65	17 020 K05 014 - Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina	5.000.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
66	17 020 K05 015 - Sanacija kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac	11.100.000,00	2.055.000,00	10.668.563,67	4.617.478,79	1.518.830,29
67	17 020 K05 016 - Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	2.300.000,00	320.000,00	11.253,00	10.217,72	12.864,16
68	17 020 K05 018 - Sanacija mosta Kruč na magistralnom putu Bar –Ulcinj	1.830.000,00	320.000,00	32.065,00	32.065,00	0,00
69	17 020 K05 019 - Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj	1.020.000,00	315.000,00	32.065,00	32.065,00	0,00
70	17 020 K05 020 - Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na magistralnom putu Šćepan polje-Plužine,	2.500.000,00	260.000,00	33.600,00	0,00	0,00
71	17 020 K05 022 - Sanacija klizišta „Dobrakovo	6.465.000,00	1.020.000,00	5386946,6	4825543,3	873508,89
72	17 020 K05 025 - Sanacija kosine „Galev krš“ na reg.putu Đurđevića Tara -Mojkovac, sa prilaznicama	1.000.000,00	450.000,00	36675,1	0	0
73	17 020 K05 026 - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na reg.putu Đurđevića Tara – Mojkovac, sa prilaznicama	940.000,00	365.000,00	45617	0	0
74	17 020 K05 027 - Sanacija kosina na reg.putu R-24 Buča - Lubnice	2.700.000,00	370.000,00	0	0	0
75	17 020 K05 030 - Sanacija klizišta na regionalnom putu R-20, Berane-Kalače-Petnjica	310.000,00	310.000,00	178911,69	0	842,06
		1,890,004,000.00	165,000,013.00	358,769,409.51	238,843,698.99	23,137,224.71
