




Ministarstvo finansija

Izveštaj o realizaciji Kapitalnog budžeta u 2025. godini

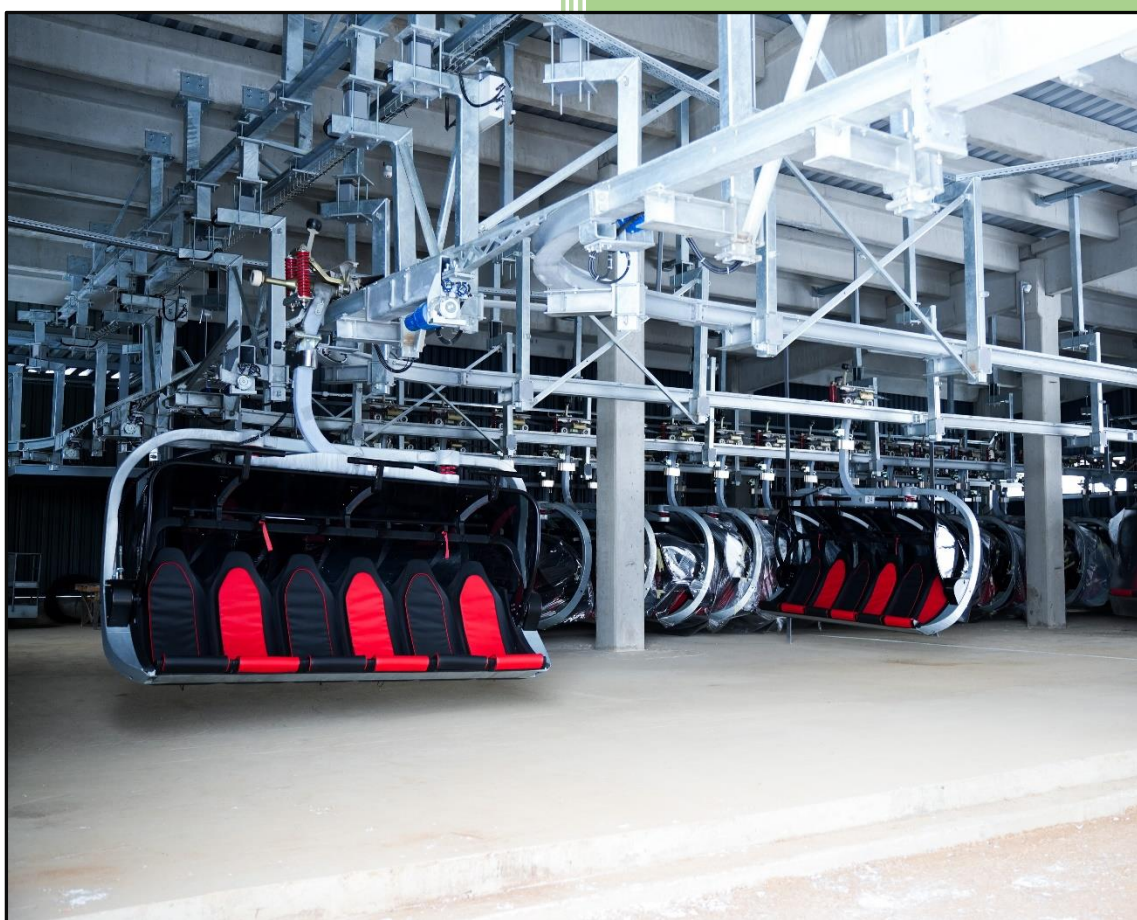

Izveštaj o realizaciji Kapitalnog budžeta u 2025. godini

Pravni osnov: Zakon o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Službeni list CG", br. 11/2025)

Opredijeljeni iznos za realizaciju Kapitalnog budžeta u 2025. godini: **280.000.013,00 €**

Ukupno ostvarena realizacija Kapitalnog budžeta u 2025. godini: **223.184.494,69 €**

Potrošnja Ministarstva javnih radova u 2025. godini: **123.793.416,44 €**

Potrošnja Uprave za saobraćaj u 2025. godini: **99.391.078,25 €**

Deset najznačajnijih projekata koji su završeni u 2025. godini:

- Adaptacija objekta Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću;
- Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat;
- Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor“, Podgorica;
- Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici;
- Rekonstrukcija i adaptacija JZU „Vaso Čuković“ Risan;
- Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac;
- Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo, dionica Cetinje-Čevo;
- Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Mijakovići, Pljevlja;
- Rekonstrukcija magistralnog puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane;
- Sanacija klizišta "Dobrakovo", Kolašin.

Ključni projekti čija realizacija je bila intezivna u 2025. godini:


- Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat - Jaz, izgradnja bulevara;
- Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute;
- Izgradnja puta Petlja Veruša - Lopate;
- Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros - Vladimir;
- Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine – Nikšić – Danilovgrad, dionica Zaborje - Jasenovo polje;
- Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić;
- Sanacija kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac;
- Dogradnja kompleksa UIKS-a u Danilovgradu;
- Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru;
- Izgradnja Ski centara na lokalitetima: „Cmiljača“ B.Polje, „Žarski“ Mojkovac i „Hajla“ Rožaje;
- Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje;
- Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica;
- Vodosnadbijevanje Pljevalja;
- Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, Berane;
- Izgradnja vrtića u Baru koji se finansira iz kredita CEB-a;
- Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju;
- Izgradnja sportske zone u Kolašinu;
- Izgradnja sportske hale u Plužinama;
- Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača;
- Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima;
- Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru;
- Izgradnja Doma starih u Plavu.

Realizacija kapitalnog budžeta na kraju četvrtog kvartala 2025. godine

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Službeni list CG", br. 11/2025) za **Kapitalni budžet** su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **280 miliona eura**, što je za 33 miliona više u odnosu na Kapitalni budžet za 2024. godinu. Navedeni iznos je planiran za realizaciju 346 aktivnosti (projekata) ukupne procijenjene vrijednosti 4,114 milijardi eura, koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj i Ministarstva javnih radova (bivša Uprava za kapitalne projekte). Od ukupno opredijeljenog iznosa za Kapitalni budžet u 2025. godini čak 100 miliona eura (35% od ukupnog Kapitalnog budžeta) je planirano za nastavak izgradnje projekta „Autoput Bar-Boljare“, odnosno za početak realizacije druge dionice od Mateševa do Andrijevice, a koja se sprovodi po tenderskim procedurama EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj).

Na kraju četvrtog kvartala 2025. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore **potrošeno je 223.184.494,69€** ili 80% od ukupno zakonski planiranog iznosa, od čega je 201,32 mil.€ plaćeno iz opštih prihoda budžeta, dok je 15,01 mil.€ povučeno iz namjenski ugovorenih kredita, a 5,19 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti) i 1,60 mil.€ iz donacija (Grafik 1).

Grafik 1: Pregled izvršenja Kapitalnog budžeta u 2025. po svim izvorima finansiranja

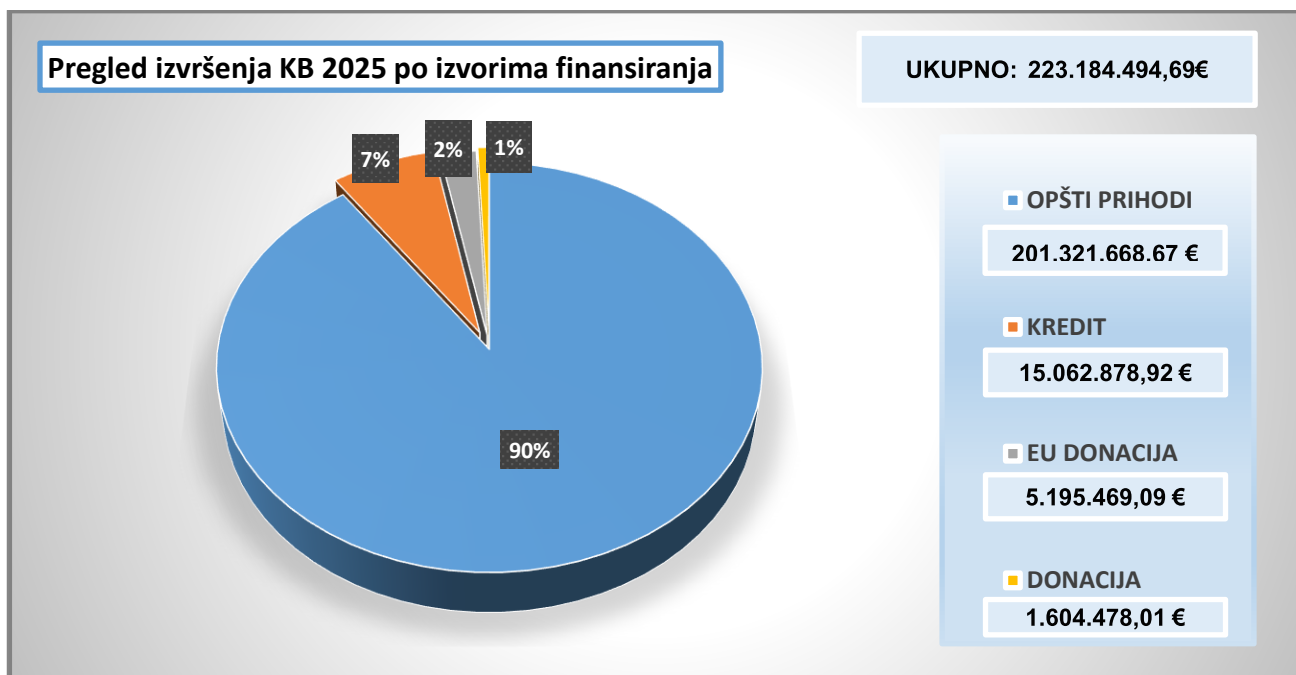

Imajući u vidu da je u prva dva mjeseca tekuće godine na snazi bilo privremeno finansiranje usljed ne usvajanja Zakona o budžetu za 2025. godinu, kao i strukturalne promjene u Vladi (transformacija Uprave za kapitalne projekte u Ministarstvo javnih radova), odloženo je započinjanje aktivnosti na novim projektima što je za posljedicu imalo slabiju realizaciju na kraju drugog kvartala. Međutim, u drugoj polovini godine inteziviranim aktivnostima implementacionih jedinica došlo do ubrzanja dinamike realizacije na mnogim projektima, što je nadalje uslovalo potrebu za većim iznosom sredstava iz opštih prihoda u odnosu na prvobitno planirane.

Shodno tome, Ministarstvo finansija je nakon detaljne analize na kraju trećeg kvartala, uz procjenu da zbog složenih tenderskih procedura do kraja godine neće doći do potpisivanja ugovora sa najboljim ponuđačem za izgradnju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice a samim tim i do potrebe plaćanja planiranog avansa, predložilo Vladi da odobri realokaciju neutrošenih sredstava u iznosu od 45 mil.€, kojim je implementacionim jedinicama omogućena veća potrošnja iz opštih prihoda kroz izmjene tekuće potrošnje, a sve u cilju nesmetanog izvođenja radova i redovnog izmirivanja dospelih obaveza (Tabela 1).

Tabela 1: Izvršenje Kapitalnog budžeta po potrošačkim jedinicama

Potrošačka jedinica	Izvor finansiranja	Zakon za 2025.	Tekući za 2025.	Izvršenje 2025.	Izvršenje 2024.
MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA	OPŠTI PRIHODI	114.999.908,00	135.599.907,50	115.772.170,97	113.718.371,19
	KREDIT	53,00	53,00	1.221.298,37	4.996.081,77
	EU DONACIJA	35,00	34,50	5.195.469,09	12.599.475,87
	DONACIJA	4,00	5,00	1.604.478,01	0,00
	UKUPNO	115.000.000,00	135.600.000,00	123.793.416,44	131.313.928,83
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ	OPŠTI PRIHODI	75.000.003,00	99.400.003,00	85.549.497,70	73.526.054,08
	KREDIT	45.000.009,00	9,00	13.841.580,55	24.032.777,17
	EU DONACIJA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	279.285,00
	DONACIJA	1,00	1,00	0,00	0,00
	NAMJENSKI	0,00	0,00	0,00	22.499.302,00
	UKUPNO	165.000.013,00	144.400.013,00	99.391.078,25	120.337.418,25
UKUPNO	svi izvori	280.000.013,00	280.000.013,00	223.184.494,69	251.651.347,08

Potrošnja iz opštih prihoda: Nakon preusmjeravanja koje je Vlada u novembru 2025. godine odobrila u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, potrošačkim jedinicama je omogućeno dodatnih 45 miliona iz opštih prihoda što je na kraju rezultiralo potrošenju iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 201,3 mil.€ (106% u odnosu na plan), odnosno 11,3 miliona eura više u odnosu na inicijalno planiranih 190 mil.€.

Izluzimajući sredstva u iznosu od 105 mil.€, koja su bila opredijeljena za realizaciju projekata u okviru potprograma „17 020 K03 – Izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica“, a koje u skladu sa odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu realizuje „Monteput DOO“ na osnovu sporazuma sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom saobraćaja, ukupno izvršenje Kapitalnog budžeta u 2025. godini po svim izvorima finansiranja iznosilo je 198,7 mil.€, što je 114% u odnosu na planiranih 175 mil.€ (Tabela 2).

Imajući u vidu da je u 2024. godini za potrebe eksproprijacije druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice na namjenskom depozitnom računu uplaćeno 28,52 mil.€, od čega 22,5 mil.€ namjenskih pdihoda po osnovu posebnog „Programa ekonomskog državljanstva“, realna potrošnja za tekuće i kapitalne izdatke iz Kapitalnog budžeta iz opštih prihoda je iznosila 178,4 mil.€ (91% u odnosu na plan), što je za 20,3 mil.€ manje u odnosu na 2025. godinu.

Tabela 2: Izvršenje Kapitalnog budžeta ostvareno iz opštih prihoda budžeta

OPŠTI PRIHODI	Zakon za 2025.	Izvršenje 2025.	%	Zakon za 2024.	Izvršenje 2024.	%
Ukupno sa autoputom	189.999.911,00	201.321.668,67	106%	236.980.133,75	209.743.727,27	89%
Ukupno bez autoputa	174.983.911,00	198.745.993,65	114%	196.744.133,75	178.370.653,90	91%

Realizacija sredstva iz EU donacija: Ostvarena je u iznosu od 5,2 mil.€, što je za čak 7,68 mil.€ manje u odnosu na 2024. godinu iz razloga što su u prošloj godini završena dva velika IPA projekta (dvije klinike i operativni centar u Podgorici). Međutim, u odnosu na prethodnu uporednu godinu kada nije bilo **realizacije sredstava iz donacija** u 2025. godinu ostvaren je iznos od 1,6 mil.€ koji se odnosio na sufinansiranje izgradnje Osnivne škole Vladimir Nazor u Podgorici.


Povlačenje sredstava iz ugovorenih kredita: Ostvareno je do ukupnog iznosa od 15 mil.€, što je za čak 14 mil.€ manje nego prethodne godine kada je od ukupnih 29 skoro 15 miliona eura otišlo na plaćanje dionice Lepenac – Berane za koju je u 2025. godini plaćeno 4,88 mil.€, dok je za Tivat – Jaz potrošeno 8,84 mil.€, a 1,04 mil.€ za vrtić u Baru.

Tabela 3: Pregled Izvršenja Kapitalnog budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

Kapitalni budžet za 2025.				Opšti prihodi budžeta		
Stavka izdatka	Svi izvori finansiranja					
	Zakon za 2025.	Tekući za 2025.	Izvršenje	Zakon za 2025.	Tekući za 2025.	Izvršenje
4144 - Bankarske usluge i negativne kursne razlike	12.140,00	12.140,00	327,98	12.140,00	12.140,00	327,98
4146 - Advokatske, notarske i pravne usluge	5.090.000,00	895.000,00	532.139,22	5.090.000,00	895.000,00	532.139,22
4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije	24.064.669,00	18.171.166,92	10.552.299,30	24.064.618,00	18.171.115,92	7.669.718,56
4199 - Ostalo	670.000,00	842.400,00	836.055,90	670.000,00	842.400,00	836.055,90
4411 - Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	139.236.006,00	123.495.906,00	89.660.051,50	49.236.000,00	78.495.900,00	75.818.470,95
4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu	53.626.423,00	62.440.465,83	54.040.271,68	53.626.423,00	62.440.465,83	54.040.271,68
4413 - Izdaci za građevinske objekte	45.247.475,00	52.283.622,25	49.939.401,79	45.247.438,00	52.283.584,75	45.694.594,80
4415 - Izdaci za opremu	5.855.281,00	8.527.981,00	8.657.892,45	5.855.273,00	8.527.973,00	7.764.034,71
4419 - Ostali kapitalni izdaci	6.198.019,00	13.331.331,00	8.966.054,87	6.198.019,00	13.331.331,00	8.966.054,87
UKUPNO	280.000.013,00	280.000.013,00	223.184.494,69	189.999.911,00	234.999.910,50	201.321.668,67

Realizacija po ekonomskoj klasifikaciji: Što se tiče potrošnje Kapitalnog budžeta u 2025. godini po ekonomskoj klasifikaciji najveći iznos novca je isplaćen za infrastrukturu od opšteg značaja (regionalni i magistralni putevi, autoputevi i brze saobraćajnice) u iznosu od 89,66 mil.€, od čega je 75,82 mil.€ iz opštih prihoda budžeta. Za lokalnu infrastrukturu je potrošeno 54,04 mil.€ svih iz opštih prihoda, dok je za građevinske objekte izdvojeno 49,94 mil.€ od čega 45,69 mil.€ iz opštih prihoda. Za opremu je plaćeno 8,66 mil.€ (7,76 mil.€ iz opštih), za eksproprijaciju 8,97 mil.€, dok je za izradu projektne dokumentacije i druge konsultantske usluge potrošeno 24,06 mil.€ od čega je 7,67 mil.€ iz opštih prihoda (Tabela 3).

Grafik 2: Uporedni prikaz izvršenja Kapitalnog budžeta u 2025. i 2024. godini

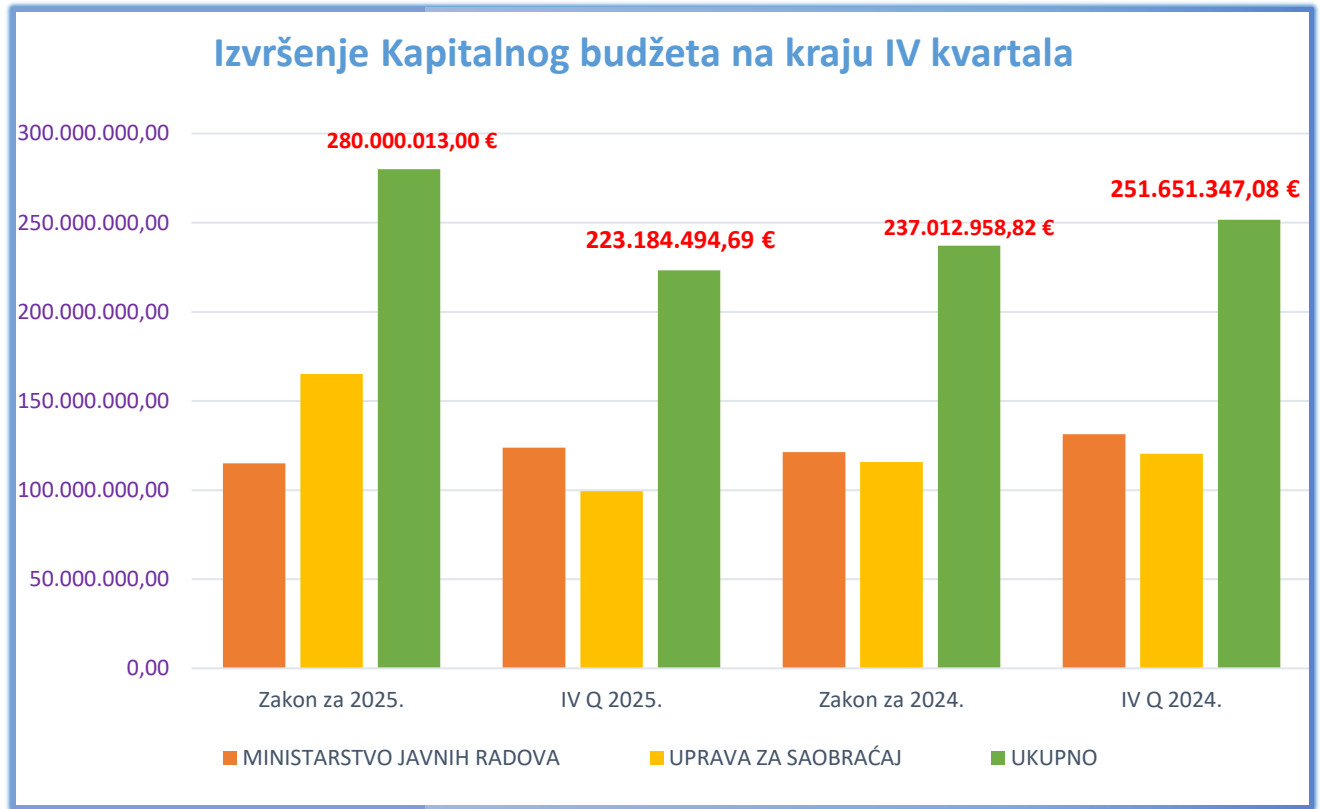

- ✓ **U okviru kapitalnog budžeta Ministarstva javnih radova**, za sprovođenje 271 projekta (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 1,939 milijardi eura, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu opredijeljeno je 115,00 mil.€, što je 41% od ukupnog Kapitalnog budžeta za 2025. godinu.


Na kraju četvrtog kvartala 2025. godine za projekte koje realizuje Ministarstvo javnih radova plaćeno je ukupno 123,23 mil.€, odnosno 108% od ukupne zakonski planirane sume (115 mil.€), od čega je potrošnja iz opštih prihoda budžeta iznosila 115,77 mil. € što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu (Grafik 2 i 3).

Dodatno, Ministarstvo finansija je u cilju dodatne podrške razvoju infrastrukture lokalnih samouprava, realokacijom sredstava omogućilo nesmetanu realizaciju svih sklopljenih ugovora između opština i Ministarstva javne uprave u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, te je shodno tome za potrebe aktivnosti „Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (programski kod 17 020 K04 002)“ na kraju godine plaćeno 17,81 mil.€.

Najznačajniji projekti koji su završeni u 2025. godinu iz nadležnosti Ministarstva javnih radova sa ukupno ugovorenim iznosom (projektovanje, radovi, nadzor, oprema i eksproprijacija):

- Adaptacija objekta Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću - ugovoreno 2.211.631,02 €;
- Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima Tivat - ugovoreno 4.811.651,48 €;
- Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor“ Podgorica, ugovoreno 6.968.116,10 €;
- Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici - ugovoreno 5.843.547,85 €;
- Rekonstrukcija Doma digitalne revolucije u Nikšiću - ugovoreno 1.187.682,09 €;
- Rekonstrukcija objekta "Dvorca Kralja Nikole" u Nikšiću, I faza - ugovoreno 1.869.621,06€;
- Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan - ugovoreno 2.337.353,44 €;
- Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka, Žabljak - ugovoreno 1.359.527,78 €;
- Rekonstrukcija kasarne "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima - ugovoreno 1.182.501,58€;
- Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac - ugovoreno 4.371.820,05 €;
- Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bečići - ugovor 3.567.093,31€.

Grafik 3: Uporedni prikaz izvršenja Ministarstva i Uprave po izvorima finansiranja

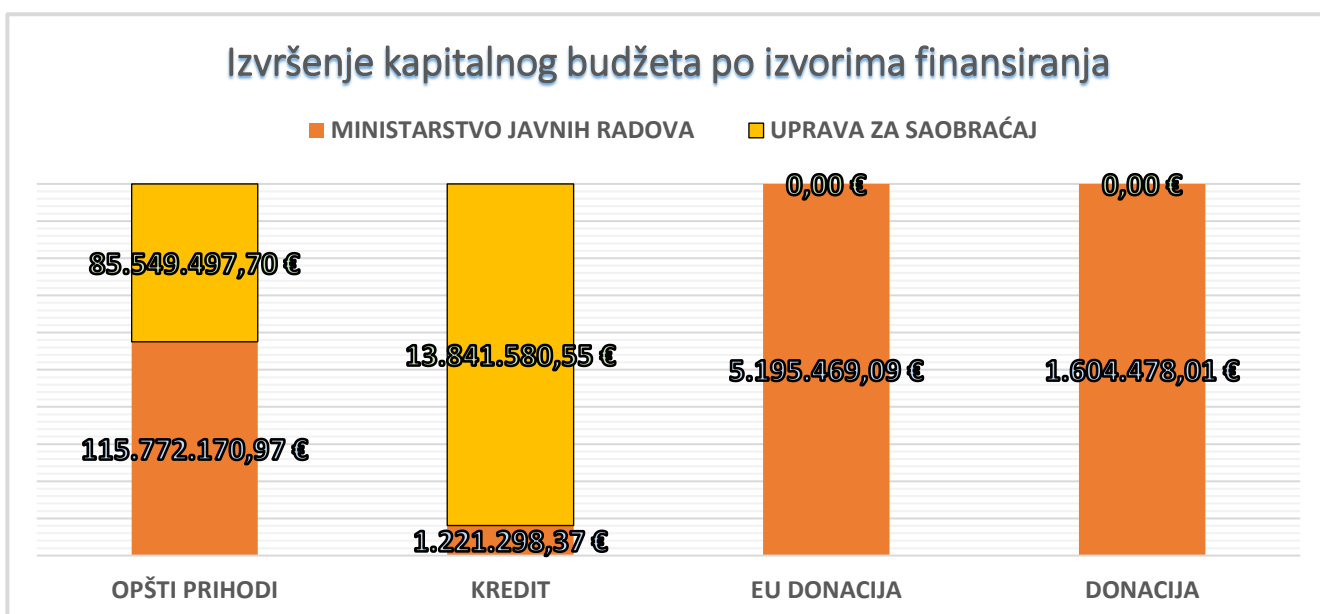

- ✓ **U okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 165,00 mil.€ (59% od ukupno planiranog Kapitalnog budžeta) za realizaciju 75 projekata ukupne procijenjene vrijednosti 2,175 milijardi eura. Za sprovođenje 73 projekta (procijenjene 1,238 milijardi eura) opredijeljeno je 60 mil.€ (21% ukupnog Kapitalnog budžeta), dok je za projekat "Autoput Bar-Boljare", izgradnju dionice Mateševo-Andrijevića (procijenjene 650 mil.€) i projekat „Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice“ (procijenjene 287 mil.€) opredijeljeno 105 mil.€ (38% od ukupnog Kapitalnog budžeta) za čiju realizaciju je nadležan „Montepuz DOO“.

Na kraju četvrtog kvartala 2025. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je 99,39 mil.€, odnosno 60% od ukupne zakonski planirane sume od 165 mil.€, od kojih je 105 miliona bilo namijenjeno za autoput i brze saobraćajnice koje realizuje „Montepuz DOO“. Povlačenje kreditnih sredstava je iznosilo 13,84 mil.€, što je za 10,19 mil.€ manje u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu (Grafik 2 i 3).

Potrošačka jedinica	Izvor finansiranja	Zakon za 2025.	Tekući za 2025.	Izvršenje 2025.	Izvršenje 2024.
Uprava za saobraćaj bez projekata koje realizuje Montepuz	OPŠTI PRIHODI	59.984.003,00	86.745.003,00	82.973.822,68	64.652.282,71
	KREDIT	9,00	9,00	13.841.580,55	24.032.777,17
	EU DONACIJA	0,00	0,00	0,00	279.285,00
	DONACIJA	1,00	2,00	3,00	0,00
	UKUPNO	59.984.013,00	86.745.014,00	96.815.406,23	88.964.344,88

Dakle, posmatrajući samo realizaciju projekata koji su u isključivoj nadležnosti Uprave za saobraćaj, ukupna potrošnja je iznosila 96,81 mil.€, odnosno 161% u odnosu na opredijeljenja sredstva inicijalnim zakonom (59,98 mil.€), što je na kraju za 7,85 mil.€ više u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je realizacija kreditnih sredstava je bila manja, potrošnja iz opštih prihoda budžeta je iznosila 82,97 mil.€ što je za 18,32 mil.€ više u poređenju sa prethodnom fiskalnom godinom. U procentualnom iznosu izvršenje budžetskih sredstava kod Uprave za saobraćaj je bilo na nivou od 138% u odnosu na zakonom planiranih 59,98 mil.€, odnosno 96% u odnosu na raspoloživa sredstva nakon preusmjeravanja tokom fiskalne godine (86,74 mil.€).

Najznačajniji projekti koji su završeni u 2025. godinu iz nadležnosti Uprave za saobraćaj sa ukupno ugovorenim iznosom (projektovanje, radovi, nadzor, oprema i eksproprijacija):

- Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo, dionica Cetinje-Čevo – ugovoreno 38.903.782,77 €;
- Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Mijakovići, Pljevlja – ugovoreno 7.970.576,07 €;
- Rekonstrukcija magistralnog puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane – ugovoreno 56.670.221,22 €;
- Adaptacija regionalnog puta Mateševo-Andrijevića, prevoj Trešnjevnik – ugovoreno 1.565.411,25 €;
- Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik – ugovoreno 851.357,04 €;
- Sanacija klizišta "Dobrakovo", Kolašin – ugovoreno 6.161.458,50 €.

MONTEPUT DOO	Izvor finansiranja	Zakon za 2025.	Tekući za 2025.	Izvršenje 2025.	Izvršenje 2024.
Autoputevi i brze saobraćajnice (Potprogram 17 020 K03)	OPŠTI PRIHODI	15.016.000,00	12.655.000,00	2.575.675,02	8.873.771,37
	KREDIT	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	EU DONACIJA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	NAMJENSKI	0,00	0,00	0,00	22.499.302,00
	UKUPNO	105.016.000,00	57.655.000,00	2.575.675,02	31.373.073,37

- ✓ **U dijelu realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta – nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevice**, ali i projektovanje ostalih dionica duž ucrtane trase autoputa, aktivnosti se sprovode u skladu sa planiranom dinamikom od strane „Monteput“ DOO, a shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2025.

U skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), završena je prva faza tenderskog postupka za izbor izvođača radova (pretkvalifikacija) za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevice. Uspješno je sprovedena kompletna tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača po principu „projektuj i izgradi“ i ista je poslata u decembru EBRD-u na odobrenje.

Kada je riječ o izboru konsultanta za vršenje stručnog nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova (inženjera) za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevice, finalna faza tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača je završena i odobrena od strane EBRD-a. Takođe, u skladu sa pravilima EBRD-a, ugovorena je usluga tehničke i upravljačke podrške implementaciji projekta (PIU Support) sa „SAFEGE DOO“ kao vodećeg partnera zajednice ponuđača, koju čine još „SUEZ Consulting“ i „SBCC DOO“, na iznos od 14.448.630,00€.

NAPOMENA: Ministarstvo finansija je 24. jula 2025. godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj zaključilo Ugovor o kreditu i Ugovor o projektu za finansiranje i realizaciju projekta izgradnje druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, kojim je definisano da Crna Gore dobije 150 miliona bespovratnih sredstava i 200 miliona povoljnog kredita. Navedeno će omogućiti nesmetanu realizaciju predmetnog projekta i isplatu avansa odmah po potpisivanju ugovora sa izabranim izvođačem radova po principu „projektuj i izgradi“, što će dalje u značajnoj mjeri rasteretiti finansiranje Kapitalnog budžeta iz opštih prihoda budžeta na srednjem roku i omogućiti bržu dinamiku realizacije drugih kapitalnih projekta.

Za realizacije kapitalnog projekta Autoputa Bar–Boljare (programski kod 17 020 K03 001), u skladu sa Zakonom o budžetu za 2025. godinu, potrošeno je 2.575.675,02€, od čega je značajan dio potrošen za izradu idejnih projekata sljedećih dionica:

- **Andrijevice-Berane-Boljare**, dužine cca 50 km, ukupna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 4.421.340,00 € sa PDV-om i do sada je izvršena uplata u iznosu od 1.326.402,00 € (30% vrijednosti ugovora);
- **Smokovac-Tološi**, dužine cca 10 km, ukupna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 791.582,00 € sa PDV-om i do sada je izvršena uplata u iznosu od 237.474,60 € (30% vrijednosti ugovora);
- **Tološi-Virpazar**, dužine cca 41,5 km; ukupna vrijednost zaključenog ugovora iznosi 4.150.300,00 € sa PDV-om i do sada je isplaćen avans od 415.030,00€ (10% vrijednosti ugovora);
- **Virpazar-Bar (petlja Zaljevo)**, dužine cca 23 km, ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi 2.864.675,00 € sa PDV-om i do sada je isplaćen avans od 286.467,50€ (10% vrijednosti ugovora).

Dodatno: za realizaciju aktivnosti „Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice (programski kod 17 020 K03 002) nije bilo potrošnje u 2025. godini, ali je shodno zakonskom obrazloženju krajem godine raspisan tender za izbor najpovoljnijeg izvođača po principu „projektuj i izgradi“ za izgradnju brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, dionica Markovići – Lastva Grbaljska (L=9,3km), čija je procijenjena vrijednost 237 miliona eura i koja će biti komplet finansirana iz opštih prihoda budžeta. Postupka je u toku i otvaranje ponuda i zaključenje ugovora se očekuje do kraja prvog kvartala 2026. godine.

ZAKLJUČCI

- ❖ Na kraju četvrtog kvartala 2025. godine za realizaciju Kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 223.184.494,69€ ili 80% od ukupno zakonski planiranog iznosa. Iz opštih prihoda budžeta plaćeno je 201,32 mil.€ (106% u odnosu na plan), odnosno 11,3 miliona eura više u odnosu na inicijalno planiranih 190 mil.€, dok je 15,01 mil.€ povučeno iz namjenski ugovorenih kredita, a 5,19 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti) i 1,60 mil.€ iz donacija.
- ❖ Za projekte koje realizuje Ministarstvo javnih radova (bivša Uprava za kapitalne projekte) plaćeno je ukupno 123,23 mil.€, odnosno 108% od ukupne zakonski planirane sume (115 mil.€), od čega je potrošnja iz opštih prihoda budžeta iznosila 115,77 mil. € što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.
- ❖ Za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je 99,39 mil.€, odnosno 60% od ukupne zakonski planirane sume od 165 mil.€, dok je iz kreditnih sredstava potrošeno 13,84 mil.€, što je za 10,19 mil.€ manje u odnosu na prethodnu godinu. Izuzimajući 105 miliona koje je bilo namijenjeno za autoput i brze saobraćajnice za čiju realizaciju je zadužen „Monteput DOO“, potrošnja iz opštih prihoda budžeta je iznosila 82,97 mil.€ (138% u odnosu na zakonom planiranih 59,98 mil.€), što je za 18,32 mil.€ više u poređenju sa prethodnom fiskalnom godinom.
- ❖ U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica od Mateševa do Andrijevice, „Monteput DOO“ je u 2024. godini uspješno sproveo kompletnu tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača po principu „projektuj i izgradi“ i ista je poslata u decembru EBRD-u na odobrenje. Finalna faza tendera za izbor najpovoljnijeg konsultanta za vršenje stručnog nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova je završena i odobrena od strane EBDR-a. Takođe, zaključeni su ugovori za izradu idejnih projekata za sljedeće dionice autoputa Bar-Boljare: Andrijevica-Boljare, Smokovac – Tološi, Tološi-Virpazar i Virpazar-Bar.
- ❖ Ministarstvo finansija sprovodi intezivne aktivnosti na uspostavljanju novog informacionog sistema za upravljanje javnih investicija (PIMIS), kao i na izradi softverske aplikacije „Mapa javnih investicija“, čime će se dodatno unaprijediti transparentnost i procesi upravljanja javnim novcem kojima se finansiraju kapitalni projekti.

Prilog1: Pregled fotografija završenih projekata u 2025. godinu

Prilog2: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata u okviru Ministarstva javnih radova i Uprave za saobraćaj, odobrenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu

PRILOG 1: Ukupna potrošnja u 2025. godini je iznosila 223,18 mil. €



PRILOG 2: Pregled realizacije svih kapitalnih projekata

Rb	Programski kod i naziv projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u okviru kapitalnog budžeta Ministarstva javnih radova (organizacioni kod 43701)	Procijenjena vrijednost	Iznos iz Zakona za 2025. god.	Ugovorena vrijednost	Realizovano do 2025. god.	Izvršenje u 2025. god.
1	11 052 K01 001 - Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	5.000.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
2	11 052 K01 002 - Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	2.850.000,00	10.000,00	2.807.360,65	2.612.751,91	2.400,00
3	11 052 K02 001 - Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije	1.000.000,00	10.003,00	105.272,36	7.430,36	97.842,00
4	12 024 K01 003 - Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	45.000.000,00	5.002,00	299.082,60	251.523,90	0,00
5	12 024 K01 004 - Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	680.000,00	305.181,00	5.111.028,74	4.269.076,75	284.549,32
6	12 024 K02 001 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	4.450.000,00	300.401,00	0,00	0,00	0,00
7	12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	14.110.000,00	3.003.001,00	13.810.243,15	7.751.393,79	1.326.307,61
8	13 024 K01 001 - Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	650.000,00	160.000,00	627.868,98	242.515,97	347.199,11
9	13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske CG	5.000.000,00	100.000,00	6.485.246,73	6.356.755,67	0,00
10	13 025 K01 002 - Izgradnja objekta za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	3.500.000,00	60.000,00	3.063.726,66	2.923.191,28	0,00
11	13 025 K01 003 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	3.200.000,00	60.000,00	2.257.854,12	2.208.705,71	0,00
12	13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	7.086.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
13	13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	12.000.000,00	1.550.000,00	11.691.852,80	7.810.912,53	3.182.799,05
14	13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	1.100.000,00	1.000.000,00	926.842,11	154.534,91	117.847,89
15	13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima	1.200.000,00	1.000.000,00	1.182.501,58	521.495,00	636.512,15
16	13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima	1.750.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
17	13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	5.500.000,00	900.000,00	5.173.235,90	0,00	1.680.981,23
18	15 019 K01 001 - Ski centar na lokalitetu "Kolašin", Kolašin	40.000.000,00	5.003,00	38.227.263,73	36.195.155,80	97.546,85
19	15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Čmiljača", Bijelo Polje	60.000.000,00	2.300.001,00	22.307.874,22	16.460.552,58	646.900,99
20	15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	29.500.000,00	630.001,00	22.988.503,44	14.302.584,40	1.349.705,71
21	15 019 K01 004 - Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32.000.000,00	2.500.002,00	25.013.128,98	20.640.242,64	4.231.016,08
22	15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	19.000.000,00	5.003,00	14.369.396,91	9.417.468,26	84,70
23	15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32.000.000,00	615.002,00	27.077.529,90	19.747.982,37	1.262.353,57
24	15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	30.000.000,00	1.010.001,00	11.977.401,60	8.496.014,37	3.221.199,92
25	15 019 K01 008 - Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	5.000.000,00	110.000,00	3.834.721,58	3.319.741,95	50.000,00
26	15 019 K01 009 - Objekat "Kuća voća" u Andrijevi	2.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	15 019 K01 010 - Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	5.500.000,00	5.000,00	1.457.672,90	646.562,59	0,00
28	15 019 K01 013 - Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem	25.000.000,00	2.000.001,00	9.547.559,09	4.142.341,70	52.205,80
29	15 019 K01 015 - Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Čmiljača"	12.000.000,00	5.001,00	44.140,00	0,00	0,00
30	15 019 K01 019 - Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	12.500.000,00	500.002,00	12.106.155,12	0,00	0,00
31	15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak	260.000,00	230.000,00	214.489,92	0,00	0,00
32	15 019 K01 030 - Izgradnja gondole od centra Kolašina do Ski centra Kolašin 1600	60.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	20.000.000,00	100.000,00	201.949,00	201.949,00	0,00

34	15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	300.000,00	200.000,00	1.287.965,50	994.050,81	154.172,42
35	15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	300.000,00	200.000,00	2.365.656,75	2.060.708,05	0,00
36	15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	2.000.000,00	1.500.000,00	5.268.996,90	3.339.409,74	1.591.670,04
37	15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	12.950.000,00	500.000,00	2.652.315,96	1.846.298,47	429.823,91
38	15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada	800.000,00	700.000,00	2.174.706,00	1.203.883,06	890.406,82
39	15 030 K01 008 - Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	2.000.000,00	1.700.000,00	11.951.449,78	8.722.798,46	2.880.956,69
40	15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	1.500.000,00	1.200.000,00	7.135.006,73	5.922.665,56	1.192.894,50
41	15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	1.000.000,00	900.000,00	5.597.038,02	4.037.474,79	907.524,96
42	15 030 K01 013 - Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	11.650.000,00	200.000,00	10.605.137,06	7.528.436,90	1.518.472,14
43	15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	2.450.000,00	700.000,00	810.000,00	104.176,51	700.000,00
44	15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	11.500.000,00	800.000,00	18.000,00	17.157,80	0,00
45	15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	2.750.000,00	300.000,00	100.000,00	89.128,60	0,00
46	15 030 K01 022 - Izgradnja žičare Lovćen - Cetinje	60.000.000,00	200.003,00	30.003,00	0,00	26.673,77
47	16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	7.500.000,00	208.000,00	150.930,00	0,00	11.150,00
48	17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju	2.200.000,00	158.000,00	2.120.738,98	1.067.362,20	1.053.263,78
49	17 019 K02 004 - Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1.000.000,00	1.002,00	943.417,02	943.417,02	0,00
50	17 019 K02 006 - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	2.000.000,00	60.200,00	1.984.896,00	1.588.421,66	146.474,73
51	17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	2.515.000,00	56.202,00	2.536.130,97	2.204.403,96	294.859,38
52	17 020 K04 002 - Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)	25.000.000,00	1.050.001,00	25.496.567,95	831.215,16	18.335.575,47
53	17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	5.000.000,00	10.000,00	4.905.820,51	4.856.620,26	0,00
54	17 020 K04 006 - Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
55	17 020 K04 007 - Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav	12.000.000,00	1.005.000,00	75.832,83	46.401,46	0,00
56	17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose	16.000.000,00	5.001,00	11.385.553,17	967.155,84	1.012.023,02
57	17 020 K04 010 - Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	2.550.000,00	310.000,00	2.859.210,43	1.240.700,06	1.590.435,74
58	17 020 K04 013 - Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića	7.100.000,00	105.000,00	7.455.708,93	3.917.243,72	3.403.924,57
59	17 020 K04 014 - Izgradnja puta Srđevac- Lozna	8.350.000,00	5.000,00	2.483.583,02	246.198,30	0,00
60	17 020 K04 015 - Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina	2.500.000,00	5.000,00	1.404.155,82	1.404.155,82	0,00
61	17 020 K04 016 - Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	6.470.000,00	1.005.000,00	4.701.244,84	3.203.766,05	818.126,66
62	17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje	3.500.000,00	205.000,00	1.073.530,26	417.268,47	335.627,73
63	17 020 K04 029 - Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	5.700.000,00	1.215.000,00	5.910.000,00	3.046.778,52	1.760.218,47
64	17 020 K04 041 - Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistarlnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	1.300.000,00	5.000,00	1.087.050,44	0,00	0,00
65	17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	2.800.000,00	810.000,00	1.359.527,78	289.716,76	299.323,56
66	17 020 K04 047 - Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	820.000,00	31.000,00	814.041,89	351.029,90	57.942,37
67	17 020 K04 050 - Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	3.514.000,00	10.000,00	3.514.226,86	3.446.848,30	0,00
68	17 020 K04 059 - Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	700.000,00	105.000,00	579.631,45	141.429,58	0,00
69	17 020 K04 060 - Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	10.000.000,00	70.000,00	357.016,55	173.970,78	0,00
70	17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	6.000.000,00	1.020.000,00	4.364.808,55	742.478,57	562.536,57

71	17 020 K04 062 - Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	2.000.000,00	305.000,00	928.000,00	480.730,02	300.000,00
72	17 020 K04 065 - Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju	3.600.000,00	5.000,00	1.008.010,00	1.008.010,00	0,00
73	17 020 K04 068 - Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	6.000.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
74	17 020 K04 070 - Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	697.620,07
75	17 020 K04 079 - Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović"	4.000.000,00	5.000,00	2.292.552,56	2.267.422,20	0,00
76	17 020 K04 092 - Izgradnja vatrogasno-spasilackog doma u Nikšiću	4.050.000,00	1.004.000,00	3.900.242,04	701.294,51	1.110.333,05
77	17 020 K04 093 - Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
78	17 020 K04 099 - Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	18.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	17 020 K04 101 - Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	800.000,00	400.000,00	780.988,50	260.788,36	520.035,37
80	17 020 K04 114 - Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
81	17 020 K04 119 - Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću	2.500.000,00	905.000,00	2.500.000,00	703.255,83	696.531,82
82	17 020 K04 130 - Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Čanju	13.500.000,00	90.000,00	2.720.840,00	0,00	2.720.840,00
83	17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva	3.250.000,00	1.200.000,00	3.250.000,00	1.437.674,81	1.597.566,01
84	17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L29 (Donje Crkvice-Gornje Crkvice-granica BiH)	300.000,00	205.000,00	200.000,00	181.243,96	0,00
85	17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	2.500.000,00	805.000,00	2.224.772,32	686.698,12	409.257,62
86	17 020 K04 148 - Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	7.600.000,00	255.000,00	211.752,42	0,00	0,00
87	17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	385.000,00	350.000,00	360.891,12	0,00	73.835,17
88	17 020 K04 150 - Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	3.500.000,00	360.000,00	820.000,00	0,00	781.730,24
89	17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	4.990.000,00	5.000,00	4.922.278,79	0,00	1.301.000,00
90	17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	1.520.000,00	410.000,00	615.638,62	532.705,74	5.082,00
91	17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	1.300.000,00	305.000,00	997.810,59	932.718,47	54.904,56
92	17 020 K04 154 - Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	2.100.000,00	500.000,00	261.073,23	0,00	0,00
93	17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima	1.950.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv.Trojica" u Stanjevićima, BD	870.000,00	560.000,00	534.639,78	0,00	0,00
95	17 020 K04 158 - Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u PG	7.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96	17 020 K04 160 - Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	2.700.000,00	105.000,00	659.457,28	140.866,27	0,00
97	17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	780.000,00	105.000,00	105.776,91	105.775,04	0,00
98	17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	12.000.000,00	1.050.000,00	595.800,00	83.900,00	0,00
99	17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebješe i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću	3.210.000,00	520.000,00	2.816.167,99	0,00	0,00
100	17 020 K04 165 - Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima	450.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	17 020 K04 166 - Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti	2.700.000,00	550.000,00	2.184.813,23	0,00	990.349,57
102	17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	4.500.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
103	17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu	7.000.000,00	810.000,00	3.077.795,24	600.000,00	1.234.535,77
104	17 020 K04 170 - Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku	2.650.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
105	17 020 K04 171 - Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin	1.000.000,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
106	17 020 K04 172 - Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane	3.700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
107	17 020 K04 173 - Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnjica, Bijelo Polje	3.900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
108	17 020 K04 174 - Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
109	17 020 K04 175 - Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Guisinja	600.000,00	510.000,00	559.580,00	0,00	0,00
110	17 020 K04 176 - Rekonstrukcija ulice Donji Pažanj, Kolašin	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
111	17 020 K04 177 - Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu	2.700.000,00	1.000.000,00	2.684.608,20	0,00	188.399,88

112	17 020 K04 178 - Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja	1.750.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
113	17 020 K04 180 - Izgradnja lokalnog puta Tuzi-Mataguži, II faza	4.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
114	17 020 K04 181 - Uređenje korita rijeke Ibar	1.280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
115	17 020 K04 182 - Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku	1.020.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
116	18 003 K01 001 - Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	17.500.000,00	5.000,00	15.364.198,99	13.961.203,80	0,00
117	18 003 K01 003 - Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	5.000.000,00	10.000,00	4.259.097,24	3.488.389,79	150.296,14
118	18 003 K01 004 - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	5.000.000,00	10.000,00	2.670.497,73	2.215.004,37	0,00
119	18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	15.000.000,00	2.020.002,00	1.851.663,72	1.359.415,32	42.253,25
120	18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	2.500.000,00	5.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
121	18 003 K01 011 - Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	11.000.000,00	550.000,00	9.888.572,03	970.103,01	1.438.447,26
122	18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvrat životinja sa CITES liste sa zooološkim vrtom, Berane	19.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	5.700.000,00	500.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
124	18 003 K01 035 - Vodosnadbijevanje Pljevalja	11.000.000,00	1.500.000,00	8.045.488,04	4.228.000,94	2.450.000,00
125	18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	2.500.000,00	15.000,00	33.154,00	0,00	0,00
126	18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić	2.000.000,00	5.000,00	30.889,58	28.769,66	0,00
127	18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	200.000,00	160.000,00	174.499,88	34.899,98	0,00
128	18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	3.600.000,00	505.000,00	3.567.093,31	968,00	3.566.098,69
129	18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	7.000.000,00	5.000,00	226.009,43	187.551,56	0,00
130	18 003 K01 052 - Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje	550.000,00	5.000,00	454.232,15	0,00	435.416,70
131	18 003 K01 053 - Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	600.000,00	260.000,00	327.586,45	135.585,30	111.027,45
132	18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	590.000,00	340.000,00	13.854,50	0,00	0,00
133	18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	10.000.000,00	305.001,00	272.734,00	0,00	0,00
134	18 003 K01 057 - Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevići	500.000,00	290.000,00	164.788,69	68.903,91	13.023,23
135	18 003 K01 058 - Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo“, BA	5.200.000,00	810.001,00	4.946.131,14	0,00	2.027.001,00
136	18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	700.000,00	180.000,00	545.169,01	0,00	0,00
137	18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	10.000.000,00	95.001,00	0,00	0,00	0,00
138	18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	5.000.000,00	10.000,00	4.371.820,05	3.421.936,34	889.500,92
139	18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	4.500.000,00	410.000,00	915.703,62	231.395,35	210.000,00
140	18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	4.520.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
141	18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	7.800.000,00	510.000,00	12.559,00	0,00	9.655,00
142	18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	2.150.000,00	5.000,00	2.093.748,98	0,00	0,00
143	18 003 K01 069 - Izgradnja sistema vodosnadbijevanja	5.000.000,00	10.002,00	71.812,08	30.914,08	0,00
144	18 003 K01 070 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsičko-Poličkog	900.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
145	18 003 K01 071 - Izgradnja šetališta i kanalizacije od "Titove vile" do Hotela "Iberostar" u Njivicama - faza C	3.650.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
146	18 003 K01 072 - Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaže "Okolo" do glavnog gradskog bazena na ŽB	1.650.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
147	18 003 K01 073 - Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku	1.850.000,00	700.000,00	204.834,85	38.595,37	127.980,52
148	18 003 K01 074 - Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru	250.000,00	250.000,00	205.700,00	0,00	102.850,00

149	18 003 K01 075 - Vodosnadbjevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Šavnik	600.000,00	355.000,00	373.272,32	232.110,30	125.769,55
150	18 003 K01 076 - Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine	600.000,00	500.000,00	566.813,75	0,00	249.341,20
151	18 003 K01 077 - Adaptacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi	1.200.000,00	620.000,00	1.041.810,54	0,00	457.575,64
152	18 003 K01 078 - Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak	310.000,00	305.000,00	259.606,33	150.031,68	106.003,52
153	18 003 K01 079 - Fekalna i atmosferska kanalizacija za Ski centar Kolašin 1600	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
154	18 003 K01 080 - Glavni kolektor fekalne kanalizacije Ski centar Kolašin 1400	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
155	18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	13.700.000,00	60.000,00	14.028.588,89	13.408.350,66	451,13
156	18 003 K02 003 - Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	4.380.000,00	150.000,00	4.289.768,52	2.592.512,39	1.697.256,13
157	18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama	3.550.000,00	14.000,00	3.547.813,33	3.038.982,86	499.726,48
158	18 003 K02 011 - Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	751.000,00	1.551,00	731.435,51	714.420,29	0,00
159	18 003 K02 013 - Doprinis uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	1.290.000,00	48.101,00	1.291.502,61	517.071,89	274.241,72
160	18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	3.500.000,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00
161	18 003 K02 015 - Podrška u uspostavljanju EIONET sistema u Crnoj gori	700.000,00	42.120,00	700.000,00	0,00	280.000,00
162	18 003 K02 016 - Podrška u implementaciji INSPIRE direktive	200.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
163	18 004 K01 001 - Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", Podgorica	60.000.000,00	10.000.000,00	24.079,00	0,00	0,00
164	19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem	790.000,00	193.000,00	798.107,87	605.559,18	1.388,69
165	19 032 K04 001 - Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	10.000.000,00	10.002,00	6.522.142,80	2.857.585,89	1.151.124,66
166	19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	5.000.000,00	10.002,00	4.853.799,03	1.877.904,44	1.475,39
167	19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, PG	7.000.000,00	105.002,00	130.425,90	0,00	0,00
168	19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, PG	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, PG	2.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatnici, PG	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
171	19 032 K04 007 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	4.990.000,00	5.000,00	61.044,50	27.225,00	27.225,00
172	19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
173	19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu	1.100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
174	19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova	5.000.000,00	5.000,00	2.402.729,83	1.958.966,98	62.625,00
175	19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	7.200.000,00	510.002,00	3.617.287,33	1.005.135,59	1.358.374,27
176	19 032 K04 012 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju	3.300.000,00	5.000,00	49.109,72	28.055,72	21.054,00
177	19 032 K04 013 - Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	20.500.000,00	5.000,00	9.161.981,54	8.905.999,68	0,00
178	19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	6.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
179	19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u PG	6.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	19 032 K04 017 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, PG	15.730.000,00	5.000,00	221.672,00	0,00	221.672,00
181	19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi	3.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	3.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	1.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	2.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekata Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	15.000.000,00	520.000,00	12.639.664,82	1.183.041,57	196.323,12
186	19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić, HN	1.000.000,00	5.000,00	69.938,00	32.620,00	26.620,00

187	19 032 K04 026 - Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	6.200.000,00	510.001,00	5.843.547,85	3.329.408,49	2.451.399,51
188	19 032 K04 027 - Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću	20.000.000,00	5.000,00	2.211.631,02	0,00	1.501.000,00
189	19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	650.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19 032 K04 029 - Izgradnja novog objekta OŠ " Vladimir Nazor" Masline Podgorica	7.100.000,00	1.005.000,00	6.968.116,10	3.759.438,59	2.480.745,94
191	19 032 K04 030 - Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	5.760.000,00	1.005.000,00	4.811.651,47	1.861.749,24	2.493.504,13
192	19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić	500.000,00	505.000,00	499.806,90	0,00	499.806,90
193	19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru	300.000,00	250.000,00	269.981,25	0,00	264.441,21
194	19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojević“ u Pećuricama, Opština Bar	1.900.000,00	1.010.000,00	1.196.590,33	659.999,61	0,00
195	19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	3.000.000,00	510.000,00	2.348.223,75	0,00	469.644,75
196	19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ “Bajo Jojić” u Andrijevici	4.000.000,00	5.000,00	32.246,50	13.794,00	18.452,50
197	19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	10.000.000,00	520.000,00	924.164,60	25.168,00	0,00
198	19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	2.500.000,00	5.000,00	51.413,60	18.550,00	18.150,00
199	19 032 K04 053 - Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	4.860.000,00	1.000.000,00	7.214.609,26	3.008.697,50	2.498.407,16
200	19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ “Radomir Mitrović” - područno odjeljenje u Donjim lugama, Berane	5.500.000,00	210.000,00	374.794,83	73.070,31	299.807,33
201	19 032 K04 055 - Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	1.400.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
202	19 032 K04 056 - Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	2.050.000,00	420.000,00	1.995.231,81	0,00	395.916,69
203	19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ “Oktoih”, Podgorica	3.000.000,00	1.520.000,00	2.880.889,98	10.043,98	334.105,20
204	19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradišnici, Tivat	3.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	19 032 K04 059 - Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima	1.235.000,00	500.000,00	1.046.813,16	161.216,32	883.480,88
206	19 032 K04 060 - Adaptacija školskog dvorišta SEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica	182.000,00	176.000,00	181.653,59	98.722,77	78.932,98
207	19 032 K04 061 - Adaptacija krova i vrtića JPU “Vukosava Ivanović”, Bar	373.000,00	10.000,00	367.207,79	0,00	365.481,06
208	19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	6.700.000,00	5.000,00	6.005.438,55	5.975.388,86	0,00
209	19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	5.000.000,00	10.000,00	241.556,73	46.886,00	76.603,74
210	19 038 K01 005 - Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	6.000.000,00	5.000,00	4.713.850,05	0,00	235.692,51
211	19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	4.000.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
212	19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru	4.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213	19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama	5.800.000,00	1.550.000,00	4.825.882,70	1.499.786,62	1.232.529,10
214	19 038 K01 010 - Izgradnja Olimpijskog bazena u Baru	18.250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
215	19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	19 038 K01 013 - Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom	26.500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
217	19 038 K01 014 - Natrkivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici	13.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
218	19 038 K01 015 - Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u Centar za smještaj sportista, PV	14.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219	19 038 K01 016 - Izgradnja zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima	9.700.000,00	10.000,00	117.697,36	0,00	117.697,36
220	19 038 K01 017 - Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero , Pljevlja	12.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici	13.000.000,00	10.000,00	12.617.391,60	12.382.069,02	234.690,30
222	19 040 K01 003 - Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	2.300.000,00	305.001,00	1.187.682,09	623.554,09	554.666,07
223	19 040 K01 004 - Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	2.500.000,00	510.001,00	2.339.184,41	0,00	459.076,48
224	20 021 K01 002 - Rekonstrukcija objekta “Dvorca Kralja Nikole” u Nikšiću	5.000.000,00	10.000,00	1.869.621,06	1.726.869,08	13.788,94
225	20 021 K01 003 - Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata funkciji razvoja kulture	5.000.000,00	10.001,00	1.113.927,07	160.018,93	409.983,64
226	20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar , Nikšić	5.000.000,00	55.001,00	3.192.111,13	3.176.756,90	0,00
227	20 021 K01 022 - Rekonstrukcija druge faze Kaldre u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	1.800.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
228	20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	330.000,00	215.000,00	264.844,49	17.000,00	102.397,36
229	20 021 K01 029 - Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	3.800.000,00	5.000,00	2.892.779,88	0,00	629.482,16

230	20 021 K01 031 - Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	750.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
231	20 021 K01 032 - Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	20.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	21 011 K01 001 - Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	1.000.000,00	5.000,00	743.043,65	10.341,85	401.000,00
233	21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risanu	4.900.000,00	820.001,00	2.337.353,44	346.201,13	1.990.920,61
234	21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40.000.000,00	2.000.001,00	38.937.327,75	104.785,65	915.609,80
235	21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica	30.000.000,00	455.000,00	487.561,02	88.865,18	180.290,84
236	21 011 K01 007 - Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	2.100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	2.400.000,00	1.050.000,00	422.290,00	422.290,00	0,00
238	21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	15.000.000,00	125.007,00	118.820,79	48.400,00	70.420,79
239	21 011 K01 012 - Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	825.000,00	370.001,00	540.420,78	36.559,82	301.497,13
240	21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	1.200.000,00	5.001,00	783.051,46	0,00	159.190,69
241	21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	3.000.000,00	550.001,00	1.308.601,58	282.036,21	286.392,71
242	21 011 K01 016 - Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	20.000.000,00	105.000,00	844.816,97	46.794,93	632.507,13
243	21 011 K01 017 - Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane	740.000,00	5.000,00	535.524,29	425.546,80	0,00
244	21 011 K01 018 - Adaptacija Doma zdravlja Budva	1.300.000,00	420.000,00	1.139.475,83	400,00	398.819,76
245	21 011 K01 021 - Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	1.150.000,00	5.000,00	1.132.734,16	1.009.570,64	4.000,00
246	21 011 K01 026 - Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju	4.200.000,00	5.000,00	30.572,19	30.572,19	0,00
247	21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	360.000,00	360.000,00	358.160,00	0,00	358.160,00
248	21 011 K01 029 - Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	780.000,00	100.000,00	742.539,74	651.995,44	90.544,30
249	21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	800.000,00	260.000,00	700.356,33	0,00	608.377,82
250	21 011 K01 031 - Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	820.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	21 011 K01 032 - Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	3.900.000,00	505.000,00	3.802.304,00	0,00	3.802.304,00
252	21 011 K01 033 - Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece	5.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
253	21 011 K01 034 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	5.000.000,00	5.000,00	974.032,16	18.536,37	1.904,80
254	21 011 K01 035 - Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici	199.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
255	21 011 K01 036 - Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje	1.530.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
256	21 011 K01 037 - Sistem grijanja i hlađenja u JZU "Dom zdravlja Cetinje"	420.000,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
257	21 011 K01 038 - Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
258	21 011 K01 039 - Adaptacija i rekonstrukcija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG	2.000.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
259	21 011 K01 040 - Adaptacija prostorija u OB Bar za potrebe programa BabyFrendly	730.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
260	21 011 K01 041 - Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku	230.000,00	165.000,00	190.157,32	0,00	187.365,23
261	21 011 K01 042 - Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšić	600.000,00	501.000,00	477.814,00	0,00	0,00
262	21 011 K01 043 - Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić	850.000,00	520.000,00	706.635,64	0,00	350.555,05
263	21 011 K01 044 - Adaptacija DZ Kolašin	325.000,00	325.000,00	9.559,00	0,00	0,00
264	21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	9.205.000,00	590.002,00	10.455.576,25	8.767.556,65	1.654.563,17
265	21 011 K02 002 - Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	2.100.000,00	12.967,00	2.089.394,77	1.965.296,72	117.571,52
266	21 011 K02 004 - Radovi na izgradnji operativnog centra	2.200.000,00	2.500,00	2.193.893,47	1.985.226,09	208.667,38
267	22 025 K01 007 - Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1.700.000,00	825.000,00	1.659.873,74	608.611,17	606.200,19
268	22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	1.200.000,00	495.000,00	903.154,10	285.866,67	269.545,53
270	22 025 K01 010 - Izgradnja Doma starih u Plavu	4.150.000,00	700.000,00	3.476.133,36	1.727.251,08	1.000.000,00
271	22 025 K01 012 - Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	1.450.000,00	515.000,00	1.325.055,85	0,00	501.776,02
		1.939.216.000,00	115.000.000,00	713.339.498,70	373.634.841,71	123.793.416,44

Rb	Programski kod i naziv projekta iz Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj (organizacioni kod 42703)	Procijenjena vrijednost	Iznos iz Zakona za 2025. god.	Ugovorena vrijednost	Realizovano do 2025. god.	Izvršenje u 2025. god.
1	17 020 K01 002 - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	67.800.000,00	90.000,00	66.651.638,76	64.168.858,95	2.342.733,94
2	17 020 K01 004 - Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrljka – Miljakovići	9.330.000,00	3.090.000,00	7.970.576,07	2.559.724,64	5.400.833,99
3	17 020 K01 006 - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i B.Polja	19.000.000,00	601.000,00	1.492.960,00	0,00	730.694,00
4	17 020 K01 009 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova	34.500.000,00	4.065.000,00	30.626.449,15	28.547.094,78	1.902.636,25
5	17 020 K01 010 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara	75.500.000,00	5.001.001,00	53.915.261,77	8.484.526,23	12.787.619,78
6	17 020 K01 011 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	65.600.000,00	4.000.000,00	56.670.221,22	23.604.484,90	25.188.027,09
7	17 020 K01 013 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar	25.000.000,00	88.002,00	72.600,00	0,00	0,00
8	17 020 K01 014 - Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo	39.550.000,00	2.075.000,00	38.903.782,77	36.870.448,65	1.944.844,98
9	17 020 K01 016 - Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza	16.150.000,00	160.000,00	168.190,00	142.961,50	0,00
10	17 020 K01 017 - Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor	40.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
11	17 020 K01 018 - Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - Vragodo	17.400.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	17 020 K01 019 - Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje	7.250.000,00	570.000,00	6.970.682,02	6.446.237,20	484.108,12
13	17 020 K01 021 - Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac	48.650.000,00	205.000,00	189.577,41	0,00	22.469,50
14	17 020 K01 022 - Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute	15.000.000,00	2.820.000,00	12.071.988,04	1.477.223,38	4.726.669,10
15	17 020 K01 025 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	10.000.000,00	1.020.000,00	6.960.942,73	0,00	4.576.748,47
16	17 020 K01 027 - Putni prelazi	800.000,00	200.000,00	18.330,50	0,00	18.330,50
17	17 020 K01 028 - Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije	25.000.000,00	1.920.001,00	2.434.405,59	0,00	2.434.405,59
18	17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari	8.322.000,00	241.001,00	275.720,45	0,00	167.451,34
19	17 020 K01 035 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska	2.300.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
20	17 020 K01 036 - Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice	24.480.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
21	17 020 K01 037 - Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir	24.720.000,00	205.000,00	18.248.099,88	97.890,19	2.731.690,43
22	17 020 K01 040 - Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Pljevlja-Mihajlovića, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje	1.500.000,00	300.001,00	1.492.960,00	1.213.300,00	0,00
23	17 020 K01 041 - Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrom Tivat-Jaz	3.200.000,00	300.000,00	5.488.442,00	2.094.886,53	657.590,72
24	17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna	1.100.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
25	17 020 K01 043 - Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	84.050.000,00	705.000,00	9.619,50	0,00	9.619,50
26	17 020 K01 045 - Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)	10.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	17 020 K01 046 - Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju	5.510.000,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00
28	17 020 K01 048 - Rekonstrukcija dijela puta Podgorica – Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik	19.400.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
29	17 020 K01 057 - Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krče-Metaljka	34.000.000,00	305.000,00	723.771,02	24.296,50	129.916,48
30	17 020 K01 058 - Rekonstrukcija tunela Vrmac	300.000,00	150.000,00	27.648,50	0,00	27.648,50
31	17 020 K01 063 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje	14.600.000,00	98.000,00	88.850,30	0,00	88.850,30
32	17 020 K01 065 - Izrada rasvjete u tunelu "Ključ" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin	240.000,00	306.000,00	239.789,63	182.707,85	26.229,87
33	17 020 K01 066 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen	630.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
34	17 020 K01 067 - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva	5.000.000,00	700.000,00	2.242.307,90	352.331,39	1.359.272,44
35	17 020 K01 070 - Uvođenje Inteligentnih transportnih sistema (ITS) na magistralnim i regionalnim putevima	1.550.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

36	17 020 K01 072 - Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica - Bioča	14.350.000,00	1.500.000,00	11.471.201,29	1.134.112,63	3.758.000,55
37	17 020 K01 073 - Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate	14.200.000,00	3.350.000,00	11.078.319,29	2.953.687,81	3.817.790,61
38	17 020 K01 078 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han	6.000.000,00	610.000,00	5.743.198,53	0,00	485.178,72
39	17 020 K01 079 - Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-Jasenovo polje	15.220.000,00	2.090.000,00	15.119.820,29	3.502.105,29	8.756.189,65
40	17 020 K01 081 - Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi	12.000.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
41	17 020 K01 082 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-11 Lepetani-Tivat- Krtolska raskrsnica, dionica Donja Lastva - Aerodrom „Tivat“-izgradnja bulevara	35.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
42	17 020 K01 083 - Rekonstrukcija mag.puta M-1, dionica Sutomore-ulaz u Bar – izgradnja Bulevara	19.230.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
43	17 020 K01 091 - Izgradnja tunela „Lokve“	20.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44	17 020 K01 092 - Unapređenje baze putnih podataka	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
45	17 020 K01 096 - Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane - Riđani	7.100.000,00	1.080.000,00	6.427.593,88	0,00	893.278,72
46	17 020 K01 097 - Rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići – R.Crnojevića sa rekonstrukcijom kamenog mosta	17.500.000,00	1.003.000,00	336.872,34	0,00	307.989,64
47	17 020 K01 099 - Rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane – Rožaje	89.000.000,00	504.002,00	0,00	0,00	0,00
48	17 020 K01 118 - Adaptacija regionalnog puta R-13 Podgorica - Mateševo, dionica Bioče-Veruša	21.500.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
49	17 020 K01 120 - Rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi-Podgorica, od apoteke do skretanja za Sukuruć	2.176.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
50	17 020 K01 121 - Adaptacija regionalnog puta Mateševo-Andrijevica, prevoj Trešnjevnik	1.650.000,00	510.000,00	1.565.411,25	245.553,50	1.319.857,75
51	17 020 K01 122 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka na ulazu u Virpazaru	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52	17 020 K01 123 - Izgradnja magistralnog puta Podvade - Trpezi - Kalače, I faza	6.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53	17 020 K01 124 - Izgradnja magistralnog puta Petnjica - Haništa sa graničnim prelazom sa Srbijom	30.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	17 020 K01 125 - Izrada rasvjete u tunelu "Mogren"	550.000,00	510.000,00	409.770,15	0,00	407.240,80
55	17 020 K01 126 - Rekonstrukcija regionalnog puta R-18 Bar-Sutorman-Virpazar	64.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
56	17 020 K02 001 - Obilaznica Rožaje, II faza	33.640.000,00	3.100.000,00	19.778.320,09	17.516.617,65	0,00
57	17 020 K02 007 - Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić	30.245.000,00	2.080.000,00	14.548.800,98	912.776,54	213.623,34
58	17 020 K02 008 - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane - Grnčar	361.000,00	61.000,00	312.231,05	301.007,94	11.223,11
59	17 020 K03 001 - Autoput Bar-Boljare	650.000.000,00	100.016.000,00	26.676.527,00	0,00	2.575.675,02
60	17 020 K03 002 - Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice	287.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61	17 020 K05 003 - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica	350.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
62	17 020 K05 004 - Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	1.540.000,00	304.000,00	851.357,07	0,00	851.357,07
63	17 020 K05 010 - Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina	990.000,00	5.000,00	20.267,50	19.416,26	0,00
64	17 020 K05 012 - Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin	1.655.000,00	408.000,00	24.079,00	23.019,52	0,00
65	17 020 K05 014 - Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina	5.000.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
66	17 020 K05 015 - Sanacija kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac	11.100.000,00	2.055.000,00	10.668.563,67	4.617.478,79	5.407.444,78
67	17 020 K05 016 - Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik	2.300.000,00	320.000,00	12.864,16	0,00	12.864,16
68	17 020 K05 018 - Sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar –Ulcinj	1.830.000,00	320.000,00	1.674.466,80	32.065,00	301.649,63
69	17 020 K05 019 - Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj	1.200.000,00	315.000,00	47.674,00	32.065,00	0,00
70	17 020 K05 020 - Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na magistralnom putu Šćepan polje-Plužine,	2.500.000,00	260.000,00	36.867,46	0,00	36.867,46
71	17 020 K05 022 - Sanacija klizišta „Dobrakovo	6.465.000,00	1.020.000,00	6.161.528,56	3.952.134,41	2.209.324,09
72	17 020 K05 025 - Sanacija kosine „Galev krš“ na reg.putu Đurđevića Tara -Mojkovac, sa prilaznicama	1.000.000,00	450.000,00	41.246,29	0,00	39.595,61
73	17 020 K05 026 - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na reg.putu Đurđevića Tara – Mojkovac, sa prilaznicama	940.000,00	365.000,00	49.097,78	0,00	49.097,78
74	17 020 K05 027 - Sanacija kosina na reg.putu R-24 Buča - Lubnice	2.700.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
75	17 020 K05 030 - Sanacija klizišta na regionalnom putu R-20, Berane-Kalače-Petnjica	310.000,00	310.000,00	178.911,69	0,00	178.438,87
		2.175.234.000,00	165.000.013,00	447.189.805,33	211.509.013,03	99.391.078,25
