



VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
KAPITALNOG BUDŽETA

za period od
01.01.2012.god. do 31.12.2012. god.

Podgorica, februar 2013. godine

1. REZIME

Kapitalnim budžetom za 2012. godinu planirano je da Direkcija javnih radova realizuje sredstva u iznosu od **35.985.000,00 €**. Rebalansom Kapitalnog budžeta za 2012. godinu u saradnji sa Ministarstvom finansija navedena sredstva umanjena su za **2.800.000,00 €**, tako da ukupno planirani Kapitalni budžet koji se realizuje preko Direkcije javnih radova u 2012. godini iznosi **33.185.000,00 €** (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Crne Gore za 2012. godinu, Sl. list CG. br. 29, od 06. juna 2012. godine). Svi projekti Kapitalnog budžeta grupisani su prema oblastima za koje su kandidovani i u skladu sa takvom klasifikacijom obezbijena su sredstva na sljede i na in:

- Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad drflavnih organa	7.371.347,71 p
- Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	3.465.000,00 p
- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	5.535.000,00 p
- Izgradnja stambenih objekata	200.000,00 p
- Projekti o uvanja flivotne sredine	935.000,00 p
- Izgradnja i rekonstrukcija grani nih prelaza	72.902,29 p
- Izgradnja objekata Zavoda za izvr–enje krivi nih sankcija	600.000,00 p
- Izgradnja lokalne infrastrukture	8.060.000,00 p
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	2.374.650,00 p
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	1.273.200,00 p
- Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	2.132.900,00 p
- Izgradnja i kupovina diplomatskih predstavni–tava u inostranstvu	1.000.000,00 p
- Zakon o Dinastiji Petrovi Njego–	815.000,00 p
- Hitna pomo i sanacija od poplava	50.000,00 p

Na osnovu Zakona o budžetu kao i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2012. godinu, Vlada Crne Gore je shodno svojim ovla–enjima, a na osnovu prijedloga i informacija nadlefnih ministarstava, zaklju cima tokom godine, izvr–ila odre ene promjene u strukturi i namjeni pojedinih budžetskih pozicija, a koje su navedene u daljem tekstu:

- Zaklju ak Vlade Crne Gore br. 06-601/4 od 04. aprila 2012. godine
 - Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima i problemima na realizaciji projekta izgradnje postrojenja za pre i– avanje otpadnih voda u op–tini fiabljak,
 - Zadufluje se Ministarstvo odrflivog razvoja i turizma da nedostaju a sredstva u iznosu od 396.000,00 p za realizaciju Projekta izgradnje postrojenja za pre i– avanje otpadnih voda u op–tini fiabljak obezbijedi iz sredstava Kapitalnog budžeta kod Direkcije javnih radova za 2012. godinu u okviru projekta šProjekti o uvanja flivotne sredine,
- Zaklju ak Vlade Crne Gore br.06-1598/3 od 12. jula 2012. godine
 - Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u iznosu od 1.240.000,00 p Prijestonici Cetinje, i to 1.100.000,00 p za izradu Master plana i idejnog projekta za MACCOC (Marina Abramovic Community Center Obod Cetinje) i 140.000,00 p za otkup trpezarije u nekada–njem Obodu koja je trenutno u vlasni–tvu Societe General Montenegro,
 - Zadufluje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom odrflivog razvoja i turizma izvr–i pla anje u iznosu od 1.240.000,00 p iz Kapitalnog budžeta za 2012. godinu kod Ministarstva odrflivog razvoja i turizma sa projekta šIzgradnja i rekonstrukcija objekata kulture sa izdatka 4413-izdaci za gra evinske objekte, za Prijestonicu Cetinje- izrada Master

plana i Idejnog projekta za MACCOC (Marina Abramovic Community Center Obod Cetinje) kao i otkup trpezarije u nekadašnjem Obodu koja je u vlasništvu Societe General Montenegro.

- Zaključak Vlade Crne Gore br.06-1625/2 od 19. jula 2012. godine
 - Vlada je usvojila informaciju o izgradnji Komplexa fakulteta umjetnosti na Cetinju,
 - Zadufljuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da izda Ministarstvu prosvjete i sporta građevinsku dozvolu za izgradnju Komplexa fakulteta umjetnosti na Cetinju na dijelu katastarske parcele br. 3351/1 KO Cetinje I, u površini 25.270 m², UP 1 Urbanistički projekat "Stari Obod",
 - Ovlašćuje se Direkcija javnih radova da sprovodi operativno-tehničke poslove u vezi sa izgradnjom Komplexa fakulteta na Cetinju.
- Zaključak Vlade Crne Gore br.06-1675/4 od 26. jula 2012. godine
 - Vlada je usvojila informaciju o kupovini nepokretnosti-zgrade na Trgu Kralja Nikole na Cetinju, upisanoj u LN br. 1634 KO Cetinje I, katastarska parcela br. 3463,
 - Zadufljuje se Direkcija javnih radova i Ministarstvo finansija da najkasnije do 19. jula 2012. godine iz sredstava Kapitalnog budžeta sa projektnog koda 810- Izgradnja lokalne infrastrukture, sa pozicije 4412-izdaci za lokalnu infrastrukturu, prenesu sredstva u iznosu od 205.000,00 eura, na projektni kod 805- Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture, pozicija 4413-izdaci za građevinske objekte i ista uplate na depozit Osnovnog suda u Cetinju na ime kupovine nepokretnosti po osnovu prava preneće kupovine.
- Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-1831/3 od 06. septembra 2012. godine,
 - Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima PIU na realizaciji projekta ("Concept Paper") nabavke i instalacije kontejnera u koje će biti smještene ugrožene porodice iz kampa Konik I,
 - Zadufljuje se Ministarstvo finansija i Direkcija javnih radova da obezbijede sredstva za pripremu terena za postavljanje kontejnera u kampu Konik I.
- Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-1942/3 od 27. septembra 2012. godine,
 - Vlada je usvojila informaciju o obezbijedenju sredstava za završetak radova na klupskim prostorijama FK "Iskra" u Danilovgradu u sklopu stadiona "Braća Velaševići",
 - Zadufljuje se Direkcija javnih radova da u saradnji sa Ministarstvom finansija obezbijedi sredstva za završetak radova na klupskim prostorijama FK "Iskra" u Danilovgradu u sklopu stadiona "Braća Velaševići" površine 357 m²,
 - Zadufljuje se Direkcija javnih radova da sprovede postupak javne nabavke za izbor izvođača radova i nabavku opreme.
- Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2019 od 27. septembra 2012. godine,
 - Vlada je usvojila informaciju o potrebi rekonstrukcije objekta u mjesnoj zajednici "Kličevo" u kojem će se obavljati djelatnost Doma zdravlja "Niki",
 - Zadufljuje se Direkcija javnih radova da u saradnji sa Ministarstvom finansija obezbijedi sredstva potrebna za rekonstrukciju objekta u mjesnoj zajednici "Kličevo" za potrebe Doma zdravlja "Niki",
 - Zadufljuje se Direkcija javnih radova da sprovede postupak javne nabavke za izbor izvođača radova.
- Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2019 od 27. septembra 2012. godine,
 - Vlada je usvojila informaciju o kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom u vezi projekta Hitne mjere za prevenciju i sanaciju posljedica od poplava,
 - Vlada je prihvatila Ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Vlade Crne Gore za projekat Hitne mjere za prevenciju i sanaciju posljedica poplava,

- Ovlašćuje se dr Milorad Katnić . Ministar finansija da, u ime Vlade, potpiše Ugovor iz tačke 2. ovog zaključka,
 - Zadužuje se Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova da, u okviru svojih nadležnosti, realizuju obaveze iz Ugovora i da redovno, preko Ministarstva finansija, informišu Vladu o ostvarenim aktivnostima.
- Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2321 od 22. novembra 2012. godine,
 - Vlada je usvojila informaciju o oštećenju na objektima zdravstvenih ustanova nastalih usljed elementarnih nepogoda s informacijom o potrebnim sredstvima za sanaciju,
 - Zadužuju se Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Direkcija javnih radova da Kapitalnim budžetom obezbijede dio sredstava za sanaciju oštećenja na objektima zdravstvenih ustanova, a drugi dio sredstava da obezbijede zdravstvene ustanove angažovanjem sopstvenih sredstava.
 - Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2357/4 od 29. novembra 2012. godine,
 - Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u iznosu od 700.000,00 € i to,
 - Iz Kapitalnog budžeta kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva- Direkcija za saobraćaj (organizacioni kod 41001) sa projekta širenje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore (projektni kod 771) sa izdatka 4411- izdaci za infrastrukturu od općeg značaja,
 - na Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova (organizacioni kod 41501) na projekat širenje i rekonstrukcija sportskih objekata (projektni kod 806) na izdatku 4413- izdaci za građevinske objekte u iznosu od 700.000,00 €.
 - Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2586/2 od 21. decembra 2012. godine,
 - Vlada je odobrila plaćanje sredstava u iznosu od 100.000,00 € Prijestonici Cetinje za hitne sanacione radove na zgradi bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju, usljed pojava u junu 2012. godine.
 - Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2586/2 od 21. decembra 2012. godine,
 - Vlada je odobrila plaćanje sredstava u iznosu od 100.000,00 € Prijestonici Cetinje za hitne sanacione radove na zgradi bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju, usljed pojava u junu 2012. godine.
 - Zaključak Vlade Crne Gore br. 06-2664/2 od 27. decembra 2012. godine,
 - Vlada je prihvatila Predlog za prenamjenu i plaćanje sredstava Prijestonici Cetinje za urbanizaciju i izgradnju javne infrastrukture na području namijenjenom za izgradnju potomcima Dinastije Petrović-Njegoš,
 - Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova, izvrši plaćanje Prijestonici Cetinje u iznosu od 125.000,00 €, predviđenih Kapitalnim budžetom za 2012. godinu, sa projekta Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova 41501825 Zakon o Dinastiji Petrović-Njegoš, sa pozicije 413, za izradu planske dokumentacije i izgradnju javne infrastrukture na području namijenjenom za izgradnju porodice i potomcima Dinastije Petrović-Njegoš.

Tokom realizacije projekata, Direkcija javnih radova je u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2012. godinu, a na osnovu Rješenja Ministarstva finansija izvršila određena budžetska preusmjeravanja: br. 03-6893/1 od 21.06.2012. godine; br. 03-10121/1, 03-9701/1, 03-01-9045/1 i 03-11152/1 od 10.09.2012. godine; br. 03-10481/1 od 21.09.2012. godine; br. 03-12114/1 od 01.11.2012. godine; br. 03-13034/1 od 26.11.2012. godine.

Obzirom na navedene razloge, Kapitalni budžet za 2012. godinu, koji je realizovala Direkcija javnih radova, sadržavao je aktivnosti na realizaciji projekata ukupne vrijednosti **33.885.000,00** eura.

Projekti Hitne pomoći i prevencije od poplava i Izgradnje i rekonstrukcije administrativnog prostora za rad drflavnih organa-Uprava za nekretnine, kofinansiraju se iz sredstava Svjetske banke, odnosno Evropske investicione banke. Rebalansom Kapitalnog budfleta za 2012. godinu kreditna sredstva pomenutih institucija planirana su na nivou koji zadovoljava op-te uslove otvaranja pozicije u budfletu, me utim na osnovu stvarne realizacije projekata njihovo povla enje i tro-enje zna ajno prema-uje iznos planiranog, shodno lanu 8 Zakona o budfletu (Sluflbeni list CG br. 66 od 30. decembra 2012. godine) kojim se kafl: šizdaci potro-a kih jedinica koje se finansiraju iz kredita Svjetske banke za projekat- **Projekat katastra** i Evropske investicione banke za projekat- **Hitna pomoć i prevencija od poplava** izvr-ava e se u visini njihovog ostvarenjaõ.

Pored ve pomenuta dva projekata, iz sredstava me unarodnih finansijskih institucija planirano je kofinansiranje i za sljede e projekte:

- Izgradnja nove EKO zgrade Ministarstva odrflivog razvoja i turizma (donacija Ministarstva flivotne sredine kopna i mora Republike Italije),
- Izgradnja Sportske hale na fiabljaku (donacija Republike Slovenije),
- Izgradnja postrojenja za pre i- avanje otpadnih voda na fiabljaku (donacija Republike Slovenije),
- Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje (planirana realizacija projekata kroz IPA fondove).

Ukupan iznos kreditnih sredstava koja je Direkcija javnih radova realizovala tokom 2012. godine iznosi **4.340.593,63 €** od ega za projekat Hitne pomoći i prevencije od poplava 3.916.748,96 þ, dok je za projekat Uprave za nekretnine realizovano 423.844,67 þ.

Od planiranog iznosa sredstava opredijeljenjih Rebalansom Kapitalnog budfleta za 2012. godinu, **28.114.500,00 € (82.97%)** se odnosi na projekte koji su zapo eti u prethodnim godinama, dok **5.770.500,00 € (17.03%)** se odnosi na projekte iji po etak realizacije je ostvaren u 2012. godini.

Tokom 2012. godine, Direkcija javnih radova je shodno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona budfletu za 2012. godinu, Zakonu o ure enju prostora i izgradnji objekata, Zakonu o javnim nabavkama, ali i ostaloj zakonskoj regulativi raspisala: 119 javnih nadmetanja, od ega:

- 115 otvorena postupka javnih nabavki,
- 2 pregovara ka postupka javnih nabavki,
- 2 javne nabavke putem -oping metode.

U skladu sa ostvarenom realizacijom, Direkcija javnih radova je u cilju realizacije predvi enih aktivnosti zaklju ila: 82 ugovora sa izabranim ugovara ima, i to:

- 54 ugovora za izvo enje radova,
- 9 ugovora za izradu projektne dokumentacije,
- 1 ugovor za nabavku robe,
- 18 ugovora za vr-enje stru nog nadzora i tehni ku kontrolu izvo enja radova.

Tokom 2012. godine, Direkcija javnih radova je izgradila, rekonstruisala, adaptirala, sanirala i opremila:

- Otvoreno plivali-te na Tflveru u Herceg Novom,
- Centar za djecu i mlade šLjubovi õ u Podgorici,
- Sportski objekat i streljanu u Danilovgradu,
- Vrhovni sud u Podgorici,
- Centar za azilante u Spuflu,
- Osnovnu -kolu šMilan Vukoti õ- selo Srpska, gradska op-tina Golubovci,
- Kuhinju u objektu JU Zavod šKomanski mostõ u Podgorici,
- Pomo ni fudbalski teren u Kola-inu,
- Terene za potrebe odrflavanja MOSI igara u Beranama,

- Za-titni bedem oko objekta Zatvora za duge kazne i paviljon % za flene u Spufu,
- Gradske saobra ajnice realizovane kroz pomo lokalnim upravama ukupne površine **54.633 m²** u op-tinama: Kola-in, fiabljak, Roflaje, Bijelo Polje (most Nikoljac sa pripadaju om saobra ajnicom) i Ulcinj,
- Lokalne puteve kod kojih je izvr-ena modernizacija u duflini od **23 km** u op-tinama: Pljevlja, Andrijevica, Mojkovac, fiabljak, Roflaje, Berane, Pluffine, Nik-i , Plav, Tmrvnik,
- Izgradnju lokalnog puta Ostrog-fidrebaonik u duflini **6.1 km**,
- Hitnu pomo i prevenciju od poplava:

završena projektna dokumentacija: Sanacija korita rijeke Vruje i za-tita izbjegli kog naselja-**Plav**; Ure enje korita rijeke Grn ar-**Plav**; Regulacija korita rijeke Lim-**Andrijevica**; Regulacija korita rijeke Kralj-tice-**Andrijevica**; Regulacija korita rijeke Lim (za-tita obilaznice i centralne gradske zone i za-tita obala nizvodno od gradskog mosta)-**Berane**; Sanacija klizi-ta na putu Krstac-Pro- enje-**Mojkovac**; Sanacija klizi-ta Vranjske Njive-**Radov e-Podgorica**,

završeni radovi: Regulacija korita rijeke Zlore ice I faza-**Andrijevica**; Sanacija lokalnog puta raskrsnice Zoganje-Kodra Dakina-selo Ra -magistralni put Ulcinj-Ada-**Ulcinj**; Za-tita nasipa Jalovi-ta i obaloutvrde u naselju Ambarine-**Mojkovac**; Sanacija puta za selo Pu-tula-**Šavnik**; Sanacija klizi-ta na putu Bogeti i-Ostrog-**Nikšić**; Sanacija klizi-ta Povija na putu Bogeti i-Ostrog-**Nikšić**, Sanacija klizi-ta Tmrbaji i na putu Gorica-Vini i-Ostrog-**Danilovgrad** ; Sanacija puta za Tmrtaricu i izgradnja 3 mosta na Tmrtari koj rijeci-**Mojkovac**.

Vrijednost sredstava koje je Direkcija javnih radova realizovala u 2012. godini iznosi **33.339.163,43 €¹**. Od tog iznosa sredstava iz op-tih prihoda drflavnog budfeta finansirano je **28.998.569,80 €** (86,98 %), dok je iz kreditnih sredstava obezbije enih preko Svjetske banke, odnosno Evropske investicione banke, finansirano **4.340.593,63 €** (3,02 %). Preostala planirana sredstva nijesu realizovana iz sljede ih razloga:

- nije zapo eta izgradnja regionalnih sanitarnih deponija i postrojenja za pre i- avanje otpadnih voda iz razloga nezavr-enih pripremnih poslova odnosno procedura dobijanja urbanisti ko tehni kih uslova, nepribavljanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju, neobavljenih revizija, neobezbije enih gra evinskih dozvola od strane budu ih korisnika deponija i postrojenja, tako da nijesusu stvoreni uslovi za realizaciju kreditnih linija,
- za odre eni broj projekata za koji je bila planirana izrada projektne dokumentacije, ista nije realizovana iz razloga -to korisnici nijesu realizovali aktivnosti koje prethode izradi projektne dokumentacije, kao -to su: obezbje enje urbanisti ko-planskih pretpostavki, rje-avanje imovinsko pravnih odnosa i obezbje enje potrebnih uslova za izradu projektne dokumentacije od nadlefnih institucija,
- izgradnja jednog broja objekata zapo ela je kasnije u odnosu na planirani rok zbog odredbi novog Zakona o javnim nabavkama koji se primjenjuje od 01. januara i kojim su produfeni rokovi procedura javnih nadmetanja.

Po regionima sredstva su realizovana na sljede i na in:

- u sjevernom regionu **8.026.273,90 €** odnosno **24,07 %**.
- u centralnom region **19.455.384,33 €**, odnosno **58,36 %**,

¹ Navedena cifra uklju uje i kreditna sredstva koja nisu bila planirana Kapitalnim budfетom za 2012. godinu, ali su na osnovu Zakona o budfeta i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o budfetu za 2012. godinu, realizovana preko informacionog sistema Ministarstva finansija SAP/REES pod budfetskom stavkom Direkcije javnih radova, odnosno Ministarstva odrflivog razvoja i turizma.

- u južnom regionu **4.677.505,20 €**, odnosno **14,03 %**,
- dok je za projekte koji se ne mogu vezati za neki od regiona realizovano **1.180.000,00 €**, odnosno **3,54 %** (Sredstva za rješavanje stambenih potreba sindikalnih organizacija i Diplomatska predstavništva u inostranstvu).

Vrlo značajan projekat koji je Direkcija javnih radova započela tokom 2011. godine i koji je nastavila da realizuje u 2012. godini je projekat hitne pomoći i prevencije od poplava na osnovu sačinjenog Elaborata Procjene sanacije infrastrukturnih objekata oštećenih u poplavama iz decembra 2010. godine.

Evropska investiciona banka iz svojih fondova se kreditiraju radovi, tokom juna mjeseca 2011. godine dala je saglasnost na pomenuti Elaborat. Radovi se prije svega odnose na sanaciju mostova, puteva, klizišta i regulaciju vodotokova. Sredstva za realizaciju ovog projekta postala su operativna po etkom ove budžetske godine, tako da cifra od **3.961.259,84 €**, koliko je do sada plaćeno, uključuje i izmirenje obaveza za radove i usluge izvršene i u prethodnoj budžetskoj godini.

Tokom 2012. godine Direkcija javnih radova raspisala je 22 javna nadmetanja za izbor izvođača radova na otklanjanju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

U ukupnoj realizaciji u 2012. godini za radove je izdvojeno 29.656.535,77 €, što je u cjelosti realizovala domaća građevinska operativna. Sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € realizovana su za kupovinu diplomatskih predstavništava Crne Gore u Njujorku u Americi i shodno tome ukupno realizovana sredstva za kapitalne projekte iznose **30.656.535,77 €**. Iznos realizacije koju su ostvarile konsultantske firme (izrada tehničke dokumentacije, revizije, nakande za gradsko-građevinsko zemljište, stručni nadzori i sl.) ostvaren je u ukupnom iznosu od **2.682.627,66 €**, od čega su domaće konsultantske firme realizovale 2.589.527,66 € što čini 96,52 %, odnosno inostrane firme 93.100,10 € što čini 3,48 % ukupne realizacije.

Sve ugovore je realizovalo preko 80 građevinskih, projektantskih i konsultantskih preduzeća.

Vrlo bitan segment poslovanja Direkcije javnih radova u prethodnom periodu bilo je aktivno učestvovanje u stvaranju pretpostavki za buduću realizaciju IPA projekata u Crnoj Gori.

Naime, Vlada Crne Gore na sjednici od 14. aprila 2011. godine usvojila je informaciju o uspostavljanju operativnih struktura za III i IV IPA komponentu gdje je Direkcija javnih radova prepoznata kao Implementaciono tijelo za decentralizovano upravljanje EU fondovima za III IPA komponentu "Regionalni razvoj". Shodno tome, a u cilju dobijanja akreditacije od strane Evropske komisije u Crnoj Gori, u toku su aktivnosti koje podrazumijevaju prilagođavanje zatjevnima i ispunjavanje uslova postavljenih od strane Evropske komisije.

Dana 23. novembra 2012. godine Direkcija javnih radova potpisala je "Operativni sporazum" čiji su potpisnici i tijela operativne strukture za IPA komponentu III: Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, čijim potpisivanjem su zvanično definisane obaveze Operativne strukture kako bi se na kvalitetan način uspostavili radni odnosi između potpisnika ovog Sporazuma i zajednički razradilo njihovo funkcionisanje u obavljanju poslova upravljanja i sprovođenja Operativnog programa "Regionalni razvoj" za period 2012-2013. godinu, finansiranih kroz Instrument za prepristupnu pomoć (IPA).

U I kvartalu 2013. godine otkriva se posjeta revizora nezavisne revizorske kuće KPMG koja je zadužena za ocjenu usklađenosti sistema. Između ostalog, revizori pomenute revizorske kuće posjetili su i Direkciju javnih radova kako bi se uvjerali da su službenici upoznati sa procedurama za sprovođenje projekata III IPA komponente. Nakon okončanja njihove misije, otkriva se dolazak revizora Evropske komisije, koji će dati konačnu ocjenu o tome da li su stvorene sve pretpostavke kako bi Crna Gora mogla koristiti bespovratna IPA sredstva, a što prije svega podrazumijeva uspostavljanje institucija, pripremu procedura i dobijanje akreditacije. Kako bi se na kvalitetniji način odgovorilo zahtjevima koji predstoje, Direkcija javnih radova će nastojati da i u narednom periodu doprinese stvaranju institucionalnih pretpostavki za kvalitetnije funkcionisanje sistema.

Bez obzira na aktuelnu ekonomsku i finansijsku krizu, realizacija Kapitalnog budžeta bitan je instrument funkcionisanja i kontinuiranog obavljanja privredne aktivnosti, a javni radovi definisani na tržišnim principima poslovanja izraz su legitimnog ulaganja države u kreiranje poslovnog i privrednog ambijenta, kako bi se podstakle i dodatno intenzivirale sve aktivnosti koje doprinose privrednom rastu i razvoju.

Kapitalno investiranje i politika javnih radova kroz realizaciju Kapitalnog budžeta omogućuje i svim učesnicima ovog programa da na bazi multiplikativnih efekata dodatno dinamiziraju ekonomsku aktivnost i podstaknu rast i razvoj, a sa druge strane omogućuje i se poboljšanje lokalne infrastrukture, stvaranje uslova za rad državnih organa, kulturnih institucija, organa socijalnog staranja, zdravstvenih institucija, uz politiku ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

Podgorica, februar 2013. godine

Direkcija javnih radova

***2. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE BUDŽETA
za period od 01.01.2012.god. do 31.12.2012. god.***

R.br	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2012.god.			PLAĆENO Do 31.12.2012.god.		
		Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)	Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)
1.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora</i>	972.097,71	6.399.250,00	7.371.347,71	720.584,33	5.931.104,21	6.651.688,54
1.1	Izgradnja poslovnog objekta MUP-a u Zagori u	80.000,00	0,00	80.000,00	60.428,35	0,00	60.428,35
1.2	Kupovina objekta Kampa na Zlatici	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	973.909,97	973.909,97
1.3	Objekti pravosudnih organa	57.500,00	468.000,00	525.000,00	10.736,82	43.508,21	54.245,03
1.4	Izgradnja kompleksa CANU, Ministarstva odbrane, General-taba vojske CG i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija	110.097,11	1.311.000,00	1.421.097,71	58.806,46	1.278.580,53	1.337.386,99
1.5	Izgradnja Eko efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma	300.000,00	900.000,00	1.100.000,00	237.118,54	866.386,24	1.103.504,78
1.6	Izgradnja Eko zgrade UN-a u Crnoj Gori	25.000,00	1.688.000,00	1.813.000,00	29.150,31	1.397.985,79	1.427.136,10
1.7	Izgradnja poslovne zgrade Uprave za nekretnine	330.000,00	1.052.250,00	1.382.250,00	307.489,80	1.370.733,47	1.678.223,27
1.8	Konkurs za novu zgradu Skupštine Crne Gore	70.000,00	0,00	70.000,00	16.854,05	0,00	16.854,05
2.	<i>Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture</i>	490.000,00	2.975.000,00	3.465.000,00	87.380,55	2.551.637,51	2.639.018,06
2.1	Muzički centar i Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma vojske u Podgorici	100.000,00	650.000,00	750.000,00	2.164,22	615.524,48	617.688,70
2.2	Izgradnja bioskopa š18. septembar u Nikšiću	10.000,00	390.000,00	400.000,00	5.800,94	200.133,16	205.934,10
2.3	Studija izvodljivosti za Dom revolucije u Nikšiću	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00


R.br	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2012.god.			PLAĆENO Do 31.12.2012.god.		
		Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)	Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)
2.4.	Izrada projektne dokumentacije za muzej savremene umjetnosti CG u Podg	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sanacija i rekonstrukcija objektata kulture na Cetinju	170.000,00	1.655.000,00	1.825.000,00	8.567,36	1.573.367,61	1.581.934,97
2.6.	Rekonstrukcija i adaptacija objektata kulture na sjeveru CG	80.000,00	280.000,00	360.000,00	70.848,03	162.612,26	233.460,29
3.	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	152.000,00	5.383.000,00	5.535.000,00	97.184,25	5.055.170,01	5.152.354,26
3.1.	Izgradnja bazena na Tiveru	65.000,00	2.240.000,00	2.305.000,00	63.960,24	2.237.193,89	2.301.154,13
3.2.	Izgradnja sportske hale na fiabljaku	10.000,00	320.000,00	330.000,00	1.774,18	315.700,00	317.474,18
3.3.	Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Kotoru	2.000,00	1.198.000,00	1.200.000,00	0,00	1.180.703,18	1.180.703,18
3.4.	Rekonstrukcija Sportskog kompleksa u Kola-inu	32.000,00	378.000,00	410.000,00	8.303,47	266.592,57	274.896,04
3.5.	Izgradnja sportske dvorane u Beranama	15.000,00	30.000,00	45.000,00	4.949,10	0,00	4.949,10
3.6.	Izgradnja pomoćnih fudbalskih terena u Kola-inu	15.000,00	120.000,00	135.000,00	10.645,36	119.450,19	130.095,55
3.7.	Izvođenje radova i opremanje sportske streljane u Danilovgradu	5.000,00	785.000,00	790.000,00	589,00	774.265,69	774.854,69
3.8.	Sportska infrastruktura za potrebe MOS-i igara u Beranama	7.000,00	182.000,00	189.000,00	6.904,50	161.264,49	168.168,99
3.9.	Rekonstrukcija svlaionica FK Šiskrao u Danilovgradu	1.000,00	130.000,00	131.000,00	58,40	0,00	58,40
4.	Izgradnja stambenih objekata	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
4.1.	Stambeni objekti za potrebe sindikalnih organizacija	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00

R.br	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2012.god.			PLAĆENO Do 31.12.2012.god.		
		Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)	Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)
5.	<i>Projekti očuvanja životne sredine</i>	414.000,00	521.000,00	935.000,00	144.889,04	230.882,10	375.771,14
5.1.	Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje	409.000,00	344.000,00	753.000,00	140.137,94	119.956,00	260.093,94
5.2.	Zatravnjivanje Jalovi-ta u Mojkovcu	5.000,00	177.000,00	182.000,00	4.751,10	110.926,10	115.677,20
6.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza</i>	32.902,89	40.000,00	72.902,29	19.492,29	4.454,28	23.946,57
7.	<i>Izgradnja objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija</i>	30.000,00	570.000,00	600.000,00	11.622,41	357.247,49	368.869,90
8.	<i>Izgradnja lokalne infrastrukture</i>	429.500,00	7.630.500,00	8.060.000,00	193.991,13	7.074.635,28	7.268.626,41
9.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva</i>	645.100,00	1.729.550,00	2.374.650,00	519.217,39	1.728.649,97	2.247.867,36
9.1.	Izgradnja Poliklini kog sa urgentnim centrom u Beranama	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Izgradnja agencije za ljekove i medicinsku sredstva	37.000,00	1.174.550,00	1.211.550,00	26.016,00	1.173.649,96	1.199.665,96
9.3.	Izgradnja Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici	360.000,00	0,00	360.000,00	267.987,19	0,00	267.987,19
9.4.	Izgradnja doma zdravlja u B. Polju-transfer sredstava	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,01	555.000,01
9.5.	Rekonstrukcija odjeljenja intezivne njege bolnice u Brezoviku	10.000,00	0,00	10.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00
9.6.	Klinika za onkologiju i radioterapiju u Podgorici-komunalne naknade	219.000,00	0,00	219.000,00	218.952,54	0,00	218.952,54
9.7.	Integralni bolni ki informacioni sistem Klini kog centra Crne Gore	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

R.br	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2012.god.			PLAĆENO Do 31.12.2012.god.		
		Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)	Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)
9.8.	Ambulanta MZ Kli evo u Nik-i u	5.000,00	0,00	5.000,00	2.381,66	0,00	3.381,66
10.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja</i>	160.000,00	1.113.200,00	1.273.200,00	69.214,92	1.025.211,12	1.094.426,04
10.1.	Izgradnja objekta Centra za djecu i mlade Ljubovi	11.000,00	60.600,00	71.600,00	9.032,21	46.855,84	55.888,05
10.2.	Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama	20.000,00	170.000,00	190.000,00	2.764,07	164.780,69	167.544,76
10.3.	Izgradnja Centra za azilante u Spufu	55.000,00	518.200,00	573.200,00	51.513,13	440.650,81	492.163,94
10.4.	Adaptacija objekta u sklopu SZ šKomanski mostö u Podgorici	9.000,00	49.400,00	58.400,00	2.152,00	74.682,88	76.834,88
10.5.	Izgradnja kampa za izbjeglice na Koniku	65.000,00	315.000,00	380.000,00	3.753,51	298.240,90	301.994,41
11.	<i>Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja</i>	561.100,00	1.571.800,00	2.132.900,00	249.994,26	1.497.166,24	1.747.160,50
11.1.	Izgradnja objekta dje ijeg vrti a u Golubovcima	5.000,00	95.000,00	100.000,00	1.250,00	43.547,65	44.797,65
11.2.	Izgradnja objekta dje ijeg vrti a i jaslica u Bijelom Polju	76.100,00	0,00	76.100,00	7.493,52	0,00	7.493,52
11.3.	Izrada projektne dokumentacije za O. TM šMrkojevi iö u Baru	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Izgradnja O.TM šMilan Vukoti ö- gradska op-tina Golubovci	10.000,00	410.000,00	420.000,00	14.599,21	450.982,67	465.581,88
11.5.	Rekonstrukcija objekta dje ijeg vrti a i jaslica u Tivtu	10.000,00	525.000,00	535.000,00	12.199,00	532.144,37	544.343,37
11.6.	Izrada projektne dokumentacije za objekat Gimnazije u Pluffinama	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

R.br	NAZIV PROJEKTA	REBALANS KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2012.god.			PLAĆENO Do 31.12.2012.god.		
		Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)	Tekući Izdaci (€)	Kapitalni izdaci (€)	Ukupno (€)
11.7.	Izgradnja Akademija umjetnosti na Cetinju	200.000,00	516.800,00	716.800,00	140.560,42	448.669,88	589.230,30
11.8.	Izgradnja sportske dvorane Univerziteta u Podgorici	65.000,00	0,00	65.000,00	29.486,28	0,00	29.486,28
11.9.	Izgradnja školsko-gradske hale u Gusinju- opština Plav	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11.10	Izgradnja filološkog fakulteta u Nikšiću	35.000,00	0,00	35.000,00	41.416,67	0,00	41.416,67
11.11	Izgradnja Studenskih domova u Podgorici i Nikšiću	25.000,00	25.000,00	50.000,00	2.848,54	21.821,67	24.670,21
11.12	Izrada projektne dokumentacije za Srednju stručnu školu u Golubovcima	65.000,00	0,00	65.000,00	140,62	0,00	140,62
12.	<i>Izgradnja i kupovina diplomatskih predstavništava u inostranstvu</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.	<i>Zakon o Dinastiji Petrović njegoš</i>	182.000,00	633.000,00	815.000,00	125.000,00	503.174,81	628.174,81
13.1.	Otkup zemljišta na Cetinju	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
13.2.	Adaptacija dvorca na Kruševcu	32.000,00	178.000,00	210.000,00	0,00	162.415,81	162.415,81
13.3.	Izgradnja stambenih objekata	25.000,00	105.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Sanacija oštećenja na objektima zdravstvenih ustanova	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	340.759,00	340.759,00
14.	<i>Hitna pomoć i prevencija od poplava</i>	15.000,00	35.000,00	50.000,00	444.057,09	3.517.202,75	3.961.259,84
UKUPNO		4.083.700,00	29.801.300,00	33.885.000,00	2.682.627,66	30.656.535,77	33.339.163,43

3. FOTO DOKUMENTACIJA

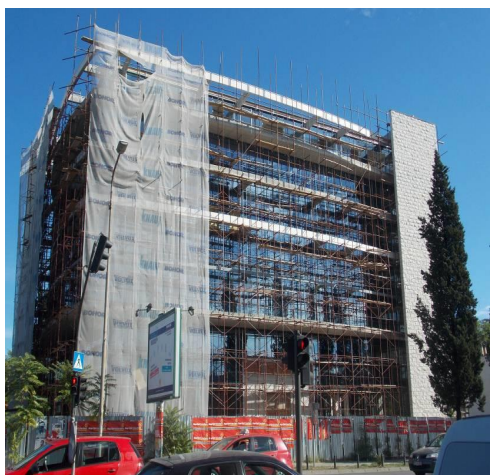

Nova Zgrada CANU u Podgorici



Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici



Eko zgrada UN organizacija u CG u Podgorici




Uprava za nekretnine u Podgorici



Muzički centar u Podgorici




Bioskop 18. Septembar u Nikšiću

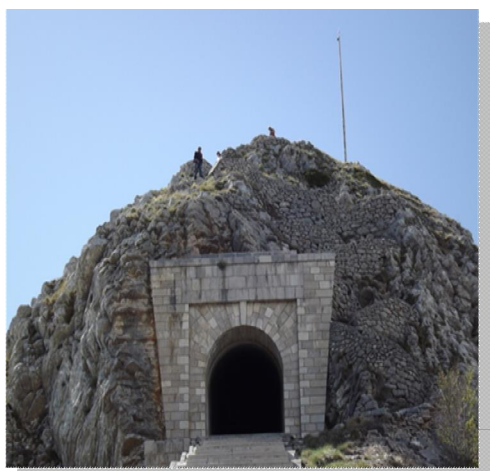

Pjevački tunel Mauzoleja na Lovćen




Dom kulture u Mojkovcu

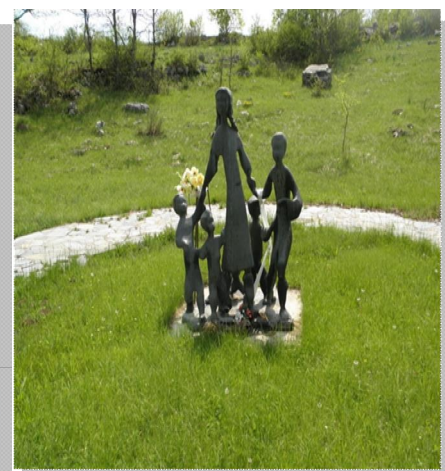

Spomen kompleks Doli u Plužinama



Dom kulture u Pljevljima

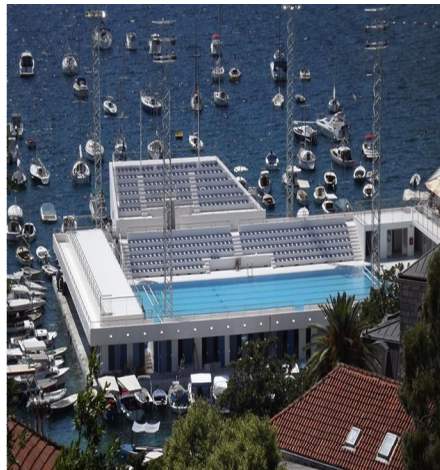

Bazen na Trkveru u Herceg-Novom



Sportska hala na Biabljaku



Sportsko-rekreativni centar u Kotoru



Sportski kompleks u Kola-inu



Sportska dvorana u Beranama



Pomo ni fudbalski teren u Kola-inu



Sportski objekat i streljana u Danilovgradu



MOSI igre Beranama- infrastruktura



Zatravnjeno Jalovi-te u Mojkovcu



ZIKS u Spufu




Stambeni objekti- MZ Bikovica



Ure enje korita rijeke ehotine



Kanalizaciona mreža na Rijeci Crnojevi a

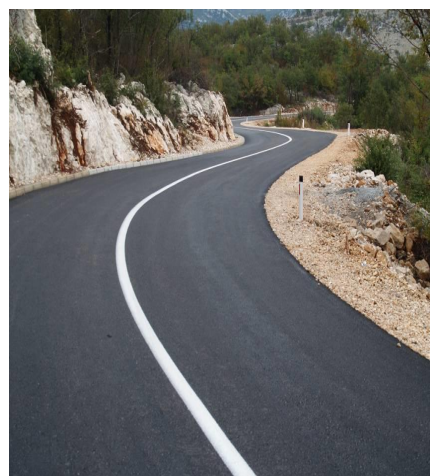

Lokalni put Ostrog-fidrebaonik



Most Nikoljac u B. Polju



Gradske saobra ajnice



Lokalni putevi



Agencija za lijekove u Podgorici



Dom zdravlja u B. Polju



Centar za djecu i mlade Ljubovi



Dnevni centar na Cetinju



Centar za azilante u Spufu



Komanski most u Podgorici- kuhinja



Kamp na Koniku u Podgorici



Dje iji vrti u Golubovcima



O.™Milan Vukoti u Golubovcima



Dječiji vrtić i jaslice u Tivtu




Kompleks akademija na Cetinju



Studentski dom u Podgorici



Adaptacija Dvorca na Kruševcu

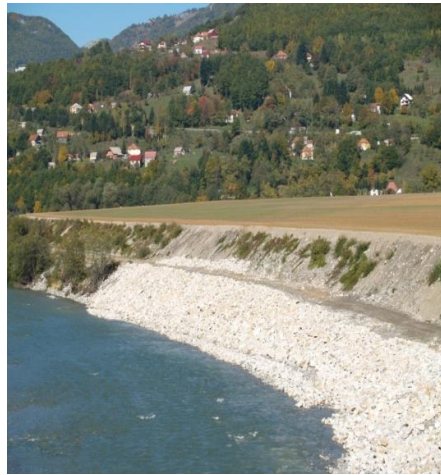

Hitna pomoć i sanacija od poplava



Hitna pomoć i sanacija od poplava
