



CRNA GORA
MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Zakona o budžetu Crne Gore
za period 01.01.2025. – 31.12.2025. godine



Podgorica, mart 2026. godine

UVOD	11
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA.....	14
TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA	17
I. POLJOPRIVREDA.....	36
1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST POLJOPRIVREDE	37
1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	38
II. TURISTIČKA DJELATNOST	39
2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin	41
2.2. Ski centar na lokalitetu „Cmiljača” u Bijelom Polju.....	42
2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac.....	47
2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama	54
2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	59
2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju	59
2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	71
2.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	73
2.9. Objekat „Kuća voća“ u Andrijevići.....	73
2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule	74
2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”	75
2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”	76
2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica.....	77
2.14. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“, Opština Žabljak..	77
2.15. Izgradnja gondole od centra Kolašina do Ski centra Kolašin 1600.....	78
III. EKOLOGIJA I PRIRODA	79
3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	81
3.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	83
3.3. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama..	84
Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, Herceg Novi	87
3.4. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	87
3.5. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera.....	88
3.6. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica	88
3.7. Izgradnja centra za prihvat životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane..	89

3.8.	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	89
3.9.	Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja	90
	Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog cjevovoda visoke i niske zone Pliješ – grad sa povratnim cjevovodom	90
3.10.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	91
3.11.	Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić	91
3.12.	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	91
3.13.	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići	92
3.14.	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m.....	93
3.15.	Vodovod „Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje.....	93
3.16.	Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	94
3.17.	Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici.....	95
3.18.	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću.....	95
3.19.	Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevića	95
3.20.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta „Merića Vrelo”, Berane	95
3.21.	Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	96
3.22.	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva.....	96
3.23.	Sanacija odlagališta Zakršnica.....	96
3.24.	Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje. Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice - II faza.....	97
3.25.	Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak. 98	
3.26.	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	98
3.27.	Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu	98
3.28.	Izgradnja Sistema vodosnadbijevanja.....	98
3.29.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama – Buče, Zagrad i Dapsićko-Poličkog.....	99
3.30.	Izgradnja šetališta i kanalizacije od “Titove vile” do Hotela “Iberostar” u Njivicama faza C	99
3.31.	Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaže „Oko” do glavnog gradskog bazena na Žabljaku	99
3.32.	Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku.....	99
3.33.	Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru.....	100
3.34.	Vodosnadbijevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Opština Šavnik.....	100
3.35.	Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine.....	100
3.36.	Adaptacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi	101

3.37.	Fekalna i atmosferska kanalizacija za Ski centar Kolašin 1600.....	101
3.38.	Glavni kolektor fekalne kanalizacije Ski centar Kolašin 1400	101
3.39.	Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak.....	102
3.40.	PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.....	104
3.41.	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija...	105
3.42.	Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama.....	105
3.43.	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija.....	106
3.44.	Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori.....	106
3.45.	Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	106
3.46.	Podrška u uspostavljanju EIONET sistema u Crnoj Gori	107
3.47.	Podrška u implementaciji INSPIRE direktive.....	107
3.48.	Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju uslova iz poglavlja 27 EU acquis-a i povezano jačanje kapaciteta.....	107
IV.	UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ.....	108
4.1.	Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju „Velje brdo“, podgorica.....	110
V.	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	111
5.1.	Rekonstrukcija energetske blokade - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.....	113
5.2.	Rekonstrukcija i adaptacija JZU „Vaso Čuković“ u Risnu.....	113
5.3.	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	116
5.4.	Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica	117
5.5.	Rekonstrukcija objekata stare bolnice „Danilo I“ na Cetinju	118
5.6.	Nabavka magnetne rezonance – „multislice scener“	118
5.7.	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju.....	119
5.8.	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	120
5.9.	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju.....	121
5.10.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama.....	122
5.11.	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	123
5.12.	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane...	124
5.13.	Adaptacija Doma zdravlja Budva	124
5.14.	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama.	125
5.15.	Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju	126
5.16.	Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi.....	126
5.17.	Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	126
5.18.	Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.....	127
5.19.	Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane.....	128
5.20.	Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore	128

5.21.	Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece	129
5.22.	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova	129
5.23.	Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici	131
5.24.	Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj bolnici Bijeloj Polje	131
5.25.	Sistem grijanja i hlađenja u JZU „Dom zdravlja Cetinje”	132
5.26.	Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu	132
5.27.	Rekonstrukcija i adaptacija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG	132
5.28.	Adaptacija prostorija u OB Bar za potrebe programa Baby Friendly	132
5.29.	Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku	132
5.30.	Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšiću	133
5.31.	Adaptacija DZ Kolašin	133
5.32.	Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić	134
5.33.	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore	136
5.34.	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	137
5.35.	Radovi na izgradnji operativnog centra	138
VI.	UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA	140
6.	a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA	141
6.1.	Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu	142
6.2.	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	143
5.	b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR PRAVOSUĐE	144
6.3.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa	145
6.4.	Kompleks UIKS u Danilovgradu	146
VII.	JAVNA BEZBIJEDNOST	147
7.1.	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju	149
VIII.	FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE	151
7a.	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE	152
8.1.	Izgradnja objekata za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima	153
8.2.	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni “13.jul”	153
8.3.	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	154
8.4.	Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni „Pero Četković” u Baru	154
8.5.	Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni „Breza” u Kolašinu	155

8.6.	Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni „Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima	156
8.7.	Izgradnja nove zgrade u kasarni „Milovan Šaranović” u Danilovgradu	156
8.8.	Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni „Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima	157
IX.	SOCIJALNA ZAŠTITA.....	158
8.1.	Projekat izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru....	160
8.2.	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru..	160
8.3.	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi.....	160
8.4.	Izgradnja Doma starih u Plavu	161
8.5.	Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku.....	162
X.	INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ.....	163
10.1.	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	165
10.2.	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica,naselja i nedostajuće infrastrukture grada.....	165
10.3.	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	165
10.4.	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	165
10.5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	165
10.6.	Unapređenje turističke ponude grada	165
10.7.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica	165
10.8.	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva.....	165
10.9.	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa.....	165
10.10.	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	165
9.11.	Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza.....	167
9.12.	Uređenje gradskih parkova “13. Jul” i “Njegošev park”	167
9.13.	Izgradnja “Lokande” sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	167
9.14.	Izgradnja žičare Lovćen – Cetinje.....	167
XI.	UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA	168
11.1.	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju.....	170
11.2.	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.....	171
11.3.	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju	172
11.4.	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju.....	172
XI.	ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE.....	174
11.2.	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	177
11.3.	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić.....	178
11.4.	Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	179

11.5.	Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.....	179
11.6.	Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača.....	180
11.7.	Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru	180
11.8.	Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	180
12.1.	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo).....	183
12.2.	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka.....	188
12.3.	Rekonstrukcija puta Plav - Bogičevica, Plav	189
12.4.	Putni pravac Monte Rose.....	189
12.5.	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu.....	189
12.6.	Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića	191
12.7.	Izgradnja puta Srđevac – Lozna.....	191
12.8.	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina.....	192
12.9.	Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića.....	192
12.10.	Rekonstrukcija puta Gusinje – Vusanje	192
12.11.	Izgradnja autobuske stanice Igallo - Bare.....	193
12.12.	Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrljica, Bar	193
12.13.	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	193
12.14.	Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igallo Bare	194
12.15.	Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	194
12.16.	Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	194
12.17.	Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike.....	194
12.18.	Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	195
12.19.	Rekonstrukcija bulevara „13. Jul” Nikšić	195
12.20.	Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju.....	195
12.21.	Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	195
12.22.	Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac.....	195
12.23.	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani.....	195
	Adaptacija lokalnih puteva u Komanima.....	196
12.24.	Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću.....	196
12.25.	Rekonstrukcija puta Gusinje - Grebaje.....	197
12.26.	Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici ...	197
12.27.	Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela.....	197
12.28.	Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici	198
12.29.	Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću.....	198

12.30. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva.....	198
12.31. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH)	199
12.32. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	199
12.33. Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima.....	199
12.34. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu	200
12.35. Rekonstrukcija i adaptacija gradske tržnice u Plavu	200
12.36. Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	201
12.37. Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	201
12.38. Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	202
12.39. Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje.....	202
12.40. Rekonstrukcija pijace u Tuzima.....	202
12.41. Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira „Sv.Trojica“ u Stanjevićima, Budva	202
12.42. Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	202
12.43. Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica.....	203
12.44. Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica	203
12.45. Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi.....	203
12.46. Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću	204
12.47. Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima.....	204
12.48. Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti	204
12.49. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima.....	204
12.50. Izgradnja sportske zone u Kolašinu	204
12.51. Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku.....	205
12.52. Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin.....	205
12.53. Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane.....	205
12.54. Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnjica, Bijelo Polje.....	205
12.55. Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad	205
12.56. Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Gusinje	205
12.57. Rekonstrukcije ulice Donji Pažanj, Kolašin.....	206
12.58. Rekonstrukcija Nove ulica u Plavu	206
12.59. Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja.....	206
12.60. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Čanju	206
12.61. Izgradnja lokalnog puta Tuzi-Mataguži, II faza	207
12.62. Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku.....	207

XIII.	INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA.....	208
13.1.	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	210
13.2.	Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	210
XIV.	RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE	211
14.1.	Naučno-tehnološki park u Podgorici	213
14.2.	Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić.....	215
14.3	Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću ...	216
XV.	SPORT	217
15.1.	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.....	219
15.2.	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata.....	221
15.3.	Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	222
15.4.	Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva	222
15.5.	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru.....	223
15.6.	Izgradnja sportske hale u Plužinama.....	223
15.7.	Izgradnja olimpijskog bazena u Baru	223
15.8.	Izgradnja balon sale u Zeti	224
15.9.	Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom	224
15.10.	Natkrivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici	224
15.11.	Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u centar za smještaj sportista, Pljevlja	224
15.12.	Izgradnja zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima ...	224
15.13.	Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero, Pljevlja.....	224
XVI.	UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA	225
16.1.	Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem.....	227
16.1.	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	229
	Rekonstrukcija OŠ „Vlado Milić” u Podgorici	230
	Izvođenje radova na adaptaciji krova postojećih školskih objekata OŠ “Vuk Karadžić”, Podgorica	230
	Izvođenje radova na adaptaciji JU OŠ „Mirko Srzentić”, Petrovac.....	230
	Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JU OŠ „Janko Bjelica” u Crkvicama, Nikšić	231
	Izgradnja nove Osnovne škole u Igalu, Herceg Novi.....	231
	Izgradnja Gimnazije u Baru	231
	Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću.....	231
16.2.	Izgradnja , rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	232
	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Lovčenski partizanski odred” na Cetinju	232

Izvođenje radova na adaptaciji fiskulturne sale JU OŠ “Boško Strugar” Ulcinj.....	232
Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ „Risto Ratković“ u Bijelom Polju i JU OŠ „Radomir Mitrović“ Berane.....	232
16.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica	232
16.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica.....	233
16.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu	233
16.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici	233
16.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama	233
16.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju	233
16.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu.....	234
16.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Baru	234
16.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Ulcinju.....	234
16.12. Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju	234
16.13. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici	235
16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	235
16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica	236
16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi.....	236
16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici.....	236
16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru.....	236
16.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici.....	236
16.20. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica	236
16.21. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi.....	237
16.22. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.....	237
16.23. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću.....	239
16.24. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	239
16.25. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor“ Masline	239
16.26. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat.....	241
16.27. Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić	242
16.28. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko“ u Baru	242
16.29. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, Opština Bar	242

16.30. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.....	243
16.31. Izgradnja sportske sale za JU OŠ „Bajo Jojić” u Andrijevići	244
16.32. Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	244
16.33. Izgradnja fiskulturne sale „Ivo Visin” Prčanj, Kotor	244
16.34. Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a.....	245
16.35. Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	245
16.36. Adaptacija krova vrtića JPU “Vukosava Ivanović”, Bar.....	245
16.37. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović” – područno odjeljenje u Donjim lugama, Opština Berane	246
16.38. Izgradnja novog vrtića u Nikšiću.....	246
16.39. Izgradnja paviljona u sastavu OŠ „Oktoih”, Podgorica	247
16.40. Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	247
16.41. Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima.....	247
16.42. Adaptacija školskog dvorišta JU Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović”, Podgorica	247

UVOD

Ministarstvo javnih radova, kao nasljednik Uprave za kapitalne projekte, formirano je 15. aprila 2025. godine.

Zakonom o budžetu Crne Gore opredijeljena su sredstva u iznosu od 135.600.000,00€ od čega 135.599.907,50€ iz budžetskih sredstava, 53,00€ iz kredita, 5,00 € donacija i 34,50€ IPA sredstva.

U periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 123.793.416,44€, od čega 115.772.170,97€ iz budžetskih sredstava, 5.195.469,09 iz IPA fondova, 1.604.478,01€ iz donacija i 1.221.298,37€ iz kredita.

Budžetom je obuhvaćena realizacija 293 projekta koja obuhvata i kumulativne pozicije kroz koje se realizuje veći broj podprojekata. U periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Ministarstvo javnih radova raspisalo je 183 postupka javnih nabavki.

Kroz Izvještaj o realizaciji za 2025. godinu godine detaljno su prezentovane do sada sprovedene aktivnosti na svim projektima i podprojektima obuhvaćenim Zakonom o budžetu Crne Gore, uz prateću fotodokumentaciju radova koji su završeni ili su u toku.

Prijedlog Ministarstva javnih radova bio je da se, u okviru obezbijeđenih sredstava Zakonom o budžetu, utvrde prioritetni projekti za koje će biti obezbijeđeni ukupni iznosi neophodni za njihov završetak, čime bi se izbjegla faznost, a samim tim i pojednostavila realizacija i skratili rokovi izgradnje.

Realizaciju određenih projekata prate otežavajuće okolnosti na koje ne može uticati, izuzev u formi urgencija ka odgovornim licima i nadležnim institucijama, kao i proaktivnog odnosa u slučaju svakog pojedinačnog projekta.

Iako su određeni projekti obuhvaćeni Zakonom o budžetu Crne Gore, Ministarstvo javnih radova nije u mogućnosti da započne aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji jer Korisnici (odnosno Investitori u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji) nisu dostavili neophodnu dokumentaciju. Inicijalna dokumentacija se najčešće odnosi na ovjeren projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove, odnosno Idejno rješenje za projekte za koje je bilo neophodno u saradnji sa nadležnim ministarstvom sprovesti proceduru arhitektonskog konkursa.

U okviru svojih nadležnosti Korisnici za određene projekte sprovode aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije, te Ministarstvo javnih radova ne može otpočeti sa tenderskom procedurom za izbor izvođača radova i stručnog nadzora dok projektna dokumentacija od strane Korisnika ne bude dostavljena. Takođe, realizaciju projekata često prolongiraju i postupci eksproprijacija, odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi zbog kojih nerijetko dolazi i do obustave radova.

U okviru indirektnog upravljanja IPA fondovima u IPA II perspektivi (2014-2020) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2014, 2016, 2017, 2018 kao i za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017) i u IPA III perspektivi (2021-2027) Uprava za kapitalne projekte ima ulogu Implementacione agencije i to za Godišnji akcioni program 2021.

Ukupan broj aktivnih projekata koji su obuhvaćeni ovim programima je 29.

➤ U okviru CAP2016 programa u toku je realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine, gdje je korisnik Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a implementiraju se sljedeći projekti: Podrška implementaciji i praćenju upravljanja vodama, Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija i Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2016 programa iznosi 9.628.384,96 €, a do sada je realizovano 9.396.912,5 €.

➤ U okviru CAP2017 programa obuhvaćeni se sljedeći projekti: Tehnička podrška za pripremu investicionih

projekata u saobraćaju, Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja, Tehnička podrška u jačanju institucionalnih kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta, Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju, Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora i Nabavka opreme za unaprjeđenje bezbjednosti pomorske plovidbe u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2017 programa iznosi 11.251.231,60€, a do sada je realizovano 10.887.069,41€.

➤ U okviru CAP2018 programa obuhvaćeni su sljedeći projekti: Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore, Izvođenje radova na rekonstrukciji/adaptaciji mikrobioloških laboratorija, Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških laboratorija, Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije, Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica), Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu. Ukupna vrijednost projekata u okviru CAP2018 programa iznosi 34.788.716,28€, a do sada je realizovano 27.580.740,58€.

➤ U okviru SOPEES programa implementira se projekat adaptacije školskih objekata za pristup osoba sa invaliditetom. Ugovorena vrijednost je 797.281,12€, a do sada je realizovano 605.158,43€.

➤ U okviru IPA III, PROGRAM IPA2021 obuhvaćena je realizacija sljedećih projekata: Izgradnja i nadzor 3 granična kontrolna mjesta na graničnim prelazima Božaj (Albanija), Kula (Kosovo) i Aerodrom Podgorica, Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori, Tehnička podrška za jačanje kapaciteta, usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija (Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju zahtjeva iz Poglavlja 27 pravne tekovine EU i povezano jačanje kapaciteta, Podrška uspostavljanju EIONET-a za sistem praćenja izvještavanja i Podrška u sprovođenju INSPIRE direktive) i Tehnička podrška za programiranje i implementaciju projekata IPA III. Ukupna vrijednost projekata u okviru IPA III programa iznosi 6.842.942,35€, a do sada je realizovano 1.080.031,00€.

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROGRAMIMA

TABELA PLAĆANJA - KAPITALNI BUDŽET ZA 2025. GODINU 31.12.2025. godine			
41506	Naziv projekta	OBEZBJEĐENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2025. GODINU NAKON PREUSMJERAVANJA	PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2025.GODINU
		UKUPNO	UKUPNO
11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	379.801,00	2.400,00
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	47.616.814,39	40.857.755,29
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	14.276.488,08	10.911.013,62
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	521.985,00	2.751.675,46
19 032 K04	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	16.522.075,04	18.119.769,68
19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	1.470.082,00	1.248.432,85
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	2.078.400,00	1.662.522,71
19 032 K05	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	83.000,00	1.388,69
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	1.409.002,00	1.155.652,10
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	11.585.013,00	10.739.860,66
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	1.094.571,00	1.980.802,07
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	2.950.500,00	2.377.521,74
16 002 K01	Priorekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	78.000,00	11,150,00
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	11.283,003,00	10.292.595,25
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosuđa	310.183,00	284.549,32
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	1.833.392,00	1.326.307,61
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	390.000,00	347.199,11
13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	6.889.584,05	5.618.140,32

17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova- sektor Saobraćaj	462.608,00	1.494.597,89
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	14.254.996,44	12.512.240,07
	SVE UKUPNO	135.599.907,50	123.793.416,44

TABELARNI PRIKAZ PLAĆANJA PO PROJEKTIMA

TABELA PLAĆANJA- KAPITALNI BUDŽET ZA 2025. GODINU 31.12.2025. godine

40903	Naziv projekta	PLANIRANO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2025. GODINU			PLAĆENO KAPITALNIM BUDŽETOM ZA 2025.GODINU		
		Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO	Tekući izdaci	Kapitalni izdaci	UKUPNO
		11 052 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa-sektor Politički sistem i upravljanje	27,800.00	352,001.00	379,801.00	2,400.00
1.1	Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici	18,800.00	351,001.00	369,801.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	9,000.00	1,000.00	10,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11 052 K02	Upravljanje javnim investicijama	110,003.00	0.00	110,003.00	97,842.00	0.00	97,842.00
2.1	Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije	110,003.00	0.00	110,003.00	97,842.00	0.00	97,842.00
17 020 K04	Izgradnja lokalne infrastrukture	814,519.00	46,802,295.39	47,616,814.39	165,168.84	40,692,586.45	40,857,755.29
3.1	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	150,000.00	19,005,574.67	19,155,574.67	75,983.10	18,259,592.37	18,335,575.47
3.1.1.	Lokalni putevi km	150,000.00	19,005,574.67	19,155,574.67	75,983.10	18,259,592.37	18,335,575.47
3.2.1	Gradske saobraćajnice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo - Gusinje	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav	1.00	1,001.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Putni pravac Monte Rose Tivat	8,000.00	1,182,273.00	1,190,273.00	0.00	1,012,023.02	1,012,023.02
3.7	Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu	5,438.00	1,593,998.00	1,599,436.00	5,437.74	1,584,998.00	1,590,435.74

3.8	Izgradnja puta Danilovgrad Spuž preko Martinića	25,000.00	3,880,000.00	3,905,000.00	18,634.00	3,385,290.57	3,403,924.57
3.9	Izgradnja puta Srđevac Lozna	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.10	Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina Podgorica	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.11	Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića	5,000.00	2,241,565.00	2,246,565.00	0.00	818,126.66	818,126.66
3.12	Rekonstrukcija puta Gusinje Vusanje	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	335,627.73	335,627.73
3.13	Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare	5,000.00	2,097,000.00	2,102,000.00	0.00	1,760,218.47	1,760,218.47
3.14	Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.15	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka Žabljak	10,000.00	850,000.00	860,000.00	0.00	299,323.56	299,323.56
3.16	Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare	4,999.00	116,001.00	121,000.00	0.00	57,942.37	57,942.37
3.17	Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3.18	Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama	5,000.00	400,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
3.19	Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
3.20	Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić	0.00	563,000.00	563,000.00	0.00	562,536.57	562,536.57
3.21	Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić	4,999.00	300,001.00	305,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
3.22	Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.23	Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka	4,999.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.24	Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac	5,000.00	795,000.00	800,000.00	0.00	697,620.07	697,620.07

3.25	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani	4,000.00	51,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
3.26	Izgradnja vatrogasno-spasilčkog doma u Nikšiću	22,000.00	1,108,000.00	1,130,000.00	3,499.32	1,106,833.73	1,110,333.05
3.27	Rekonstrukcija puta Gusinje - Grebaje	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3.28	Uređenje trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici	3,999.00	999.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00
3.29	Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela	7,000.00	515,000.00	522,000.00	6,594.50	513,440.87	520,035.37
3.30	Rekonstrukcija ul. Branka Ćopića / Janka Vukotića u Podgorici	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3.31	Rekonstrukcije školske ulice u Nikšiću	5,000.00	697,150.00	702,150.00	0.00	696,531.82	696,531.82
3.32	Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva	200,000.00	1,571,984.16	1,771,984.16	35,581.95	1,561,984.06	1,597,566.01
3.33	Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.34	Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti	10,000.00	600,000.00	610,000.00	9,129.03	400,128.59	409,257.62
3.35	Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
3.36	Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	5,000.00	64,904.56	69,904.56	0.00	54,904.56	54,904.56
3.37	Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	5,082.00
3.38	Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin	4,000.00	1,317,000.00	1,321,000.00	0.00	1,301,000.00	1,301,000.00
3.39	Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom	10,000.00	810,000.00	820,000.00	0.00	781,730.24	781,730.24
3.40	Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	73,835.17	73,835.17
3.41	Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje	5,000.00	250,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
3.42	Rekonstrukcija pijace u Tuzima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.43	Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv. Trojica" u Stanjevićima, Budva	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3.44	Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.45	Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
3.46	Sanacija lokalnog puta Orahovo - Gornji Zatrijebač, Podgorica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.47	Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.48	Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportstko-rekreativnog parka u Nikšiću	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.49	Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Tuzi u Golubovcima	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3.50	Rekonstrukcija puta Tuzi - Hoti	50,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	10,309.20	980,040.37	990,349.57
3.51	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.52	Izgradnja sportske zone u Kolašinu	10,000.00	1,300,000.00	1,310,000.00	0.00	1,234,535.77	1,234,535.77
3.53	Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.54	Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3.55	Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.56	Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnica, Bijelo Polje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.57	Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3.58	Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Gusinje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.59	Rekonstrukcija ulice Donji Pažanj, Kolašin	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00
3.60	Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu	10,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00	188,399.88	188,399.88

3.61	Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.62	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice u Čanju	11,000.00	2,730,840.00	2,741,840.00	0.00	2,720,840.00	2,720,840.00
3.63	Izgradnja lokalnog puta Tuzi - Mataguži, II faza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.64	Uređenje korita rijeke Ibar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.65	Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 030 K01	Razvojni projekti Prijestonice Cetinje	1,387,500.00	9,895,503.00	11,283,003.00	1,304,366.66	8,988,228.59	10,292,595.25
4.1	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	170,000.00	0.00	170,000.00	154,172.58	0.00	154,172.58
4.3	Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	1,700.00	1,590,000.00	1,591,700.00	1,694.00	1,589,976.04	1,591,670.04
4.5	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje	20,000.00	570,000.00	590,000.00	29,534.00	400,289.91	429,823.91
4.6	Unapređenje turističke ponude grada	885,300.00	10,000.00	895,300.00	880,406.82	10,000.00	890,406.82
4.7	Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobraćajnica	100,000.00	2,790,000.00	2,890,000.00	91,153.30	2,789,803.23	2,880,956.53
4.8	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	43,000.00	1,150,000.00	1,193,000.00	42,894.50	1,150,000.00	1,192,894.50
4.9	Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa	49,500.00	880,500.00	930,000.00	55,573.69	851,951.27	907,524.96
4.10	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	78,000.00	1,589,000.00	1,667,000.00	22,264.00	1,496,208.14	1,518,472.14
4.11	Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4.12	Uređenje gradskih parkova "13. jul" i "Njegošev park"	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

4.13	Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Izgradnja žičare Lovćen - Cetinje	30,000.00	616,003.00	646,003.00	26,673.77	0.00	26,673.77
12 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad Pravosudja	304,181.00	6,002.00	310,183.00	163,999.85	120,549.47	284,549.32
5.1	Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	4,001.00	1,001.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenju krivičnih sankcija	300,180.00	5,001.00	305,181.00	163,999.85	120,549.47	284,549.32
12 024 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Pravosuđe	3,400.00	1,829,992.00	1,833,392.00	300,608.00	1,025,699.61	1,326,307.61
6.1	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa	400.00	330,001.00	330,401.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Kompleks UIKS-a u Danilovgradu	3,000.00	1,499,991.00	1,502,991.00	300,608.00	1,025,699.61	1,326,307.61
13 024 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti	10,000.00	380,000.00	390,000.00	9,196.00	338,003.11	347,199.11
7.1	Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice policije u Gusinju	10,000.00	380,000.00	390,000.00	9,196.00	338,003.11	347,199.11
13 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane	187,000.00	6,702,584.05	6,889,584.05	93,516.94	5,524,623.38	5,618,140.32
8.1	Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Izgradnja objekta za prihvatanje i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	22,000.00	125,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00

8.3	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	20,000.00	283,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00
8.4	Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru	105,000.00	3,634,584.05	3,739,584.05	73,215.00	3,109,584.05	3,182,799.05
8.6	Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	117,847.89	117,847.89
8.7	Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima	10,000.00	760,000.00	770,000.00	10,000.00	626,512.15	636,512.15
8.8	Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	30,000.00	1,700,000.00	1,730,000.00	10,301.94	1,670,679.29	1,680,981.23
8.9	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 019 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova-sektor Saobraćaj	243,353.00	219,255.00	462,608.00	185,464.55	1,309,133.34	1,494,597.89
9.1	Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizaciju pomoćnih objekata za navigaciju	99,750.00	159,657.50	259,407.50	354.82	1,052,908.96	1,053,263.78
9.2	Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja	1.00	1,001.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja	140,401.00	0.00	140,401.00	146,474.73	0.00	146,474.73
9.4	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	3,201.00	59,003.00	62,204.00	38,635.00	256,224.38	294,859.38
18 003 K01	Projekti očuvanja životne sredine	916,002.00	13,338,994.44	14,254,996.44	334,706.73	12,177,533.34	12,512,240.07
10.1	Izgradnja objekta Eko efikasne zgrade Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

10.2	Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada	165,000.00	5,000.00	170,000.00	150,296.14	0.00	150,296.14
10.3	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja	20,000.00	150,002.00	170,002.00	0.00	42,253.25	42,253.25
10.5	Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Izgradnja vodovodne mreže na hercegovačkom poluostrvu Luštica	50,000.00	1,569,664.44	1,619,664.44	20,158.40	1,418,288.86	1,438,447.26
10.7	Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Vodosnabdijevanje Plješ Pljevalja	100,000.00	2,450,000.00	2,550,000.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
10.10	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
10.11	Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.12	Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.13	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići	99.00	3,566,321.00	3,566,420.00	0.00	3,566,098.69	3,566,098.69
10.14	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
10.15	Vodovod Seošnica - razdjelne komore za MZ Seošnica, opština Rožaje	7,999.00	431,001.00	439,000.00	4,416.50	431,000.20	435,416.70
10.16	Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko	15,000.00	135,000.00	150,000.00	0.00	111,027.45	111,027.45

10.17	Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.18	Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću	150,000.00	1.00	150,001.00	0.00	0.00	0.00
10.19	Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo	5,000.00	140,000.00	145,000.00	0.00	13,023.23	13,023.23
10.20	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta Merića vrelo, Berane	19,999.00	2,027,002.00	2,047,001.00	0.00	2,027,001.00	2,027,001.00
10.21	Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.22	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
10.23	Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac	28,000.00	862,000.00	890,000.00	27,551.70	861,949.22	889,500.92
10.24	Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje	10,000.00	210,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00
10.25	Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak	4,000.00	410,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
10.26	Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice	15,904.00	100,000.00	115,904.00	9,655.00	0.00	9,655.00
10.27	Razdvajanje fekalne i atmosfere kanalizacije u Mojkovcu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.28	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja	5,000.00	5,002.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00
10.29	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsićko-Poličkog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.30	Izgradnja šetališta i kanalizacije od "Titove vile" do hotela "Iberostar" u Njivicama - faza C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.31	Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaže "Oko" do glavnog gradskog bazena na Žabljaku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.32	Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku	5,000.00	165,000.00	170,000.00	0.00	127,980.52	127,980.52

10.33	Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru	216,000.00	0.00	216,000.00	102,850.00	0.00	102,850.00
10.34	Vodosnabdijevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Šavnik	5,000.00	135,000.00	140,000.00	4,469.79	121,299.76	125,769.55
10.35	Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine	10,000.00	240,000.00	250,000.00	9,341.20	240,000.00	249,341.20
10.36	Adapatacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi	20,000.00	596,000.00	616,000.00	968.00	456,607.64	457,575.64
10.37	Fekalna i atmosferska kanalizacija za ski centar Kolašin 1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.38	Glavni kolektor fekalne kanalizacije ski centar Kolašin 1400	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
10.39	Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak	5,000.00	110,000.00	115,000.00	5,000.00	101,003.52	106,003.52
15 019 K01	Unapređenje turističke ponude	816,500.00	13,459,988.08	14,276,488.08	283,221.05	10,627,792.57	10,911,013.62
11.1	Ski centar na lokalitetu Kolašin, Kolašin	24,000.00	111,003.00	135,003.00	2,262.70	95,284.15	97,546.85
11.2	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	100,000.00	967,101.00	1,067,101.00	16,502.43	630,398.56	646,900.99
11.3	Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac	180,000.00	1,765,001.00	1,945,001.00	100,313.72	1,249,391.99	1,349,705.71
11.4	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	50,000.00	4,540,002.00	4,590,002.00	29,645.86	4,201,370.22	4,231,016.08
11.5	Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak	500.00	3.00	503.00	84.70	0.00	84.70
11.6	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	165,000.00	1,725,002.00	1,890,002.00	60,626.09	1,201,727.48	1,262,353.57
11.7	Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu	42,000.00	3,586,872.08	3,628,872.08	21,579.75	3,199,620.17	3,221,199.92
11.8	Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11.9	Objekat "Kuća voća" u Andrijevici	4,000.00	61,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.11	Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osniježavanjem	158,000.00	1.00	158,001.00	52,205.80	0.00	52,205.80

11.12	Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača"	48,000.00	2,001.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00
11.13	Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica	21,000.00	600,002.00	621,002.00	0.00	0.00	0.00
11.14	Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.15	Izgradnja gondole od centra Kolašina do ski centra Kolašin 1600	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18 003 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj	521,984.00	1.00	521,985.00	1,971,948.98	779,726.48	2,751,675.46
12.1	PPOV kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	1,000.00	0.00	1,000.00	451.13	0.00	451.13
12.2	Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija	419,502.00	0.00	419,502.00	1,697,256.13	0.00	1,697,256.13
12.3	Podrška u implementaciji i monitoring upravljanja vodama	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	499,726.48	499,726.48
12.4	Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori	53,101.00	0.00	53,101.00	274,241.72	0.00	274,241.72
12.6	Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme	699.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00
42701	Podrška u uspostavljanju EIONET sistema u Crnoj Gori	42,121.00	0.00	42,121.00	0.00	280,000.00	280,000.00
12.8	Podrška u implementaciji INSPIRE direktive	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
19 032 K04	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja	647,446.92	15,874,628.12	16,522,075.04	532,377.07	17,587,392.61	18,119,769.68
13.1	Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja	34,001.00	1,206,001.00	1,240,002.00	7,729.65	1,143,395.01	1,151,124.66

13.2	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja	8,001.00	1.00	8,002.00	1,475.39	0.00	1,475.39
13.3	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB II	13,005.00	13.00	13,018.00	27,225.00	0.00	27,225.00
13.3.1	Vrtić u City kvartu	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
13.3.2	Vrtić na Starom aerodromu u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.3.3	Vrtić na Tuškom putu u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.3.4	Vrtić na Zlatici u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.3.5	Vrtić u Beranama	12,999.00	2.00	13,001.00	27,225.00	0.00	27,225.00
13.3.6	Vrtić u Bijelom Polju	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.3.7	Vrtić u Plavu	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića iz kredita CEB I	37,502.00	280,006.00	317,508.00	102,146.02	1,339,907.25	1,442,053.27
13.4.1	Rekonstrukcija predškolskih ustanova	2.00	2.00	4.00	62,625.00	0.00	62,625.00
1339	Vrtić u Baru	10,002.00	280,002.00	290,004.00	18,467.02	1,339,907.25	1,358,374.27
13.4.3	Vrtić u Ulcinju	27,498.00	2.00	27,500.00	21,054.00	0.00	21,054.00
13.5	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a	230,004.00	14.00	230,018.00	221,672.00	0.00	221,672.00
13.6.1	Druga Gimnazija u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.6.2	Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.6.3	Osnovna škola u City kvartu u Podgorici	229,998.00	2.00	230,000.00	221,672.00	0.00	221,672.00
13.6.4	Osnovna škola u Karabuškom polju Tuzi u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.6.5	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.6.6	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
13.6.7	Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00

13.7	Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,323.12	196,323.12
13.8	Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi	39,000.00	1,000.00	40,000.00	26,620.00	0.00	26,620.00
13.9	Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici	35,629.92	2,425,274.12	2,460,904.04	35,365.88	2,416,033.63	2,451,399.51
13.10	Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću	8,000.00	1,501,000.00	1,509,000.00	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00
13.11	Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.12	Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica	5,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00	0.00	2,480,745.94	2,480,745.94
13.13	Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat	78,000.00	2,769,000.00	2,847,000.00	36,977.40	2,456,526.73	2,493,504.13
13.14	Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u opštini Nikšić	1,000.00	500,000.00	501,000.00	210.00	499,596.90	499,806.90
13.15	Sanacija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" Bar	6,100.00	258,400.00	264,500.00	6,050.00	258,391.21	264,441.21
13.16	Izgradnja fiskulturne sale za OŠ "Mrkojevići" u Pečuricama, opština Bar	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
13.17	Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	0.00	469,997.00	469,997.00	0.00	469,644.75	469,644.75
13.18	Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevici	18,453.00	1,000.00	19,453.00	18,452.50	0.00	18,452.50
13.19	Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.20	Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor	23,000.00	1,000.00	24,000.00	18,150.00	0.00	18,150.00
13.21	Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	15,001.00	2,691,499.00	2,706,500.00	10,079.29	2,488,327.87	2,498,407.16
13.22	Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović", područno odjeljenje u donjim lugama, Berane	10,000.00	292,163.00	302,163.00	7,644.78	292,162.55	299,807.33
13.23	Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.24	Izgradnja novog vrtića u Nikšiću	20,000.00	509,760.00	529,760.00	0.00	395,916.69	395,916.69

13.25	Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica	20,000.00	349,000.00	369,000.00	0.00	334,105.20	334,105.20
13.26	Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.27	Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima	19,000.00	981,000.00	1,000,000.00	0.00	883,480.88	883,480.88
13.28	Adaptacija školskog dvorišta SEŠ "Mirko Vešović", Podgorica	4,250.00	76,000.00	80,250.00	3,141.16	75,791.82	78,932.98
13.29	Adaptacija krova i vrtića JPU "Vukosava Ivanović", Bar	10,000.00	360,000.00	370,000.00	9,438.00	356,043.06	365,481.06
19 040 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke	19,999.00	1,450,083.00	1,470,082.00	0.00	1,248,432.85	1,248,432.85
14.1	Naučno-tehnološki park u Podgorici	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	234,690.30	234,690.30
14.2	Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić	4,999.00	556,002.00	561,001.00	0.00	554,666.07	554,666.07
14.2	Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću	15,000.00	659,081.00	674,081.00	0.00	459,076.48	459,076.48
19 038 K01	Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	348,400.00	1,730,000.00	2,078,400.00	159,079.36	1,503,443.35	1,662,522.71
15.1	Rekonstrukcija zapadna tribina FK Sutjeska u Nikšiću	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata	132,300.00	155,000.00	287,300.00	8,470.00	68,133.74	76,603.74
15.3	Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo	4,000.00	372,000.00	376,000.00	0.00	235,692.51	235,692.51
15.4	Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.5	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko - rekreativnog kompleksa u Baru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.6	Izgradnja sportske hale u Plužinama	57,000.00	1,200,000.00	1,257,000.00	32,912.00	1,199,617.10	1,232,529.10
15.7	Izgradnja olimpijskog bazena u Baru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.8	Izgradnja balon sale u Zeti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.9	izgradnja istočne tribina Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

15.10	Natkrivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.11	Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u Centar za smještaj sportista, Pljevlja	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.12	Izgradnja zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima	133,100.00	1,000.00	134,100.00	117,697.36	0.00	117,697.36
15.13	Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero, Pljevlja	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
19 032 K03	Prijekti koji se finansiraju iz IPA fondova - Sektor obrazovanje	13,000.00	70,000.00	83,000.00	1,388.69	0.00	1,388.69
16.1	Inkluzija marginalnih grupa u obrazovni sistem	13,000.00	70,000.00	83,000.00	1,388.69	0.00	1,388.69
20 021 K01	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	76,000.00	1,333,002.00	1,409,002.00	27,531.07	1,128,121.03	1,155,652.10
17.1	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	10,000.00	5,000.00	15,000.00	13,788.94	0.00	13,788.94
17.2	Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture	20,000.00	466,001.00	486,001.00	10,756.90	399,226.74	409,983.64
17.3	Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
17.4	Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.5	Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću	18,000.00	160,000.00	178,000.00	0.00	102,397.36	102,397.36
17.6	Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača	4,000.00	701,000.00	705,000.00	2,985.23	626,496.93	629,482.16
17.7	Rekonstrukcija palate Drago u Kotoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.8	Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21 011 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva	987,002.00	10,598,011.00	11,585,013.00	386,326.60	10,353,534.06	10,739,860.66

18.1	Rekonstrukcija energetskog bloka trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	4,000.00	401,000.00	405,000.00	0.00	401,000.00	401,000.00
18.2	Rekonstrukcija i adaptacija JZU "Vaso Čuković" Risan	53,000.00	1,950,001.00	2,003,001.00	49,514.41	1,941,406.20	1,990,920.61
18.3	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	175,000.00	800,001.00	975,001.00	3,777.76	911,832.04	915,609.80
18.4	Dom zdravlja u City kvartu Podgorica	400,000.00	5,000.00	405,000.00	180,290.84	0.00	180,290.84
18.5	Rekonstrukcija objekata stare bolnice "Danilo I" na Cetinju	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.6	Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.7	Centar PET CT sa klinikom za hematologiju	75,002.00	5,005.00	80,007.00	70,420.79	0.00	70,420.79
18.8	Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav	20,000.00	350,001.00	370,001.00	0.00	301,497.13	301,497.13
18.9	Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju	14,000.00	181,001.00	195,001.00	2,757.43	156,433.26	159,190.69
18.10	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama	30,000.00	290,001.00	320,001.00	0.00	286,392.71	286,392.71
18.11	Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju	100,000.00	585,000.00	685,000.00	69,304.57	563,202.56	632,507.13
18.12	Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.13	Adaptacija Doma zdravlja Budva	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	398,819.76	398,819.76
18.14	Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama	4,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
18.15	Rekonstrukcija objekta nekadašnje dječje bolnice na Cetinju	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.16	Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi	0.00	360,001.00	360,001.00	0.00	358,160.00	358,160.00
18.17	Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi	0.00	99,999.00	99,999.00	0.00	90,544.30	90,544.30
18.18	Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	22,000.00	609,000.00	631,000.00	0.00	608,377.82	608,377.82
18.19	Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.20	Nabavka linearnog akceleratora za KCCG	5,000.00	3,805,000.00	3,810,000.00	0.00	3,802,304.00	3,802,304.00

18.21	Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.22	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova	3,000.00	2,000.00	5,000.00	1,904.80	0.00	1,904.80
18.23	Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.24	Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.25	Sistem grijanja i hlađenja u JZU "Dom zdravlja Cetinje"	1,000.00	5,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00
18.26	Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.27	Adaptacija i rekonstrukcija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
18.28	Adaptacija prostora u OB Bar za potrebe programa Babyfriendly	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
18.29	Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku	10,000.00	220,000.00	230,000.00	4,356.00	183,009.23	187,365.23
18.30	Adaptacija dječjeg dispanzera DZ NK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.31	Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić	10,000.00	510,000.00	520,000.00	0.00	350,555.05	350,555.05
18.32	Adaptacija DZ Kolašin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 011 K02	Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo	59,215.00	1,035,356.00	1,094,571.00	43,635.47	1,937,166.60	1,980,802.07
19.1	Izgradnja klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KC CG	49,001.00	1,025,002.00	1,074,003.00	33,685.47	1,620,877.70	1,654,563.17
19.2	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	5,215.00	10,353.00	15,568.00	5,000.00	112,571.52	117,571.52
19.3	Radovi na izgradnji operativnog centra	4,999.00	1.00	5,000.00	4,950.00	203,717.38	208,667.38
22 025 K01	Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	65,000.00	2,885,500.00	2,950,500.00	7,836.61	2,369,685.13	2,377,521.74

20.1	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	25,000.00	1,035,000.00	1,060,000.00	7,352.61	598,847.58	606,200.19
20.2	Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.3	Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	25,000.00	338,500.00	363,500.00	0.00	269,545.53	269,545.53
20.4	Izgradnja Doma starih u Plavu	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
20.5	Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku	15,000.00	512,000.00	527,000.00	484.00	501,292.02	501,776.02
16 002 K01	Priprojekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021 - oblast poljoprivrede	7,999.00	70,001.00	78,000.00	11,150.00	0.00	11,150.00
21.1	Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta, izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja	7,999.00	70,001.00	78,000.00	11,150.00	0.00	11,150.00
18 004 K01	Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1	Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", Podgorica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVE UKUPNO	7,566,303.92	128,033,603.58	135,599,907.50	6,081,764.47	117,711,651.97	123,793,416.44

PROGRAM

I. POLJOPRIVREDA

POTPROGRAM

**1. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – IPA2021, OBLAST
POLJOPRIVREDE**

1.1. Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja

- Projekat se realizuje u sklopu IPA III, AAP 2021 programa.
- Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije, izgradnja i opremanje tri granična kontrolna mjesta (Aerodrom Golubovci, Božaj i Kula) i jedne karantinske jedinice za zdravlje bilja u Tološima, ali i nadzor nad pomenutim objektima.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAIII/CAP21/SER/01-908/24-5984/1 sa projektantom, koji će biti zadužen i za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad radovima je potpisan 07.11.2024. sa kompanijom „Urbi pro“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 150.000,00€.
- Implementacije ugovora je u toku. Revidovani glavni projekat i tenderska dokumentacija za izgradnju graničnog kontrolnog mjesta na graničnom prelazu Aerodrom Golubovci je završena u oktobru 2025 godine i raspisan je tender za radove na pomenutoj lokaciji po PRAG proceduri. Rok za ugovaranje svih projekata iz programa AAP 2021 je bio 15.12.2025 godine. Ugovor o radovima na pomenutoj lokaciji je potpisan 11.12.2025. godine. Za ostale lokacije ugovaranje će se vršiti po nacionalnom zakonodavstvu budući da se zbog problematike nije moglo stići ugovoriti ugovori o radovima po PRAG pravilima do pomenutog roka. Za karantinsku jedinicu u Tološima završen je Glavni projekat i isti je revidovan. Ministarstvo javnih radova očekuje od Uprave za bezbjednost hrane zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke za odabir izvođača radova. Za granični prelaz Božaj u toku je izrada glavnog projekta. Očekuje se da glavni projekat bude revidovan uskoro. Za granični prelaz Kula u Rožajama, došlo je do promjene lokacije samog graničnog prelaza. Iz Uprave policije i Uprave carina su angažovali projektanta za izradu glavnih projekata objekata za njihove potrebe. Nakon nekoliko sastanka usklađene su pozicije objekata i donijeto je idejno rješenje za poziciju sva 3 objekta. Čeka se zvanično odobrenje svih relevantnih institucija na pomenuto rješenje kako bi se nastavilo sa projektovanjem.
- Za izvođenje radova na izgradnji graničnog kontrolnog mjesta na lokaciji Aerodrom Golubovci, ugovor sa izvođačem radova “Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 11.12.2025. godine na iznos od 688.042,35€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini realizovano je 11.150,00€.

PROGRAM

II. TURISTIČKA DJELATNOST

POTPROGRAM

2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Ministarstvo javnih radova sa resornim ministarstvom sprovodi aktivnosti na valorizaciji turističkih lokaliteta, ulaganja u razvoj ski centara, unapređenje turističke infrastrukture, izgradnju panoramskih gondola i drugih pratećih sadržaja. Aktivnostima na realizaciji projekata "Unapređenja turističke ponude" koordinira nadležno ministarstvo koje utvrđuje potrebe i prioritete i dostavlja dokumentaciju na osnovu koje Ministarstvo javnih radova pokreće aktivnosti iz svoje nadležnosti kao naručilac posla.

2.1. Ski centar na lokalitetu „Kolašin 1600”, Kolašin

- Realizacija ovog projekta planirana je fazno.
- Završeni su radovi prve faze koja je obuhvatila: putnu infrastrukturu od Ski rezorta „Kolašin 1450” do Ski rezorta „Kolašin 1600” sa izgradnjom potpornih zidova, sanaciju klizišta i izgradnja parkinga za dnevne skijaše, izgradnju bazne stanice sa sistemom vodosnadbijevanja, izgradnju žičare K8 sa pripadajućim cca 10km staza, trafostanica 35/10kW i dvije trafostanice 10/0,4kW, kao i nabavku dvije mašine za pripremu ski staza.
- Sve aktivnosti planirane za realizaciju prve faze su završene i ski centar je stavljen u funkciju krajem 2019. godine.
- Kroz drugu fazu je završena: izgradnja žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza. U toku je izgradnja garaže na lokalitetu „Kolašin 1450” i ugovorena je izgradnja hidrotehničke infrastrukture za vodosnadbijevanje i osvježavanje.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 97.546,85 €.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „sidro”

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju novog fiksnog Ski lifta tipa „sidro” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4725/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine, na iznos od 2.079.855,54€ .
- Ugovor br. 01-334/23-5313/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-560/2 sa stručnim nadzorom “Ding” Podgorica, zaključen je 06.02.2024. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni, dobijena je upotrebna dozvola, u toku su aktivnosti na primopredaji sa Investitorom – Ministarstvom turizma.
- U 2025. godini realizovano je 37.980,54€.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa „tanjir”

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za Izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i Izgradnja novog fiksnog Ski lifta tipa „tanjir” na skijalištu „Kolašin 1600” po principu „projektuj i izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
- Ugovor br. 01-334/23-4726/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 1.506.315,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-5312/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-560/1 sa stručnim nadzorom “Ding” Podgorica, zaključen je 06.02.224. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni, dobijena je upotrebna dozvola, u toku su aktivnosti na primopredaji sa Investitorom – Ministarstvom turizma.

- U 2025. godini realizovano je 32.414,54€.

Ski staze uz žičaru K7

- Projekat se realizuju po principu „projektuj i izgradi“. Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7“ sa pratećom opremom i signalizacijom.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7“ je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini realizovano je 27.067,07€.

Rekonstrukcija skijaške staze broj 17 u ski centru Kolašin 1600

- Projekat se odnosi na izvođenje radova u cilju zaštite od oštećenja, kao i bezbjednog korišćenja ski staze broj 17.
- Uprava za kapitalne projekte je u tokom 2024. godine raspisala dva javna nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 243.000,00€ bez pdv-a na kojima nije bilo pristiglih ponuda. Obaveza Ministarstvo turizma je da razmotri i ponovo dostavi dokumentaciju za raspisivanje poziva za javno nadmetanje.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.2. Ski centar na lokalitetu „Cmiljača“ u Bijelom Polju

- Realizacija ovog projekta se odvija fazno.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 646.900,99€.

Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača

U toku je usaglašavanje faza realizacije putnog pravca Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača, koje sprovodi Opština Bijelo Polje u saradnji sa nadležnim ministarstvom.

- Krajem 2024. godine Opština Bijelo Polje je dostavila projektni zadatak za izgradnju dionice Jasikovac – Cmiljača po principu “projektuj i izgradi” nakon čega je Uprava za kapitalne projekte raspisala poziv za izbor projektanta/izvođača radova, kao i za izbor revidenta i stručni nadzor. Nastavak aktivnosti na izgradnji puta, tj. realizaciji dionice Ravna Rijeka – Jasikovac, zbog tehnoloških razloga, biće nastavljen nakon ugovaranja i izgradnje dionice Jasikovac – Cmiljača.
- Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača br. 01-334/25-757/1 sa “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.02.2025. godine na iznos od 24.042,7€.
- Ugovor br. 01-334/25-1730/1 sa stručnim nadzorom „Geotechnics, projects&consulting“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.04.2025. godine na iznos od 154.517,00€.
- Javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača sa izvođenjem radova, po sistemu „projektuj i izgradi“, raspisano je u novembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 12.105.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Cmiljača



- Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača“ u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi“. I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je

zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta. Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena.
- Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare i radovi su obustavljeni do daljnjeg. Dokumentacija je prosljeđena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje na dalje postupanje, nakon čega je predmet prosljeđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Komunalnoj policiji Opštine Bijelo Polje.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-7697/2 od 08.12.2023. godine donijela Rješenje kojim se Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje proglašava nadležnim za vršenje inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole građenja. Uprava za kapitalne projekte je uputila urgenciju Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje u cilju rješavanja navedene problematike.
- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je preuzelo obavezu da u saradnji sa “Skijalištima” iznađe najbolje tehničko rješenje kako bi se obezbijedila funkcionalnost ski centra i prevazišlo pitanje visinskih razlika usljed neusaglašenosti planskih dokumenata i tehničkih zahtjeva izgradnje žičare.
- Obaveza Ministarstva turizma je da izradi plansku dokumentaciju kako bi se nastavile aktivnosti na izgradnji objekta bazne stanice sa pratećim sadržajima.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Primarna elektroenergetska infrastruktura

- **Izgradnja trafostanice „Cmiljača“ 35/10 kV**
- Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojkovačkoj strani, za ski centar Žarski.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, “Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, “Eminent“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2728/1 sa stručnim nadzorom, “Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
- U 2021. godini završeni su svi radova na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad, jer nije izgrađen 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” na koji treba da se priključi trafostanica.
- Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje stalno napajanje. Objekat nije fizički obezbijeđen. Oprema je izložena ekstremnim temperaturama, tako da može doći do oštećenja usled nepovoljnih uslova u kojima se nalazi. Garancija za garantni rok po ugovoru istekla u decembru 2023. godine (2 godine od primopredaje objekta).

- Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za funkcionalno ispitivanje predmetne trafostanice.
- Potrebno je sa stručnim nadzorom i izvođačem radova utvrditi koje je radove neophodno izvesti da bi objekat trafostanice „Cmiljača“ 35/10 kV bio spreman za probni rad.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 „Cmiljača“ do TS 10/0,4 kV bazna stanica „Cmiljača“

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- **Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača**
 - Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra „Cmiljača“ sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m', izrade rezervoara I faze, zapremine 80m³, na koti oko 1700 mm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m'.
 - Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
 - Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
 - Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
 - U cilju uvođenja izvođača u posao Opština Bijelo Polje je izvršila prijavu radova.
 - Od strane inspeksijskih organa dobijen je negativan odgovor na prijavu radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega je i prolongiran početak izvođenja radova, a potom i raskinut ugovor sa izvođačem „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica.

- Obaveza Opštine Bijelo Polje je da provjeri da li se listovi nepokretnosti poklapaju sa trasom vodovoda, kako bi se stvorili uslovi za ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova.
- Uprava za kapitalne projekte je pokrenula procedure izrade i revizije projekta u cilju upodobljavanja projektne dokumentacije sa važećom zakonskom regulativom. Projekat je tehnički revidovan i u toku je obezbijedenje saglasnosti od nadležnih insititucija.
- Obaveza Direkcije za imovinu Opštine Bijelo Polje je da provjeri status rješenja o eksproprijaciji na trasi vodovoda i povratno informiše Ministarstvo turizma o istom, posebno uzimajući u obzir da je Uprava za nekretnine – područna jedinica Bijelo Polje, preuzela obavezu da sprovede unos zabilježski sprovedenih postupaka eksproprijacije po rješenjima, kao dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građenje, u listovima nepokretnosti i dostavljanja istih resornom Ministarstvu turizma.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka žičare šestosjed Z7

- Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare “Z7” i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi. Radovi su se izvodili do kraja 2021. godine, nakon čega je gradilište konzervirano.
- Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza, a preostali su radovi na funkcionalnom ispitivanju gdje je neophodno obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
- U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, a za šta je neophodno prethodno izgraditi elektro - energetska infrastrukturu za koju je potrebno da Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS “Cmiljača” 35/10kV.
- Potrebno je da se u saradnji sa izvođačem radova, stručnim nadzorom, projektantom, revidentom i Cedis-om utvrdi obim posla za stavljanje objekta u funkcionalno stanje.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine” 110/35 kV do TS „Cmiljača” 35/10kV

- Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, “Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, “Nik com” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.

- Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase u toku 2020. godine.
- U toku izvođenja pripremnih radova i geodetskog snimanja trase dealekovoda utvrđeno je da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom Glavnom projektu usled preklapanja projektovane trase dalekovoda na pojedinim dionicama sa izgrađenim ski stazama i žičarom, usled čega je izvođač obustavio radove do izmjene projektne dokumentacije. Kako je u međuvremenu došlo do nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga, pokrenuta procedura raskida zaključenog ugovora za izvođenje radova i isti je sporazumno raskinut 31.03.2023. godine.
- U decembru 2023. godine Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je dostavilo novi projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, na osnovu čega je Uprava za kapitalne projekte zaključila ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/23-4308/1 sa projektantom "Crta" d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.07.2023. godine na iznos od 9.619,50€.
- Ugovor br. 01-334/23-2279/1 za reviziju glavnog projekta sa revidentom "Studio projekt mne" d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijenosti 1.350.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno jer nije bilo ispravnih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1593/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 03.04.2025. godine na iznos od 1.633.279,82€.
- Izvođač radova je uveden u posao krajem jula 2025. godine.
- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je građevinsku dozvolu na osnovu revidovanog glavnog projekta.
- Do sada su izvedeni radovi na probijanju pristupnih puteva do stubnih mjesta, krčenje šume, šalovanje, armiranje i betoniranje temelja za stubove dalekovoda, uz montažu početnog dijela čelične konsrtukcije. Izvođač je izveo 30 temelja za stubove projektovanog dalekovoda, na kojima je postavljen početni dio čelične konstrukcije stubova. Zbog zimskog perioda radovi su obustavljeni i isti će biti nastavljeni po poboljšanju vremenskih uslova.
- U 2025. godini realizovano je 630,398,56€.

2.3. Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 1.349.705,71€.

Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo - Vrioci - Žarski katun, II faza Radovi I faze koji su obuhvatili proboj puta su završeni.

- Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanjenje 10 kV kabla, a asfalterski radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
- Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Inter project“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
- Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Vu ti inženjering“ d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, „Toškovići“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.
- Do sada su završeni zemljani radovi na probouju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
- Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, “Kov atelje” d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
- Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.
- Izrada dopune Glavnog projekta je završena.
- Zbog mnogobrojnih problema na trasi puta, Uprava za kapitalne projekte je 28.12.2022. godine raspisala javnu nabavku za izbor projektanta za izradu Glavnog projekta za završetak svih preostalih radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Da bi se nastavilo izvođenje radova na dijelu trase po dopunjenom revidovanom glavnom projektu potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
- Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/23-3703/1 od 23.06.2023. godine sa "Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica za izradu glavnog projekta za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun na iznos od 34.727,00€ i sa d.o.o. “Civil Engineer” Podgorica zaključila ugovor br. 01-334/23-3288/1 od 02.06.2023. godine za reviziju istog.
- Glavni projekat za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun je revidovan i dostavljen Upravi za kapitalne projekte u oktobru 2024. godine. Izvođač radova „Toškovići“ d.o.o. je dostavio stručnom nadzoru na izjašnjenje predlog radova po izmijenjenom projektu, koji su u skladu sa zaključenim ugovorom iz 2017. godine, a koji obuhvataju i pozicije radova koje je po novom projektu tehnološki neophodno izvesti, sa kojim se stručni nadzor saglasio.
- Sa izvođačem radova „Toškovići“ d.o.o. zaključen je Aneks VIII Ugovora, br. 01-067/25-1398/3 od 30. 07.2025. godine, kojim se izvođač radova obavezuje da izvede radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom za završetak radova na putu Vragodo-Vrioci-Žarski katun i specifikacijom radova koja je odobena od strane stručnog nadzora.
- Kako izvođač radova nije ispunio ugovorene obaveze shodno zaključenom Ankesu VIII ugovora, sa izvođačem radova „Toškovići“ d.o.o., je 03.11.2025. godine jednostrano raskinut ugovor o izgradnji II faze puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
- Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za završetak radova na putu Vragodo-Vrioci-Žarski katun, Mojkovac, objavljen je 30.12.2025. godine, procijenjene vrijednosti 4.770.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem završetka radova na putu Vragodo-Vrioci-Žarski katun, objavljeno 31.12.2025. godine, procijenjene vrijednosti 40.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.

Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac



- Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Monteput" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
- Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
- Radovi na objektu nisu otpočinjali.
- Uprava za kapitalne projekte je izvođaču radova dostavila obavještenje o jednostranom raskidu Ugovora, br. obavještenja 01-334/24-6591/1 od 27.11.2024. godine, s obzirom da od dana zaključivanja ugovora 22.12.2020. godine, nije bilo izvršenja ugovorenih obaveza.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Trasa puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m

- Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o.

Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, „Geoprojekt“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od od 1.750,50€.
- Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljani u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
- Revident projekta izmijenjene trase puta „Ing-impuls“ d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma „Ing-impuls“ d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500 m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine, zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom „Europrojekt“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1.936,00€.
- Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta, na koju je revident dostavio primjedbe.
- Revidovan glavni projekat je Upravi za kapitalne projekte dostavljen u julu 2023. godine.
- Raspisivanje tendera za izbor izvođača radova je prolongiran do preciziranja zahtjeva Opštine Mojkovac za izgradnjom vodovoda, koji bi ulazio u trasu projektovanog puta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 03.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7104/1 sa izvođačem „Gradnja inženjering MNE“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.12.2024. godine, na iznos od 982.510,81€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 03.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7382/1 od 26.12.2024. godine, zaključen je sa „N&B inženjering i konsalting“ d.o.o. Nikšić, na iznos 10.648,00€.
- Sekretarijat za urbanizam Opštine Mojkovac 30.05.2025. je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju saobraćajnice Vragodo-Vrioci-Žarski katun dužine 500m. Izvođač radova je uveden u posao krajem juna 2025. godine.
- Radovi su se izvodili usporenom dinamikom zbog ometanja u radu od strane mještana, kao i vremenskih neprilika.
- U 2025. godini realizovano je 202.810,86€.

Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno - servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“

Donesena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja „Žarski“.

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto poništeno 16.07.2021. godine.
- Nakon što je Opština Mojkovac dostavila inovirani projektni zadatak i urbanističko tehničke

uslove, Uprava za kapitalne projekte raspisala je javno nadmetanje za izbor projektanta i revidenta.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.09.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6874/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Nik Com” iz Nikšića, zaključen je 10.12.2024. godine, na iznos od 114.641,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 14.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6745/1 sa revidentom glavnog projekta, „B-Ril Inženjering” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024. godine, na iznos od 6.987,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Tokom izrade projektne dokumentacije utvrđeno je da trasa vodovoda ide preko privatnih parcela, o čemu je obaviještena Opština Mojkovac.
- Obaveza Opštine Mojkovac da riješi eksproprijaciju kako bi se glavni projekat pozitivno revidovao.
- U toku je revizija projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski

- Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi”. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac” iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta, nakon čega se otpočelo sa radovima u julu 2020. godine.
- Izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, a izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih zidova i stubova suterena ugostiteljskog objekta. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine i od tada više nisu izvođeni.
- Usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, izvođač radova je zatražio sporazumni raskid ugovora.
- Sporazum o raskidu ugovora je potpisan 24.07.2023. godine.
- Javni nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-943/1 sa izvođačem radova „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.02.2025. godine na iznos od 3.892.980,88€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-2116/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 24.04.2024. godine, na iznos od 121.000,00€.
- Radovi su otpočeli u julu 2025. godine i isti su obustavljeni zbog nastupajućeg zimskog perioda. Sa izvođenjem radova će se nastaviti kada se steknu povoljni vremenski uslovi.

- U 2025. godini realizovano je 1.059.423,13€.



Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4

- Kapacitet žičare „Z4“ je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
- Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta i otpočelo se sa radovima u 2020. godinu. Završene su aktivnosti na nabavci opreme i građevinski radovi na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije.
- Radovi se ne izvode zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Obaveza Opštine Mojkovac je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Ski staze uz žičaru Z4

- Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4“ je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo u 2020. godini. Radovi su izvođeni do polovine 2022. godine na katastarskim parcelama na kojima je

završen postupak eksproprijacije. Završeno je preko 80% ugovorenih radova.

- Da bi se počelo sa radovima, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.
- Obaveza Opštine Mojkovac je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV „Z4“ i priključnog 10 kV kablovskog voda

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-4121/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Yawel” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5755/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Revizija glavnog projekta završena je u aprilu 2024. godine.
- S obzirom da se trafo-stanica napaja sa Ski centra “Cmiljača”, realizacija će započeti kada bude izgledno priključenje objekta na elektro-enrgetske infrastrukturu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.4. Ski centar na lokalitetu Hajla u Rožajama

- Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
- Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne ple (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
- Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.
- U 2025. godini za realizaciju ski centru „Hajla“ utrošeno je 4.231.016,08€.

Putna infrastruktura

Za izvođenje asfalterških radova sa saobraćajnom signalizacijom i opremom regionalnog puta Daciće-Kaluđerski laz-Štedim raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova 23.06.2023. godine.

- Ugovor br. 01-334/23-4890/1 sa izvođačem radova "Tofi" d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 858.163,70€.
- Ugovor br. 01-334/23-3702/1 sa stručnom nadzorom "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.06.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Radovi na projektu su otpočeli u avgustu 2023. godine i izvodili se do oktobra 2023. godine.
- Svi radovi su završeni i dostavljen je konačni izvještaj.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



Žičara

- Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim“. Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi“. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon“ d.o.o. Sarajevo, zaključen je 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
- Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.

- Radovi su u završnoj fazi.
- U 2025. godini realizovano je 266.540,69€.



Ski staze

- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2283/1 sa izvođačem "Gradnja inženjering MNE" d.o.o Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine na iznos od 2.722.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 25.03.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4539/1 sa stručnim nadzorom "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.08.2023. godine na iznos od 36.300,00€.
- U 2023. godini su završeni radovi na stazama od 1 do 7. Radovi na sječi šumskih stabala od strane šumskog gazdinstva iz Rožaja su nastavljani u junu 2024. godine, kao i radovi na uređenju ski staza 1, 4 i 5. Radovi su usvojenom dinamikom izvođeni do decembra 2024. godine.
- Radovi na svih 8 staza su završeni u avgustu 2025. godine, osim pozicije ozelenjavanja površina, koje će se realizovati kada se steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2025. godini realizovano je 269.244,13€.



Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu „Hajla“

- U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio synthesis architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i tadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma., koje je pripremlilo projektni zadatak i dostavilo isti Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sprovođenje konkursa za izbor idejnog rješenja.
- Ministarstvo turizma je kao investitor projekta, Ministarstvu javnih radova dostavilo „Projektni zadatak za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji i opremanju Bazne stanice na lokalitetu Ski centra „Hajla-Štedim“ i u toku su pripreme aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja, koje će biti raspisano nakon usvajanja Plana javnih nabavki za 2026. godinu. Na osnovu Idejnog arhitektonskog rješenja, dobijenog kroz nacionalni konkurs koje je sprovelo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 8.990.450,00€ bez pdv-a.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura

- Nakon što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Upravi za kapitalne projekte ovjerene projektne zadatke, Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za realizaciju projekta po principu „projektuj i izgradi“ za: čeliju 35kV u TS 35/10kV „Zeleni“, podzemni vod 35kV od TS 35/10kV „Zeleni“ do TS 35/10kV „Crnja“, TS 35/10kV „Crnja“, TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 4“, TS 10/0,4kV, 1x630kVA „Nova 5“, TS 10/0,4kV, 2x1000kVA „Nova 6“ i TS 10/0,4kV, 1x1000kVA „Nova 7“, TS 10,04kW Nova 8 sa podzemnim kablom, kao i za izbor revidenta i stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
- Procijenjena vrijednost radova nedostajuće elektroenergetske infrastrukture iznosi 4.800.000,00€ bez pdv-a.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra „Hajla“ po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 19.05.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-5751/1, sa izvođačem radova "Eminent" d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine, na iznos od 5.746.048,00.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra "Hajla" po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 25.09.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-7612/1 sa stručnim nadzorom "Civil engineer" do.o.o. Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 38,054.50€.
- Glavni projekat je završen, prijavljen je početak radova i izvođač radova je uveden u posao u junu 2024. godine. Izvođeni su radovi na postavljanju elekro kabla u dužini od 20 km, kao i montaži trafostanica 1-8, po dinamičkom planu. Radovi su obustavljeni u decembru zbog nastupajućeg zimskog perioda. Sa izvođenjem radova nastavljeno je u maju 2025. godine, a isti su završeni u novembru tekuće godine.
- U toku je probni rad trafostanica i priprema dokumentacije za tehnički prijem.
- U 2025. godini realizovano je 3.647.594,59€.

Nabavka, transport i ugradnja hauba za zaštitu od vremenskih neprilika za korpe šestosjedne žičare na Hajli/Štedimu, Opština Rožaje za potrebe Ski centra „Hajla“

- Javno nadmetanje za nabavku, transport i ugradnju hauba za zaštitu od vremenskih neprilika za korpe šestosjedne žičare na Hajli/Štedimu, raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-962/1 sa izvođačem radova „Strucon“ d.o.o. Sarajevo, zaključen je 29.02.2024. godine na iznos od 1.445.962,10€.
- Ugovor br. 01-33/24-479/1 sa stručnim nadzorom „Infrastruktura“ d.o.o. Podgorica zaključen je 01.02.2024. godine na iznos od 7.320,5€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada studije hidrotehničke infrastrukture na prostoru u zahvatu Lokalne studije lokacije „Hajla i Štedim“, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za izradu studije hidrotehničke infrastrukture na prostoru u zahvatu Lokalne studije lokacije „Hajla i Štedim“, raspisano je u oktobru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-787/1 sa firmom „Flowmax“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.2024. godine na iznos od 27.830,00€.
- Izrada studije je završena i predata Opštini Rožaje.
- U 2025. godini realizovano je 27.830,00€.

Izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji hidrotehničkih instalacija vodovodne mreže na lokalitetu Ski centra „Hajla - Štedim“, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji hidrotehničkih instalacija vodovodne mreže na lokalitetu Ski centra „Hajla i Štedim“ raspisano je u junu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 2.300.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.

Nabavka novih vozila za pripremu i ravnanje snijega (tabači snijega) na ski stazama na lokalitetu ski centra „Hajla - Štedim“, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za nabavku novih vozila za pripremu i ravnanje snijega (tabači snijega) na ski stazama raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.650.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.

Nabavka, transport i ugradnja pokretne trake sa galerijom na lokalitetu ski centra „Hajla - Štedim“, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za nabavku transport i ugradnja pokretne trake sa galerijom na lokalitetu ski centra „Hajla - Štedim“, raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.080.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji akumulacionog jezera za vještačko osnježavanje na lokalitetu ski centar Hajla - Štedim, Opština Rožaje

- Javno nadmetanje za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji akumulacionog jezera za vještačko osnježavanje na lokalitetu ski centar Hajla - Štedim, raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 3.300.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.

2.5. Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

Izgradnja ski poligona za obuku skijaša početnika koji se sastoji od pokretne trake i tjubing staze na skijalištu na lokalitetu Savin kuk, Žabljak

- Na osnovu projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova dostavljenih od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, 01.06.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja glavnog projekta izgradnje ski poligona za obuku skijaša početnika.
- Ugovor br. 01-334/23-5913/1 sa izvođačem radova "Eurozox" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 338.800,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-3157/1 sa vršiocem revizije „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2023. godine, na iznos od 6.413,00€, a ugovor br. 01-334/23-3160/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica zaključen je 30.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 84,70€.

2.6. Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju

- Kroz realizaciju projekta sprovode se aktivnosti na realizaciji više podprojekata, a koji se odnose na izgradnju žičare-gondole, servisnih objekata na ulazu u žičaru, uređenje unutrašnjosti same pećine, izgradnja vizitornog centra sa regulacijom korita rijeke, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture, kao i za nabavku opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu i uređenje unutrašnjosti pećine

- Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
- U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
- Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
- Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine.

Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99€.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
- Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine.
- U drugoj polovini 2022. godine, radovi nisu izvođeni iz razloga što je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje kojim je utvrdila da je Uprava za kapitalne projekte – „Operater“, pričinila štetu životnoj sredini u okviru zaštićenog područja Đalovića klisure, u dijelu Đalovića pećine usljed izvođenja radova I faze, te je naložila obustavu radova na valorizaciji pećine dok se ne pribave neophodne dozvole. Usljed navedenog se nije otpočelo ni sa izvođenjem radova II faze.
- Uprava za kapitalne projekte je na donijeto rješenje uložila žalbu posredstvom advokatske kancelarije „Iusticia”, s obzirom na to da Uprava za kapitalne projekte nije Operater u postupku, a da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje je Investitor, bilo dužno da obezbijedi sve neophodne dozvole od Agencije na osnovu blagovremenih informacija dostavljenih od strane Uprave, da je postupak utvrđivanja značaja štete u životnoj sredini nepravilno i nezakonito sproveden, naročito imajući u vidu činjenicu da je Agencija za zaštitu životne sredine, i prije početka radova imala tačna, precizna i jasna saznanja o vrsti radova koji će se izvoditi na uređenju zaštićenog lokaliteta, kao i da ne postoje zakonske granice pećine i da one nikada nisu definitivno utvrđene, tako da nulto stanje same pećine nije poznato. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je donijelo rješenje br. UPII-04-351/2 od 1.8.2023. godine, kojim poništava rješenje Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-UPI-126/14 i vraća na ponovno odlučivanje.
- Agencija za zaštitu životne sredine je uradila Studiju nultnog stanja, a Ministarstvo turizma je preuzelo obavezu donošenja odluke o potrebnim aktivnostima za nastavak radova.
- Agencije za zaštitu životne sredine izdala je Rješenje br. 03-UPI-1358/4 od 23.04.2025.g. kojim se dozvoljava izvođenje radova u speološkom objektu Đalovića pećini. Organizovan je veći broj sastanaka sa izvođačem radova I faze, nadzorom, Agencijom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom turizma kako bi se riješile nejasnoće i sagledale mogućnosti uvođenja izvođača u posao. Kako pomenuto Rješenje uslovljava nastavka izvođenja radova u toku je utvrđivanje statusa zaključenih ugovora sa izvođačem i stručnim nadzorom, kao i utvrđivanje potrebnog obima posla za završetak radova s obzirom da se radovi nisu izvodili duži vremenski period.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 263.955,63€.





Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice




- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik Opština Bijelo Polje je dostavila Upravi za kapitalne projekte ovjeren Projektni zadatak kako bi pokrenula postupak iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.

- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, „Crnogoraput“ a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, „Geotechnics, project & consulting“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
- Problematika koja prati realizaciju projekta ogleda se kroz nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijeđenim prilaznima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predata Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
- Sa projektantom „Inter projekt“ d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
- Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
- Radovi na predmetnom projektu su nastavljeni u septembru 2022. godine, nakon što su od strane nadležnih institucija izmještene postojeće vodovodne, TK i elektro instalacije, a od strane opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte obaviještena da mještani pristaju da se izvode radovi po revidovanom glavnom projektu.
- I pored potvrde predstavnika Opštine Bijelo Polje da tokom izvođenja radova neće biti opstrukcija od strane mještana, te da će zahtjeve mještana Opština naknadno rješavati u sopstvenoj režiji, opstrukcije su se nastavile, a radovi izvođeni u 2022. godini su djelimično završeni.
- Da bi se izbjegle konstantne obustave i produžeci roka izvođenja radova, u 2023. godini su definisane sporne dionice na kojima se radovi nisu mogli izvoditi i raspisana je javna nabavka za izbor projektanta koji će vršiti izradu izmjene projektne dokumentacije.
- Ugovor o izradi izmjene revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije puta L1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje br. 01-334/23-42227/1 sa projektantom „Viamont“ d.o.o. Kolašin zaključen je 21.07.2023. godine, na iznos od 14.399,00€.
- Ugovor o reviziji istog projekta br. 01-334/23-3634/1 sa revidentom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.06.2023. godine, na iznos od 9.438,00€.
- Revidovana izmjena glavnog projekta je Upravi za kapitalne projekte dostavljena 15.11.2023. godine i ista je vraćena revidentu na provjeru usklađenosti sa Zakonom o

planiranju prostora i izgradnji objekata.

- Radovi po izmijenjenom revidovanom glavnom projektu su nastavljeni 07.05.2024. godine i završeni u julu 2024. godine.
- Uzimajući u obzir dodatne i viškove radova kao rezultat izmjene revidovanog glavnog projekta, u toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za nastavak radova na rekonstrukciji puta Gubavač-Bistrica.
- Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača za nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica je objavljeno je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6746/1 sa izvođačem radova "Konstruktor group" d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 04.12.2024. godine, na iznos od 2.323.664,93€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova je raspisano u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-789/1 sa stručnim nadzorom "Ding" d.o.o. iz Podgorice zaključen je 19.02.2025. godine, na iznos 3.630,00€.
- Nastavak radova na rekonstrukciji puta je otpočeo u martu 2025. godine.
- Izvođenje radova prati brojna problematika koja se ogledala u neusaglašenosti projekta sa stanjem na licu mjesta, gdje je tokom izvođenja radova bilo potrebno izvršiti izmještanje podzemnih instalacije koje nisu bile evidentirane projektnom dokumentacijom. Takođe, izvođenje radove je bilo uslovljeno završetkom radova na izgradnji vodovoda Bistrica.
- Zbog nepredviđenih okolnosti koje prate realizaciju projekta, pored izvođenja radova uporenim dinamikom, za posljedicu je imalo i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.
- Radovi su u toku.
- U 2025. godini realizvano je 689.506,59€.

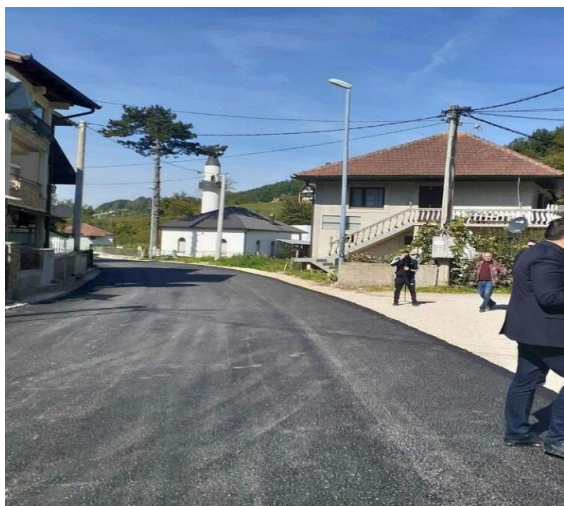

Postavljanje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje

Projektom je obuhvaćeno postavljanje javne rasvjete duž rekonstruisanog puta Gubavač-Bistrica i to na dvije dionice: Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica

- Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani Glavni projekat. Projektant je „Arhing inženjering” d.o.o. iz Bijelo Polja (br. ugovora 07/1-7087 od 24.07.2019. godine)i revident „Civil engineer”doo iz Podgorice (br. ugovora 07/1-14043 od 27.12.2019. godine).
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 03.07.2020. godine, koji je poništen i drugi put 14.09.2021. godine. Ugovor br.01-334/22-337/1 sa izvođačem „Ramel” d.o.o. Nikšić, zaključen je 31.01.2022.godine, na iznos od

161.771,43€,

- Stručni nadzor je izabran u postupku nabavke male vrijednosti br .03-48/20 od 06.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/22-5940 sa stručnim nadzorom „Sistem-MNE” d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.07.2020. godine, na iznos od 7.900,00€.
- Ugovor je raskinut, s obzirom da vršilac stručnog nadzora nije dostavljao garanciju i raspisano je novo javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora. Ugovor br. 01-334/25-381/4 sa vršiocem stručnog nadzora „B-RIL Inzinjering“ d.o.o. zaključen je 19.05.2025. godine, na iznos od 5.445,00€.
- S obzirom da su radovi na postavljanju javne rasvjete uslovljeni izvođenjem radova na rekonstrukciji puta, izvođač radova je uveden u posao 12.08.2022. godine. Radovi se u ovom periodu mogu izvoditi samo na dionici puta Mirojevići-Bistrica, dok na drugoj dionici nijesu stvoreni uslovi za početak radova.
- Nakon rješavanja problema sa postojećim instalacijama, izvođač radova „Ramel“ d.o.o. otpočeo je sa izvođenjem radova na postavljanju javne rasvjete na dionici Gubavač-Lozna luka i završio dio radova koje je bilo moguće izvesti, a koji se odnose na zemljane i instalaterske radove.
- U 2025. godini utrošeo je 3.708,59€.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim virovima”

- Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh”, a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting” d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
- Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
- U cilju pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekta Bijelog Polja na idejno rješenje, obaveza Ministarstvo turizma je bila da u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



Izgradnja objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom

- Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu ovjerenog Projektnog zadatka dostavljenog
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Permonte“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.
- Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2022. godine.
- Ključevi objekta su predati Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
- Objekat nije stavljen u funkciju jer je za isti neophodno obezbijediti energetska napajanje, odnosno potrebno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitoring centar”.
- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023. godine raspisano javno nadmetanje za projektovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Bistrica” do TS “Vizitoring centar” po principu “projektuj i izgradi“. Ugovor br. 01-334/24-2495/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Eminent“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 09.05.2024. godine, na iznos od 117.605,95€.
- Ugovor br. 01-334/24-2267/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.04.2023. godine na iznos od 7.744,00€.
- Omogućiti prolazak kabla preko državnih parcela je uslov za dobijanje pozitivnog izvještaja revizije, a nakon dobijanja istog resorno ministarstvo je uputilo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
- Problematika prolaska kabla preko državnih parcela je riješena, dobijena je građevinska dozvola i radovi će otpočeti čim se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
- Ministarstvo javnih radova se u saradnji sa Ministarstvom turizma više puta bezuspješno obraćalo opštini Bijelo Polje za dobijanje potrebnih podataka, koji se odnose na potrebe vodosnabdijevanja i prateće elektroenergetske infrastrukture, kako bi Ministarstvo javnih radova planiralo i realizovalo dalje aktivnosti u okviru projekta, sa ciljem stavljanja objekta u funkciju.



Elektroenergetska infrastruktura

Za potrebe elektro napajanja kompleksa „Đalovića pećine“ ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice „Nedakuse“, izgradnja trafostanice 35/10kV „Bistrica“, dalekovod 35kV „Nedakusi – Bistrica“, kabal od TS „Bistrica“ do buduće TS „Manastir Podvrh“, kao i TS „Manastir Podvrh“. Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice „Bistrica“ 35/10 kV TS 35/10 kV „Bistrica“ služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Izgradnja 35 kV dalekovoda „Nedakuse-Bistrica“

Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine.

Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „YAWEL“ d.o.o.

Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.

- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, „Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu“ a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00€.

- Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i dobijena je upotrebna dozvola 16.12.2022. godine.
- Na osnovu Izvještaja interne Komisije CEDIS-a, Izvođač radova „Eurozox“ je zaključno sa 19.12.2024. godine otklonio nedostatke koji su bili posledica lošeg izvođenja, a na osnovu odobrenja od strane CEDIS-a. Ostale nedostatke koji su posledica neodržavanja (raskres šime, čišćenje oko stubnih mjesta, zamjena polomljenih izolatora), potrebno je sa predstavnicima CEDIS-a naći rješenje za njihovo otklanjanje, imajuću u vidu da ti radovi spadaju u redovno održavanje.
- Nije izvršeno preuzimanje objekta nakon završetka od strane CEDIS-a, jer nije završena procedura otkupa. Dok se ne otklone primjedbe CEDIS-a, objekat se ne može priključiti na distributivnu mrežu.
- U toku su aktivnosti na otklanjanju nedostataka, nakon čega će pokrenuti aktivnosti na stavljanju trafostanice u probni rad.

Izgradnja TS “Bistrica” 35/10 kV



- Trafostanica “Bistrica” 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteran i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
- Reviziju glavnog projekta odradio je “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, „Electroteam“ d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 3911/1 sa stručnim nadzorom, „Nikom“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.
- Svi ugovoreni radovi na objektu su završeni u 2021. godini.
- U drugoj polovini 2023. godine otklonjeni svi nedostaci po preliminarnom izvještaju Komisije za tehnički prijem objekta i podnijet zahtjev CEDIS-u za privremeno priključenje objekta na distributivnu mrežu za potrebe probnog rada.
- U prvoj polovini 2024. godine izvršen je interni pregled izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDIS-a i dostavljen izvještaj 17.05.2024. godine.
- Objekat još uvijek ne može da se priključi na distributivnu mrežu i pusti u probni rad, jer nije pušten u rad dalekovod 35 kv Nedakusi – Bistrica.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV

- Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave za kapitalne projekte. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, „Eminent“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
- Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni u 2021. godini i dobijena je upotrebna 03.08.2023. godine.
- Objekat još uvijek ne može da se priključi na distributivnu mrežu i pusti u probni rad, jer nije pušten u rad dalekovod 35 kv Nedakusi – Bistrica.

Izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice STS 1x250kVA na lokalitetu Đalovića pećina

- U aprilu 2024. godine Upravi za kapitalne projekte dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je Uprava za pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“, raspisano je 21.06.2024. godine, procijenjene vrijednosti 520.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je 08.10.2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-828/1 sa izvođačem radova „Xenergy“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.2025. godine na iznos od 602.580,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 04.12.2024. Ugovor br. 01-334/25-808/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Inženjer Gogić“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.02.2025. godine na iznos od 5.377,77€.
- U toku je revizija glavnog projekta, nakon čega će se uraditi elaborat pristupnih puteva i projekat predati za izdavanje građevinske dozvole, čime će se stvoriti uslovi za početak radova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Žičara Đalovića pećina

- Projekat izgradnje gondole se izvodi po principu „projektuj i izgradi“. Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ a.d. Podgorica, zaključen je 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.

- Završene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Sa radovima se otpočelo u 2019. godini. Završeni su radovi na izgradnji pristupnih puteva, ugradnja polazne i izlazne stanice i isporučena oprema žičare.
- Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, odnosno potrebno je da se završi procedura tehničkih pregleda i priključenja trafostanice TS 35/10 kV „Bistrica“ i priključenja TS 10/0,4 kV „Žičara“ na elektro energetska mrežu.



Vodosnabdijevanje

- Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbijediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System“ d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018. godine, na iznos od 34.848,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o., Podgorica, zaključen je 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
- Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata

na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekta na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i nezavisni projekat. Opština Bijelo Polje je krajem godine dostavila Projektni zadatak za "Vodosnabdijevanja i odvođenje fekalnih voda iz uslužno-servisnih objekata na prijemno-ulaznom punktu".

- Obaveza Opštine Bijelo Polje je da razmotri sveukupne potrebe za vodom svih izgrađenih i planiranih sadržaja na lokaciji Đalovića pećina, uzimajući u obzir sve do sada započete projekte u unkciji valorizacije Đalovića pećine i informiše Ministarstvo javnih radova o izabranim rješenjima za potrbeno snandbijevanje objekata – Vizitoring centra, polazne stanice žičare/gondole i platoa ispred ulaza u pećinu, nakon čega će Ministarstvo razmotriti status već zaključenog ugovora i pokrenuti dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Ministarstvo javnih radova se u saradnji sa Ministarstvom turizma više puta bezuspješno obraćalo Opštini Bijelo Bolje za dobijanje potrebnih podataka, koji se odnose na potrebe vodosnabdijevanja i prateće elektroenergetske infrastrukture, kako bi ministarstvo javnih radova planiralo i realizovalo dalje aktivnosti u okviru projekta, sa ciljem stavljanja objekta u funkciju.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System” d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, zaključen je 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- Radovi su prolongirani zbog nivoa rijeke, a potom nisu izvođeni zbog situacije na globalnom tržištu cijena.
- Nakon što je Imenovani stručni nadzor „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje jednostrano raskinuo ugovor, Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa preduzećem „Infrastruktura“ Podgorica ugovor br. 01-067/23-4322/1 od 25.07.2023.godine.
- Uprava za kapitalne projekte je jednostrano raskinula ugovor o javnoj nabavci br. 01-334/24-3280/1 od 10.06.2024. godine sa izvođačem radova „Inženjering put“.
- U toku je sagledavanje mogućnosti ponovnog raspisivanja javnog nadmetanja za izvođenje radova, uz analizu procijenjene vrijednosti projekta u odnosu na aktuelne tržišne uslove.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.7. Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu

- Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Izgradnja objekta planirana je fazno pri čemu svaka faza čini tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu koje će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.
- Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta i nakon izvršene prijave građenja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, izvođač je uveden u posao 19.09.2022. godine.
- Ukupna površina objekta je 49.067,37m², a površina I faze je 23.465,92m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
- Ukupan broj parking mjesta I faze je 626 za putnička vozila i 8 parking mjesta za autobuse.
- Do sada su završeni radovi svi građevinsko zanatski, hidrotehnički i mašinski radovi, a preostali su radovi na instalacijama jake i slabe struje. Usljed nastupanja zimske sezone, radovi su privremeno obustavljeni, gradilište je konzervirano sredinom decembra 2025. godine i isti će biti nastavljeni u 2026. godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- Ministarstvo javnih radova je krajem 2024. godine pokrenulo proceduru izrade glavnog projekta pristupnih saobraćajnica. Ugovor br. 01-334/24-7485/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Ding” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.12.2024. godine na iznos od 6.013,70€.
- Urađeno je idejno rješenje, na koje je dobijeno pozitivno mišljenje od strane Uprave za saobraćaj. U toku je pribavljanje odgovarajućih urbanističko tehničkih uslova od strane opštine Kolašin kako bi se završila izrada i revizija glavnog projekta.
- U 2025. godini realizovano je 3.221.199,92€.



2.8. Turistička infrastruktura – izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na raspisivanje novih konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije izvođenje radova na izgradnji objekata za potrebe razvoja turističke infrastrukture. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Upravi za kapitalne projekte na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godina. Procijenjena ukupna vrijednost za 2025. godinu iznosi 5.000.000€.

Valorizacija kanjona Nevidio

- Opština Šavnik je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o unapređenju turističke ponude – „Valorizacija kanjona Nevidio“ u iznosu od 455.229,60 €. Anex I broj: 01-018/25-769/2 od 10.06.2025. godine, zaključen je na iznos 51.891,59€. Anex II broj 01-018/25-1938/1 od 10.09.2025. godine, zaključen je na iznos 526.649,57€.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu Korisniku – Opštini Šavnik.
- U 2025. godini realizovano je 50.000,00€.

2.9. Objekat „Kuća voća“ u Andrijevici

- Objekat „Kuće voća“ u Andrijevici nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevica, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevici, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštica i Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojace se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffè bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunker) 153,82 m².
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine.
- Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01-5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37€.
- Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering“ d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00€.
- Sa izvođenjem ugovorenih radova otpočelo se u aprilu 2018. godine i radovi su se do sredine 2019. godine odvijali planiranom dinamikom. Tokom 2019. godine, po zahtjevu bivšeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, urađen je novi tehnološki elaborate na osnovu kog je izmijenjena projektna dokumentacija za objekat proizvodnog pogona, u dijelu arhitekture, vodovodnih, elektro i mašinskih instalacija. Navedene izmjene su između ostalog podrazumijevale rušenja i demontaže već izvedenih radova na objektu proizvodnog pogona, što je za posljedicu imalo produženje ugovorenog roka za završetak radova, kao i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.
- U cilju završetka realizacije projekta, Uprava za kapitalne projekte je sprovela pregovarački

postupak po odobrenju Ministarstva finansija i raspisala novi otvoreni tenderski postupak za dodatne radove, kako bi se time obuhvatili svi naknadni i dodatni radovi koji su nastali usljed propusta i izmjena u projektnoj dokumentaciji. Po osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka sa izvođačem radova "Neimar inženjering" je potpisan ugovor o izvođenju dodatnih radova, dok je otvoreni postupak obustavljen, iz razloga što predmetni objekat nije bio obuhvaćen Zakonom o budžetu za 2021. godinu, odnosno nisu bila obezbijeđena finansijska sredstva za izvođenje radova.

- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Takođe za predmetni objekat je u 2019. godini izrađen projekat trafostanice za potrebe napajanja objekta "Kuće voća", međutim, za isti nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije realizovan.
- Uprava za kapitalne projekte se obraćala dopisom nadležnom Ministarstvu 03.08.2021. godine, na koji nije dobijen odgovor. U martu 2022. godine je održan sastanak na kojem je usmeno saopšteno od strane predstavnika ministarstva da tehnologija proizvodnje predmetnog objekta nije konačno definisana i usvojena, kao i da nije poznato koje sirovine će se koristiti u proizvodnji.
- Do kraja 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik, nije dostavilo inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, niti je u saradnji sa Opštinom Andrijevica realizovalo aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu.
- Kako bi se nastavilo sa daljom realizacijom projekta, neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik u skladu sa planiranom funkcijom objekta uradi inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, kako bi Ministarstvo javnih radova raspisalo javno nadmetanje za nastavak i završetak radova na objektu. Takođe, potrebno je da ministarstvo u saradnji sa Opštinom Andrijevica, pokrene i realizuje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice, kako bi Ministarstvo raspisalo javna nadmetanja za izgradnju iste.
- Urgencija za rješavanje navedene problematike nadležnom Ministarstvu je upućena je više puta, ali Ministarstvo javnih radova nije dobilo odgovor.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.10. Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule

- Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
- Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01-759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L.” d.o.o. Podgorica je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00€.
- Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00€.
- U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule,

nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00€.
- Sredinom 2022. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3273/1 sa izvođačem „Intermost“ d.o.o Podgorica, je zaključen 02.06.2023. godine, na iznos 1.101,006,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Projektman“, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 23.776,5€.
- Opština Herceg Novi je krajem decembra 2023. godine dopunila prijavu radova nadležnom inspeksijskom organu čime su se stvorili uslovi za početak realizacije ugovora.
- Izvođač radova je uveden u posao početkom 2024. godine. Tokom izvođenja radova došlo je do pojave nepredviđenih okolnosti vezano za pojavu podzemnih kablova na dijelu lokacije na kojoj se izvode radovi, kao i neusklađenosti projekta sa stanjem na licu mjesta. Izvođač je izveo dio radova i zbog neriješene problematike konzervirao gradilište zbog početka turističke sezone.
- Sredinom 2024. godine Uprava za zaštitu kulturnih dobara je dostavila Rješenje kojim se izdaje saglasnost na konzervatorski projekat čiji sadržaj nije bio predmet ugovorne dokumentacije, te je u svrhu otpočinjanja radova bilo potrebno izvršiti dopunu revidovanog glavnog projekta i utvrditi ukupan obim posla.
- Opština Herceg Novi je preuzela obavezu izmjene revidovanog glavnog projekta shodno rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Do kraja godine nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi Ministarstvo javnih radova razmotrilo mogućnosti za nastavak projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.11. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra „Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“

- Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
- Opština Kolašin je u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavila potpisani projektni zadatak i UTU-uslove sa programskim zadatkom na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 03.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/24-127/1 od 13.01.2023.godine potpisan je sa projektantom/izvođačem, „Sigillum Co“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 9.183.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je 20.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-1285/1 od 03.03.2023. godine potpisan je sa revidentom „Sistem-mne_Institut“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 98.000,00€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisani su 20.12.2022.godine, Ugovor br. 01-334/23-1724/1 od 23.03.2023. godine potpisan je sa stručnim nadzorom „Sistem-mne Institut“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 158.000,00€.
- Problematika koja se odnosi na realizaciju projekta javila se nakon javne rasparave na kojoj je izlagan Elaborat o zaštiti životne sredine projekta. Zbog odbijajućeg Rješenja Komisije koja je cijenila predmetni Elaborat, kao i pritiska određenog broja građana Investitor tj. Opština Kolašin i Vodovod Kolašin izmjenili su projektni zadatak. Nakon što su dostavili postpisani izmjenjeni projektni zadatak, Uprava za kapitalne projekte je prosljedila izmijenjene uslove CEDIS-u radi dobijanja novih uslova priključenja na osnovu kojih će projektant/izvođač pripremiti tehničku dokumentaciju, a sve kako bi Uprava kapitalnih projekata bila u mogućnosti da provjeri na koji način izmjene u projektnom zadatku utiču na realizaciju sklopljenog ugovora sa projektantom/izvođačem radova. Uprava za kapitalne projekte je 05.04.2024. godine, na osnovu dostavljenog izmijenjenog projektnog zadatka i izmijenjene odluke potpisala aneks ugovora za realizaciju predmetnog projekta br. 01-334/24-1718/1, koji je u odnosu na primarni ugovor uvećan za vrijednost od 1.423.123,94€.
- U toku je realizacija projektne dokumentacije na dionicama gdje su riješeni imovinsko pravni odnosi.
- Izvođač radova je uveden u posao 29.07.2024. godine na fazama za koje su se stekli uslovi za to tj. revidovan glavni projekat na osnovu riješenih imovinsko-pravnih odnosa faza IV i VI i na njima su se izvodili radovi do zimske sezone.
- Lokalno stanovništvo opstruira rad I i II faze, a za koje su stečeni uslovi za izvođenje radova, sa čime je upoznata Opština Kolašin kao investitor.
- Opština Kolašin u obavezi da riješi imovinsko-pravne odnose za fazu III i V fazu kako bi se stekli uslovi za dalju realizaciju projekta na ovim fazama.
- Ministarstvo javnih radova je dopisom br. 01-334/25-2039/1 od 17.09.2025. godine obaviješteno od strane Izvođača radova o jednostranom raskidu ugovora.
- U toku su aktivnosti na usklađivanju neophodne dokumentacije u saradnji sa zaštitnikom imovinsko-pravnih odnosa radi razganičenja sa izvođačem radova po ovom projektu.
- U 2025. godini realizovano je 52.205,80€.

2.12. Povezivanje ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”

Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski

- Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.

- Opštine Mojkovac i Bijelo Polje dale su saglasnost na urađeno idejno rješenje.
- Revizija projektne dokumentacije je završena.
- Potrebno je da Ministarstvo javnih radova, Ministarstvo turizma, Skijališta Crne Gore i Opština Bijelo Polje razmotre mogućnost za realizaciju ovog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Cmiljača" do TS 10/0,4 kV bazna stanica „Žarski“

- U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-5928/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 9.559,00 €.
- Ugovor br. 01-334/23-5929/1 sa revidentom glavnog projekta "Diagram" d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 6.655,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije koja je uslovljena izradom projekta puta koji povezuje ski centre.
- Trasa kablovskog voda je uslovljena sa trasom nove saobraćajnice, tako da dinamika izrade projekta zavisi od završetka projekta buduće saobraćajnice.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.13. Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije dostavljene od strane opštine Herceg Novi raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju panoramske gondole Igalo Ilinica u opštini Herceg Novi. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je poništila postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od 04.02.2022. godine.
- Uprava za kapitalne projekte je ponovo 30.11.2022. godine objavila javni poziv.
- Ugovor br. 01-334/23-4727/1 sa izvođačem radova „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 11.965.555,54€.
- Ugovor br. 01-334/23-7606/14 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Ul. Cetinjski put bb, Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 20.945,10€.
- Ugovor br. 01-334/23-6502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro d.o.o Podgorica, zaključen je 10.11.2023. godine na iznos od 119.654,48€.
- Tokom izrade projektne dokumentacije, a uslijed dostavljanja dodatnih zahtjeva od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara u smislu uklapanja trase žičare, kao i arhitekture polazne i izlazne stanice, u skladu sa smjernicama HIA ukazala se potreba za izradom dopunske tehničke dokumentacije. Izvođač radova je u skladu sa ugovornim obavezama započeo aktivnosti na izradi usklađivanja idejnog rješenja sa zahtjevima Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.14. Uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten“, Opština Žabljak

- Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti. Planirano je uređenje lokacija na panoramskoj ruti koja obilazi oko masiva Durmitora i djelimično obodom kanjona rijeke Tare, a u blizini vidikovaca, izvora, naselja i drugih lokacija.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na uređenju lokacija na panoramskoj ruti

"Durmitorski prsten" raspisivano je u junu, a zatim i u avgustu 2024. godine procijenjene vrijednosti 180.000,00€ bez pdv-a i na istima nije bilo pristiglih ponuda.

- Ponovno javno nadmetanje raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1313/1 sa izvođačem „Mosting“ d.o.o. zaključen je 22.07.2025. godine, na iznos od 211.585,92€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1882/2 sa "Projetcman" d.o.o., zaključen je 15.09.2025. godine na iznos od 2.904,00€.
- Ministarstvo turizma sprovodi aktivnosti na prijavi adaptacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

2.15. Izgradnja gondole od centra Kolašina do Ski centra Kolašin 1600


- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.


PROGRAM
III. EKOLOGIJA I PRIRODA

POTPROGRAM

3. a. PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

3.1. Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

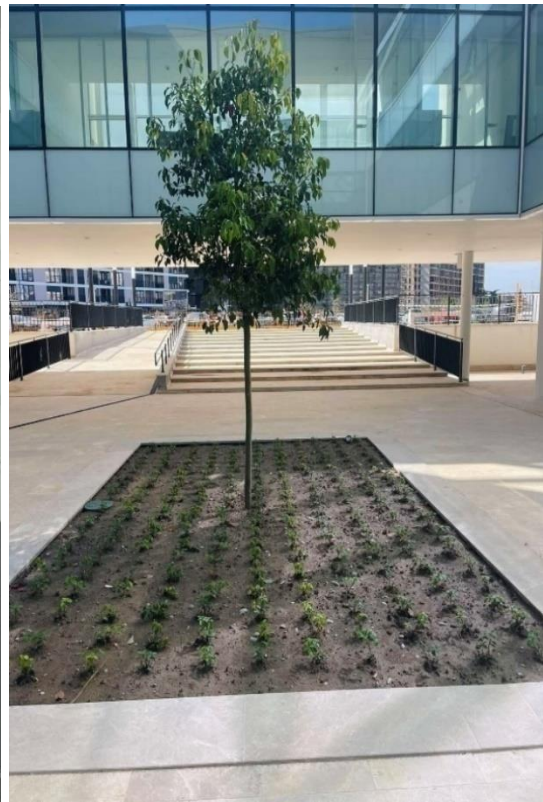

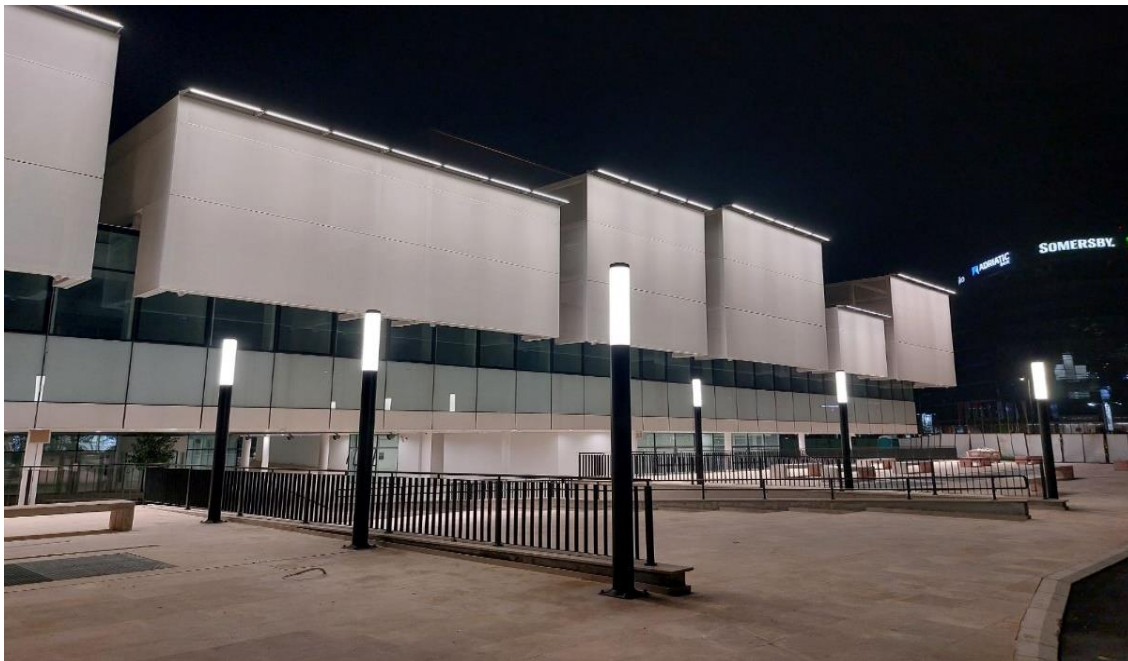

- Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko-italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegro-Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
- Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar” – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
- I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
- Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
- Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50€.
- Nakon što je završena izrada armirno-betonske i čelične konstrukcije objekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
- U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
- Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnih nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG” AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021. godine na iznos od 14.904.394,84€.

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
- Početkom 2022. godine radovi su započeti i do sada su završeni radovi na sanaciji postojeće čelične konstrukcije i izradi lamelirane drvene konstrukcije, radovi na zatvaranju objekta strukturalnom fasadom, izrada fasadne obloge od lameliranih drvenih i aluminijumskih sendvič panela, krovopokrivački radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
- Svi radovi su završeni, kao i tehnički pregled objekta.
- U toku su aktivnosti na utvrđivanju ukupne cijene koštanja izgradnje objekta Eko-efikasne zgrade - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.2. Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i sanaciji deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i odlagališta komunalnog otpada. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.
- U 2025. godini realizovano je 150.296,14€.

Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane

Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project” d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
- Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Toškovići” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-

334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.

- Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspeksijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
- Problematika: Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava za kapitalne projekte je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković“ pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava za kapitalne projekte navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlašćenog lica firme „Tošković“ ima elemenata krivičnog djela prevare.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Pejzažno uređenje zelenih površina specijalne namjene – zatvaranje i rekultivacija privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima, Kolašin

- U januaru 2024. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavljena je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/23-266/1 sa obrađivačem idejnog rješenja “Projekt sistem“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.01.2024. godine na iznos od 9.667,00€.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi“ raspisano je 26.04.2024. godine. Zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju donešena je Odluka o poništenju postupka.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je 02.08.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5932/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica zaključen je 23.10.2024. godine na iznos od 145.200,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-6893/2 sa revidentom glavnog projekta “Ding” d.o.o. Podgorica zaključen je 10.12.2024. godine na iznos od 3.611,85€.
- Završena je revizija glavnog projekta i dobijena saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine, opštine Kolašin.
- U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za ivođenje radova na zatvaranju i rekultivaciji privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima.
- U 2025. godini ukupno je realizovano €.

3.3. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama

Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sistema za upravljanja otpadnim vodama. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Upravi za kapitalne projekte na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu

- Dužina fekalne kanalizacione mreže u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu iznosi 6 km.

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1-7182/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
- Za potrebe izrade konačnog izvještaja revizije potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

- Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaza u cilju bolje iskorišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
- Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, „Eurozox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
- U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

- U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
- Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
- Završeni su radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
- Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.

II faza

- Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz instalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hiperling” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Po primarnom ugovoru završeni su radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnjosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
- U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesti kako bi se sistem stavio u funkciju na osnovu čega je potpisan ugovor sa firmom „Hiperling” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/22-1303/1 od 31.03.2022. godine u iznosu od 47.037,68€ sa pdv-om. Sve aktivnosti po ovom ugovoru za nepredviđene radove su realizovane.
- Preostale su određene pozicije iz primarnog ugovora kako bi se okončala II faza projekta, a iste će biti odrađene kada se za to stvore tehnički uslovi tj. zamućenje izvorske vode.
- Korisnik nije saglasan sa izvedenim radovima i odbija da primi iste, pa je potrebno održati sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja, koji su naručilac predmetnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje

- Uprava za kapitalne projekte je 09.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 80.000,00 € bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 13.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 20.000,00 € bez pdv-a.
- Uprava za kapitalne projekte je 14.06.2023. godine je poništila postupak za izradu glavnog projekta jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.
- Krajem aprila 2023. godine je donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za odabir revidenta predmetne projektne dokumentacije. Ugovor br. 01-334/23-5138/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. zaključen je 08.09.2023. godine na iznos od 13,128.5€.
- Po formiranju uslova Ministarstvo javnih radova će nastaviti sa aktivnostima iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Revizija izmijenjenog glavnog projekta fekalne kanalizacije za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV sa priključcima u opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora „Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija”, zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi izmijenjenog glavnog projekta za infrastrukturne objekte od pumpne stanice do PPOV, sa priključcima, u opštini Rožaje, dok Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na reviziji izmijenjenog glavnog projekta.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta izmijenjenog glavnog projekta je raspisano 24.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-900/1 sa revidentom izmijenjenog glavnog projekta, „Civil

engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 03.03.2022. godine, na iznos od 2.662,00€.

- U toku je revizija glavnog projekta.
- Obaveza Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je da u saradnji sa Prokonom obezbijedi projektanta koji će upodobiti detalje projekta za zahtjevima Uprave za saobraćaj, kako bi Uprava za saobraćaj izdala potrebnu saglasnost na navedeni projekat.
- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovodi aktivnosti na projektu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao glavni koordinator i korisnik ugovora "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija", zaključenog sa COWI A/S iz Danske, sprovodi aktivnosti na izradi Izradi projektne dokumentacije Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Rožaje" u sklopu tog projekta Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti na Izradi Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže.
- Javno nadmetanje za izbor projektanta, Uprava javnih radova je raspisao sklopila ugovor sa preduzećem „Aqua engineering“ d.o.o. Podgorica br. 01-334/20-8155/1 od 07.10.2020.godine, sa rokom izrade od 5 mjeseci u iznosu od 53.600,00€.
- Za vršenje stručne revizije sklopljen je ugovor sa preduzećem „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“ ad Podgorica br. 01-334/20-8788 od 23.10.2020. godine.
- U toku je revizija glavnog projekta. Revident je tražio saglasnost od Uprave za saobraćaj.

Izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, Herceg Novi

- Ministarstvo javnih radova će pokrenuti proces javne nabavke procijenjene vrijednosti 4.897.170,00 € bez pdv-a, kada se za to stvore adekvatni uslovi. Takođe, u narednom periodu će biti pokrenuti procesi javnih nabavki usluga na realizaciji predmetnog projekta.
- Krajem 2025. godine, usaglašavan je obim i modalitet tehničke specifikacije i vrijednosti predmete javne nabavke u koordinaciji s nadležnim institucijama opštine Herceg Novi. Po formiranju uslova, Ministarstvo javnih radova će nastaviti sa aktivnostima iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.4. Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja

- U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-5936 od 24.10.2019. godine, za realizaciju projekta "Toplifikacija Pljevalja", za čista i topla Pljevlja-izgradnja magistralnog toplovoda od TE Pljevlja do grada" u januaru 2022. godine potpisan je emorandum o razumijevanju između Opštine Pljevlja, Elektroprivrede Crne Gore i Uprave za Kapitalne projekte kojim se definiše namjera svih strana da učestvuju u realizaciji projekta.
- U martu je Elektroprivreda Crne Gore je oformila radnu grupu za praćenje realizacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici Elektroprivrede CG, Opštine Pljevlja i nekadašnje Uprave za kapitalne projekte
- Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2022. godine, nakon sprovedene procedure javne nabavke, ugovorila izradu projektne dokumentacije za kompletan primarni toplovod i izvođenje radova na prvoj dionici toplovoda u dužini od cca 2,3km, po principu "projektuj i izgradi". U toku je izrada projektne dokumentacije.
- Potpisan je ugovor sa EPCG po principu „projektuj i izgradi“ za izradu glavnog projekta kompletnog centralnog toplovoda i izgradnju prve dionice u dužini od cca 2,3 km.
- Javno nadmetanje za Izvođenje radova na izgradnji II I III faze primarnog toplovoda od TE Pljevlja do grada u dužini od cca 4km raspisano je u decembru 2024. godine, a zatim i u maju 2025. godine procijenjene vrijednosti 7.346.116,8 bez pdv-a i sta su poništena zbog

neispravnosti pristiglih ponuda.

- Ugovor br. 01-426/25-3725/1 sa „Intermost“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.12.2025. godine na iznos od 8.887.868,00€ putem pregovaračkog postupka.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.03.2025. godine na iznos od 143.990,00€.
- U toku su aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole za izgradnju II I III faze primarnog toplovođa od strane Opštine Pljevlja.
- Javno nadmetanje za izradu revizije Glavnog projekta za rekonstrukciju postojećih objekata/zamjena kotlarnica u podstanice za toplifikaciju i pripadajuće tehnologije, raspisano je u junu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2489/3 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 04.11.2025. godine na iznos od 25.549,15€.
- Javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju postojećih objekata/zamjena kotlarnica u podstanice za toplifikaciju i pripadajuće tehnologije, raspisano je u septembru 2025. godine. Ugovor br. za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju postojećih objekata/zamjena kotlarnica u podstanice za toplifikaciju i pripadajuće tehnologije, sa projektantom „Decom group“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.11.2025. godine na iznos od 217.765,77€.
- U toku je izrada glavnog projekta.
- U 2025. godini realizovano je 42.253,25€.

3.5. Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera

- Opština Plav koordinira i sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- Od strane Opštine je izrađena Studija izvodljivosti, a u toku je kompletiranje projektnog zadatka kojim koordinira Opština Plav. Nakon dostavljanja ovjerenog projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova, Ministarstvo javnih radova će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.6. Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica

- Na osnovu dostavljenog revidovanog glavnog projekta od strane Opštine Herceg Novi, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavu za odabir najpovoljnijeg Izvođača i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.02.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-677/1 sa izvođačem „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.02.2023. godine, na iznos od 9.769.992,03€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 14.03.2022. godine, ugovor br. 014-334/23-1501/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.03.2023. godine, procjenjene vrijednosti 118.580,00€.
- Izvođač je uveden u posao 07.04.2023. godine.
- U toku realizacije projekta je došlo do izmjene projekta u dijelu izmjene položaja jednog od rezervoara. Opština Herceg Novi je pripremila i dostavila izmijenjeni projekat.
- U toku je izvođenje radova. Potpisan je aneks ugovora za produženje roka, br. 01-018/25-3221/1 od 12.12.2025.godine, sa rokom izvođenja do 15.11.2026. godine.
- U 2025. godini je realizovano 1.438.447,26€.



3.7. Izgradnja centra za prihvata životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.8. Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze

- Opština Tuzi sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta.
- U 2022. godini u cilju realizacije predmetnog projekta zaključen je Ugovor o realizaciji sa Opštinom Tuzi na iznos od 72.013,75 €, a zatim aneks 1 ugovora na iznos od 1.738,801.00€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.9. Vodosnadbijevanje Pljevalja - izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ, Pljevlja



- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4427/1 sa izvođačem konzorcijumom „Fidija“ d.o.o. Podgorica, „Ving“ d.o.o. Pljevlja, „Milanović tretman voda“ d.o.o. Kragujevac, Kolektor Sisteh Sistemi in tehnologije d.o.o. Ljubljana, zaključen je 28.07.2023. godine na iznos od 4.790.245,61€.
- Ugovor br. 01-334/23-3864/1 sa stručnim nadzorom „Ding“ d.o.o. zaključen je za izvođenje pripremnih radova na izgradnji postrojenja Pliješ 03.07.2023. godine, na iznos 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-5304/1 sa stručnim nadzorom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 83.490,00€. Radovi su se izvodili do zimskog perioda, kada su bili privremeno obustavljeni.
- Nakon uvođenja izvođača radova u posao, nakon zimske sezone, sačinjen je Anex ugovora br. 01-067/25-558/2 od 06.02.2025.godine, koji se odnosi na uvećanje sredstava u iznosu od 5,58% ugovorene vrijednosti radova i produžetak roka za završetak radova do 31.12.2025.godine.

Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog cjevovoda visoke i niske zone Pliješ – grad sa povratnim cjevovodom

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 15.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-996/1 sa „Konzorcijum Ving“ d.o.o. Pljevlja i „Permonte“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.03.2024. godine na iznos od 2.709.311€.
- Izvođač je uveden u posao 10.05.2024. godine.
- Rok za završetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Ugovor br. 01-334/24-1133/1 sa stručnim nadzorom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 08.03.2024. godine, na iznos od 53.240,00€.
- Radovi su nastavljeni nakon zimske sezone. U toku je dobijanje saglasnosti za realizaciju radova u koritu rijeka Čehotine i Breznice, kao i od Uprave za šume, kako bi mogli da se izvode radovi na potezu od Brda Pliješ do pristupne saobraćajnice.
- U toku su aktivnosti za potpsivanje Anexa ugovora za produženje roka za završetak radova.
- U 2025. godini realizovano je 2.450.000,00€.

3.10. Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja

- Za potrebe izrade Glavnog projekta transfer stanice u Pljevljima, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Urbanističko tehničke uslove i projektni zadatak.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom raspisano je 28.09.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-2355/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.04.2023. godine, na iznos od 27.104,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2277/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ingenium" d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
- Usled promjene zauzetosti terena, Opština Pljevlja je tražila dopunu izdatih urbanističko - tehničkih uslova od resornog Ministarstva u dijelu katastarskih parcela na kojima je planirana izgradnja objekta.
- Opština Pljevlja je izmjene urbanističko-tehničkih uslova dostavila u decembru 2023. godine.
- Glavni projekat je revidovan. U toku je dopuna projekne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.11. Projekat poboljšavanja vodosnadbijevanja u KO Župa, Nikšić

- Na osnovu dostavljenog projekta od strane Opštine Nikšić, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 30.12.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-4941/1 sa izvođačem radova "Ferc" d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.08.2023. godine na iznos od 24.560,58€.
- Ugovor br. 01-334/23-2617/1 sa stručnim nadzorom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.05.2023. godine, na iznos od 5.929,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.12. Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića

- U oktobru 2023. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova procijenjene vrijednosti 145.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1134/1 sa izvođačem radova „Geotin MNE“ d.o.o. i „Eurozox“ d.o.o. zaključen je 08.03.2024. godine na iznos od 174,499.88€.
- Ugovor br. 01-334/23 -7393/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je usaglašavanje projektne dokumentacije vodovoda Konjuhe sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno cjevovodom mini hidroelektrane.
- Rješavati u koordinaciji sa predstavnicima Opštine Andrijevića.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.13. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva, Bečići



- U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir ponuđača koji će izvršiti nabavku opreme i instalaciju iste. Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, uslijedila je žalba Državnoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U međuvremenu je protiv odluke Državne komisije pokrenut upravni spor.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2024. godine ponovo pokrenula postupak javne nabavke za odabir dobavljača i instalatera opreme procijenjene vrijednosti 2.470.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/24-4130/1 sa „Marex technology“ d.o.o. Beograd, zaključen je 22.07.2024. godine na iznos od 2.987.019,31€.
- Prema inicijativi od strane Opštine Budva, Uprava za kapitalne projekte je sklopila aneks ugovora sa izvođačem radi nabavke nepredviđenih – dodatnih roba, radova i usluga, br. 01-334/24-7083/1 od 18.12.2024. godine, sa inoviranom vrijednošću na iznos od 3.566.125,31 sa pdv-om.
- Radovi na ugradnji opreme završeni su u februaru 2025. godine, a u martu je izvršena funkcionalna proba objekta. U aprilu 2025. godine je izvršena primopredaja objekta.
- U 2025. godini isplaćeno je 3.566.098,69€.

3.14. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju – Izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine 450m



- Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena revidovana elektronska tehnička dokumentacija.
- Za odabir izvođača radova Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje 20.04.2023. godine, procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Nije bilo pristiglih ponuda.
- Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-7881/1 sa privrednim društvom „Projectman“ d.o.o. Podgorica, od 17.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Uprava za kapitalne projekte je ponovo raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova, s uvećanom procijenjenom vrijednosti od 180.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01 - 334/24 - 3368/1 po zajedničkoj ponudi „Nicos Cop“ d.o.o. Berane i „Vigoris Ecotech“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.06.2024. godine na iznos od 216.450,44€.
- U toku je izvođenje radova, odnosno usklađivanje izvođenja radova na predmetnom kolektoru sa izvođenjem radova na izgradnji obaloutvrde.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.15. Vodovod „Seošnica” – razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje

- U 2024. godini Opština Rožaje je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektну dokumentaciju, te hje Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-944/1 sa izvođačem radova “Vik” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.02.2025. godine na iznos od 448.183,36€.

- Ugovor br. 01-334/25-890/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Mecmex-architects” d.o.o. Rožaje, zaključen je 24.02.2025. godine na iznos od 6.050,00€.
- Radovi su završeni. Očekuje se konačni izvještaj nadzornog organa.
- U 2025. godini realizovano je 435.416,70€.



3.16. Vodosnadbijevanje na teritoriji opštine Plužine – vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko

- Opština Plužine je dostavila projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Uprava je u novembru 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova I faze za naselja Borkovići – Dubljevići. Ugovor br. 01-334/23-7388/1 za vršenje stručnog nadzora za I fazu vodovoda Borkovići Dubljevići, sa privrednim društvom „Diagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-2569/1 sa izvođačem radova „Vigoris Ecotech“ d.o.o. Podgorica zaključen je 13.05.2024. godine i aneks ugovora br. 01-334/24-3030/1 od 29.05.2024. godine, na iznos 198.838,33€.
- Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Borkovići Dubljevići na I fazi otpočelo je sredinom 2024. godine.
- Svi radovi I faze su završeni i izvršena je primopredaja u decembru 2025. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji vodovoda naselje Borkovići Dubljevići II faza, raspisano je u maju 2025. godine, procijenjene vrijednosti 205.460,62€ bez pdv-a i isto je poništeno. Ponovno javno nadmetanje raspisano je krajem novembra 2025. godine i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovoda naselje Borkovići Dubljevići II faza raspisano je krajem decembra 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini realizovano je 111.027,45€.

3.17. Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođač radova na rekonstrukciji vodovoda u opštini Petnjica raspisano je u decembru 2024. godine i isto je poništeno zato što nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-816/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je 20.02.2025. godine na iznos od 13.854,5€.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 260.000,00€ bez pdv-a raspisano je u aprilu i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Obaveza Opštine Petnjica je da dostavi korigovani glavni projekat u dijelu predmjera i predračuna radova, nakon čega će se pristupiti ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.18. Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću

- Opština Nikšić je dostavila urbanističko-tehničke uslove i projektni zadatak na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje gradskog vodovoda u Nikšiću 18.10.2023. godine, procijenjene vrijednosti 300.000,00€.
- Raspisano je javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta 29.12.2023. godine, procijenjene vrijednosti 50.000,00€.
- Ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/24-1544/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.03.2024. godine na iznos od 213.444,00€, sa rokom izrade 7 mjeseci od dana dobijanja pozitivnog izvještaja o reviziji elaborata o geotehničkim svojstvima terena.
- Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta br. 01-334/24-2831/1 sa “Projectman” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.05.2024. godine na iznos od 59.290,00€.
- U saradnji sa predstavnicima Vodovoda Nikšić projektant sprovodi aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.19. Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, Andrijevica

- Opština Andrijevica je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je tokom 2023. godine u više navrata raspisivala javno nadmetanje za odabir izvođača radova, u skladu sa inoviraniom specifikacijom – obimom radova, dostavljenim od strane Korisnika – Opština Andrijevica procijenjene vrijednosti 145.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01 – 334/24 – 2733/1 sa privrednim društvom „Inženjer Gogić” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.05.2024. godine na iznos od 155.229,69€.
- Ugovor br. 01-334/23-7391/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je od 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Izvođač je uveden u posao krajem septembra 2024. godine.
- U toku je sagledavanje zahtjeva izvođača radova u pogledu viškova radova. Obaveza Opštine Andrijevica da dostavi inoviranu tehničku dokumentaciju za narednu fazu.
- U 2025. godini realizovano je 13.023,23€.

3.20. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta „Merića Vrelo”, Berane

- Opština Berane je u januaru 2024. godine dostavila je Upravi za kapitalne projekte

dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6305/1 sa izvođačem radova "Flowmax" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.11.2024. godine na iznos od 4.828.035,14€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4996/1 sa vršiocom stručnog nadzora "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 118.096,00€.
- U toku je izvođenje radova, kao i sagledavanje zahtjeva izvođača oko nepredviđenih radova.
- U 2025. godini realizovano je 2.027.001,00€.

3.21. Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane

- U 2023. godini Opština Berane dostavila je Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Ugovor br. 01-334/24-1992/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.04.2024. godine na iznos od 9,546.90€.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-724/1 sa izvođačem radova „Gold grading” d.o.o. Berane, zaključen je 17.02.2025. godine na iznos od 553.622,11€.
- Izvođač radova je uveden u posao 12. juna 2025. godine. Zbog problema sa nepoklapanjem tehničke dokumentacija sa stanjem na terenu, vezano za problematiku instalacija nadležnih institucija, radovi ne teku planiranom dinamikom.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.22. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva

- U 2023. godini Opština Budva dostavila je Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Krajem 2024. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu elaborata uticaja na životnu sredinu za podmosrki ispušt Buljarica, procijenjene vrijednosti 30.000,00 bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije bio pristiglih ponuda. Takođe, raspisano je i javno nadmetanje za izradu studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici, procijenjene vrijednosti 60.000,00 bez pdv-a i isto je poništeno.
- U 2025. godini nije bilo aktivnosti na predmetnom projektu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.23. Sanacija odlagališta Zakršnica

- Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi za kapitalne projekte.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
- Izvršena je Izmjena glavnog projekta na osnovu ugovora br. 01-334/22-4931/1 od 15.11.2022.godine kao i revizija izmijenjenog glavnog projekta, ugovor br. 01-334/22-4957/1 od 16.11.2022.godine. Potreba za izmjenom glavnog projekta javila se usljed promjene količina na samom odlagalištu od perioda izrade projekta do raspisivanja javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-

2081/1 sa konzorcijumom, „Gradnja inženjering MNE“ i „Trisoplast Mineral Liners“ je zaključen 06.04.2023. godine, na iznos od 4.228.330,05€.

- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.03.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-2779/1 sa stručnim nadzorom, „Arhiplan CG“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.05.2023. godine, na iznos 83.490,00 €.
- Radovi su počeli 08.06.2023. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Mojkovac.
- Aneks 1 ugovora br. 01-334/25-5528/2 je zaključen 03.10.2024. godine kojim se produžava rok za završetak radova do 01.07.2025. godine.
- Svi ugovoreni radovi su završeni.
- Primopredaja izvedenih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova korisniku - opštini Mojkovac i „Komunalne usluge Gradac“ d.o.o. Mojkovac, izvršena je 05.09.2025. godine.
- U 2025. godini ukupno realizovano je 889.500,92€.



3.24. Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje

Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice - II faza

- Budući da je Opština Bijelo Polje sklopila Ugovor za izvođenje radova za I fazu izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta Banjica, kao i da je jedan dio radova izveden, Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena elektronska verzija revidovane projektne dokumentacije. U drugoj polovini 2022. godine je sa Opštinom Bijelo Polje usaglašavan obim radova naredne faze. Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-3006/1 od 24.05.2023. godine na iznos od 7.900,00 eura bez pdv-a sa privrednim društvom „Projectman“ d.o.o. Podgorica
- Za odabir izvođača radova II faze raspisano je javno nadmetanje 05.05.2023. godine. Ugovor br. 01 - 334/23 - 6008/1 sa izvođačem „Indel inženjering“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.10.2023. godine na iznos od 748.879,859 € bez pdv-a.
- Izvođač je uveden u posao u novembru 2023. godine. Izvođenje radova je pratila problematika izmještanja podzemnih instalacija koji nise nisu bile prepoznate, ukrštanje sa izvođenjem radova na izgradnji puta Gubavač - Bistrica, vremenski uslovi, kao i imovinsko pravni problemi.
- Radovi su nastavljeni u drugoj polovini 2025. godine i isti su u toku.
- U 2025. godini realizovano je 210.000,00€.

3.25. Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak

- U februaru 2025. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljen projekat usklađen sa eurokodovima i Uprava je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1151/3 sa izvođačem radova „Roaming Montenegro” zaključen je 15.08.2025. godine na iznos od 2.023.931,99€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u aprilu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-940/2 sa vršiocom stručnog nadzora „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.08.2025. godine na iznos od 69.817,00€.
- U toku su aktivnosti na dobijanju građevinske dozvole od strane Opštine Žabljak.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.26. Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice

- Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
- Završena je revizija glavnog projekta.
- Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 9.655,00€.

3.27. Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.28. Izgradnja Sistema vodosnadbijevanja

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji vodovodne infrastrukture. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja vodovoda Štitarica, Mojkovac

- Opština Mojkovac je u decembru 2025. godine Ministarstvu javnih radova dostavila projektnu dokumentaciju i isto je pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, provijenjene vrijednosti 209.685,45€ i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na izgradnji glavnog vodovodnog cjevovoda Vukoser-Dedeić - I faza, Rožaje

- Opština Rožaje je u 2025. godini Ministarstvu javnih radova dostavila projektnu dokumentaciju i isto je pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 666.115,71€. U toku je žalbeni postupak.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji glavnog vodovodnog cjevovoda Vukoser-Dedeići, I faza, raspisano je u septembru 2025. godine. Ugovor br. 01-334/26-157/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.01.2026. godine na iznos od 11.979,00€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.29. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama – Buče, Zagrad i Dapsićko-Poličkog

- Opština Berane je u 2025. godini Ministarstvu javnih radova dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Ministarstvo pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji Dapsićko Polićkog vodovoda raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 391.374,37€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 10.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.30. Izgradnja šetališta i kanalizacije od “Titove vile” do Hotela “Iberostar” u Njivicama faza C

- Opština Herceg Novi u 2025. godini nije dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje bi Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.31. Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaze „Oko” do glavnog gradskog bazena na Žabljaku

- Opština Žabljak je u 2025. godine Ministarstvu javnih radova dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Ministarstvo pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.320.000,00 €. U toku je žalbeni postupak.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora u toku izvođenja radova raspisano je u septembru 2025. godine i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.32. Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku

Nabavka i ugradnju SCADA sistema na vodovodnom sistemu opštine Žabljak - I faza

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6408/1 sa „Vik“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.11.2024. godine na iznos od 192.976,85€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5120/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.09.2024. godine na iznos od 11.858,00€.
- Radovi su u završnoj fazi.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u aprilu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.515.925,00€ i na isto je uložena žalba. U toku je rješavanje žalbenog postupka.
- U 2025. godini realizovano je 127.980,52€.

3.33. Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru

- U aprilu 2024. godine Upravi za kapitalne projekte dostavljena je dokumentacija od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Javno nadmetanje za izradu studije uspostavljanja primarne selekcije komunalnog otpada u Baru, izradu glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta i proširenje postojećeg reciklažnog centra i sprovođenje procjene uticaja na životnu sredinu, raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6787/1 sa "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.12.2024. godine na iznos od 205.700,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta i proširenje postojećeg reciklažnog centra u Baru, raspisano je u novembru 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-3382/4 sa revidentom "StructurArch group" d.o.o. Podgorica, zaključen je 24.12.2025. godine na iznos od 3.630,00€.
- U 2025. godini realizovano je 102.850,00€.

3.34. Vodosnadbijevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Opština Šavnik

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Šavnik.
- Ugovor br. 01-334/23-6198/1 sa izvođačem „Ekspert M“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.10.2023. godine na iznos od 362.940,82€.
- Ugovor br. 01-334/23-4889/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Izvođač je uveden u posao 17. novembra 2023. godine. Završeno izvođenje radova na I i II fazi.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova III faze raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 460.000,00€ bez pdv-a, a zatim i u aprilu 2025. godine i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora nad izvođenjem radova III faze raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor broj 01-334/25-1781/1 sa „Diagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.04.2025. godine na iznos od 9.772,50€.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova III faze raspisano je u oktobru 2025. godine. Ugovor broj 01-334/25-3749/1 sa „Ekspert M“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.12.2025. godine na iznos od 556.566,68€.
- U 2025. godini realizovano je 125.769,55€.

3.35. Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Plužine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izgradnju vodovoda i rezervoara u selu Goransko raspisano je u oktobru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 460.000,00€ bez pdv-a. Prvo javno nadmetanje je poništeno, a ponovo raspisano u oktobru i donijeta je odluka o izboru najpovoljnije ponude. Ugovor br. 01-334/25-380/1 sa izvođačem radova „Vigoris Ecotech“ d.o.o. Podgorica zaključen je 14.05.2025. godine na iznos od 555.137,25€.
- Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/25-1192/1 od 12.03.2025. godine sa privrednim društvom N&B inženjering i Konsalting d.o.o. Nikšić, na iznos od 11.676,50€.
- Stručni nadzor je iznio primjede na tehničku dokumentaciju koju je dostavila Opština Plužine. U toku je sagledavanje obima izmjene dokumentacije, nakon čega će biti moguće

- sagledati eventualne pojave nepredviđenih radova.
- U 2025. godini realizovano je 249.341,20€.

3.36. Adaptacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi

- Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je u aprilu 2024. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 950.000,00€ bez pdv-a. Donesena je odluka za odabir izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7399/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.12.2024. godine na iznos od 15.730,00€.
- Izvođač je uveden u posao u drugoj polovini 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 457.575,64€.

3.37. Fekalna i atmosferska kanalizacija za Ski centar Kolašin 1600

- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera krajem 2024. godine dostavilo je Upravi za kapitalne projekte idejno rješenje sa zahtjevom za realizaciju projekta po principu “projektuj i izgradi”.
- Uprava za kapitalne projekte je uputilo zahtjev opštini Kolašin za kompletiranje dokumentacije, odnosno dostavljanje i projektnog zadatka za izradu glavnog projekta i izvođenje radova, kao i urbanističko – tehničkih uslova.
- U martu 2025. godine održan je sastanak u opštini Kolašin na kojem je konstatovano od strane predstavnika opštine Kolašin da opština očekuje da će Zakupac do 04.04.2025. godine dostaviti Projektni zadatak usklađen s Idejnim Rješenjem i isti će biti dostavljen Ministarstvu javnih radova. Takođe, na sastanku je od strane Ministarstva javnih radova predloženo da se paralelno sa izradom Projektnog zadatka provjeri planirana lokacija budućeg PPOV-a sa aspekta imovinsko-pravnih odnosa, što je prihvaćeno od strane predstavnika opštine Kolašin, međutim, do danas Ministarstvu javnih radova nije dostavljena tražena dokumentacija.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.38. Glavni kolektor fekalne kanalizacije Ski centar Kolašin 1400

- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera krajem 2024. godine dostavilo je Upravi za kapitalne projekte idejno rješenje sa zahtjevom za realizaciju projekta po principu “projektuj i izgradi”.
- Uprava za kapitalne projekte je uputilo zahtjev opštini Kolašin za kompletiranje dokumentacije, odnosno dostavljanje i projektnog zadatka za izradu glavnog projekta i izvođenje radova, kao i urbanističko – tehničkih uslova.
- U martu 2025. godine održan je sastanak u opštini Kolašin na kojem je konstatovano od strane predstavnika opštine Kolašin da opština očekuje da će Zakupac do 04.04.2025. godine dostaviti Projektni zadatak usklađen s Idejnim Rješenjem i isti će biti dostavljen Ministarstvu javnih radova. Takođe, na sastanku je od strane Ministarstva javnih radova predloženo da se paralelno sa izradom Projektnog zadatka provjeri planirana lokacija budućeg PPOV-a sa aspekta imovinsko-pravnih odnosa, što je prihvaćeno od strane predstavnika opštine Kolašin, međutim, do danas Ministarstvu javnih radova nije dostavljena tražena dokumentacija.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.39. Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5015/1 sa „Temko“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 06.09.2024. godine na znos od 252.588,53€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5150/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.09.2024. godine na iznos od 7.108,00€.
- Radovi su završeni u junu 2025. godine i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 106.003,52€.

POTPROGRAM

**3. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR ODRŽIVI
RAZVOJ**

3.40. PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

- Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane” potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
- U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
- U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijedena sredstva iz Zakona o budžetu.

- **Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda**

- Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech“ Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
- U aprilu 2019. godine, postrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
- U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
- U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).

- **Kanalizaciona mreža**

- Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech“ Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI“ Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
- Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
- U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
- U 2025. godini realizovano je 451.13,00€.



3.41. Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
- Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
- Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S”, je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€ sa inicijalnim rokom implementacije od 36 mjeseci.
- Aneks kojim se produžava rok implementacije i kojim se definisane nove aktivnosti je potpisan 28.05.2024. godine. Rok implementacije je produžen do 21.12.2024. godine.
- Sve aktivnosti na projektu su završene.
- U 2025. godini realizovano je 1.697.256,13€.

3.42. Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama

- Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
- Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.
- Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istraživanjima.
- Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
- Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
- Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Aneks broj 5 ugovora potpisan je 20.12.2022. godine i odnosi se na produženje ugovorenog roka do 30.04.2023. bez povećanja ugovorene vrijednosti, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je šesti šestomjesečni izvještaj.
- Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na posljednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
- Aneks broj 6 ugovora potpisan je 18.05.2023. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta, povećanje ugovorene vrijednosti na 3,535,135.00 € i produženje roka implementacije do 14.07.2024. godine.

- Aneks broj 7 ugovora potpisan je 06.06.2024. godine i odnosi se na smanjenje ugovorene vrijednosti na 3.535.105,00€ i produženje roka implementacije do 30.11.2024. godine.
- Implementacija je uspješno završena.
- U 2025. godini realizovano je 499.726,48€.

3.43. Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
- U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projekta iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave za kapitalne projekte vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
- Avansna uplata koja je bila previđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
- U decembru 2022. godine, za dva ugovora dostavljeni su konačni izvještaji.
- U periodu od januara do juna 2023. godine šest grant ugovarača (KOD, Gorica, Expeditio, MES, CZIP, ISSP) je dostavilo konačne izvještaje i ujedno zahtjeve za finalna plaćanja.
- Nakon odobrenja finalnih izvještaja, sve aktivnosti na ugovorima su završene.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.44. Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je početkom 2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat "Doprinos uspostavljanja NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori".
- Nakon obrade navedene dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte, je istu prosljedila Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na kontrolu i odobrenje.
- Dio tenderske dokumentacije je odobren i javno objavljen na eTED sajtu tokom aprila 2023. godine, rok za dostavljanje aplikacija je bio 05.06.2023. godine, nakon čega će se pristupiti otvaranju i vrednovanju pristiglih aplikacija za prvu fazu tenderskog postupka.
- Nakon uspješno završene prve faze i odobrenja preostalog dijela tenderske dokumentacije 14.12.2023. godine je otpočeo rad evaluacione komisije za drugu fazu postupka.
- Evaluacioni izvještaj je odobren od strane EU Delegacije, čime su se stekli uslovi za potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
- Ugovor je potpisan 10.05.2024. godine na iznos 1.290.000,00€ sa kompanijom „Eptisa SouthEast Europe”.
- Aneks br. 1 ugovora kojim je vrijednost povećana na 2.580.000,00€ i produžen rok implementacije za dodatnih 12 mjeseci potpisan je 04.09.2025. godine.
- U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.
- U 2025. godini realizovano je 274.241,72€.

3.45. Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 21.06.2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat "Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme" na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.
- Tender za odabir dobavljača opreme je sproveden. Kako nije bilo tehnički ispravnih ponuda, isti je poništen.

- Izmjenom akcionog dokumenta, projekat je isključen.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.46. Podrška u uspostavljanju EIONET sistema u Crnoj Gori

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Prva verzija Tenderske dokumentacije je poslata EU Delegaciji na ex-ante odobrenje 24.07.2024. godine i ista je odbijena 31.08.2024. godine.
- Druga verzija Tenderske dokumentacije je poslata EU Delegaciji na ex-ante odobrenje 04.10.2024 godine i ista je odobrena 25.10.2024. godine.
- Shortlist report je poslat EU Delegaciji na ex-ante odobrenje 18.09.2024. godine i isti je odobren 16.10.2024 godine.
- Pozivna pisma uspješnim aplikantima i tenderska dokumentacija je poslata 06.11.2024 godine. Rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2024 godine.
- Nakon uspješno završene implementacije, potpisan je ugovor sa najuspješnijim ponuđačem 25.03.2025. godine.
- Nalog za početak radova je izdat 08.04.2025. kada je i održan početni sastanak.
- Početni izvještaj je odobren čime je inicijalna faza ugovora kompletirana.
- U toku su dalje aktivnosti na realizaciji ugovora.
- U 2025. godini realizovano je 280.000,00€.

3.47. Podrška u implementaciji INSPIRE direktive

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Inicijalna dokumenta tenderske dokumentacije su poslata EU Delegaciji na odobrenje 06.02.2025. i ista su odbijena 10.04.2025. godine.
- Ugovor se zbog nedovoljne pripremljenosti tenderske dokumentacije koja je od strane Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavljena Ministarstvu javnih radova nije ugovorio u predviđenom roku za ugovaranje na nivou programa IPA II AAP 2021
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.48. Podrška Crnoj Gori u ispunjavanju uslova iz poglavlja 27 EU acquis-a i povezano jačanje kapaciteta

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na odobrenje 29.10.2024. godine. Finalno je odobrena 04.04.2025. godine.
- Shortlist izvještaj je dostavljen Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na odobrenje 01.11.2024. godine. Finalno je odobren 19.12.2024. godine.
- Pozivna pisma su poslata 7.04.2025. Kroz zahtjev za izmjesnom tenderske dokumentacije, definisan je finalni rok za dostavljanje ponuda 27.06.2025. godine.
- Nakon odobrenja evaluacionog izvještaja, ugovor sa kompanijom Expertise Advisors je potpisan 24.10.2025. u vrijednosti od 1.395.600,00€. Aneks ugovora kojim se povećava vrijednost ugovora na 2.092.700,00€ je potpisan 15.12.2025. te godine.
- Implementacija ugovora je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

3.49. Izgradnja kapaciteta za programiranje i sprovođenje Ipa programa

- Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
- Projekat se realizuje kroz IPA III AAP za 2021. Nakon uspješno završenog procesa evaluacije i odobrenja evaluacionog izvještaja od strane EU Delegacije, ugovor sa kompanijom Enova d.o.o. Sarajevo je potpisan 10.12.2025. godine u vrijednosti od 632.200,00€ sa rokom implementacije od 18 mjeseci.
- Početne aktivnosti na realizaciji ugovora su u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

IV. UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

POTPROGRAM

4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA STAMBENIH OBJEKATA

4.1. Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju „Velje brdo“, Podgorica

- Projekat Velje Brdo predstavlja jedan od najambicioznijih i najznačajnijih urbanističkih poduhvata u savremenoj istoriji Podgorice i Crne Gore. Planirana izgradnja potpuno novog urbanog naselja na do sada neiskorišćenoj lokaciji ima za cilj stvaranje funkcionalnog, održivog i infrastrukturno opremljenog prostora koji će objediniti stanovanje, rad i javne sadržaje. Projekat obuhvata stambene, poslovne i javne funkcije, kao i izgradnju kompletne prateće infrastrukture, čime se stvara osnova za dugoročni urbani i demografski razvoj grada.
- Prema projektnim planovima, predviđeno je da u okviru naselja boravi 66.000 korisnika, što Velje Brdo svrstava među najveća planska urbana proširenja u regionu. Naselje je zamišljeno kao zaokružena urbana cjelina koja uključuje stambene objekte, obrazovne ustanove poput škola i vrtića, dom zdravlja, poslovne i komercijalne prostore, kao i bogatu mrežu parkova, zelenih površina, sportskih i rekreativnih zona. Ovakav koncept ima za cilj obezbjeđivanje visokog kvaliteta života, smanjenje potrebe za svakodnevnim migracijama ka centralnim dijelovima grada i jačanje lokalne zajednice.

Infrastruktura i saobraćaj

- Poseban segment projekta odnosi se na izgradnju moderne saobraćajne i komunalne infrastrukture. Planirana je izgradnja novog bulevara koji će obezbijediti kvalitetnu povezanost Veljeg Brda sa ostalim dijelovima Podgorice, čime se unapređuje ukupna mobilnost stanovništva.
- Javno nadmetanje za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom, Podgorica raspisano je u junu 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-2046/1 sa konzorcijumom "Optimusproject" d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 18.09.2025. godine na iznos od 74.536,00€.
- Javno nadmetanje za vršenje revizije Glavnog projekta Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom raspisano je u junu 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-2161/1 sa revidentom "Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu", Podgorica, zaključen je 26.09.2025. godine na iznos od 24.079,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom – izvođenje pripremnih radova, raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.867.498,6 € bez pdv-a i isto je u toku.
- Pored saobraćajne infrastrukture, radi se i na izgradnji kompletnih sistema komunalnih usluga, uključujući vodovod, kanalizaciju i elektroenergetsku mrežu. Ministarstvo javnih radova je preuzelo obavezu izrade idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture za obezbjeđivanje potrebnih količina voda i odvođenje otpadnih voda stambeno - poslovnog kompleksa Velje brdo, kojim će se iznaći tehničko rješenje sigurnog vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda predmetnog stambeno-poslovnog kompleksa.
- Javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture, raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 24.900,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM
V. ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

POTPROGRAM

5. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZDRAVSTVA

5.1. Rekonstrukcija energetskeg bloka - trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskeg bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika Klinički centar Crne Gore, pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ing invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, "Bates" d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
- Projektna dokumentacija je revidovana u novembru 2022. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 06.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa izvođačem, "Ramel" d.o.o. Nikšić, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 726.000,14 €.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br.01-334/23-2618/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.05.2023. godine, na iznos 9.655,8 €.
- Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa trenutnim stanjem na objektu i specifičnih zahtjeva korisnika tokom izvođenja radova, radovi na objektu su bili obustavljeni. Nakon izmjene i dopune tehničke dokumentacije na koju je dao saglasnost Korisnik KCCG i usaglašavanja dinamike izvođenja radova sa korisnikom KCCG, radovi su otpočeli u oktobru 2025. godine i isti su toku.
- U 2025. godini realizovano je 401.000,00€.



5.2. Rekonstrukcija i adaptacija JZU „Vaso Ćuković” u Risnu

- Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo glavni projekat adaptacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 17.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-1926/1 sa izvođačem radova, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad zaključen je 10.05.2022. godine, na iznos od 1.397.431,72€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 21.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-4329/1 za preduzećem "Urbi.Pro" d.o.o. zaključen je 14.10.2022. godine, na iznos od 43.318,00€.
- Sa radovima se otpočelo u novembru 2022. godine. Nakon radova na demontaži i rušenju,

stručni nadzor je ukazao na problematiku vezanu za neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta i zahtjevao izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcije objekta sa seizmičkim proračunom za stvarno stanje objekta. Krajnji korisnik je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja preuzeo obavezu obezbjeđenja dokumentacije koja omogućava nastavak radova na postojećem objektu.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje saobraćajnica i parking prostora ispred bolnice procijenjene vrijednosti 250.000,00€, na osnovu projektnog zadatka potpisanog od strane korisnika JZU „Vaso Ćuković“, raspisano je 23.12.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje za opremanje objekta (nabavka medicinske opreme) za 7 partija ukupne procijenjene vrijednosti 420.000,00€ bez pdv-a, raspisano je krajem decembra 2022. godine.
- Partija I: Digitalni rendgen aparat sa plafonskim vješanjem, procijenjena vrijednost 181.500,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-3623/1 sa dobavljačem, „Osmi red - D“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.06.2024. godine, na iznos od 145.200,00€.
- Partija II: Aparat za anesteziju, procijenjena vrijednost 30.250,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/1 sa dobavljačem, „Farmont M.P.“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 30.250,00€.
- Partija III: Stacionarni ultrazvučni aparat, procijenjena vrijednost 60.500,00€ sa pdv-om. U avgustu je uložena žalba, a krajem avgusta komisija je usvojila istu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke donesena je u oktobru tekuće godine.
- Partija IV: Oprema za operacionu salu, procijenjena vrijednost 169.400,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/1 sa dobavljačem, „Farmont M.P.“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 169.400,00€.
- Partija V: Električni bolnički krevet, procijenjena vrijednost 24.200,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/2 sa dobavljačem, „Farmont M.P.“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 24.200,00€.
- Partija VI- Aparati za intenzivnu jedinicu, procijenjena vrijednost 26.015,00€ sa pdv-om. Ugovor br. 01-334/24-4016/2 sa dobavljačem, „Farmont M.P.“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2024. godine, na iznos od 26.015,00€.
- Partija VII - Aparati za kabinet za preglede, procijenjena vrijednost 16.335,00€ sa pdv-om. Na javnom nadmetanju nije bilo podnijetih ponuda.
- Digitalni rendgen aparat isporučen i predat na korišćenje Korisniku, dok će ostali ugovori biti realizovani nakon završetka izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji JZU "Vaso Ćuković".
- Krajem juna 2024. godine je dostavljena izmijenjena i revidovana projektna dokumentacija od strane korisnika.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i adaptaciji JZU "Vaso Ćuković", raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6893/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 10.12.2024. godine na iznos od 344.369,8€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova, raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-411/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.01.2025. godine, na iznos od 9.661,85€.
- Izvođač za dodatne radove je uveden u posao u februaru 2025. godine.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat Korisniku u septembru 2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 1.990.920,61€.



5.3. Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.
- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljeno prvorangirano Idejno arhitektonsko rješenje, Urbanističko-tehnički uslovi i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista je na inicijativu korisnika – Opšte bolnice Pljevlja, pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja po principu „projektuj i izgradi“.
- Javno nadmetanje za Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji Opšte bolnice u Pljevljima po principu „projektuj i izgradi“ raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5522/1 sa „Termomont“ d.o.o. Beograd i Igp „Fidija“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.10.2024. godine na iznos od 38.694.602,10€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije raspisano je u februaru 2024. godine procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Donesena je odluka o izboru najpovoljnije ponude krajem marta i na istu je uložena žalba.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor revidenta rapisano je u februaru 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-2259/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2025. godine na iznos od 137.940,00€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Opšte bolnice u Pljevljima po principu „projektuj i izgradi“, raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 500.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- Nakon usaglasavanja sa Investitorom/Korisnikom, odnosno Ministarstvom zdravlja/JZU Opšta bolnica Pljevlja projektant je razradio idejno rješenje i na isto je dobijena saglasnost od strane Korisnika u februaru 2025. godine.
- Projektant je analizom konkursnog Idejnog rješenja utvrdio da planirani objekat znatno prekoračuje zadatu površinu u osnovi i ne zadovoljava zadati koeficijent zauzetosti iz urbanističko tehničkih uslova br. UP/I 05-332/20-78/6 izdatih dana 13.04.2020. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja, te predmetni objekat nije moguće projektovati prema navedenim urbanističko tehničkim uslovima.
- Investitor/Korisnik, odnosno Ministarstvo zdravlja/JZU Opšta bolnica Pljevlja su preuzeli obavezu da pribave nove urbanističko tehničke uslove koji će biti u skladu sa PUP-om Pljevlja, a kojim je predviđena veća zauzetost za predmetnu parcelu, čime bi omogućili projektovanje i izvođenje objekta prema konkursnom Idejnom rješenju i predstavlja osnov za dalju izradu Glavnog projekta.
- Urbanističko tehnički uslovi su izdati od strane nadležnog ministarstva u oktobru 2025. godine i u toku je izrada i revizija projektne dokumentacije.
- U 2025. godini realizovano je 915.609,80€.



5.4. Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dom zdravlja u City kvartu.
- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, Uprava je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta Doma zdravlja u City kvartu raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7484/1 sa ponuđačem „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 30.12.2024. godine na iznos od 356.900,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta projektne dokumentacije raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 70.000,00€ bez pdv-a i donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke krajem marta.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2540/2 sa „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“, zaključen je 11.11.2025. godine na iznos od 39.930,00€.
- Nakon što je tehnološki projekat usaglašen sa Investitorom/Korisnikom - Ministarstvo zdravlja i ZU Dom zdravlja Glavni grad, na koji su isti dali pisanu saglasnost krajem juna 2025. godine, nastavilo se sa daljom izradom glavnog projekta.
- U toku su završne aktivnosti na izradi i reviziji glavnog projekta.
- U 2025. godini realizovano 180.290,84€.



5.5. **Rekonstrukcija objekata stare bolnice „Danilo I” na Cetinju**

- Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu od strane Ministarstva zdravlja utvrđeno je da je ista nepotpuna i da nije moguće pokrenuti javne nabavke za odabir izvođača radova i stručnog nadzora.
- Ministarstvo zdravlja je preuzelo obavezu dorade projektne dokumentacije.
- Nakon dostavljanja dopunjene dokumentacije od strane nadležnih organa, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti na raspisivanju javne nabavke za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.6. **Nabavka magnetne rezonance – „multislice scener”**

- Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala javno nadmetanje za nabavku magnetne rezonance (MRI) za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić (partija I) i nabavku multislajsnog skenera (CT) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore (partija II). Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.930.000€ bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/1 sa dobavljačem PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, za partiju II: nabavka multislajsnog 4D skenera (CT) je zaključen 30.07.2024. godine, na iznos od 422.290,00 Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Kliničkom centru Crne Gore.
- Postupak javne nabavke za partiju I: nabavku magnetne rezonance (MRI) za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić je poništen krajem novembra 2024. godine postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
- Javno nadmetanje za nabavku magnetnih rezonanci (MRI) za potrebe Opšte Bolnice Bijelo Polje i Opšte Bolnice Nikšić je ponovo raspisano u junu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.560.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.7. Centar PET CT sa klinikom za hematologiju

- Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore su 30.05.2023. godine dostavili Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju po predmetnom projektu. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu iste raspisala 31.05.2023. godine javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta. Kako na predmetno javno nadmetanje nije podnijeta nijedna ponuda isto je poništeno, nakon čega se pristupilo ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja 07.07.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6067/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.10.2023. godine, na iznos od 96.800,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, je zaključen 09.11.2023. godine, na iznos od 14.760,79€.
- Obaveza projektanta je da na osnovu Idejnog rješenja urađenog od strane „Ing Invest“ doo Danilovgrad na koje je prethodno dobijena saglasnosti korisnika – Klinički centar Crne Gore, kao i glavnog državnog arhitekta izradi Glavni projekat.
- Projektant je nakon analize postojećeg stanja objekta Klinike za onkologiju koji treba da se rekonstruiše za potrebe Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, obavijestio Upravu za kapitalne projekte i krajnjeg korisnika – Klinički centar Crne Gore, a o čemu je bilo upoznato i Ministarstvo zdravlja na prethodno održanim sastancima, o problematici na realizaciji ovog projekta.
- Dana 26.12.2023. godine projektant je putem dopisa zatražio pisanu saglasnost od strane korisnika – Klinički centar Crne Gore sa predlogom rješenja u smislu rušenja postojećeg objekta, odnosno sa totalnom rekonstrukcijom postojećeg objekta, na što je i dobijena saglasnost korisnika (dopis br. 03/01-37771/1 od 26.12.2023. godine).
- Nakon toga projektant je pristupio usaglašavanju Idejnog rješenja sa predstavnicima Kliničkog centra i ekspertima iz IAEA kako bi se uvažile sve potrebe, zahtjevi i sugestije u cilju što bolje i funkcionalnije organizacije prostora.
- Inovirano idejno rješenje na koje su dali saglasnost korisnik, kao i autor prvobitnog rješenja, u aprilu 2024. godine je poslato Državnom arhitekti na ponovni pregled i saglasnost.
- Nakon dobijanja saglasnosti Državnog arhitekta, krajem juna 2024. godine, stvorili su se uslovi za otpočinjanje aktivnosti na izradi glavnog projekta.
- Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
- U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije i nakon saglasnosti na istu od strane CEB-a, pristupiće se raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 70.420,79€.



5.8. Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav

- Projektну dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Plav.
- Uprava za kapitalne projekte je krajem decembra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 340.000,00 € bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je ponovljeno krajem februara 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4389/1 sa izvođačem radova, „R&R Invest” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.08.2024. godine na iznos od 530.994,88€.
- Ugovor br. 01-334/24-1993/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.04.2024. godine na iznos od 9.425,90€.
- Radovi su otpočeli u junu 2024. godine i zbog nastupajućeg zimskog perioda prekinuti su u novembru iste godine. Radovi su nastavljeni u 2025. godini, kada su se za to stvorili povoljni vremenski uslovi i isti su u završnoj fazi. Nakon rješavanja problematike vezane za priključenje na elektroenergetsku mrežu, stvoriće se uslovi za stavljanje objekta u funkciju.
- U 2025. godini realizovano je 301.497,13 €.



5.9. Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Ulcinj.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2022. godine objavila javno nadmetanje za odabir izvođača radova čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000,00 € bez pdv-a, koje je u junu poništeno iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.
- Nakon povećanja procijenjene vrijednosti radova od strane projektanta na iznos od 390.000,00 € bez pdv-a, raspisano je novo javno nadmetanje u novembru 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2505/1 sa izvođačem „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 411.399,98 € sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-3158/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 14.459,50€.
- Radovi su otpočeli početkom juna 2023. godine i isti su ubrzo obustavljeni zbog zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone i prisustva instalacija na lokaciji koja je predviđena za dogradnju objekta.
- Stručni nadzor i izvođač radova su zajednički konstatovali da na osnovu postojeće projektne dokumentacije nije moguće nastaviti i završiti radove na dogradnji Doma zdravlja u Ulcinju.
- Korisnik - Dom zdravlja Ulcinj je dostavio Upravi za kapitalne projekte dopunjenu projektну dokumentaciju, te su u januaru 2025. godine stvoreni uslovi za nastavak izvođenja radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na dogradnji Doma zdravlja u Ulcinju raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-42625-2689/1 sa izvođačem „Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 349.568,99€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2685/1 sa „Hill construction” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 7.623,00€.
- Radovi se odvijaju usporenom dinamikom zbog međuzavisnosti radova iz osnovnog ugovora i ugovora za dodatne radove.
- U 2025. godini realizovano je 159.190,69€.



5.10. Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koji je potpisalo i dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-1172/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.02.2023. godine, na iznos od 36.300,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
- Projektnom dokumentacijom je obuhvaćena adaptacija 56 osnovnih i srednjih škola za potrebe stomatoloških ambulanti i to u opštinama: Andrijevića, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje, Šavnik, Tivat, Tuzi i Ulcinj.
- Nakon što je završena izrada i revizija glavnog projekta pristupilo se raspisivanju javnog nadmetanja.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova na adaptaciji stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednosti 880.000,00€ bez pdv-a, je na zahtjev Ministarstva zdravlja raspisano krajem oktobra 2023. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje za odabir izvođača radova ponovljeno je u februaru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4390/1 sa izvođačem radova „Cema” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.08.2024. godine na iznos od 1.203.815,58€.
- Javno nadmetanje za odabir vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor 01-334/24-5417/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.09.2024. godine na iznos od 58.927,00€.
- Krajem novembra 2024. godine, nakon obavještenja od strane Ministarstva zdravlja da su se stekli uslovi za uvođenje izvođača u posao, otpočelo se sa izvođenjem radova i isti su u toku
- Nije moguće izvoditi radove u svih 56 škola.
- Problematiku rješava Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
- Javno nadmetanje za nabavku opreme za stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.020.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Radovi se odvijaju usporenom dinamikom zbog međuzavisnosti pojedinih pozicija radova sa

stomatološkom opremom.

- U 2025. godini realizovano je 286.392,71€.

5.11. Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koje je potpisala JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, a dostavilo Ministarstvo zdravlja, raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
- Ugovor br. 01-334/23-3633/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 19.06.2022. godine, na iznos od 93,589.87€.
- Ugovor br. 01-334/23-6407/1 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica, zaključen je 06.11.2023. godine, na iznos od 15.365,79 €.
- U prethodnom periodu sprovedene su aktivnosti na usaglašavanju idejnog rješenja sa stvarnim stanjem na terenu i potrebama Korisnika.
- Konačno usaglašeno idejno rješenje je u martu 2024. godine dostavljeno Državnom arhitekti na saglasnost.
- Nakon dobijanja saglasnosti Glavnog državnog arhitekta stvorili su se uslovi da projektant u avgustu 2024. godine otpočne izradu glavnog projekta.
- Nakon dobijanja saglasnosti Glavnog državnog arhitekta projektant je započeo izradu glavnog projekta.
- U toku su aktivnosti na reviziji glavnog projekta.
- Upravi za kapitalne projekte je u 2024. godini od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Bijelo Polje dostavljena projektna dokumentacija za sanaciju krova bolnice u Bijelom Polju.
- Javno nadmetanje za izvođenje radova procijenjene vrijednosti 402.000,00€ bez pdv-a raspisano je u avgustu 2024. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Nakon dostavljanja inovirane projektne dokumentacije od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Bijelo Polje, ponovo je raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova u decembru 2024. godine. Ugovor 01-334/25-1169/ sa "Volvox materials&construction" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.03.2025. godine na iznos od 725.979,31€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor 01-334/25-1196/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Sistem-mne” d.o.o. Podgorica, zaključen je 12.03.2025. godine na iznos od 9.922,00€.
- Radovi na sanaciji krova bolnice su u završnoj fazi.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg objekta bolnice u - dio lamele “C”, raspisano je krajem novembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 12.550.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora, raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 200.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini realizovano je 632.507,13€.



5.12. Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za izvođenje radova. Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja” d.o.o. Pljevlja, je zaključen 20.04.2023. godine na iznos od 525,868.49 €.
- Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa stručnim nadzorom, „Diagram” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine na iznos od 9,655.80€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine, a završeni su u septembru iste godine i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.13. Adaptacija Doma zdravlja Budva

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Budva krajem 2023. godine raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 850.000.00 bez pdv-a
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude donešena je krajem marta tekuće godine, na koju je uložena žalba i postupak je poništen u junu mjesecu.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-82/1 sa „Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 14.01.2025. godine na iznos od 1.123.424,48€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3429/1 sa stručnim nadzorom „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.06.2024. godine na iznos od 15,651.35€.
- Izvođač je uveden u posao krajem marta 2025. godine i radovi su u toku.
- U 2025. godini realizovano je 398.819,76€.



5.14. Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 09.12.2022. godine javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.
- Ugovor br. 01-334/23-1497/1 sa izvođačem radova „Tehnogradnja“ d.o.o. Pljevlja, je zaključen 13.03.2023. godine na iznos od 861,828.51€.
- Ugovor br. 01-334/23-2818/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 17,194.10€.
- Radovi su otpočeli u junu 2023. godine, a završeni su u avgustu iste godine i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 4.000,00€.

5.15. Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju

- Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju kako bi Ministarstvo javnih radova pokrenu aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.16. Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi

- Uprava za kapitalne projekte je krajem avgusta 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju procijenjene vrijednosti 296.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije bilo ispravnih ponuda.
- Javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4931/1 sa dobavljačem "Inter pharm" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.09.2024. godine na iznos od 358.160,00€.
- Transfuziomobil je predat Korisniku – Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore u decembru 2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 358.160,00€.



5.17. Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi

- Uprava za kapitalne projekte je sredinom oktobra 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, po partijama, ukupne procijenjene vrijednost 642.000,00 € bez pdv-a.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/1 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju II: Automatski brojač rezidualnih leukocita je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 58.927,00€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1854/2 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju III: Oprema za kolekciju i procesiranje jedinica krvi je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 234.800,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predata na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.

- Ugovor br. 01-334/24-1854/2 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, za partiju IV: Aparati za suvo otapanje krvnih komponenti je zaključen 11.04.2024. godine, na iznos od 234.800,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-2095/1 sa dobavljačem, „Famegra” d.o.o. Podgorica, za partiju V: Uređaj za automatsku izolaciju DNK sa automatskim uzimanjem uzorka pune krvi iz epruveta vakutajner sistema je zaključen 23.04.2024. godine, na iznos od 57.830,99€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1809/1 sa dobavljačem, „Medica” d.o.o. Podgorica, za partiju VI: Real-time qPCR analizator. je zaključen 10.04.2024. godine, na iznos od 29.221,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Ugovor br. 01-334/24-1982/1 sa dobavljačem, „Farmalab” d.o.o. Podgorica, za partiju VII - Thermal Cycler je zaključen 10.04.2024. godine, na iznos od 17.363,50€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi
- Donešene su odluke o poništenju postupka javne nabavke za partiju I: Centrifuga za izdvajanje krvnih komponenti, partiju VIII - Sistem za horizontalnu elektroforezu i partiju IX: Oprema za banku matičnih ćelija.
- Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi - Oprema za banku matičnih ćelija raspisano je ponovo 30.04.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5651/1 sa dobavljačem, „Inter pharm” d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2024. godine, na iznos od 198.433,95€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi - Centrifuga za izdvajanje krvnih komponenti ponovo je raspisano u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-408/1 sa „Farmalab” d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.05.2025. godine na iznos od 90.544,30€. Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena i predana na korišćenje Zavodu za transfuziju krvi.
- U 2025. godini realizovano je 90.544,30€.

5.18. Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koje je dostavio Zavod za hitnu medicinsku pomoć krajem oktobra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju, procijenjene vrijednosti 500.000,00 € bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Javno nadmetanje je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-3814/1 sa izvođačem radova “Refena” d.o.o. Podgorica, zaključen je 05.07.2024. godine na iznos od 678.576,65€.
- Ugovor br. 01-334/24-3516/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 20.06.2024. godine na iznos od 21.780,00€.
- Završeni su radovi na adaptaciji jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Baru, Nikšiću, Budvi, Beranama. U Bijelom Polju, otpočeće se sa izvođenjem radova nakon obavještenja od krajnjeg Korisnika da su stvoreni uslovi za uvođenje izvođača u posao.
- U 2025. godni realizovano je 608.377,82€.



5.19. Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine, procijenjene vrijednosti 523.660,6€ i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanja za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 625.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.20. Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore krajem 2023. godine raspisala javno nadmetanje za nabavku linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore. Ugovor br. 01-334/24-4081/1 sa dobavljačem PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 3.802.304,00€.
- Medicinska oprema koja je predmet ugovora je isporučena Kliničkom centru Crne Gore sredinom jula 2025. godine.
- U 2025. godni realizovano je 3.802.304,00€.



5.21. Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece

- Rekonstrukcija i dogradnja centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece predstavlja sastavni dio Univerzitetskog kliničkog centra i biće realizovana u sklopu istog.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.22. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, opremanje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zdravstvenih objekata. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta, donacija i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.

Izgradnja novog Urgentnog centra i dnevne bolnice OB Berane

- Nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi inoviranu projektnu dokumentaciju, Ministarstvo javnih radova će preuzeti dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Rekonstrukcija operacionog bloka OB Berane

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva zdravlja preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javna nadmetanja za izbor izvođača radova raspisivna su u oktobru 2024. i januaru 2025. godine procijenjene vrijednosti 658.205,1€ i ista su poništena.
- Nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi inoviranu projektnu dokumentaciju, Ministarstvo javnih radova će preuzeti dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija i modernizacija operacionog bloka i jedinice intezivnog liječenja u SB Risan

- Nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi dokumentaciju Ministarstvu javnih radova, isto će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Nova zgrada Zavoda za HMP Podgorica

- Nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi dokumentaciju Ministarstvu javnih radova, isto će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Adaptacija objekta za potrebe Nacionalnog centra za dijagnostiku dojke u sklopu KCCG

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem juna 2025. godine, procijenjene vrijednosti 840.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2683/4 sa sa izvođačem radova „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 19.11.2025. godine na iznos od 949.591,00€.
- Ugovor sa „Genesis projekt“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.11.2025. godine na iznos od 15.548,50€.
- Nakon obavještenja Kliničkog centra Crne Gore da su stvoreni uslovi za uvođenje izvođača u posao, otpočeće se sa izvođenjem radova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija odjeljenja pedijatrije OB Nikšić

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2690/1 sa izvođačem radova „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 477.814,00€.
- Ugovor br. 01-334/25-3197/1 sa „Nik com“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 11.12.2025. godine na iznos od 7.018,00€.
- Nakon obavještenja JZU OB Nikšić da su stvoreni uslovi za uvođenje izvođača u posao, otpočeće se sa izvođenjem radova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija Doma zdravlja Andrijevica

- Nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi inoviranu projektnu dokumentaciju, pristupiće se raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Onkološka dnevna bolnica u Bijelom Polju

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 270.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.23. Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici

- Univerzitetski klinički centar u Podgorici predstavlja strateški zdravstveni infrastrukturni projekat zasnovan na savremenom medicinskom konceptu i novom rasporedu funkcionalnih cjelina, sa ciljem uspostavljanja centralne, visokospecijalizovane ustanove koja objedinjuje kliničku praksu, edukaciju i istraživanje. Projekat se realizuje kroz fazno planiranje, pri čemu trenutna faza obuhvata idejno rješenje i definisanje obima radova, uz jasno razgraničenje između postojećih objekata koji se zadržavaju i novih sadržaja koji se razvijaju. Ključni fokus je na izgradnji novih kapaciteta i unapređenju funkcionalnosti kompleksa bez rekonstrukcije glavne zgrade postojećeg kliničkog centra, uz paralelno sprovođenje pripremnih radova koji uključuju čišćenje terena, uklanjanje postojećih struktura i preusmjeravanje infrastrukture, čime se stvaraju uslovi za nesmetanu realizaciju glavnih građevinskih aktivnosti.
- Glavni radovi obuhvataju sve segmente savremenog bolničkog kompleksa, uključujući izgradnju objekata sa kompletnim konstrukcijskim sistemom, razvijenu eksternu infrastrukturu i uređeno okruženje sa pristupnim saobraćajnicama, parkingom i pejzažnim rješenjima. Poseban akcenat stavljen je na visok standard omotača zgrade, energetska efikasnost i integraciju savremenih tehničkih sistema, uključujući HVAC, vodovod i kanalizaciju, elektroenergetske sisteme srednjeg i niskog napona, kao i napredne sisteme zaštite od požara. Medicinski aspekt projekta dodatno je osnažen implementacijom kompleksnih sistema medicinskih gasova i specifičnih instalacija neophodnih za rad operacionih sala, laboratorija i intenzivne njege, čime se osigurava usklađenost sa međunarodnim standardima zdravstvene infrastrukture.
- Projektom je predviđena i integracija savremenih digitalnih i komunikacionih sistema, uključujući mrežnu infrastrukturu, sigurnosne sisteme, nadzor i kontrolu pristupa, čime se omogućava efikasno upravljanje objektom i unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Istovremeno, jasno su definisani elementi koji nijesu obuhvaćeni projektom, poput određenih eksternih energetske priključaka i dijela IT opreme, što ukazuje na potrebu za dodatnom koordinacijom sa relevantnim institucijama i dobavljačima. Ukupno posmatrano, Univerzitetski klinički centar je koncipiran kao kompleksan, integrisani zdravstveni sistem koji treba da odgovori na dugoročne potrebe zdravstvenog sistema Crne Gore, unaprijedi dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, te pozicionira Podgoricu kao regionalni medicinski centar.
- Ukupni bolnički kapacitet Univerzitetskog kliničkog centra koji je projektovan na 65 000 m² sa preko 550 stacionarnih kreveta u standardnim odjeljenjima, uz dodatne specijalizovane kapacitete intenzivne njege, dnevne bolnice i dijagnostike, što ukupno daje kompleks visoke tercijarne zdravstvene ustanove kao i kompleks koncipiran kao integrisani zdravstveni, obrazovni i istraživački centar regionalnog značaja.
- Finansijska sredstva za realizaciju projekta planirana su kroz kreditni aranžman sa francuskom BPI bankom, a na osnovu međudržavnog sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske. U toku su aktivnosti na odabiru izvođača kao i aktivnosti na izmjenama urbanističkog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.24. Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj bolnici Bijeloj Polje

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova. Nakon sagledavanja iste, Ministarstvo će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.25. Sistem grijanja i hlađenja u JZU „Dom zdravlja Cetinje”

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju 2025. godine. Ministarstvo javnih radova nije moglo pokrenuti procedure iz svoje nadležnosti prije usvajanja Zakona o budžetu za 2026. godinu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.26. Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma zdravlja u Rožajama raspisano je u novembru 2025. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 250.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji Doma zdravlja u Tivtu (adaptacija laboratorija za mikrobiologiju i biohemiju) raspisano je krajem oktobra 2025. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji Doma zdravlja u Tivtu, procijenjene vrijednosti 160.000,00€ bez pdv-a, raspisano je u decembru 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.27. Rekonstrukcija i adaptacija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova u novembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 620.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.


5.28. Adaptacija prostorija u OB Bar za potrebe programa Baby Friendly

- Ministarstvo zdravlja je dostavilo projektnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova. Nakon sagledavanja iste, Ministarstvo će preuzeti aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.29. Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku

- Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva zdravlja i Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić” Brezovik, Nikšić, raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 160.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno zbog neispravnosti ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-306/1 sa "La collina inženjering" Podgorica, zaključen je 27.01.2025. godine na iznos od 185.801,32€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1375/1 sa "N&b inženjering i konsalting" d.o.o. Nikšić, zaključen je 24.03.2025. godine na iznos od 4.356,00€.

- Izvođač je uveden u posao 08.07.2025. godine.
- Radovi su u završnoj fazi.
- U 2025. godini realizovano je 187.365,23€.

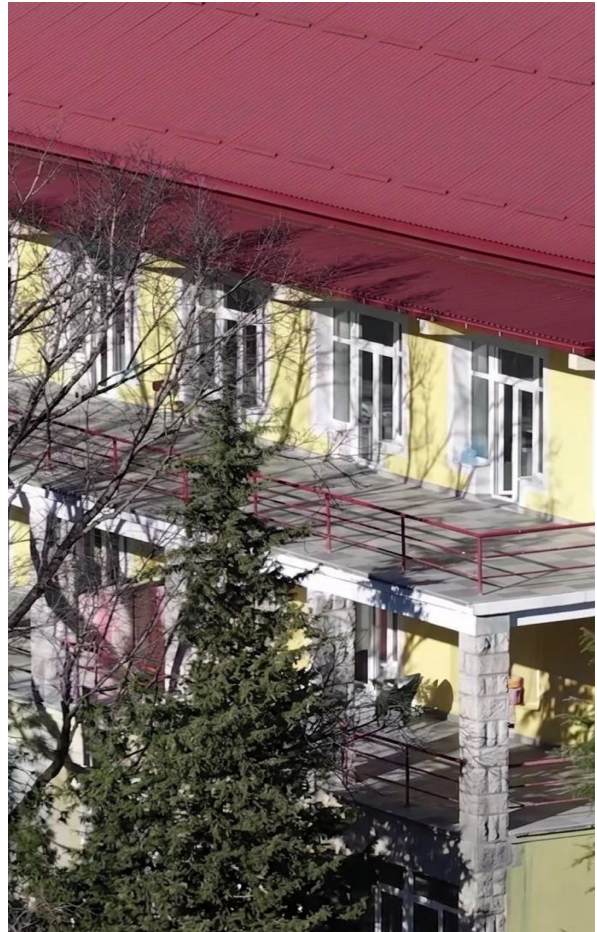

5.30. Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšiću

- Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva zdravlja i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisivano je u avgustu i oktobru 2024. godine, a zatim i u aprilu, avgustu i novembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 270.000,00€ bez pdv-a i ista su poništena iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.31. Adaptacija DZ Kolašin

- Nakon što je Upravi za kapitalne projekte dostavljena projektna dokumentacija po predmetnom projektu, ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji prostorija Doma zdravlja u Kolašinu, raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 260.000,00 bez pdv-a i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je krajem decembra 2024. godine procijenjene vrijednosti 7.900,00 bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanja za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2025. godine i u decembru je donešena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

5.32. Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić


- Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Nikšić i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 590.000,00€ raspisano je u julu 2024. godine i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7164/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 20.12.2024. godine na iznos od 700.767,14€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-693/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.02.2025. godine na iznos od 5.868,50€.
- Izvođač radova je uveden u posao u martu 2025. godine.
- Aneks ugovora br. 01-334/25-2247/1 sa izvođačem radova zaključen je 03.10.2025. godine na iznos od 796.584,55€. €.
- U toku su radovi na adaptaciji postojećeg prostora i opremanju.
- U 2025. godini realizovano je 350.555,05€.



POTPROGRAM

**4.b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR
ZDRAVSTVO**

5.33. Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

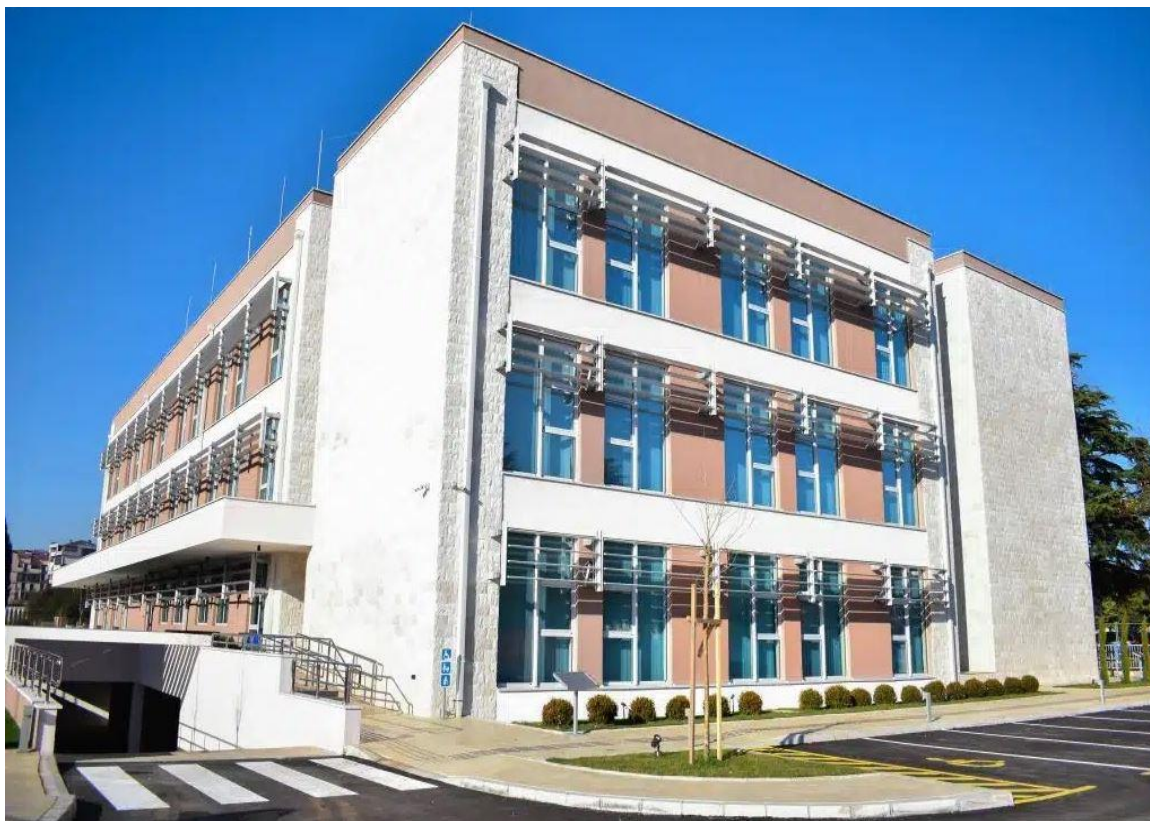

- Projektom je obuhvaćena izgradnja objekta spratnosti su + pr + 2 sprata u kome će biti smještena Klinika za infektivne bolesti i Klinika za dermatovenerologiju. Ukupna površina koja obuhvata građevinsko područje iznosi 5.530.59m².
- Ugovorom je predviđena i nabavka medicinske opreme za potrebe potpune funkcionalnosti objekta.
- Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra.
- Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontorulu i ista je odobrena u decembru 2021. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.06.2022. godine, a javno otvaranje ponuda je održano 30.06.2022. godine. Nakon završene evaluacije ponuda i odobrenja izvještaja rada Evaluacione komisije od strane EU Delegacije, zaključen je Ugovora sa odabranim izvođačem radova.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3577/1 je zaključen 07.10.2022. godine na iznos od 8.492.468,22€.
- Svi radovi su završeni i objekat je pušten u rad.
- Nakon isteka garantnog roka od godinu dana, sve aktivnosti su završene.
- U 2025. godini realizovano je 1.654.563,17€.

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore

- Nakon odobrenja najave za tendersku proceduru od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegacije na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine. Pripremni sastanak i otvaranje ponuda je održano 21.02.2022. godine. Evaluacioni izvještaj je 11.05.2022. odobren od strane EU Delegacije.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija je poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 18.07.2022. godine, a otvaranje ponuda je održano 19.07.2022. godine.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/SER/01-908/22-4381/1 je zaključen 01.12.2022. godine na iznos 335.750,00€ sa kompanijom „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“ u konzorcijumu sa „Genesis project d.o.o. Podgorica“, dok je Addendum br.1 Ugovora potpisan 19.07.2023. godine.
- Četvrti privremeni izvještaj je odobren.
- Sve aktivnosti su završene.

5.34. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija

- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/adaptacija i nabavka opreme za odabrane mikrobiološke laboratorije: Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, JZK Budva, JZZC Cetinje, JZK Ulcinj,
- Radovi koji se izvode odnose se na arhitektonsko/građevinske radove, vodovod/kanalizaciju, montažu mašinske (HVAC) opreme, elektro instalacija itd. u zavisnosti od uslova za buduću isporuku specijalizovane opreme.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-5156/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na

iznos od 1.191.479,82€.

- Ugovoreni rok izvođenja radova je 9 mjeseci.
- Izvođač je uveden u posao 17.02.2023. godine.
- Period implementacije ugovora bio je produžen do 15.02.2024. godine.
- Radovi su završeni, kao i garantni rok od godinu dana.
- U 2025. godini realizovano je 117.571,52€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije/adaptacije mikrobioloških laboratorija

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-4842/1 je zaključen 30.11.2022. godine sa ugovaračem „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, na iznos od 49.999,95€.
- Inicijalni rok implementacije za realizaciju ugovora je 21 mjesec.
- Sve aktivnosti su završene.

Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških potreba

- Projektom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije : Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, - PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, PZK Budva, JZKC Cetinje, JZK Ulcinj
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SUP/01-908/22-5074/1 je zaključen 02.12.2022. godine sa ugovaračem PDG DOO, na iznos od 839.864,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
- Nalog za početak perioda implementacije je izdat 01.03.2023. godine.
- Sva oprema je isporučena, instalirana i prihvaćena u skladu sa ugovorom.

5.35. Radovi na izgradnji operativnog centra

Izvođenje radova na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
- Ugovorom je predviđena izgradnja javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije za potrebe Instituta za javno zdravlje. Planirana spratnost objekta je Po+P+2. Bruto razvijena površina objekta je 1506,48 m², a neto površina 1318,38 m².
- Glavni projekat je izrađen od strane Instituta za javno zdravlje.
- Tenderska dokumentacija je objavljena 30.03.2022. godine.
- Rok za dostavljanje ponuda je bio 30.05.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 03.06.2022.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Nakon ex-ante kontrole pripremljenog Ugovora od strane EU Delegacije, isti će biti potpisan sa odabranim Ugovaračem.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3495/1 je zaključen 27.09.2022. godine na iznos od 2.144.491,25€. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Rok implementacije ugovora je bio produžen do 31.03.2024. godine.
- Radovi su završeni, kao i garantni rok od godinu dana.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije

- Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
- U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslata odabranim firmama 31.05.2022. godine.

- Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
- Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena 28.09.2022. godine.
- Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 24 mjeseca.
- Ugovor je bio produžen do 18.06.2025. godine, kako bi se uskladio garantni rok sa ugovorom o radovima.
- Sve aktivnosti su završene.



PROGRAM

VI. UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

POTPROGRAM

**6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG
PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA**

6.1. Izgradnja objekta za potrebe UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

- U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.
- U decembru 2014. godine usvojen je drugi Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, prioritet je razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih finansijskih sredstava putem zajma CEB-a.
- Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova UIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.
- Konsultantske usluge za izradu tehničke i druge dokumentacije su finansirane grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000,00 €.
- U skladu sa glavnim projektom, predračunska vrijednost izvođenja radova i opremanja objekta je vrijednosti 29.699.885,48€. Procijenjena vrijednost realizacije pratećih infrastrukturnih komponenti projekta (rekonstrukcija pristupnog puta, regulacija rijeke Tare, izgradnja trafostanice sa dovodnim kablom i izgradnja vodovodne mreže za potrebe zatvora) iznosi 7.000.000,00€.
- Ukupna vrijednost realizacije svih projekata iznosi apriksimativno 37.000.000,00€. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. decembra 2022. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00€.
- U toku je revizija glavnog projekta zatvora, kojim koordinira Ministarstvo pravde, kao i aktivnosti na projektovanju i reviziji pratećih infrastrukturnih komponenti projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja infrastrukture za potrebe objekta UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV i priključnog 10 kV kablovskog voda

- Ugovor br.01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Diagram" d.o.o. Podgorica zaključen je 27.04.2023. godine na iznos 9.619,50€.
- Ugovor br. 01-334/23-5759/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 06.10.2023. godine na iznos 8.470,00€.
- Potrebna izmjena Odluke o izgradnji objekta od opšteg interesa od strane Opštine Mojkovac, kako bi se završila revizija glavnog projekta.

Izgradnja nove hidrotehničke infrastrukture na trasi od izvorišta Gojakovići do objekta UIKS-a

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije raspisano je 04.08.2023.

godine. Ugovor br. 01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta "Ingenium" d.o.o. Podgorica zaključen je 16.10.2023. godine na iznos 17.477,24€.

- Ugovor br. 01-334/23-5707/1 sa revidentom glavnog projekta "Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 8.470,00€.
- Revizija glavnog projekta je završena u martu 2024. godine.

6.2. Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija

- Ugovor sa turskom firmom „Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company” je potpisan 20.04.2022. godine. Ugovor se sastojao iz dvije faze: Prva faza koja je uspješno završena je podrazumijevala izradu tenderske dokumentacije za 4 LOTA u oblasti pravosuđa. Druga faza podrazumijeva stručni nadzor nad izvođenjem radova za ugovorena 2 LOTA: LOT2 - Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu i LOT1 - Izvođenje radova na objektima (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica) za potrebe UIKS-a.
- Vrijednost ugovora je 678.850,00€ sa rokom implementacije od 43 mjeseca.
- U toku je druga faza realizacije ugovora koja se odnosi na nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i adaptaciji 7 objekata sudstva, kao i 4 objekta u kompleksu UIKS-a.
- U 2025. godini realizovano je 284.549,32€.

POTPROGRAM

**5. b. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR
PRAVOSUĐE**

6.3. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata pravosuđa



- Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
- Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
- Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrtu projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 potpisan je 30.11.2022. godine sa konzorcijumom LD „Gradnja” d.o.o., „Ramel” d.o.o., „Eurozox” d.o.o. i „Ening” d.o.o. na iznos od 3.434.508.01€.
- Izvođač je 22.03.2023 zvanično uveden u posao.
- Istog dana počeli su radovi na Osnovnom sudu u Kotoru i Nikšiću, a nakon toga i radovi na Osnovnom sudu u Podgorici, Osnovnom sudu u Beranama i Osnovnom i Višem sudu u Bijelom Polju.
- Radovi na svim sudovima su završeni. Nakon isteka garantnog roka, sve aktivnosti su završene
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

6.4. Komplex UIKS u Danilovgradu



- Ugovor br. CPA/MNE/IPAI/CAP18/WKS/01-908/22-4763/1 zaključen je sa „Fidija“ d.o.o. 01.12.2022. godine, na iznos od 13.809.971,09 €.
- Radovi se odnose na izgradnju sljedećih objekata: multifunkcionalni objekat, specijalna zdravstvena ustanova, prijavnica i otvoreni zatvor.
- Konstantovano je obilaskom parcele na kojoj će se izvoditi radova da se na istoj nalazi dalekovod koji je potrebno izmjestiti zbog potreba nesmetanog izvođenja radova.
- Projekti, kao i revizija istih za izmještanje dalekovoda od 10 kv i 35 kv su kompletirani. Izmještanje se jednim dijelom vrši na privatnoj parceli. Ministarstvo pravde u saradnji sa nadležnim institucijama i stranama uključenim u projektu je ušlo u proceduru sprovođenja javnog interesa kako bi se sprovela eksproprijacija nepokretnosti i omogućilo nesmetanje odvijanje radova.
- Nakon završetka elaborata eksproprijacije kao i procjene nepokretnosti, na sjednici Vlade donešen je zaključak o proglašenju javnog interesa.
- Radovi na relokaciji 10kv dalekovoda su završeni, kao i povezivanje na elektroenergetsku mrežu. Nakon relokacije 10kv dalekovoda, radovi na izvođenju predmetnih objekata su nastavljeni, osim objekta prijavnice koja je uslovljena relokacijom 35kv dalekovoda. Za početak izvođenja radova na relokaciji 35Kv dalekovoda, predat je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
- Kako se zbog pomenutih dalekovoda radovi nisu mogli odvijati u punom kapacitetu na svim objektima, rok je produžen do 02.12.2026.
- U 2025. godini realizovano je 1.326.307,61€.

PROGRAM
VII. JAVNA BEZBIJEDNOST

POTPROGRAM

**6. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG
PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBIJEDNO**

7.1. Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju

- Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteran, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
- Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
- u suteranu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
- u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
- na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
- u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
- na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
- Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, "Nikola" d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
- U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova je preuzelo obavezu rješavanja spornih pitanja sa privatnim licima.
- Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica,
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 200.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7429/1 sa izvođačem radova "Tehnogradnja" d.o.o. Pljevlja, zaključen je 27.12.2024. godine na iznos od 358.846,14€.
- Javno nadmetanje za izbor vršica stručnog nadzora nad izvođenjem radova II faze raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6939/1 sa stručnim nadzorom "Ingenium" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.12.2024. godine na iznos od 9.196,00€.
- Radovi II faze odnose se na uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem, kao i sve preostale radove neophodne za stavljanje objekta u funkciju.
- Svi radovi su završeni. U toku je sagledavanje izvedenih radova od strane krajnjeg korisnika – Ministarstva unutrašnjih poslova, kojem je dostavljena dokumentacija za sprovođenje tehničkog prijema objekta.
- U 2025. godini realizovano je 347.199,11€.



PROGRAM

VIII. FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

POTPROGRAM

**7a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG
PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE**

8.1. Izgradnja objekata za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-6009/1 od 27.12.2022. godine zaključen je sa privrednim društvom „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad na iznos od 2.897.336,33€.
- Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora raspisano u maju 2022. godine poništeno je 13.12.2022. godine budući da nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Krajem decembra 2022. godine ponovo je pokrenuta procedura odabira stručnog nadzora za predmetni objekat. Ugovor br. 01-334/23-1502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.03.2023. godine na iznos od 62.920,00€.
- Svi radovi su završeni. U toku je otklanjanje nedostataka na primjedbe komisije za tehnički pregled objekta. Navedeni nedostaci nijesu bili predmet ugovorne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na izmještanju instalacija toplovoda, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Golubovcima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1120/1 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 07.03.2025. godine na iznos od 98.388,33€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-627/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.02.2025. godine na iznos od 5.082,00€.
- U toku su pripremni radovi i geodetska snimanja na terenu.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



8.2. Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.200.000,00€.
- Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5249/1 od 30.11.2022. godine sa privrednim društvom „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad na iznos od 2.177.994,12€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.05.2022. godine. Procijenjena

vrijednost iznosi 66.000,00€. Ugovor br. 01-334/22-5762/1 godine sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2022. na iznos od 79.860,00€.

- Početkom izvođenja predmetnih radova od strane svih uključenih u realizaciju projekta, utvrđeno je postojanje podzemnih instalacija elektro-energetske infrastrukture na lokaciji izgradnje objekta, čije izmještanje se sprovodi prema procedurama CEDIS-a i za čije izmještanje je potrebna saglasnost nadležne institucije, kao i brojni nedostaci u projektnoj dokumentaciji koji za posljedicu imaju produžetak roka završetka izvođenja radova. Kako do prolongiranja izvođenja radova nije došlo krivicom izvođača, a što je potvrđeno i izjašnjenjem stručnog nadzora, zaključen je anex ugovora za produžetak roka.
- Svi radovi su završeni. U toku je otklanjanje nedostataka na primjedbe komisije za tehnički pregled objekta. Navedeni nedostaci nijesu bili predmet ugovorne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

8.3. Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo odbrane.

8.4. Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni „Pero Četković” u Baru

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Lokacija objekta je u kasarni „Pero Četković u Baru. Komanda Mornarice Vojske Crne Gore je spratnosti Pr + 2, ukupne bruto površine 2.099,85m². Na nivou prizemlja i prvog sprata su prostorije za potrebe Komande Mornarice Vojske Crne Gore, a drugi sprat je predviđen za potrebe Mornaričkog operativnog centra (MOC).
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u Baru, raspisano je 12.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4884/1 sa izvođačem radova, Konzorcijumom „Fidija” d.o.o. Podgorica i „Termomont” d.o.o. Beograd, je zaključen 25.08.2023. godine, na iznos od 11.510.352,82€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-6902/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.12.2023. godine, na iznos od 181.500,00€.
- Na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Ministarstva odbrane, izvođač je uveden u posao 06.12.2023. godine.
- Završeni su svi ugovoreni radovi i u toku je obuka korisnika, nakon čega će se izvršiti tehnički pregled objekta, pribaviti upotrebna dozvola i izvršiti primopredaja korisniku.
- U 2025. godini realizovano je 3.182.799,05€.



8.5. Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni „Breza” u Kolašinu

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-5752/1 sa izvođačem radova „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 766.057,98€.
- Aktivnosti na ugovaranju stručnog nadzora sprovelo je Ministarstvo odbrane.

- Radovi su obustavljeni u martu 2024. godine zbog nepredviđenih okolnosti u postojećem stanju objekta. Izvršena je izmjena projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane
- Javno nadmetanje za dodatne radove na rekonstrukciji objekta KN-2 u kasarni „Breza“, u skladu sa izmijenjenom projektnom dokumentacijom, raspisano je u aprilu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1706/2 sa sa izvođačem radova „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.09.2025. godine na iznos od 160.784,14€.
- Radovi su nastavljeni u oktobru 2025. godine i isti su u toku.
- U 2025. godini realizovano je 117.847,89€.

8.6. Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni „Vladimir Knežević Voloda“ u Pljevljima

- Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2023. godine. S obzirom da na navedenom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, isto je ponovljeno u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4079/1 sa izvođačem radova „Tehnogradnja“ d.o.o. Pljevlja, zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 1.136.521,58€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5411/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.09.2024. godine na iznos od 45.980,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao u oktobru 2024. godine
- Svi radovi su završeni u decembru 2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 636.512,15€.



8.7. Izgradnja nove zgrade u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu

- U 2024. godini je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane, te je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br.

01-334/25-1354/1 sa izvođačem radova „Fidija” d.o.o. Podgorica, zaključen je 21.03.2025. godine na iznos od 5.079.581,9€.

- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor 01-334/25-637/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2025. godine na iznos od 93.654,00€.
- Izvođač je uveden u posao u julu 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 1.680.981,23 €.

8.8. Izgradnja hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni „Vladimir Knežević Voloda” u Pljevljima

- U julu 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane i ista je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u novembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.355.611,5€ i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2025. godine i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izgradnjom hangara raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 50.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM
IX. SOCIJALNA ZAŠTITA

POTPROGRAM

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

- Na objektu su završeni svi radovi. Pimopredaja objekta je izvršena 28.02.2023. godine.

8.1. Projekat izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

- Opštine Bar dostavila je Upravi za kapitalne projekte je revidovani glavni projekat.
- Objekat je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni "ŠS", u zahvatu DUP-a "Polje Zaljevo".
- Objekat je projektovan sa spratnošću Pr+1. Ukupna bruto površina prizemlja iznosi 442,45m², dok bruto površina sprata iznosi 509,0m². Na prizemlju između ostalog su prdviđene sljedeće prostorije: senzorna soba, igraonica, dvije sobe za edukativne aktivnosti, trpezarija, kuhinja. Na spratu se nalaze prostorije za fizikalnu terapiju, kancelarije psihologa, defektologa, logopeda, sala za sastanke.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisano je u Ugovor br. 01-334/23-3861/1 sa izvođačem radova „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, zaključen je 03.07.2023. godine na iznos od 1.633.938,61€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je decembru 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-5914/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 25.935,14€.
- Izvođač je uveden u posao 22.11.2023. godine.
- U toku su građevinsko zanatski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, radovi na elektroinstalacijama jake i slabe struje, kao i radovi na mašinskim instalacijama.
- Potpisan je aneks 2 ugovora za produženje roka, br. 01-077/25-1072/5 sa izvođačem radova „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, od 05.03.2025. godine u trajanju do 01.06.2025. godine.
- Usljed izmjene projekta došlo je do produženja ugovorenog roka za izvođenje objekta.
- Potpisan aneks za produženje roka, projektant dostavio izmjene glavnog projekta.
- U 2025. godini realizovano je 606.200,19€.

8.2. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

8.3. Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

- Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na dogradnji dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 505.000€ bez pdv-a , na kojem nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je ponovljeno u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1658/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 03.04.2024. godine na iznos od 876,534.1€.
- Ugovor br. 01-334/24-1596/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 26.620,00€.
- Izvođač je uveden u posao sredinom juna 2024. godine i radovi su u toku.
- U 2025. godini realizovano je 269.545,53€.

8.4. Izgradnja Doma starih u Plavu

- Investitor je Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, koje je Upravi za kapitalne projekte dostavilo revidovani glavni projekat.
- Prema zahtjevu investitora objekat je spratnosti Su, P i 3 sprata. Ukupna neto površina objekta je 2.308,71m², a bruto površina 2.885,81m². Na tri sprata u 46 smještajnih jedinica ukupno je predviđeno 64 korisnika. Na I spratu je predviđeno 11 smještajnih jedinica za ukupno 16 korisnika, od toga 1 apartman, 6 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe, pratećim holom za boravak, prostor za medicinsko osoblje. Na II spratu je predviđeno 12 smještajnih jedinica za ukupno 22 korisnika, od toga 1 apartman, 9 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe sa pratećim holom za boravak. Na III spratu je predviđeno 13 smještajnih jedinica, od toga 1 apartman, 10 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe kao i prethodni spratovi sadrži stacionar za nepokretna i hendikepirana lica, hol za zajednički boravak sa mini kuhinjom i ostavom za čisto i prljavo rublje. Vertikalne komunikacije u objektu su tako projektovane da povezuju sve etaže objekta i sastoje se od javnog stepeništa kao i putničkog i bolničkog lifta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5395/1 izvođača radova „LD-gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 06.12.2022. godine, na iznos od 2.854.847,49€.



- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.10.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5389/1 sa „Projectman“ d.o.o. iz Podgorice, zaključen je 06.12.2022. na iznos od 21.767,90€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
- Zbog nepostojanja elektroenergetske infrastrukture, nije moguće postići punu funkcionalnost objekta.
- U koordinaciji sa drugim učesnicima u realizaciji projekta, Ministarstvo javnih radova je pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti na prevazilaženju predmetne problematike (aneks III sa produženim rokom za završetak radova do avgusta 2026. godine).
- U 2025. godini realizovano je 1.000.000,00€.

8.5. Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku

- Opština Šavnik je u julu 2024. godine dostavila Upravi za kapitalne projekte revidovan glavni projekat, a kako bi Uprava za kapitalne projekte sprovela aktivnosti iz svojih nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano je u oktobru 2024. godine, zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju donešena je Odluka o poništenju postupka.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-755/1 sa „Marting project“ d.o.o. Podgorica zaključen je 18.02.2025. godine na iznos od 17.224,35€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1370/4 sa „Stambeno“ d.o.o. Nikšić zaključen je 07.08.2025. godine na iznos od 1.307.347,50€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u septembru 2025. godine.
- Završeni su radovi na iskopu i nasipu tamponskim slojem ispod temelja objekta, kao i svi armirano betonski radovi na konstrukciji objekta. Gradilište je konzervirano uslje nastupajućeg zimskog perioda. Radovi će biti nastavljeni kad se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
- U 2025. godini realizovano je 501.776,02€.

PROGRAM

X. INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

POTPROGRAM

9. a. RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

- Ministarstvo javnih radova je sa Prijesticom Cetinje zaključilo Ugovor o realizaciji programa „Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Ministarstvo javnih radova vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
- U 2025. godini realizovano je 10.292.595,25€.

10.1. Izgradnja sportske hale na Obilića poljani

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

10.2. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 154.172,58€.

10.3. Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

10.4. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 1.591.670,04€.

10.5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 429.823,91€.

10.6. Unapređenje turističke ponude grada

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 890.406,82€.

10.7. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 2.880.956,53€.

10.8. Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 1.192.894,50€.

10.9. Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 907.524,96€.

10.10. Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju

- Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
- U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave za kapitalne projekte. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.

- Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih viškova radova. U toku je definisanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijesticom Cetinje.
- Početkom 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova na izgradnji tribinskih prostora i izvođeni su radovi na uređenju terena. Takođe, korisnik je inovirao zahtjeve vezane za izradu terena za igru i dodatne zahtjeve na izvedenim instalacijama u cilju ekonomičnosti objekta tokom njegove eksploatacije. Krajem 2022. godine definisane su neophodne aktivnosti za završetak radova na objektu i raspisan je poziv za javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova.
- Na osnovu usaglašavanja zahtjeva krajnjeg korisnika pripremljena je tehnička dokumentacija i u julu 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača dodatnih radova na izgradnji fudbalskog stadiona, procijenjene vrijednosti 1.321.000,00€ na kom nije bilo pristiglih ponuda.
- U decembru 2023. godine ponovljen je tenderski postupak. Ugovor br. 01-334/24-1630/1 sa izvođačem dodatnih radova „Ramel“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 02.04.2024. godine na iznos od 1.597.203,15€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem dodatnih radova raspisano je krajem jula 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3998/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.07.2024. godine na iznos od 48.400,00€.
- Svi ugovoreni radovi su završeni osim radova na iscrtavanju terena i ugradnji golova.
- U toku su pripreme aktivnosti za tehnički pregled objekta.
- U 2025. godini realizovano je 1.518.472,14€.



9.11. Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini utrošeno je 700.000,00€.

9.12. Uređenje gradskih parkova “13. Jul” i “Njegošev park”

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

9.13. Izgradnja “Lokande” sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika

- Na realizaciji ovog projekta u 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

9.14. Izgradnja žičare Lovćen – Cetinje

- Projekat se realizuje kroz program „Razvojni projekti Prijestonice Cetinje”.
- Javno nadmetanje za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji žičare Lovćen-Cetinje, po principu “projektuj i izgradi”, Ministarstvo javnih radova je raspisalo u novembru 2025. godine, procijenjene vrijdnosti 48.938.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini realizovano je 26.673,77€.

PROGRAM
XI. UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

POTPROGRAM

**10. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA-SEKTOR
SAOBRAĆAJ**

11.1. Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim sensorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT 1: Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV) i LOT 2- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS)-phase II.
- U 2025. godini realizovano je 1.053.263,78€.

Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV)

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
- Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
- Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
- Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
- Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
- Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
- Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
- Realizacija projekta je u toku.
- Tri radionice na kojima su učestvovali korisnici su održane u Baru, u skladu sa ugovorom.
- Angažovan je dobavljača opreme koja treba da bude isporučena u sklopu ovoga ugovora, od strane ugovarača.
- Sva oprema je isporučena i sistem je pušten u produkciju.
- Rok je produžen kroz Aneks br. 2 koji je potpisan 03.02.2025. godine do 30.09.2025. godine.
- Po isteku garantnog roka, sve aktivnosti su završene.

VTMIS- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.

- Projektom je obuhvaćena podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim sensorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
- Tenderska dokumentacija je objavljena 27.07.2021. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda 15.10.2021. godine. Otvaranje ponuda je održano 18.10.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 zaključen je 13.12.2021. godine, vrijednost ugovora je 1.425.000,00 €.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 08.02.2022.godine.
- Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja izdavanja početka implementacije.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisan 07.11.2022. godine čime je produžen rok implementacije za 240 dana, tj. do 14.06.2023. godine usled nemogućnosti proizvođača da potrebnu opreme proizvede u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu energetske komponente usljed posledica izazvanih pandemijom COVID-a i rata na teritoriji Evropske unije.
- Aneksa ugovora br. 2 je potpisan 05.07.2023. godine, kojim se rok završetka implementacije produžava do 14. marta 2024. godine.
- Rok implementacije je produžen do 14.09.2024. godine kroz adendum broj 3, odobren od strane EU.
- Krajnji rok za implementaciju ugovora je bio 12.12.2024. do kada je sva oprema isporučena i instalirana u skladu sa ugovorom.
- Po isteku garantnog roka, sve aktivnosti su završene.

11.2. Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
- U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU.
- Projektom je obuhvaćena oprema koja se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 je zaključen 30.11.2021. godine na iznos od 941.474,00 €.
- Rok implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
- Potpisane su tri izmjene ugovora koje su se odnosile na produženje roka implementacije do 24.03.2023. godine. Rok je produžen zbog nemogućnosti proizvođača opreme da istu proizvedu u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu usljed pandemije COVID-a.
- Posljednji sertifikat o prihvatanju opreme je potpisan 24.03.2023. godine, kada je isporučen finalni dio opreme, čime je zvanično završen period implementacije ugovora.
- 26.04.2023. godine, u marini u Baru je organizovana prezentacija opreme kojoj su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva kapitalnih

investicija, Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanja lukama, ugovarača, Uprave za kapitalne projekte, medija.

- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

11.3. Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u saobraćaju

- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom doprinose postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja kao i pripremi projekata iz oblasti saobraćaja.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-4474/1 je zaključen 15.10.2021. godine, na iznos 1.981.040,00€.
- Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 05.11.2021. godine.
- Rok implementacije je Aneksom br. 5 produžen do 05.12.2025. godine.
- Sve aktivnosti na realizaciji projekta, koje uključuju izradu glavnih projekata i tenderske dokumentacije za oba podprojekta (željeznica i putevi) su završene.
- U 2025. godini realizovano je 16.474,73€.

11.4. Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju



- Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
- Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
- U 2025. godini realizovano je 294.859,38€.

Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €.
- Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
- Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
- Addendumom br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00 € a period implementacije projekta je produžen na 36

mjeseci.

- Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.
- Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekta. Glavni projekt koji je dostavljen 02.06.2021. godine je time je implementacija prve faze ugovora završena.
- Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i evaluaciju pristiglih ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Nalog za početak II faze ugovora izdat je 13.08.2021. godine Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice.
- Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Sve aktivnosti koji se tiču nadzora nad izvođenjem radova su završeni. U toku su aktivnosti oko finalnih plaćanja.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SER/01-908/21-2171 je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
- Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

- Svrha projekta je poboljšanje uslova prevoza i vremena putovanja na željezničkom koridoru Bar-Vrbnica. U tom kontekstu ponuđač će obezbediti građevinske radove na adaptaciji i rekonstrukciji postojeće zgrade prekogranične željezničke stanice Bijelo Polje na pruzi Bar – Vrbnica kako bi postala zajednička granična stanica Crne Gore i Srbije, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i EU standardima. Radovi će obezbediti odgovarajuće uslove za rad i omogućiti paralelnu kontrolu prekograničnih organa Crne Gore i Srbije. Ovo će isključiti potrebu za dvostrukim zaustavljanjem vozova i smanjiti carinsku kontrolu/vreme putovanja za 30 min. Ugovor o radovima će se realizovati prema Opštim uslovima za ugovore o radovima koji se finansiraju iz budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj (EDF).
- Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine.
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 18.02.2022. godine.
- Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
- Prva faza izvođenja radova koja je obuhvatila isključivo lijevi dio zgrade i čitav drugi peron je završena i taj dio željezničke stanice je u potpunosti u funkciji.
- Druga faza izvođenja radova koja se tiče desnog dijela zgrade i pomoćnog objekta je počela tokom novembra 2022. godine.
- Aneks ugovora broj 1 je potpisan 19.04.2023. godine koji se odnosio na produženje roka implementacije ugovora do 31.05.2023. godine. Zbog izvođenja dodatnih radova, cijena ugovora je uvećana na 2.092.412,55€.
- Radovi su završeni i nakon isteka garantnog roka izdat je Sertifikat o finalnom prihvatanju radova.
- U 2025. godini realizovano je 294.859,38€.


PROGRAM

XI. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

POTPROGRAM

**11. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA
KULTURE**

11.1. Rekonstrukcija objekta “Dvorca Kralja Nikole” u Nikšiću

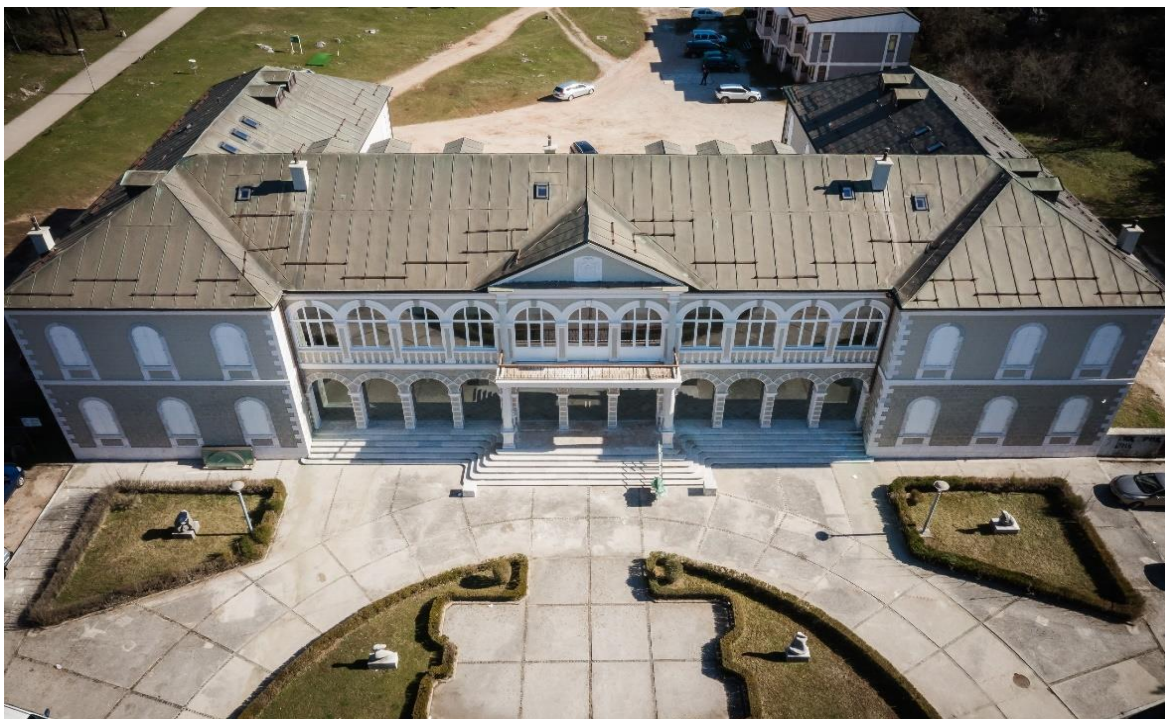

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu čenakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
- Svi ugovoreni radovi koji se izvode na osnovu revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije objekta, koji je Upravi za kapitalne projekte dostavila Opština Nikšić, su završeni i u toku je završno čišćenje objekta.
- Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji usljed čega je izvršena izmjena i ponovna revizija glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija. Izmjene u projektnoj dokumentaciji rezultirale su pojavom dodatnih radova za čije izvođenje je raspisano javno nadmetanje 28.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-28/1 sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 10.01.2023. godine, na iznos od 361.658,98€.
- Završeni su radovi na ugradnji termotehničkih i sprinkler instalacija.
- Početkom 2022. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela Rješenje o privremenoj obustavi sprovođenja konzervatorskih mjera u prizemlju ulaznog dijela objekta, do izdavanja novih konzervatorskih uslova 24.05.2023. godine. Na osnovu izdatih uslova Opština Nikšić je obezbijedila izradu novog konzervatorskog projekta i pribavila ponovnu saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara 30.08.2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-6885/1 za izvođenje radova u prizemlju ulaznog dijela objekta sa izvođačem, „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.12.2023. godine, na iznos od 31.459,99€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi, pribavljena je saglasnost na izvedene radove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara i izdato je odobrenje za upotrebu objekta od strane stručnog nadzora. Primopredaja objekta korisniku izvršena je 08.08.2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 13.788,94€.

11.2. Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, opremanje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata kulture. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi), ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na izgradnji spomen kompleksa Bajo Pivljanin, Plužine

- Ministarstvu javnih radova je od strane Opštine Plužine dostavljena projektna dokumentacija i isto je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijenosti 369.560,96€ i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na rekonstrukciji enterijera „Centra za kulturu Husein Bašiću” u Plavu

- Ministarstvu javnih radova je od strane Opštine Plav dostavljena projektna dokumentacija i isto je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1073/5 sa „Kiko construction“ d.o.o. Plav, zaključen je 02.09.2025. godine na iznos od 277.744,25€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 88.792,22€.

Adaptacija doma kulture u Tuzima

- Ministarstvu javnih radova je u 2025. godini od strane Opštine Tuzi dostavljena projektna dokumentacija i isto je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1122/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 07.03.2025. godine na iznos od 430.650,18€.
- Ugovor br. 01-334/24-7233/1 sa „Diagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.12.2024. godine na iznos od 9.413,80€.
- U toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 327,241.42€.

Izvođenje radova na adaptaciji Doma kulture u Sukuruću, Opština Tuzi


- Ministarstvu javnih radova je od strane Opštine Tuzi dostavljena projektna dokumentacija i isto je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U toku su pripreme aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

11.3. Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić

- Opština Nikšić je dostavila revidovani glavni projekat.
- Bruto površina objekta „Radio i televizije Nikšić” u Nikšiću površine je cca 2.019,32 m² i sastojace se iz prizemlja, I sprata, II sprata i III sprata. Na prvom spratu su predviđene kancelarije za direktora, urednika radio televizije i prostorije za sekretaricu. Takođe, na I spratu su kancelarije za pravnike, ekonomiste i direktora radija. Uz glavni studio se nalazi prostorija za režije sa pratećom REK prostorijom. Na II spratu se nalazi kongresna sala sa garderoberom, virtuelni studio, arhiva, kao i lounge bar sa pratećim prostorijama. Na III spratu su predviđene prostorije za tehničke instalacije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 13.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4366/1 sa izvođačem „LD gradnja d.o.o. Nikšić”, je zaključen 17.10.2022.godine, na iznos od 1.793.442,65€.
- Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora je potpisan između „Radio i televizije Nikšić d.o.o. Nikšić” i „RMA inženjering d.o.o. Nikšić”, gdje su naručilac i izvršilac saglasni da predmetna usluga bude donacija.
- Izvođač radova je uveden u posao 07.11.2022.godine i rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
- Aneks ugovora br. 01-334/23-3360/1 o građenju vezano za produženje roka, potpisan je između naručioca i izvođača radova 06.06.2023. godine sa novim rokom završetka do 07.11.2023. godine. Anex je produžen zbog nedostataka i neusaglašenosti u projektnoj

dokumentaciji, kao i zbog nepovoljne vremenske situacije koja u datom periodu nije dozvolila radove kada su se izvršavali radovi na konstrukciji, fasadi, krovovima i izolaciji, koji tehnološki zavise od vremenskih uslova.

- Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za opremanje lokalne televizije Nikšić 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-4479/1 sa izvođačem radova „Telemont” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.07.2023. godine na iznos od 937.598,18€.
- Ugovor br. 01-334/23-1922/1 sa stručnim nadzorom „Europroject” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.03.2023. godine na iznos od 6.534,00€.
- U decembru 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji lokalnog radio televizijskog centra u Nikšiću. Ugovor br. 01-334/24-1835/1 sa izvođačem radova „Telemont” d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.04.2024. godine na iznos od 270,103.02€.
- Ugovor br. 01-334/24-897/1 sa stručnim nadzorom „Hill construction” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.2.2024. godine na iznos od 6.050,00€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi i objekat je predat korisniku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava

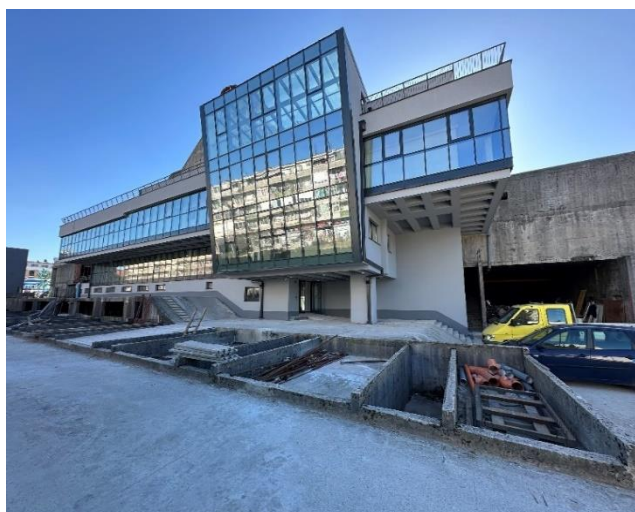

11.4. Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj

- Rekonstrukcija I faze kaldrme u Starom gradu Kalaja je završena i očekuje se rekonstrukcija druge faze.
- U cilju uspješnog realizovanja ove investicije, a uzimajući u obzir probleme na koje je izvođač radova naišao tokom izvođenja radova I faze, neusaglašenost projekta sa stvarnim stanjem na terenu i izmijenjene potrebe korisnika u odnosu na period izrade projektne dokumentacije, Opština Ulcinj preuzela je obavezu dorade projektne dokumentacije.
- Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija za izvođenje II faze, prilagođena potrebama investitora, na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

11.5. Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću

- Nakon dostavljanja potpisanog projektnog zadatka od strane Islamske zajednice, Uprava za kapitalne projekte je 18.10.2023. godine raspisala javno nadmetanje za Izradu konzervatorskog projekta sanacije Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.
- Ugovor br. 01-334/23-6778/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Cetinje, zaključen je 27.11.2023. godine na iznos od

17.000,00€.

- Ugovor br. 01-334/24-3968/1sa vršiocem stručnog nadzora „Hill Construction“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.07.2024. godine na iznos od 9.559,00€.
- Na više raspisanih javna nadmetanja za izbor izvođača radova tokom 2024. godine, procijenjene vrijednosti 159.000,00 bez pdv-a nije bilo pristiglih ponuda. Ponovno javno nadmetanje uvećane procijenjene vrijednosti, raspisano je u junu 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-2162/ sa izvođačem radova „Studio prostor“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.09.2025. godine na iznos od 238.285,50€.
- Izvođač radova je uveden u posao krajem oktobra 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 102.397,36€.

11.6. Izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Glavnog grada Podgorica, Uprava za kapitalne projekte je 20.05.2024. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 2.429.000,00€ bez pdv-a. Na javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-635/1 sa izvođačem radova „Bombeton“ d.o.o. Cetinje, zaključen je 30.05.2025. godine na iznos od 2.892.779,88€].
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u martu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1588/3 sa vršiocem stručnog nadzora „Meping pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 08.09.2025. godine na iznos od 144.213,85€.
- Izvođač je uveden u posao krajem septembra 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 629.482,16€.

11.7. Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru

- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Ministarstva kulture, Uprava za kapitalne projekte je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 550.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- U toku je dopuna projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, nakon čega će Ministarstvo janih radova sprovesti aktivnosti na raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

11.8. Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini dostavljena je dokumentacija na osnovu koje je isto pokrenula sktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izradu hlavnog projekta objekta Muzeja savremene umjetnosti, Prirodnjačkog muzeja, Kuće Arhitekture i Parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture u Podgorici, raspisano je u decembru, procijenjene vrijednosti 1.239.670,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je u decembru, procijenjene vrijednosti 155.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XII. REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

POTPROGRAM

12. IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

12.1. Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. se odnose na: izradu i reviziju projektne dokumentacije; izvođenje radova za projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica, kao i drugih infrastrukturnih objekata, shodno iskazanim prioritetima lokalnih samouprava. Godišnja sredstva namijenjena za rješavanje lokalnih infrastrukturnih problema se realizuju shodno Listi prioriternih lokalnih projekata, koje utvrđuje Ministarstvo finansija i dostavlja Upravi za kapitalne projekte na dalju realizaciju. Aktivnosti na realizaciji projekata mogu preuzeti da sprovode i opštine, glavni grad i prijestonica, na osnovu potpisanih godišnjih Ugovora sa Ministarstvom javnih radova, a uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija. Period realizacije 2024-2026. Ukupna procijenjena vrijednost investicije za tekuću godinu iznosi 25.000.000,00 eura.
- U 2025. godini realizovano je 18.335.575,47€.

Lokalni putevi i gradske saobraćajnice

Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih puteva za naselje Tomaševo – Sokolac, Bijelo Polje

Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2619/2 sa izvođačem radova „Bemax“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 21.11.2025. godine na iznos od 622.366,60€.

Ugovor br. 01-426/25-2693/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.11.2025. godine, na iznos 9.559,00€.

Uvođenje izvođača u posao obaviće se nakon poboljšanja vremenskih prilika.

Izvođenje radova na lokalnom putu Orahovica-Kajebeg, Bijelo Polje

Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1776/3 sa izvođačem radova „Konstruktor group“ d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 24.10.2025. godine na iznos od 249.732,19€.

Ugovor br. 01-334/25-1489/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Angelini“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.07.2025. godine na iznos od 9.667,90€.

Svi radovi su završeni.

Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta Kovren-Gorice, Bijelo Polje

Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2692/1 sa izvođačem radova „Konstruktor group“ d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 203.080,35€.

Ugovor br. 01-426/25-2692/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.11.2025. godine, na iznos 9.559,00€.

Uvođenje izvođača u posao obaviće se nakon poboljšanja vremenskih prilika.

Glavni grad Podgorica

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo Ugovor sa Glavnim gradom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu

od 1.350.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Pljevlja

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.224.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 1.019.093,94€.

Opština Šavnik

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Šavnik za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 250.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 250.000,00€.

Opština Gusinje

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 250.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica. Anex I broj 01-018/25-2669/2 od 06.11.2025, potpisan je na iznos 299.610,00€.
- U 2025. godini realizovano je 298.158,11€.

Opština Danilovgrad

- U 202. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 2.555.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 2.337.702,20€.

Opština Andrijevica

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 608.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 600.233,06€.

Opština Rožaje

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.100.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica. Anex I broj: 01-018/25-2207/1 od 31.10.2025. godine, potpisan je na iznos 1.650.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 1.290.239,82€.

Opština Bijelo Polje

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 766.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 762,998.90€.

Opština Petnjica

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 300.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica. Anex I broj: 01-334/25-1178/2 od 30.07.2025. godine, potpisan je na iznos 550.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 549.937,80€.

Opština Nikšić

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 2.810.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 1.604.649,67€.

Opština Mojkovac

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.090.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 1.010.819,36€.

Opština Kolašin

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo je ugovor sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.320.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova

i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica. Anex I broj: 01-018/25-2099/1 od 23.09.2025. godine, potpisan je na iznos 1.870.000,00€.

- U 2025. godini realizovano je 1.651.177,42€.

Opština Ulcinj

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Ulcinj za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 800.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. realizovano je 799.512,07€.

Opština Žabljak

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.110.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 962.107,59€.

Opština Plužine

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 200.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Tuzi

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 942.263,02€.

Opština Plav

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.097.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica. Anex I broj: 01-018/25-370/4 od 31.07.2025. godine, potpisan je na iznos 1.357.000,00€ i Anex II broj: 01-018/25-2100/1 od 23.09.2025. godine na iznos 1.507.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 1.505.149,25€.

Opština Berane

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Berane za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture liniskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 2.955.931,50€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 2.373.538,01€.

Opština Zeta

- U 2025. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Zeta za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.360.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 122.171,04€.

Opština Bar

- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova je zaključilo ugovor sa Opštinom Bar za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 350.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
- U 2025. godini realizovano je 157.148,02€.

12.2. Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka

- Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi), ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.

Regulacija korita rijeke Ibar



- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obradivač glavnog projekta je "Hydrogis System" d.o.o. Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođačem, „Vukotić-trade“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj“ d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
- Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.
- Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
- Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je u aprilu 2024 godine. Ugovor br. 01-334/24-3643/1 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 26.06.2024. godine na iznos od 1.218.763,45€.
- Obaveza Opštine Rožaje je da riješi imovinsko-pravne odnose na terenu da bi ugovor bio realizovan.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.3. Rekonstrukcija puta Plav - Bogićevica, Plav

- Put Plav – Bogićevica kao dio budućeg regionalnog puta Plav – Dečane je ukupne dužine cca 17,5 km.
- Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnom projekta „Civil engineer“ d.o.o., zaključen je 09.12.2019. godine, na iznos od 9.470,00€.
- Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta odradila je firma „Geoprojekt“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br. 01-334/23-5277/1 zaključen je 14.09.2023. godine na iznos od 19.951,37€.
- Ugovor br. 01-334/23-5967/1 sa revidentom elaborata je „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.10.2023. godine na iznos od 3.448,50€.
- Zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa projektom zadatkom došlo je do raskida ugovora sa projektantom „Ding“ d.o.o. Podgorica.
- Potrebno je sprovesti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor novog obrađivača glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.4. Putni pravac Monte Rose

- Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano u novembru 2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2148/1 sa izvođačem, Konzorcijum Besix-Briv, zaključen je 24.05.2022. godine, na iznos od 10.301.160,07€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano u decembru 2021. godine. Ugovor br. 01/334-23-422/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, zaključen je 27.01.2023. godine na iznos od 219.264,10€.
- Tokom 2023. godine nije završena eksproprijacija, što je obaveza Opštine Herceg Novi, te izvođač nije uveden u posao.
- Sredinom juna 2024. godine izvođač je uveden u posao, na dijelu na kom je riješena eksproprijacija. Krajem 2025. godine obezbijedena su sredstva za završetak eksproprijacije na preostalom dijelu trase puta.
- U toku su radovi, na dijelu na kom je riješena eksproprijacija.
- Potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnosa na polovini trase (4 km), što je u nadležnosti Opštine Herceg Novi.
- U 2025. godini realizovano je 1.012.023,02€.

12.5. Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu

- Opština Plav je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Rekonstrukcija obuhvata Ulicu Čaršijsku 1 i Ulicu Racina čaršija.
- Javno nadmetanje za rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, I faza, raspisano je 28.04.2022. godine, procijenjene vrijednosti 1.239.674,00 sa pdv-om.
- Opština Rožaje zaključila je ugovor br. 031-756 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, 08.09.2022. godine na iznos od 1.239.380,01€.
- Vršenje stručnog nadzora obezbijedila je opština Plav.
- Dužina glavne gradske saobraćajnice je 600m. Rekonstrukcijom saobraćajnice odrađene su atmosferska, fekalna i vodovodna kanalizacija, izvršeno je asfaltiranje saobraćajnice bns –

om i abs-om u dva sloja. Trotoari su obloženi behaton kockama u širini od 2 m Rasvjeta na ovom projektu je takođe odrađena.

- Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2023. godine, a isti su završeni u novembru 2023. godine.



- Druga faza izvođenja radova obuhvatala je radove na na rekonstrukciji saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom i trotoarima.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4534/1 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 08.08.2024. godine na iznos od 988.372,59€.
- Ugovor br. 01-334/24-3654/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Infrastruktura“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.06.2024. godine, na iznos od 9.438,00€.
- Svi radovi su završeni u oktobru 2025. godine i očekuje se konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U 2025. godini realizovano je 1.590.435,74€.



12.6. Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Danilovgrad.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Danilovgrad zaključili su aneks VI ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića” u iznosu od 1.106.465,25€.
- U 2025. godini realizovano je 3.403.924,57€.

12.7. Izgradnja puta Srđevac – Lozna

- Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je „Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o Podgorica.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI” d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
- Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
- Ugovor je raskinut na zahtjev izvođača radova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.8. Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Glavni grad zaključili su aneks VIII ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture za izvođenje radova na rekonstrukciji Zmaj Jovine ulice u iznosu od 5.000,00 €.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.9. Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad Podgorica.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Glavni grad zaključili su aneks VIII ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje za izvođenje radova na rekonstrukciji Bulevara Veljka Vlahovića u iznosu od 1.005.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 818.126,66€.

12.10. Rekonstrukcija puta Gusinje – Vusanje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
- Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
- Krajem 2021. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
- Ugovor br. 01-334/23-30/1 sa izvođačem radova „Indel inženjering”, zaključen je 10.01.2023. godine na iznos od 1.028.354,26€.
- Ugovor br. 01-334/23-148/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Projectman” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.01.2023. godine, na iznos od 11.737,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
- Tokom 2024. godine radovi su bili obustavljeni usljed nepoklapanja tehničke dokumentacije sa stanjem na terenu.
- Radovi su nastavljani u drugoj polovini 2025. godine, kada je i potpisan aneks ugovora sa inoviranom vrijednošću 1.186.088,75€ i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 335.627,73€.



12.11. Izgradnja autobuske stanice Igalo - Bare

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Herceg Novi zaključili su aneks V ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izgradnja autobuske stanice Igalo – Bare“ u iznosu od 1.997.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je ukupno 1.760.218,47€.

12.12. Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar - Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

- Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Projektant glavnog projekta je „Via project“ d.o.o. iz Podgorice, a revident „Arhitektura Aurea d.o.o. iz Podgorice.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosila je 930.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/23-534/1 zaključen je 01.02.2023. godine sa izvođačem radova „Inženjer Gogić“ d.o.o. iz Podgorice na iznos 1.075.555,42€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.08.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosila je 27.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/23-146/1 zaključen je 16.01.2023. godine sa vršiocem stručnog nadzora "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice, na iznos 11.495,00€.
- Nakon priprema za početak radova na realizaciji projekta, od strane Opštine Bar je dostavljena informacija da je na Rješenje UPI-07-041/22-467/10 izjavljena žalba, te da je novim Rješenjem UPI-07-041/22-467/15 žalba usvojena i da se postupak za izdavanje odobrenja za izgradnju obustavlja do pravosnažnog okončanja postupka.
- Dana 31.05.2024. godine, Opština Bar je dostavila informaciju da Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje nije u mogućnosti da izda odobrenje za izvođenje radova, dok se ne riješe sporni imovinsko pravni odnosi.
- Dopisom 01-334/25-1136/2 od 17.03.2025. godine, Opština Bar je dostavila informaciju da je i dalje na snazi prekid postupka do okončanja spora vezano za imovinsko pravne odnose.
- Do kraja 2025. godine, imovinsko pravni problemi nisu riješeni.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.13. Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka

- Uprava za kapitalne projekte je 06.07.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta asfaltiranja puta Marina dolina – Radovan luka.
- Ugovor br. 01-334/23-2507/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Geotechnics, Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.04.2023. godine, na iznos od 20.207,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5528/1 sa izvođačem radova „Bemax“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.10.2024. godine na iznos od 1.329.398,78€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4996/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 6.292,00€.
- Izvođač je uveden u posao u maju 2025. godine. Svi radovi su završeni i u toku je izrada konačnog izvještaja stručnog nadzora.
- U 2025. godini realizovano je 299.323,56€.

12.14. Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalu Bare

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Herceg Novi zaključili su aneks III ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalu - Bare” u iznosu od 121.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 57.942,37€.

12.15. Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile

- Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Herceg Novi.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Herceg Novi zaključili su aneks IV ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta u Igalu od Galeba do Titove Vile“ u iznosu od 10.000,00€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.16. Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama

- Nakon dostavljenog revidovanog glavnog projekta od strane Opštine Berane, Uprava za kapitalne projekte je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova raspisano je u junu 2023. godine procijenjene vrijednosti 504.122,98€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u oktobru 2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/24-1191/1 sa izvođačem radova „Gold Grading“ d.o.o. Berane, zaključen je 12.03.2024. godine na iznos od 570,132.95€.
- Ugovor br. 01-334/24/1825/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.04.2024. godine na iznos od 9,559,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2024. godine.
- U avgustu 2024. godine radovi su obustavljeni zbog propusta u projektnoj dokumentaciji.
- Nakon dopune projektne dokumentacije, radovi su nastavljani u septembru 2025. godine i isti su u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.17. Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike

- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022. godine, na iznos od 349.941,55 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
- Izrada projekta koji se realizuje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i projektnog zadatka koje je dostavila Opština Herceg Novi je završena. Tokom 2025. godine Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane Opštine Herceg Novi o izgradnji brze ceste Debeli brijeg - Budva, gdje dolazi do preklapanja sa trasom zaobilaznice od Sutorine do Zelenike. Upućen je zahtjev Opštini Herceg Novi da dostavi tehničke uslove i rješenja za eventualnu izmjenu trase i usklađivanje sa projektom brze ceste.
- Potrebno je da se Opština Herceg Novi izjasni o potrebi izgradnje zaobilaznice.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.18. Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne zaključila dostavila projektnu dokumentaciju u 2023. godini.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5706/1 sa Eurozox d.o.o. danilovgrad, zaključen je 11.10.2024. godine na iznos od 2.812.682,86€.
- U toku su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 562.536,57€.

12.19. Rekonstrukcija bulevara „13. Jul” Nikšić

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Nikšić.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Nikšić zaključili su aneks IV ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture - Rekonstrukcija Bulevara „13.jul” u iznosu od 305.000,00€.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 300.000,00 €.

12.20. Izgradnja bulevara Majka Tereza u Ulcinju

- Obaveza opštine Ulcinj je da Ministarstvu javnih radova dostavi revidovani glavni projekat, na osnovu kojeg će isto preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.21. Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju krajem januara 2025. godine, kako bi Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova će vršiti Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.22. Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Mojkovac.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Mojkovac zaključili su ugovor realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Rekonstrukcija gradskog trga”, Mojkovac na iznos od 1.000.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 697.620,07€.

12.23. Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” – Komani

- Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 16.05.2022. godine za izbor izvođača radova sa procijenjenom vrijednošću od 700.000,00€ bez pdv-a i postupak jednostavne nabavke 03-9/22, 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.500,00€ bez pdv-a za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.
- Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa pdv-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa „Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice 15.08.2022. godine br. 01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa pdv-om.
- Predmetni radovi su završeni.

- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija lokalnih puteva u Komanima

- Od strane Glavnog grada Podgorica, Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija - Elaborat o adaptaciji lokalnih puteva u Komanima, urađen od strane „Inter project” d.o.o. iz Podgorice.
- U postupku otvorene javne nabavke br. 04-34/23 od 12.07.2023. godine, izabran je najpovoljniji izvođač radova „Bemax” d.o.o. iz Podgorice i sa istim je zaključen ugovor br. 01-426/23-7154/2 od 14.12.2023. godine na iznos 1.069.840,13€.
- Sa stručnim nadzorom „N&B inženjering i konsalting” d.o.o. iz Nikšića je putem zahtjeva za podnošenje ponuda za jednostavnu nabavku br. 03-12/23 od 04.07.2023. godine, zaključen ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova, br. 01-334/23-5423/1 od 21.09.2023. godine na iznos 4.598,00€.
- Realizacija je otpočela odmah nakon prijave radova adaptacije od 21.12.2023. godine.
- Radovi su završeni u februaru 2024. godine i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U 2025. godini realizovano je

12.24. Izgradnja Vatrogasno – spasilačkog doma u Nikšiću

- Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektну dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 2.066.115,70€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-433/1 sa izvođačem radova „L-gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 30.01.2025. godine na iznos od 3.021.920,04€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u februaru 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-1555/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.04.2025. godine na iznos od 58.322,00€.
- Izvođač je uveden u posao u januaru 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 1.110.333,05€.



12.25. Rekonstrukcija puta Gusinje - Grebaje

- Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09€. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Gusinje.
- U 2021. godini dostavljen je revidovani glavni projekat. Radovi se nijesu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Nakon dostavljanja projektne dokumentacije, pristupiće se pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.26. Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici

- Ministarstvu javnih radova u septembru 2025. godine je dostavljena dokumentacija od strane Glavnog grada Podgorica, na osnovu koje je isto pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na uređenju Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici, po principu "projektuj izgradi" raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 14.726.033,00€ i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.27. Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela

- Od strane opštine Šavnik dostavljena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju djelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, na osnovu koje je objavljena tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-23/23 od 18.05.2023. godine za izbor

najpovoljnijeg izvođača radova. Kako po predmetnom postupku nije bilo dostavljenih ponuda, postupak je poništen.

- Opština Šavnik je dostavila novi zahtjev za realizaciju projekta sa smanjenim obimom radova, na osnovu čega je ponovo raspisana javno nadmetanje u septembru 2023. godine i izabran najpovoljniji izvođač radova "Akropolis" d.o.o iz Nikšića, sa kojim je zaključen ugovor br. 01-334/23-7330/1 od 20.12.2023. godine na iznos 251.370,52€.
- Ugovor br. 01-334/23-3156/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Ding" d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2023. godine na iznos 9.559,00€.
- Početak radova je odložen dok se stvore povoljni vremenski uslovi za izvođenje.
- Izdato je rješenje kojim se odobrava rekonstrukcija lokalnog puta.
- Radovi su otpočeli 04.07.2024. godine i završeni u ugovorenom roku, 22. avgusta 2024. godine. Dostavljena je okončana situacija i konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U skladu sa zahtjevom za realizacijom II faze projekta, Opština Šavnik je u julu dostavila projekat adaptacije djelova lokalnog puta, na osnovu kojeg je u oktobru 2024. godine raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji djelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, opština Šavnik II faza. Ugovor br. 01-334/24-7107/1 sa najpovoljnijim izvođačem radova „AG Infoplan“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.12.2024. godine na iznos 513.464,49€.
- Ugovor br. 01-334/24-5628/1 sa stručnim nadzorom „Civil Engineer“ d.o.o. iz Podgorice zaključen je od 08.10.2024. godine na iznos od 6.594,50€.
- Dana 21.03.2025. godine, Opštini Šavnik je dostavljena dokumentacija i upućen zahtjev da prijavi radove adaptacije, kako bi se otpočelo sa izvođenjem.
- Radovi su otpočeli u maju 2025. godine i kompletno završeni u junu 2025. godine. Asfaltom je presvučeno približno 5km puta. Na pojedinim mjestima je porušena postojeća kolovozna konstrukcija i izvršena zamjena lošeg materijala preko kojeg je urađen novi sloj asfalta, a na preostalom dijelu je preko postojećeg asfalta urađen novi sloj. Dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora.
- U 2025. godini realizovano je 520.035,37€.

12.28. Rekonstrukcija Ul. Branka Ćopića/Janka Vukotića u Podgorici

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Glavni grad.
- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.29. Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Nikšić.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Nikšić zaključili su aneks III ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Rekonstrukcija školske ulice“ u iznosu od 905,000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 696.531,82€.

12.30. Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Budva.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Budva zaključili su aneks V ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – „Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva“ u iznosu od 1.770,000,00 €.
- U 2025. godini realizovano je 1.597.566,01€.

12.31. Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L – 29 (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH)

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Nikšić.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Nikšić zaključili su ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Rekonstrukcija puta Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BiH“ u iznosu od 100.000,00 €.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.32. Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti



- Objekat je prizemni, bruto površine cca 1.200 m². U centralnom dijelu je planiran pijačni dio sa 30 tezgi za voće i povrće i 10 tezgi za domaću radinost. Ostali sadržaji: ribara, mesara, pekara, poslovni prostori, tehničke prostorije, cvjećare, prostor za prodaju mliječnih proizvoda i jaja, administrativni prostor, poslovni prostori, tehničke prostorije i ostali prateći prostori. U okviru parcele planiran je parking prostor sa 31 parking mjestom, od kojih su 2 mjesta predviđena za lica sa invaliditetom.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2023. godine, dok je javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano krajem decembra 2023. godine.
- Ugovor br. 01-334/24-1810/1 sa izvođačem radova „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.04.2024. godine na iznos od 2.154.168,82€.
- Ugovor br. 01-334/24-2571/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ing Invest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 13.05.2024. godine na iznos od 70,603.50€.
- Izvođač je uveden u posao u junu 2024. godine i radovi su u toku.
- Aneksom ugovora br. 2 rok je produžen do 31.06.2026. godine.
- Nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosu na dijelu parcele, što onemogućava izvođenje radova u punom kapacitetu.
- U 2025. godini realizovano je 409.257,62€.

12.33. Rekonstrukcija Ržaničkog mosta u Tuzima

- Opština Tuzi je Upravi za kapitalne projekte krajem januara 2025. godine dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.

Izvođenje radova na adaptaciji lokalnih puteva u Milješu, Opština Tuzi

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-1552/4 sa „Bemax“ do.o. Podgorica, zaključen je 19.08.2025. godine na iznos od 261.073,23€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji lokalnih puteva u Milješu, raspisano je u septembru 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-sa „Geo

spin“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 09.12.2025. godine na iznos od 5.111,04€.

- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.34. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu

- Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Plav.
- Rekonstrukcija obuhvata Ulicu Šabovića i Ulicu Omeragića.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-909/1 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.02.2024. godine na iznos od 1.599.888,47€.
- Ugovor br. 01-334/25-719/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Asfalt-beton gradnja“, zaključen je 14.02.2025. godine na iznos od 9.062,00€.
- Radovi su otpočeli krajem februara 2025. godine.
- Svi radovi su završeni u avgustu 2025. godine.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 54.904,56€.



12.35. Rekonstrukcija i adaptacija gradske tržnice u Plavu

- Opština Plav je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava za kapitalne pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Bruto površina tržnice je 774,20 m², spratnost P+1, kapaciteta 18 tezgi na prizemlju, odnosno 42 na sprat gdje je planirana tekstilna pijaca.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4079/1 sa izvođačem radova „Tehno gradnja“ d.o.o. Pljevlja, zaključen je 19.07.2024. godine na iznos od 597.000,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-3665/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.06.2024. godine na iznos od 8.470,00€.
- Radovi na ovom projektu su otpočeli u julu 2024. godine, a zbog nastupajućeg zimskog

perioda radovi su obustavljeni u decembru 2024. godine. Sa izvođenjem se nastavilo u 2025. godini, kada su se stekli povoljni vremenski uslovi.

- Svi radovi I faze su završeni.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze na rekonstrukciji i adaptaciji Gradske tržnice u Plavu raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 675.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze raspisano je u decembru 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 5.082,00€.

12.36. Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin

- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Kolašin u januaru 2024. godine, sprovedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 10.04.2024. godine procijenjene vrijednosti 3.820.000,00€ bez pdv-a
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.04.2024. godine procijenjene vrijednosti 70.000,00€ bez pdv-a.
- Kako na objavljenom tenderu za izbor izvođača radova nije bilo zainteresovanih ponuđača, Upravi za kapitalne projekte je od strane Opštine Kolašin dostavljen zahtjev za ponovnim raspisivanjem tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, uz povećanje procijenjene vrijednosti za 5%.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1192/2 i sa najpovoljnijim ponuđačem konzorcijum IGP Fidiya d.o.o. Podgorica, "Hill Construction" d.o.o Podgorica i UCC "Montekop" d.o.o. Kolašin, zaključen je 12.03.2025. godine na iznos 4.839.998,79€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova je raspisano u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-5044/1 i sa najpovoljnijim ponuđačem „Projectman“ d.o.o. iz Podgorice zaključen je od 09.09.2024. godine na iznos 82.280,00€.
- Opštini Kolašin je upućen zahtjev da obezbijedi građevinsku dozvolu, kako bi se otpočelo sa realizacijom projekta.
- Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, izdata je građevinska dozvola za I fazu radova, koja obuhvata kružni tok, "Ulicu 1" do PR 18 i "Ulicu 7" od PR1 do PR 28 i izvršena prijava početka građenja u julu 2025. godine. Radovi su otpočeli 21.07.2025. godine.
- U septembru 2025. godine, izvođač radova se obratio Naručiocu sa zahtjevom za rješavanje problema sa kojima se suočio tokom izvođenja, a koji su (osim neriješenih imovinsko pravnih pitanja), uglavnom rezultat neusaglašenosti projekta sa stvarnim stanjem na terenu.
- Opština Kolašin je preuzela obavezu da uradi izmjenju spornih djelova revidovanog glavnog projekta i da radi na rješavanju imovinsko pravnih odnosa, kako bi se izvođaču radova što prije omogućio rad i na drugim fazama projekta.
- U decembru su radovi obustavljeni zbog nastupajućeg zimskog perioda. Očekuje se da će u međuvremenu biti urađena izmjena projektne dokumentacije i da će radovi biti nastavljeni čim dozvole vremenski uslovi.
- U 2025. godini, realizovano je 1.301.000,00€.

12.37. Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom

- Aktivnosti na realizaciji sprovodi Opština Herceg Novi.
- U 2025. godini Ministarstvo javnih radova i Opština Herceg Novi zaključili su aneks II ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom“ u iznosu od 820.000,00€.
- U 2025. godini realizovano je 781,730.24€.

12.38. Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosuđe, Gusinje

- Opština Gusinje je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1850/1 sa izvođačem radova „Nikos Cop“ d.o.o. Berane, zaključen je 14.04.2025. godine na iznos od 355.446,12€.
- Ugovor br. 01-334/24-3774/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.07.2024. godine, na iznos od 5.445,00€.
- Izvođač radova je uveden u posao u maju 2025. godine i u toku je izvođenje radova, kao i sagledavanje zahtjeva investitora – opštine Gusinje za polaganje elektroenergetskog kabla uporedo sa izvođenjem radova.
- U 2025. godini realizovano je 73.835,17€.

12.39. Rekonstrukcija ulice 3 i Bistrički put sa pratećom infrastrukturom, Bijelo Polje

- Opština Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava za kapitalne projekte preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2025. godine. Ugovor br. 01-018/25-528/3 sa izvođačem radova „Konstruktor group“ d.o.o. Bijelo Polje zaključen je 23.09.2025. godine na iznos od 211.752,42€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2837/4 sa „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. Podgorica, zaključen je 25.11.2025. godine na iznos od 7.257,73€.
- Izvođač će biti uveden u posao nakon poboljšanja vremenskih uslova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.40. Rekonstrukcija pijace u Tuzima

- Opština Tuzi je u novembru 2025. godine dostavila projektnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova.
- S obzirom da projektantska procjena prevazilazi sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2025. godinu, u toku je razmatranje mogućnosti za pokretanje realizacije projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.41. Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira „Sv.Trojica“ u Stanjevićima, Budva

- Opština Budva je dostavila Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7041/1 sa izvođačem radova „Nicos kop“ d.o.o. Berane, zaključen je 17.12.2024. godine na iznos od 528.710,78€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6407/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Genesis Project“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.11.2024. godine na iznos od 5.929,00€.
- Opština Budva sprovodi aktivnosti na prijavi sanacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.42. Rekonstrukcija starog objekta Robne kuće za potrebe inovacijskog centra u Podgorici

- Obaveza Glavnog grada Podgorica je da Ministarstvu javnih radova dostavi projektnu dokumentaciju, na osnovu koje će Ministarstvo preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.43. Sanacija lokalnog puta Ubli, Podgorica

- Glavni grad Podgorica je dostavio Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-3102/1 sa izvođačem radova „Geo-Put Project“ zaključen je 31.05.2024. godine na iznos od 134.901,09€.
- Ugovor br. 01-334/24-2264/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.04.2024. godine na iznos od 9.498,50€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji puta Mokra - Širokar, Glavni grad Podgorica

- Glavni grad Podgorica je dostavio Ministarstvu javnih radova projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je isto pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2398/2 sa izvođačem radova „Geo-put“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.10.2025. godine na iznos od 511.064,68€.
- Ugovor sa vršiocem stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji puta Mokra-Širokar „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.11.2025. godine na iznos od 3.993,00€.
- Radovi će otpočeti nakon poboljšanja vremenskih uslova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.44. Sanacija lokalnog puta Orahovo-Gornji Zatrijebač, Podgorica

- Glavni grad Podgorica je dostavio Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojeg je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2024. godine, na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovljeno javno nadmetanje raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4860/1 sa izvođačem radova „Geo-Put Project“ zaključen je 29.08.2024. godine na iznos od 101.783,91€.
- Ugovor br. 01-334/24-5016/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.09.2024. godine na iznos od 3.993,00€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.45. Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljena projektna dokumentacija od strane Opštine Tuzi, na osnovu koje je preuzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u novembru 2024. godine, sa procijenjenom vrijednošću od 8.810.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji.
- Opština Tuzi je u januaru 2025. godine dostavila dopunjenu projektnu dokumentaciju. Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2025. godine i isto je poništeno.
- Potrebno je da Opština Tuzi ponovo dostavi izmijenjenu projektnu dokumentaciju, kako bi se nastavilo sa realizacijom projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.46. Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportsko-rekreativnog parka u Nikšiću

- U februaru 2025. godini Upravi za kapitalne projekte je dostavljen izmijenjeni revidovani glavni projekat od strane Agencije za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2684/3 sa izvođačem radova "Đurković" d.o.o. Nikšić, zaključen je 19.11.2025. godine na iznos od 2.814.508,99€.
- Ugovor br. 01-334/25-2977/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.11.2025. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.47. Rekonstrukcija raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima

- Ministarstvu javnih u 2025. godini radova dostavljena je projektna dokumentacija od strane Opštine Tuzi.
- Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, koji su u nadležnosti Opštine.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.48. Rekonstrukcija puta Tuzi-Hoti

- U 2024. godini Upravi za kapitalne projekte je od strane Opštine Tuzi dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisana su u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-367/1 sa izvođačem radova "Putevi Bar" d.o.o. Bar, zaključen je 29.01.2025. godine na iznos od 2.116.085,23€. Ugovor br. 01-334/24-7390/1 sa vršiocem stručnog nadzora "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.12.2024. godine na iznos od 68.728,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 990.349,57€.

12.49. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.50. Izgradnja sportske zone u Kolašinu

- Na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Opštine Kolašin u januaru 2024. godine, sprovedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6313/1 sa izvođačem radova „Pnp Perovišić“ d.o.o., zaključen 12.11.2024. godine je godine na iznos od 3.024.313,24€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4603/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.08.2024. godine na iznos od 53.482,00€.
- Izvođač je uveden u posao 05.05.2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 1.234.535,77€.

12.51. Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku

- Opština Žabljak je u 2025. godini Ministarstvu javnih radova dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je isto preduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta za Komunalno i Vodovod na Žabljaku, raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor 01-426/25-3113/1 sa izvođačem radova „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 08.12.2025. godine na iznos od 2.575.088,91€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 40.000,00€ i isto je u toku.
- Uvođenje izvođača u posao biće obavljeno nakon poboljšanja vremenskih uslova.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.52. Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji lokalnog puta Velje duboko, Kolašin, raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 800.000,00€.
- U toku je vrednovanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.53. Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija od strane Opštine Berane, na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane, raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 2.940.000,00€ i u toku je vrednovanje ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 45.000,00€ i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.54. Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnjica, Bijelo Polje

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.55. Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji Njegoševe ulice i parkinga u Danilovgradu, procijenjene vrijednosti 624.414,08€ bez pdv-a, raspisano je u novembru 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.56. Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Gusinje

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prvi put je raspisano u julu 2025. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.

- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u septembru 2025. Ugovor br. 04-426/25-2913/1 sa izvođačem radova „LD gradnja“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 26.11.2025. godine na iznos od 599.580,00€.
- U toku je javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.57. Rekonstrukcije ulice Donji Pažanj, Kolašin

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 1.870.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.58. Rekonstrukcija Nove ulica u Plavu

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Rekonstrukcija obuhvata Hridsku ulicu i Ulicu Čaršijska 1.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u martu 2025. godine. Ugovor br. 01-402/25-896/5 sa izvođačem radova „Tofi“ d.o.o. Rožaje, zaključen je 05.08.2025. godine na iznos od 2.684.608,20€.
- Ugovor br. 01-402/25-2864/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Asfalt-Beton gradnja“ d.o.o. zaključen je 21.11.2025. godine na iznos od 7.900,00€.
- Radovi su otpočeli u novembru 2025. godine i isti su obustavljeni zbog nastupajućeg zimskog perioda, a biće nastavljeni nakon poboljšanja vremeskkih uslova.
- U 2025. godini realizovano je 188.399,88€.

12.59. Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji gradske saobraćajnice od opšte bolnice Pljevlja do gradskog groblja Ravni raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 905.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji parkinga na površini ispod gradskog groblja reaspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 350.000,00€ i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.60. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Čanju

- U 2025. godini je Ministarstvu javnih radova dostavljena dokumentacija od strane Opštine Bar, na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica u Čanju: - Saobraćajnica od raskrsnice sa magistralnim putem M-1 do naselja Čanj - Saobraćajnica 1- II faza i priključne saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Čanj II" i DSL-a "Čanj sektor 51" raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 2.850.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje pouda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica u Čanju raspisano je u septembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 33.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini realizovano je 2.720.840,00€ (troškovi eksproprijacije).

12.61. Izgradnja lokalnog puta Tuzi-Mataguži, II faza

- Ministarstvu javnih radova je u 2025. godini dostavljena dokumentacija od strane Opštine Tuzi, na osnovu koje je isto pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

12.62. Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku

- U 2025. godini Ministarstvu javnih radova je dostavljena dokumentacija na osnovu koje je pokrenulo procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na pejzažnom uređenju površine na novoformiranim urbanističkim parcelama, obaloutvrde, nasipa i šetališta uz rijeke Bukovica i Bijela, raspisano je prvi put u aprilu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 580.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda. Na ponovljenim javnim nadmetanjima, u julu i oktobru tekuće godine, s uvećanom procijenjenom vrijednošću od 680.000,00€ bez pdv-a takođe nije bilo pristiglih ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XIII. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

POTPROGRAM

**13. a. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG
PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA - SEKTOR POLITIČKI
SISTEM I UPRAVLJANJE**

13.1. Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na adaptaciji: "stare zgrade Pobjede" za potrebe "Monstata", „stare zgrade Vlade“ za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva, kao i drugih objekata za potrebe državnih organa u Podgorici, po utvrđenim prioritetima Vlade. Period realizacije 2025-2026. godina. Procijenjena vrijednost investicije 5.000.000,00 eura.

Izvođenje radova na adaptaciji stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva raspisano je krajem avgusta 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2970/1 sa izvođačem radova „Ramel“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 28.11.2025. godine. Ugovor sa vršiocem stručnog nadzora „Nik com“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 28.11.2025. godine na iznos od 9.559,00€.
- U toku je izvođenje radova.
- Javno nadmetanje za opremanje budućih prostorija Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odeljenja u objektu Stare zgrade Vlade raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijnosti 379.000,00€ i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

13.2. Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom. Period realizacije 2014-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.850.000€.
- Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
- Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju tokom 2020. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je dostavljena Upravi za imovinu kako bi u skladu sa Zaključkom Vlade preduzeli dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
- Krajem 2020. godine završena je izrada glavnog projekta prilogađavanja objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu. Nakon završenog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i potpisivanja ugovora u junu 2022. godine, krajem iste godine završeni su svi ugovoreni radovi na prilogađavanju objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu kao i primopredaja istih korisniku.
- U 2025. godini realizovano je 2.400,00€.

PROGRAM
XIV. RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE


POTPROGRAM

14. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI NAUKE

14.1. Naučno-tehnološki park u Podgorici

- Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke, kao i prijavu građenja. Projekant glavnog projekta je „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je „Ing-impuls” d.o.o. Podgorica.
- Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteran, prizemlje i dvije etaže.
- U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
- U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 30 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01- 334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
- Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđeni su dodatni radovi čije je izvođenje bilo potrebno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.



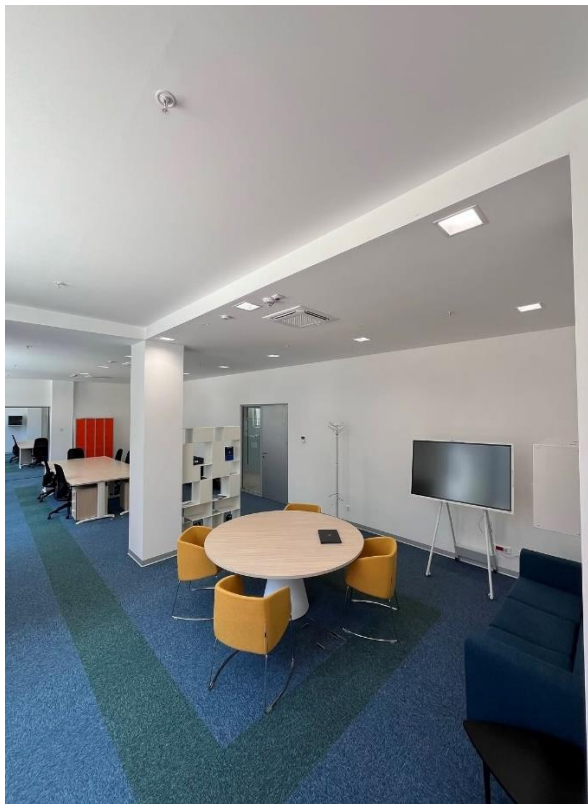

- Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01- 334/21-6693/1 sa izvođačem „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
- Sa radovima se nastavilo u januaru 2022. godine i isti su u završnoj fazi.
- Tokom izvođenja radova, utvrđena je potreba za dopunom projekta trafostanice nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izvođenje istih 30.11.2022. godine. Ugovor br. 01- 334/23-2674/1 sa izvođačem, „Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 391.145,00€.
- Radovi na trafostanici su završeni, osim u dijelu povezivanja napojnog kabla na postojeći kablovski 10kV vod TS „Podgorica IV“ do TS „Poljoprivredni Institut“ koji je moguć nakon dobijanja upotrebne dozvole trafostanice. Sva neophodna dokumentacija za tehnički prijem je predata korisniku koji će organizovati komisiju za tehnički prijem izvedenih radova na trafostanici, a nakon što nadležni Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice donese rješenje o imenovanju komisije. Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja komisije za tehnički prijem i upotrebne dozvole od nadležnog Sekretarijata, korisnik će pokrenuti dalju proceduru priključenja trafostanice na distributivnu mrežu kod nadležnog preduzeća CEDIS doo Podgorica.
- Nakon što je od strane Naučno-tehnološkog parka dostavljen projekat opremanja objekta 04.05.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova sa opremanjem. Ugovor br. 01-334/23-4728/1 sa izvođačem, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2023. godine, na iznos od 1.703.816,97€.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja dodatnih radova sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici je raspisano 31.07.2023. godine. Ugovor br. 01-334/20-6408/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 48.400,000€.
- Tek nakon stavljanja trafostanice pod napon, a nakon toga i samog objekta, krajem aprila 2024. godine stvorili su se uslovi za ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme, kao i pribavljanje stručnih nalaza (atesta) za tehničku ispravnost instalacija.
- Svi ugovoreni radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 234.690,30€.

14.2. Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić

- IPC Tehnopolis je Upravi za kapitalne projekte sredinom 2022. godine dostavio projektnu dokumentaciju.
- Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dijela postojećeg objekta za potrebe izgradnje Doma digitalne revolucije. Nakon javnog nadmetanja i sprovedenih aktivnosti Uprava je 26.06.2023. godine donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.
- Ugovor br. 01-334/234-192/1 sa izvođačem radova Društvo „LD Gradnja” za izgradnju i promet d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.07.2023. godine, na iznos od 724,550.22€.
- Vršenje stručnog nadzora sprovodi Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić.
- Na osnovu zahtjeva opštine Nikšić, raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova krajem aprila 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4338/2 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 30.07.2024. godine na iznos od 284.343,95€.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini realizovano je 554.666,07€.



14.3. Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću

- Opština Nikšić je 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na kongresnoj multimedijalnoj sali raspisano je u oktobru 2023. godine i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.645.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano u aprilu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-4602/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.08.2024. godine na iznos od 43.802,00€.
- Ponovno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-155/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 20.01.2025. godine, na iznos od 2.295.382,41€.
- Izvođač je uveden u posao u februaru 2025. godine. U toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 459.076,48€.


PROGRAM
XV. SPORT

POTPROGRAM

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA

15.1. Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

- Fudbalski savez Crne Gore je ugovorio izradu glavnog projekta Rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.
- Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore – Uprave za kapitalne projekte, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijedena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
- Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
- Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem, „Roaming Montenegro“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
- Tokom izvođenja radova Uprava za kapitalne projekte je, od strane stručnog nadzora Agencije za projektovanje i planiranje Nikšić, obavještena da je neophodno pristupiti izmjeni projektne dokumentacije u cilju usaglašavanja kategorije stadiona po standardima UEFA.
- U cilju razmatranja predložene inicijative, Opština Nikšić i Fudbalski klub „Sutjeska“ su pokrenuli aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije kako bi se utvrdili finansijski i drugi faktori koji prate nastavak izgradnje kao i zakonske procedure obezbjeđenja i ugovaranja dodatnih radova.
- Nakon završetka inoviranog glavnog projekta i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta, Uprava za kapitalne projekte je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u februaru 2022. godine dostavila informaciju o nastavku realizacije predmetnog objekta kako bi, u skladu sa nadležnostima, istu dostavila Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem na razmatranje.
- Usvajanjem nevedene informacije, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 22.07.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Po predmetnom javnom nadmetanju, do utvrđenog roka, nije bilo pristiglih ponuda.
- Imajući u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka i utvrđeno je da je neophodno obezbjeđenje dodatnih sredstava o čemu je Uprava u decembru 2022. godine obavjestila nadležno Ministarstvo. Zaključkom br. 07-011/23-434/2, donesenim na 39. Sjednici Vlade Crne Gore održane 2. februara 2023. godine, data je saglasnost za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine FK Sutjeska u Nikšiću je raspisano 27.03.2023. godine.
- Ugovor za dodatne radove br. 01-334/23-4428/1 sa izvođačem radova „Roaming Montenegro“ iz Nikšića zaključen je 24.07.2023. godine na iznos od 993.298,68€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi, dobijen konačni izvještaj i objekat je predat korisniku na upotrebu krajem jula 2024. godine.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

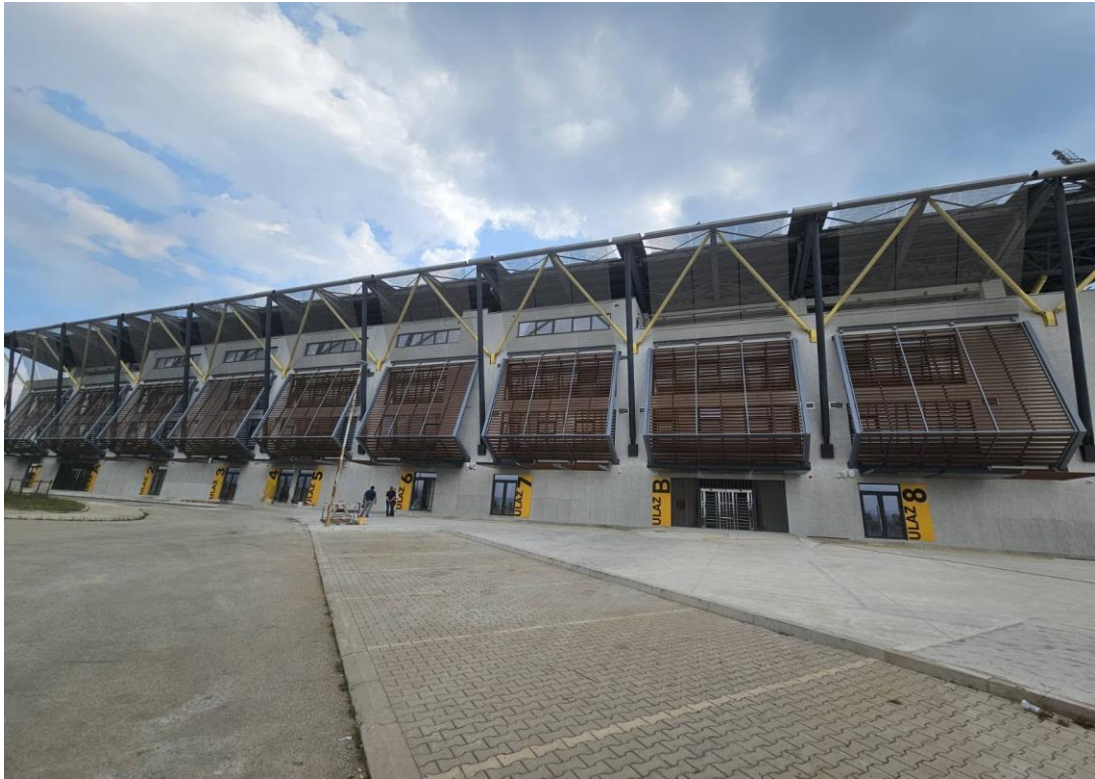



15.2. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata

- Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, opremanje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji sportskih objekata. Realizaciju aktivnosti sprovodi Ministarstvo javnih radova na osnovu osnovu saglasnosti Ministarstva finansija, koje utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi) ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.

Rekonstrukcija terena za odbojku i tenis na gradskom stadionu „Pod Golubinjom“ u Pljevljima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2024. godine procijenjene vrijednosti 56.565,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7105/1 sa izvođačem radova „Tangram system“ d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.12.2025. godine na iznos od 67.741,73€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-723/1 sa „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.02.2025. godine na iznos od 2.299,00€.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 69.948,74€.

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije sportske hale u Haremima, Berane

- Javno nadmetanje izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije sportske hale u Haremima, opština Berane, raspisano je krajem 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-1661/1 sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 08.04.2025. godine na iznos od 114.708,00€.
- Ugovor za vršenje revizije Glavnog projekta rekonstrukcije sportske hale u Haremima sa „Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je, 30.12.2024. godine, na iznos od 9.438,00€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na uređenju terena sa sportskim terenom i dječijim igralištem, Opština Tuzi

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 500.000,00€ bez pdv-a i sto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.3. Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo

- Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi Uprava za kapitalne projekte je raspisala poziv za obrađivača glavnog projekta Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova po sistemu „projektuj i izgradi” je raspisano 04.03.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3636/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem „Briv konstrukcion” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 4.713.850,06€.
- Revizija glavnog projekta je završena.
- U toku je razmatranje zahtjeva izvođača radova za raskid ugovora.
- U 2025. godini realizovano je 235.692,51€.

15.4. Rekonstrukcija otvorenog bazena Pizana kod Starog grada Budva

- Naručilac tehničke dokumentacije je Opština Budva i nakon dostavljanja iste 09.12.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na adaptaciji otvorenog bazena „Pizana”. Tehničkom dokumentacijom adaptacije postojećeg bazena planirano je da se školjka bazena u najvećoj mjeri odvoji od cirkulacije vode iz otvorenog mora formiranjem zidova bazena gdje nedostaju, a time i spriječi unošenje mulja i pijeska u bazen, kao i da se školjka bazena i hodna površina oko bazena obloži keramičkim pločicama.
- Procijenjena vrijednost radova iznosila je 640.000,00€ bez pdv-a. Na javno nadmetanje za izbor izvođača radova nije bilo pistiglih ponuda.
- Nakon dorade i dopune projektne dokumentacije i usaglašavanja iste sa euro kodovima od strane Opštine Budva ni nakon 5 raspisanih javnih nadmetanja za izbor izvođača radova tokom 2024. i 2025. godine, procijenjene vrijednosti iznosi 1.200.000,00€ bez pdv-a, nije bilo pristiglih ponuda.
- Uprava za kapitalne projekte je raspisala i javno nadmetanje za vršioca stručnog nadzora 22.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 12.000,00€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Na ponovnom javnom nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 25.000,00€ bez pdv-a, takođe nije bilo pristiglih ponuda i isto je poništen.
- Obaveza Opštine Budva je ponovna provjera i usaglašavanje projektne dokumentacije, kako bi Ministarstvo javnih radova preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.5. Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.6. Izgradnja sportske hale u Plužinama

- Opština Plužine je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Opštini Plužine, u obuhvatu detaljnog urbanističkog plana „Centar”. Ukupna bruto površina objekta 2985.63m², spratnost objekta P+2.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2023. godine i na istom nije bilo pristiglih ponuda. Javno nadmetanje je ponovljeno u martu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-3380/1 sa I.G.P. „Fidija” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.06.2024. godine na iznos od 4.723.032,70€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1597/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 102.850,00€.
- Izvođač je uveden u posao 24.03.2025. godine. Do sada su završeni su grubi građevinski radovi. Gradilište je konzervirano sredinom decembra 2025. godine i radovi će biti nastavljeni kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
- U 2025. godini realizovano je 1.232.529,10€.



15.7. Izgradnja olimpijskog bazena u Baru

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.8. Izgradnja balon sale u Zeti

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.9. Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.10. Natkrivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini je od strane Ministarstva sporta i mladih dostavljena dokumentacija na osnovu koje je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i izvođenje radova na natkrivanju otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici, po principu "projektuj i izgradi" raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 10.500.000,00€ bez pdv-a i u toku je procedura zaključivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.
- Javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta natkrivanja otvorenog olimpijskog bazena raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 40.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- Javno nadmetanje vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na natkrivanju otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici, po principu „projektuj i izgradi“ bazena raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 200.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.11. Rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u centar za smještaj sportista, Pljevlja

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

15.12. Izgradnja zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini realizovano je 117.697,36€ (konkursna komisija).

15.13. Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero, Pljevlja

- Ministarstvu javnih radova u 2025. godini nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

PROGRAM

XVI. UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOVA OBRAZOVNOG SISTEMA

POTPROGRAM

**16. a. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA – SEKTOR
OBRAZOVANJE**

16.1. Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem

- Projektom je obuhvaćena izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to: **Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju**
- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač „Entasis” d.o.o. Podgorica.
- Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
- Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je bio 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
- Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi za kapitalne projekte.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€ sa kompanijom „Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica.
- Završena je revizija projektne dokumentacije.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera

- Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 sa "GOKYOL INSAAT ve SANAYII A.S" zaključen je 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od 7 mjeseci.
- Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
- Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
 - - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN” PODGORICA
 - - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ” PODGORICA
 - - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI” PODGORICA
 - - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA
 - - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ” NIKŠIĆ
 - - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ” HERCEG NOVI
 - - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA” BIJELO POLJE
 - - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA” NIKŠIĆ
- Tokom marta 2022. godine izvođač radova je uveden u posao na školskim objektima.
- Aneksom broj 1 ugovora o radovima implementacioni period za izvođenje radova je produžen do 31.12.2022. godine, a Administrativnim nalogom do 29.02.2024. godine.
- Radovi nisu završeni u predviđenom roku pa je Uprava za kapitalne projekte kao Ugovorno tijelo preduzela neophodne aktivnosti u skladu sa ugovornim mogućnostima. Naplaćena je garancija za dobro izvršenje posla i raskinut ugovor sa izvođačem radova.
- U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova kako bi se završili preostali radovi.
- U 2025. godini realizovano je 1.388,69€.

POTPROGRAM

**16. b. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U OBLASTI
OBRAZOVANJA**

16.1. Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, opremanje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata obrazovanja. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Ministarstvu javnih radova na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi), ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 10.000.000€.

Izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

- Univerzitet Crne Gore je dostavio potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u februaru 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-1127/1 sa izvođačem radova „La colina inženjering” d.o.o. Podgorica, zaključen je 07.07.2025. godine na iznos od 1.807.841,45 €.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je u februaru 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-417/7 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica zaključen je godine na iznos od 22.807,29€.
- Izvođač je uveden u posao krajem jula 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 882.355,23€.

Izvođenje radova na totalnoj rekonstrukciji postojećeg objekta JU OŠ „Risto Ratković” Bijelo Polje, područno odeljenje Pripčiči

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg objekta JU OŠ „Risto Ratković” Bijelo Polje, područno odeljenje Pripčiči raspisano je u aprilu 2025. godine.
- Ugovor br. 01-011/25-13/2 sa izvođačem radova „BMR Baošić” d.o.o. Bijelo Polje, zaključen je 10.07.2025. godine na iznos od 348.104,45€.
- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo stručni nadzor nad izvođenjem radova.
- Izvođač je uveden u posao krajem septembra 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 67.198,98€.

Izvođenje radova na adaptaciji krova vrtića JPU „Vukosava Ivanović”, VJ „Mali princ” u Baru

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2025. godine. Ugovor br. 01-334/25-1280/1 sa izvođačem radova „Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 18.07.2025. godine na iznos od 191.058,98€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor sa „Marting project” d.o.o. Podgorica zaključen je 11.03.2025. godine na iznos od 4.658,50 €.
- Svi radovi su završeni u septembru i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 191.005,40€.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji vrtića u Gusinju

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji i dogradnji vrtića u Gusinju procijenjene vrijednosti 113.410,24€ bez pdv-a raspisivano je u aprilu i julu tekuće godine i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2025. godine i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija OŠ „Vlado Milić” u Podgorici

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji paviljona JU OŠ „Vlado Milić” u Podgorici, po principu “projektuj i izgradi” raspisano je krajem oktobra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 2.975.206,61€ i u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji krova postojećih školskih objekata OŠ “Vuk Karadžić”, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2025. godine. Ugovor sa „BB solar” d.o.o. Podgorica zaključen je 04.08.2025. godine na iznos od 230,941.55€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor sa „Angelini” d.o.o. Podgorica zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 4.235,00€.
- Radovi će otpočeti nakon završetka školske godine.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji JU OŠ „Mirko Srzentić”, Petrovac

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji elektro instalacija, termotehničkih instalacija kao i molersko-farbarski radovi na enterijeru JU OŠ „Mirko Srzentić”, raspisano je u julu 2025. godine. Ugovor sa izvođačem radova „Cema” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 338.664,48€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor sa „Hill construction” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.11.2025. godine na iznos od 7.623,00€.
- Radovi će otpočeti nakon završetka školske godine.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji JU OŠ „Donja Lovnica” PO Čosovica Rožaje

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u novembru 2025. godine dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova, nakon čega je Ministarstvo pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 352.989,98€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na sanaciji krova na objektu OŠ „Dašo Pavičić” u Sutorini

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje radova na sanaciji krova na objektu OŠ „Dašo Pavičić” raspisano je u novembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-930/1 sa „Entext inženjering” d.o.o. Podgorica, zaljučen je 27.02.2024. godine na iznos od 42.341,29€.
- Zbog neusaglašenosti predmjera i predračuna sa stvarnim stanjem na terenu, kao i pojavom nepredviđenih radova, ugovor sa izvođačem je raskinut.

Izvođenje radova na rekonstrukciji škole JU OŠ „Janko Bjelica” u Crkvicama, Nikšić

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 129.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovna javna nadmetanja raspisivana su u avgustu i oktobru 2024. godine procijenjene vrijednosti 165.285,00€ bez pdv-a na istima nije bilo pristiglih ponuda.
- Krajem decembra 2024. godine ponovo je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji škole JU OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama i isto je poništeno iz razloga što nje bilo pristiglih ponuda.
- Obaveza Agencije za projektovanje i planiranje, Nikšić je da dostavi inovirani projekat kako bi Ministarstvo javnih radova pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja nove Osnovne škole u Igalu, Herceg Novi

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2024. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja Gimnazije u Baru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.2. Izgradnja , rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja

- Višegodišnji projekat koji se realizuje u kontinuitetu. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2025. godinu odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije, opremanje i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata obrazovanja. Ministarstvo finansija utvrđuje prioritete dostavljenih zahtjeva u toku godine i dostavlja Upravi za kapitalne projekte na dalju realizaciju. Takođe, sredstva se odnose i za plaćanje projekata koji su sa ove aktivnost započeti (raspisani tenderi), ali ne i završeni u prethodnoj godini. Period realizacije 2024.-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije na godišnjem nivou iznosi 5.000.000€.

Izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Lovćenski partizanski odred” na Cetinju

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji fiskulturne sale u OŠ „Lovćenski partizanski odred” na Cetinju, procijenjene vrijednosti 2.492.000,00€ raspisano je u avgustu 2025. godine. U toku je vrednovanje ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspisano je u oktobru 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji fiskulturne sale JU OŠ “Boško Strugar” Ulcinj

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Ministarstvu javnih radova nakon čega je Ministarstvo pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji fiskulturne sale sa pripadajućim svlačionicama i toaletima za JU OŠ “Boško Strugar” Ulcinj raspisano je krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 280.610,62€ i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora nad adaptacijom fiskulturne sale JU OŠ "Boško Strugar" raspisano je u avgustu 2025. godine. Ugovor br. 01-426/25-2687/1 zaključen je sa „Hill construction” d.o.o. Podgorica 06.11.2025. godine na iznos od 7.139,00€.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ „Risto Ratković“ u Bijelom Polju i JU OŠ „Radomir Mitrović“ Berane

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektni zadatak, na osnovu čega je Uprava preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju fiskulturne sale JU OŠ „Risto Ratković“ u Bijelom Polju i JU OŠ „Radomir Mitrović“ Berane raspisano je krajem decembra 2024. godine.
- Ugovor br. 01-334/25-827/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.02.2025. godine na iznos od 60.379,00€.
- Ugovor sa izvođačem radova je raskinut zbog neslaganja urbanističko tehničkih uslova i projektnog zadatka.
- U 2025. godini.

16.3. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2024. godine dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u martu 2024. godine.

Ugovor br. 01-334/25-421/1 sa projektantom „Urbi pro” d.o.o. Podgorica zaključen je 30.01.2025. godine na iznos od 121.000,00€.

- Ugovor br. 01-334/24-1991/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.04.2024. godine na iznos od 9.425,90€.
- U toku je izrada projektne dokumentacije.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.5. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Tuškom putu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.6. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić na Zlatici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.7. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Beranama

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u januaru 2024. godine dostavilo projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u maju 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-2652/1 sa projektantom „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.05.2024. godine na iznos od 54.450,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-2818/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.05.2024. godine na iznos od 6.594,50€.
- U toku je priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
- U 2025. godini realizovano je 27.225,00€.

16.8. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Bijelom Polju

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima

- pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.9. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Plavu

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.10. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Baru

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Baru.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 90.750,00 sa pdv-om.
- Ugovor br. 01-334/23-4122/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 89.540,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-4885/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.546,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor 01-334/24-7106/1 sa „BB Solar“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.12.2024. godine na iznos od 3.194.149,32€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u novembru 2024. godine. Ugovor br. 01-428/25-92/2 sa „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“, Podgorica zaključen je 30.04.2025. godine na iznos od 42.616,20€.
- Izvođač je uveden u posao u maju 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 1.358.374,27€.

16.11. Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II:

Vrtić u Ulcinju

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Ulcinju.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4124/1 sa projektantom „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 22.990,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-2284/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 2.416.671,17€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2025. godine procijenjene vrijednosti 50.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini realizovano je 21.054,00€.

16.12. Izgradnja kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju

- Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod“. Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i

Objekte zajedničkih sadržaja.

- Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
- Završetkom radova i dobijanjem upotrebne dozvole na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima u kompleksu komisija za tehnički pregled je konstatovala nedostatke na objektima zajedničkih sadržaja i podzemne garaže i u cilju otklanjanja istih Uprava za kapitalne projekte je u martu 2022. godini raspisala tendersku proceduru za izbor izvođača za dodatne radove po primjedbama komisije za tehnički pregled za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje dodatnih radova po primjedbama komisije za tehnički pregled raspisano je 27.12.2022. godine, Ugovor za izvođenje dodatnih radova br. 01-334/23-2506/1 sa izvođačem „Bombeton” d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 181.476,10€. Radovi za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok završeni su početkom 2024. godine, izdata je upotrebna dozvola i izvršena je primopredaja objekta korisniku.
- Ugovor br: 01-334/23-3866/1 od 03.07.2023. godine za vršenje stručnog nadzora nad dodatnim radovima za objekat zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetske blok zaključen je sa „Urbi pro“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 6.037,90€.
- U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena. Shodno prioritetima Univerziteta Crne Gore, kao sledeća faza realizacije kompleksa Akademije umjetnosti, planirana je izgradnja Fakulteta dramskih umjetnosti i u toku su aktivnosti na kompletiranju projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom od strane korisnika.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji fakulteta Likovnih umjetnosti raspisano je u novembru 2025. godine procijenjene vrijednosti 393.140,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- Ugovaranje stručnog nadzora biće obezbijeđeno od strane Univerziteta Crne Gore.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.13. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.14. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.15. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u City kvartu, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo potrebnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte nakon čega je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta za Osnovnu školu u City kvartu raspisano je u avgustu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-223/1 sa „Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22.01.2025. godine na iznos od 204.490,00€.
- Ugovor br. 01-334/25-81/1 sa revidentom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 14.01.2025. godine na iznos od 16.698,00€.
- Glavni projekat i revizija istog su završeni.
- Tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova sa tehničkom dokumentacijom poslata EIB-u na odobrenje.
- U 2025. godini realizovano je 221.672,00€.

16.16. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.17. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.18. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.19. Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a:

Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.20. Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

- Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i

u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.

- S obzirom na veličinu i složenost objekta, predviđeno je da se rekonstrukcija odvija u više faza. Nakon što je Korisnik definisao prioritete radove i dostavio tehničku specifikaciju koja se odnosi na zamjenu postojeće fasadne bravarije i radove na sanaciji fasade, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 28.11.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-2395/1 sa izvođačem radova „M solutions“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.04.2024. godine na iznos od 1.148.326,77€.
- Javno nadmetanje za izbor za izbor vršioca stručnog nadzora 29.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1328/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Genesis project“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.03.2024. godine na iznos od 14.520,00€.
- Svi radovi su završeni.

Izvođenje radova na adaptaciji zgrade Tehničkih fakulteta u Podgorici

- Javno nadmetanje za izvođenje radova na adaptaciji zgrade Tehničkih fakulteta u Podgorici raspisano je u julu 2025. godine.
- Ugovor sa izvođačem radova „Stambeno“ d.o.o. Nikšić i podugovaračima „Arhibox“ d.o.o. Nikšić, „LD group“ d.o.o. Nikšić, „Ramel“ d.o.o. Nikšić i „Ening“ d.o.o. Nikšić zaključen je 03.12.2025. godine na iznos od 11.071.367,48€.
- Ugovor br. 01-426/25-2596/3 sa vršiocom stručnog nadzora „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 21.11.2025. godine na iznos od 179.564,00€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini realizovano je 196.323,12€.

16.21. Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi

- Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Uprava za kapitalne projekte je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-53/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 12.01.2022. godine, na iznos od 53.240,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.12.2021. godine. Ugovor br. 101-334/22-6148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 29.12.2022. godine, na iznos od 10.648,00€.
- Nakon potpisivanja ugovora projektant je izvršio obilazak objekta i obavjestio Upravu za kapitalne projekte da je za potrebe snimanja postojećeg stanja, a uzimajući u obzir stanje objekta i terena oko objekta, neophodno obezbijediti bezbjedan i siguran pristup objektu. Uprava za kapitalne projekte je sa sa preduzećem „Bokić“ d.o.o. Herceg Novi zaključila ugovor br. 01-334/22-1973/1 od 12.05.2022. godine za čišćenje lokacije na iznos od 6.050,00 €.
- Nakon raščišćavanja objekta i uklanjanja labilnih dijelova na zidovima i krovu objekta, izvršeno je geodetsko snimanje i urađeno je idejno rješenje. Krajem 2023. godine dobijena je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na urađeno idejno rješenje i započelo se sa izradom glavnog projekta.
- U toku je revizija glavnog projekta.
- U 2025. godini realizovano je 26.620,00€.

16.22. Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici

- Arhitektonski fakultet je Upravi za kapitalne projekte dostavio revidovani glavni projekat.

- Arhitektonski fakultet se nalazi u kompleksu Univerzitetskog centra u Podgorici. Projektom dokumentacijom predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta Arhitektonskog fakulteta, čime ukupna bruto površina dograđenog i rekonstruisanog objekta iznosi 5.041,12m².
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 08.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5709/1 sa izvođačem, „Stambeno” d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos od 3.411.828,97€.
- Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-369/1 sa stručnim nadzorom „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” iz Podgorice, je zaključen 25.01.2023. godine, na iznos od 32.827,30€.



- Izvršena je prijava građenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i izvođač je uveden u posao 01.03.2023. godine.
- Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke u projektnoj dokumentaciji što je za posledicu imalo izradu izmjena i dopuna glavnog projekta od strane Arhitektonskog fakulteta i pojavu dodatnih radova.
- Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 28.12.2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-1586/1 sa izvođačem radova „Stambeno” d.o.o. Nikšić, zaključen je 01.04.2024. godine na iznos od 721.658,22€.
- Javno nadmetanje za izvođenje završnih radova i opremanje Arhitektonskog fakulteta raspisano je u decembru 2024. godine. Ugovor sa izvođačem radova „Stambeno” d.o.o. Nikšić, zaključen je 24.02.2025. godine na iznos od 1.663.563,88€.
- Svi radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu 26.09.2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 2.451.399,51€.

16.23. Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju, na osnovu kojih je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, raspisivano je u maju, a zatim u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 2.105.000,00€ bez pdv-a i na istim nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-316/1 sa „Roaming Montenegro” d.o.o. Nikšić, zaključen je 12.05.2025. godine na iznos od 2.211.631,02€.
- Stručni nadzor je obezbijeđen od strane Univerziteta Crne Gore.
- Izvođač radova je uveden u posao u junu 2025. godine.
- Svi radovi su završeni. Preostala izrada konačnog izvještaja stručnog nadzora.
- U 2025. godini realizovano je 1.501.000,00€.

16.24. Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici

- Ministarstvu javnih radova je u 2025. godini dostavljen revidovani glavni projekat od strane Pravnog fakulteta UCG i isto je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na adaptaciji biblioteke na Pravnom fakultetu, raspisano je u oktobru 2025. godine, procijenjene vrijednosti 537.000,00€ i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je krajem decembra 2025. godine i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.25. Izgradnja novog objekta OŠ „Vladimir Nazor“ Masline

- Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo revidovan glavni projekat.
- Ukupna površina objekta je 5.761,11 m².
- Objekat se sastoji od 3 etaže, podrum, prizemlje i prvi sprat i projektovana je za 1100 učenika u dvije smjene. U podrumu škole predviđeni su toaleti, garderobe, multimedijaska učionica, biblioteka, produženi boravak, pomoćne i tehničke prostorije (uključujući podstanicu za termotehničke instalacije). U prizemlju škole predviđene su učionice, kabineti, hol, zbornica, kancelarija direktora i drugog osoblja (pomoćnici direktora, sekretar, računovođa, psiholog, pedagog, defektolog), toaleti, tehničke i pomoćne prostorije. Na prvom spratu škole predviđene su učionice, hol, toaleti, tehničke i pomoćne prostorije.
- Projekat će se finansirati iz sredstava Evropske investicione banke, granta Bilateralne Donor Grupe i Vlade Crne Gore.
- Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti koje se odnose na ugovaranje izvođenja radova. Ugovaranje vršenja stručnog nadzora nad građenjem škole sprovodi Ministarstvo prosvjete.
- Ugovor za vršenje stručnog nadzora nad građenjem škole je potpisalo Ministarstvo prosvjete sa kompanijom “Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company”.
- Ugovor broj CPA/MNE/IPAI/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 sa konzorcijumom LD „Gradnja“ d.o.o, „Ramel“ d.o.o., „Eurozox“ d.o.o. i „Ening“ d.o.o., potpisan je 24.08.2023. godine na iznos od 6.967.177,01€.
- Objekat je završen i predat na upotrebu u aprilu 2025. godine.
- 2025. godini realizovano je 2.480.745,94€.





16.26. Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat

- Opština Tivat je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 27.07.2022. godine.
- Ugovor br. 01-334/23-29/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 10.01.2023. godine na iznos od 4.716.740,29€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-4821/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22.08.2023. godine, na iznos od 94.911,19€.
- Izvođač radova je uveden u posao u septembru 2023. godine.
- Objekat je završen i predat na upotrebu u decembru 2025. godine.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 2.493.504,13€.





16.27. Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić

- U toku su aktivnosti usaglašavanja potreba od strane Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Nakon što potrebna dokumentacija bude dostavljena Upravi za kapitalne projekte, Uprava će pokrenuti aktivnosti na nabavci vozila.
- Krajem 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za nabavku autobusa za gradski i đачki prevoz procijenjene vrijednosti 410.000,00€ bez pdv-a i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje raspisano je u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6678/1 sa „Ben kov” d.o.o. Tivat, zaključen je 02.12.2024. godine na iznos od 499.596,9€.
- Završena je primopredaja autobusa od strane dobavljača, predstavnika Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
- U 2025. godini realizovano je 499.806,90€.

16.28. Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ „Meksiko” u Baru

- Osnovna škola „Meksiko” je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u Baru, KO Polje, opština Bar. Površina objekta je 2.370 m², spratnosti prizemlje i sprat.
- Osnovna škola dostavila je projektnu dokumentaciju za sanaciju krovnog pokrivača u postojećim gabaritima.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.02.2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7534/1 sa izvođačem „M Solutions” d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.12.2024. godine, na iznos od 263.931,25€.
- Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7394/1, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 6.050,00€.
- Završeni su svi ugovoreni radovi i predati su korisniku 10.10.2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 264.441,21€.

16.29. Rekonstrukcija fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići” u Pečuricama, Opština Bar

- Opština Bar je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
- Objekat se nalazi u dvorištu Osnovne škole “Mrkojevići” Pečurice, Opština Bar.
- Predviđena spratnost objekta je prizemlje i sprat. Dimenzije fiskulturne sale su 30.65x20.00m.
- Fiskulturna sala posjeduje: sportski teren, tribine kapaciteta 184 sjedišta, dvije svlačionice sa toaletima, pet toaleta, špet kancelarija, salu za sastanke i šest tehničkih prostorija.

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-784/1 sa izvođačem radova „Kalamper” d.o.o. Bar, zaključen je 20.02.2024. godine na iznos od 1.164.422,34€.
- Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7611/1, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 32.186,00€.
- Završeni su zemljani i armirano betonski radovi, a u toku su radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
- Radovi su obustavljeni zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji na koje je ukazao stručni nadzor.
- Opština Bar, kao nosilac izrade i revizije glavnog projekta je izvršila izmjenu projektne dokumentacije nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove krajem decembra 2025. godine, procijenjene vrijednosti 650.000,00€ bez pdv-a i isto je u toku.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.



16.30. Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektnu dokumentaciju, te je Uprava za kapitalne projekte na osnovu iste, pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u aprilu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 1.850.000,00€ bez pdv-a, i na istom nije bilo pristiglih ponuda.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-612/1 sa „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 10.02.2025. godine na iznos od 2.348.223,75€.
- Ugovor br. 01-334/25-1316/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.07.2025. godine na iznos od 58.960,88€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini realizovano je 469.644,75€.

16.31. Izgradnja sportske sale za JU OŠ „Bajo Jojić” u Andrijevici

- Nakon dostavljanja projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte je u junu 2022. godine pristupila aktivnostima na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta idejnog rješenja i glavnog projekta. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Andrijevica, Osnovne škole „Bajo Jojić” i JU Srednje mješovite škole.
- Projektnim zadatkom planirana je rekonstrukcija – dogradnja sportske sale bruto površine do 1.700 m². Sadržaji obuhvataju igralište za košarku i odbojku, montažne tribine, svlačionice, prostoriju za nastavnika, spravarnicu kao i ostale tehničke i prateće prostorije.
- Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.06.2022. godine Ugovor br. 01-334/22-5708/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2022.godine, na iznos od 27.588,00 €.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-819/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.02.2023. godine na iznos od 4.658,50€. S obzirom da je po prvobitnom idejnom rješenju projektantska procijenjena vrijednost izgradnje objekta prevazilazila iznos investicije opredijeljen kroz obrazloženje projekta u budžetu, izvršena je racionalizacija idejnog rješenja.
- Završena je revizija projektne dokumentacije krajem februara 2025. godine.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u junu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 3.145.000,00€ bez pdv-a i u toku je vrednovanje ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u junu 2025. godine, procijenjene vrijednosti 100.000,00€ bez pdv-a u toku je vrednovanje ponuda.
- U 2025. godini realizovano je 18.452,50€.

16.32. Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici

Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole „Ing. Marko Radević”, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak za adaptaciju fiskulturne sale za potrebe JU „Ing. Marko Radević”, Podgorica.
- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je 07.11.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-7294/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2023. godine na iznos od 17.908,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7348/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Arhiplan” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2023. godine na iznos od 7.260,00€.
- Ugovor br. 01-334/24-1797/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 09.04.2024. godine na iznos od 9.607,40€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisivano je u aprilu, a zatim i u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 592.014,7€ i na istim nije bilo pristiglih ponuda. Ponovno javno nadmetanje sa uvećanom procijenjenom vrijednošću raspisano je u oktobru 2024. godine i isto je poništeno zbog neispravnih ponuda.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je ponovo raspisano u septembru tekuće godine. Ugovor br. 01-426/25-3051/1 sa izvođačem radova „LD gradnja” d.o.o. Nikšić zaključen je 03.12.2025. godine na iznos od 834.227,21€.
- U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.33. Izgradnja fiskulturne sale „Ivo Visin” Prčanj, Kotor

- Opština Kotor je dostavila projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

- Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta izgradnje fiskulturne sale „Ivo Visin“ u Prčnju raspisano je u novembru 2023. godine i isto je ponovljeno u decembru 2023. godine procijenjene vrijednosti 30.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/24-4555/1 sa „Urbi.pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 09.08.2024. godine na iznos od 36.300,00€.
- Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6677/1 sa „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.12.2024. godine na iznos od 5.638,6€.
- Završena je revizija glavnog projekta i isti je poslat Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na izdavanje građevinske dozvole.
- U 2025. godini realizovano je 18.150,00€.

16.34. Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je dostavilo projektnu dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte, na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U aprilu 2024. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjene vrijednosti 6.000.000,00€ bez pdv-a, kao i javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora.
- Ugovor br. 01-908/24-4323/1 sa „Kozorcijumom „LD gradnja“, „Ramel“ i „Ening Nikšić“ d.o.o., zaključen je 05.08.2024. godine, na iznos od 7.204.772,28€.
- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbjeđuje stručni nadzor nad izvođem rješenja.
- Svi radovi su završeni, u toku je garantni period od godinu dana.
- U 2025. godini realizovano je 2.498.407,16€.

16.35. Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine procijenjene vrijednosti 1.121.992,45€ i isto je poništeno.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u decembru 2024. godine, procijenjene vrijednosti 22.600,00€ i isto je poništeno.
- Obaveza opštine Tivat je da dostavi inovirani projekat kako bi Ministarstvo javnih radova preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.36. Adaptacija krova vrtića JPU „Vukosava Ivanović“, Bar

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u avgustu 2024. godine, procijenjene vrijednosti 296.634,4€ i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7356/1 sa „Tehno gradnja“ d.o.o. Pljevlja i „Arhiplan Cg“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.12.2024. godine na iznos od 357.769,79€.
- Ugovor br. 01-334/24-4936/1 sa vršiocom stručnog nadzora „Marting project“ d.o.o. Podgorica zaključen je 03.09.2024. godine na iznos od 9.438,00€.
- Svi radovi su završeni u septembru 2025. godine.
- U 2025. godini realizovano je 365.481,06€.

16.37. Rekonstrukcija JU OŠ „Radomir Mitrović” – područno odjeljenje u Donjim lugama, Opština Berane

- Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2023. godine dostavilo projektni zadatak Upravi za kapitalne projekte.
- Ugovor o izradi glavnog projekta rekonstrukcije br. 01-334/23-3636/1 sa preduzećem „Urbi.pro”, zaključen je 19.06.2023. godine na iznos od 9.667,90€.
- Ugovor o vršenju revizije br. 01-334/23-36511 sa preduzećem „Arhiplan CG”, zaključen 20.06.2023. godine na iznos od 8.349,00€.
- Ugovor br. 01-334/23-7607/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ingenium” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u decembru 2023. godine. Ugovor br. 01-334/24-3573/1 sa ponuđačem „Gold Grading” d.o.o. Berane i podugovaračem „Civil Engineer” Podgorica, zaključen je 24.06.2024. godine na iznos od 356.235,83€.
- Radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 299.807,33€.



16.38. Izgradnja novog vrtića u Nikšiću

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-269/1 sa „LD gradnja” d.o.o. Nikšić, zaključen je 24.01.2025. godine na iznos od 1.979.583,46€.
- Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je u oktobru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/25-428/1 sa „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.01.2025. godine na iznos od 15.651,35€.
- Radovi se ne izvode. Obaveza Opštine Nikšić je da izmjesti trafostanicu, koja se nalazi na parceli koja je predviđena za izgradnju vrtića, nakon čega će otpočeti radovi.
- U 2025. godini je realizovano je 395.916,69€.

16.39. Izgradnja paviljona u sastavu OŠ „Oktoih”, Podgorica

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dostavilo je Upravi za kapitalne projekte projektnu dokumentaciju na osnovu koje je Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Javno nadmetanje za izbor projektanta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi”, raspisano je u septembru 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-7193/1 sa „BB solar” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2024. godine na iznos od 2.831.400,00€.
- Ugovor br. 01-334/25-328/1 sa revidentom „Institut za razvoj i istraživanje” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.01.2025. godine na iznos od 7.502,00€.
- Ugovor br. 01-426/25-2594/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Genesis project” d.o.o. zaključen je 30.10.2025. godine na iznos od 31.944,00€.
- Izvođač je uveden u posao u decembru 2025. godine i u toku je izvođenje radova.
- U 2025. godini realizovano je 334.105,20€.

16.40. Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat

- Obaveza Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je da izradi projektni zadatak i sprovede konkursnu proceduru za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo javnih radova će u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
- U 2025. godini nije bilo utroška sredstava.

16.41. Adaptacija sistema grijanja u školskim objektima

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za adaptaciju sistema grijanja raspisano je u julu 2024. godine.
- JU Srednja ekonomska škola Mirko Vešović - Ugovor broj 01-334/24-6736/3 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024, na iznos od 140.525,49€.
- JU OŠ „Polica”, Berane - Ugovor broj 01-334/24-6736/1 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024 na iznos od 198.380,36€.
- JU OŠ „Kekec”, Sutomore i JU OŠ „Zarija Vujošević”, Zeta - Ugovor broj 01-334/24-6736/3 sa izvođačem radova „Ening” d.o.o. Nikšić, zaključen je 04.12.2024 na iznos od 467.175,81€.
- JU OŠ „18 Oktobar”, Bioče i JU OŠ „Vojin Popović”, Drezga - Ugovor broj 01-334/24-6244/1 sa izvođačem radova „Thermia“ d.o.o. Podgorica zaključen je 08.11.2024 na iznos od 240.731,50€.
- Vršenje stručnog nadzora nad adaptacijom sistema grijanja, obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.
- Svi radovi su završeni.
- U 2025. godini ukupno je realizovano 883.480,88€.

16.42. Adaptacija školskog dvorišta JU Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović”, Podgorica

- Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u maju 2024. godine, procijenjene vrijednosti 145.207,54€ bez pdv-a i isto je poništeno.
- Ponovno javno nadmetanje je raspisano u julu 2024. godine. Ugovor br. 01-334/24-6003/1 sa ponuđačima „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica, „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica sa podugovaračem „D&D-ing” d.o.o. Berane, zaključen je 28.10.2024. godine na iznos od 174.514,59€.
- Ugovor br. 01-908/24-4910/2 sa vršiocem stručnog nadzora „Marting project” d.o.o. Podgorica, zaključen je 02.09.2025. godine na iznos od 7.139,00€.
- Radovi su završeni i objekat je predat na upotrebu.
- U 2025. godini realizovano je 78.932,98 €.
