

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA INTENZIVNE REVITALIZACIJE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE

U skladu sa obavezom koja je utvrđena Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, Ministarstvo kapitalnih investicija prikuplja podatke i informacije od „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica (CEDIS) i iste dostavlja Vladi na razmatranje.


U prethodnim izvještajima predstavljena je struktura Projekta revitalizacije 10kV i 0.4kV elektroenergetske mreže, opisani radovi i definisana planirana dinamika aktivnosti na Projektu.

Dalekovodi koji su bili kanadidovani za ovaj projekat su u cijelosti završeni. U pitanju su dva projekta 3097 i 3157. Ovim projektima je remontovano ukupno 775 km dalekovoda.


Kroz aktivnosti zaposlenih CEDIS-a rađena je revitalizacija dalekovoda, stubnih trafostanica i niskonaponske (NN) mreže i trenutno je stavljen akcenat na projekte 3081, 3159, 3160, 4615 i 4616. Svi ovi navedeni Projekti su bazirani na principu da materijal nabavi CEDIS i da elektromontažni dio radova rade zaposleni u CEDIS-u. Građevinski dio radova rade eksterne firme.

Projekat 3081 traje od 2019. godine i cilj je da se ove godine objekti koji su započeti završe. Od početka projekta pa sve do danas je započeto 709 objekata, od čega je 556 završeno. Vrijednost radova za završene objekte je preko 8.000.000,00€. Ukupna vrijednost radova, na projektu 3081, realizovanih sopsstvenim snagama iznosi 12.319.672,87€.


U I godini realizacije u okviru projekta 3081 odrađeno je 553 km dalekovoda

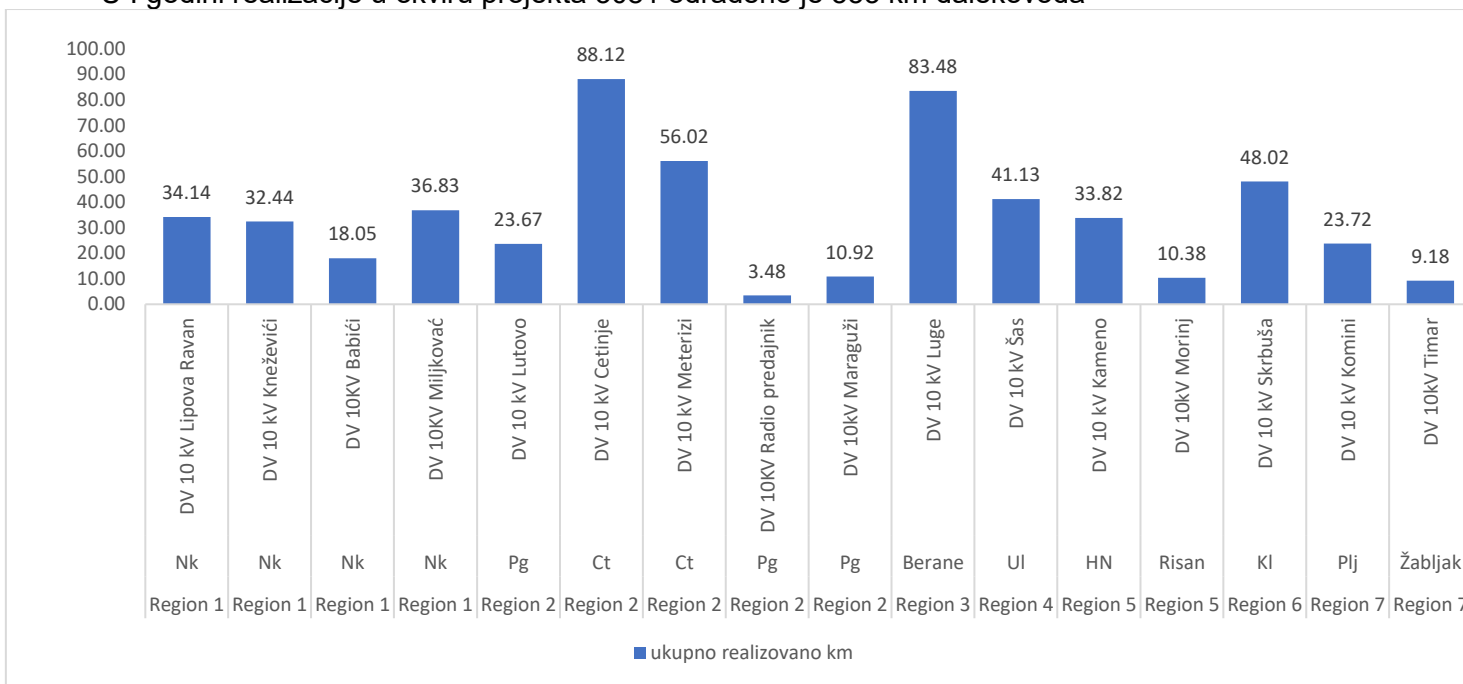

U II godini realizacije u okviru projekta 3081 odrađeno je 185,83 km dalekovoda

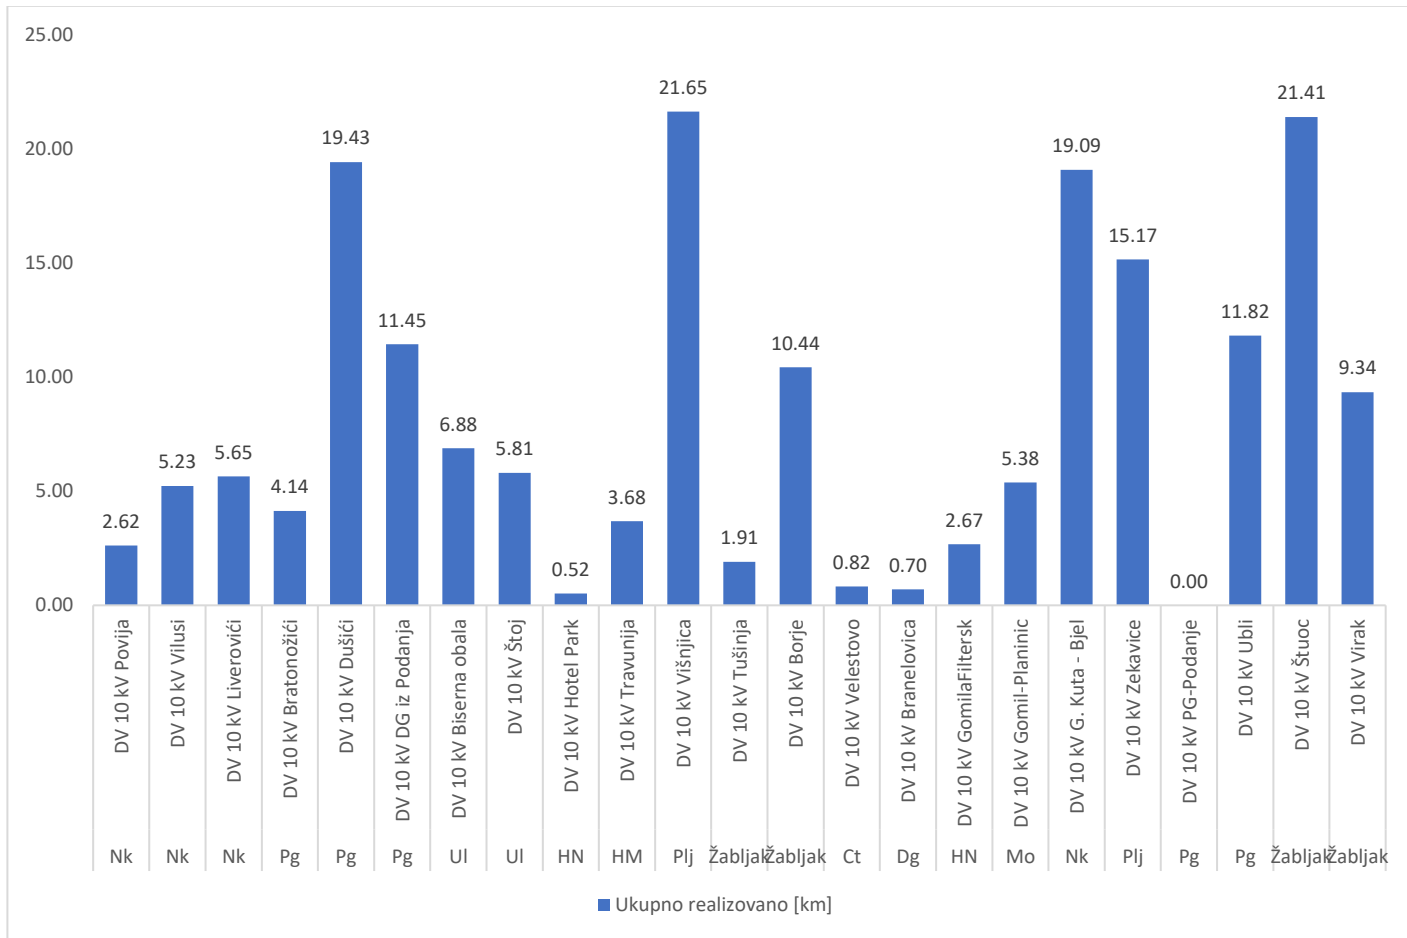

Projekat 3159 je započet 2022. godine i na njemu je do sad završeno 43 objekta, 25 aktivirano i na 62 objekta radovi su u toku. Vrijednost uloženi radova na objektima koji su završeni je 99.163,06€.

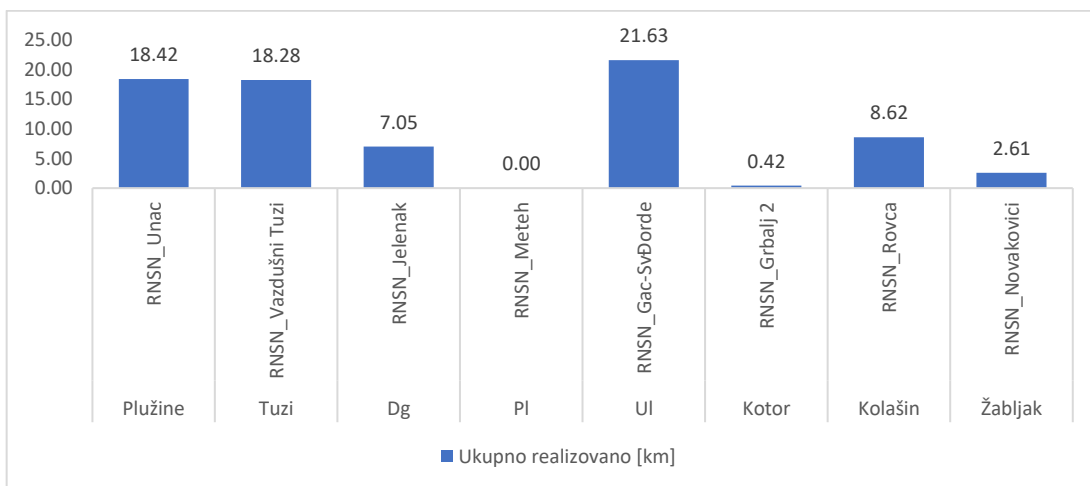

Projekti 4615 i 4616 bazirani su na objektu DV 10kV Rovca, na kojima je ukupna vrijednost do sada izvedenih radova 200.580,20€.

Pored navedenog CEDIS je pokrenuo tendere za 8 dalekovoda, za nabavku materijala i tendere za

građevinski dio radova. U pitanju su dalekovodi koji se nalaze u sljedećoj tabeli:

REGION	Naziv dalekovoda	Opština
Region 1	DV 10kV Unač	Plužine
Region 2	DV 10kV Vazdušni Tuzi i DV 10kV Jelenak	Podgorica-Tuzi
Region 3	DV 10kV Meteh	Plav
Region 4	DV 10kV Gač	Ulcinj
Region 5	DV 10kV Grbalj 2	Kotor
Region 6	DV 10kV Rovca	Kolašin
Region 7	DV 10kV Novakovići	Žabljak

Trenutno CEDIS ima potpisane ugovore za sedam dalekovoda. Za osmi dalekovod 10kV Grbalj 2, koji je dva puta objavljivao tender, nemaju ponuđača.

Naziv dalekovoda	Datum potpisivanja
DV 10kV Vazdušni Tuzi	31.08.2022
DV 10kV Jelenak	07.07.2022
DV 10kV Rovca	18.07.2022
DV 10kV Unač	18.07.2022
DV 10kV Meteh	18.07.2022
DV 10kV Gač	04.07.2022
DV 10kV Novakovići	06.12.2022
DV 10kV Grbalj 2	/

Ovim projektom je predviđeno revitalizacija 262 km dalekovoda, odnosno ugradnja 1990 drvenih stubova, 765 betonskih stubova i 463 čelično-rešetkastih stuba, što ukupno iznosi 3218 stubova. Broj trafostanica koje su predviđene za remont je 130.

U narednoj tabeli prikazan je broj ugrađenih stubova na dalekovodima, zaključno sa 01.07.2023. godine:

Naziva dalekovoda	Drveni stubovi	AB stubovi	ČR stubovi	Ukupno
DV 10kV Vazdušni Tuzi	30	131	0	161
DV 10kV Jelenak	22	36	1	59
DV 10kV Rovca	83	28	10	121
DV 10kV Unač	210	4	0	214
DV 10kV Meteh	0	0	0	0
DV 10kV Gač	173	1	9	183
DV 10kV Novakovići	37	0	0	37
DV 10kV Grbalj 2	2	0	1	3

Projekat 3160 je započet 2022. godine i na njemu je do sad završen i aktiviran 1 objekat, a na 118 objekata radovi su u toku. Vrijednost uloženi radova na objektu koji je završen je 53.661,16€.
