

**Predlog**



**PLAN RADA ZA  
2025. GODINU**

## **Pravni osnov**

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monteput“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo, registrovano kod CRPS, na osnovu odluke Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br.33/14), u okviru ovog Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar-Boljare, koja je, Odlukom Vlade Crne Gore broj 08-011/24-2872/2 od 30. maja 2024. godine, preimenovana u Poslovnu jedinicu za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

Na osnovu odredbi Statuta, u skladu sa definisanim nadležnostima, zaključeni su sljedeći ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa „Monte put“ d.o.o. 14.06.2007. godine, zatim Aneks Ugovora od 14.06.2007. godine i Aneks 2 Ugovora od 08.11.2013. godine, Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo, od 27.10.2014. i Aneks 1 ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlašćenja „Monteput“ d.o.o. Podgorica – PJ Autoput Bar – Boljare kao upravljača projektom i Predstavnika Investitora u izvršavanju Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

U članu 14 Statuta „Monteput“ d.o.o., definisana je obaveza donošenja Finansijskog plana i Plana rada sa smjernicama za njihovo izvršavanje od strane Odbora direktora, uz prethodnu saglasnost Osnivača, odnosno Vlade Crne Gore. Takođe, članom 5 Odluke o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori, definisano je da se Plan rada ove Poslovne jedinice iskazuje u okviru Plana rada Društva.

## **Osnovna djelatnost Društva**

Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to:

- upravljanje auto-putevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita auto-puteva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; priprema poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na građenju novih puteva i rekonstrukciji postojećih i stručni nadzor nad izvođenjem radova; planiranja redovnog održavanja, stručna kontrola nad redovnim održavanjem auto-puteva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; objavljivanje poziva za nadmetanje i zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; vođenje evidencije; praćenje utroška finansijskih sredstava; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju i rekonstrukciju auto-puteva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate naknade za upotrebu auto-puteva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata (putarina ili korisnička naknada); praćenje stanja putne mreže; zaštita puta; upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, drugi poslovi od značaja za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putevima, kao i ostale poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju auto-puteva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori;
- organizovanje održavanja tunela “Sozina“ i prilaznih saobraćajnica (građevinsko i elektromašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja;
- stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment;
- upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

## **Plan rada „Monteput“ d.o.o.**

U 2025. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su poslovi upravljanja autoputem Bar-Boljare, dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijevaju upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu, održavanje autoputa, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, i upravljanje objektima u svrhu komercijalnog korišćenja, uz prioritarnu dionicu autoputa Bar- Boljare, Smokovac-Mateševo; poslovi na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, održavanje tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“, te ubiranje prihoda od naknada koje, shodno odredbama Zakona o putevima, pripadaju ovom privrednom društvu.

„Monteput“ je za 2025. godinu planirao sprovođenje tenderske procedure, koja je započela u novembru 2024. godine, objavljivanjem javnog poziva, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i podzakonskim aktima, radi davanja u dugoročni zakup zemljišta na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, (odmorišta Mrke-lijeva strana) imajući u vidu da je u 2024. godini, nakon uspješno sprovedene tenderske procedure, zaključen ugovor sa a.d. „Jugopetrol“ Podgorica, za zakup zemljišta radi izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima, na lokaciji Mrke desno, iz pravca Podgorice prema Kolašinu.

U cilju održavanja dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo i tunela „Sozina“ sa saobraćajnicama, u skladu sa zadatim evropskim standardima, planirano je redovno održavanje objekata, opreme i sredstava rada, kao i određena investiciona ulaganja koja će doprinijeti poboljšanju uslova eksploatacije navedenih objekata.

U dijelu investicionih ulaganja za potrebe autoputa Bar-Boljare, planirana je integracija sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje, nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde, izrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona, ugradnja EKO zaštitnog uređaja za efikasno odvracanje divljači, ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza, nabavka horizontalne i vertikalne signalizacije za naznačavanje slabije vidljivosti u zonama česte pojave magle, regulacija pribrežnih i procjednih voda u zoni mosta Jabuka i rekonstrukcija potpornog zida na regionalnom putu R-13.

U dijelu značajnijih investicionih ulaganja za potrebe tunela Sozina planirana je sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima, nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina.

Za potrebe autoputa i Sozine, u dijelu investicionih ulaganja, planirana je i nabavka rampi za brze staze i rezervnih djelova (opruge, letva rampe, senzor kraka rampe,) apsorbera/ublaživača udara, te radovi na izgradnji infrastrukture za elektro punjače u sklopu baza za održavanje.

U 2025. godini Planom je predviđen značajan broj aktivnosti i radova na tekućem građevinskom održavanju dionice Smokovac-Mateševo i tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, koji će poboljšati putnu infrastrukturu i funkciju, a pretežno se, za potrebe autoputa, odnose na:

- nabavku elemenata čelične odbojne ograde;
- zamjenu / popravku svih stubova na trasi sa krutom horizontalnom vezom i nabavku rezervnih tabli i ostalih dijelova vertikalne saobraćajne signalizacije;
- geodetsko opažanje mjernim instrumentima objekata na trasi autoputa;

a za potrebe tunela „Sozina“, na:

- osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš;
- renoviranje Komandnog centra, Naplatnog centra i trafo stanica, sanacija vrata na ulazima u galerije na proširenjima u tunelu Sozina (krov, bravarija);
- sanaciju pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima

Planirani značajniji radovi na tekućem građevinskom održavanju kako dionice Smokovac-Mateševo tako tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, odnose se na:

- čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom;
- ugradnju elemenata čelične odbojne ograde;
- nabavku materijala i izvođenje ostalih građevinsko-zanatskih radova koji se ne mogu predvidjeti na objektima i u putnom pojasu i radovi za hitne intervencije.

Potrebe tekućeg održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme , na autoputu i Sozini, realizovaće se kroz nabavku led reflektora i raznih sijalica za tekuće održavanje, održavanje klima uređaja, nabavku i ugradnju djelova za održavanje i servis klima uređaja, nabavku i ugradnju rezervnih djelova za održavanje ormara automatike (trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markri, promjenljive signalitacije, video nadzora i sl), servis senzora CO, vidljivosti i strujanja vazduha (elektrohemijske ćelije za CO i VIS, CO-G u galerijama,...), vanredne i redovne servise i nabavku uređaja za besprekidno napajanje - UPS, nabavku baterija za uređaje za besprekidno napajanje, vanredne i redovne servise i nabavku i ugradnju rezervnih djelova za aggregate, održavanje ormara sa soft starterima za jet fenove, nabavku opreme i rezervnih djelova i servisiranje sistema za vodosnabdijevanje, nabavku i ugradnju rezervnih djelova za redovno održavanje sistema naplate putarine, nabavku i ugradnja rezervnih djelova za održavanje video zida, video kontrolera, monitor a u komandnom centru, održavanje SCADA Sistema, nabavku i ugradnju ventilatora i održavanje sistema ventilacije, sanaciju optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova, nabavku i ugradnju djelova za sistem dojave požara i PP zastite, održavanje softvera za naplatu putarine i dr.

U 2025. godini kontinuirano i u skladu sa potrebama, izvodiće se radovi, koji se odnose na tekuće održavanje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, te održavanja prilaznih saobraćajnica tunelu Sozina, a koji se pretežno odnose na zimsko održavanje, redovno ljetnje održavanje, košenje i čišćenje trapezastih kanala odvodnje i organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova.

Monte put je, u proteklom periodu, ubirao prihod od izdavanja bilborda, na putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunela "Sozina", kroz zaključivanje pojedinačnih ugovora o zakupu. Tokom 2024. godine, ugovorena je dugoročna saradnja za izdavanje svih lokacija za bilborde, sa firmom "S plus", uz ugovorenu godišnju naknadu prema Monteputu, kao zakupodavcu, pa će se ova saradnja nastaviti i u 2025. godini.

Kroz nabavku osnovnih sredstava i materijala obezbijediće se nesmetano obavljanje djelatnosti Društva.

### **Infrastrukturni projekti**

Monteput je, za projektovanje i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevića, aplicirao za dodjelu sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj. Pregovori sa EBRD započeli su u 2024. godini, pripremom dokumentacije u skladu sa procedurama EBRD-a, na način da je Monteput kompletirao neophodnu dokumentaciju koja se odnosi na zaštitu životne sredine i socijalni aspekt – ESIA. U 2024. godini, raspisan je pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova, kao i tenderi za izbor konsultanta nad projektovanjem i izvođenjem radova i izbor nadzornog organa. U 2025. godini očekuje se raspisivanje glavnog tendera za izbor izvođača radova.

### **Projektovanje-idejni/glavni projekti - sredstva Kapitalnog budžeta**

U toku 2024. godine raspisani su tenderi za Izradu idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Andrijevića - Berane – Boljare i Izradu idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Smokovac – Tološi i tender za Izradu idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Podgorica - Bar, poddionica Virpazar - Stari Bar. Završetak tenderskih postupaka i zaključivanje ugovora očekuje se u 2025. godini.

Za 2025. godinu planirano je raspisivanje tendera za Izradu idejnog/glavnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Tološi – Virpazar.

### **Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta**

U toku 2024. godine ugovorena je izrada idejnog rješenja autoputa Bar -Boljare, dionica: Stari Bar - Sukobin i izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice, dionica: Crnča – Pljevlja. Za 2025. godinu planirano je raspisivanje tendera za izradu idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Petlja Primorske saobraćajnice – Markovići, izradu Glavnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Markovići - Lastva Grbaljska, izradu idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Lastva Grbaljska - Debeli Brijeg i izradu idejnog projekta brze saobraćajnice, poddionica: Nikšić – Šavnik, Šavnik - Žabljak, Žabljak - Pljevlja (Vrulja).

### **Planirane Investicije iz sredstava dobiti**

Sredstva dobiti Društva iz prethodnih godina, koja su raspoređena zaključcima Vlade Crne Gore, koristiće se za Idejne/glavne projekte, za koje će se raspisati tenderski postupci u 2025. godini, i to:

Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica – Grahovo;  
Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, petlja: Grahovo-granica BIH ;  
Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Pljevlja - granica sa BIH;  
Izrada idejnog projekta autoputa Andrijevića - Peć, dionica: Andrijevića - granica sa Kosovom;  
Izrada idejnog/glavnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Danilovgrad – Nikšić;

Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Smokovac – Božaj;  
Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevića – Peć;  
Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja – Goražde;  
Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva;  
Izrada idejnog rješenja Virpazar – Sukobin;  
Izrada idejnog rješenja Danilovgrad – Nikšić;  
Izrada idejnog rješenja Jadransko-Jonskog autoputa, dionica: Čevo - granica BiH;  
Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Smokovac – Božaj;  
Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Nikšić – Pljevlja;  
Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Podgorica – Danilovgrad;  
Izrada idejnog rješenja regionalnog puta Rijeka Crnojevića – Virpazar;  
Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar-Boljare sa Jadransko-jonskim autoputem;

### **Način i uslovi finansiranja Plana rada:**

Plan rada je urađen na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2024. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2025. godinu.

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monteput“ d.o.o. u dijelu upravljanja i održavanja, kako dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, tako i cjelokupnog sistema tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, detaljno su prikazani u Finansijskom planu ovog Društva za 2025. godinu.

Plan rada za 2025. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2025. godinu.

Finansiranje rashoda Društva planira se iz sopstvenih sredstava, sredstava dobiti Društva i sredstava iz Kapitalnog budžeta Crne Gore.

**FINANSIJSKI PLAN “MONTEPUT” D.O.O. PODGORICA ZA  
2025. GODINU**



## Pravni status

„Montepuť“ d.o.o. Podgorica je jednoćlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list RCG“, br. 76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Montepuť“ d.o.o. („Sl.list CG“, br. 101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br. 35/14), osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar-Boljare. Odlukom Vlade Crne Gore broj 08-011/24-2872/2 od 30. maja 2024. godine, preimenovana u Poslovnu jedinicu za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u Podgorici 09.05.2006. godine pod reg. br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti 5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici, ul. Avda Međedovića br. 130.

Djelatnost „Montepuť“ d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) definisana je navedenim odlukama Vlade Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zakljućenim između Vlade Crne Gore - Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Montepuť“ d.o.o. sa druge strane.

## Osnovne odredbe

Ćlanom 14 stav 2 Statuta ovog Društva definisana je obaveza donošenja Plana rada i Finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivaća, odnosno Vlade Crne Gore.

Na osnovu predloga Plana rada za 2025. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i raspoloživim sredstvima na poslovnim računima rezervisanim za ugovorene – nerealizovane planske obaveze iz 2024. godine, urađen je predlog Finansijskog plana za 2025. godinu.

## Izvori finansiranja i struktura prihoda

Finansijskim planom predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu 137,476,579.80 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sljedećih izvora:

1. Prihoda Društva (sa PDV-om)
  - 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica -  
----- 13,131,045.00€
  - 1.2. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritete dionice Smokovac-Mateševo----- 11,628,728.00 €
  - 1.3. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda, prihoda od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva-----  
----- 881,225.00€
2. Prihoda od raspodjele dobiti 2021. i 2022. godine, raspoređenih Zaključkom br.08-011/23-6295/2 od 29. decembra 2023. godine----- 2,452,058.00€
3. Sredstava dobiti iz 2023. godine raspoređenih Zaključkom Vlade CG br. 10-011/24-6182/2 od 08.11.2024.g-----3,067,526.00€
4. Priliva od povraćaja sredstva za plaćene poreze-----1,300,000.00€



5. Priliva sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025. godinu, sa pozicije 17 020 K03 002-Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice-----5,000,000.00€
6. Priliva sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025. godinu, sa pozicije 17 020 K003 001-Autoput Bar-Boljare----- 100,016,000.00€.

Planirani prihodi "Montepuť" d.o.o. za 2025. godinu

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2025. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2024. godini.

**Tabela 1.**

	<b>PRILIVI SREDSTAVA</b>	<b>Realizovani prihodi u 2024. godini (eura)</b>	<b>Planirani prihodi u 2025. godini (eura)</b>	<b>2025/2024</b>
1.1.	Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	12,687,000.00	13,131,045.00	1,035
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo	11,074,976.00	11,628,724.80	1,05
1.3.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa-bilborda, prihoda od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva	881,235.00	881,225.00	0.99
<b>1.</b>	<b>Ukupni poslovni prihodi</b>	<b>24,643.211.00</b>	<b>25,640,994.80</b>	<b>1.04</b>
2.	Sredstva dobiti iz 2021/2022g. po Zaključku Vlade CG br.08-011/23-6295/2 od 29. 12. 2023.g		2,452,058.00	
3.	Sredstva dobiti iz 2023.g. po Zaključku Vlade CG br. 10-011/24-6182/2 od 08.11.2024.g		3,067,526.00	
4.	Priliv od povraćaja sredstva za plaćene poreze	715,280.31	1,300,000.00	
5.	Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025.g pozicije 17 020 K03 002-Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice		5,000,000.00	
6.	Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025.g pozicije 17 020 K003 001-Autoput Bar-Boljare		100,016,000.00	
	<b>Ukupni prilivi sredstava (1-6)</b>	<b>25,358,491.31</b>	<b>137,476,579.80</b>	



Cilj Društva je realizacija kapitalnih investicija u projekat nastavka izgradnje auto-puta Bar-Boljare, preduzimanje aktivnosti za unaprjeđenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju obaveza za investicije iz Kapitalnog budžeta, kao i modernizacija sistema naplate u integracije sistema naplate tunel Sozina i auto-put Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, pružanje kvalitetnijih usluga našim

korisnicima, razvoj novih korisničkih servisa dopune računa putem Web i mobilne aplikacije kao i bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela „Sozina“ i „Raš“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

### **Obrazloženje planiranih prihoda**

Na osnovu rezultata poslovanja „Monte put“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na naplatnim mjestima tunel Sozina i autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirani su prihodi za 2025. godinu.

#### **1. Ukupni poslovni prihodi:**

**1.1. i 1.2.** Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju "Monteput" d.o.o. („Službeni list RCG”, broj 76/05, 68/09, 33/14, 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Službeni list RCG”, broj 48/08, 20/12, 31/14, 082/20 i 065/22). Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2024. godini, planirani su prihodi od naplate putarine za poslovnu 2025. godinu veći za 4.2%. Ukupni poslovni prihod za 2025. godinu planiran je za 5.7% više nego u prethodnoj godini. Imajući u vidu činjenicu da se cijene naplate neće uskladivati, kao i činjenicu da su realizovani prihodi u 2024. godini 11.54% veći nego u 2023. godini, nije realno očekivati značajnije povećanje prihoda u 2025. godini. Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina planiran je u iznosu 13,131,045.00 eura sa PDV-om, što je 3,5% više nego u 2024. godini.

Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za saobraćaj 13.07.2022. godine, a naplata putarine počela je 21.07.2022. godine. Naplata se vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Na osnovu pokazatelja poslovanja u 2024. godini, planiran je prihod za 2025. godinu na većem nivou za 5%.

**1.3.** „Monteput“ raspolaže sa 39 reklamnih panoa - bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa - bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 5915. Prihodi od izdavanja bilborda, prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih kablova mobilnih operatera, i ostali prihodi koje Društvo planira da ostvari planirani su u iznosu 881,225.00 eura

sa PDV-om. U ukupno planiranim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 3.4%.

**2. Prihod od raspodjele dobiti iz 2021. i 2022. godine**

raspoređena je Zaključkom Vlade Crne Gore br. br.08-011/23-6295/2 od 29. decembra 2023. godine u iznosu 2,452,059 eura. Zaključkom je dobit dodijeljena Monteputu za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput, kao i administrativo-tehničke poslove za autoputeve i brze saobraćajnice.

**3. Prihod od raspodjele dobiti iz 2023. godine**

raspoređena je Zaključkom Vlade Crne Gore br. 10-011/24-6182/2 od 08.11.2024. godine u iznosu 3,067,526.00 eura. Zaključkom je dobit dodijeljena Monteputu za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput, kao i administrativo-tehničke poslove za autoputeve i brze saobraćajnice.

**4. Priliv od povraćaja sredstva**

naplaćenih Izvršnim rješenjem na ime poreza na nepokretnost, koje je u sudskom postupku poništeno, očekuje se od Opštine Bar u iznosu 1,300,000.00 eura.

**5. Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025. godinu**

sa pozicije 17 020 K03 002-Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice- za realizaciju kapitalnih projekata čija se realizacija za 2025. godinu planira u iznosu 5,000,000.00 eura.

**6. Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025. godinu**

sa pozicije 17 020 K003 001-Autoput Bar-Boljare za realizaciju kapitalnih projekata vezanih za nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare, čija se realizacija za 2025. godinu planira u iznosu od 100,016,000.00 eura.



## Struktura rashoda

U tabeli 2. dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog plana, rashoda za upravu (menadžment, pravni sektor, sektor za finansijske i računovodstvene poslove i sektor za tehničku pripremu, nadzor i održavanje); sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela „Sozina” i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare-dionica Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada.

**Tabela 2.**

		Uprava	Sozina	Auto-put-dionica Smokovac-Mateševo	PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupno plan 2025.
1.	<b>INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	67,668.00	6,207,808.00	5,551,447.70	72,500.00	11,899,423.70
1.1.	<b>Investiciona ulaganja</b>		3,617,400.00	1,413,524.70	0	5,030,924.70
1.1.1.	Nabavka rampi za brze staze i rezervnih djelova (opruge, letva rampe, senzor kraka rampe,...)		50,000.00	15,000.00		65,000.00
1.1.2.	Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Naplatnog centra		15,000.00			15,000.00
1.1.3.	Nabavka/zamjena kontrole pristupa u zgradi NC-a i naplatnim kućicama		10,000.00			10,000.00
1.1.4.	Usluga integracije sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje			165,000.00		165,000.00
1.1.5.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima		2,921,400.00			2,921,400.00
1.1.6.	Izrada podloge od štampanog betona na podnoj ploči ljetnikovca.			8,000.00		8,000.00
1.1.7.	Nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina		185,000.00			185,000.00
1.1.8.	Provlačenje i povezivanje optickog voda kroz tunel Sozina		21,000.00			21,000.00
1.1.9.	Nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde			100,000.00		100,000.00
1.1.10.	Apsorberi/ublaživači udara		400,000.00	800,000.00		1,200,000.00
1.1.11.	Izrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona			40,000.00		40,000.00
1.1.12.	EKO zaštitni uređaj za efikasno odvratanje divljači, stavka koja bi svim službama olakšala posao. (stalno djelujući višezvučni eko zaštitni uređaj)			20,000.00		20,000.00

1.1.13.	Radovi na izgradnji infrastrukture za elektro punjače u sklopu baza za održavanje		15,000.00	35,000.00		50,000.00
1.1.14.	Ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza			20,000.00		20,000.00
1.1.15.	Horizontalna i vertikalna signalizacija za naznačavanje slabije vidljivosti u zonama česte pojave magle			77,524.70		77,524.70
1.1.16.	Sređivanje enterijera konferencijske sale na Pelevom Brijegu			13,000.00		13,000.00
1.1.17.	Regulacija priobrenih i procjednih voda u zoni mosta Jabuka i rekonstrukcija potpornog zida na regionalnom putu R-13			120,000.00		120,000.00
<b>1.2.</b>	<b>Tekuće građevinsko održavanje</b>		<b>776.844</b>	<b>294.500</b>		<b>1.071.344</b>
1.2.1.	Nabavka materijala i radovi na obnavljanju postojeće horizontalne saobraćajne signalizacije			25,000.00		25,000.00
1.2.2.	Nabavka rezervnih dijelova za separatore		2,000.00	10,000.00		12,000.00
1.2.3.	Ispitivanje otpada u separatorima i odlaganje otpada na ovlašćenu deponiju		3,000.00	30,000.00		33,000.00
1.2.4.	Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom		70,000.00	10,000.00		80,000.00
1.2.5.	Ugradnja elemenata čelične odbojne ograde		37,000.00	27,390.00		64,390.00
1.2.6.	Nabavka elemenata čelične odbojne ograde			168,000.00		168,000.00
1.2.7.	Nabavka materijala i izvođenje ostalih građevinsko-zanatskih radova koji se ne mogu predvidjeti na objektima i u putnom pojasu i radovi za hitne intervencije		40,000.00	150,000.00		190,000.00
1.2.8.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš. Nerealizovane obaveze, radovi i nadzor		1,185,000.00			1,185,000.00
1.2.9.	Renoviranje Komandnog centra, Naplatnog centra i trafo stanica, sanacija vrata na ulazima u galerije na proširenjima u tunelu Sozina (krov, bravarija)		48,390.00			48,390.00
1.2.10.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima-nerealizovane obaveze		312,500.00			312,500.00
1.2.11.	Glavni pregledi objekata (mostova, tunela, saobraćajnice...)		15,000.00			15,000.00

1.2.12.	Redovni pregled kolovoza na mostovima, u tunelima i na otvorenoj trasi autoputa			15,000.00		15,000.00
1.2.13.	Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na proširenju i prepravci rezervoara za gorivo na Pelevom Brijegu			40,000.00		40,000.00
1.2.14	Zamjena / popravka svih stubova na trasi sa krutom horizontalnom vezom i nabavka rezervnih tabli i ostalih dijelova vertikalne saobraćajne signalizacije			45,000.00		45,000.00
1.2.15	Hortikultura, zatravljanje zelenih površina i sadnja višegodišnjih stabala			30,000.00		30,000.00
1.2.16	Radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore		15,000.00			15,000.00
1.2.17	Geodetsko opažanje mjernim instrumentima objekata na trasi autoputa			30,000.00		30,000.00
1.2.18	Nabavka i montaža garažnih vrata- nerealizovane obaveze		25,404.00			25,404.00
1.2.19.	Nabavka materijala i izvođenje radova na proširenju magacina i zaštiti pumpe u okviru KC Pelev Brijeg- nerealizovane obaveze			18,762.00		18,762.00
<b>1.3</b>	<b>Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme</b>	<b>9,500.00</b>	<b>293,510.00</b>	<b>1,052,746.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,357,256.00</b>
1.3.1.	Nabavka led reflektora i raznih sijalica za tekuće održavanje		15,000.00	15,000.00		30,000.00
1.3.2.	Održavanje klima uređaja, nabavka i ugradnja djelova za održavanje i servis klima uređaja	2,000.00	5,000.00	20,000.00		27,000.00
1.3.3.	Nabavka i ugradnja rezervnih djelova za održavanje ormara automatike (trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markri, promjenljive signalitacije, video nadzora i sl)		15,000.00	60,000.00		75,000.00
1.3.4.	Servis senzora CO, vidljivosti i strujanja vazduha (elektrohemijske ćelije za CO i VIS, CO-G u galerijama,)		15,000.00	40,000.00		55,000.00
1.3.5.	Vanredni i redovni servis i nabavka uređaja za besprekidno napajanje - UPS, nabavka baterija za uređaje za besprekidno napajanje	2,000.00	15,000.00	10,000.00		27,000.00
1.3.6.	Vanredni i redovni servis i nabavka i ugradnja rezervnih djelova za agregate		10,000.00	10,000.00		20,000.00
1.3.7.	Održavanje ormara sa soft starterima za jet fenove			10,000.00		10,000.00
1.3.8.	Nabavka opreme i rezervnih djelova i servisiranje sistema za vodosnabdijevanje			30,000.00		30,000.00

1.3.9.	Nabavka i ugradnja rezervnih djelova za redovno održavanje sistema naplate putarine		5,000.00	38,000.00		43,000.00
1.3.10.	Nabavka i ugradnja rezervnih djelova za održavanje video zida, video kontrolera, monitora u komandnom centru		5,000.00	10,000.00		15,000.00
1.3.11.	Održavanje SCADA sistema		60,500.00	302,500.00		363,000.00
1.3.12.	Nabavka i ugradnja ventilatora i održavanje sistema ventilacije			85,000.00		85,000.00
1.3.13.	Sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova		5,000.00	30,000.00		35,000.00
1.3.14.	Nabavka i ugradnja djelova za sistem dojava požara i PP zaštite	500.00	45,000.00	50,000.00	500.00	96,000.00
1.3.15.	Ostali uređaji, oprema i materijal koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće elektro-mašinsko održavanje objekata i hitne intervencije		10,000.00	100,000.00		110,000.00
1.3.16.	Održavanje softvera za naplatu putarine		65,000.00	68,000.00		133,000.00
1.3.17.	Redovni servis i nabavka, uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		7,000.00	15,000.00		22,000.00
1.3.18.	Hitne intervencije	2,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	23,000.00
1.3.19.	Radovi na otklanjanju nedostataka kod postojećih brojača saobraćaja na autoputu			30,000.00		30,000.00
1.3.20.	Nabavka rezervnih djelova za klimu Schneider Electric-nerealizovane obaveze			6,851.00		6,851.00
1.3.21.	Nabavka i ugradnja rasvjete za rekreativnu zonu na Pelevom brijegu			10,000.00		10,000.00
1.3.22.	Rezervni dijelovi za IT opremu	3,000.00	2,000.00	15,000.00		20,000.00
1.3.23.	Nabavka mobilnih gradilišnih reflektora sa integrisanim agregatom, za potrebe izvođenja hitnih intervencija			30,000.00		30,000.00
1.3.24.	Nabavka, isporuka i montaža UPS-ova i baterija za Socomec UPS-ove-nerealizovane obaveze		4,010.00			4,010.00
1.3.25.	Nabavka elektrohemijskih ćelija za mjerenje koncentracije CO-nerealizovane obaveze			27,411.00		27,411.00
1.3.26.	Nabavka, montaža, testiranje i puštanje u rad mobilnog svjetlosnog tornja-nerealizovane obaveze			29,984.00		29,984.00
1.3.27.	Redovni servis i nabavka, uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		7,000.00	15,000.00		22,000.00
<b>1.4.</b>	<b>Nabavka osnovnih sredstava i inventara</b>	<b>47.428</b>	<b>639.531</b>	<b>2.013.215</b>	<b>22.500</b>	<b>2.722.674</b>

1.4.1.	Nabavka specijalnog vozila za preglede mostova i vijaduktova			1,500,000.00		1,500,000.00
1.4.2.	Nabavka putničkih i terenskih vozila				60,000.00	60,000.00
1.4.3.	Usluge i nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta		6,000.00	19,000.00		25,000.00
1.4.4.	Nabavka višenamjenskih nastavaka za održavanje puta			130,000.00		130,000.00
1.4.5.	Nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu		6,000.00	19,000.00		25,000.00
1.4.6.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme puta		6,000.00	19,000.00		25,000.00
1.4.7.	Nabavka niskonoseće prikolice			55,000.00		55,000.00
1.4.8.	Nabavka malog navalnog vatrogasnog vozila-nerealizovane obaveze iz 2024			158,000.00		158,000.00
1.4.9.	Nabavka privremene saobraćajne signalizacije		20,000.00			20,000.00
1.4.10.	Nabavka samohodne roto teleskopske dizalice			130,000.00		130,000.00
1.4.11.	Nabavka dizel kompresora		25,000.00			25,000.00
1.4.12.	Nabavka opreme za pranje obloge tunela, saobraćajne signalizacije i rasvjete			100,000.00		100,000.00
1.4.13.	Nabavka svjetlosne saobraćajne signalizacije i rezervnih djelova		200,000.00			200,000.00
1.4.14.	Nabavka kamera, NVR-ova, rezervnih djelova za video nadzor		15,000.00	17,000.00		32,000.00
1.4.15.	Nabavka dva hemijska zaštitna gas-nepropusna odijela-nerealizovane obaveze		7,006.00			7,006.00
1.4.16.	Nabavka traktora -nerealizovane obaveze za prikolicu čistilicu			55,391.00		55,391.00
1.4.17.	Nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca			1,000.00		1,000.00
1.4.18.	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite		20,000.00	40,000.00		60,000.00
1.4.19.	Nabavka vatrogasne zaštitne obuće i odjeće			4,800.00		4,800.00
1.4.20.	Nabavka radne odjeće i uniforme					-
1.4.21.	Nabavka uniformi za alpinizam		2,000.00	4,000.00		6,000.00
1.4.22.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme		2,000.00	4,000.00		6,000.00



1.4.23.	Nabavka klima uređaja i bijele tehnike	2,000.00	4,000.00	2,000.00		8,000.00
1.4.24.	Nabavka uređaja i opreme za elektro-mašinsko održavanje auto-puta			10,000.00		10,000.00
1.4.25.	Nabavka i montaža kućice i uređaja za automatsku naplatu putarine za NC Pelev Brijeg-nerealizovane obaveze			20,871.00		20,871.00
1.4.26.	Nabavka SOS telefona i dodatne opreme za tunel Sozina		20,000.00			20,000.00
1.4.27.	Nabavka računarske opreme	20,000.00	10,000.00	12,000.00	6,000.00	48,000.00
1.4.28.	Nabavka mrežne opreme	2,000.00	15,000.00	10,000.00		27,000.00
1.4.29.	Nabavka servera, licenci i ostale serverske opreme	10,000.00	80,000.00	15,000.00		105,000.00
1.4.30.	Ostala osnovna sredstva za IT	6,000.00				6,000.00
1.4.31.	Ostala osnovna sredstva	7,000.00	20,000.00	35,000.00	5,000.00	67,000.00
1.4.32.	Punjači za Električna vozila		40,000.00	80,000.00		120,000.00
1.4.33.	Nabavka uređaja za simulaciju dima		1,800.00	1,800.00		3,600.00
1.4.34.	nabavka drona za monitoring i snimanje objekata u izgradnji-nerealizovane obaveze			30,250.00		30,250.00
1.4.35.	Nabavka vatrogasne opreme i alata - nerealizovane obaveze		1,603.00			1,603.00
1.4.36.	Nabavka servera i ostale serverske opreme-nerealizovane obaveze	5,000.00	19,700.00	5,000.00		29,700.00
1.4.37.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme-nerealizovane obaveze	6,168.00	15,496.00	7,913.00		29,577.00
1.4.38.	Nabavka, isporuka i montaža ručnih, optičkih javljača požara za Esser centralu u tunelu Sozina-nerealizovane obaveze		6,999.00			6,999.00
<b>2.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>3,700,644.84</b>	<b>2,815,097.19</b>	<b>9,993,201.77</b>	<b>1,125,221.35</b>	<b>17,634,165.15</b>
<b>2.1</b>	<b>Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga</b>	<b>696,619.00</b>	<b>1,025,654.00</b>	<b>2,775,698.00</b>	<b>356,950.00</b>	<b>4,854,921.00</b>
2.1.1.	Kancelarijski materijal i toneri	18,500.00	10,000.00	7,500.00	8,000.00	44,000.00

2.1.2.	Termo rolne za printere i POS terminale, magnetne trake i riboni za printere		2,000.00	25,000.00		27,000.00
2.1.3.	Troškovi štampanja I fotokopiranja	500.00	500.00	1,000.00	500.00	2,500.00
2.1.4.	Sredstva za održavanje poslovnih prostorija, i ostala sredstva za higijenu	4,000.00	7,900.00	10,950.00	2,700.00	25,550.00
2.1.5.	Održavanje higijene objekata- "outsource"	12,900.00	19,800.00	40,800.00	7,000.00	80,500.00
2.1.6.	Nabavka vode za piće, kafe, pića i napitaka	6,000.00	6,000.00	9,500.00	5,000.00	26,500.00
2.1.7.	Nabavka deterdženta za pranje tunela Sozina i Raš		5,000.00	15,000.00		20,000.00
2.1.8.	Materijal za održavanje puta		3,000.00	100,000.00		103,000.00
2.1.9.	Ostali materijal, djelovi, roba i usluge za tekuće održavanje i sitne popravke	7,000.00	5,000.00	5,700.00	5,000.00	22,700.00
2.1.10.	Redovno održavanje i servisiranje vozila	18,000.00	30,000.00	95,000.00	8,000.00	151,000.00
2.1.11.	Vanredni servis vozila (rezervni djelovi i usluge)	5,000.00	8,000.00	15,000.00	2,000.00	30,000.00
2.1.12.	Nabavka auto guma, motaža, balansiranje, skladištenje i krpjenje guma	5,000.00	5,000.00	25,000.00	3,000.00	38,000.00
2.1.13.	Usluga pranja vozila	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	6,500.00
2.1.14.	Nabavka potrošnog materijala i opreme za pranje i održavanje vozila		3,000.00	5,000.00	500.00	8,500.00
2.1.15.	Nabavka radioničarskog alata za potrebe nužnog servisiranja vozila i mehanizacije		5,000.00	10,000.00		15,000.00
2.1.16.	Nabavka sitnog potrošnog materijala i djelova za održavanje vozila, mehanizacije i vučnih vozila	1,000.00	3,500.00	15,000.00	1,000.00	20,500.00
2.1.17.	Održavanje i servisiranje nadogradnje na vatrogasnim vozilima i nabavka nedostajuće opreme		6,000.00	10,000.00		16,000.00
2.1.18.	Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje iz saobraćajnih nezgoda i gašenje požara		20,000.00	20,000.00		40,000.00
2.1.19.	Trošak goriva vozila +benzinska stanica autoput +lož ulje	25,000.00	25,000.00	320,000.00	10,000.00	380,000.00
2.1.20.	Trošak GPS	1,000.00	2,000.00	8,000.00	1,500.00	12,500.00
2.1.21.	Trošak električne energije	10,000.00	270,000.00	980,000.00	5,000.00	1,265,000.00
2.1.22.	Troškovi komunalnih usluga (deponija, čistoća, održavanje ulaza, voda...)	5,000.00	15,000.00	15,000.00	4,500.00	39,500.00
2.1.23.	Troškovi zakupa hig.toaleta i usluga održavanja čišćenja, pražnjenja i dezinfekcije toaleta			15,000.00		15,000.00

2.1.24.	Troškovi zakupa poslovnog prostora tekuće i neplaćene obaveze iz prethodnog perioda				58,00	58,000.00
2.1.25.	Nabavka usluge kablovskih servisa	3,000.00	2,500.00	4,300.00	1,00	10,800.00
2.1.26.	Nabavka usluge mobilnih servisa	3,500.00	1,500.00	3,300.00	2,70	11,000.00
2.1.27.	Troškovi održavanja i nadogradnje baze podataka puteva			75,000.00		75,000.00
2.1.28	Troškovi konsultantskih usluga	5,000.00	10,000.00	20,000.00	65,00	100,000.00
2.1.29.	Troškovi ugovora o djelu	50,000.00	5,000.00	35,000.00	10,00	100,000.00
2.1.30	Rashodi za komisije zaposleni i komisije i radne grupe lica koja nijesu zaposlena u Monteputu	80,000.00	5,000.00	20,000.00	20,00	125,000.00
2.1.31	Trošak reprezentacije	20,000.00	1,000.00	10,000.00	10,00	41,000.00
2.1.32	Nabavka Tag uređaja			25,000.00		25,000.00
2.1.33	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja i troškovi prolazaka autoput/Sozina	50,000.00	2,000.00	30,000.00	5,000.00	87,000.00
2.1.34	Troškovi oglasa	2,000.00	1,500.00	1,500.00	500.00	5,500.00
2.1.35	Troškovi reklame i propagande (video produkcija, promocija u medijima, promotivni materijal, online promocijai drugi vidovi reklame i propagande	20,500.00	5,600.00	14,200.00	3,000.00	43,300.00
2.1.36	Usluga strucnog nadzora nad radovima na sanaciji sekundarne obloge		105,000.00			105,000.00
2.1.37	Održavanje web servisa i usluga	8,000.00				8,000.00
2.1.38	Održavanje i nadogradnja finansijskog softvera	5,000.00				5,000.00
2.1.39	Troškovi održavanja računarske opreme PJ				5,000.00	5,000.00
2.1.40	Nadogradnja DMS softvera i dodatne funkcionalnosti	10,000.00				10,000.00
2.1.41	Network Security Licence	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,600.00	6,600.00
2.1.42	Razvoj i implementacija digitalnih kanala prodaje putarine	50,000.00				50,000.00
2.1.43	Nabavka usluge održavanja mrežne infrastrukture	10,000.00				10,000.00
2.1.44	Nabavka usluge održavanje serverske opreme i sistemskih servisa	6,000.00				6,000.00

2.1.45	Nabavka licenci Microsoft 365 platforme	9,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00	19,000.00
2.1.46	Nabavka licenci za Autodesk softvere	12,000.00				12,000.00
2.1.47	Nabavka softvera za backup servera i radnih stanica		4,000.00			4,000.00
2.1.48.	Nabavka licenci za bezbjednost mrezne infrastrukture	1,500.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
2.1.49.	Nabavka licenci za antivirus	5,000.00			500.00	5,500.00
2.1.50.	Usluga provjere otpornosti IT infrastrukture na hakerske napada - Penetration testing	10,000.00				10,000.00
2.1.51.	Nabavka licenci za softver za upravljanje IT infrastrukturom	6,000.00				6,000.00
2.1.52.	Usluga digitalizovanja tehničke dokumentacije-projekata i planova		9,680.00			9,680.00
2.1.53.	Usaglašavanje IT sistema sa standardima i regulativama za sigurnost informacija	15,000.00				15,000.00
2.1.54.	Održavanje DMS softvera	10,000.00				10,000.00
2.1.55.	Nabavka licenci za softver za upravljanje odsustvima - Away	3,500.00				3,500.00
2.1.56.	Softver za statičku i dinamičku analizu konstrukcije i softver za izradu detalja armature				3,000.00	3,000.00
2.1.57.	Materijal za sitne tekuće popravke	2,000.00				2,000.00
2.1.58.	Ostali poslovni rashodi za IT	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	45,000.00
2.1.59.	Trošak održavanje računara i Web servera				6,600.00	6,600.00
2.1.60.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom + IT + obuka operatera KC...)	10,000.00	44,500.00	39,000.00	5,000.00	98,500.00
2.1.61.	Naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i troškovi uknjižbe objekata			150,000.00		150,000.00
2.1.62.	Ispitivanje elektrostromobranske instalacije	500.00	7,000.00	65,000.00	300.00	72,800.00
2.1.63.	Izmjena Akta o procjeni rizika za neobrađena radna mjesta po novoj sistematizaciji	100.00	100.00	150.00	100.00	450.00
2.1.64.	Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad	100.00	200.00	300.00	50.00	650.00
2.1.65.	Ispitivanje sredstava za rad i opreme lične zaštite na radu		1,000.00	2,500.00		3,500.00

2.1.66.	Trošak održavanja vatrogasne opreme za nadgradnju vatrogasnih vozila		4,000.00	8,000.00		12,000.00
2.1.67	Ispitivanje pp aparat, hidranata i kalibracija alko testa			9,668.00		9,668.00
2.1.68	Ispitivanje hidrantske mreže		300.00	4,700.00		5,000.00
2.1.69	Nabavka hlora, održavanje vodovodne mreže i periodično ispitivanje kvaliteta vode u sistemu na auto-putu			5,000.00		5,000.00
2.1.70	Ispitivanje uslova radne sredine		100.00	100.00		200.00
2.1.71	Periodični sistematski pregledi zaposlenih		2,200.00	4,000.00	1,000.00	7,200.00
2.1.72	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	5,000.00	40,000.00	50,000.00	2,000.00	97,000.00
2.1.73	Troškovi transporta novca		3,000.00	10,000.00		13,000.00
2.1.74	Troškovi advokata, notara, administrativnih i sudskih taksi	65,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	78,000.00
2.1.75	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licence zaposlenih za obavljanje poslova,	3,500.00	500.00	1,000.00	2,500.00	7,500.00
2.1.76	Trošak članskog dopriinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica		8,000.00			8,000.00
2.1.77	Troskovi fizičke i tehnicke zastite imovine i lica u poslovnom objektu	2,400.00	51,000.00	195,030.00	2,400.00	250,830.00
2.1.78	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	5,000.00	178,524.00	10,000.00	60,000.00	253,524.00
2.1.79	Troškovi prevoza zaposlenih		13,700.00	16,000.00		29,700.00
2.1.80	Administrativni troškovi (registracije/dozvole i sl.)	1,000.00	500.00	3,000.00	500.00	5,000.00
2.1.81	Trošak službenih putovanja	15,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	45,000.00
2.1.82	Monitoring i zaštita životne sredine	-		48,000.00		48,000.00
2.1.83	Ostali poslovni rashodi	15,000.00	5,000.00	40,000.00	3,000.00	63,000.00
2.1.84	Zakup uređaja ja predaju pazara		10,000.00	10,000.00		20,000.00
2.1.85	Revizija bezbjednosti puta		3,500.00	20,500.00		24,000.00
2.1.86	nabavka potrošnog materijala za tekuće građevinsko održavanje		8,200.00	22,000.00		30,200.00

2.1.87	Usluge kreiranja softverskog rešenja za simulaciju upravljanja saobraćajem			25,000.00		25,000.00
2.1.88	Usluga izrade strategije razvoja IKT-a sluzbe	5,000.00				5,000.00
2.1.89	Usluga procjene stanja bezbjednosti IT infrastrukture - IT Security Checkout-nerealizovane ugovorene obaveze	4,000.00				4,000.00
2.1.90	Specijalističke usluge na poslovima neplaniranih intervencija i dorade SCADA sistema		10,000.00	10,000.00		20,000.00
2.1.91	Stipendije studentima	10,000.00				10,000.00
2.1.92	Održavanje nadogradnje na vatrogasnim vozilima i nabavka nedostajuće opreme - nerealizovane obaveze		5,850.00			5,850.00
2.1.93	Nabavka klijentskih licenci za Microsoft Windows server	5,000.00				5,000.00
2.1.94	Izrada idejnog rješenja autoputa Bar-Boljare, izmjena dijela trase od ulaznog portala tunela Trešnjevik-Andrijevića nerealizovane obaveze	9,619.00				9,619.00
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>17,700.00</b>	<b>30,350.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>205,500.00</b>
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2,900.00	5,400.00	10,400.00	1,300.00	20,000.00
2.2.2.	Osiguranje imovine	300.00	18,450.00	80,600.00	650.00	100,000.00
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	9,500.00	6,500.00	60,000.00	4,500.00	80,500.00
2.2.4.	Ostali osnovi osiguranja od odgovornosti	5,000.00				5,000.00
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi kredita</b>	<b>1,623,313.00</b>	<b>-</b>	<b>3,734,935.00</b>	<b>-</b>	<b>5,358,248.00</b>
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – glavnica	1,333,334.00			-	1,333,334.00
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – kamata	289,979.00			-	289,979.00
2.3.3.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom			2,208,408.00	-	2,208,408.00
2.3.4.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate			416,603.00		416,603.00

2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- glavnica			947,284.00		947,284.00
2.3.6	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- Troškovi kamate			162,640.00		162,640.00
<b>2.4.</b>	<b>Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>1,363,012.84</b>	<b>1,759,093.19</b>	<b>3,331,568.77</b>	<b>761,821.35</b>	<b>7,215,496.15</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>1,266,052.84</b>	<b>1,501,254.30</b>	<b>2,981,788.55</b>	<b>712,603.35</b>	<b>6,461,699.04</b>
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	996,892.00	1,182,090.00	2,347,865.00	561,105.00	5,087,952.00
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	269,160.84	319,164.30	633,923.55	151,498.35	1,373,747.04
<b>2.4.2.</b>	<b>Prevoz zaposlenih ukupno</b>	<b>18,288.00</b>	<b>108,212.89</b>	<b>178,290.22</b>	<b>12,192.00</b>	<b>316,983.11</b>
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	14,400.00	85,207.00	140,386.00	9,600.00	249,593.00
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	3,888.00	23,005.89	37,904.22	2,592.00	67,390.11
<b>2.4.3.</b>	<b>Zimnica</b>	<b>42,672.00</b>	<b>55,626.00</b>	<b>110,490.00</b>	<b>17,526.00</b>	<b>226,314.00</b>
2.4.3.1.	Zimnica neto	33,600.00	43,800.00	87,000.00	13,800.00	178,200.00
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	9,072.00	11,826.00	23,490.00	3,726.00	48,114.00
<b>2.4.4.</b>	<b>Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru</b>	<b>36,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>210,500.00</b>
2.4.4.1.	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	6,000.00	19,000.00	6,000.00	7,500.00	38,500.00
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	20,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	47,000.00
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju i ostale otpremnine		50,000.00	25,000.00		75,000.00

2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	10,000.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	50,000.00
3.	<b>Izdaci za stambene potrebe zaposlenih</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
4.	<b>AUTO PUT BAR- BOLJARE</b>				<b>43,922.00</b>	<b>43,922.00</b>
4.1.	<b>Upravljanje projektom nakon završetka izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo</b>				<b>40,922.00</b>	<b>40,922.00</b>
4.1.1.	Ostali tehnički i administrativni troškovi				21,961.00	21,961.00
4.1.2.	Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga na Regionalnom putu R15 - Virpazar - Rijeka Crnojevića, u dužini od cca 24km-nerealizovane obaveze				18,961.00	18,961.00
4.2.	<b>Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
4.2.1.	Obuka za korišćenje opreme i softvera za geodeziju				3,000.00	3,000.00
5.	<b>Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta</b>	<b>15,246,000.00</b>	-	-	<b>687,419,150.00</b>	<b>702,665,150.00</b>
5.1.	<b>Izvođenje radova i nadzor</b>				687,419,150.00	687,419,150.00
5.1.1.	Izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo - Andrijevića				664,646,950.00	664,646,950.00
5.1.2.	Nadzor nad radovima na dionici autoputa Mateševo - Andrijevića				19,360,000.00	19,360,000.00
5.1.3.	PIU Mateševo -Andrijevića				3,388,000.00	3,388,000.00
5.1.4.	Kontrolna ispitivanja Mateševo-Andrijevića				24,200.00	24,200.00
5.2	<b>Projektovanje-idejni projekti autoputa Bar-Boljare</b>	<b>15,246,000.00</b>				<b>15,246,000.00</b>



5.2.1	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Andijevica - Berane - Boljare	6,050,000.00				6,050,000.00
5.2.2	Izrada idejnog/glavnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Tološi - Virpazar	4,961,000.00				4,961,000.00
5.2.3	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Virpazar - Stari Bar	3,025,000.00				3,025,000.00
5.2.4	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Smokovac - Tološi - nerealizovane obaveze	1,210,000.00				1,210,000.00
<b>6.</b>	<b>Projektovanje-idejni projekti brzih saobraćajnica</b>	<b>24,248,400.00</b>				<b>24,248,400.00</b>
6.1.1	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Stari Bar - Sukobin	3,146,000.00				3,146,000.00
6.1.2	Izrada idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Petlja Primorske saobraćajnice - Markovići	1,452,000.00				1,452,000.00
6.1.3	Izrada glavnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Markovići - Lastva Grbaljska	484,000.00				484,000.00
6.1.4	Izrada idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Lastva Grbaljska - Debeli Brijeg	3,775,200.00				3,775,200.00
6.1.5	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Crnča - Pljevlja	6,195,200.00				6,195,200.00
6.1.6	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Nikšić - Pljevlja (Vrulja)	9,196,000.00				9,196,000.00
<b>7</b>	<b>Investicije iz sredstava dobiti raspoređene po Zaključku Vlade CG</b>	<b>26,715,646.19</b>				<b>26,715,646.19</b>
<b>7.1</b>	<b>Idejni/glavni projekti</b>	<b>17,835,400.00</b>				<b>17,835,400.00</b>
7.1.1	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	5,082,000.00				5,082,000.00

7.1.2	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, petlja: Grahovo-granica BIH	1,936,000.00				1,936,000.00
7.1.3	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Pljevlja - granica sa BIH	2,904,000.00				2,904,000.00
7.1.4	Izrada idejnog projekta autoputa Andrijevića - Peć, dionica: Andrijevića - granica sa Kosovom	3,267,000.00				3,267,000.00
7.1.5	Izrada idejnog/glavnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Danilovgrad - Nikšić	3,000,800.00				3,000,800.00
7.1.6	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Smokovac - Božaj	1,645,600.00				1,645,600.00
<b>7.2.</b>	<b>Projektovanje-idejna rješenja</b>	<b>1,438,446.19</b>				<b>1,438,446.19</b>
7.2.1	Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevića - Peć ugovoreno	100,430.00				100,430.00
7.2.2	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde-ugovoreno	189,970.00				189,970.00
7.2.3	Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva-ugovoreno	175,329.00				175,329.00
7.2.4	Izrada idejnog rješenja Virpazar - Sukobin-ugovoreno	145,200.00				145,200.00
7.2.5	Izrada idejnog rješenja Danilovgrad - Nikšić	129,470.00				129,470.00
7.2.6	Izrada idejnog rješenja Jadransko-Jonskog autoputa, dionica: Čevo - granica BIH	96,000.19				96,000.19
7.2.7	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Smokovac - Božaj-ugovoreno	99,992.00				99,992.00
7.2.8	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Nikšić - Pljevlja	205,000.00				205,000.00
7.2.9	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica - Danilovgrad	72,600.00				72,600.00
7.2.10	Izrada idejnog rješenja regionalnog puta Rijeka Crnojevića - Virpazar	43,560.00				43,560.00
7.2.11	Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar-Boljare sa Jadransko-jonskim autoputem-ugovoreno	180,895.00				180,895.00

<b>7.3.</b>	<b>Revizija projektne dokumentacije</b>	<b>7,066,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,066,400.00</b>
7.3.1	Komisije za reviziju Idejnih rješenja	123,420.00				123,420.00
7.3.2	Komisija za reviziju idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Andrijevića - Berane - Boljare	605,000.00				605,000.00
7.3.3	Komisija za reviziju idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica-Grahovo	508,200.00				508,200.00
7.3.4	Komisija za reviziju idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Grahovo-granica BIH	193,600.00				193,600.00
7.3.5	Komisija za reviziju idejnog/glavnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Tološi - Virpazar	496,100.00				496,100.00
7.3.6	Komisija za reviziju idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Virpazar - Stari Bar	302,500.00				302,500.00
7.3.7	Komisija za reviziju idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Stari Bar - Sukobin	314,600.00				314,600.00
7.3.8	Komisija za reviziju idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Petlja Primorske saobraćajnice - Markovići	145,200.00				145,200.00
7.3.9	Komisija za reviziju glavnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Markovići - Lastva Grbaljska	48,400.00				48,400.00
7.3.10	Komisija za reviziju idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Lastva Grbaljska - Debeli Brijeg	377,520.00				377,520.00
7.3.11	Komisija za reviziju idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Crnča - Pljevlja	619,520.00				619,520.00
7.3.12	Komisija za reviziju idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Pljevlja - granica sa BIH	290,400.00				290,400.00
7.3.13	Komisija za reviziju idejnog projekta autoputa Andrijevića - Peć, dionica: Andrijevića - granica sa Kosovom	326,700.00				326,700.00
7.3.14	Komisija za reviziju idejnog/glavnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Danilovgrad - Nikšić	300,080.00				300,080.00
7.3.15	Komisija za reviziju idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Nikšić - Pljevlja (Vrulja)	919,600.00				919,600.00
7.3.16	Komisija za reviziju idejnog projekta autoputa Bar-Boljare, dionica: Smokovac - Tološi	121,000.00				121,000.00

7.3.17	Komisija za reviziju idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Smokovac - Božaj	164,560.00				164,560.00
7.3.18	Komisija za reviziju Glavog projekta Mateševo - Andrijevića	1,210,000.00				1,210,000.00
<b>7.4.</b>	<b>Ostale komisije</b>	<b>375,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375,400.00</b>
7.4.1	Komisija za pripremu projektnih zadataka	96,800.00				96,800.00
7.4.2	Komisija za tehničku pripremu pripremu tendera za izvođenje dionice Mateševo-Andrijevića	36,300.00				36,300.00
7.4.3	Komisija za eksproprijaciju	181,800.00				181,800.00
7.4.4	Ostale komisije	60,500.00				60,500.00
<b>8.</b>	<b>Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta-umanjenje pozicije-prenos realizacije za period nakon 2025.g</b>	<b>5,892,700.00</b>			<b>596,756,450.00</b>	<b>602,649,150.00</b>
<b>9.</b>	<b>Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta-umanjenje pozicije-prenos realizacije za period nakon 2025.g</b>	<b>19,248,399.00</b>				<b>19,248,399.00</b>
<b>10.</b>	<b>Investicije iz sredstava dobiti umanje pozicija</b>	<b>20,697,054.60</b>				<b>20,697,054.60</b>
<b>11.</b>	<b>Umanjenje pozicije 1.1.5 Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima</b>		<b>1,900,000.00</b>			<b>1,900,000.00</b>
<b>12</b>	<b>Umanjenje pozicije 1.4.1 Nabavka specijalnog vozila za preglede mostova i vijaduktova</b>			<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>
<b>13</b>	<b>Umanjenje pozicije 1.1.10 Apsorberi/ublaživači udara</b>		<b>200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>600,000.00</b>

14	Umanjenje pozicije 1.4.10 Nabavka samohodne roto teleskopske dizalice			130,000.00		130,000.00
15	Umanjenj pozicije 2.1.36 Usluga strucnog nadzora nad radovima na sanaciji sekundarne obloge		55,000.00			55,000.00
16	Obaveza za PDV (razlika izlazni/ulazni)					521,481.29
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>24,388,205.43</b>	<b>6,867,905.19</b>	<b>13,514,649.47</b>	<b>91,893,421.35</b>	<b>137,187,591.46</b>

### Obrazloženje planiranih rashoda

Pregled planiranih rashoda za 2025. godinu, u iznosu 137,187,591,46 eura sa PDV-om, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda Monteputa, sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu Zakona o Budžetu CG za 2025. i sredstava od raspoređenje dobiti 2021. i 2022. godine po Zaključku Vlade Crne Gore br.08-011/23-6295/2 od 29. 12. 2023. i raspoređene dobiti 2023. godine po Zaključcima Vlade Crne Gore br.08-011/24-3268/2 od 13.06.2024.g. i 10-011/24-6182/2 od 08.11.2024.g.



## **1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje 6.580.772 eura**

### **Investiciona ulaganja i tekuće održavanje 11,899,423.70 eura**

Privredno društvo "Monte put" d.o.o., Podgorica, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, dok je Statutom definisana djelatnost Društva- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju: upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad redovnim održavanjem auto-puteva, zaštitu puta, upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, i drugi poslovi koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori, organizovanje i naplatu putarine;

organizovanje održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja.

Odlukom o osnivanju „Montepu“ d.o.o. Podgorica, tom privrednom društvu je povjereno upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima. Od 13.07.2022. godine Sektor za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa zadužen je za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo a realizacija investicija vezanih za nastavak auto-puta Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevića definisano je Zakonom o Budžetu CG za 2024.g od 28.12.2023.g. čl.18 .

**1.1.** Za Investiciona ulaganja planirana su sredstva u iznosu 5,030,924.70 eura. Planirana sredstva realizovaće se u skladu planiranim pozicijama 1.1-1.17na način i dinamikom predviđenom u planu rada.

Planirana je: Nabavka rampi za brze staze i rezervnih djelova( opruge , letva rampe, senzor kraka rampe,...); Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Naplatnog centra; Nabavka/zamjena kontrole pristupa u zgradi NC-a i naplatnim kućicama; Integracija sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje; Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge i nadzor na radovima; Izrada podloge od štampanog betona na podnoj ploči ljetnikovca; Nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina; Provlačenje i povezivanje optickog voda kroz tunel Sozina; Nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde; Apsorberi/ublaživači udara; Izrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona; EKO zaštitni uređaj za efikasno odvrćanje divljači, stavka koja bi svim službama olakšala posao. (stalnodjelujući višezvučni eko zaštitni uređaj); Radovi na izgradnji infrastrukture za elektro punjače u sklopu baza za održavanje; Ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza; Horizontalna i vertikalna signalizacija za naznačavanje slabije vidljivosti u zonama česte pojave magle; Horizontalna i vertikalna signalizacija za naznačavanje slabije vidljivosti u zonama česte pojave magle; Regulacija pribrežnih i procjednih voda u zoni mosta Jabuka i rekonstrukcija potpornog zida na regionalnom putu R-13.

**1.2** Tekuće građevinsko održavanje- planirana su sredstva u iznosu 2,352,446.00 eura.

Za radove tekućeg građevinskog održavanja od planiranih sredstava za održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica planirano je 1,753,294.00 eura , a za održavanje objekata na auto-putu 599,152.00 eura.

Radovi su planirali u skladu sa planovima tekućeg održavanja opreme a realizovaće se u skladu sa planom rada.

**1.3.** Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 1,357,256.00 eura.

Sredstva su planirana za realizaciju pozicija od 1.3.1-1.3.37 i to za Upravu 9,500 eura, Sozinu 293,510 za auto-put 1,052,746.00 eura i za PJ za izgradnju autoputeva 1,500.00 eura.

Planske obaveze će se realizovati u skladu sa Planom rada za 2025.g

**1.4.** Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2024. godini, iznose 3,158,797.00 eura

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica („Sl.list CG“, br. 101/2020 od 9.10.2020.g), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja radnih procesa sa dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. S tim u vezi, neophodno je izvršiti modernizaciju određene opreme i nabaviti nova sredstva za rad u cilju obezbjeđivanja bezbjednog rada posebno zaposlenih u službama koji obavljaju terenski posao , omogućiti digitalizaciju radnih procesa i s tim u vezi blagovremenu obradu i čuvanje podataka.

## **2. Planirani rashodi tekućeg poslovanja:**

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2025. godinu, iznose 17,632,165.15 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u iznosu od 3.698,644.84 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 2.815,097.19 eura sa PDV-om; sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa 9,993,201.77 eura i za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 1,125,221.35 eura sa PDV-om.

Poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, tekućeg održavanja i usluga (poz.2.1.).....4,852,921.00 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....205,500.00 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.)..... 5,358,248.00 €
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....7,215,496.15 €

**2.1.** Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su na istom novouo odnosu na prethodnu godinu. U navedenim rashodima značajno učešće imaju rashodi za električnu energiju,koji su planirani u iznosu 1,265,000.00 eura. U redovnim troškovima značajno učešće imaju troškovi materijala za tekuće održavanje, troškovi prevoza zaposlenih do naplatnih mjesta i Komandnih centara Sozina i Pelev Brijeg, troškova sudskih sporova koji se odnose na sporove iz prethodnog perioda, ostalog potrošnog materijala, licenci za rad i sl.

**2.2.** Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 205,500 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih 20,000 eura, osiguranje imovine 100,000.00 eura, osiguranje i registracija vozila

i dodatno osiguranje - odnosno kasko osiguranje 80,500 eura. i osiguranje od odgovornosti po osnovu revizija, i sl.

**2.3.** Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 5,358,248.00 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1,623,313.00 eura. Po navedenom Ugovoru za 2024. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2024.g. i 15.10.2024.g.) u iznosu od 289,979.00 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1,333,334.00 eura.

Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom, planirana je u iznosu 2,208,408.00 eura za glavnice i 416,603.00 eura za kamatu.

U 2022. godini, zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, bila su neophodna značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate putarine na tunelu "Sozina" nijesu bili dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000.000 eura. Za otplatu glavnice planirano je 947,284.00 eura a za kamatu 162,640.00 eura.

**2.4.** Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova a vodeći računa o kadrovskim potrebama s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u većini sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i održavanja, poslovima zaštite i spašavanja u tunelu „Sozina“ i na autoputu. Dodjelom novih projekata za nastavak auto-puta biće neophodno angažovanje određenog broja inženjera adekvatno fazama realizacije projekata, za koje je neophodno planirati određena sredstva.

Organizovanjem novih službi a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, na dan 31.12.2024. godine je 310 zaposlenih na neodređeno i određeno, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora.



Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24-satnom radnom vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava planirati veći budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe, neophodno je planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju

redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 310 zaposlenih na neodređeno, zarade za angažovanje zaposlenih na određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva, tri



člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora i za 20 sezonskih radnika koji će biti angažovani prosječno 5 mjeseci i angažovanje potrebnog kadra za realizaciju novih investicija po potrebi. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 7,215,469.15 eura. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine.

**3.** Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih: Kolektivnim ugovorom čl. 68 Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1%-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su planirana sredstva za 2025.godinu iznose 250.000 eura . Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva.

**4.** Poslovna jedinica za upravljanje projektima izgradnje autoputa i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori:

**4.1** Upravljanje projektima izgradnje autoputa i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori:

projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo: Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Montepuť“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
- Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2024. godini.
- Za realizaciju preostalih obaveza predviđena su sredstva 33.000,00 eura i to za ostale adminastrativno-tehničke troškove 30.000 eura i za obuku za korišćenje softvera za geodeziju 3.000. eura.

**5. Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta -17 020 K003 001-Autoput Bar-Boljare**

Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025.g, sa pozicije- 17 020 K003 001-Autoput Bar-Boljare-----100,016,000.00€

Odlukom Vlade Crne Gore „Monte put“ d.o.o. je zadužen za realizaciju investicija iz Kapitalnog budžeta vrijedne 702,665,150.00 eura sa PDV-om, koje će u 2025. godini biti realizovane u iznosu 100,016,000.00 eura.



## 6. Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta pozicija - 17 020 K03 002-Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice

Iz priliva sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG za 2025.g, sa pozicije 17 020 K03 002-Izrada projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput i brze saobraćajnice planirano je finansiranje idejnih projekta čija je vrijednost 24,248,400,00 eura a za koje je planiran izdatak u 2025.godini 5,000,000 eura.

- Izrada idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Stari Bar -Sukobin
- Izrada idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Petlja Primorske saobraćajnice - Markovići
- Izrada glavnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Markovići - Lastva Grbaljska
- Izrada idejnog projekta brze Primorske saobraćajnice, dionica: Lastva Grbaljska - Debeli Brijeg
- Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Crnča - Pljevlja
- Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Nikšić - Pljevlja (Vrulja)

## 7. Investicije iz sredstava dobiti raspoređene po Zaključku Vlade CG

Za realizaciju navedene pozicije u 2025.g. planirana su sredstva dobiti 2021-2023.g raspoređene zaključcima Vlade Crne Gore u iznosu 5,519,585.00 eura. Ostatak sredstava planira se da se obezbijedi iz raspodjele dobiti za 2024 i narednih perioda do pokrića sredstava.

**7.1** Idejni/glavni projekti-17,835,400,00 eura, očekivana realizacija u 2025.godini 1.783.540 eura.

- Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo
- Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, petlja: Grahovo-granica BIH
- Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Pljevlja - granica sa BIH

- Izrada idejnog projekta autoputa Andrijevića - Peć, dionica: Andrijevića - granica sa Kosovom
- Izrada idejnog/glavnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Danilovgrad - Nikšić
- Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice, dionica: Smokovac - Božaj

**7.2.** Projektovanje-idejna rješenja 1,438,446.19 eura čija se realizacija u 2025.godini očekuje u iznosu 1,255,248.00 eura.

- Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevića - Peć - ugovoreno
- Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde-ugovoreno
- Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva-ugovoreno
- Izrada idejnog rješenja Virpazar - Sukobin-ugovoreno
- Izrada idejnog rješenja Danilovgrad - Nikšić
- Izrada idejnog rješenja Jadransko-Jonskog autoputa, dionica: Čevo - granica BiH
- Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Smokovac - Božaj-ugovoreno
- Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Nikšić - Pljevlja
- Izrada idejnog rješenja brze saobraćanice Podgorica - Danilovgrad
- Izrada idejnog rješenja regionalnog puta Rijeka Crnojevića - Virpazar
- Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar-Boljare sa Jadransko-jonskim autoputem-ugovoreno

**7.3-7.4.** Za realizaciju projekata neophodno je formirati stručne komisije za realizaciju i praćenje određenih faza projekata. Za te namjene planirana su sredstva 7,441,800.00 eura. Finansiranje obaveza planirano je iz sredstava ostvarene dobiti Monteputa u proteklom i narednim periodima. U 2025.godini očekuje se rashod po tom osnovu 2,979,804.00 eura.

Napomena: Zbog raspisivanja poziva za Javne nabavke određene pozicije Finansijskog plana smo planirali u ukupnom iznosu koji se planira za raspisivanje poziva sa PDVom. Imajući u vidu da će realizacija po datim pozicijama biti djelimično u 2025.godini a većim dijelom u budućim periodima za sve iznose koji se realizuju nakon 2025. predviđene su pozicije umanjenja. Umanjenja su prikazana na pozicijama 6,7,8,9,10,14, i 15.

## **Zaključak**

Nakon detaljnog prikaza pozicija očekivanih priliva u iznosu 137,445,354.80 eura i odliva u iznosu 137,187,591.46 eura, može se zaključiti da su rashodi pokriveni prihodima i da se nakon realizacije svih planskih obaveza, kao rezultat ostvarenja plana, očekuje pozitivan finansijski saldo u iznosu 257,763.34 eura.

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA  
“MONTEPUT” D.O.O. PODGORICA ZA 2024. GODINU**



## **Pravni status**

„Montepuť“ d.o.o. Podgorica je jednoćlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Montepuť“ d.o.o. („Sl.list CG“, br.101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.35/14), osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, Odlukom Vlade Crne Gore broj 08-011/24-2872/2 od 30. maja 2024. godine, preimenovana u Poslovnu jedinicu za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u Podgorici 09.05.2006. godine pod reg. br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti 5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici, ul. Avda Međedovića br.130.

Djelatnost „Montepuť“ d.o.o., (u daljem tekstu: Društvo), definisana je citiranim odlukama Vlade Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zakljućenim između Vlade Crne Gore - Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Montepuť“ d.o.o., sa druge strane.

## **Osnovne odredbe**

Odredbama Statuta ovog Društva, čl.14 stav 2, definisana je obaveza donošenja Plana rada i Finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivaća Društva, odnosno Vlade Crne Gore.

Na osnovu predloga Plana rada za 2023. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i raspoloživim sredstvima na poslovnim računima rezervisanim za ugovorene – nerealizovane planske obaveze iz 2022. godine, urađen je predlog Finansijskog plana za 2024. godinu.

## **Izvori finansiranja i struktura prihoda:**

Finansijskim planom, predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu 113.570.486 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora:

### 1. Prihoda Društva (sa PDVom)

- 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica -  
----- 12.550.097€
- 1.2. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritete dionice Smokovac-Mateševo ----- 9.818.332 €
- 1.3. 1.3 Prihoda od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja elektrićnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----  
-----cca 20.500.000€
- 1.4. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda -----65.000€
- 1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva----- 485.000€

### 2. Prihod od raspodjele dobiti 2021.g, i 2022.g. raspoređene po Zaključku br.08-011/23-6295/2 od 29. decembra 2023.godine-----2.452.058€

### 3. Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu Zakona o Budžetu CG za 2024.g od 28.12.2023.g. čl.18 -----67.700.000€

### **Planirani prihodi "Monteput" d.o.o. za 2024. godinu**

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2024. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2023. godini.

Tabela 1

	<b>PRILIVI SREDSTAVA</b>	<b>Realizovani prihodi 2023. januar-decembar</b>	<b>Planirani prihodi 2024.godina Eura</b>	<b>Realizovani prihodi januar-decembar</b>	<b>2024/2023</b>
1.1.	Prihodi od naknada-putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	11.952.473	12.550.097	12.687.000	1.06
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo	9.350.792	9.818.332	11.074.976	1.18
1.3.	Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDIS	20.095.224	20.500.000	0	0
1.4.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa-bilborda	58.722	65.000	66.270	1.13
1.5.	Prihoda od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva	501.513	1.143.020	814.965	1.62
<b>1.</b>	<b>Ukupni poslovni prihodi</b>	<b>41.958.724</b>	<b>44.076.449</b>	<b>24.643.211</b>	<b>0.59</b>
2.	Prihod od raspodjele dobiti 2021.g i 2022.g., raspoređene po Zaključku br.od 29.12. 2023.godine		2.452.058		
3.	Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu Zakona o Budžetu CG za 2024.g od 28.12.2023.g. čl.18		67.700.000		
4.	Priliv od povraćaja sredstva za plaćene poreze			715,280.31	
	<b>Ukupni prilivi sredstava (1+2+3)</b>		<b>113.570.486</b>	<b>25,358,491,31</b>	

Cilj Društva je realizacija kapitalnih investicija u projekte nastavka izgradnje auto-puta Bar-Boljare, preduzimanje aktivnosti za unapređenje poslovanja i postizanje boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju obaveza za investicije iz Kapitalnog budžeta, kao i modernizacija sistema naplate i integracije sistema naplate tunel Sozina i autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, pružanje kvalitetnijih usluga našim korisnicima, razvoj novih korisničkih servisa dopune računa putem Web i mobilne aplikacije kao i

bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela „Sozina“ i „Raš“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

## **Obrazloženje realizovanih prihoda**

Na osnovu rezultata poslovanja „Monte put“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na naplatnim mjestima tunel Sozina i autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirani su prihodi za 2024. godinu.

### **1. Ukupni poslovni prihodi:**

**1.1.** Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju "Monteput" d.o.o. („Sl. list RCG”, broj: 76/05, 68/09, 33/14 i 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list RCG”, broj: 48/08, 20/12, 31/14, 082/20 i 065/22). Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2023. godini, planirani su prihodi od naplate putarine za poslovnu 2024. godinu veći za 5%.

Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina ostvaren je u iznosu 12.687.000 eura, što je 1,01 % više od planiranih prihoda, 6% više nego 2023.g. U realizovanim prihodima manuelna naplata učestvuje sa 75,03% eura, a ENP 24,64% i Toll4All 0,33%. Prihod je ostvaren od prolazaka vozila kategorije Tip 1-Tip 5. Najveće učešće imaju vozila Tip 2 - putnička vozila 63,50%, zatim Tip 5 – 20,70%, slijedi Tip 4 - 8,94%, Tip 3 - 6,79% i Tip 1 - 0,07%. U ukupnim prihodima od naplate putarine prihod ostvaren na naplatnom mjestu Sozina učestvuje sa 53,40%.

**1.2.** Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je u saobraćaj 13.07.2022. godine, a naplata putarine počela je 21.07.2022. godine. Naplata se vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Prihod za 2024. godinu ostvaren je za 12,79% više od planiranog, a 18,44% više nego 2023.godine.

Prihod od naplate putarine na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo realizovan je u iznosu 11.074.976 eura što je 18,44 % planiranih prihoda. U realizovanim prihodima manuelna naplata ostvarena je 70,62%, ENP 28,83%, a Toll4All 0,55%. Prihod je ostvaren od prolazaka vozila kategorije Tip1-Tip5. Najveće učešće imaju vozila Tip 2 - putnička vozila 86,45%, zatim Tip 3 - 5,89%, Tip 4 - 4,8%, Tip 5 – 2,82%, i Tip 1 - 0,04%. U ukupnim prihodima od naplate putarine prihod ostvaren na naplatnim mjestima na autoput učestvuje sa 46.60%.

**1.3.** Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovoru CEDISa i planiran je u iznosu cca 20.500.000 eura. Ugovorom sa CEDIS-om regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorom precizirani su uslovi otkupa. U posmatranom periodu nije realizovana prodaja.


**1.4.** „Monteput“ raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Za 2024. godinu prihodi od izdavanja

reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 65.000 eura sa PDV-om. U 2024.g, ostvareni su prihodi u iznosu 66.270 eura.

**1.5.** Prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih kablova mobilnih operatera, i ostali prihodi koje Društvo planira da ostvari planirani su u iznosu 485.000 eura sa PDV-om. U periodu januar-decembar ostvareni su prihodi u iznosu 814.965 eura, a odnose se na prihode od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera, prihode od nadzora, prihode od naknade štete i prihode od povraćaja sredstava iz sudskih sporova.

**2.** Prihod od raspodjele dobiti 2021.g, i 2022.g raspoređena je Zaključkom Vlade Crne Gore br. od 29. decembra 2023.godine u iznosu 2.452.059 eura. Zaključkom dodijeljena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski auto-put, kao i administrativo-tehničke poslove za auto-puteve i brze saobraćajnice.

**3.** Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu člana 18 Zakona o Budžetu CG za 2024.g, za realizaciju kapitalnih projekata vezanih za nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, čija se realizacija za 2024.godinu planira u iznosu 67.700.000 eura. U posmatranom periodu nijesu povučena sredstava iz Budžeta.

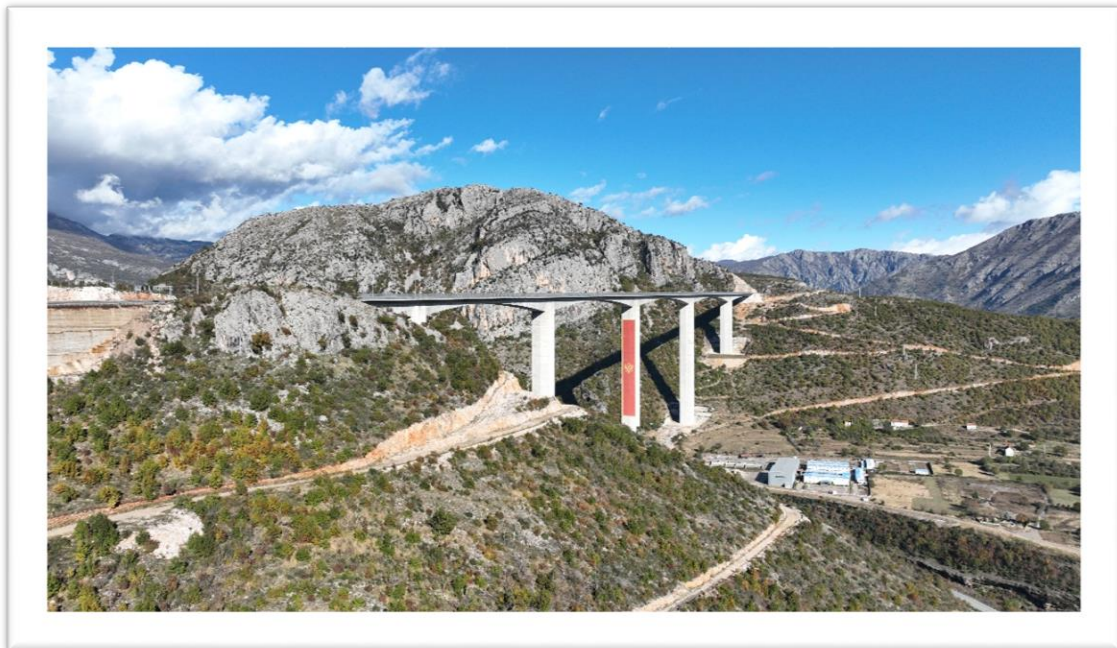



## Struktura rashoda

U tabeli 2. dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog plana, rashoda za upravu (menadžment, pravni sektor, sektor za finansijske i računovodstvene poslove i sektor za tehničku pripremu, nadzor i održavanje); sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela „Sozina” i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare-dionica Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada.

Tabela 2

		Uprava	Sozina	Autoput-dionica Smokovac-Mateševo	P.J za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori	Ukupno plan 2024	Realizovano 2024.g
1.	<b>INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>58.698</b>	<b>1.965.413</b>	<b>3.631.215</b>	<b>25.500</b>	<b>5.680.826</b>	<b>3.501.918</b>
1.1.	<b>Investiciona ulaganja</b>	<b>0</b>	<b>237.254</b>	<b>891.974</b>	<b>0</b>	<b>1.129.228</b>	<b>997.500</b>
1.1.1.	Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Komandnog centra		41.000			41.000	40.317
1.1.2.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i auto-puta ugovorene-nerealizovane obaveze		50.000	415.000		465.000	465.000
1.1.3.	Usluga integracije sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje		30.000	220.000		250.000	250.000
1.1.4.	Izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina ugovorene nerealizovane obaveze		72.254			72.254	72.254
1.1.5.	Nabavka i ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza			87.400		87.400	
1.1.6.	Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg			34.474		34.474	33.809
1.1.7.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel Raš - raskrsnica Virpazar) ugovorene nerealizovane obaveze		25.000			25.000	22.219
1.1.8.	Nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina		0			0	
1.1.9.	Provlačenje i povezivanje optickog voda kroz tunel Sozina		19.000			19.000	

1.1.10	Nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde			95.100		95.100	95.067
1.1.11	Apsorberi/ublaživači udara			0		0	
1.1.12	Izrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona			40.000		40.000	18.804
<b>1.2.</b>	<b>Tekuće građevinsko održavanje</b>	<b>0</b>	<b>775.544</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>990.044</b>	<b>267.598</b>
1.2.1.	Nabavka materijala i izrada horizontalne saobraćajne signalizacije		28.200			28.200	28.200
1.2.2.	Pregled čišćenja separatora, pranje i zamjena filtera u separatorima			0		0	
1.2.3	Skladištenje opasnih materija iz separatora		3.000	10.000		13.000	
1.2.4.	Nabavka rezervnih djelova za vjetrobransku ogradu na mostu Moračica			10.000		10.000	<b>9.737</b>
1.2.5.	Nabavka rezervnih djelova za ogradu za zaštitu od zasljepljenja			10.000		10.000	9.415
1.2.6	Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom nerealizovane obaveze		60.000			60.000	59.828
1.2.7.	Sanacija čelične odbojne ograde i nabavka rezervnih dijelova		100.000	10.000		110.000	
1.2.8.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije		40.000	80.000		120.000	45.678
1.2.9.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš.		110.000			110.000	
1.2.10.	Sanacija građevinskih objekata u vlasništvu Upravljača na Sozini		70.000			70.000	
1.2.11.	Nabavka i ugradnja specijalne podloge za uređenje rekreativne staze u krugu KC Sozina za potrebe vatrogasaca.		7.000			7.000	
1.2.12.	Radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore		15.000			15.000	
1.2.13.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge.-		312.500			312.500	1.702

1.2.14	Glavni pregledi objekata (mostova, tunela, saobraćajnice...)		10.000			10.000	
1.2.15	Proširenje i prepravka rezervoara za gorivo			0		0	
1.2.16	Nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze			29.300		29.300	29.258
1.2.17	Nabavka, transport i ugradnja kliznog segmenta čelične odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze			65.200		65.200	63.937
1.2.18	Nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na Sozini nerealizovane obaveze		19.844			19.844	19.843
<b>1.3</b>	<b>Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme</b>		<b>289.400</b>	<b>590.600</b>	<b>3.000</b>	<b>883.000</b>	<b>172.945</b>
1.3.1.	Nabavka led reflektora i raznih sijalica za tekuće održavanje		15000	15000		<b>30000</b>	<b>13492</b>
1.3.2.	Nabavka djelova za održavanje i servis klima, servis grijanja i hlađenja u COKSu			10000		10000	
1.3.3.	Rezervni djelovi za održavanje ormara automatike(trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markri, promjenljive signalitacije, video nadzora i sl)		38000	35000		73000	4085
1.3.4.	Održavanje senzora CO, vidljivosti i strujanja vazduha			30000		30000	
1.3.5.	Održavanje senzora strujanja vazduha u tunelima			2000		2000	
1.3.6.	Vanredni i redovni servis i nabavka uređaja za besprekidno napajanje -UPS, nabavka baterija za uređaje za besprekidno napajanje		25000	5000		30000	2672
1.3.7.	Vanredni i redovni servis i nabavka rezervnih djelova za agregate		9500	5000		14500	320
1.3.8.	Održavanje ormara sa soft starterima za jet fenove			5000		5000	
1.3.9.	Održavanje pumpnog postrojenja na vodoizvorištu, rezervoaru "Podovi", hlornim stanicama, buster postrojenja hidrantske mreže i pogona za tretman otpadnih voda			20000		20000	
1.3.10.	Rezervni djelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine		10000	30000		40000	26366
1.3.11.	Održavanje servera, svičeva, video zida, video kontrolera, monitora u komandnom centru			5000		5000	

1.3.12	Održavanje SCADA sistema		60500	237000		297500	58613
1.3.13	Nabavka ventilatora i održavanje sistema ventilacije		10000	33000		43000	
1.3.14	Sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova		8000	30000		38000	7140
1.3.15	Održavanje sistema dojava požara i PP zaštite		7000	20000		27000	
1.3.16	Ostali uređaji, oprema i materijal koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće elektro-mašinsko održavanje objekata i hitne intervencije		10000	67000		77000	37535
1.3.17	Održavanje softvera za naplatu putarine		65000			65000	16034
1.3.18	Redovni servis i nabavka, zakup, uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		6400	11600		18000	1154
1.3.19	Hitne intervencije		25000	0		25000	3337
1.3.20	Nabavka mobilnih gradilišnih reflektora sa integrisanim agregatom, a za potrebe izvođenja hitnih intervencija			30000		30000	
1.3.21	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata				3000	3000	2197
<b>1.4.</b>	<b>Nabavka osnovnih sredstava i inventara</b>	<b>58698</b>	<b>663215</b>	<b>1934141</b>	<b>22500</b>	<b>2678554</b>	<b>2063875</b>
1.4.1.	Nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg vozila za potrebe sektora Sozina ugovorene obaveze 2023		307.968			307.968	307.996
1.4.2.	Nabavka putničkog vozila ugovorene nerealizovane obaveze			49.400		49.400	49.400
1.4.3.	Nabavka rezervnih i potrošnih dijelova opreme i mašina za održavanje puta ugovorene nerealizovane obaveze			21.780		21.780	
1.4.4.	Nabavka specijalnih vozila za održavanje tunela, kanala i kanalizacije nerealizovane obaveze			587.092		587.092	587.092
1.4.5.	Nabavka pluga za Isuzu vozilo (čišćenje snijega)		17.244			17.244	16.510
1.4.6.	Nabavka malog navalnog vatrogasnog vozila			158.000		158.000	
1.4.7.	Nabavka freze za odbacivanje snijega			89.300		89.300	89.298
1.4.8.	Nabavka kombi vozila i putničkih vozila			123.000		123.000	122.680
1.4.9.	Nabavka male kosilice sa duvačem (nastavak za unimoga) za održavanje pojaseva oko stubova čeline zaštitne ograde			72.200		72.200	72.177

1.4.10.	Traktor sa prikolicom i mogućnošću instalacije višenamjenskih priključaka			158.400		158.400	96.558
1.4.11.	Nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu		5.000	25.000		30.000	7.754
1.4.12.	Nabavka niskonoseće prikolice			55.000		55.000	
1.4.13	Servisiranje nadogradnje vatrogasnog vozila.		2.600			2.600	1.295
1.4.14.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme puta		8.240	15.000		23.240	8.640
1.4.15.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta		5.000	10.000		15.000	6.640
1.4.16.	Nabavka rezervnih djelova za Holmatro hidraulični alat.		6.000			6.000	6.000
1.4.17.	Nabavka privremene saobraćajne signalizacije		20.000	65.526		85.526	85.082
1.4.18.	Nabavka kamera i rezervnih djelova za video nadzor		25.000	10.000		35.000	20.957
1.4.19.	Nabavka termovizijske opreme za ispitivanje elektro opreme i instalacija			5.000		5.000	
1.4.20.	Nabavka, ugradnja i instalacija informacionih displeja Smokovac/Mateševo			0		0	
1.4.21.	Nabavka vatrogasne opreme i alata		3.140			3.140	1.618
1.4.22.	Nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca			5.000		5.000	4.957
1.4.23.	Sredstva i oprema lične zaštite iz 2023		26.862	44.165		71.027	71.548
1.4.24.	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite		8.000	12.000		20.000	19.313
1.4.25.	Nabavka vatrogasne zaštitne obuće i odjeće		5.180	4.500		9.680	8.682
1.4.26.	Nabavka radne odjeće i uniforme		5.000	8.000	1.500	14.500	
1.4.27.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	16.070	10.700	15.500	2.000	44.270	13.494
1.4.28	Nabavka klima uređaja i bijele tehnike	600	3.000	3.000		6.600	5.773
1.4.29	Nabavka uređaja i opreme za elektro-mašinsko održavanje auto-puta			9.500		9.500	

1.4.30	Nabavka i montaža kućice i uređaja za automatsku naplatu putarine za NC Pelev Brijeg			51.000		51.000	
1.4.31	Nabavka eksternih VoIP telefona		15.000			15.000	
1.4.32	Nabavka računarske opreme	19.200	10.000	14.000	6.000	49.200	44.144
1.4.33	Nabavka mrežne opreme	2.000	20.000	5.000		27.000	5.502
1.4.34	Nabavka servera i ostale serverske opreme	5.000	19.700	5.000		29.700	
1.4.35	Davači kartica ugovorene nerealizovane obaveze			80.998		80.998	80.998
1.4.36	Nabavka drona za monitoring i snimanje objekata u izgradnji			30.500	10.000	40.500	8.696
1.4.37	Nabavka, isporuka i ugradnja antena za TAG		38.720	166.280		205.000	199.913
1.4.38	Nabavka hidraulične dizalice		79.861			79.861	79.860
1.4.39	Nabavka IP telefoni	1.500	1.000			2.500	2.420
1.4.40	Kamere u upravnoj zgradi	1.000				1.000	
1.4.41	Ostala osnovna sredstva	10.000	20.000	35.000	3.000	68.000	35.550
1.4.42	Punjači za Električna vozila			0		0	
1.4.43.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme ugovorene nerealizovane obaveze	3.328				3.328	3.328
<b>2.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>3.608.617</b>	<b>2.293.136</b>	<b>22.465.778</b>	<b>1.016.950</b>	<b>29.384.481</b>	<b>15.473.218</b>
<b>2.1</b>	<b>Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga</b>	<b>495.130</b>	<b>739.180</b>	<b>2.488.839</b>	<b>257.300</b>	<b>3.980.449</b>	<b>3.073.979</b>
2.1.1.	Kancelarijski materijal toneri	17.950	10.000	4.850	13.500	46.300	44.200
2.1.2.	Termo rolne za printere i POS terminale i magnetne trake		20.000	65.000		85.000	85.000
2.1.3.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	500	500	1.000	500	2.500	700
2.1.4.	Sredstva za održavanje poslovnih prostorija, i ostala sredstva za higijenu	3.150	7.900	10.950	2.700	24.700	24.300
2.1.5.	Održavanje higijene objekata – "outsorce"	13.600	20.850	43.000	6.900	84.350	84.300

2.1.6.	Nabavka vode za piće, kafe, pića i napitaka	4.200	9.300	15.000	5.000	33.500	29.404
2.1.7.	Nabavka deterdženta za pranje tunela Sozina i Raš		4.000			4.000	3.500
2.1.8.	Materijal za održavanje (so, rizla, tečni rastvor za posipanje)		3.000	70.000		73.000	68.300
2.1.9.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	5.000	7.000	7.700	1.000	20.700	19.300
2.1.10.	Redovno održavanje i servisiranje vozila	12.000	18.000	75.000	6.000	111.000	38.600
2.1.11.	Vanredni servis vozila (rezervni djelovi i usluge)	6.000	10.000	20.000	2.000	38.000	11.558
2.1.12.	Nabavka auto guma, motaža, balansiranje, skladištenje i krpjenje guma	5.000	5.000	15.000	4.000	29.000	14.542
2.1.13.	Usluga pranja vozila i nabavka potrošnog materijala za održavanje	3.000	1.000	1.000	1.500	6.500	2.850
2.1.14.	Održavanje nadogradnje na vatrogasnim vozilima i nabavka nedostajuće opreme		6.000	7.000		13.000	4.212
2.1.15.	Trošak goriva vozila /benzinska stanica autoput /lož ulje	25.000	20.000	350.000	10.000	405.000	215.900
2.1.16.	Trošak GPS	1.000	2.000	6.000	1.500	10.500	10.500
2.1.17.	Trošak električne energije	10.000	270.000	761.556	5.000	1.046.556	930.370
2.1.18.	Troškovi komunalnih usluga (deponija, čistoća, održavanje ulaza, voda...)	5.000	10.000	10.000	4.000	29.000	29.000
2.1.19.	Troškovi zakupa hig.toaleta i usluga održavanja čišćenja, pražnjenja i dezinfekcije toaleta			15.000		15.000	15.000
2.1.20.	Troskovi zakupa poslovnog prostora				24.000	24.000	
2.1.21.	Trosak kablovskih servisa i usluga	3.000	2.500	4.300	1.000	10.800	10.824
2.1.22.	Trošak mobilnih servisa i usluga	3.500	1.500	3.000	2.600	10.600	11.444
2.1.23.	Izrada baze podataka puteva			75.000		75.000	27.636
2.1.24.	Troškovi konsultantskih usluga	26600			65.000	91.600	20.900
2.1.25.	Troškovi ugovora o djelu	10.000	5.000	26.000	7.000	48.000	47.800
2.1.26.	Rashodi za komisije zaposleni i komisije i radne grupe lica koja nijesu zaposlena u Monteputu	24.000	9.000	26.000	10.000	69.000	68.500
2.1.27.	Trošak reprezentacije	20.000	1.000	10.000	10.000	41.000	40.500
2.1.28.	Nabavka Tag uređaja nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda			247.393		247.393	234.070
2.1.29.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja i troškovi prolazaka autoput/Sozina	30.000	2.000	55.000	5.000	92.000	65.000
2.1.30.	Troškovi oglasa	2.000	1.500	1.500	500	5.500	1.200
2.1.31.	Troškovi reklame i propaganda (video produkcija, promocija u medijima, promotivni materijal, online promocijai drugi vidovi reklame i propagande	20.500	5.600	14.200	3.000	43.300	35.000

2.1.32	Troškovi edukacije zaposlenih o komunikaciji	0		0	0	0	
2.1.33	Usluge revizije- externa	8.500				8.500	6.655
2.1.34	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera i licence	5.000				5.000	4.900
2.1.35	Troškovi održavanja računarske opreme				5.000	5.000	4.500
2.1.36	Nadogradnja DMS-a dodatne funkcionalnosti	9.600				9.600	9.600
2.1.37	Održavanje web servisa i usluga	1.000			1.600	2.600	280
2.1.38	Razvoj i implementacija digitalnih kanala prodaje putarine	60.000				60.000	56.000
2.1.39	Trošak održavanja mrežne infrastrukture	6.000				6.000	5.500
2.1.40	Trošak održavanje serverske opreme i sistemskih servisa	6.000	2.000	3.000		11.000	6.218
2.1.41	Trošak Office 365 platforme - E-mail servis - godišnje licence	9.000	2.000	4.000	3.000	18.000	17.500
2.1.42	Trošak licence za Autodesk softvere	5.000				5.000	5.000
2.1.43	Nabavka softvera za backup servera i radnih stanica		3.000			3.000	3.000
2.1.44	Nabavka licenci za bezbjednost mrežne infrastrukture	1.200	1.200	3.200		5.600	5.595
2.1.45	Nabavka licenci za antivirus programe	1.500			500	2.000	1.987
2.1.46	Nabavka licenci za Microsoft Windows Servere	3.500				3.500	3.500
2.1.47	Nabavka softvera za upravljanje IT opremom	3.000				3.000	2.600
2.1.48.	Usluga digitalizovanja tehničke dokumentacije-projekata i planova		9.680			9.680	
2.1.49.	Usluga izrade strategije razvoja IKT-a sluzbe	5.000				5.000	60
2.1.50.	Usluga procjene stanja bezbjednosti IT infrastrukture - IT Security Checkout	4.000	5.000	10.000		19.000	
2.1.51.	Nabavka i ugradnja sistema za evidenciju radnog vremena	2.000				2.000	
2.1.52.	Softver za statičku i dinamičku analizu konstrukcije i softver za izradu detalja armature				5.500	5.500	3.509
2.1.53.	Nabavka softvera za izradu geodetskih podloga				10.000	10.000	4.390
2.1.54.	Ostali poslovni rashodi za IT	3.680	1.330	1.780		6.790	6.700
2.1.55.	Trošak održavanje računara i Web servera				6.600	6.600	
2.1.56.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom + IT + obuka operatera KC...)	10.000	12.220	22.260	5.000	49.480	25.600
2.1.57.	Naknada za priključenje na distributivni sistem električne			0		0	



	energije i troškovi uknjižbe objekata						
2.1.58.	Ispitivanje elektrogromobranske instalacije		200	500	300	1.000	1.000
2.1.59.	Izmjena Akta o procjeni rizika za neobrađena radna mjesta po novoj sistematizaciji	100	100	100	100	400	400
2.1.60.	Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad		200	250		450	384
2.1.61.	Ispitivanje sredstava za rad i opreme lične zaštite na radu		200	400		600	363
2.1.62.	Trošak održavanja vatrogasne opreme i servis kompresora		2.000	7.500		9.500	3.600
2.1.63.	Ispitivanje PP aparata; hidranata; kalibracija Drager alkotesta; kontrola detektora požara i ventilacije u tunelima		1.250	14.150		15.400	9.701
2.1.64.	Ispitivanje hidrantske mreže		300	4.700		5.000	5.000
2.1.65.	Nabavka hlora, održavanje vodovodne mreže i periodično ispitivanje kvaliteta vode u sistemu na auto-putu			5.000		5.000	760
2.1.66.	Ispitivanje uslova radne sredine		100	100		200	157
2.1.67	Periodični sistematski pregledi zaposlenih		1.500	2.500	1.000	5.000	2.350
2.1.68	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	25.000	45.000	37.000	2.000	109.000	108.520
2.1.69	Troškovi transporta novca		2.100	7.500		9.600	9.600
2.1.70	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.000	1.000	1.000	2.500	6.500	6.500
2.1.71	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licence zaposlenih za obavljanje poslova	3.500	500	1.000	2.500	7.500	7.300
2.1.72	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica		8.000			8.000	7.020
2.1.73	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.150	45.250	175.250	2.000	224.650	210.603
2.1.74	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	5.000	51.400	60.000	5.000	121.400	33.202
2.1.75	Troškovi prevoza zaposlenih		80.500	81.200		161.700	165.508
2.1.76	Administrativni troškovi (registracije/dozvole i sl.)	1.000	500	3.000		4.500	272

2.1.77	Trošak službenih putovanja	15.000	5.000	15.000	10.000	45.000	28.634
2.1.78	Monitoring i zaštita životne sredine	0		48.000		48.000	30.000
2.1.79	Ostali poslovni rashodi	46.400	5.000	40.000	3.000	94.400	75.600
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>12.660</b>	<b>28.000</b>	<b>135.800</b>	<b>6.370</b>	<b>182.830</b>	<b>147.222</b>
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2.900	5.400	10.400	1.300	20.000	17.647
2.2.2.	Osiguranje imovine	260	16.100	70400	570	87.330	84.575
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	9.500	6.500	55.000	4.500	75.500	45.000
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi kredita</b>	<b>1.683.468</b>	<b>0</b>	<b>16.638.297</b>	<b>0</b>	<b>18.321.765</b>	<b>5.408.724</b>
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – glavnica	1.333.334			0	1.333.334	1.333.334
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – kamata	35.0134			0	35.0134	35.0134
2.3.3	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom			15.035.096	0	15.035.096	2.122.055
2.3.4.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate			492.277		492.277	492.277
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- glavnica			919.285		919.285	919.285
2.3.6	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- Troškovi kamate			191.639		191.639	191.639
<b>2.4.</b>	<b>Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>1.417.359</b>	<b>1.525.956</b>	<b>3.202.842</b>	<b>753.280</b>	<b>6.899.437</b>	<b>6.843.293</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>1.333.424</b>	<b>1.404.479</b>	<b>2.971.441</b>	<b>713.914</b>	<b>6.423.257</b>	<b>6.401.854</b>
2.4.1.1	Neto zarade i naknade zarada	973.302	1.025.167	2.168.935	521.105	4.688.509	4.673.502
2.4.1.2	Porezi i doprinosi	360.122	379.312	802.506	192.809	1.734.748	1.728.352
<b>2.4.2.</b>	<b>Prevoz zaposlenih ukupno</b>	<b>22.550</b>	<b>25.905</b>	<b>54.950</b>	<b>12.435</b>	<b>115.840</b>	<b>114.899</b>

2.4.2.1	Prevoz zaposlenih neto	14.400	16.500	35.000	7.920	73.820	
2.4.2.2	Porezi i doprinosi	8.150	9.405	19.950	4.515	42.020	
<b>2.4.3.</b>	<b>Zimnica</b>	<b>32.525</b>	<b>52.272</b>	<b>102.802</b>	<b>15.682</b>	<b>203.280</b>	<b>185.835</b>
2.4.3.1	Zimnica neto	26.880	43.200	84.960	12.960	168.000	<b>151.500</b>
2.4.3.2	Porezi i doprinosi	5.645	9.072	17.842	2.722	35.280	<b>34.335</b>
<b>2.4.4.</b>	<b>Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru</b>	<b>28.860</b>	<b>43.300</b>	<b>73.650</b>	<b>11.250</b>	<b>157.060</b>	<b>140.705</b>
2.4.4.1	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	4.660	1.300	650	3.250	<b>9.860</b>	<b>9.860</b>
2.4.4.2	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	16.000	10.000	10.000	7.000	<b>43.000</b>	<b>26.645</b>
2.4.4.3	Otpremnine za odlazak u penziju i ostale otpremnine		25.000	50.000		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
2.4.4.4	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	8.200	7.000	13.000	1.000	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>3.</b>	<b>Izdaci za stambene potrebe zaposlenih</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>4.</b>	<b>Poslovna jedinica za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori</b>				<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>29.847</b>
<b>4.1.</b>	<b>Upravljanje projektom nakon završetka izgradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.847</b>
4.1.1.	Ispitivanja radova i opreme nakon završetka				20.000	20.000	9.680
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi				30.000	30.000	5.167
<b>4.2.</b>	<b>Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

4.2.1.	Nabavka opreme za izradu geodetskih podloga				10.000	10.000	10.000
4.2.2	Obuka za korišćenje opreme i softvera za geodeziju				5.000	5.000	5.000
<b>5.</b>	<b>Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta</b>				14.302.200	14.302.200	
5.1.	Izvođenje radova i nadzor				<b>1.234.200</b>	<b>1.234.200</b>	
5.1.1.	Izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo – Andrijevića						
5.1.2	Nadzor nad radovima na dionici autoputa Mateševo - Andrijevića						
5.1.3	Kontrolna ispitivanja				24.200	24.200	
5.1.4.	Revizija Glavnog projekta Mateševo-Andrijevića				1.210.000	1.210.000	
<b>5.2</b>	<b>Projektovanje-idejni projekti</b>				12.100.000	12.100.000	
5.2.1	Izrada idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Andrijevića - Berane – Boljare				6.050.000	6.050.000	
5.2.2	Izrada idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Podgorica -Bar				6.050.000	6.050.000	
5.3	Revizija projektne dokumentacije				968.000	968.000	
5.3.1	Revizija Idejnog projekta Andrijevića-Berane-Boljare				484.000	484.000	
5.3.2	Revizija Idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Podgorica -Bar				484.000	484.000	
6.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g. poz.5.1				1.234.200	1.234.200	

7.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g.poz. 5.2				5.600.000	5.600.000	
8.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g.poz 5.4				318.000	318.000	
9.	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica:Podgorica – Grahovo	4.840.000				4.840.000	
9.1.	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica:Podgorica – Grahovo	4.840.000				4.840.000	
10	Umanjenje pozicije 9.1 za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g	3.850.000				3.850.000	
<b>11</b>	<b>Projektovanje-idejna rješenja</b>	<b>1.283.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>1.404.730</b>	<b>27.576</b>
11.1	Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom	181.500				181.500	
11.2	Izrada studija izvodljivosti za Jadransko-jonski auto-put	300.000				300.000	
11.3.	Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevice - Peć				121.000	121.000	10.043
11.4	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde	205.700				205.700	
11.5	Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva	181.500				181.500	17.533
11.6.	Reviziju Idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica:Podgorica - Grahovo	363.000				363.000	
11.7.	Revizija Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko -	12.100				12.100	

	Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom						
11.8.	Revizija idejnog rješenja autoputa Andrijevića - Peć	12.100				12.100	
11.9.	Revizija idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde	18.150				18.150	
11.10.	Revizija idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva	9.680				9.680	
<b>12</b>	<b>Komisije</b>	<b>67.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>159.610</b>	<b>128.624</b>
12.1	Komisija za pripremu projektnog zadatka - idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	15.700				15.700	
12.2	Komisija za pripremu projektnog zadatka - idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Podgorica - Bar				15.700	15.700	
12.3	Komisija za tehničku pripremu pripremu tendera za izvođenje dionice Mateševo-Andrijevića				38.550	38.550	4.240
12.4	Komisija za otvaranje i vrednovanje tendera za izvođenje dionice Mateševo-Andrijevića				4.710	4.710	
12.5.	Komisija za tehničku pripremu tendera za nadzor dionice Mateševo - Andrijevića				30.000	30.000	1.702
12.6	Komisija za otvaranje i vrednovanje tendera tendera za nadzor dionice Mateševo-Andrijevića				3.140	3.140	
12.7	Komisija za planiranje sadržaja na nove dionice	12.560				12.560	
12.8	Komisija za eksproprijaciju	23.550				23.550	118.937
12.9	Ostale komisije	15.700				15.700	3.745
<b>13</b>	<b>Ostali projekti</b>	<b>463.010</b>				<b>463.010</b>	<b>9.099</b>
13.1	Izrada Idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad-Nikšić	157.300				157.300	

13.2	Izrada Idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica-Tuzi(Božaj)	96.800				96.800	9.099
13.3	Revizija Idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad-Nikšić	15.730				15.730	
13.4	Revizija Idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica-Tuzi (Božaj)	9.680				9.680	
13.5	Izrada Idejnog rješenja Jadransko-jonskog autoputa Sozina - granica sa Albanijom	150.000				150.000	
13.6	Izrada idejnog rješenja poddionica 16, 17 i 18 (Nikšić - Šavnik, Šavnik - Žabljak, Žabljak - Plevlja (Vrulja),	226.000				226.000	
13.7	Izrada idejnog rješenja poddionica 16, 17 i 18 (Nikšić - Šavnik, Šavnik - Žabljak, Žabljak - Plevlja (Vrulja),	(202.500)				(202.500)	
13.8	<b>Izrada Idejnog rješenja Jadransko-jonskog autoputa, dionica Čevo-granica sa BiH, i revizija Idejnog rješenja Jadransko-jonskog autoputa, dionica Čevo-granica sa BiH</b>	106.000				106.000	
13.9	<b>Izrada Idejnog rješenja Jadransko-jonskog autoputa, dionica Čevo-granica sa BiH i revizija Idejnog rješenja Jadransko-jonskog autoputa, dionica Čevo-granica sa BiH</b>	(96.000)				(96.000)	
<b>14</b>	<b>UMANJENJE POZICIJA</b>						
	<b>13.1-13.4</b>	<b>(53.393)</b>				<b>(53.393)</b>	
14.1.	Izrada Idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad-Nikšić-umanjenje pozicije 13.1	(31.460)				(31.460)	
14.2.	Izrada Idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica-Tuzi (Božaj)-umanjanje pozicije 13.2	(19.360)				(19.360)	
14.3	Revizija Idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad-Nikšić umanje pozicije 13.3	(1.573)				(1.573)	

14.4	Revizija Idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica-Tuzi (Božaj)-umanjanje pozicije 13.4	(1.000)				(1.000)	
15	<b>UMANJENJE POZICIJE 12.9</b>	(610.000)				(610.000)	(610.000)
15.1.	Osiguranje kosina (projektovanje, nadzor i ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš. 12.9	(610.000)				(610.000)	(610.000)
16	<b>PDV OBAVEZA</b>					<b>6.850.300</b>	<b>1.106.875</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.058.172</b>	<b>4.258.549</b>	<b>26.096.993</b>	<b>8.470.550</b>	<b>51.734.564</b>	<b>19.917.157</b>

### **Obrazloženje planiranih rashoda**

Pregled planiranih rashoda za 2024. godinu, u iznosu 51.734.564 eura sa PDV-om, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje rashoda planirano je iz poslovnih prihoda Monteputa, sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu Zakona o Budžetu CG za 2024.g od 28.12.2023.g. čl.18 i sredstava od raspoređenja dobiti 2021.g. i 2022.g po Zaključku Vlade Crne Gore br.08-011/23-6295/2 od 29. 12. 2023.g.


Utrošena sredstva u periodu januar-decembar 2024.godine iznose 19.917.157 eura.

#### **1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – 5.680.826 eura**

Privredno društvo "Monteput" d.o.o. Podgorica, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, dok je Statutom definisana djelatnost Društva- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju:

- upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad redovnim održavanjem autoputeva, zaštitu puta, upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, i drugi poslovi koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori, organizovanje i naplatu putarine;
- organizovanje održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja.



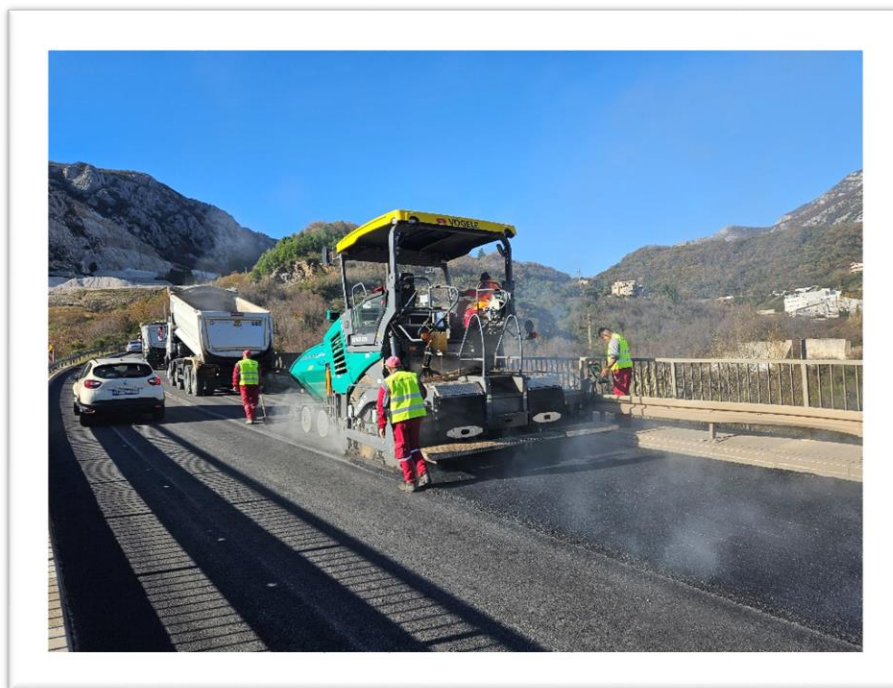

Odlukom o osnivanju „Montepuť“ d.o.o. Podgorica, tom privrednom društvu je povjereno upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima. Od 13.07.2022. godine Sektor za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa zadužen je za nadzor, upravljanje i održavanje auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

**1.1.** Investiciona ulaganja planirana iznose 1.129.228 eura, a realizovana 997.500 eura ili 88,33%

**1.1.1.** Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Komandnog centra planirana je 41.000 eura, a realizovana u vrijednosti 40.317 eura.

**1.1.2 - 1.1.3.** Nadogradnja sistema za naplatu putarine na tunelu „Sozina“ i integracija sistema naplate sa sistemom naplate na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

Polazeći od činjenice da je osnovni izvor prihoda Društva naplata putarine, posebna pažnja posvećena je sistemu naplate, tako da su ulaganja u sistem naplate neophodna. Nabavka postojećeg sistema za naplatu na tunelu „Sozina“ datira od 2014. godine, što je u uslovima napretka tehnoloških dostignuća veoma dug period, a i zahtijeva veoma visoke troškove održavanja postojećih sistema. Pažljivo su sagledani benefiti koje će omogućiti nadogradnja sistema. Kako od 2022.godine Društvo upravlja i autoputem Bar-Boljare, dionica Smokovac - Mateševo neophodna je integracija sistema naplate i digitalnih kanala prodaje. Samo proces praćenja naplate zahtijeva visok stepen tačnosti prepoznavanja kategorija vozila i registarskih tablica kao i čuvanje velikog broja podataka o vremenu prolaska, dionicama koje su korišćene, rasporedu prihoda od „Sozine“ i autoputa i ispravnosti naplate. Omogućen je pristup putem WEB aplikacije tako da korisnici mogu sami da izvrše uvid u stanje i dopunu korisničkih računa.

Za projekat integracije sistema naplate „Sozina“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirano je 715.000 eura i 100% realizovano.

**1.1.4-1.1.12** Na navedenim pozicijama planirane su obaveze su uglavom i realizovane. Planske obaveze na pozicijama 1.1.5 - Nabavka i ugradnja pokretne ograde za formiranje

službenih prolaza i 1.1.8 - Nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina su u toku i konačna realizacija prenijeće se na 2025.g.

## **1.2. Tekuće građevinsko održavanje**


Za radove tekućeg građevinskog održavanja planirana su sredstva u iznosu od 990.044 eura, od čega za održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica 775.544 eura, a za održavanje objekata na autoputu 214.500 eura.

U proteklom periodu utrošena su sredstva u iznosu 267.597 eura a odnose se na osiguranje kosina na nabavku materijala i izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - 28.200 eura; nabavku rezervnih djelova za vjetrobransku ogradu na mostu Moračica - 9.737 eura; nabavku rezervnih djelova za ogradu za zaštitu od zaslijepjenja - 9.415 eura; Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom - 59.828 eura;

ostale građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije - 45.678 eura; nabavku rezervnih elemenata odbojne ograde na auto-putu - 29.258 eura; nabavka, transport i ugradnja kliznog segmenta čelične odbojne ograde na auto-putu - 63.937 eura; nabavku rezervnih elemenata odbojne ograde na Sozini - 19.843 eura.

## **1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 883.600 eura**

**1.3.1 - 1.3.21.** Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, tunel “Sozina” i “Raš”, prilazne saobraćajnice i prateće objekte, planirana su sredstva u iznosu 289.400 eura, a za potrebe auto-puta 590.600 eura. U posmatranom periodu utrošeno je 172.945 eura.

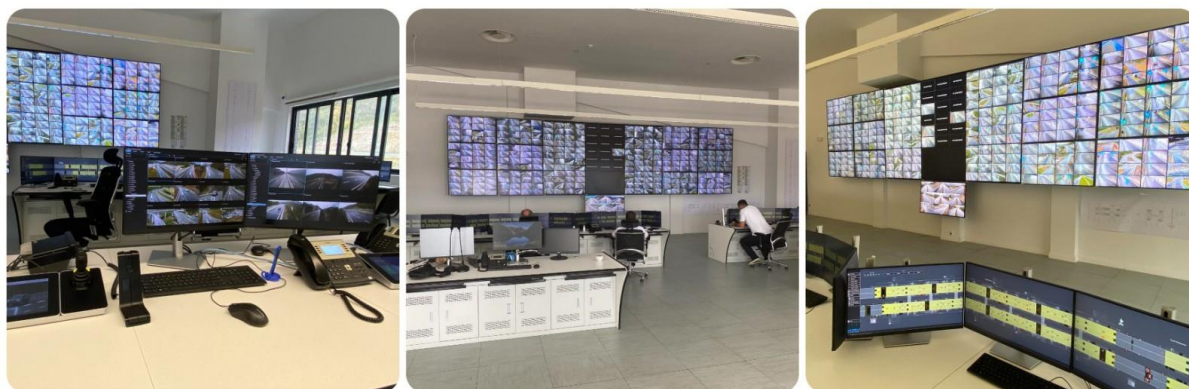

## **1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2024. godini, iznose 2.678.554 eura**

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica („Sl.list CG“, br. 101/20), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja radnih procesa sa

dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare.

Za zamjenu dotrajale opreme za upravnu zgradu planirana su sredstva u iznosu od 58.698 eura, za potrebe sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i pratećih objekata, izdvojeno je 663.215 eura.

Za potrebe sektora za nadzor, održavanje i upravljanje autoputem Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo izdvojeno je 1.934.141 eura. Ukupne nabavke realizovane su u vrijednosti 2.063.875 eura, a dio nabavki koje su zbog tenderskih procedura u toku realizovaće se u 2025.godini



## 1. Planirani rashodi tekućeg poslovanja

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2024. godinu iznose 29.384.481 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u iznosu od 3.608.617 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu od 2.293.136 eura sa PDV-om; sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa 22.465.778 eura i za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 257.300 eura sa PDV-om.

Realizovani poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....3.073.979 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....147.722 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....5.408.727€
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.)..... 6.843.293 €

**2.1.** Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 3.980.449 eura. Realizovani rashodi u posmatranom periodu iznose 3.073.979 eura. Najveće učešće u rashodima imaju trošak za električnu energiju 930.370 eura. Ostali poslovni rashodi realizuju se u skladu sa planiranim.

**2.2.** Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 182.830 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih 20.000 eura, osiguranje imovine 87.330 eura, registraciju vozila 75.500 eura. Troškovi osiguranja realizovani su u iznosu 147.222 eura. Odnose se na osiguranje zaposlenih 17.647 eura, osiguranje imovine 84.575 eura, osiguranje i registraciju vozila 45.000 eura.

**2.3.** Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 18.321.765 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.683.468 eura. Po navedenom Ugovoru za 2024. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2024.g. i 15.10.2024.g.) u iznosu od 350.134 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura. Kreditna obaveza je izmirena iz tekućih prihoda Društva.

Obaveza po kreditu IRFu za projekat izgradnje trefostanica za elektronapajanje auto-puta plaćena je u iznosu 2.614.332 eura.

U 2022. godini, zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, bila su neophodna značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate putarine na tunelu "Sozina" nijesu bili dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000,00 eura. Za otplatu kamate i glavnice u 2024.g. utrošeno je 1.110.924 eura.

**2.1.4.** Zarade se isplaćuju u skladu sa planiranim izdacima. Za period januar-decembar 2024. godine isplaćene su zarade za prosječno zaposlenih, tri člana Revizorskog odbora i tri člana Odbora direktora. Trošak zarada iznosi 6.401.854 eura. U ukupnim realizovanim troškovima poslovanja učestvuju sa 30.46%.

### **3. Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih:**

Članom 68 Kolektivnog ugovora Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su planirana sredstva za 2024. godinu iznosila 250.000 eura ili 1% poslovnih prihoda. Sredstva su raspoređena u skladu sa Pravilnikom Društva.

### **4. Poslovna jedinica za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori**

Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo: Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Montepuť“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
- Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2023. godini.

Tokom planske godine vršila se povremena kontrolna ispitivanja nakon završetka radova. Za navedene rashode utrošena su sredstva u iznosu 9.680 eura.

Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove planirani su u iznosu od 30.000 eura. Utrošena su sredstva u iznosu od 5.167 eura.

## **5-15 Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta i sredstava dobiti Monteputa**

U prethodnom periodu posebna pažnja je posvećena raspisivanju tenderskih procedura i ugovaranja planiranih obaveza.

U 2024.godini ugovoreno je:

- 11.5 Izrada idejnog rješenja prelaza preko bokokotorskog zaliva-Građevinski Institut Makedonija - Civil engineering - 175.329 eura,
- 13.3 Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevice - Peć, dionica Andrijevice –Čakor-Via Projekt - 100.430 eura,
- 13.2 Izrada idejnog rješenja, Podgorica-Tuzi-Božaj- Via Projekt - 90.992 eura,
- 13.1 Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice dionica Danilovgrad-Nikšić-KONZORCIJUM GEOTECHNICS PROJECT & CONSULTING - 129.470 eura,
- 13.8 Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča-Pljevlja-granica sa BiH-KONZORCIJUM GEOTECHNICS PROJECT & CONSULTING - 189.970 eura,
- 11.1 Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar-Boljare sa Jadransko jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom - DB Inžinjering & MHM-Projekt - 180.895 eura.

Realizacija po ugovorima očekuje se u 2025.godini.

### **Zaključak:**

U periodu januar-decembar 2024. godine, ostvareni su prihodi **25.358.491,31** eura, a rashodi **19.917.157** eura. Preliminarni poslovni rezultat za navedeni period iznosi **5.412.334,31** eura, konačan rezultat poslovanja utvrdiće se nakon izrade Godišnjih finansijskih iskaza za 2024. godinu.

Na osnovu prikazanih podataka, može se zaključiti da je u proteklom periodu ostvaren dobar poslovni rezultat i stvoreni preduslovi za uspješnu realizaciju svih planskih obaveza u narednom periodu.
