



**CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

PREDLOG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
AKCIONOG PLANA
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2020. GODINU**

Podgorica, april 2021. godine

SADRŽAJ:

I UVOD	3
II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA u 2020. godini.....	8
III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE.....	11
IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA.....	71
V PREDLOG ZAKLJUČKA.....	72

I UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 21. decembra 2017. godine usvojila **Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina**. Strategija je izrađena u skladu sa globalnim ciljevima i prioritetima Sendai okvira i predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Sa ciljem ostvarenja prioriternih aktivnosti, kao sastavni dio Strategije izrađen je **Dinamički plan aktivnosti za period 2018-2023. godina (DPA)**. Riječ je o operativnom dokumentu, zasnovanom na principima i posvećenosti Sendai okvira, kao i prioritetima Crne Gore za period 2018-2023, a čijom će se realizacijom unaprijediti stanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, pozitivno uticati na integraciju smanjenja rizika u politike, programe i planove, dodatno osnažiti i povećati kapaciteti za rano upozoravanje, stvoriti otpornije zajednice na katastrofe i u spriječiti događanje novih rizika u Crnoj Gori.

Dinamički plan aktivnosti obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i biće detaljno razrađen kroz tri dvogodišnja akciona plana, u okviru kojih će biti utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave dužni da sprovode. Ministarstvo unutrašnjih poslova je do sada izradilo dva akciona plana: **Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018/2019 i Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021**. Sprovođenje Strategije i Akcionih planova za period 2018-2023. godine, samim tim i Akcionog plana za 2020 i 2021. godinu prati Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktorat za zaštitu i spašavanje, o čemu priprema godišnje izvještaje koje Vlada Crne Gore usvaja na svojim sjednicama. **Vlada Crne Gore do sada je usvojila dva izvještaja: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2018 godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2019 godinu.**

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje sačinilo je i treći po redu Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, za 2020. godinu. Izvještaj obuhvata pregled realizovanih aktivnosti, odnosno podaktivnosti definisanih Akcionim planom 2020/2021, a za 2020. godine i izrađen je u saradnji sa: Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom vanjskih poslova, Upravom za šume, Upravom za vode, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavodom za školstvo, Zavodom za geološka istraživanja, Crvenim krstom Crne Gore, JP Nacionalni parkovi,

Građevinskim fakultetom UCG, Glavnim gradom Podgorica, Prijesticom Cetinje i svim opštinama.¹ Sačinjen je u skladu sa dostavljanim izvještajima od strane nosilaca aktivnosti, te predstavlja svojevrsan pokazatelj napretka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Svi dobijeni podaci integrisani su u tabelarnu formu koja je sastavni dio ovog dokumenta.

U prethodnoj godini pratila se realizacija 56 aktivnosti, realizovano je 14 aktivnosti, u toku je realizacija 23 aktivnosti, dok nije realizovano 19 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 205 planiranih u 2020. godini, realizovano je 37 podaktivnosti, u toku je realizacija 38 podaktivnosti, dok nije realizovano 130 podaktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 25 % aktivnosti, da je u toku realizacija 41 % aktivnosti, te da nije realizovano 34 % aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, procentualno je realizovano 18,05 % podaktivnosti, u toku je realizacija za 18,54 % podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 63,41 % podaktivnosti.² Na grafiku niže prikazan je stepen realizacije aktivnosti Akcionog plana u 2020. godini.



¹ Nazivi nosilaca aktivnosti iz Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021, izmijenjeni su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave „Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21.


² Velika razlika u statusu realizacije aktivnosti i podaktivnosti je iz razloga što 5 aktivnosti Akcionog plana imaju 105 podaktivnosti čiji nosioci realizacije su opštine.

Kako bismo što bolje sagledali rezultate ostvarene u prethodnoj godini, na sledećem grafiku biće prikazana uspešnost realizacije aktivnosti **jedinica lokalne samouprave - opština kao najbrojnih nosilaca realizacije podaktivnosti**. Opštine su u prethodnoj godini, imale obavezu realizacije 5 aktivnosti od čega nijedna aktivnost nije realizovana, realizacija je u toku za 4 aktivnosti, a u potpunosti nije realizovana 1 aktivnost. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 102 planirane u 2020. godini, realizovano je svega 9 podaktivnosti, u toku je realizacija 12 podaktivnosti, dok nije realizovana 81 podaktivnost.

Na grafiku niže prikazana je ukupna realizacija podaktivnosti od strane opština u 2020. godini.




Na grafiku niže dat je prikaz realizacije podaktivnosti opština po aktivnostima u 2020. godini.

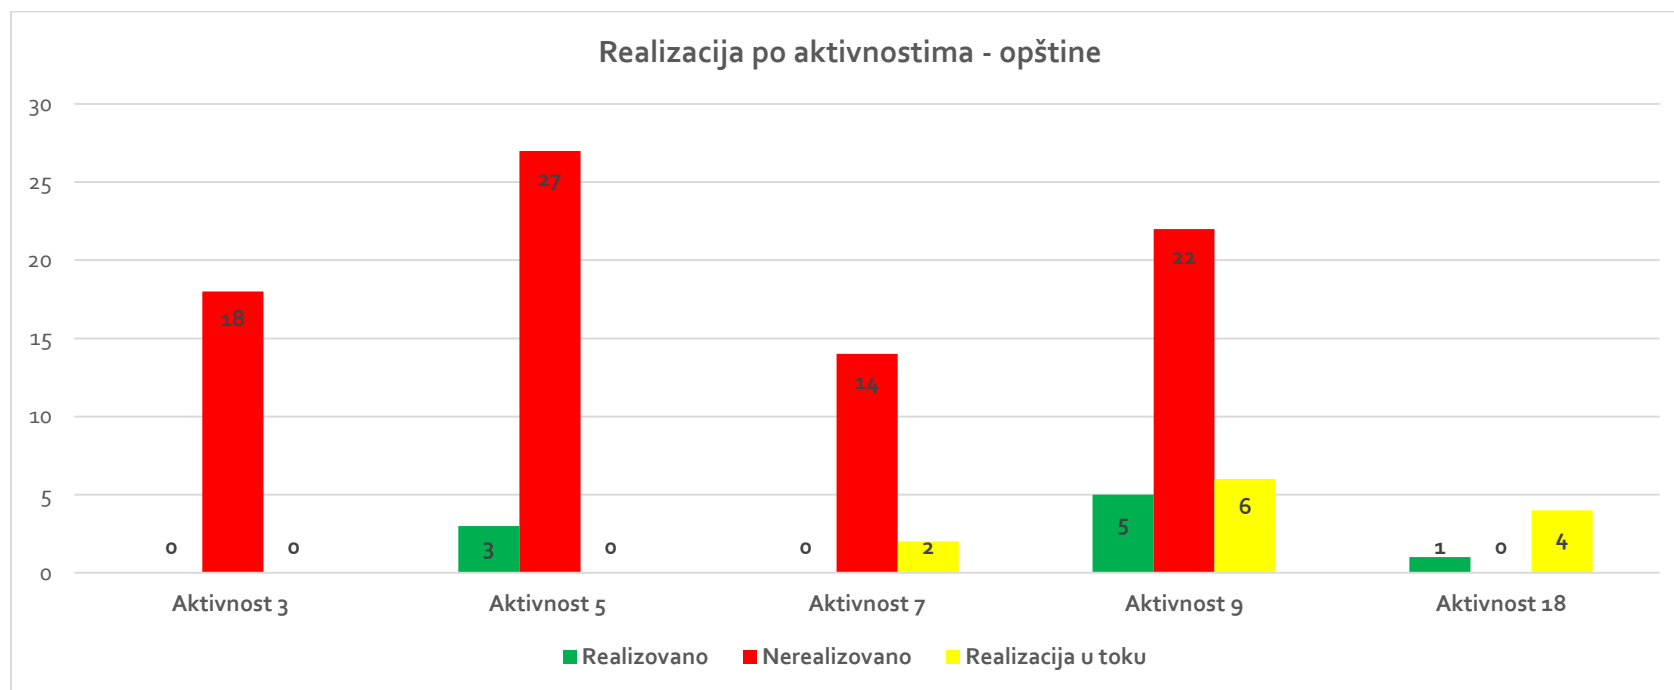

Ostali subjekti u prethodnoj godini imali su za obavezu realizaciju 51 aktivnosti od čega je 14 aktivnosti realizovano, realizacija je u toku za 19 aktivnosti, a nije realizovano 18 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 103 planiranih u 2020. godini, realizovano je 28 podaktivnosti, u toku je realizacija 26 podaktivnosti, a nije realizovano 49 podaktivnosti.

Na sledećem grafiku prikazan je status realizacije podaktivnosti od strane ostalih subjekata u 2020. godini.

Realizacija podaktivnosti ostalih subjekata

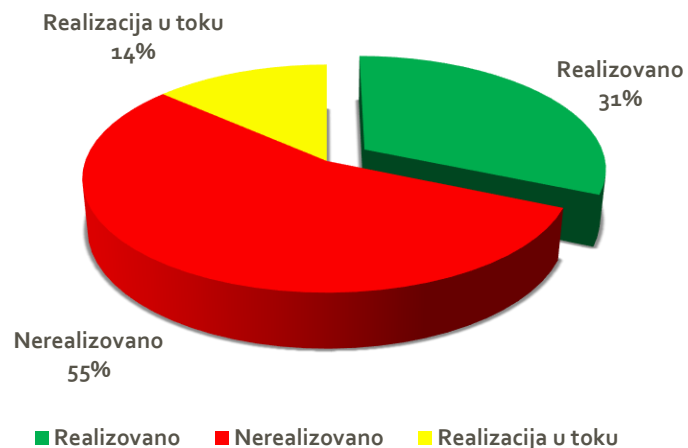

Stepen realizacije u odnosu na prethodne godine je na niskom nivou. Kao glavni razlog zašto određene aktivnosti nijesu realizovane, odnosno djelimično su realizovane, nosioci aktivnosti uglavnom su naveli nedostatak finansijskih sredstava, odnosno situaciju izazvanu pandemijom COVID 19. Kada uporedimo grafik uspješnosti realizacije opština i ostalih subjekata, dolazimo da zaključka, da je manja uspješnost realizacije opština primjetna u odnosu na ostale subjekte realizacije. Takođe, opštine prednjače u prenošenju nerealizovanih aktivnosti iz godine u godinu. Posebno zabrinjavajuća činjenica odnosi se na to da je veoma mali broj opština izradilo, odnosno započelo izradu opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Takođe, bitan nedostatak sistema zaštite i spašavanja odnosi se na izradu akustičkih studija i uspostavljanje sistema javljanja i obavještanja u jedinicama lokalne samouprave, što onemogućava adekvatno informisanje građana prije, tokom i nakon poplava, požara itd.

Manja uspješnost realizacije aktivnosti primjetna je i kod Ministarstva vanjskih poslova i Građevinskog fakulteta, te kod Ministarstva bez portfelja koje je u međuvremenu novom organizacijom Vlade Crne Gore i prestalo da postoji. Poseban izazov u narednom periodu

predstavljajući realizaciju nekoliko aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno uspostavljanje Nacionalnog trening centra i poboljšanje tehničke opremljenosti Direktorata za zaštitu i spašavanje, odnosno obezbjeđivanje opreme i sredstava za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika, naročito zemljotresa.

Najznačajnije aktivnosti koje su realizovane tokom 2020. godine odnose se na: izradu Procjene rizika od katastrofa Crne Gore, izradu Nacionalnog plana za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona i Nacionalnog plana za zaštitu i spašavanje od hemijskih i bioloških rizika, kao i nekoliko opštinskih planova za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika. Započeta je i preliminarna procjena rizika od poplava, izrađena lokalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa opštine Danilovgrad, te nastavljena realizacija programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom na dječju populaciju i obrazovne ustanove. Realizovan je značajan broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara. Implementirana je operativna upotreba DASHBOARD web online profesionalne operativne platforme evropskog centra za prognozu vremena, te poboljšani tehnički kapaciteti seizmičkog monitoringa. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije i NATO-a;

Finansiranje aktivnosti vršilo se se iz Budžeta Crne Gore, Budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i iz drugih izvora. Većina aktivnosti realizuje se u dvogodišnjem periodu, a ukupan iznos finansijskih sredstava koji je planiran za sprovođenje 61 aktivnosti Akcionog plana **za period 2020 i 2021. godinu iznosi 6.102.000,00 eura**. Na osnovu dostavljenih izvještaja **u 2020. godini utrošeno je 2.429.529,36 eura, od toga, opštine su utrošile svega 7.500 eura**. Utrošena sredstva nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: **9.22; 9.25; 15.1; 15.2; 15.3; 18.3a; 27; 30; 38.1; 50;**

Detaljni podaci o planiranim i utrošenim sredstvima, kao i o izvoru finansiranja nalaze se u sklopu tabele koja je sastavni dio ovog izvještaja.

II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA

Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine, usvojena je prije donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije. Iz tog razloga u prvom i u drugom Izvještaju o realizaciji Akcionih planova za 2018. i 2019. godinu, kao i u ovom Izvještaju za 2020. godinu nije bilo

moгуće podijeliti aktivnosti u tematske grupe i podvesti ih pod strateške i operativne ciljeve jer nijesu definisani u Strategiji. Iz navedenih razloga uspješnost realizacije biće prikazana po subjektima realizacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova započelo je nekoliko veoma važnih aktivnosti u prethodnoj godini, između ostalih izradu Procjene rizika od katastrofa Crne Gore, te pripremu nacionalnih planova za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona, kao i hemijskih i bioloških rizika. Nastavljena je implementacija preuzetih obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, učestvovanje u aktivnostima i radnim tijelima Mehanizma civilne zaštite EU, kao i aktivnosti usmjerene u pravcu jačanja svijesti građana i djece na temu smanjenja rizika od katastrofa.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je članstvom u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) obezbijedilo tehničku podršku stranih eksperata u oblasti zaštite ljudi i životne sredine, te omogućilo učešće domaćih istraživača na obukama, kuresevima i konferencijama.

Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Crne Gore su u okviru godišnjih planova rada realizovali značajni broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Uprava za šume izradila je Plan sanacije šuma za šume degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca, te je u okviru planiranih aktivnosti koje se realizuju po fazama, sproveden postupak nabavke sadnica i pošumljavanja opožarenih površina u područnim jedinicama Žabljak, Pljevlja, Mojkovac i Nikšić.

Uprava za vode realizuje nekoliko značajnih projekata, pa su u okviru projekta “GEF SCCF - Upravljanje slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu” urađeni i revidovani Glavni projekti regulacije za kritične dionice na vodotocima Lim i Grančar, i to u 4 opštine: **Bijelo Polje** - GP uređenja lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m; **Berane** - GP regulacije rijeke Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km; **Plav** - GP regulacija rijeke Lim, na lokaciji Brezojevice, ukupne dužine 1,4 km; **Gusinje** - GP regulacije rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km. U okviru projekta “Integrirani razvojni program koridora rijeka Save i Drine” pripremljen je i Projektni zadatak za izradu glavnih projekata izgradnje nasipa na kritičnim dionicama rijeka Tare i Lima. Započeta je preliminarna procjena rizika od poplava kroz IPA projekat “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori”.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju realizovao je nekoliko značajnih aktivnosti u prethodnoj godini. Implementirana je operativna upotreba DASHBOARD web online profesionalne operativne platforme evropskog centra za prognozu vremena. DASHBOARD platforma se svakodnevno operativno koristi za izdavanje upozorenja na opasnost od toplih i hladnih talasa-ekstremnih temperatura, uvedena je i satelitska internet konekcija u centralnoj stanici Podgorica. Jedna aktivnost je i unaprijed realizovana, a odnosi se na jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa, odnosno proširenje nacionalne mreže akcelerometara uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese, te je u tu svrhu u prethodnoj godini nabavljen još jedan akcelerometar koji je u funkciji.

Zavod za geološka istraživanja u prethodnoj godini realizovao je veoma važne aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i validaciju podataka sa izradom projektnih zadataka, dok u narednom periodu slijedi izrada Projekta, terenska istraživanja i izrada karata osjetljivosti na klizanje i odronjavanje, odnosno karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta 1:200.000 i izradu karte vjerovatnoća pojavljivanja debričkih tokova 1:200.000.

Zavod za školstvo u saradnji sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje vršio je edukaciju nastavnog osoblja osnovnih škola u Budvi, Risnu i Baru za sprovođenje međupredmetne oblasti *Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa*. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 66 nastavnika, od čega 21 u Budvi (škole iz Budve, Petrovca i Tivta), 24 u Risnu (škole iz Kotora, Herceg Novog i Nikšića) i 21 u Baru. Takođe, vršena je i edukacija zaposlenih u JPU „Đina Vrbica“ u Podgorici. Tokom edukacije, posebna pažnja je posvećena postupcima koje zaposleni i djeca treba da sprovode prije, tokom i nakon dešavanja prirodnih nepogoda (požar, poplave i zemljotres). Kroz praktičan rad, zaposleni su obučeni za sprovođenje evakuacije djece i ostalih u slučaju požara i zemljotresa.

Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu realizuje aktivnosti u oblasti smanjenje rizika od katastrofa koje su edukativnog karaktera, usmjerene prevashodno na dječiju populaciju. U prethodnoj godini organizovane su radionice za učenike osnovnih i srednjih škola - na temu smanjenja rizika od katastrofa i očekivanih reakcija, radionica za psiho-socijalnu podršku za zaposlene i volontere CKCG kao i predavanja prve pomoći.

Opštine Mojkovac, Gusinje i Bar izradile su opštinske planove za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika. Ovi planovi su značajni iz razloga što se zaštita i spašavanje u lokalnoj zajednici sprovodi na osnovu opštinskih planova zaštite i spašavanja koji ujedno i predstavljaju osnovu za donošenje preduzetnih planova zaštite i spašavanja. Poseban korak naprijed napravila je opština Danilovgrad koja je izradila i usvojila prvu Lokalnu strategiju za smanjenje rizika od katastrofa.

**III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE
ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2020. GODINU**

Re-dni br.	Aktivnosti / Ključne tačke (podaktivnosti)	Indikator uspjeha	Status realizacije / Komentar	Vodeća institucija / Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Planirani rok za početak/završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Novi rok za početak / završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Planirana i utrošena sredstva	Izvor finansiranja	Preporuka / Komentar
1.	<p>Potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja</p> <p>1.1 Priprema Nacrta ugovora</p> <p>1.2 Utvrđivanje vrste specijalističke jedinice sa kojom treba potpisati ugovor</p> <p>1.3 Potpisivanje ugovora</p>	<p>1.1 Pripremljen Nacrt</p> <p>1.2 Definisane vrste specijalističkih jedinica</p> <p>1.3 Potpisani ugovori</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u> *Nedostatak finansijskih sredstava</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p> <p>/</p> <p>Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje</p>	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	100.000€	Budžet	*Potpisati ugovore sa specijalističkim jedinicama u 2021. godini.
2.	Poboljšati tehničku opremljenost Direktorata za zaštitu i spašavanje (oprema i sredstva			Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za					

	za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika) 2.1 Izvršiti nabavku utvrđene opreme i sredstava za zemljotres	2.1 Izvršena nabavka potrebne opreme i sredstava	<u>Nerealizovano</u> * Nedostatak finansijskih sredstava	zaštitu i spašavanje	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	400.000€	Budžet	* <u>Obezbijediti potrebna finansijska sredstva</u>
3.	Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje) Opština Ulcinj 3.1 Izrada akustičke studije	3.1 Izrađena akustička studija	<u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19 i zbog blokade računa Opštine Ulcinj	Opština Ulcinj	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	6.000€	Budžet opštine	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	Opština Pljevlja 3.3 Izrada akustičke studije	3.3 Izrađena akustička studija	<u>Nerealizovano</u> * <u>Nedostatak finansijskih sredstava, budžetska sredstva nijesu predviđena u budžetu za 2021. g.</u>	Služba zaštite i spašavanja	III (2020) / IV (2021)	/	6.000€	Budžet opštine	* <u>Planirati ovu aktivnost u Akcionom planu za 2022. godinu.</u>

	<p>Opština Žabljak 3.4 Izrada akustičke studije</p>	<p>3.4 Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>IV (2021)</p>	<p>5.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati aktivnost do kraja 2021. godine</u></p>
	<p>Opština Herceg Novi 3.5 Izrada akustičke studije</p>	<p>3.5 Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Nedostatak finansijskih sredstava</p>	<p>Opština Herceg Novi</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>10.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
	<p>Opština Tivat 3.6a Izrada akustičkog elaborata</p>	<p>3.6a Izrađen elaborat</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Opština Tivat</p>	<p>II (2020) / IV (2020)</p>	<p>IV (2021)</p>	<p>20.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u></p>
	<p>3.6b Nabavka opreme</p>	<p>3.6b Nabavljena oprema</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>						
	<p>3.6c Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS</p>	<p>3.6c Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Nedostatak finansijskih sredstava</p>						
	<p>Opština Bijelo Polje 3.7 Izrada akustičke studije</p>	<p>3.7 Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *pitanje tendera problematično</p>	<p>Opština Bijelo Polje</p>	<p>I (2020) / II (2020)</p>	<p>II (2021) / IV (2021)</p>	<p>4.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom</u></p>

	<p>Opština Berane 3.9 Izrada akustičke studije</p>	<p>3.9 Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>	<p>Opština Berane</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>5.000 €</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>akustičkih studija</u> *<u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u></p>
	<p>Opština Budva 3.10a Formiranje radne grupe</p>	<p>3.10a Formirana radna grupa</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Opština Budva</p>	<p>I (2020) / II (2020)</p>	<p>I (2021) / II (2021)</p>	<p>10.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p>*<u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u></p>
	<p>3.10b Izrada akustičke studije</p>	<p>3.10b Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>		<p>II (2020) / IV (2020)</p>	<p>II (2021) / IV (2021)</p>			
	<p>3.10c Utvrđivanje spiska opreme i sredstava za sistem obavještanja</p>	<p>3.10c Utvrđen spisak opreme</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p>		<p>III (2020) / IV (2020)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>			
	<p>Opština Mojkovac 3.11 Izrada akustične studije</p>	<p>3.11 Izrađena akustička studija</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Sistem iz perioda "DSZ" popravljen i isprobava se svakog prvog u mjesecu</p>	<p>Opština Mojkovac</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>7.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p>*<u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u></p>

Opština Plužine 3.12 Izrada akustičke studije	3.12 Izrađena akustička studija	<u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19	Opština Plužine	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u>
Opština Kotor 3.14 Izrada akustičke studije	3.14 Izrađena akustička studija	<u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19	Opština Kotor	II (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u>
Opština Kolašin 3.15a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin	3.15a Pripremljen i objavljen tender	<u>Nerealizovano</u>	Opština Kolašin	I (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)			<u>*Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
3.15b Izrada akustičke studije	3.15b Izrađena akustička studija	<u>Nerealizovano</u> U CG ne postoji firme koje se bavi ovom problematikom		IV (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	5.000€	Budžet opštine	
Prijestonica Cetinje 3.16a Formiranje tenderske komisije i izbor najboljeg izvođača	3.16a Formirana komisija i izabran izvođač	<u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19	Prijestonica Cetinje / Organi jedinice lokalne samouprave	I (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)	/	Budžet prijestonice	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u>

				Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije					
4.	Obezbjeđivanje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke 4.1 Izrada i usvajanje Odluke	4.1 Izrađena i usvojena Odluka	Nerealizovano *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	/	/	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
5.	Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa Opština Ulcinj 5.1a Formiranje Radne grupe	5.1a Formirana Radna grupa	Nerealizovano *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19 i blokade računa Opštine Ulcinj	Opština Ulcinj	I (2020) / II (2020)	I (2021) / II (2021)	20.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	Opština Bar								

5.2a Formiranje Radne grupe	5.2a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Bar	I (2020) / II (2020)	I (2021) / II (2021)	10.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
5.2b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.2b Izrađena Strategija	<u>Nerealizovano</u> *zbog nedostatka finansijskih sredstava		II (2020) / IV (2021)	II (2021) / IV (2021)			
Opština Rožaje 5.4 Izrada Nacrta	5.4 Izrađena Strategija	<u>Nerealizovano</u> *zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Rožaje	I (2020) / I (2021)	IV (2021) / IV (2021)	1.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
Opština Žabljak 5.5a Formiranje Radne grupe	5.5a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Žabljak	I (2020) / IV (2021)	IV (2021) / II (2022)	3.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
5.5b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.5b Izrađena Strategija	<u>Nerealizovano</u> *Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19						
Opština Herceg Novi 5.6a Formiranje Radne grupe	5.6a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Herceg Novi	I (2020) / IV (2021)	III (2021) / IV (2021)	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
5.6b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.6b Izrađena Strategija	<u>Nerealizovano</u> * Nedostatak finansijskih sredstava						

Opština Petnjica 5.7a Formiranje Radne grupe	5.7a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Petnjica	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	2.000€	Budžet opštine	<u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u>
5.7b Izrada Nacrta	5.7b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u> * Razlozi nijesu dostavljeni		I (2020) / III (2021)	I (2021) / IV (2021)			
Opština Tivat 5.8a Formiranje Radne grupe	5.8a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Tivat	II (2020) / IV (2021)	IV (2021)	25.000€	Budžet opštine	<u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u>
5.8b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.8b Izrađena Strategija	<u>Nerealizovano</u> *Radna grupa će se formirati u skladu sa organizacionim promjenama u Opštini Tivat						
Opština Bijelo Polje 5.9a Formiranje Radne grupe	5.9a Formirana Radna grupa	<u>Realizovano</u>	Opština Bijelo Polje	I (2020) / III (2020)	/	/	/	/
5.9b Izrada Nacrta	5.9b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>		III (2020) / II (2021)	I (2021) / IV (2021)	2.000€	Budžet opštine	<u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u>
Opština Andijevica 5.10a Formiranje Radne grupe	5.10a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Andijevica	I (2020) / I (2020)	I (2021) / I (2021)	5.000€	Budžet opštine	<u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u>
5.10b Izrada Nacrta	5.10b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>		III (2020) / I (2021)	IV (2021)			

			* Razlozi nijesu dostavljeni						
Opština Plav									
5.11a Formiranje Radne grup	5.11a Formirana Radna grupa	Realizovano		Opština Plav	I (2020) / I (2020)	/	/	/	/
5.11b Izrada Nacrta	5.11b Izrađen Nacrt	Nerealizovano * Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19			I (2020) / IV (2020)	I (2021) / II (2021)	800€	Budžet opštine	<u>*Planirati realizaciju ove aktivnosti u 2021. godini</u>
Opština Berane									
5.12a Formiranje Radne grupe	5.12a Formirana Radna grupa	Nerealizovano		Opština Berane	I (2020) / I (2020)	I (2021) / I (2021)	4.000€	Budžet opštine	<u>*Obratiti se za stručnu podršku DZS-MUP</u>
5.12b Izrada Nacrta	5.12b Izrađen Nacrt	Nerealizovano * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19			I (2020) / I (2021)	I (2021) / IV (2021)			
Opština Budva									
5.13a Formiranje Radne grupe	5.13a Formirana Radna grupa	Nerealizovano		Opština Budva	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	20.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u>
5.13b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	5.13b Izrađena Strategija	Nerealizovano * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19			I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)			

Opština Plužine 5.14a Izrada Nacrta	5.14a Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>	Opština Plužine	I (2020) / I (2020)	I (2021) / I (2021)	7.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.14b Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	5.14b Izrađena Strategija <u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19			I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)		
Opština Šavnik 5.15a Formiranje Radne grupe	5.15a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Šavnik	IV (2020) / II (2021)	I (2021) / I (2021)	2.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.15b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.15b Izrađena Strategija <u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava i pandemije COVID19			I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)		
Opština Danilovgrad 5.16 Izrada lokalne Strategije	5.16 Izrađena Strategija	<u>Realizovano</u>	Opština Danilovgrad	I (2020) / II (2020)	/	Predviđeno 15.000€ Utrošena sredstva 2.500€	Budžet opštine	/
	Opština Kolašin 5.17a Formiranje Radne grupe za izradu strategije	5.17a Formirana Radna grupa <u>Nerealizovano</u>		Opština Kolašin	II (2020) / II (2020)	I (2021) / II (2021)	4.000€	Budžet opštine
5.17b Izrada Nacrta strategije	5.17b Izrađen Nacrt strategije <u>Nerealizovano</u>			II (2020) / III (2020)	II (2021) / IV (2021)			

	<p>Opština Kotor 5.19 Izrada lokalne Strategije</p>	<p>5.19 Izrađena Strategija</p>	<p>* Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p> <p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>	<p>Opština Kotor</p> <p>/</p> <p>Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p>	<p>I (2020) / I (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>5.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
<p>6.</p>	<p>Izrada Nacionalne procjene rizika od katastrofa 6.1 Formiranje Radne grupe 6.2 Izrada Nacrta</p>	<p>6.1 Formirana Radna grupa 6.2 Izrađen Nacrt</p>	<p><u>Realizovano</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u> * Formiran Upravljački odbor na najvišem nivou, formirana radna grupa za izradu Procjene rizika; izrađeno i usvojeno Uputstvo za izradu Procjene rizika.</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p> <p>/</p> <p>Ostala ministarstva i organi državne uprave</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p> <p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>/</p> <p>I (2021) / III (2021)</p>	<p>Planirano 50.000€ Bez utrošenih sredstava</p>	<p>EU Grant</p>	<p><u>* Izraditi Nacionalnu procjenu rizika od katastrofa CG do kraja godine</u></p>

7.	Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa								
	Opština Pljevlja								
	7.1a Formiranje radne grupe	7.1a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Služba zaštite i spašavanja	II (2020) / II (2020)	II (2021) / IV (2021)	Predviđeno 5.000€ Sada se planira 4.500€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	7.1b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	7.1b Izrađena procjena rizika	<u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19		II (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)			
	Opština Herceg Novi								
	7.2a Formiranje Radne grupe	7.2a Formirana Radna grupa	<u>Realizacija u toku</u>	Opština Herceg Novi	I (2020) / I (2020)	IV (2020) / IV (2021)	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	7.2b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	7.2b Izrađena procjena rizika	<u>Realizacija u toku</u> *Uključivanje domaćih i međunarodnih eksperata, u završnoj fazi		II (2020) / IV (2020)	IV (2020) / IV (2021)			
Opština Andrijevića									
7.3a Formiranje Radne grupe	7.3a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>	Opština Andrijevića	I (2020) / I (2020)	I (2021) / II (2021)	4.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>	
7.3b Izrada Nacrta	7.3b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>		IV (2020) / IV (2020)	II (2021) IV (2021)				

			* Razlozi nijesu dostavljeni						<u>kvartalnom periodu</u>
Opština Berane									
7.4a Formiranje Radne grupe	7.4a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>		Opština Berane	I (2020) / I (2020)	I (2021) / I (2021)	5.000 €	Budžet opštine	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
7.4b Izrada Nacrta	7.4b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>			I (2020) / III (2020)	I (2021) / III (2021)			
7.4c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	7.4c Izrađena procjena rizika	<u>Nerealizovano</u>	* Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19		III (2020) / IV (2020)	III (2021) / IV (2021)			
Opština Plužine									
7.5a Formiranje Radne grupe	7.5a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>		Opština Plužine	I (2020) / I (2020)	I (2021) / I (2021)	5.000 €	Budžet opštine	*Obratiti se za stručnu podršku DZS-MUP
7.5b Izrada Nacrta	7.5b Izrađen Nacrt	<u>Nerealizovano</u>	* Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19		II (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)			
Opština Kolašin									
7.6a Formiranje Radne grupe	7.6a Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>		Opština Kolašin	III (2020) / III (2020)	I (2021) / I (2021)	5.000 €	Budžet opštine	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
7.6b Izrada procjene rizika od katastrofa	7.6b Izrađena procjena	<u>Nerealizovano</u>	* Podaktivnosti nijesu realizovane		III (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)			

	<p>Opština Kotor 7.7 Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika</p> <p>Opština Budva 7.8a Formiranje Radne grupe</p> <p>7.8b Izrada procjene rizika od katastrofa</p>	<p>7.7 Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika</p> <p>7.8a Formirana Radna grupa</p> <p>7.8b Izrađena procjena</p>	<p>zbog pandemije COVID19</p> <p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p>	<p>Služba zaštite i spašavanja</p> <p>Opština Budva</p> <p>/</p> <p>Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p>	<p>I (2020) / III (2020)</p> <p>I (2020) / II (2020)</p> <p>III (2020) / IV (2020)</p>	<p>II (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / II (2021)</p> <p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>5.000 €</p> <p>/</p>	<p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p> <p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
8.	Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od			Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za					

	<p>različitih vrsta rizika</p> <p>8.1 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odroni</p> <p>8.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika</p>	<p>8.1 Izrađen Plan</p> <p>8.2 Izrađen Plan</p>	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u> Oba Nacionalna plana su završena i spremna za dostavu Vladi Crne Gore na usvajanje.</p>	<p>zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p> <p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / I (2021)</p> <p>I (2021) / I (2021)</p>	<p>/</p> <p>/</p>	<p>/</p> <p>/</p>	<p>/</p> <p>/</p>
9.	<p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika</p> <p>Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor</p> <p>9.1a Formiranje Radne grupe</p> <p>9.1b Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor</p>	<p>9.1a Formirana Radna grupa</p> <p>9.1b Izrađen Plan</p>	<p><u>Realizacija u toku</u> *Započet postupak formiranja radne grupe</p> <p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>	<p>Služba zaštite i spašavanja opština Kotor</p>	<p>IV (2020) / I (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>5.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Nastaviti realizaciju započetih aktivnosti</u></p>

<p>Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi 9.2 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi</p>	<p>9.2 Usvojen Plan</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Skupština Opštine Herceg Novi najavila usvajanje u III kvartalu 2021. godine</p>	<p>Skupština Opštine Herceg Novi</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>III (2021) / III (2021)</p>	<p>/</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
<p>Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Tivat 9.3 Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od poplava</p>	<p>9.3 Ažuriran Plana</p>	<p><u>Realizacija u toku</u> *Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od požara je pri kraju, kašnjenje je prouzrokovano pandemijom COVID19</p>	<p>Služba ZiS Tivat</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>IV (2021)</p>	<p>1.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Ažurirati plan do kraja 2021. godine</u></p>
<p>9.4 Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa</p> <p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Ulcinj</p>	<p>9.4 Izrađen Plana</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *Zbog pandemije COVID19</p>		<p>IV (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2022)</p>	<p>1.000€</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*U što kraćem vremenskom intervalu započeti izradu označenog dokumenta</u></p>

<p>9.5 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Ulcinj</p> <p>9.6a Formiranje Radne grupe</p> <p>9.6b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara</p> <p>9.7a Formiranje Radne grupe</p> <p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <u>Bar</u></p> <p>9.8 Formiranje radne grupe za izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa</p>	<p>9.5 Usvojen Plan</p>	<u>Nerealizovano</u>	Opština Ulcinj	I (2020) / I (2020)	I (2021) / IV (2021)	25.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu
	<p>9.6a Formirana Radna grupa</p>	<u>Nerealizovano</u>		I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)			
	<p>9.6b Usvojen Plan</p>	<u>Nerealizovano</u>		I (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)	25.000€	Budžet opštine	
	<p>9.7a Formirana Radna grupa</p>	<p><u>Nerealizovano</u> *Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19 i zbog blokade računa Opštine Ulcinj</p>		IV(2020) / IV (2020)	IV (2021) / IV (2021)			
	<p>9.8 Formirana radna grupa za izradu opštinskih planova</p>	<u>Realizacija u toku</u>	Opština Bar	I (2020) / II (2020)	I (2021) / II (2021)	20.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

- Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara	9.9b Usvojen Plan	Realizovano		I (2020) / I (2020)	/	/	/	
9.9 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava	9.11 Izrađen Plan	Nerealizovano *Izrađen predlog za formiranje radne grupe		II (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)			<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
9.11 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara								
Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština <u>Žabljak</u>	9.13a Formirana Radna grupa	Nerealizovano	Opština Žabljak	I (2020) / IV (2021)	IV (2021) / II (2022)	1.500€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
9.13a Formiranje Radne grupe	9.13b Izrađen plan	Nerealizovano *Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19						
9.13b Izrada Plana								
Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština <u>Petnjica</u>	9.14a Formirana Radna grupa	Realizovano	Opština Petnjica	I (2020) / I (2020)	/	/	/	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
9.14a Formiranje Radne grupe	9.14b Izrađen Nacrt	Nerealizovano		I (2020) / III (2020)	I (2021) / II (2021)	2.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
9.14b Izrada Nacrta	9.14c Izrađen Plan	Nerealizovano		IV (2020) / IV (2020)	IV (2021) / IV (2021)			

	<p>9.14c Utvrđivanje i usvajanje Plana</p> <p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <u>Andrijevica</u> 9.15 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <u>Budva</u> 9.17 Usvajanje plana zaštite i spašavanja od požara</p> <p>9.18 Dorada i usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava</p> <p>9.19a Formiranje Radne grupe</p>	<p>9.15 Izrađen Plan</p> <p>9.17 Izrađen Plan</p> <p>9.18 Plan doraden i usvojen</p> <p>9.19a Formirana Radna grupa</p> <p>9.19b Izrađen Plan zaštite</p>	<p>*Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p> <p><u>Nerealizovano</u> * Razlozi nijesu dostavljeni</p> <p><u>Realizacija u toku</u> *Izrađen - na javnoj raspravi</p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Opština Andrijevica</p> <p>Opština Budva</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p> <p>IV (2019) / I (2020)</p> <p>IV (2019) / I (2020)</p> <p>I (2020) / II (2020)</p> <p>I (2020) / III (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / I (2021)</p> <p>I (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>25.000€</p>	<p>Budžet opštine</p> <p>/</p> <p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p> <p><u>*Usvojiti i dobiti saglasnost na označeni plan</u></p> <p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
--	--	--	---	---	--	--	----------------------------------	--	--

	<p>9. 19b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština <u>Mojkovac</u></p> <p>9.20 Pribavljanje saglasnosti na Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>Izrada lokalnog plana zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <u>Danilovgrad</u></p> <p>9.21a Formiranje Radne grupe</p> <p>9.21b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p>	<p>9.20 Dobijena saglasnost</p> <p>9.21a Formirana radna grupa</p> <p>9.21b Izrađen plan</p>	<p>* Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizacija u toku * Plan nije dovršen u cjelosti zbog pandemije COVID19, potrebno završiti procjenu rizika</p>	<p>Opština Mojkovac</p> <p>Opština Danilovgrad</p>	<p>I (2020) / I (2020)</p> <p>I (2020) / III (2020)</p> <p>I (2020) / III (2020)</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>II (2021)</p>	<p>Utrošena sredstva 5.000€</p> <p>/</p> <p>5.000€</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>Budžet opštine</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
--	---	---	---	--	--	------------------------------------	--	---	---

	<p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <u>Kolašin</u> 9.22 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od požara</p>	<p>9.22 Usvojen Plan</p>	<p>Realizacija u toku *Nacrt plana izrađen</p>	<p>Opština Kolašin</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / I (2021)</p>	<p>Planirano 1.000€ *Podaci o utrošeni sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>/</p>	<p><u>*Usvojiti i dobiti saglasnost na označeni plan</u></p>
	<p>Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada <u>Podgorica</u> 9.24a Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.24b Utvrđivanje predloga Plana i usvajanje</p>	<p>9.24a Izrađen plan 9.24b Usvojen plan</p>	<p><u>Nerealizovano</u> <u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p>	<p>Glavni grad Podgorica</p>	<p>II (2020) / II (2020) IV (2020) / IV (2020)</p>	<p>II (2021) / II (2021) IV (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p>Budžet Glavnog grada</p>	<p><u>*Obezbijediti sredstva za realizaciju i realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
	<p>Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava opština <u>Gusinje</u> 9.25 Izrada plana zaštite i spašavanja od poplava</p>	<p>9.25 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od poplava</p>	<p>Realizovano</p>	<p>Opština Gusinje</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Planirano 3.000€ *Podaci o utrošeni sredstvima</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p>/</p>

	<p>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik 9.26a Formiranje Radne grupe</p> <p>9.26b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>9.27a Formiranje Radne grupe</p> <p>9.27b Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p>	<p>9.26a Formirana Radna grupa</p> <p>9.26b Izrađen Plan</p> <p>10.27a Formirana Radna grupa</p> <p>9.27b Izrađen Plan</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nisu realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava i pandemije COVID19</p>	<p>Opština Šavnik</p> <p>/</p> <p>Organi jedinica lokalnih samouprava</p>	<p>IV (2020) / II (2021)</p> <p>IV (2020) / II (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>nijesu dostavljeni</p> <p>1.000€</p> <p>500€</p>	<p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p> <p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
10.	<p>Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj.</p>			<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p> <p>/</p> <p>Ostala ministarstva i</p>					

	<p>shodno različitim vrstama rizika 10.1 Održavanje konferencije u 2020. godini</p>	<p>10.1 Održana konferencija</p>	<p>Nerealizovano * Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>	<p>organi državne uprave</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p><u>*Održati konferenciju nakon smirivanja situacije sa Covidom 19 ili istu održati online</u></p>
<p>11.</p>	<p>Nastavak realizacije programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti građana o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom na zdravstvene i obrazovne ustanove 11.1 Realizacija vježbi evakuacije</p>	<p>11.1 Realizovane vježbe evakuacije</p>	<p>Realizovano * Organizovanje i izvođenje vježbe evakuacije u JPU „Sunkcokrili“</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>IV (2021)</p>	<p>/</p>		<p><u>*Nastaviti sa aktivnostima realizacije vježbi evakuacije u objektima u kojima su izradeni planovi zaštite i spašavanja</u></p>
<p>12.</p>	<p>Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, a posebno</p>			<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za</p>					

<p>kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE</p> <p>12.1 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2020. godinu</p> <p>12.3 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2020. godinu</p> <p>12.5 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2020. godini</p> <p>12.7 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2020. godini</p> <p>12.9 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2020. godini</p>	<p>12.1 Plaćena članarina za 2020.godinu</p>	<p>Realizovano</p>	<p>zaštitu i spašavanje</p>	<p>I (2020) / I (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Planirano 38.000€ Utrošeno 52.876,60€</p>	<p>Budžet (Uplata izvršena prema proračunina DG ECHO)</p>	<p>/</p>
	<p>12.3 Plaćena članarina za 2020. godinu</p>	<p>Realizovano</p>		<p>I (2020) / I (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Planirano 25.000€ Utrošeno 25.000€</p>	<p>Budžet</p>	<p>/</p>
	<p>12.5 Realizovan program obuka</p>	<p>Nerealizovano *Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>		<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p><u>* Realizovati program obuka nakon smirivanja situacije sa Covidom 19</u></p>	
	<p>12.7 Realizovan program obuka</p>	<p>Realizovano 4 online obuke 1 webinar</p>		<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>/</p>	<p>/</p>		
	<p>12.9 Realizovan program obuka</p>	<p>Nerealizovano * Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19</p>		<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p><u>*Realizovati program obuka nakon smirivanja situacije sa Covidom 19</u></p>	

13.	<p>Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje</p> <p>13.1 Realizacija Programa u 2020. godini</p>	13.1 Realizovan Program u 2020. godini	<p><u>Nerealizovano</u> *Realizovana jedna obuka, ostale planirane obuke nijesu realizovane zbog pandemije Covid 19.</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave</p>	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	12.000€ Budžet		<p><u>* Realizovati planirane obuke kada se smiri situacija izazvana pandemijom Covid 19.</u></p>
14.	<p>Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa</p> <p>14.1 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2020. godini</p>	14.1 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa	<p><u>Realizovano</u> *Organizovana vježba evakuacije u JPU „Sunkcokrili“u Podgorici i edukativna predavanja učenicima i nastavnicima u više osnovnih škola u</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave</p>	III (2020) / IV (2020)	/	/	/	/

			Crnoj Gori na temu smanjenja rizika od katastrofa.						
15.	<p>Učešće na obukama, kursovima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)</p> <p>15.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)</p>	15.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2020. godinu	Realizovano - Učešće na sastancima radnih tijela koja se bave smanjenjem rizika od katastrofa putem VTC veze (usled pandemije nije bilo)	Ministarstvo odbrane / Direktorat za politiku i odbranu i Generalštab Vojske Crne Gore	I (2020) / IV (2020)	/	Predviđeno 5.000€ *Podaci o utrošeni sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima

	<p>15.2 Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite</p>	<p>15.2 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2020. godinu</p>	<p>učestvovana vježbama i CIMIC kursevima). - Aktivnosti na suzbijanju pandemije.</p> <p><u>Djelimično realizovano</u> - Timovi HBRN Vojske sprovodili su aktivnosti u oblasti biološke dekontaminacije; - Nije realizovana obuka HBRN jedinica u inostranstvu, usljed pandemije COVID - 19</p>	<p>Ministarstvo odbrane / Generalštab Vojske Crne Gore</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>Predviđeno 4.000€ *Podaci o utrošeni sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>*Realizovati planirane aktivnosti</u></p>
	<p>15.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)</p>	<p>15.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2020. godinu</p>	<p><u>Realizovano</u> -Sprovođenje redovnih aktivnosti u skladu sa važećim propisima i planovima obuke (gašenje požara: selo Mataruge, rejon Virpazara, Gornji Zagarač; saniranje naftne mrlje-marina Kalimanj)</p>	<p>Ministarstvo odbrane / Direktorat za materijalne resurse i Generalštab Vojske Crne Gore</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Predviđeno 3.000€ *Podaci o utrošeni sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u></p>
16.	<p>Nabavka formacijske opreme koja može biti</p>								

	<p>korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa</p> <p>16.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa</p>	<p>16.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2020. godini</p>	<p><u>Realizovano</u> - Set medicinskih uređaja i izolaciona komora za helicopter BELL 412 EP/EPI -Nabavka: sanitetsko vozilo, Caterpillar (CS54B valjak, 320GC, 930M), Kompresor Atlas Copcon XAS 97 Dd;</p>	<p>Ministarstvo odbrane / Direktorat za materijalne resurse</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>Nastavak definisanih aktivnosti u 2021</p>	<p>Predviđeno 1.010.000€ Troškovi nabavke u 2020. godini iznosili 853.798,10€</p>	<p>Budžet</p>	<p>/</p>
17.	<p>Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe - organizovanje stručnih konferencija,</p>			<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p>					

	radionica, panel tribina, skupova i tribina 17.1 Održavanje jedne stručne radionice	17.1 Održana jedna stručna konferencija	Nerealizovano *zbog aktuelnih epidemioloških mjera.		I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	2.000€ + 800€	Budžet	*Formirati stručni tim sa zadatkom da pripremi stručni materijal i organizuje radionicu
18.	Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata) Opština Petnjica			Opština Plužine, Petnjica i Gusinje					
	18.1a Jačanje kadrovskih kapaciteta	18.1a Upošljen neophodan broj lica	Realizacija u toku	Opština Petnjica	I (2020) / II (2021)	I (2021) / II (2021)	/	Budžet opštine	*Zaokružiti proces formiranja službe zaštite
	18.1b Jačanje tehničke opremljenosti	18.1b Nabavljen a neophodna sredstva i oprema	Realizacija u toku *Izvršena priprema		I (2020) / II (2021)	I (2021) / II (2021)	/		
	Opština Plužine 18.2 Formiranje službe zaštite spašavanja	18.2 Formirana Služba zaštite i spašavanja	Realizacija u toku *Nije postavljen komandir SZS	Opština Plužine	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	10.000€	Budžet opštine	*Zaokružiti proces formiranja službe zaštite

	<p>Opština Gusinje 18.3a Jačanje kadrovskih kapaciteta</p>	<p>18.3aUpošljen neophodan broj lica</p>	<p>Realizovano Formirana služba zaštite i spašavanja</p>	<p>Opština Gusinje</p> <p>/</p> <p>Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Planirano 104.500€ Podaci o utrošeni sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p>/</p>
	<p>18.3b Jačanje tehničke opremljenosti</p>	<p>18.3bNabavljen a neophodna sredstva i oprema</p>	<p>Realizacija u toku *Započeta realizacija projekta vrijednog 9.900,00€ *u procesu raspisivanja javnih nabavki</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>II (2021) / IV (2021)</p>	<p>13.000€</p>	<p>Budžet opštine / projekat</p>	<p><u>*Zaokružiti process jačanja tehničke opremljenosti</u></p>
<p>19.</p>	<p>Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći 19.1 Izrada Informacije za Vladu o stanju i izazovima u oblasti razvojne saradnje i humanitarne pomoći</p> <p>19.2 Formiranje Međuresorske radne grupe na rukovodnom nivou</p>	<p>19.1 Izrađena Informacija</p> <p>19.2 Formirana Međuresorska radna grupa</p>	<p>Nerealizovano</p> <p>Nerealizovano *Usled pandemije nije se pristupilo</p>	<p>Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju</p>	<p>I (2020) / I (2020)</p> <p>II (2020) / III (2020)</p>	<p>II (2022) / U zavisnosti od dinamike</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p><u>*Izvrši adekvatno planiranje sprovođenje ove aktivnosti</u></p>

			realizaciji podaktivnosti - U okviru podrške pregovaračkom procesu PP30 za 2020 i 2021 godinu predložena je obuka za uspostavljenje sistema razvojne saradnje-obuka Prenos iskustava o metodologiji OECD						
20.	Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći 20.1 Priprema i izrada Nacrta strategije	20.1 Definisan predmet Strategije	Nerealizovano *Usled pandemije nije se pristupilo realizaciji podaktivnosti	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju	IV (2020) / IV (2021)	II (2022) / U zavisnosti od dinamike	20.000€ + dodatna sredstva Budžet / donato-rska sredstva GIZ i UNDP		<u>*Izvrši adekvatno planiranje sprovođenja aktivnosti</u>
21.	Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od voda na rječnim tokovima od značaja za Crnu Goru 21.1 Izrada i revizija projektne dokumentacije za	21.1 Izrađena i revidirana projektna dokumentacija	Realizovano Urađeni su i revidirani Glavni projekti regulacije	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	I (2020) / IV (2021)	/	Predviđeno budžetom 40.000€ Utrošeno	Grant Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF) i Fonda za posebne klimatske	<u>*Izraditi projektnu dokumentaciju za ostale vodotoke od značaja za Crnu Goru</u>

	regulaciju rijeka od značaja za državu		za kritične dionice na vodotocima Lim i Grnčar u 4 opštine: - Bijelo Polje - GP uređenja lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m; - Berane - GP regulacije rijeke Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km; - Plav - GP regulacija rijeke Lim, na lokaciji Brezojevice, ukupne dužine 1,4 km; - Gusinje - GP regulacije rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km. - U okviru projekta “Integrirani razvojni program koridora rijeka Save i Drine” pripremljen je Projektni zadatak za izradu glavnih projekata izgradnje nasipa na kritičnim				500.000€	promjene (SCCF)	
--	--	--	---	--	--	--	----------	-----------------	--

			dionicama rijeka Tare i Lima.						
22.	<p>Sprovođenje građevinskih mjera za uređenje vodotoka i drugih voda i izgradnja vodnih objekata za zaštitu od poplava</p> <p>22.1 Uklanjanje viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi, u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća *nastavak podaktivnosti zavisi od situacije na terenu</p>	22.1 Uklonjen materijal iz desnog rukavca Bojane	<p><u>Realizovano</u></p> <p>Predmetni radovi planirani su da se završe do kraja juna 2020. godine, ali zbog zastoja uzrokovanog COVIDOM19 to nije bilo moguće i produženi su do kraja 2020. godine. Isti po potrebi mogu biti produženi jer problem nagomilavanja nanosa ne može biti trajno riješen.</p>	Uprava za vode	I (2020) / IV (2021)	/	<p>Predviđeno 300.000€</p> <p>Utrošeno 300.000€</p>	Kapitalni budžet	/
23.	<p>Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine</p>			Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta / Javni sektor					

	<p>iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu <p>23.1 Plaćanje godišnje članarine za 2020. godinu</p> <p>23.3 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2020 godinu i njihova realizacija</p>	<p>23.1 Plaćena godišnja članarina za 2020. godinu</p> <p>23.3 Realizovani projekti</p>	<p><u>Realizovano</u></p> <p><u>Realizovano</u></p>	<p>Naučno-istraživačke institucije Univerziteta</p> <p>Centar za ekotoksikološka ispitivanja</p> <p>Klinički centar CG UCG-PMF</p> <p>Institut za javno zdravlje</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p> <p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>/</p> <p>/</p>	<p>Predviđeno 6.000,00€ Budžetom Utrošeno 5103.93</p> <p>Utrošeno 127.750 242.920</p>	<p>Budžet Ministarstva nauke</p> <p>Budžet IAEA + 5% vrijednosti projekta (učesće institucije)</p>	<p>/</p>
24.	<p>Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa</p> <p>24.1 Planirani seminari u Podgorici, Cetinju, Kotoru,</p>	<p>24.1 Realizovani seminari u Podgorici,</p>	<p><u>Realizovano</u></p>	<p>Zavod za školstvo / Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>/</p>	<p>Predviđeno 6.000€ Utrošeno 1200€</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>*Nastaviti sa realizacijom definisanih aktivnosti iz AP</u> <u>*Nastaviti aktivnosti u</u></p>

	Tivtu, Herceg Novom	Cetinju, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom	Od pet predviđenih seminara tri su realizovana. Razlog je smanjenje finansijskih sredstava Zavodu za školstvo.	zaštitu i spašavanje					oblasti srednjeg obrazovanja
25.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama 25.1 Seminari u Podgorici i Budvi	25.1 Relizovani seminari u Podgorici i Budvi	Realizovano Organizovana dva dvodnevna seminara u Podgorici	Zavod za školstvo	II (2020) / III (2020)	/	Predviđeno 2.500€ Utrošeno 800€		*Nastaviti sa realizacijom definisanih aktivnosti iz AP
26.	Izrada Zakona o seizmološkim poslovima 26.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona 26.2 Javna rasprava 26.3 Odgovori na pitanja javne	26. Usvojen Zakon	Realizacija u toku Nerealizovano Nerealizovano Sektor za seizmologiju	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I (2020) / II (2020) II (2020) / III (2020) III (2020) / IV (2020)	IV (2020) / II (2021) I (2021) / II (2021) I (2021) / II (2021)	1.000€ 500€ 500€	Budžet	*U okviru Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odrediti Direktorat koji će biti nadležan za rukovođenje i koordinaciju sprovođenja aktivnosti

	rasprave i formiranje Predloga zakona		<p>pripremio je tekst Nacrta Zakona o seizmološkoj djelatnosti. Do kašnjenja je došlo zbog preklapanja nadležnosti u okviru Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (tadašnjeg MORT-a i to između Direktorata za životnu sredinu, Direktorata za građevinarstvo i Direktorata za planiranje prostora</p>						
27.	<p>Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija</p> <p>27.1 Formiranje radne grupe i izrada Nacrta</p>	27.1 Usvojene izmjene i dopune	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p>Izrađen je nacrt predloga izmjene i dopune Zakona</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p> <p>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	<p>Predviđeno 2.500€</p> <p>Sada se planira 1.000€</p> <p>Nema podataka o utrušenim sredstvima</p>	Budžet	<p>*<u>Formirati stručnu radnu grupu, odabrati konsultanta kako bi se uradile izmjene i odgovarajući Pravilnici</u></p>

28.	Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti 28. Usvajanje izmjena i dopuna zakona	28. Usvojene izmjene i dopune	Nerealizovano Očekuju se nova imenovanja službenika od strane ZHMS koji će raditi na izradi izmjena i dopuna	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	/	Budžet	* Formirati <u>Radnu grupu koja će otpočeti realizaciju aktivnosti</u>
30.	Obuka i edukacija zaposlenih kroz učešće na stručnim radionicama 30. Stručna obuka kadrova iz sektora seizmologije u GFZ Potsdam	30. Jedan službenik završio trening u GFZ Potsdam	Realizovano *Dva savjetnika iz sektora Seizmologije završili su tro-nedjeljni kurs International Training Course on "Seismology and Seismic Hazard Assessment"- (organizuje GFZ German Research Centre for Geosciences)	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	II (2020) / IV (2020)	/	Predviđeno 3.000€ Nema podataka o utrušenim sredstvima	Donacija GFZ	/
31.	Nabavka softvera kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka	31. 1/2 Unaprijeđen	Realizacija u toku	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I (2020) / III (2020)	I (2021) / IV (2021)	Predviđeno 200€	Budžet	/

	<p>31.1 Raspisivanje međunarodnog tendera</p> <p>32.2 Nabavka dodatnih paketa za automatsku lokaciju zemljotresa i obradu seizmičkih podataka</p>	Sistem auto-lokacije postojećeg režima obrade podataka	<p>Nabavljena je life time licence Scan Lock za automatsku obradu podataka u platformi SeisComp3</p> <p>-Opredijeljena godišnja budžetska sredstva ne mogu da pokriju kupovinu life-time licence za automatsku izradu mapa intenziteta.</p> <p>- Planirana nabavka softvera Sigma kroz usvojeni DG ECHO projekat Balance - 2021 (12,000 EUR)</p>				<p>Predviđeno 14.800€</p> <p>/</p> <p>Utrošeno 5.000€</p>	Budžet	
32.	<p>Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu</p> <p>32.1 Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije - ZHMS</p>	32.1 Finansirana pripravnost	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p>- Pripravnost obezbijedena preraspodjelom radnog vremena</p>	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	II (2020) / III (2020)	I (2021) / IV (2021)	<p>Predviđeno 5.000€</p>	Budžet	<p>*</p> <p><u>*Definisati Zakonom o seizmološkim poslovima</u></p>

33.	<p>Održavanje i unapređivanje back-up sistema u napajanju / komunikacijama/analizi seizmičkih podataka. Povezivanje i umrežavanje seizmičkih stanica putem satelitske konekcije.</p> <p>33.1 Uvođenje satelitskog interneta u centralnu stanicu Podgorica</p>	33.1 Uvedena satelitska internet konekcija u centralnu stanicu Podgorica	<p><u>Realizovano</u></p> <p>* Uveden satelitski internet u stanicu Podgorica, uveden satelitski internet na GPS stanici Gostilje</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>	I (2020) / IV (2021)	/	<p>Predviđeno 6.500€ Utrošeno 1.000€</p>	Budžet	/
34.	<p>Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne temperature (topli i ledeni talasi) na bazi primjene numeričkog meteorološkoprognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM</p> <p>34.1 Formiranje radne grupe</p>		<p><u>Realizovano</u></p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p> <p>* U saradnji sa EC</p>	I (2020) / IV (2021)	/	<p>Predviđeno 30.000€ Utrošeno</p>	Budžet	/

	<p>34.2 Izrada projekta platforme, definisanje kriterijuma- pragova</p> <p>34.3 Nabavka softvera- platforme, operativno povezivanje platforme sa input podacima iz numeričkog modela</p> <p>34.4 Testiranje platforme, verifikacija, uvođenje u operativno stanje</p>	<p>34. Online operativna platforma</p>	<p>* Implementirana je operativna upotreba DASHBOARD web online profesionalne operativne platforme EC (evropskog centra za prognozu vremena)</p> <p>* DASHBOARD platforma je kompatibilno rješenje sa planiranom aktivnošću. svakodnevno se operativno koristi za izdavanje upozorenja na opasnost od toplih i hladnih talasa- ekstremnih temperatura kako za državne Organe tako i za ažuriranje Meteoalarma u evropskom integrisanom sistemu za meteorološka upozorenja EUMETNET</p> <p><u>Realizacija u toku</u> * Tokom 2021 planirano je operativno upoređivanje</p>	<p>/ Evropski centar za prognozu vremena</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>0€</p>		
--	--	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	--

			rezultata Platforme sa stvarnim stanjem situacije na terenu tj. ostvarljivost onoga što je prognozirano						
35.	<p>Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika</p> <p>35.1 Formiranje Radne grupe</p>	35.1 Formirana Radna grupa	<p><u>Nerealizovano</u></p> <p>*Razlozi nijesu dostavljeni</p>	<p>Ministarstvo bez portfelja /</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova –</p> <p>Direktorat za zaštitu i spašavanje</p> <p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p> <p>Inženjerska komora</p>	I (2020) / IV (2020)	/	5.000€ Budžet Inženjerske komore		* <u>Definisati nosioca realizacije aktivnosti</u>
36.	<p>Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima</p> <p>36.1 Rad komisije na Izradi Nacrta studije</p> <p>36.2 Donošenje Studije od strane Ministarstva</p>	<p>36.1 Izrađen Nacrt studije</p> <p>36.2 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora</p>	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u></p> <p>*Formirana komisija od predstavnika JPNP CG, MUP-a i MORT-a.</p>	<p>JP Nacionalni parkovi /</p> <p>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova –</p> <p>Direktorat za zaštitu i spašavanje</p>	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / III (2023)	<p>Predviđeno 15.000€</p> <p>Utrošeno 0</p>	Budžet	<p>*<u>Uspostaviti komunikaciju sa specijalizovanim subjektima za postavljanje video nadzora</u></p> <p><u>Obezbijediti finansijska sredstva.</u></p>

			Uspostavljena komunikacija sa specijalizovanim firmama za posatvljanje video nadzora - Usled Nedostataka finansijskih sredstava, kasni se sa realizacijom aktivnosti.						
37.	Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja			Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje / Jedinice lokalne samouprave					
	37.1 Formiranje Radne grupe	37.1 Formirana Radna grupa	<u>Nerealizovano</u>		I (2020) / II (2020)	I (2021) / II (2021)	/	Projekat	<u>* Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	37.2 Izrada analize o najboljem modelu za uspostavljanje NTC	37.2 Izrađena analiza	<u>Nerealizovano</u> *Započete aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „SAFE TOGETHER“ – Prevenција rizika u prekograničnom području		II (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)			

38.	Izrada stručnih uputstava za sanaciju opožarenih površina			Uprava za šume Crne Gore					
	38.1 Godišnji Program gazdovanja šumama za 2020. godinu (sadrži i Plan sanacije - pošumljavanja požarišta)	38.1 Pošumljena površina	<u>Realizacija u toku</u> Godišnji Program gazdovanja šumama za 2020. godinu izrađen. Pošumljavanje nije izvršeno usled mjera stednje zbog pandemije Covid 19.	/	I (2020) / IV (2020)	II (2021) / IV (2021)	Planirano 100.000,00€ Utrošena sredstva nisu dostavljena uz obrazloženje da ih je nemoguće prikazati	Budžet/ Uprava za šume	<u>*Izvršiti pošumljavanje nakon smirivanja situacije Covid 19</u>
	38.3 Plan sanacije šuma 2019., period realizacije 2020.godna	38.3 Pošumljena površina	<u>Realizovano</u> Plan realizovan u cjelosti Sproveden postupak javne nabavke sadnica i usluga pošumljavanja opožarenih površina, (po tehničkoj specifikaciji površina za pošumljavanje i potrebnog sadnog materijala sa sredstvima za izvođenje radova) Radovi su planirani i završeni u Područnoj jedinici Žabljak, Pljevlja,	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	Planirano 280.000,00€ Utrošeno 249.530.73€	Budžet	/

			Bijelo Polje, Plužine, Mojkovac i Nikšić.						
39.	<p>Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta 1:200.000</p> <p>39.1 Analiza i validacija pripremljenih podataka</p>	<p>39. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore, 1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima</p>	<p>Realizovano Projekat započet 1.10.2020.godine – potisan ugovor sa resornim ministarstvom, Direktoratom za rudarstvo i geološka istraživanja u toku 2020. godine obezbijedilo je sredstva u iznosu od 15.000€ za podršku aktivnostima koje se odnose na prikupljanje i validaciju podataka sa izradom projektnog zadatka.</p>	<p>JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direktoratom za rudarstvo i geološka ispitivanja Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktoratom za zaštitu i spašavanje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</p>	I (2020) / IV (2020)	/	<p>Planirano 15.000€ Utrošeno 15.000€</p>	Budžet	/

	39.2 Izrada Projektnog zadatka		Nerealizovano		/	IV (2023)	predviđeno 90.000€ sada se planira oko 100.000€	Budžet	*Nastaviti sa započetim aktivnostima
	39.3 Realizacija projekta		Nerealizovano *U sledećem period u slijedi izrada Projektnog zadatka, terenska istraživanja i izrada karata osjetljivosti na klizanje, odnosno Karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore 1:200.000						
40.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova 1:200.000 40.1 Prikupljanje i priprema podataka i osnova za izradu Projekta	40.Urađen Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova Crne Gore,1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima,	Realizovano Projekat započet 1.10.2020.godine – potisan ugovor sa resornim ministarstvom. Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja u toku 2020. godine obezbijedilo je sredstva u iznosu od 10.000€ za podršku	JU Zavod za geološka istraživanja / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i	I (2020) / IV (2020)	IV (2023)	Predviđeno 10.000€ Utrošeno 10.000€ Za nastavak aktivnosti planira se oko 100.000€	Budžet	*Nastaviti sa započetim aktivnostima

		pravilnicima i standardima	aktivnostima koje se odnose na prikupljanje i validaciju podataka sa izradom projektnog zadatka. U sledećem periodu slijedi izrada Projekta, terenska istraživanja i izrade karte osjetljivosti na odronjavanje.	geološka ispitivanja Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede					
41.	Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavod za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.)	41. Ojačani kadrovski kapaciteti	<u>Nerealizovano</u> ** Podaktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID19 koja je onemogućila mobilost istraživača. Određene aktivnosti obavljane preko videokonferencija, a po već započetim projektima iz predmetne oblasti.	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	10.000€	Budžet	*Ojačati kadrovske kapacitete
42.	Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u			JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja					

	cilju formiranja GEOISCG 42.1 Nastavak realizacije započetih aktivnosti na vektorizaciji geoloških osnova i formiranju baze podataka	42. Unaprijeđeni tehničko-tehnološki kapaciteti (nabavka opreme i specijalizovanih softvera)	<u>Realizacija u toku</u> Nastavak realizacije započetih aktivnosti na vektorizaciji geoloških osnova i formiranju baze podataka – izrada Katastra koncesija za ležišta č.s.m u Crnoj Gori	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	Predviđeno 50.000€ Utrošeno 20.000€ Planira se 30.000€	Budžet	/
43.	Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi u 23 opštine 43.1 Vaspitno-motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog davalastva krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	43.1 Realizovana vaspitno-motivaciona predavanja u svim opštinama u Crnoj Gori	<u>Realizacija u toku</u> * Održana su 3 predavanja u Podgorici. Zbog situacije sa COVID 19 nisu održana predavanja po srednjim školama i fakultetima	Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK) Crveni krst CG i lokalne organizacije Crvenog krsta Crveni krst CG /	I (2020) / IV (2021)	III (2021) / III (2021)	Predviđeno 26.600€ Utrošeno 4.700€ Planira se 17.300€	Budžet	<u>*Nastaviti realizaciju aktivnosti</u>

	<p>43.2 Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori</p> <p>43.3 Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster, promotivna kampanja, obuka motivatora u oblasti ddk...)</p>	<p>43.2 Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori</p> <p>43.3 Izrađen promotivni materijal</p>	<p>Realizovano Održane su 4 akcije u Podgorici i 12 akcija koje su realizovale lokalne organizacije Crvenog krsta</p> <p>Nerealizovano * Prati se epidemiološka situacija i u skladu sa mjerama će se organizovati navedene aktivnosti</p>	<p>Zavod za transfuziju krvi</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p> <p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p> <p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>18.000€</p>	<p>Budžet</p>	
44.	<p>Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije</p> <p>44.1 Organizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština.</p>	<p>44.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice)</p>	<p>Realizacija u toku Održane 2 radionice u 2 grada</p>	<p>Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>Predviđeno 500 € Utrošeno 500 € Planira se 500€</p>	<p>Budžet /CKCG</p>	<p><u>*Nastaviti realizaciju aktivnosti</u></p>

	<p>44.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.</p> <p>44.3 Angažovanje tima predavača.</p> <p>44.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.</p>	<p>44.2 Izabrane škole</p> <p>44.3 Angažovani predavači</p> <p>44.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama</p>	<p><u>Nerelizovano</u></p> <p><u>Nerelizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID19</p>						
45.	<p>Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije</p> <p>45.1 Realizovati 4 radionice za djecu i odrasle RE populacije.</p> <p>45.2 Realizovati najmanje 4 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica sa statusom zaštite</p>	<p>45. Organizovano najmanje 8 radionica za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID19</p>	<p>Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>600 €</p>	<p>Budžet/CKC G</p>	<p>* <u>Realizovati planirane radionice kada se smiri situacija izazvana pandemijom Covid 19.</u></p>
46.	<p>Radionice psihosocijalne podrške (PSP) za pomagače</p>			<p>Crveni krst Crne Gore /</p>					

	<p>46.1 Organizovati 4 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština.</p> <p>46.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice.</p> <p>46.3 Angažovanje predavača.</p> <p>46.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.</p>	<p>46.1 Organizovane 4 radionice za pomagače. (Najmanje 60 pomagača pohađalo radionicu na temu psihosocijalne podrške)</p> <p>46.2 Izvršena selekcija pomagača</p> <p>46.3 Angažovani predavači</p> <p>46.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji način prevazilaženja profesionalnog stresa.</p>	<p>Realizacija u toku Organizovana jedna radionica za 15 zaposlenih i volontera CKCG</p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u></p> <p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktor za zaštitu i spašavanje UNHCR</p>	<p>I (2020) / IV (2020)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>Predviđeno 1000 € Utrošeno 1000€ Planira se 2000€</p>	<p>Budžet/CKC G</p>	<p>* Realizovati planirane radionice kada se smiri situacija izazvana pandemijom Covid 19.</p>
47.	<p>Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći</p> <p>47.1 Dva treninga za instruktore prve pomoći</p>	<p>47.1 92 instruktora prve pomoći – po 4</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Crveni krst CG Lokalne organizacije Crvenog krsta /</p>	<p>I (2020) / I (2020)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>9.000 €</p>	<p>Budžet</p>	<p>*Realizovati planiranu aktivnost u</p>

									<u>označenom kvartalnom periodu</u>
	instruktora u svim gradovima			Vrtići Osnovne škole Srednje škole Fakulteti	I (2020) / IV (2020)	I (2021) / IV (2021)	5.000 €	Budžet	
47.2 Obuka u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima	47.2 Najviše 6000 osoba edukovanih za pružanje prve pomoći	Nerealizovano							
47.3 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou	47.3 Najmanje 6000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći	Nerealizovano			II (2020) / II (2020)	III (2021) / IV (2021)	6.000 €	Budžet	
47.4 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći	47.4 Oko 600 učesnika učestvovalo na državnom takmičenju	Nerealizovano			II (2020) / II (2020)	I (2021) / IV (2021)	8.000 €	Budžet	
47.5 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama	47.5 Najmanje 2500 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći	<u>Realizacija u toku</u> 358 osoba su završile osnovni kurs			I (2020) / IV (2021)	I (2021) / IV (2021)	-	Budžet	
47.6 Organizovanje predavanja prve pomoći	47.6 Oko 2000 osoba odslušalo predavanja o značaju prve pomoći	<u>Realizacija u toku</u> Održana 2 predavanja prve pomoći - 40 osoba odslušalo predavanja.			I (2020) / IV (2021)	III (2021) / IV (2021)	1.000 €	Budžet	
							1.000 €	Budžet	

	<p>47.7 Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći</p> <p>47.8 Izrada promotivnog materijala</p>	<p>47.7 Organizovano najmanje 8 pokaznih vježbi u kojima je učestvovalo oko 200 učesnika/spasilaca</p> <p>47.8 Preko 10000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala</p>	<p>Nerealizovano * Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID19</p> <p>Realizacija u toku Odštampano 1000 flajera i postera</p>		<p>I (2020) / IV (2021)</p> <p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p> <p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>Predviđeno 6000 € Utrošeno 1000€ Planira se 5000€</p>		
48.	<p>Izrada Zakona o požarima</p> <p>48.1 Obrazovanje Radne grupe</p> <p>48.2 Izrada Nacrta zakona</p> <p>48.3 Izrada Predloga zakona</p>	<p>48.1 Obrazovanje Radne grupe</p> <p>48.2 Izrada Nacrta zakona</p> <p>48.3 Izrada Predloga zakona</p>	<p>Nerealizovano * Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID19</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>1.000€</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u></p>
49.	<p>Izrada preliminarne procjene rizika od poplava</p>	<p>49. Izrađena preliminarne procjena rizika od poplava</p>	<p>Realizacija u toku Kroz IPA projekat "Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u</p>	<p>Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede,</p>	<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>I (2021) / II (2021)</p>	<p>Ukupan budžet za implementaciju 4 direktive je 2.300.003 €</p>	<p>IPA 2016</p>	<p>/</p>

			Crnoj Gori” započeta je izrada Preliminarne procjene rizika od poplava.	šumarstva i vodoprivrede Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije			Sredstva opredeljena za Preliminarnu procjenu rizika od poplava procenjena su na oko 155.000 €		
50.	Realizovati eksperimentalno istraživanje o uticaju primjene međupredmetnog programa „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa” na znanje, stavove i vještine učenika. 50.1 Izrada izvještaja istraživanja	50.1 Izrađen izvještaj istraživanja	<u>Realizovano</u> Aktivnost realizovana u drugoj polovini 2019. godine	Zavod za školstvo / Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I (2020) / I (2020)	/	2.500€ Planiran budžet za 2020. godinu Utrošena sredstva nijesu dostavljena	/	/
54.	Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i			Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju /					

	<p>metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi.</p> <p>54.1 Formiranje Radne grupe</p> <p>54.2 Izrada tehničkog pravilnika o tipovima ekstremnih situacija i SOP sa metodologijom za njihovo prepoznavanje, rane najave i izveštavanje</p>	<p>54.1 Izrađen Pravilnik sa SOP</p>	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u> * Urađen Nacrt Usvojene izmjene Zakona, urađen tehnički Pravilnik</p>	<p>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>	<p>I (2020) / I (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>Predviđeno AP 3.500€ Izmijenjeno 2.500€</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>*Formirati stručnu radnu grupu, izvršiti odabir konsultanat, izraditi tehnički Pravilnik i SOP</u></p>
<p>55.</p>	<p>Izrada Pravilnika za implementaciju meteoroloških podloga-inputa sa procjenom rizika od nesrećekatastrofe, prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije,</p>			<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>					

	<p>kao obaveza obrađivača-projektanta.</p> <p>55.1 Formiranje Radne grupe</p> <p>55.2 Analiza postojeće dokumentacije</p> <p>55.3 Izrada Nacrta Pravilnika</p>	<p>55. Izrađen Pravilnik</p>	<p><u>Realizacija u toku</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u></p> <p><u>Realizacija u toku</u></p> <p>* Urađen Nacrt Usvojene izmjene Zakona, urađen tehnički Pravilnik</p>		<p>I (2020) / I (2021)</p>	<p>I (2021) / IV (2021)</p>	<p>3.500€</p>	<p>Budžet</p>	<p>*<u>Formirati stručnu radnu grupu, izvršiti odabir konsultanat, izraditi tehnički Pravilnik i SOP</u></p>
<p>56.</p>	<p>Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“mapa za dogođene zemljotrese</p> <p>56.1 Nabavka 1 akcelerometara</p>	<p>56.1 Aktivirana jedna akcelometrijska stanica</p>	<p><u>Realizovano unaprijed</u> Aktivnost se sistematski odvija realizacijom godišnjih budžeta.</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p>Predviđeno 9.000€ Utrošeno 9.000€</p>	<p>Budžet</p>	<p>/</p>

			Ove godine nabavljen je još jedan akcelerometar. Nova akcelerometrijska stanica je u funkciji.						
57.	<p>Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Instaliranje kompjuterske radne stanice kao hardverske podrške za instalaciju softvera za akvizaciju seizmičkih podataka u relnom vremenu, automatsko lociranje zemljotresa i diseminacija informacija</p> <p>57.1 Kupovina radio stanice</p>	57.Instalirana radna stanica	*Nerealizovano Ukupna budzetska Inija nije bila dovoljna.	Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	I (2020) / II (2020)	I (2021) / IV (2021)	11.000€	Budžet	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
58.	<p>Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na</p>			Zavod za hidrometeorol ogiju i seizmologiju					

<p>ekstremne-opasne uslove izbijanje i širenje požara na otvorenom prostoru na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM sa remote senzorima sa GPRS komunikacijom u real-time za identifikaciju meteoroloških parametara</p> <p>58.1 Formiranje radne grupe</p> <p>58.2 Izrada projekta platforme, definisanje kriterijuma- pragova</p> <p>58.3 Nabavka softvera- platforme, operativno povezivanje platforme sa input podacima iz numeričkog modela</p>	<p>58. Online operativna platforma</p>	<p><u>Realizovano</u></p> <p><u>Realizovano</u></p> <p><u>Realizovano</u> *Bez mjernih senzora na bazi prognostičkih podataka kao input Mjerni senzori zahtjevaju značajna</p>		<p>I (2020) / IV (2021)</p>	<p>/</p>	<p>Predviđeno 35.000€ Utrošeno 3.350€</p>	<p>Budžet</p>	<p>Tokom I i II kvartala 2021. da se operativno testira rad, operativna komunikacija definisanje mail liste korisnika, i registracija korisnika. Upoznavanje korisnika sa radom platforme tokom III kvartala.</p>
---	---	--	--	-----------------------------	----------	---	---------------	---

			<p>sredstva iz budžeta. U narednom vremenskom periodu kroz određene projekte u okviru Državnih organa planira se nabavka opreme-senzora</p> <p>Nerealizovano *Operativno testiranje planirano za 2021. godinu</p>		I (2020) / IV (2021)	I (2021) / III (2021)			Operativna upotreba i javno dostupni rezultati na web strani.
	<p>58.4 Testiranje platforme, verifikacija, uvođenje u operativno stanje</p>								
60.	<p>Izrada analize seizmičkog rizika u sklopu Plana generalne regulacije Crne Gore</p> <p>60.1 Priprema mapa seizmičkog hazarda kao osnov ulaza za analizu seizmičkog rizika</p> <p>60.2 Analiza mapa seizmičkog hazarda za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine</p> <p>60.3 Analiza podataka o gustini naseljenosti na teritoriji Crne Gore</p>	<p>60.1 Pripremljene mape seizmičkog hazarda</p> <p>60.2 Izrađena analiza</p> <p>60.3 Izrađena analiza</p>	<p>Nerealizovano</p> <p>Nerealizovano</p> <p>Nerealizovano</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Građevinski fakultet</p> <p>Građevinski fakultet</p> <p>Građevinski fakultet</p>	<p>I (2020) / I (2020)</p> <p>I (2020) / I (2020)</p> <p>I (2020) / I (2020)</p>	<p>I (2021) / I (2021)</p> <p>I (2021) / I (2021)</p> <p>I (2021) / I (2021)</p>	<p>4.000€</p> <p>6.000€</p> <p>5.000€</p>	<p>Budžet</p> <p>Budžet</p> <p>Budžet</p>	<p>*Za realizaciju aktivnosti odnosno podaktivnosti potrebno je obezbijediti finansijska sredstva za realizaciju. Preporuka je da se ova sredstva planiraju Budžetom Vlade.</p>

	<p>60.4 Izrada analize potrebne za prikupljanje podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima)- metodološki okvir</p>	<p>60.4 Izrađena analiza</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Građevinski fakultet</p>	<p>II (2020) / III (2020)</p>	<p>II (2021) / III (2021)</p>	<p>15.000€</p>	<p>Budžet</p>	
	<p>60.5 Podloge za izradu baze podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima) za za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine</p>	<p>60.5 Pripremljene podloge</p>	<p><u>Nerealizovano</u></p>	<p>Građevinski fakultet</p>	<p>III (2020) / IV (2020)</p>	<p>III (2021) / IV (2021)</p>	<p>10.000€</p>	<p>Budžet</p>	
	<p>60.6 Analize vulnerabiliteta izgrađene sredine – metodološki okvir</p>	<p>60.6 Izrađena analiza</p>	<p><u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nisu realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava i nedostatka saradnje sa vodećom institucijom</p>	<p>Građevinski fakultet</p>	<p>IV (2020) / III (2021)</p>	<p>IV (2021) / III (2022)</p>	<p>40.000€</p>	<p>Budžet</p>	
<p>61.</p>	<p>Obuka timova za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa. Obuka timova za brzu procjenu</p>			<p>Građevinski fakultet</p>					<p><u>*Za realizaciju aktivnosti, odnosno podaktivnosti potrebno je</u></p>

	sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa. 61.1 Analiza postojeće prakse u procjeni štete i brze procjene sigurnosti objekata nakon zemljotresa u zemljama okruženja i šire (dodatno organizovanje okruglih stolova sa eksternim ekspertima)	61.1 Izrađena analiza	<u>Nerealizovano</u>		I (2020) / II (2020)	I (2021) / IV (2021)	20.000€	Budžet	<u>obezbijediti finansijska sredstva. Preporuka je da se ova sredstva planiraju Budžetom Vlade.</u>
	61.2 Izrada studije za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa sa priručnikom i obrascima	61.2 Izrađen priručnik	<u>Nerealizovano</u> * Podaktivnosti nijesu realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava		III (2020) / II (2021)	III (2021) / II (2022)	50.000€	Budžet	

IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA

Opšte preporuke

U cilju prevazilaženja izazova i prepreka u implementaciji aktivnosti predviđenih **Akcionim planom za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021. godine**, ali i postizanja maksimuma kvaliteta rezultata, izdvojio se set preporuka u odnosu na sve subjekte realizacije:

- Preporučuje se ministarstvima, organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave da sve planirane aktivnosti realizuju u označenom kvartalnom periodu, a što će za rezultat imati značajno unaprijeđenje sistema zaštite i spašavanja Crne Gore kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou;
- Potrebno je izvršiti analizu realizovanih aktivnosti do sada, kako bi se adekvatno i ciljano sprovelo planiranje aktivnosti koje će se sprovesti u narednom periodu, a sve u cilju sprovođenja svih planiranih aktivnosti determinisanih Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije 2019-2023;
- Neophodno je adekvatno i precizno planiranje finansijskih sredstava od strane resornih ministarstava, organa državne uprave i organa lokalne samouprave u cilju realizacije definisanih aktivnosti.

Specifične preporuke

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - smatra se neophodnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova planira i opredijeli adekvatna finansijska sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti iz akcionog plana (formiranje jedinica civilne zaštite, uspostavljanje Nacionalnog trening centra, nabavka opreme i sredstava zaštite i spašavanja od zemljotresa itd.), a sve u cilju unapređenja sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih katastrofa;
- Ministarstvo bez portfelja (aktivnost 35 AP) - ovo iz razloga što je neophodno utvrditi koji organ državne uprave ima nadležnost po pitanju formiranja i rada Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na nacionalnom nivou;

- Ministarstvo vanjskih poslova - obzirom na činjenicu da je Ministarstvo vanjskih poslova planiralo sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći koji je značajan dio zakonske regulative u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, te da u prethodne tri godine nije realizovalo niti jednu aktivnost po ovom pitanju, preporučujemo da se izvrši adekvatno sprovođenje ovih aktivnosti;
- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - preporučuje se da u okviru resornog ministarstva prepoznaju unutrašnju organizacionu jedinicu koja će biti nadležna, odnosno nosilac obaveza aktivnosti 26. Akcionog plana - Izrada zakona o seizmološkim poslovima;
- Glavni grad, Prijestonica i opštine – preporučuje se da pristupe izradi opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju događanja prirodnih i drugih katastrofa, kao i akustičkih studija radi uspostavljanja sistema javljanja i obavještanja na lokalnom nivou;
- Pluzine, Petnjica i Gusinje - da zaokruže proces formiranja službi zaštite i spašavanja i ojačaju kadrovske kapacitete i tehničku opremljenost.

V PREDLOG ZAKLJUČAKA

1. Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2020. godinu.
2. Vlada zadužuje Ministarstva i organe državne uprave da u skladu sa dinamikom realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020. i 2021. godine realizuju sve planirane aktivnosti.
3. Vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da sve nerealizovane aktivnosti u 2020. godini, realizuju u 2021. godini.
