



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA  
SMANJENJE RIZIKA  
OD KATASTROFA ZA PERIOD 2018-2023. GODINA

Podgorica, jul 2024. godine

# Sadržaj

1. UVODNI REZIME.....	1
1.1. Informacija o stepenu realizacije aktivnosti tokom cjelokupnog perioda važenja Strategije .....	2
1.2. Osvrt na stepen realizacije u godišnjem izvještajnom period (2018,2019,2020,2021,2022, 2023).....	3
1.3. Objašnjenje zašto se pojedine aktivnosti nijesu realizovale ili su djelimično realizovane .....	6
1.4. Pregled izazova u sprovođenju strateškog dokumenta, ali i u datoj javnoj politici uopšte.....	7
2. INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU POSEBNIH CILJEVA STRATEGIJE.....	8
3. TABELARNI PRIKAZ STATUSA REALIZACIJE AKTIVNOSTI U 2023.....	13
4. NALAZI EVALUACIJE .....	74
5. OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA .....	76
6. PREPORUKE ZA NAREDNI CIKLUS PLANIRANJA POLITIKA .....	77

# 1. UVODNI REZIME

Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine predstavlja strateški dokument koji je u decembru 2017. godine usvojila Vlada Crne Gore. Ovaj dokument, obuhvata najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Sadrži pravni osnov, analizu rizika od elementarnih (prirodnih), tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, stanje organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, nadležnosti i uloge državnih organa, organa državne uprave i lokalne samouprave, mjere za unapređenje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, te viziju, pravce razvoja, misiju u ovoj oblasti, i na kraju definiše način sprovođenja i finansiranja.

Glavni ciljevi Strategije za smanjenje rizika od katastrofa su:

- podizanje svijesti građana i podsticanje institucija za sprovođenje aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa;
- jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa;
- integrisanje smanjenja rizika u politike, programe i planove;
- stvaranje zajednica bezbjednih i otpornih na katastrofe.

Sastavni dio Strategije je Dinamički plan aktivnosti - operativni dokument koji obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i detaljno je razrađen kroz tri dvogodišnja akciona plana, u okviru kojih su utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori dužni da sprovedu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktor za zaštitu i spašavanje, u obavezi je da u saradnji sa drugim državnim organima, organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, izrađuje akcione planove i priprema godišnje izvještaje o statusu realizacije aktivnosti i iste podnosi Vladi na usvajanje.

Vlada Crne Gore do sada je donijela tri dvogodišnja akciona plana za period 2018-2019. godine, period 2020-2021. godine i period 2022-2023, kao i pet Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 godinu.




## 1.1 INFORMACIJA O STEPENU REALIZACIJE AKTIVNOSTI TOKOM CJELOKUPNOG PERIODA VAŽENJA STRATEGIJE

U ovom dijelu dat je detaljan pregled stepena realizacije aktivnosti sa statističkim rezultatima realizacije aktivnosti za šestogodišnji izvještajni period, kao i ukupan stepen realizacije aktivnosti za cjelokupni period trajanja strateškog dokumenta, i to u odnosu na Dinamički plan.


Važno je navesti da je sastavni dio Strategije za smanjenje rizika od katastrofa Dinamički plan aktivnosti. Dinamički plan predstavlja operativni dokument čija je realizacija planirana kroz tri dvogodišnja Akciona plana. S obzirom da su se kroz izvještajni period, aktivnosti prebacivale iz godine u godinu, nemoguće je dati tačan statistički rezultat za sva tri dvogodišnja Akciona plana, stoga u nastavku će biti prikazana statistika Dinamičkog plana, koja zapravo predstavlja stepen realizacije aktivnosti cjelokupnog strateškog dokumenta.

Dinamički plan aktivnosti sadrži 106 aktivnosti o kojima se izvještavalo iz godine u godinu. S obzirom da je izvještajni period završen 2023. godine, mogu se sumirati rezultati koji su ostavereni u prethodnih šest godina trajanja strateškog dokumenta.

Kroz cjelokupan period izvještavanja, utvrđeno je da je od ukupno 106 aktivnosti iz Dinamičkog plana, realizovano 54 aktivnosti, u toku je realizacija 14 aktivnosti, dok je nerealizovano 38 aktivnosti. Navedeno ukazuje na činjenicu da je realizovano 51% aktivnosti, u toku je realizacija 13% aktivnosti i nerealizovano je 36% aktivnosti.

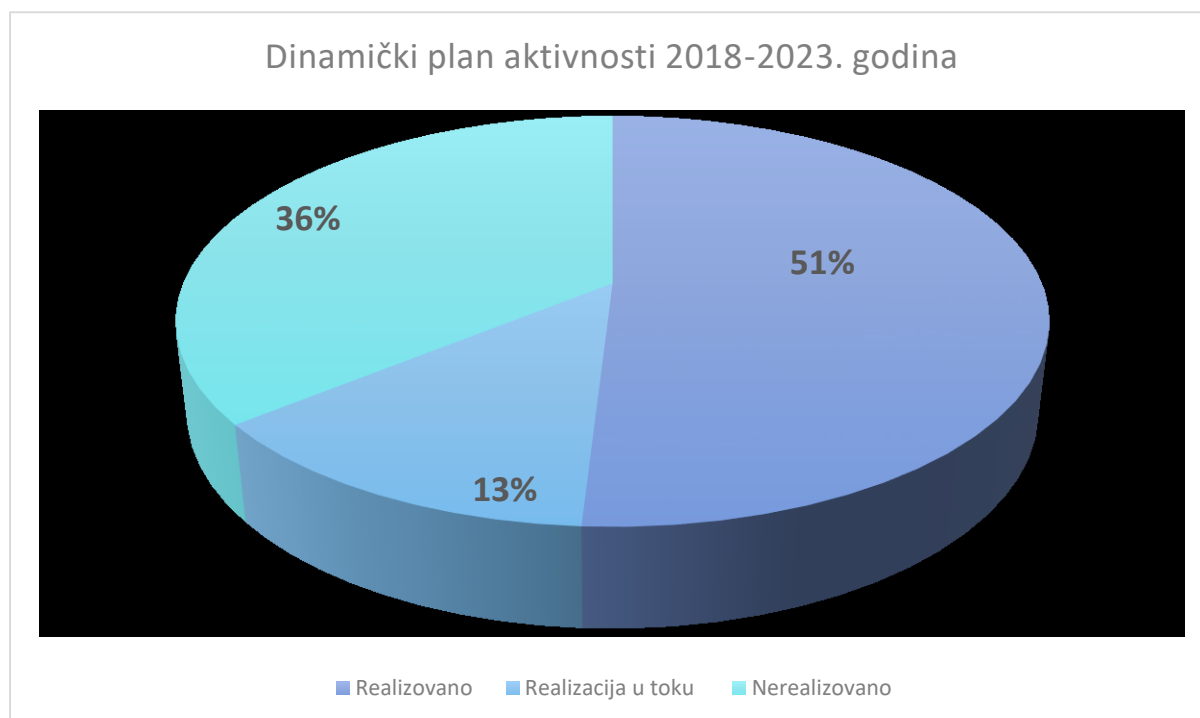


## 1.2 OSVRT NA STEPEN REALIZACIJE U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJNOM PERIODU (2018,2019,2020,2021,2022, 2023)

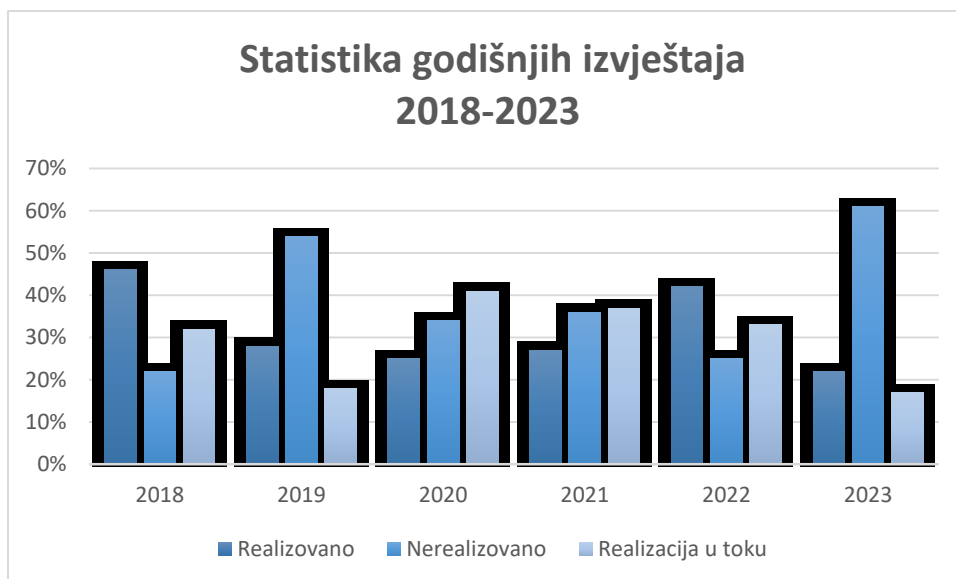

U ovom dijelu završnog izvještaja prikazan je stepen realizacije aktivnosti po godinama


Izvještajem za **2018. godinu** utvrđeno je da je od ukupno 46 planiranih aktivnosti u 2018. godini realizovana 21 aktivnost, u toku je realizacija za 15 aktivnosti, dok nije realizovano 10 aktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 46% aktivnosti, da je u toku realizacija 32% aktivnosti, te da nije realizovano 22% aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 168 planiranih podaktivnosti u 2018. godini, realizovano je 93 podaktivnosti, u toku je realizacija 30 podaktivnosti, dok nije realizovano 45 podaktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno je realizovano 55% podaktivnosti, u toku je realizacija za 18%, a procentualno nije realizovano 27% podaktivnosti.

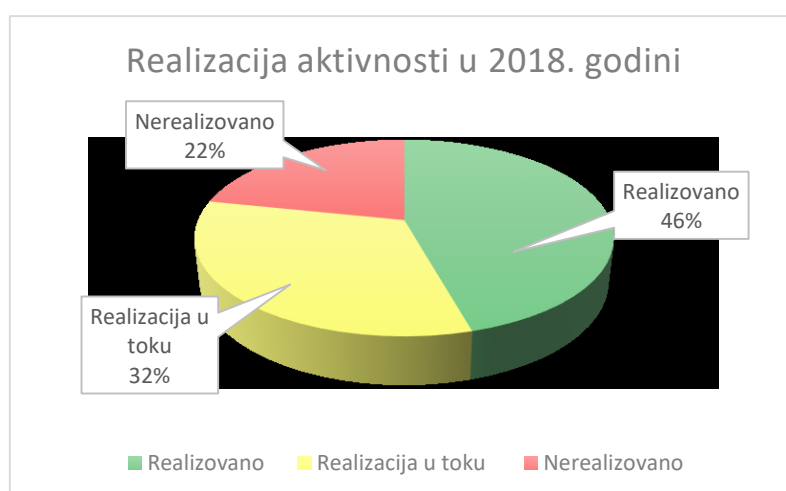


Izveštajem za **2019. godinu** utvrđeno je da je od ukupno 50 planiranih aktivnosti u 2019. godini realizovano 14 aktivnosti, u toku je realizacija 9 aktivnosti, dok nije realizovano 27 aktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 28% aktivnosti, da je u toku realizacija 18% aktivnosti, te da nije realizovano 54 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 215 planiranih podaktivnosti u 2019. godini, realizovano je 44 podaktivnosti, u toku je realizacija 22 podaktivnosti, dok nije realizovano 149 podaktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 25,4% podaktivnosti, u toku je realizacija za 15,8%, a procentualno nije realizovano 58,8% podaktivnosti.

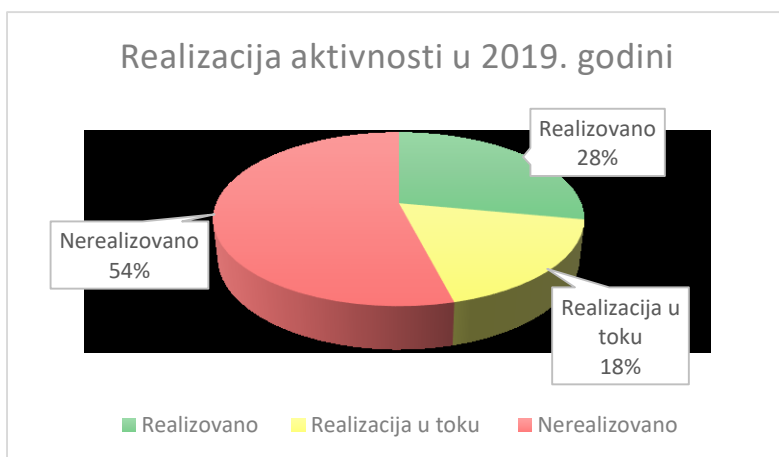


Izveštajem za **2020. godinu** utvrđeno je da je od ukupno 56 planiranih aktivnosti, realizovano 14 aktivnosti, u toku je realizacija 23 aktivnosti, dok nije realizovano 19 aktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 25 % aktivnosti, da je u toku realizacija 41% aktivnosti, te da nije realizovano 34 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 205 planiranih podaktivnosti u 2020. godini, realizovano je 37 podaktivnosti, u toku je realizacija 38 podaktivnosti, dok nije realizovano 130 podaktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 18% podaktivnosti, u toku je realizacija za 19% podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 63% podaktivnosti.

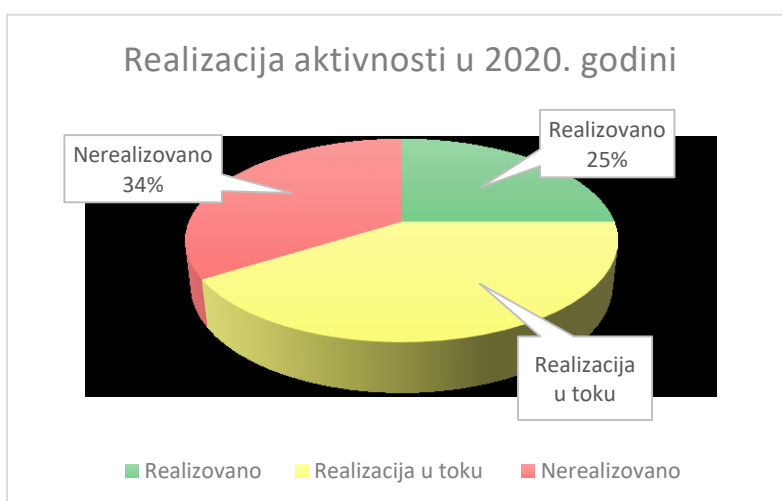


Izveštajem za **2021. godinu** pratila se realizacija 52 planirane aktivnosti, realizovano je 14 aktivnosti, u toku je realizacija 19 aktivnosti, dok nije realizovano 19 aktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 27% aktivnosti, da je u toku realizacija 37% aktivnosti, te da nije realizovano 36 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 231 planirane podaktivnosti u 2021. godini, realizovano je 58 podaktivnosti, u toku je realizacija 32 podaktivnosti, dok nije realizovano 141 podaktivnosti. Navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 25% podaktivnosti, u toku je realizacija za 14% podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 61% podaktivnosti

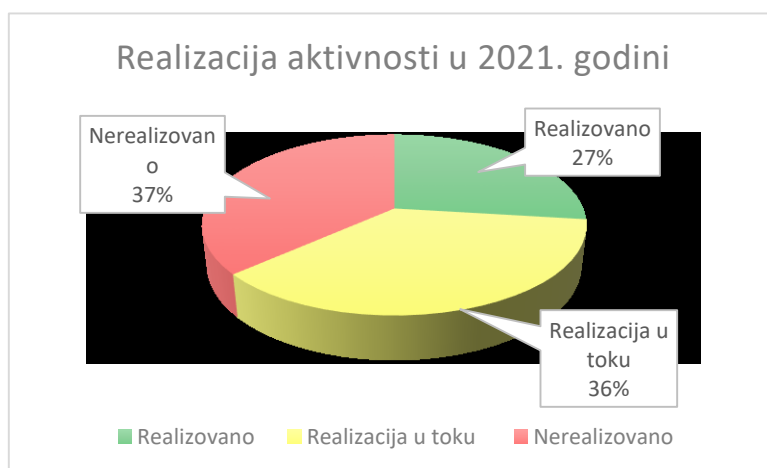


Izveštajem za **2022. godinu** pratila se realizacija 52 planirane aktivnosti, realizovano je 22 aktivnosti, u toku je realizacija 17 aktivnosti, dok nije realizovano 13 aktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 42% aktivnosti, da je u toku realizacija 33% aktivnosti, te da nije realizovano 33 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 237 planiranih podaktivnosti u 2022. godini, realizovano je 60 podaktivnosti, u toku je realizacija 50 podaktivnosti, dok nije realizovano 127 podaktivnosti. Prethodno navedeno, ukazuje da je procentualno realizovano 25% podaktivnosti, u toku je realizacija za 21% podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 54% podaktivnosti.

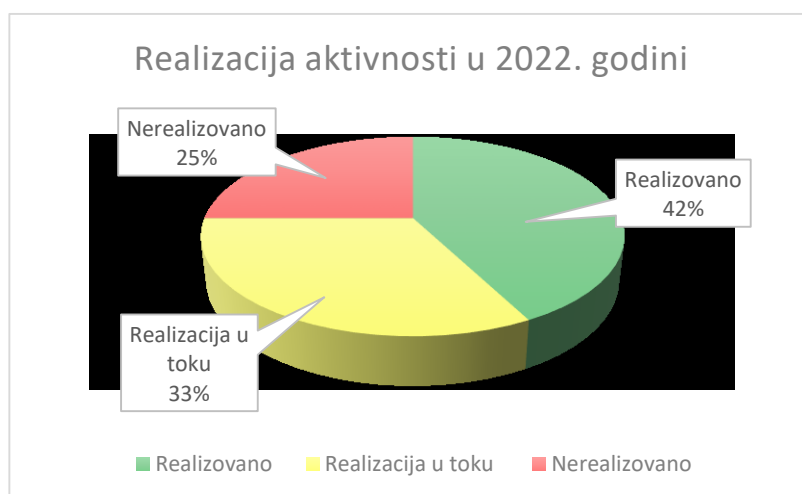

Izveštajem za **2023. godinu** pratila se realizacija 51 planirane aktivnosti, realizovano je 22 aktivnosti, u toku je realizacija 11 aktivnosti, dok nije realizovano 22 aktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 35% aktivnosti, da je u toku realizacija 22% aktivnosti, te da nije realizovano 43 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 242 planirane podaktivnosti u 2023. godini, realizovano je 52 podaktivnosti, u toku je realizacija 42 podaktivnosti, dok nije realizovano 148 podaktivnosti. Prethodno navedeno, ukazuje da je procentualno realizovano 22% podaktivnosti, u toku je realizacija za 17% podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 61% podaktivnosti

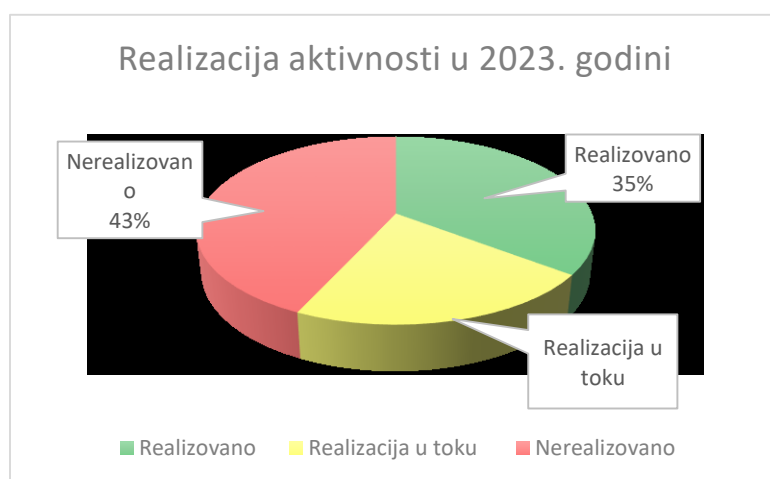

### 1.3 OBJAŠNENJE ZAŠTO SE POJEDINE AKTIVNOSTI NIJESU REALIZOVALE ILI SU DJELIMIČNO REALIZOVANE

Tokom perioda implementacije, ustanovljeno je da je najveći izazov bilo finansiranje, zbog čega veliki broj aktivnosti nije implementiran. Smanjenje rizika od katastrofa još uvijek nije prioritet Vlade za dodjelu potrebnih sredstava iz nacionalnog budžeta, aktivnosti su uglavnom finansirane iz projekata i programa međunarodnih fondova. Kao ključan razlog nerealizacije aktivnosti državni organi, organi države uprave i lokalne samouprave često su navodili i nedostatak ljudskih i materijalnih kapaciteta za sprovođenje neophodnih mjera i aktivnosti.

Takođe, česte promjene vlasti u protekle četiri godine, koje su neposredno uticale i na promjene rukovodnog kadra u uključenim institucijama te odliv stručnog kadra, uzrokovale su gubitak institucionalne memorije sa jedne strane, kao i nedovoljno odgovornosti za aktivnosti obuhvaćene Strategijom koje su bile u nadležnosti nosilaca aktivnosti. Pored toga, pandemija korona virusa i sajber napadi su evidentirani kao rizici koji su takođe imali uticaj na implementaciju aktivnosti Strategije.

Kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave, posebno treba naglasiti da je nivo uspješnosti realizacije aktivnosti opština, značajno niži u odnosu na ostale subjekte. Takođe, opštine prednjače u prenošenju nerealizovanih aktivnosti iz godine u godinu.

Posebno zabrinjava činjenica da je veoma mali broj opština izradilo, odnosno započelo izradu opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, te da pojedine opštine ovu aktivnost nijesu planirale ni u tekućoj godini.



Također, bitan nedostatak sistema zaštite i spašavanja odnosi se na izradu akustičkih studija i uspostavljanje sistema javljanja i obavještanja u jedinicama lokalne samouprave, što onemogućava adekvatno informisanje građana prije, tokom i nakon poplava, požara itd. U cilju implementacije obaveza preciziranih Sendai okvirom dužnost lokalnih samouprava je da izrade strateška dokumenta za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou. Veoma mali broj opština je realizovalo ovu aktivnost.

Sve nerealizovane aktivnosti razmotrene su sa posebnom pažnjom i biće detaljno razrađene i unaprijeđene kroz novi strateški okvir čija je izrada u toku.

## **1.4 PREGLED IZAZOVA U SPROVOĐENJU STRATEŠKOG DOKUMENTA, ALI I U DATOJ JAVNOJ POLITICI UOPŠTE**

### **1. Nepostojanje smjernica za planiranje strateških dokumenata**

Kao što je već navedeno, Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine, usvojena je prije donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije. S tim u vezi, glavni izazov u fazi pripreme Strategije je bilo nepostojanje smjernica za planiranje strateških dokumenata, što se odrazilo na strukturu i jasnoću planskog dokumenta, te otežalo i proces implementacije, monitoringa i evaluacije.

Dinamički plan aktivnosti bio je operativni dokument Strategije za smanjenje rizika od katastrofa koji je obuhvatao period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine. Da bi se postigla usklađenost sa smjernicama za izradu strateških dokumenata, ovaj plan je razrađen kroz tri dvogodišnja Akciona plana, u okviru kojih će bile utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave bili dužni da sprovedu. Svaka aktivnost u Akcionom planu imala je svoje podaktivnosti, koje su se uglavnom zbog nerealizacije prebacivale iz godine u godinu. Upravo, visok stepen razloženosti aktivnosti na podaktivnosti, reflektovao se i na samu statistiku godišnjih izvještaja, i to u smislu visokog stepena nerealizovanih podaktivnosti, posebno kod aktivnosti koje su se sprovodile na lokalnom nivou.

Ključni nedostaci DPA, koji se odrazio i na AP-ove, je nejasna logika intervencije, kao i nedefinisani mjerljivi indikatori, koji bi poslužili u monitoringu/praćenju progressa implementacije i evaluacije. Dodatno, u fazi planiranja Strategije nijesu formulisane pretpostavke za izvodljivost određenih aktivnosti, što je rezultiralo nemogućnošću da se određene aktivnosti sprovedu zbog ograničenja u normativnom okviru i u tehničkim kapacitetima pojedinačnih institucija.

Dakle, ova strategija nije imala detaljnu hijerarhiju ciljeva u smislu strateških i operativnih ciljeva sa indikatorom uspjeha, kroz čije bi se praćenje trebalo odgovoriti na ključne potrebe oblasti smanjenja rizika od katastrofa u Crnoj Gori. Navedeno ukazuje i na činjenicu da su godišnji izvještaji kreirani na osnovu stepena (ne)realizacije nosilaca aktivnosti, a ne na osnovu ispunjenosti strateških i operativnih ciljeva.

### **2. Pandemija korona virusa**

U pregledu godišnje statistike može se vidjeti da je stepen realizacije aktivnosti u 2020. i 2021. godini bio na niskom nivou. Kao glavni razlog zašto određene aktivnosti nijesu realizovane, odnosno djelimično su realizovane, nosioci aktivnosti navodili su uglavnom nedostatak finansijskih sredstava, odnosno situaciju izazvanu pandemijom COVID 19.

Pandemija je proglašena u martu 2020. godine, a ekonomske posljedice ove zdravstveno-ekonomske krize tek su se mogle naslućivati. Većina zemalja je uvela mjere socijalnog distanciranja. Prekinute su brojne djelatnosti.

Pandemija je uticala na promjene režima rada od 15. marta 2020., gdje su neki zaposleni prvenstveno morali poći na plaćeno odsustvo i prihvatiti režim skraćenog radnog vremena. Sve navedeno uticalo je na smanjenje produktivnosti rada, manjak zaposlenih i nedovoljno finansijskih sredstava koja bi bila usmjerena na realizovanje planiranih aktivnosti.

Kašnjenja u implementaciji su uzrokovana pandemijom koronavirusa, kao i sajber napadima, koji su ograničili uključene institucije da ažurno sprovedu planirane aktivnosti i o tome izvijeste Direktorat za zaštitu i spašavanje. Direktorat je često dobijao neprecizne podatke tokom izvještajnog perioda, posebno u dijelu koji se odnosi na finansijsko izvještavanje, zbog čega je iznos ukupnih utrošenih sredstava za sprovođenje aktivnosti Strategije okviran i po mišljenju službenika Direktorata nije konačan.

### **3. Diskontinuitet u sprovođenju aktivnosti nosilaca aktivnosti na lokalnom i nacionalnom nivou**

S obzirom na činjenicu da je Crna Gora ušla u fazu čestih smijena vlasti koja proizvodi domino efekat u smislu promjena u rukovodstvu raznih službi, što za posledicu ima diskontinuirano sprovođenje unazad planiranih aktivnosti. Ovome u prilog ide činjenica da određene aktivnosti prestaju da budu u nadležnosti "prošlih" institucija, što je itekako otežalo strateško izvještavanje. Ovaj problem odrazio se kako na državne organe, tako i na organe lokalne samouprave. Na nivou lokalnih samouprava često se kao razlog nerealizacije aktivnosti navodila nestabilna politička situacija kao rezultati lokalnih izbora i smjene rukovodstva, što opet za posledicu ima visok stepen nerealizovanih aktivnosti i podaktivnosti.

Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2023. godina bila je prava strategija u ovoj oblasti u Crnoj Gori i pored brojnih internih i eksternih izazova, postignuto je 51% realizacije planiranih aktivnosti.

Time je osiguran zamah za planiranje naredne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, čija neupitna relevantnost predstavlja krucijalan okvir za njen nastavak i, u odnosu na primjenu naučenih lekcija, efikasniju pripremu i implementaciju za naredni šestogodišnji period.

## **2. INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU POSEBNIH CILJEVA STRATEGIJE**


Opšti cilj Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine je *smanjenje i sprečavanje događanja novih rizika, jačanje kapaciteta društva i državnih institucija u odgovoru na različite vrste prirodnih i drugih katastrofa*. Strategija, takođe, obuhvata četiri posebna cilja: 1) Podizanje svijesti građana i podsticanje institucija na sprovođenje aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa; 2) Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa; 3) Integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u politike, programe i planove; i 4) Stvaranje bezbjednih i otpornih zajednica na katastrofe, i isti su poslužili kao osnova za formulisanje aktivnosti.

Međutim, ovaj strateški dokument usvojen je prije donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije. Iz tog razloga kako u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom Izvještaju o realizaciji Akcionih

planova za 2018, 2019, 2020, 2021, i 2022. godinu, tako ni i u Završnom izvještaju nije bilo moguće podijeliti aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima jer isti nijesu definisani u Strategiji.

Tokom evaluacije strateškog dokumenta, a za potrebe evaluacije, aktivnosti iz Dinamičkog plana aktivnosti, koje su razrađivane u tri dvogodišnja akciona plana, razvrstane su po posebnim ciljevima, sa ciljem jasnijeg pregleda i razjašnjenja veze između različitih nivoa intervencije. Takođe, Strategija nije sadržala indikatora uticaja i učinka što onemogućava preciznu procjenu progressa ka ciljevima Strategije, ali i sveukupnog učinka dokumenta.

## PRIKAZ USPJEŠNOSTI REALIZACIJE PO CILJEVIMA<sup>1</sup>

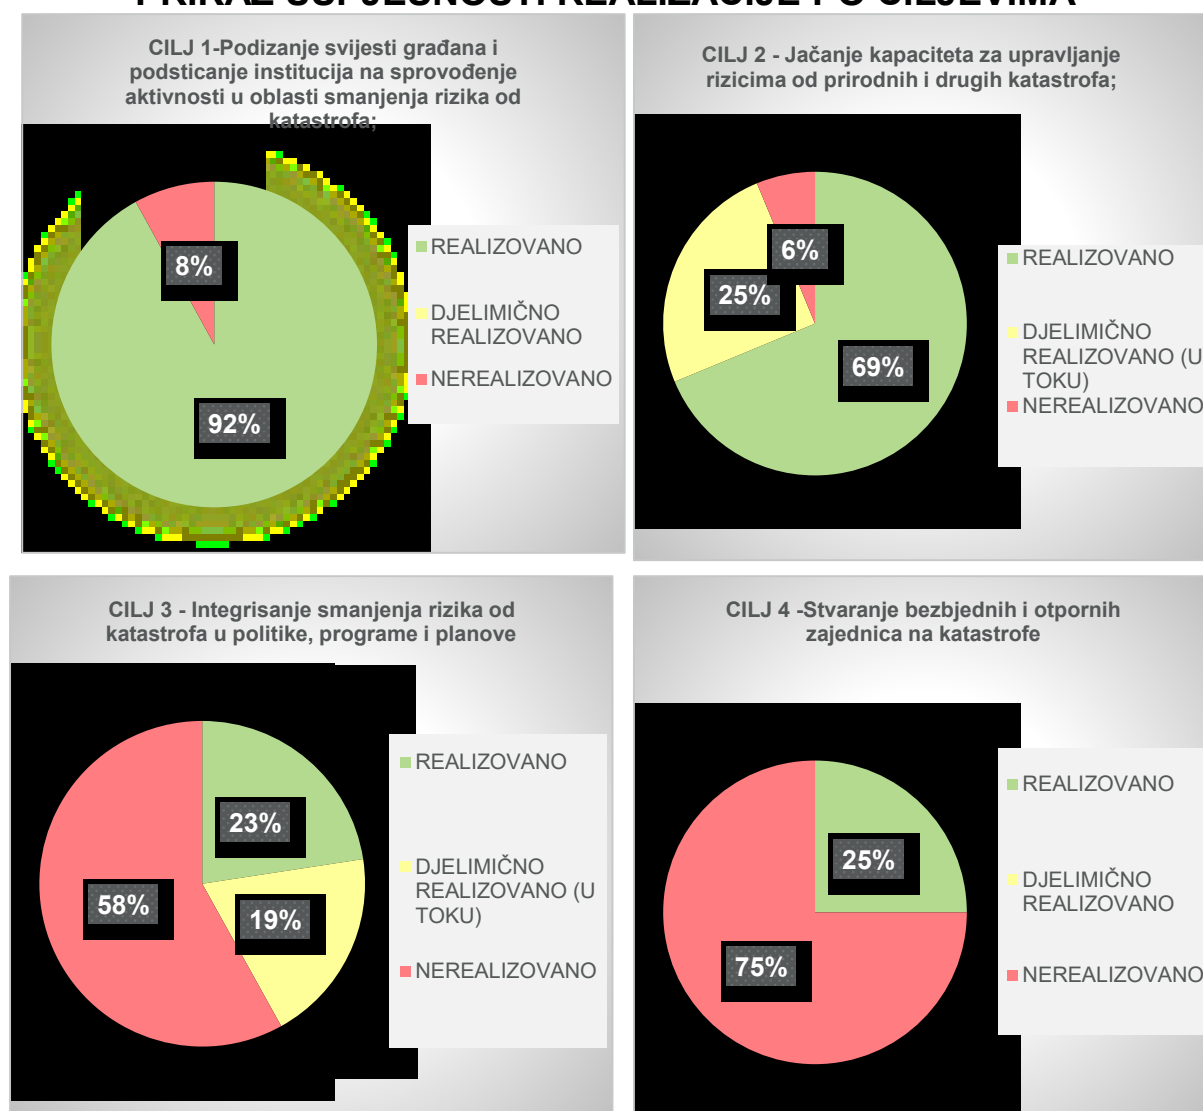

<sup>1</sup> U okviru strateškog dokumenta ciljevi strategije su jasno definisani, međutim, aktivnosti koje su precizirane u Dinamičkom planu nijesu grupisane po navedenim ciljevima. Za potrebe evaluacije dokumenta, ova podjela je izvršena samo u okviru definisanih ciljeva, ista se ne može naći u strateškom dokumentu.

## Cilj 1 Podizanje svijesti građana i podsticanje institucija na sprovođenje aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

U proteklom šestogodišnjem periodu, od ukupno planiranih 25, realizovane su 23 aktivnosti. Uspostavljene su dobre prakse, prije svega u polju promocije i edukacije građana, te uključivanjem tema smanjenja rizika od katastrofa u nastavni program obrazovnih ustanova, što je najbolji model kontinuiteta podizanja svijesti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. U proteklom periodu održan je veliki broj radionjica, seminara, edukacija na različite teme. U proteklom šestogodišnjem periodu održano je 65 akreditovanih dvodnevni seminara za nastavnike/ce i stručne saradnike/ce za edukaciju u primjeni međupredmetnog programa "Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa", pri čemu je obučeno 1730 polaznika/ca.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na psihosocijalnu podršku djeci/učenicima/cama u stresnim situacijama održan je 21 seminar, na kojima je bilo prisutno ukupno 631 polaznik/ca (direktori/ce, pedagozi/pedagoškinje, psiholozi/psihološkinje i nastavnici/ce). Takođe, unapređenja je horizontalna saradnja, povezivanjem institucija koje do implementacije Strategije nijesu imale priliku da komuniciraju i blisko saraduju.

Ključni izazovi u sprovođenju aktivnosti u okviru ovog cilja predstavljaju aktivnosti koje se odnose na podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosilaca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje kao i Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije.

## Cilj 2 Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa;

Od ukupno 46 aktivnosti koje su se razrađivale i sprovodile u proteklom šestogodišnjem periodu, realizovano je 22 aktivnosti, za 8 aktivnosti realizacija je u toku dok 15 aktivnosti nije realizovano.

Realizovane su značajane aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO-a i DPPI SEE.

Sproveden je niz aktivnosti u pravcu podizanje javne svijesti i razumijevanja uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog prijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe. Ojačani su tehnički i administrativni kapaciteti kroz sprovođenje različitih vrsta projekata, izvršena nabavka softvera kao podrške seizmičkom monitoringu i analizi podataka; kupljen jedan protiv-požarni avion, nabavljena oprema za različite vrste rizika. Unapređeni su tehničko-tehnološki kapaciteti uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju detekcije-prepoznavanja ekstremnih meteoroloških situacija; Otvoren je Trening centar za zaštitu i spašavanje u Podgorici (druga faza Vatrogasnog doma – Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, površine 1.485 m<sup>2</sup>) sa poligonom za izvođenje praktične obuke u Rogamama. Uspostavljena je operativna upotreba profesionalne Dashboard platforme - Evrpskog centra za prognozu vremena, kao i evidencija ekstremnih i značajnih meteoroloških situacija. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja nastavilo je apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA, kao i njihovu realizaciju.

Potrebno je dodatno uložiti napor kako bi se poboljšala spremnost Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom

zemljotresu. Prioritetno je zaokružavanje procesa uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima kao i uspostavljanju Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja;

O okviru ovog cilja nije realizovano nekoliko značajnih aktivnosti: Formiranje jedinica civilne zaštite; Obuka i opremanje jedinica civilne zaštite; Nije izvršena nabavka za traganje i spašavanje iz ruševina kao ni uspostavljen sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje), kao ni Obuka timova za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa i brzu procjenu sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa.

### Cilj 3 Integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u politike, programe i planove:

Uvrđeno je da ovom cilju pripadaju 36 aktivnosti Dinamičkog plana aktivnosti, od toga realizovano je 7 aktivnosti, realizacija je u toku za 6 aktivnosti dok nije realizovano 18 aktivnosti. Izrađena su dva važna dokumenta - *Procjena rizika od katastrofa Crne Gore* i *Procjena sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore*, koja predstavljaju važan osnov za implementaciju daljih aktivnosti u ovoj oblasti. Izrađena i usvojena planska dokumentacija za zaštitu i spašavanje na nacionalnom nivou, i to: Nacionalni plan zaštite i spašavanja od požara, Nacionalni plan zaštite i spašavanja od zemljotresa, Nacionalni plan zaštite i spašavanja od poplava, Nacionalni plan zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća, Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona i Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od hemijskih i bioloških rizika.

Izrađena je i preliminarna procjena rizika od poplava koja sadrži podatke o poplavama koje su se dešavale u prošlosti, a koje su imale značajnije štetne posljedice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti. Takođe, izrađena je i projektna dokumentacija za zaštitu od voda na rječnim tokovima od značaja za Crnu Goru.

U okviru ovog cilja nijesu realizovane neke od ključnih aktivnosti, kao što su: Obezbjedjivanje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke; Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći; Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći; Donošenje zakona o radu državnog organa zaduženog za poslove seizmologije; Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija; Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika; Proširivanje obima mikrosezmičkog zoniranja; Ispitivanje potencijala likvifikacije; itd.

### Cilj 4 Stvaranje bezbjednih i otpornih zajednica na katastrofe

U okviru ovog cilja grupsane su aktivnosti koje su sprovodile na lokalnom nivou, od ukupno 4 aktivnosti koje su razrađivane u okviru akcionih planova, realizovana je 1 aktivnost dok 3 nijesu realizovane. Opštine Plužine, Petnjica i Gusinje formirale su službi zaštite i spašavanja.

Opštine Nikšić, Pljevlja, Danilovgrad i Bar izradile su lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa dok su lokalne procjenu rizika od katastrofa izradile opštine Bar, Herceg Novi i Mojkovac.

Na lokalnom nivou izrađeno je nekoliko opštinskih planova za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika:

- Opštinski plan zaštite i spašavanja od požara - Plužine, Danilovgrad, Bar, Budva, Kolašin.

- Opštinski plan zaštite i spašavanja od poplava - Herceg Novi, Gusinje, Ulcinj i Budva
- Opštinski plan zaštite i spašavanja od zemljotresa izradile - Tivat, Bijelo Polje, Plužine, Mojkovac, Danilovgrad, Podgorica i Bar.
- Opštinski plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona - Bijelo Polje i Bar, a od ekstremnih meteoroloških pojava opština Pljevlja

### 3. Tabela za izvještavanje akcionog plana za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2023. godinu

R.b	Aktivnosti / Ključne tačke (podaktivnosti)	Indikator uspjeha	Status realizacije / komentar	Vodeća institucija / Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Utrošena sredstva za realizovanu ili djelimično realizovanu aktivnost	Izvor finansi- ranja	Preporuka	
1.	<b>Potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja</b>	1.1 Priprema Nacrta ugovora	1.1 Pripremljen Nacrt	*Nerealizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje	Planirana sredstva 100.000€	Budžet	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
		1.2 Utvrđivanje vrste specijalističke jedinice sa kojom treba potpisati ugovor	1.2 Definisane vrste specijalističkih jedinica	*Nerealizovano				
		1.3 Potpisivanje ugovora	1.3 Potpisani ugovori	*Nerealizovano				
2.	<b>Poboljšati tehničku opremljenost Direktorata za zaštitu i spašavanje (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika)</b>	2.1 Izvršiti nabavku utvrđene opreme i sredstava za zemljotres	2.1 Izvršena nabavka utvrđene opreme i sredstava za zemljotres	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava. U 2023. izvršena je nabavka opreme za požare – 200 naprtnjača	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirana sredstva 400.000€	Budžet	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za</u>

								<u>predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
3.	<b>Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje)</b>  <b>3.1 Opština Ulcinj</b>	<b>3.1</b> Izrada akustičke studije	<b>3.1</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano	Opština Ulcinj	Planirana sredstva 6.000€	Budžet opštine	*Potrebno je prikupiti informacije o ovlašćenim firmama za realizaciju predmetne aktivnosti.
		<b>3.2c</b> Donošenje plana potreba za materijalno - tehničko opremanje	<b>3.2c</b> Donijet plan potreba za materijalno - tehničko opremanje	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije, kao i zbog promjene odgovornih lica u opštini.				
	<b>3.2 Opština Bar</b>	<b>3.2b</b> Izrada akustičke studije	<b>3.2b</b> Izrađena akustička studija	*Realizovano	Opština Bar	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	/
	<b>3.2c</b> Donošenje plana potreba za	<b>3.2c</b> Donsen plana potreba za materijalno -	*Realizovano		Utrošena			



		materijalno - tehničko opremanje	tehničko opremanje			sredstva 5.000€		
<b>3.3 Opština Pljevlja</b>	<b>3.3</b> Izrada akustičke studije	<b>3.3</b> Izrađena akustička studija	<b>3.3</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Služba zaštite i spašavanja	Planirana sredstva 60.000€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja
<b>3.4 Opština Žabljak</b>	<b>3.4</b> Izrada akustičke studije	<b>3.4</b> Izrađena akustička studija	<b>3.4</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava I nemogućnosti angažovanja stručnih lica za izradu iste.	Opština Žabljak	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja

	<b>3.5 Opština Herceg Novi</b>	<b>3.5</b> Izrada akustičke studije	<b>3.5</b> Izrađena akustička studija	*Realizacija u toku Zajedno sa opštinama Tivat i Kotor pokrenuta je realizacija	Opština Herceg Novi	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	<b>3.6 Opština Tivat</b>	<b>3.6a</b> Izrada akustičkog elaborata	<b>3.6a</b> Izrađen elaborat	*Realizacija u toku U 2022. godini su nabavljene ponude tri izvođača za izradu studije, međutim zbog specifičnosti terena, a i iz finansijskih razloga odlučeno je da se studija radi na nivou Boke zajedno sa Kotorom i Herceg Novim. Nabavljena je saglasnost od svih i pripremljen je ugovor za potpis predsjedniku. Studija će se raditi	Opština Tivat	Planirana sredstva 5.000€  Utrošena sredstva 4.500€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>

				u prvom kvartalu 2024. godine i biti predata 15. aprila 2024. godine.				
		<b>3.6b</b> Nabavka opreme	<b>3.6b</b> Nabavljena oprema	*Nerealizovano Nedostatak kadrova/Nedostatak finansijskih sredstava				
		<b>3.6c</b> Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS	<b>3.6c</b> Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nepostojanja stalnih službenih prostorija gdje bi se ova tehnologija ugradila				
<b>3.7 Opština Bijelo Polje</b>	<b>3.7</b> Izrada akustičke studije	<b>3.7</b> Izrađena akustička studija		*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Bijelo Polje	Planirna sredstva 10.000€	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
<b>3.8 Opština Andrijevića</b>	<b>3.8</b> Izrada akustičke studije	<b>3.8</b> Izrađena akustička studija		*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andrijevića	/	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>

<b>3.9 Opština Berane</b>	<b>3.9a</b> Izrada akustičke studije <b>3.9.b</b> Nabavka opreme <b>3.9c</b> Postavljanje opreme	<b>3.9a</b> Izrađena akustička studija <b>3.9.b</b> Nabaljena oprema <b>3.9c</b> Postavljena opreme	*Nerealizovano  *Nerealizovano  *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Berane	Planirana sredstva 5.000 €	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
<b>3.10 Opština Budva</b>	<b>3.10a</b> Formira-nje radne grupe <b>3.10b</b> Izrada akustičke studije <b>3.10c</b> Utvrđi-vanje spiska opreme i sredstava za sistem obavještanja	<b>3.10a</b> Formira-na radna grupa <b>3.10b</b> Izrađena akustička studija <b>3.10c</b> Utvrđen spisak opreme	*Nerealizovano  *Nerealizovano  *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Budva	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	* <u>Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog koncepta i pribavljanja neophodnih informacija.</u>
<b>3.11 Opština Mojkovac</b>	<b>3.11</b> Izrada akustične studije	<b>3.11</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava i nedostatak stručnog kadra u ovoj oblasti	Opština Mojkovac	Planirana sredstva 7.000€	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
<b>3.12 Opština Plužine</b>	<b>3.12</b> Izrada akustičke studije	<b>3.12</b> Izrađena akustička studija	*Realizacija u toku Iz tehničkih razloga sistem obavještanja i	Opština Plužine	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Otkloniti postojeći kvar, ili postojeći system</u>

			uzbunjivanja je u prekidu		Nijesu utrošena sredstva		<u>zamjeniti novim.</u>
<b>3.13 Opština Šavnik</b>	<b>3.13</b> Izrada akustičke studije	<b>3.13</b> Izrađena akustička studija	*Realizacija u toku Aktivnost nije u potpunosti realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava i političke nestabilnosti u opštini	Opština Šavnik	Planirana sredstva 1.000€  Nijesu utrošena sredstva	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>3.14 Opština Kotor</b>	<b>3.14</b> Izrada akustičke studije	<b>3.14</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Kotor	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>

<b>3.15 Opština Kolašin</b>	<b>3.15a</b> Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin  <b>3.15b</b> Izrada akustičke studije	<b>3.15a</b> Pripremljen i objavljen tender  <b>3.15b</b> Izrađena akustička studija	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Aktivnost nije realizovana jer nije pripremljen tender za akustičku studiju	Opština Kolašin	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
<b>3.16 Prijestonica Cetinje</b>	<b>3.16a</b> Formira-nje tenderske komisije i izbor najboljeg izvođača  <b>3.16b</b> Izrada akustičke studije	<b>3.16a</b> Formira-na komisija i izabran izvođač  <b>3.16b</b> Izrađena akustička studija	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Razlozi nijesu dostavljeni	Prijestonica Cetinje	Planirana sredstva 5.000€	Budžet prijestonice	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>3.17 Glavni grad Podgorica</b>	<b>3.17a</b> Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju	<b>3.17a</b> Pripremljen i objavljen tender	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b>	Glavni grad Podgorica	Planirana sredstva 10.000€	Budžet Glavnog grada / Projekti	* <u>Dovršiti tendersku procedure u narednom period.</u>

		<p><b>3.17b</b> Izrada akustičke studije</p> <p><b>3.17c</b> Štampanje i isticanje jedinstvenih znakova za uzbunjivanje</p> <p><b>3.17d</b> Nabavka i postavljanje opreme i puštanje u rad</p>	<p><b>3.17b</b> Izrađena akustička studija</p> <p><b>3.17c</b> Izvršeno postavljanje znakva za uzbunjivanje</p> <p><b>3.17d</b> Izvršena ugradnja opreme i puštanje sistema u rad</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedovršene tenderske procedure</p>				
	<b>3.18 Opština Danilovgrad</b>	<b>3.18</b> Izrada akustičke studije	<b>3.18</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nemogućnosti pronalaska institucije koja će izraditi elaborat	Opština Danilovgrad	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine / Projekti	*Konsultovati opštine koje su izradile akustičku studiju.
	<b>3.19 Opština Nikšić</b>	<b>3.19</b> Izrada akustičke studije	<b>3.19</b> Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nemogućnosti pronalaska institucije koja će izraditi elaborat	Opština Nikšić	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	*Inicirati radni sastanak između DVS I lokalne samouprave kako bi se započela realizacija aktivnosti.
	<b>3.20 Opština Plav</b>	<p><b>3.20a</b> Izrada akustičke studije</p> <p><b>3.20b</b> Uspostavljanje sistema</p>	<p><b>3.20a</b> Izrađena akustička studija</p> <p><b>3.20b</b> Uspostavljen sistem</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nemogućnosti</p>	Opština Plav	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	*Uspostaviti komunikaciju sa opštinama koje su uradile akustičku studiju.

				pronalaska institucije koja će izraditi elaborat				
	<b>3.21 Opština Gusinje</b>	<b>3.21</b> Izrada akustičke studije  <b>3.21</b> Uspostavljen sistem	<b>3.21</b> Izrada akustičke studije  <b>3.21</b> Uspostavljen sistem	*Nerealizovano  *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Gusinje	Planirana sredstva 13.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
4.	<b>Obezbjeđivanje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke</b>	<b>4.1</b> Izrada i usvajanje Odluke	<b>4.1</b> Izrađena i usvojena Odluka	*Nerealizovano Neopredijeljena finansijska sredstva	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje Ostala ministarstva i organi državne uprave	/	/	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>



<b>5.</b>	<b>Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa</b>							
5.1	Opština Ulcinj	<b>5.1a</b> Formiranje Radne grupe  <b>5.1b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	<b>5.1a</b> Formirana Radna grupa  <b>5.1b</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano  *Nerealizovano Nedostatak stručnih lica za izradu Strategije	Opština Ulcinj	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	<u>*Potrebno je angažovati ovlašćenu firmu za realizaciju ove aktivnosti.</u>
5.2	Opština Bar	<b>5.2a</b> Formiranje Radne grupe  <b>5.2b</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	<b>5.2a</b> Formirana Radna grupa  <b>5.2b</b> Izrađena Strategija	*Realizovano  *Realizovano	Opština Bar	Planirana sredstva 10.000€  Utrošena sredstva 5.000€	Budžet opštine	/
5.3	Opština Pljevlja	<b>5.3a</b> Formiranje Radne grupe  <b>5.3b</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	<b>5.3a</b> Formirana Radna grupa  <b>5.3b</b> Izrađena Strategija	*Realizovano  *Realizovano	Služba zaštite i spašavanja	Planirana sredstva 3.000€  Utrošena sredstva 800€	Budžet opštine	/
5.4	Opština Rožaje	<b>5.4</b> Izrada Nacrta	<b>5.4</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Rožaje	Planirana sredstva 7.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih</u>

							<u>sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
5.5 Opština Žabljak	<p><b>5.5a</b> Formira-nje Radne grupe</p> <p><b>5.5b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katasrofa</p>	<p><b>5.5a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>5.5b</b> Izrađena Strategija</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Aktivnost nije ralizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava</p>	Opština Žabljak	Planirana sredstva 3.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
5.7 Opština Petnjica	<p><b>5.6a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>5.6b</b> Izrada Nacrta</p> <p><b>5.6c</b> Utvrđivanje i usvajanje Strategije</p>	<p><b>5.6a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>5.6b</b> Izrađen Nacrt</p> <p><b>5.6c</b> Izrađena Strategija</p>	<p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku Razlozi zbog kojih aktivnost nije u potpunosti realizovana, nijesu dostavljeni</p>	Opština Petnjica	<p>Planirana sredstva 2.000€</p> <p>Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim sredstvima</p>	Budžet opštine	<p>*<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih</u></p>

								izvora finansiranja
5.8 Opština Tivat	<b>5.8a</b> Formiranje Radne grupe  <b>5.8b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	<b>5.8a</b> Formirana Radna grupa  <b>5.8b</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano  *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Tivat	Planirana sredstva 25.000€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja	
5.9 Opština Bijelo Polje	<b>5.9b</b> Izrada Nacrta	<b>5.9b</b> Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Izmjene u pogledu sastava članova radne grupe.	Opština Bijelo Polje	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja	
5.9 Opština Andrijevica	<b>5.9a</b> Formira-nje Radne grupe	<b>5.9a</b> Formira-na Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Andrijevica	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije	

		<b>5.9b</b> Izrada Nacrta  <b>5.9c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	<b>5.9b</b> Izrađen Nacrt  <b>5.9c</b> Izrađena Strategija	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Razlozi nijesu dostavljeni				<u>planirati</u> <u>finansijska</u> <u>sredstva za</u> <u>sprovođenje</u> <u>aktivnosti.</u> <u>Nedostatak</u> <u>finansijskih</u> <u>sredstava za</u> <u>predložene</u> <u>aktivnosti</u> <u>nadoknaditi iz</u> <u>alternativnih</u> <u>izvora</u> <u>finansiranja</u>
5.10 Opština Plav	<b>5.10a</b> Formiranje radne grupe  <b>5.10b</b> Izrada Nacrta	<b>5.10a</b> Formirana radna grupa  <b>5.10b</b> Izrađen Nacrt	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <b>Odgovornije</b> i utemeljenije <u>planirati</u> <u>finansijska</u> <u>sredstva za</u> <u>sprovođenje</u> <u>aktivnosti.</u> <u>Nedostatak</u> <u>finansijskih</u> <u>sredstava za</u> <u>predložene</u> <u>aktivnosti</u> <u>nadoknaditi iz</u> <u>alternativnih</u> <u>izvora</u> <u>finansiranja</u>	
5.11 Opština Berane	<b>5.11a</b> Formiranje Radne grupe  <b>5.11b</b> Izrada Nacrta	<b>5.11a</b> Formirana Radna grupa  <b>5.11b</b> Izrađen Nacrt	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b>	Opština Berane	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* <b>DZS da pruži</b> <u>stručnu</u> <u>podršku</u>	

		<b>5.11c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	<b>5.11c</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka stručnih lica za izradu startegije				
5.12 Opština Budva		<b>5.12b</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	<b>5.12b</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog drugih prioriteta u ovoj oblasti	Opština Budva	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
5.13 Opština Plužine		<b>5.13a</b> Izrada Nacrta  <b>5.13b</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	<b>5.13a</b> Izrađen Nacrt  <b>5.13b</b> Izrađena Strategija	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku Formirana je Radna grupa za izradu Stretegije.	Opština Plužine	Planirana sredstva 7.000€  Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>

	5.14 Opština Šavnik	<b>5.14a</b> Formira-nje Radne grupe  <b>5.14b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa  <b>5.14c</b> Usvaja-nje lokalne Strategije	<b>5.14a</b> Formira-na Radna grupa  <b>5.14b</b> Izrađena Strategija  <b>5.14c</b> Usvojena lokalna Strategija	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Šavnik	Planirana sredstva 2.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	5.15 Opština Kolašin	<b>5.15a</b> Formiranje Radne grupe za izradu strategije  <b>5.15b</b> Izrada Nacrta strategije	<b>5.15a</b> Formira-na Radna grupa  <b>5.15b</b> Izrađen Nacrt strategije	* <b>Nerealizovano</b>  * <b>Nerealizovano</b> Nije formirana radna grupa za izradu lokalne strategije	Opština Kolašin	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	5.16 Glavni grad Podgorica	<b>5.16a</b> Formira-nje Radne grupe za izradu strategije	<b>5.16a</b> Formirana radna grupa	* <b>Nerealizovano</b>	Glavni grad Podgorica	Planirana sredstva /	Budžet Glavnog grada	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska</u>

	<p><b>5.16b</b> Izrada Nacrta strategije</p> <p><b>5.16c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije</p>	<p><b>5.16b</b> Izrađen Nacrt strategije</p> <p><b>5.16c</b> Izrađena Strategija</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Nije formirana radna grupa za izradu strategije</p>				<p><u>sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>
5.17 Opština Kotor	<b>5.17</b> Izrada lokalne Strategije	<b>5.17</b> Izrađena Strategija	<p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava</p>	Opština Kotor	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	<p>* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>
5.18 Opština Nikšić	<b>5.18</b> Izrada lokalne Strategije	<b>5.18</b> Izrađena Strategija	*Realizovano	Opština Nikšić	Planirana sredstva 4.000€ Nema podataka o utrošenim finansijskim sredstvima	Budžet opštine	/
5.19 Opština Gusinje	<b>5.19a</b> Formiranje Radne grupe za izradu strategije	<b>5.19a</b> Formirana Radna grupa za izradu strategije	*Nerealizovano	Opština Gusinje	Planirana sredstva 6.000€	Budžet opštine	<p>* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati</u></p>

		<b>5.1b</b> Izrada Nacrta strategije	<b>5.19</b> Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni				<u>finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>6.</b>	<b>Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa</b>  <u>6.1 Opština Pljevlja</u>	<b>6.1a</b> Formira-nje radne grupe  <b>6.1b</b> Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	<b>6.1a</b> Formirana Radna grupa  <b>6.1b</b> Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano  *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Služba zaštite i spašavanja	Planirana sredstva 4.500€	Budžet opštine	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja
	<u>6.2 Opština Herceg Novi</u>	<b>6.2a</b> Formiranje Radne grupe	<b>6.2a</b> Formirana Radna grupa	*Realizovano  *Realizovano	Opština Herceg Novi	Planirana sredstva 5.000€	IPA program CBC BiH-CG (EU fondovi	/



		<b>6.2b</b> Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	<b>6.2b</b> Izrađena procjena rizika	Realizovano u elektronskoj farmi, slijedi postupak štampanja		Utrošena sredstva 5.000€	međunarodna saradnja)	
<u>7.3 Opština Andrijevića</u>		<b>6.3a</b> Formira-nje Radne grupe	<b>6.3a</b> Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Andrijevića	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
		<b>6.3b</b> Izrada Nacrta	<b>6.3b</b> Izrađen Nacrt	*Nerealizovano				
		<b>6.3c</b> Utvrđiva-nje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	<b>6.3c</b> Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni				
<u>6.4 Opština Berane</u>		<b>6.4a</b> Formira-nje Radne grupe	<b>6.4a</b> Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Berane	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
		<b>6.4b</b> Izrada Nacrta	<b>6.4b</b> Izrađen Nacrt	*Nerealizovano				
		<b>6.4c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	<b>6.4c</b> Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava kao i nedostatka stručnih lica koji bi izradili lokalnu procjenu rizika				

	<u>6.5 Opština Plužine</u>	<b>6.5a</b> Izrada Nacrta  <b>6.5b</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	<b>6.5a</b> Izrađen Nacrt  <b>6.5b</b> Izrađena procjena rizika	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku Formirana je Radna grupa za izradu Procjene	Opština Plužine	Planirana sredstva 5.000€  Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet opštine	/
	<u>6.6 Opština Kolašin<sup>2</sup></u>	<b>6.6a</b> Formiranje Radne grupe  <b>6.6b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa  <b>6.6c</b> Usvajanje procjene rizika	<b>6.6a</b> Formirana Radna grupa  <b>6.6b</b> Izrađena procjena  <b>6.6c</b> Usvojena procjena	*Nerealizovano  *Nerealizovano  *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Kolašin	Planirana sredstva /	/	*Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja
	<u>6.7 Opština Kotor</u>	<b>6.7</b> Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika	<b>6.7</b> Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Služba zaštite i spašavanja	Planirana sredstva 5.000 €	Budžet opštine	Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti

<sup>2</sup> Finansijska sredstva nijesu precizirana od strane nosioca aktivnosti.

								<u>nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<u>6.8 Opština Budva</u>	<p><b>6.8a</b> Formira-nje Radne grupe</p> <p><b>6.8b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa</p>	<p><b>6.8a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>6.8b</b> Izrađena procjena</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog rada na drugim aktivnostima iz Akcionog plana</p>	Opština Budva	Planirana sredstva 15.000€	Budžet opštine	<p><u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>	
<u>6.9 Glavni grad Podgorica</u>	<p><b>6.9a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>6.9b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa</p> <p><b>6.9c</b> Usvajanje procjene rizika</p>	<p><b>6.9a</b> Formirana radna grupa</p> <p><b>6.9b</b> Izrađen Nacrt</p> <p><b>6.9c</b> Usvojena procjena</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni</p>	Glavni grad Podgorica	/	Budžet Glavnog grada	<p>* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>	

	<u>6.10 Opština Nikšić</u>	<b>6.10</b> Izrada procjene rizika od katastrofa	<b>6.10</b> Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Nikšić	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja
	<u>6.11 Opština Plav</u>	<b>6.11a</b> Formiranje radne grupe  <b>6.11b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa	<b>6.11a</b> Formirana radna grupa  <b>6.11b</b> Izrađen Nacrt procjene rizika	*Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja
	<u>6.12 Opština Gusinje</u>	<b>6.12a</b> Formiranje Radne grupe	<b>6.12a</b> Formirana radna grupa	*Nerealizovano  *Nerealizovano	Opština Gusinje	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za

		<b>6.12b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa	<b>6.12b</b> Izrađen Nacrt procjene rizika	Razlozi nijesu dostavljeni				<u>sprovođenje aktivnosti.</u> <u>Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>7.</b>	<b>Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika</b>	<b>7.1</b> Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od ekstremnih meteroloških pojava  <b>7.2</b> Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća	<b>7.1</b> Izrađen Plan  <b>7.2</b> Izrađen Plan	*Nerealizovano  *Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	/	/	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti.</u> <u>Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>8.</b>	<b>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika</b>  8.1 Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština <b>Kotor</b>	<b>8.1</b> Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja	<b>8.1</b> Izrađen Plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka	Služba zaštite i spašavanja opština Kotor	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska</u>

	od zemljotresa opština Kotor		finansijskih sredstava				<u>sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
8.2 Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi	<p><b>8.2</b> Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi</p> <p><b>8.2b</b> Ažuriranje već izrađenih opštinskih planova zaštite i spašavanja od požara, zemljotresa, klizišta i odrona</p>	<p><b>8.2</b> Usvojen Plan</p> <p><b>8.2b</b> Ažurirani planovi</p>	<p>*Realizacija u toku Plan će biti usvojen u toku godine</p> <p>*Realizovano Planovi se konstantno ažuriraju</p>	Skupština Opštine Herceg Novi	<p>Planirana sredstva 1.000€</p> <p>Utrošeno cca 1.000€ za troškove ažuriranja planova</p>	Budžet opštine	/
<b>8.3/8.4</b> Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Tivat	<p><b>8.3</b> Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od poplava</p> <p><b>8.4</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa</p>	<p><b>9.3</b> Ažuriran Plana</p> <p><b>9.4</b> Izrađen Plan</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni</p>	Služba ZiS Tivat	<p>Planirana sredstva 1.000€ + 1.000€</p>	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz</u>

								<u>alternativnih izvora finansiranja</u>
8.5/8.6/8.7 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Ulcinj</b>	<p><b>8.5</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara</p> <p><b>8.6a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>8.6</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.7a</b> Formiranje Radne grupe <b>8.7b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona</p>	<p><b>8.5</b> Usvojen Plan</p> <p><b>8.6a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>8.6b</b> Usvojen Plan</p> <p><b>8.7a</b> Formirana Radna grupa <b>8.7b</b> Usvojen Plan</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Formirana je radna grupa za izradu Plana</p>	Opština Ulcinj	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	<p>* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>	

8.8/8.9/8.10/8.11 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Bar</b>	<b>8.8</b> Formiranje radne grupe za izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona	<b>8.8</b> Formirana radna grupa za izradu opštinskih planova	*Realizovano	Opština Bar	Planirana sredstva za svaki plan po 10.000€	Budžet opštine	/
	<b>8.9</b> Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa	<b>8.9</b> Izrađen Plan	*Realizovano		Utrošena sredstva 5.000€ (bez PDV-a)		
	<b>8.10</b> Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara	<b>8.10</b> Izrađen Plan	*Realizovano		Utrošena sredstva 5.000€ (bez PDV-a)		
	<b>8.11</b> Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona	<b>8.11</b> Izrađen Plan	*Realizovano		Utrošena sredstva 5.000€ (bez PDV-a)		
8.13 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština <b>Žabljak</b>	<b>8.13a</b> Formiranje Radne grupe  <b>8.13b</b> Izrada Plana	<b>8.13a</b> Formirana Radna grupa  <b>8.13b</b> Izrađen plan	*Nerealizovano  *Nerealizovano	Opština Žabljak	Planirana sredstva 1.500€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za</u>



				Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava nedostatka stručnih lica za izradu planova				<u>sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
8.14 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština <b>Petnjica</b>	<b>8.14b</b> Izrada Nacrta  <b>8.14c</b> Utvrđivanje i usvajanje Plana	<b>8.14b</b> Izrađen Nacrt  <b>8.14c</b> Izrađen Plan	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku Prikupljeni su obrađeni terenski podaci, aktivnost nije u potpunosti realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava.	Opština Petnjica	Planirana sredstva 2.500€  Utrošena sredstva 500€	Budžet opštine	/	
8.15/8.16 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Andrijevica</b>	<b>8.15</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa  <b>8.16</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	<b>8.15</b> Izrađen Plan  <b>8.16</b> Izrađen Plan	*Nerealizovano  *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andrijevica		Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih</u>	

							<u>izvora finansiranja</u> <u>Planirati aktivnost novim strateškim dokumentom</u>
8.19 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja od zemjotresa <b>Budva</b>	<b>8.19b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	<b>8.19b</b> Izrađen Plan zaštite	*Realizacija u toku Plan je izrađen i dobijena je saglasnost od Direktorata za zaštitu i spašavnje ali plan još nije usvojen zbog problema u okviru lokalne uprave.	Opština Budva	Planirana sredstva 3.000€  Utrošena sredstva nijesu dostavljena	Budžet opštine	/
8.20 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Mojkovac</b>	<b>8.20a</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona  <b>8.20b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	<b>8.20a</b> Izrađen Plan zaštite  <b>8.20b</b> Izrađen Plan zaštite	*Nerealizovano  *Nerealizovano Aktivnostnije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Mojkovac	Planirana sredstva 3.000€	Budžet opštine	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>8.21</b> Izrada lokalnog planova zaštite i spašavanja za različite	<b>8.21a</b> Formiranje Radne grupe	<b>8.21a</b> Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Danilovgrad	Planirana sredstva 2.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati nabavku tehničke opreme koja je</u>

vrste rizika opština <b>Danilovgrad</b>	<b>8.21b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona	<b>8.21b</b> Izrađen plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka tehničke opreme koja je neophodna za sprovođenje naučnih istraživanja za potrebe ovoga plana				<u>neophodna za sprovođenje naučnih istraživanja za potrebe plana</u>
8.22 Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština <b>Kolašin</b>	<b>8.22</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	<b>8.22</b> Izrađen Plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Kolašin	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
8.23 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa <b>Glavnog grada Podgorica</b>	<b>8.23a</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa  <b>8.23b</b> Utvrdi-vanje predloga Plana i usvajanje	<b>8.23a</b> Izrađen plan  <b>8.23b</b> Usvojen plan	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku Radi se na tehničkom usklađivanju	Glavni grad Podgorica	/	Budžet Glavnog grada	/

	8.24/25 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Šavnik</b>	<p><b>8.24a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>8.24b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.25a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>8.25b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p>	<p><b>8.24a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>8.24b</b> Izrađen Plan</p> <p><b>8.25a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>8.25b</b> Izrađen Plan</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni</p>	Opština Šavnik	Planirana sredstva 1.500€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenje planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	8.26/27 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Nikšić</b>	<p><b>8.26</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.27</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p>	<p><b>8.26</b> Izrađen Plan</p> <p><b>8.27</b> Izrađen Plan</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano NVO "Defentologija" konkurisala je za izradu plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava.</p>	Opština Nikšić	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	* <u>Nakon izrade planove dostaviti DZS na mišljenje</u>
	8.28 Izrada lokalnog plana zaštite i	<b>8.28a</b> Formiranje radne grupe	<b>8.28a</b> Formirana radna grupa	*Nerealizovano	Opština Plav	Planirana sredstva 5.000€	Budžet opštine	* <u>Odgovornije i utemeljenje planirati</u>

	spašavanja od odrona i klizišta opština <b>Plav</b>	<b>8.28b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona	<b>8.28b</b> Izrađen plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni				<u>finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	<b>8.30</b> Izrada lokalnog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Gusinje	<b>8.30a</b> Formiranje Radne grupe <b>8.30b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava	<b>8.30a</b> Formirana Radna grupa <b>8.30b</b> Izrađen Plan	*Realizacija u toku *Izrađen nacrt plana, Plan nije usvojen	Opština Gusinje	Planirana sredstva 5.000€ Podaci o utrušenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Nakon izrade planove dostaviti DZS na mišljenje</u>
	8.31/8.32/8.33/8.34 Izrada i ažuriranje lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika prijestonica <b>Cetinje</b>	<b>8.31</b> Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od zemljotresa  <b>8.32</b> Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od požara  <b>8.33</b> Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od poplava	<b>8.31</b> Ažuriran plan  <b>8.32</b> Ažuriran plan  <b>8.33</b> Ažuriran plan	*Nerealizovano  *Nerealizovano  *Nerealizovano  *Nerealizovano	Prijestonica Cetinje	/	Budžet prijestonice	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>

		<b>8.34</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoških nesreća	<b>8.34</b> Izrađen Plan	Razlozi nijesu dostavljeni				
<b>9.</b>	<b>Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim vrstama rizika</b>	<b>9.1</b> Održavanje konferencije u 2023. godini	<b>9.1</b> Održana konferencija	*Realizovano U okviru projekta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima” na Završnom sastanku, održana je i konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa na temu Procjene sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore.	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	Planirana sredstva 5.000€ *Bez utrošenih sredstava	Budžet	/
<b>10.</b>	<b>Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE</b>	<b>10.2</b> Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2023. godinu	<b>10.2</b> Plaćena članarina za 2023. godinu	*Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirana sredstva cca 600.000€ / Oslobođeni plaćanja	Budžet	/
		<b>10.4</b> Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2023. godinu	<b>10.4</b> Plaćena članarina za 2023. godinu	*Realizovano		Planirana sredstva 25.000€ Utrošena sredstva 25.000€	Budžet	/

		<b>10.6</b> Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2023. godini <sup>3</sup>	<b>10.6</b> Realizovan program obuka	*Realizovano		/	Budžet Mehanizma CZ	/
		<b>10.8</b> Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2023. godini	<b>10.8</b> Realizovan program obuka	*Realizovano		30.391,36€	Budžet DPPI SEE	/
		<b>10.10</b> Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2022. godini	<b>10.10</b> Realizovan program obuka	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava		/	Budžet NATO	* <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
<b>11.</b>	<b>Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i</b>	<b>11.2</b> Realizacija Programa u 2023. godini	<b>11.2</b> Realizovan Program u 2023. godini	*Nerealizovano Obuka nije realizovana zbog neuspjele javne	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za	Planirana sredstva 11.000€	Budžet	/

<sup>3</sup> Aktivnosti od rednog broja 10.5 do 10.10 finansiraju se iz budžeta navedenih međunarodnih organizacija.

	nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje			nabavke za sprovođenje obuke	zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave / Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave			
13.	Realizovati prezentaciju eksperimentalnog istraživanja o uticaju primjene međupredmetnog programa Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na znanje, stavove i vještine učenika.	13.3 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2023. godini	13.3 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa	*Realizovano Održane edukacije i vježbe evakuacije na različite teme smanjenja rizika od katastrofa širom Crne Gore	MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirana sredstva / *Bez utrošenih sredstava	Budžet	/
14.	Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske,	14.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)	14.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2023. godinu	*Realizovano Generalštab Vojske angažovao je helikoptersku eskadrilu Vazduhoplovstva Vojske na gašenju požara u opštini Danilovgrad i Glavnom gradu Podgorica. Na početku godine uslijed velikih poplava i ukazane	Ministarstvo odbrane Direktorat za politiku i odbranu i Generalštab Vojske Crne Gore / Direktorat za materijalne resurse i	/ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima



	<b>biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)</b>			urgentne potrebe, Vojska je postavila dva montažno-demontažna mosta od Bejli materijala u dužini od 21 m i 30 m u opštinama Mojkovac i Bijelo Polje.				
		<b>14.2</b> Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite	<b>14.2</b> Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2023. godinu	*Realizovano Angažovan je jedan tim, koji je izvršavao zadatke po naređenju komande Bataljona za podršku, za potrebe Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane.		/	Budžet	* <u>Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>
		<b>14.3</b> Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)	<b>14.3</b> Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2022. i 2023. godinu	*Realizovano Na godišnjem nivou su izrađivani planovi koji se odnose na ZNR, ZŽS i ZOP i redovno su realizovane kontrole po ovim pitanjima u jedinicama i komandama VCG.		/	Budžet	* <u>Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>
<b>15.</b>	<b>Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: širenje mreže permanentnih GPS stanica</b>	<b>15.1</b> Proširenje mreže 1 permanentnom GPS stanicom		*Nije realizovano Nedostatak finansijskih sredstava.	ZHMS	Planirana sredstva 45.000€	Donacija	* <u>Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>

16.	<b>Nabavka formacijske opreme koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa</b>	16.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	16.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2022. i 2023. godini	*Realizovano U toku 2023. godine nabavljena su dva vučna voza za prevoz građevinskih mašina i tri specijalna vozila (vozilo za prevoz goriva, vozilo za prevoz kontejnera i jedno višenamjensko vozilo – donacija Republike Turske koja se mogu koristiti u 3. misiji Vojske).	Ministarstvo odbrane Direktorat za materijalne resurse	Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	* <u>Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>
17.	<b>Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe - organizovanje stručnih konferencija, radionica, panel tribina, skupova i tribina</b>	17.1 Održavanje jedne stručne radionice	17.1 Održana konferencija	*Realizovano Održana tematska konferencija povodom 44. godišnice zemljotresa	Zavod za hidrometeorologiju i i seizmologiju	Planirana sredstva 1.000€  Utrošena sredstva 612,48€	Budžet	/
18.	<b>Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata)</b>				Opština Plužine, Petnjica i Gusinje			
	18.1 Opština Petnjica							

		<b>18.1</b> Jačanje tehničke opremeljenosti	<b>18.1</b> Nabavljena neophodna sredstva i oprema	*Nerealizovano Nijesu nabavljena neophodna sredstva	Opština Petnjica	Planirana sredstva 50.000€	Fond sredstava za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu / Projekti MUP-a	<u>**</u> <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
	18.2 Opština Plužine	<b>18.2</b> Formira-nje službe zaštite spašavnja	<b>18.2</b> Formirana Služba zaštite i spašavanja	*Realizovano Izvršena popuna radnih mjesta.	Opština Plužine	Planirana sredstva / Utrošena sredstva 10.000€	Budžet opštine	/
	18.3 Opština Gusinje	<b>18.3a</b> Jačanje kadrovskih kapaciteta  <b>18.3b</b> Jačanje tehničke opremeljenosti	<b>18.3a</b> Uposlen neophodan broj lica  <b>18.3b</b> Naba- vljena neophodna sredstva i oprema	*Nerealizovano Nijesu nabavljena neophodna sredstva	Opština Gusinje	/	Budžet opštine kroz projekat	<u>**</u> <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz</u>

								<u>alternativnih izvora finansiranja</u>
19.	<b>Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći</b>	<b>19.1</b> Formiranje Međuresorske radne grupe na rukovodnom nivou	<b>19.1</b> Formirana Međuresorska radna grupa	*Realizovano Napomena: Međusektorska radna grupa je formirana, međutim, procedura usvajanja Zakona još uvijek nije završena i očekuje se da Predlog zakona bude upućen Vladi na razmatranje. To znači da se primjena ovog zakona očekuje u IV kvartalu 2024. godine	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	/	/	/
20.	<b>Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći</b>	<b>20.1</b> Priprema i izrada Nacrta strategije	<b>20.1</b> Definisani predmet Strategije	*Nerealizovano Utvrdjen je Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći koji ostavlja više mogućnosti na koji način će Vlada utvrditi prioritetne ciljeve i oblasti djelovanja za sprovođenje	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	Planirana sredstva 20.000€ + dodatna sredstva	Budžet / donatorska sredstva GIZ i UNDP	*Vlada da utvrdi prioritete i ciljeve u ovoj oblasti

				međunarodne razvojne saradnje i upućivanje međunarodne humanitarne pomoći. Iz navedenih razloga nije realizovana obaveza izrade Strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć.				
22.	<b>Sprovođenje građevinskih mjera za uređenje vodotoka i drugih voda i izgradnja vodnih objekata za zaštitu od poplava</b>	<p><b>22.1</b> Izvođenje infrastrukturnih radova na izgradnji nasipa na kritičnim dionicama na Grnčaru i Limu u opštinama B. Polje, Berane, Gusinje i Plav</p> <p><b>22.2</b> Izvođenje infrastrukturnih radova na rekonstrukciji sistema nasipa na</p>	<p><b>22.1</b> Završeni infrastrukturni radovi na Grnčaru i Limu u opštinama B. Polje, Berane, Gusinje i Plav</p> <p><b>22.2</b> Završeni infrastrukturni radovi na rekonstrukciji sistema nasipa na</p>	<p>*Realizacija u toku Raspisan je tender za odabir izvođača radova na dionicama u Beranama i Bijelom Polju. Izabrana je kompanija koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova.</p> <p>*Realizacija u toku Očekuje se raspisivanje tendera za odabir izvođača radova i</p>	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	<p>Planirna sredstva 13.4* 10<sup>6</sup> €</p> <p>Ukupna vrijednost radova prema projektnoj dokumentaci-ji iznosi 14.485.945€</p> <p>Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim sredstvima</p> <p>Planirna sredstva 700.000 US \$ Ukupna procijenjena</p>	Kredit IBRD kroz projekat SDIP  Donacija Adaptacionog Fonda kroz projekat "Integralno	/

		<p>rijeci Bojani na kritičnim dionicama</p> <p><b>22.3</b> Htini interventni radovi na vodotocima od značaja za Crnu Goru u cilju zaštite od štetnog dejstva voda</p>	<p>rijeci Bojani na kritičnim dionicama</p> <p><b>22.3</b> Sprovedeni interventni radovi na vodotocima od značaja za Crnu Goru</p>	<p>nadzor na dionici Štodra-Sukobina</p> <p>Uprava za vode obezbijedila je nadzor nad izvođenjem radova kao i geodetsko snimanje i obilježavanje prije početka i završetka predmetnih radova</p>		<p>vrijednost radova na rekonstrukciji nasipa na rijeci Bojani iznosi 5.000.000€ za dionicu Štodra-Sukobina. Adaptacioni fond je opredijelio sredstva u iznosu od 600.000€ koji pokriva samo prvu fazu radova, dok ukupna vrijednost radova iznosi 1.100.000€</p> <p>Planirna sredstva 100.000€ Finansijska sredstva za izvođenje radova obezbijediće se izvođaču radova kojeg imenuje opština i zaključi ugovor sa istim, na način i pod uslovom da</p>	<p>upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu”</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

						izvođač radova može otkupiti višak izvađenog materijala, shodno visini naknade koja je utvrđena Odlukom o visini i načinu obarčunava-nja vodnih naknada. Ugovor o nadzoru i geodetskom snimanju iznosio je 9.534,80€		
23.	Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje: - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu	23.2 Plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu	23.2 Plaćena godišnja članarina za 2023. godinu	*Realizovano	Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta / Javni sektor / Naučno-istraživačke institucije / Univerziteti / Centar za ekotoksikološka ispitivanja / Klinički centar CG	Planirna sredstva 8.000,00€  Ukupna godišnja kontribucija za 2023: za regularni budžet 14.262 EUR I 1.998 USD, za TCF 3.747 EUR I za WCF 608 EUR..	Budžet	/
		23.3 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2022/2023. godinu i njihova realizacija	23.3 Realizovani projekti	*Realizovano Realizovana dva projekta, jedan je Klinički centar Crne Gore a drugi Specijlističke	Planirna sredstva 8.000,00€  Podaci o	Budžet IAEA + 5% vrijednosti projekta (učesće institucije)	/	

				veterinarske laboratorije (projektni ciklus započeo 01.01.2022. godine a završio se 31. decembra 2023. godine)		utršenim sredstvima nijesu dostavljeni		
24.	<b>Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa</b>	<b>24.2</b> Planirani seminari u Podgorici, Nikšiću, Budvi, Kotoru.	<b>24.2</b> Realizovani seminari u Podgorici, Nikšiću, Budvi, Kotoru.	*Realizovano	Zavod za školstvo MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirna sredstva 6.000€  Utrošena sredstva 2.800 €	Budžet	/
25.	<b>Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama</b>	<b>25.2</b> Seminari u Podgorici i Herceg Novom	<b>25.2</b> Realizovani seminari u Podgorici i Herceg Novom	*Realizovano	Zavod za školstvo MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirana sredstva 2.500€  Utrošena sredstva 234€	Budžet	/
26.	<b>Izrada Zakona o seizmološkim poslovima</b>	<b>26.1</b> Javna rasprava  <b>26.2</b> Odgovori na pitanja javne rasprave i formiranje Predloga zakona	Izrađen Nacrt	*Nerealizovano  * Nerealizovano Sektor za seizmologiju pripremio je tekst Nacrta Zakona i dostavio RIA obrazac.	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera  / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Planirna sredstva 500€	Budžet	/
						Planirna sredstva 500€		
27.	<b>Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija</b>	<b>27.1</b> Formiranje radne grupe i izrada Nacrta	<b>27.1</b> Usvojene izmjene i dopune	*Nerealizovano Do kašnjenja je došlo zbog razmatranja pitanja da li se predložene izmjene trebaju	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju  /	Planirana sredstva 2.500€	Budžet	/



				regulisati kroz Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera			
28.	<b>Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti</b>	28. Usvajanje izmjena i dopuna zakona	28. Usvojene izmjene i dopune	*Realizacija u toku U toku je izrada Predloga zakona	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	/	/	/
29.	<b>Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.</b>	29.1 Stručno usavršavanje- post - diplomske studije u oblasti seizmologije/srodnih nauka	29.1 Upisan jedan doktorant	*Nerealizovano Nema upisanih kandidata. Starosna struktura zaposlenih u sektoru je nepovoljna, neophodno je zapošljavanje mladih kadrova.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Planirana sredstva 2.000€	Budžet	* <u>Neophodno stručno jačanje u Sektoru, zapošljavanju novog mladog kadra</u>

30.	<b>Realizacija druge faze VTMIS sistema u Bokotorskom zalivu i Skadarskom jezeru</b>	<p><b>30.1</b> Potpisan ugovor sa najboljim ponuđačem</p> <p><b>30.2</b> Početak implementacije realizacije ugovora</p> <p><b>30.3</b> Proces kontrole i prijema opreme</p>	<p><b>30.1</b> Potpisan ugovor</p> <p><b>30.2</b> Započeta implementacija</p> <p><b>30.3</b> Započet proces kontrole i prijema oprema</p>	<p><b>*Realizacija u toku</b></p> <p><b>* Nerealizovano</b></p> <p><b>*Nerealizovano</b> Tokom realizacije projekta je došlo dva puta do produženja implementacije projekta, a zbog čekanja na davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju od strane lokalne samouprave tj opština Kotor i Herceg Novi.</p>	<p>Ministarstvo kapitalnih investicija - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama / Sektor sigurnosti plovidbe - Pmorsko operativni centar - VTS</p>	<p>Planirna sredstva 1.450.000€</p>	<p>IPA 2017</p>	<p><u>Poboljšati komunikaciju za lokalnom samoupravom</u></p>
32.	<b>Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu</b>	<p><b>32.1</b> Una-pređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije - ZHMS</p>	<p><b>32.1</b> Finansirana pripravnost</p>	<p><b>*Realizacija u toku</b> Produžene Odluke o rasporedu radnog vremena i uvođenju prekovremenog rada u Sektoru seizmologije</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p>	<p>Planirana sredstva 1.500€</p> <p>Utrošena sredstva cca 500€</p>	<p>Budžet</p>	<p><u>*Definisati Zakonom o seizmološkim poslovima</u></p>

		32.2 Unapređenje web servisa i vidljivosti informacija na društvenim mrežama.	32.2 Aktivna nova web stranica i nalozi	*Nerealizovano				*Za realizaciju aktivnosti izgraditi kapacitete unutar sektora
33.	Održavanje i unapređivanje back-up sistema u napajanju / komunikacijama/analizi seizmičkih podataka. Povezivanje i umrežavanje seizmičkih stanica putem satelitske konekcije.	33.1 Uvođenje satelitskog interneta u centralnu stanicu Podgorica	33.1 Reaktivan prenos podataka satelitskim internetom, uveden satelitski internet u centralnu stanicu	*Realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Planirana sredstva 1.000€  Utrošena sredstva 726€	Budžet	/
34.	Nabavka opreme za sprečavanje zagađenja na otvorenom mora	34.1 Potpisan ugovor sa najboljim ponuđačem  34.2 Početak implementacije realizacije ugovora  34.3 Proces kontrole i prijema opreme	34.1 Potpisan ugovor  34.2 Započeta implementacija  34.3 Započet proces kontrole i prijema oprema	*Realizovano  *Realizovano  *Realizovano Oprema je preuzeta i operativna te smještena na sidrištu Mornarice Crne Gore u Baru	Ministarstvo kapitalnih investicija - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama / Sektor sigurnosti plovidbe	Planirna sredstva 1.000.000€  Utrošena sredstva 941.474,00€	IPA 2017	/
36.	Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u	36.1 Rad komisije na Izradi Nacrta studije	36.1 Izrađen Nacrt studije	*Realizacija u toku	JP Nacionalni parkovi /	Planirna sredstva 15.000€	Budžet	* Neophodno je od najpovoljnijeg

	<b>nacionalnim parkovima</b>			*Realizacija u toku Formirana je mješovita komisija za izradu studije. Studija je djelimično izrađena zbog ispitivanja mogućnosti postavljanja nadzora na različitim konfiguracijama terena.	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>izabranog ponuđača izvršiti uspostavljanje kompletne video mreže nadzora za detektovanje požara</u>
37.	<b>Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja</b>	37.3 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra	37.3 Uspostavljen Nacionalni trening centar	*Realizovano  Spašavanje na brzim vodama Rescue 3 international  Pružanje prve pomoći u vanboličkim uslovima	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Jedinice lokalne samouprave	Planirna sredstva 1.276.113,89€  Utrošena sredstva 8.500,00€  Utrošena sredstva 3.450,00	Projekat "SAFE TOGETHER"  Izvor finansiranja projekat RES COMM	<u>*Zakonski utemeljiti funkcionisanje Trening centra</u>

38.	<b>Izrada stručnih uputstava za sanaciju opožarenih površina</b>	38.2 Godišnji Program gazdovanja šumama za 2023. godinu (sadrži i Plan sanacije - pošumljavanja požarišta)	38.2 Izrađen godišnji program i pošumljena površina za 2023. godinu	<b>*Realizovano</b>	Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Planirna sredstva 232.232,43€  Utrošena sredstva 192.838,92€	Budžet/ Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	<u>*Dovršiti započeto pošumljavanje</u>
-----	--	--	---	---------------------	--	--	--	---

39.	<b>Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta i debritskih tokova 1:200.000</b>	39.3 Realizacija projekta	39.3 Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore,1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i standardima	*Nerealizovano Razlozi zbog kojih aktivnost nije realizovana su finansijske prirode, zato što nisu opredjeljena sredstva za izvođenje radova po projektu koji je urađen 2022. Goine a odnosi se na Izradu karata podložnosti na klizanje i debritne tokove 1:200.000	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo kapitalnih investicija - Direktor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktor za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Planirna sredstva 120.000€	Budžet	** <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
-----	--	---------------------------	--	---	--	----------------------------	--------	---

40.	<b>Izrada karte odrona 1:200.000</b>	40. Realizacija projekta	40. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte odrona Crne Gore, 1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima	*Realizovano U 2022. godini projekat je urađen i revidovan i planirani su terenski radovi. Usled finansijskih problema u Zavodu od predviđenih terenskih radova nastavljeno je sa prikupljanjem relevantnih podataka o vrsti i specifikaciji opreme potrebne za predmetno istraživanje i projekat je dopunjen u skladu sa primjedbama i sugestijama revizije komisije. Istraživanja su obavljena na magistralnom putu Podgorica-Nikšić i Izveštaj je urađen u skladu sa projektnim istraživanjima	JU Zavod za geološka istraživanja / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja / Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Planirana sredstva 102.800€  Utrošena sredstva 31.011,50€	Budžet	* <u>Nastaviti sa započetim aktivnostima</u>
-----	--	--------------------------	---	---	---	---	--------	--

41.	<b>Odgovor na rizik od klizišta i bujičnih poplava formiranjem sistema ranog upozorenja (RESPONS-a)</b>	41. Postavljanje monitoring tačaka u opštini Budva	41. Uspostavljene monitoring tačke	*Realizovano Realizovan je sistem ranog upozoravanja na klizanje za klizište Deponija čvrstog materijala na brdu Spas iznad Budve. Early warning system se sastoji iz niza senzora i razrađenih opracija, kao i sporazuma sa opštinom Budva, koji u realnom vremenu može da uzbuni i reaguje na opasnost klizišta.	JU Zavod za geološka istraživanja / INTEREG - IPA CBC Hrvatsaka - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	Planirna sredstva 202.096€  Utrošena sredstva 266.796€	IPA	/
-----	---	--	------------------------------------	---	---	--	-----	---



42.	<b>Tehničko-tehnološko opremanje i edukacija-obuka kadrova za Nowcasting prognoze. Nabavka meteoroloških radara dometa oko 400~500 km. Edukacija meteorologa za korišćenje radara i praćenje meteoroloških sistema za Now casting prognoze. Jedan S/C-band meteo radar</b>	<b>42.1</b> Formiranje radne grupe  <b>42.2</b> Izrada Elaborata  <b>42.3</b> Priprema tendera  <b>42.4</b> Priprema lokacije  <b>42.5</b> Nabavka i instalacija  <b>42.6</b> Obuka meteorologa za prognozu	<b>42.1</b> Formirana radna grupa  <b>42.2</b> Izrađen Elaborat  <b>42.3</b> Pripremljen tender  <b>42.4</b> Pripremljene lokacije  <b>42.5</b> Izvršena nabavka i instalacija  <b>42.6</b> Izvršena obuka meteorologa	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku Formirana je radna grupa i predate material za kapitalni budžet za narednu godinu za ovaj projekat.	ZHMS / MEPPU (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) DZS-MUP CG Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirna sredstva 3.000.000€  Nisu utrošena finansijska sredstva	Budžet Projekti-Donacije	*Nastaviti sa <u>započetim dokumentima</u>
43.	<b>Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi u 23 opštine</b>	<b>43.1</b> Vaspitno-motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	<b>43.1</b> Realizovana vaspitno-motivaciona predavanja u svim opštinama u Crnoj Gori	*Realizovano Realizovane dvije obuke za dvije opštinske organizacije koje su iskazale potrebu za ovom obukom. Trening za nove motivatore planira se za 2024. godinu	Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK) / Crveni krst CG i lokalne organizacije Crvenog krsta /	Planirana sredstva 4.600€  Dostavljeno da su utrošena redovna sredstva bez detalja o istim	Budžet/CKCG	/

		<p><b>43.2</b> Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori</p>	<p><b>43.2</b> Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori</p>	<p>*Realizovano Organizovane tri akcije dobrovoljnog davanja krvi sa privatnim sektorom, kao I zaposlenima I volonterima u CKCG u Podgorici.</p> <p>CKCG je finansijski pomogao realizaciju 32 akcije dobrovoljnog davanja krvi u 17 opština u Crnoj Gori</p>	<p>Zavod za transfuziju krvi</p>	<p>Planirana sredstva 18.400€</p> <p>Utrošena sredstva 200€</p> <p>+</p> <p>9.650€ (utrošena sredstva za pomoć u realizaciji 32 akcije ddk u 17 opština)</p>	<p>Budžet/CKCG</p>	
		<p><b>43.3</b> Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster, promotivna kampanja, obuka motivatora u oblasti ddk...)</p>	<p><b>43.3</b> Izrađen promotivni materijal</p>	<p>*Realizovano Izrađeni flajeri, privjesci I pokloni za učesnike u akciji dobrovoljnog davanja krvi</p>		<p>Planirana sredstva 4.000€</p> <p>Dostavljeno da su utrošena redovna sredstva bez detalja o istim</p>	<p>Budžet/CKCG</p>	

44.	<b>Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije</b>	<p>44.1 Orga-nizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština.</p> <p>44.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.</p> <p>44.3 Anga-žovanje tima predavača.</p> <p>44.4 Realiza-cija radionica i procjena uspješnosti.</p>	<p>44.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice)</p> <p>44.2 Izabrane škole</p> <p>44.3 Angažo-vani predavači</p> <p>44.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Nisu realizovane radionice za osnovce i srednjoškolce. Obrazloženje nije dostavljeno</p>	<p>Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija / Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)</p>	Planirana sredstva 500€	Budžet /CKCG	<p>** <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>
45.	<b>Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije</b>	45.1 Realizo-vati 4 radionice za djecu i odrasle RE poulacije.	45. Organizovano najmanje 8 radionica za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori	*Nerealizovano Nisu realizovane radionice. Razlozi nijesu dostavljeni	<p>Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta / Ministarstvo zdravlja (škole,</p>	Planirana sredstva 600€	Budžet/CKC G	<p>** <u>Odgovornije i utemeljenije planirati finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti.</u></p>

		45.2 Realizovati najmanje 4 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica sa statusom zaštite		*Nerealizovano	domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)			<u>Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u>
46.	<b>Radionice psihosocijalne podrške (PSP) za pomagače</b>	46.1 Organizovati 3 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština.	46.1 Organizovane 3 radionice za pomagače. ( Najmanje 60 pomagača pohađalo radionicu na temu psihosocijalne podrške)	*Realizovano Organizovana ukupno dva ttridnevna treninga na temu PSP u kriznim situacijama. Organizovana je jedna radionica za 16 pripadnika službi zaštite i spašavanja iz Bara, Andrijevice, Budve i Tivta. Treninzima je obuhvaćeno 60 volontera i zaposlenih u CKCG. Učesnici su bili iz OOCK: Bar, Budva, Herceg Novi, Nikšić, Kolašin, Rožaje, Berane, Bijelo Polje, i Prijestonica Cetinje.	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / UNHCR	Planirana sredstva 1.000€  Utrošena sredstva 5.000€ po obuci Ukupno 10.000€	Budžet/CKC G  Sredstva iz projekta	/

		46.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice.	46.2 Izvršena selekcija pomagača	*Realizovano				
		46.3 Angažovanje predavača.	46.3 Angažovani predavači	*Realizovano				
		46.4 Realizacija radionica i procjena uspjehnosti.	46.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji način prevazilaženja profesionalnog stresa.	*Realizovano				
		46.5 Organizovanje 4 radionice za pomagače – volontere CKCG	46.5 Organizovane 4 radionice za pomagače-volontere CKCG. Najmanje 60 pomagača pohađalo radionice.	*Realizovano Organizovane su 4 obuke za volontere. Učesnici su bili volonteri sa teitorije Glavnog grada.		Planirana sredstva 3.000€  Nisu utrošena finansijska sredstva. Korišćen je postojeći material za rad		
47.	Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći	47.1 Dva treninga za instruktore prve pomoći	47.1 40 instruktora prve pomoći	*Nerealizovano Ove obuke nisu organizovane zbog situacije sa COVID-19	Crveni krst CG / Lokalne organizacije Crvenog krsta / Vrtići /	Planirana sredstva 8.000€	Budžet	*Organizovati predložene obuke
		47.2 Obuka u vrtićima, osnovnim	47.2 Najviše 5000 osoba	*Realizovano		Planirana sredstva 4.000€	Budžet	/

	i srednjim školama i fakultetima	edukovanih za pružanje prve pomoći	Organizovano je 7 predavanja za učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola (Bar, Budva, Ulcinj, Podgorica)	Osnovne škole / Srednje škole / Fakulteti	Utrošena sredstva 2.000 €		
	47.3 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou	47.3 Najmanje 4000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći	*Nerealizovano		Planirana sredstva 5.000€	Budžet	*Organizovati takmičenje
	47.4 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći	47.4 Oko 600 učesnika učestvovalo na državnom takmičenju	*Nerealizovano		Planirana sredstva 15.000€	Budžet	*Organizovati takmičenje
	47.5 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama	47.5 Najmanje 5000 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći	*Realizovano 923 osobe završile osnovni kurs, a 147 resetifikaciju		Planirana sredstva / Utrošena sredstva 2.000€	Budžet	/
	47.6 Obuka za članove sanitetskih timova na lokalnom nivou	47.6 Najmanje 50 osoba u 10 lokalnih organizacija CK edukovano za pružanje prve pomoći	*Nerealizovano Podaci nijesu dostavljeni		Planirna sredstva 1.500 €	Budžet	/
	47.7 Orga-nizovanje pokaznih vježbi prve pomoći	47.7 Organizovano najmanje 10 pokaznih vježbi u kojima je učestvovalo oko 300	*Realizovano 1800 osoba odslušalo predavanja prve pomoći		Planirna sredstva 1.500 €  Utrošena sredstva	Budžet	/

			učesnika/spasilaca			3.000 €		
		47.8 Izrada promotivnog materijala	47.8 Preko 10000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala	*Realizovano Kroz obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći i preko društvenih mreža 10.000 osoba upoznato je sa značajem prve pomoći		Planirana sredstva 3.000€  Utrošena sredstva 2.000 €	Budžet	/
49.	Uspostavljanje posebnog (Remote) sistema na obali (južni Jadran) za automatski meteorološki monitoring i online platforme za kretanje meteoroloških sistema za potrebe pomorsko-privredno-turističke sigurnosti u regionu južnog Jadrana i obalnom dijelu	49.1 Formiranje radne grupe  49.2 Izrada Elaborata  49.3 Priprema tendera  49.4 Priprema lokacije  49.5 Nabavka i instalacija  49.6 Obuka meteorologa za prognozu	49.1 Formirana radna grupa  49.2 Izrađen Elaborat  49.3 Pripremljen tender  49.4 Pripremljene lokacije  49.5 Izvršena nabavka i instalacija  49.6 Obučeni meteorolozi	*Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku  *Realizacija u toku U toku je izrada elaborate kao strateškog dokumenta za realizaciju ove složene aktivnosti. Procedura je u toku preko UNDP-a	ZHMS / Uprava pomorske sigurnosti Bar	Planirna sredstva 950.000€  Planirana sredstva za eksperte za izradu elaborate kompletno za Early Warning System koji će obuhvatiti i ovu aktivnost 15.000\$	Budžet Projekti-Donacije	<u>*Zaokružiti proces realizacije aktivnosti</u>

50.	Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava	/	50. Izrađene mape opasnosti i mape rizika od poplava	*Realizacija u toku Finalni nacrt mapa rizika od poplava je dostavljen institucijama od strane konsultanata u novembru 2023. godine	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za upravljanje vodama Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirna sredstva 125.000€  Utrošena sredstva 125.000€	Projekat IPA 2016 - IPA II (IPA 2014 - 2020) „Podrška implementacij i i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“	/
51.	Izrada planova upravljanja rizikom od poplava	/	51. Izrađeni planovi upravljanja rizikom od poplava	*Realizacija u toku Pripremljeni su nacrti za oba vodna područja koja moraju proći javnu raspravu i biti usvojeni u 2024. godini	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za upravljanje vodama Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	Planirna sredstva 155.000€  Utrošena sredstva 155.000€	Projekat IPA 2016 - IPA II (IPA 2014 - 2020) „Podrška implementacij i i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“	/
52.	Obuka timova za utvrđivanje procjene štete nakon	52.1 Analiza postojeće prakse u procjeni štete i brze	52.1 Izrađena analiza	*Nerealizovano	Građevinski fakultet		Budžet	<u>Odgovornije i utemeljenije planirati</u>



	<p><b>zemljotresa. Obuka timova za brzu procjenu sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa.</b></p>	<p>procjene sigurnosti objekata nakon zemljotresa u zemljama okruženja i šire (dodatno organizovanje okruglih stolova sa eksternim ekspertima)</p> <p><b>52.2</b> Izrada studije za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa sa priručnikom i obrascima</p> <p><b>52.3</b> Izrada studije za brzu procjenu sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa sa priručnikom i obrascima</p>	<p><b>52.2</b> Izrađen priručnik</p> <p><b>52.3</b> Izrađena studija</p>	<p>*Nerealizovano</p> <p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava</p>		<p>Planirana sredstva 50.000€</p> <p>Planirana sredstva 50.000€</p>	Budžet	<p><u>finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja</u></p>
53.	<p><b>Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi.</b></p>	<p><b>53.</b> Izrada tehničkog pravilnika o tipovima ekstremnih situacija i SOP sa metodologijom za njihovo prepoznavanje, rane najave i izveštavanje</p>	<p><b>53.</b> Izrađen Pravilnik sa SOP</p>	<p>*Realizacija u toku Razmatra se da li se izradom pravilnika treba regulisati Zakonom o izgradnji planiranju prostora i izgradnji objekata</p>	<p>Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p>	<p>Planirana sredstva 3.500€</p>	Budžet	<p>* Pravilnik regulisati Zakonom o izgradnji planiranju prostora i izgradnji objekata</p>

54.	<b>Izrada Pravilnika za implementaciju meteoroloških podloga-inputa sa procjenom rizika od nesreće-katastrofe, prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije, kao obaveza obrađivača-projektanta.</b>	54. Izrada Nacrta Pravilnika	54. Izrađen Pravilnik	*Realizacija u toku Razmatra se da li se izrada pravilnika treba regulisati Zakonom o izgradnji planiranju prostora i izgradnji objekata	Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Planirana sredstva 3.500€	Budžet	* <u>Pravilnik regulisati Zakonom o izgradnji planiranju prostora i izgradnji objekata</u>
55.	<b>Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: -Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese.</b>	55. Nabavka akcelerometara	55. Dalje proširenje mreže akcelerometara. Instalirana 1 dodatna stanica.	*Realizacija u toku Formirana je nova akcelerometrijska stanica Žabljak	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Planirana sredstva 10.000€  Utrošena sredstva 2.000€	Budžet /projekti	* <u>Širiti mrežu profesionalnih akcelerometara radi pune implementacije nabavljenih softvera koji kreiraju GIS karte uticaja</u>
56.	<b>Izrada analize seizmičkog rizika u sklopu Plana generalne regulacije Crne Gore</b>	56.1 Priprema mapa seizmičkog hazarda kao osnov ulaza za analizu seizmičkog rizika	56.1 Pripremljene mape seizmičkog hazarda	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Građevinski fakultet		Budžet	* <u>Za realizaciju ove aktivnosti odnosno podaktivnosti potrebno je obezbijediti finansijska sredstva. Preporuka je da se ova sredstva planiraju budžetom Vlade</u>
		56.2 Analiza mapa seizmičkog hazarda za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine	56.2 Izrađena analiza	*Nerealizovano			Budžet	
		56.3 Analiza podataka o gustini naseljenosti na teritoriji Crne Gore	56.3 Izrađena analiza	*Nerealizovano			Budžet	

		<b>56.4</b> Izrada analize potrebne za prikupljanje podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima)-metodološki okvir	<b>56.4</b> Izrađena analiza	*Nerealizovano			Budžet	
		<b>56.5</b> Podloge za izradu baze podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima) za za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine	<b>56.5</b> Pripremljene podloge	*Nerealizovano			Budžet	
		<b>56.6</b> Analize vulnerabiliteta izgrađene sredine – metodološki okvir	<b>56.6</b> Izrađena analiza	*Nerealizovano		Planirana sredstva 40.000€	Budžet	
		<b>56.7</b> Analiza Seizmičkog rizika	<b>56.7</b> Izrađena analiza	*Nerealizovano		Planirana sredstva 20.000€	Budžet	

## 4. NALAZI EVALUACIJE

### 1. Zaključci o glavnim nalazima

Nakon implementacije Strategije za smanjenje rizik od katastrofa 2018-2023. godina, izvršena je eksterna evaluacija, čiji su rezultati sastavni dio Završnog izvještaja o implementaciji Strategije. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje je uz podršku Kancelarije UNDP-a, angažovao eksperta, koji je, kao nezavisni evaluator, sačinio Finalnu (ex-post) evaluaciju sprovođenja Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2018-2023. Evaluacija je sprovedena u periodu februar-maj 2024. godine.

U nastavku slijedi rezime nalaza evaluacije:

Proces planiranja Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2023. je bio inkluzivan, participativan i oslonjen na relevantne međunarodne i nacionalne strateške i normativne okvire. Proces je uključio veliki broj relevantnih stejkholdera na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i predstavnike akademskog sektora i međunarodnih organizacija. Po mišljenu sagovornika dubinskih intervjua, tokom procesa implementacije su mogli biti uključeni i predstavnici nevladinog sektora i medija, čija bi uloga bila edukacija, promocija i precizno informisanje građana o aktivnostima obuhvaćenih Strategijom.

Glavni izazov u fazi pripreme Strategije je bilo nepostojanje smjernica za planiranje strateških dokumenata, što se odrazilo na strukturu i jasnoću planskog dokumenta, te otežalo i proces implementacije. Donošenjem *Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata*, Generalni sekretarijat Vlade je zahtijevao reviziju Strategije, uvođenjem Dinamičkog plana aktivnosti (DPA), koji je trebalo da da pregled operativnog plana, na osnovu kojeg bi se dalje razvijali akcioni planovi na dvogodišnjem nivou. Ključni nedostaci DPA, koji se odrazio i na AP-ove, je nejasna logika intervencije, kao i nedefinisani mjerljivi indikatori, koji bi poslužili u monitoringu/ praćenju progressa implementacije i evaluacije. Dodatno, u fazi planiranja Strategije nijesu formulisane pretpostavke za izvodljivost određenih aktivnosti, što je rezultiralo nemogućnošću da se određene aktivnosti sprovedu zbog ograničenja u normativnom okviru i u tehničkim kapacitetima pojedinačnih institucija.

Takođe, dokument nije predvidio pristup u monitoringu i evaluaciji Strategije, niti su uspostavljeni mehanizmi nadzora i kontrole tokom faze implementacije. Nedostatak operativnih i nadzornih tijela je dodatno otežao proces implementacije, budući da je Direktorat sam nosio odgovornost za praćenje i nadzor, te u svojim kapacitetima rješavao brojne izazove koji su nastali tokom perioda sprovođenja Strategije.

Ključne prepreke tokom faze implementacije su se odnosile na nemogućnost finansiranja određenih aktivnosti i nedostatak odgovornosti i vlasništva nad rezultatima koji su u nadležnosti uključenih institucija, kao i politička nestabilnost u proteklom periodu, koja je uticala na kadrovske promjene, te gubitak institucionalne memorije i institucionalnih kapaciteta. Dodatno, iako je veliki broj intervjuisanih sagovornika istakao da se implementacijom Strategije unaprijedila međuinstitucionalna saradnja i komunikacija, u pojedinačnim slučajevima je to predstavljalo izazov. Na centralnom nivou, promjena vlasti je uzrokovala promjenu matičnih institucija određenih aktera u Strategiji (Zavod za geološka istraživanja), što je zbog nepreciznog normativnog okvira dodatno uticalo na nerazjašnjene

nadležnosti ove institucije, te je onemogućilo da direktno bude uključena u implementaciju u mjeri u kojoj je to predviđeno Strategijom. Političke promjene su imale uticaj i na lokalnom nivou, konkretno u dijelu aktivnosti za koje su bile zadužene lokalne službe zaštite i spašavanja, koje su pod ingerencijom lokalnih samouprava. Po mišljenju sagovornika intervjua, politička zapošljavanja i odliv stručnog kadra dovode do nerazumijevanja obaveza i nedostatka odgovornosti za aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, što se dodatno odrazilo na visok broj nerealizovanih aktivnosti.

Pored navedenih izazova i prepreka, kašnjenja u implementaciji su djelimično uzrokovana i pandemijom koronavirusa, kao i sajber napadima, koji su ograničili uključene institucije da ažurno sprovedu planirane aktivnosti i o tome izvijeste Direktorat. Direktorat je često dobijao neprecizne podatke tokom izvještajnog perioda, posebno u dijelu koji se odnosi na finansijsko izvještavanje, zbog čega je iznos ukupnih utrošenih sredstava za sprovođenje aktivnosti Strategije okviran i po mišljenju službenika Direktorata nije konačan.

Sa druge strane, Strategija je i uspostavila pojedine dobre prakse, prije svega u polju promocije i edukacije građana, te uključivanjem tema zaštite i spašavanja u nastavni program i pilotiranjem tih predmeta u pet škola. Takođe, dodatna vrijednost Strategije se ogleda i u unapređenju horizontalne saradnje, preciznije povezivanjem institucija koje do implementacije Strategije nijesu imale priliku da komuniciraju i blisko sarađuju. Dodatno, u okviru Strategije su donešena i dva važna dokumenta - *Procjena rizika od katastrofa* i *Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa*, što predstavlja važan osnov za implementaciju daljih aktivnosti u ovoj oblasti.

Konačno, treba imati u vidu da se DRR Strategija sprovodila po prvi put u Crnoj Gori. Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a je, kao glavni nosilac Strategije, imao težak zadatak po pitanju koordinacije brojnih stejkholdera i aktivnosti, gdje je, po mišljenju gotovo svih ispitanika intervjua, nerijetko premašivao svoje odgovornosti i kapacitete. Direktorat je uspio da poveže institucije na centralnom i lokalnom nivou i u saradnji sa njima, i pored brojnih brojnih internih i eksternih izazova, postigne 51% realizacije planiranih aktivnosti. Time je osiguran zamah za planiranje naredne DRR Strategije, čija neupitna relevantnost predstavlja krucijalan okvir za njen nastavak i, u odnosu na primjenu naučenih lekcija, efikasniju pripremu i implementaciju za naredni šestogodišnji period.

## **2. Naučene lekcije**

Iz Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2023. može se izvući nekoliko naučenih lekcija.

Prije svega, priprema Strategije u skladu sa *Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata* će unaprijediti proces planiranja i izrade, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje ciljeva, rezultata i aktivnosti, njihove povezanosti, kao i definisanje SMART indikatora u Strategiji i Akcionim planovima i načinima njihovog mjerenja. U fazi pripreme Strategije imperativ je i preispitivanje pretpostavki i preduslova za sprovođenje predloženih aktivnosti. Iskustva iz implementacije ove Strategije ukazuju na to da veliki broj predloženih aktivnosti nije bio izvodljiv, zbog normativnih, finansijskih i tehničkih ograničenja. Takođe, okvirno i neutemeljeno predlaganje sredstava za finansiranje predloženih aktivnosti se pokazalo kao neefikasno, zbog čega je preciznija procjena potrebnih sredstava, u skladu

sa finansijskim kapacitetima uključenih institucija, neophodna za uspješnije rezultate naredne Strategije.

Dodatno, utvrđivanje i adekvatna podjela uloga za aktivnosti koje su u nadležnostima različitih zainteresovanih strana, te uspostavljanje mehanizama za jačanje odgovornosti institucija uključenih u implementaciju će osigurati adekvatno vlasništvo nad rezultatima. Nalazi evaluacije su ukazali na to da nosioci aktivnosti nijesu pokazali adekvatan nivo odgovornosti za aktivnosti svojih institucija koje su obuhvaćene Strategijom. Premda je glavni nosilac DRR Strategije, Direktoratu ne bi trebalo da pripada odgovornost za uspješnost realizacije aktivnosti koje su u nadležnosti drugih uključenih institucija, posebno imajući u vidu činjenicu da Direktorat nema mandat za kontrolu i nadzor.

U tom smislu, previđanjem uspostavljanja operativnih i nadzornih tijela, sa mandatom za praćenje i kontrolu, bi se utvrdili i osigurali nadzorni i monitoring mehanizmi koji bi pojačali uloge i odgovornosti uključenih institucija tokom perioda implementacije Strategije. Redovnim sastajanjem ovih tijela bi se, takođe, unaprijedila komunikacija sa nosiocima aktivnosti, osigurala precizna i pravovremena razmjena informacija, kao i upravljanje novonastalim rizicima kroz unaprijed ustanovljene mjere mitigacije. Dodatno, kreiranjem jasnog plana za monitoring i evaluaciju bi se utvrdili i načini i obaveze blagovremenog i tačnog izvještavanja o sprovedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima.

Pored toga, jače učešće donosilaca odluka/rukovodilaca u institucijama i organizacijama koje učestvuju u Strategiji bi dalo veći prioritet implementaciji, praćenju i komunikacionim aktivnostima i na kraju povećalo vjerovatnoću institucionalne održivosti i održivosti na nivou politika. Dobre prakse Strategije se odnose na promociju, edukaciju i informisanje građana, gdje bi pored obrazovnih institucija, u narednoj Strategiji važnu ulogu imali i mediji i nevladin sektor. Ovo je posebno važno imajući u vidu socio-političku komponentu i javni interes koji proizilazi iz Strategije, a koji se tiče zaštite zdravlja i sigurnosti građana.

Konačno, pored toga što nalazi ukazuju na niske finansijske i kadrovske kapacitete pojedinih uključenih institucija, kapaciteti za identifikovanje i korišćenje drugih izvora finansiranja, kao što su donatorski projekti (EU, UN, EBRD, Svjetska banka, itd) nijesu u dovoljnoj mjeri razvijeni. Pojedine institucije, posebno lokalne samouprave, su u određenoj mjeri koristile sredstva iz EU fondova za implementaciju aktivnosti. Međutim, imajući u vidu da finansiranje predstavlja najveći izazov za uspješnost DRR Strategije, neophodno je dodatno unaprijediti kapacitete uključenih institucija za korišćenje sredstava iz alternativnih izvora finansiranja.

## 5. OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sprovođenje aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa finansirane su iz budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i drugih međunarodnih organizacija, kao i iz drugih izvora. Ukupna vrijednost **Dinamičkog plana aktivnosti** za sprovođenje strategije za period 2018-2023. godina bila je **33.887.670,00 eura**. Za realizaciju tri dvogodišnja akciona plana, u proteklom šestogodišnjem periodu, nosioci aktivnosti **su isplanirali ukupan iznos od 31.364.164,57 eura**, od čega je utrošeno oko **cc 7.445.141,28 eura**.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Prilikom izvještavanja za prvi dvogodišnji Akcioni plan, nijesu obrađivana utrošena finansijska sredstva, te u krajnjem računu imamo ukupan iznos utrošenih sredstava za dva dvogodišnja akciona plana.

**Za sprovođenje prvog Akcionog plana za period 2018 i 2019. godinu nosioci aktivnosti su isplanirali ukupna finansijska sredstva u iznosu od 12.262.164,57 eura.** Podaci o utrošenim sredstvima za prve dvije godine realizacije ovog dokumenta nijesu dostavljani i obrađivani.

Za drugi po redu Akcioni plan za period 2020 i 2021. godinu neophodno je bilo obezbijediti finansijska sredstva u iznosu **od 6.102.000,00 eura od čega je utrošeno cc 3.876.972,09 eura, od toga opštine su utrošile cc 45.900,00 eura.** Na osnovu dostavljenih izvještaja u 2020. godini utrošeno je 2.429.529,36 eura, od toga, opštine su utrošile svega 7.500 eura.<sup>5</sup> U 2021. godinu utrošeno je ukupno 1.417.442,73 eura<sup>6</sup> od čega je iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno cca 975.670,00 eura.<sup>7</sup> Jedinice lokalnih samouprava su i u ovoj godini utrošile svega 38.400 eura.

Za sprovođenje poslednjeg dvogodišnjeg Akcionog plana za period 2022-2023. godinu neophodno je bilo obezbijediti finansijska sredstva u iznosu od cca **13.000.000,00 eura od čega je utrošeno cc 3.568.161,19 eura, od toga opštine su utrošile cc 67.400,00 eura.** Na osnovu dostavljenih izvještaja u 2022. godini utrošeno je 1.076.182,57 eura.<sup>8</sup> U 2022. godini iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno je cca 398.240,28 eura. Jedinice lokalnih samouprava su u 2022. godini utrošile svega 20.600 eura.

Na osnovu dostavljenih izvještaja u 2023. godini utrošeno je 2.491.978,62 eura. U 2023. godini iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno je cca 2.150.146,16 eura. Jedinice lokalnih samouprava su u prethodnoj godini utrošile 46.800 eura.<sup>9</sup>

Na osnovu raspoloživih podataka o izvorima finansiranja za poslednje tri izvještajne godine, ukupno je iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno cca 3.524.056,44 eura.

## 6. PREPORUKE ZA NAREDNI CIKLUS PLANIRANJA POLITIKA

Na osnovu ukupnog procesa evaluacije, mogu se dati sljedeće **opšte preporuke**:

1. Strategiju je neophodno izraditi sa u skladu sa *Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata*, vodeći računa o povezanosti ciljeva, rezultata i aktivnosti, kao i pretpostavki za njihovo realizovanje; Dodatno, neophodno je ustanoviti

<sup>5</sup> Utrošena sredstva za izradu izvještaja za 2020. godinu nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: 9.22; 9.25; 15.1; 15.2; 15.3; 18.3a; 27; 30; 38.1; 50;

<sup>6</sup> Utrošena sredstva za izradu izvještaja za 2021. godinu nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: 5.3; 9.22; 15.1; 16; 18.3; 34; 53;

<sup>7</sup> Podaci o izvorima finansiranja, nijesu obrađivani i dostavljani za izvještajne godine 2018, 2019 i 2020.

<sup>8</sup> Utrošena sredstva za izradu izvještaja za 2022. godinu nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: 3.6; 3.13; 3.13; 5.7; 8.5; 8.23; 8.29; 8.30; 14.1; 14.2; 14.3; 19.1; 22; 23; 26; 30; 32.2; 34; 38.3; 39; 42; 49 i 50

<sup>9</sup> Utrošena sredstva za izradu izvještaja za 2023. godinu nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: 5.7; 5.18; 8.19; 8.30; 14.1; 14.2; 14.3; 16; 22.1; 23.3; 36; 43.1; 43.3;.

mjerljive indkatore u skladu sa SMART kriterijumima, sa početnim i očekivanim vrijednostima, kao i načinima mjerenja njihovih postignuća periodično i na kraju implementacije;

2. Strategija treba da obuhvati planove upravljanja rizicima, sa identifikovanim mjerama mitigacije. Strategija bi, takođe, trebalo da predloži i detaljan plan monitoringa i evaluacije, uz preciziran način na koji se ovi procesi sprovode;

3. Za narednu Strategiju bi bilo korisno uspostavljanje operativnog (upravljačkog) tijela i nadzornog (kontrolnog) tijela, sa utvrđenim mandatom, načinom odabira članova/predstavnika u ovim tijelima i načinom funkcionisanja. Operativno tijelo bi trebalo da sadrži predstavnike svih institucija uključenih u implementaciju Strategije, čija bi uloga bila monitoring i diskusija o tekućim aktivnostima, i usvajanje izvještaja akcionih planova. U nadzornom tijelu bi trebalo da budu članovi koji predstavljaju visoko rukovodni kadar u određenim institucijama i donosioci odluka, čija bi uloga bila kontrolna i konsultativna u odnosu na novonastale rizike, kao i usvajanje preporuka za unapređenje implementacije;

4. U cilju efektivnije implementacije neophodna je proaktivnija uloga svih uključenih institucija na centralnom i lokalnom nivou. Na lokalnom nivou je neophodno donošenje lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa i drugih povezanih dokumenta, kao i uključivanje lokalnih službi zaštite i spašavanja u proces planiranja i oslanjanje na podatke *sa terena*;

5. U smislu unapređenja tehničkih kapaciteta, neophodna je kontrinuirana edukacija kadrova, nabavka nedostajuće opreme neophodne za implementaciju planiranih aktivnosti, uspostavljanje i funkcionisanje relevantnih i ažuriranih baza podataka i drugih sistema koji će institucijama i građanima obezbijediti brzu i laku dostupnost podacima i informacijama;

6. Obezbeđivanje normativnih preduslova za sprovođenje aktivnosti planiranih Strategijom predlaganjem izmjena i /ili dopuna normativnih akata, kako u smislu preciziranja nadležnosti uključenih institucija, tako i u smislu obezbeđivanja ostalih preduslova za nesmetanu implementaciju, ili unapređenje preduslova za planiranje budućih Strategija za smanjenje rizika od katastrofa;

7. Uvezivanje Strategije sa drugim relevantnim programima i projektima na nacionalnom i lokalnom nivou, prije svega sa projektima koji doprinose ispunjenju ciljeva utvrđenih Strategijom, te stvaranje sinergije sa intervencijama u oblasti klimatskih promjena, kao što je Nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene, i drugim sličnim projektima. Pored oblasti klimatskih promjena, potrebno je obratiti pažnju i na rodnu ravnopravnost, što je takođe prepoznato kao povezana oblast;

8. Za narednu Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa imperativ je odgovornije i utemeljenije finansijsko planiranje u odnosu na finansijske kapacitete i prioritete uključenih institucija. Predlaganje sredstava za planirane aktivnosti treba da bude opravdano i izvodljivo, a izvještavanje blagovremeno i precizno. Nedostatak finansijskih sredstava za predložene aktivnosti bi se mogao nadoknaditi iz alternativnih izvora finansiranja i fondova koji su trenutno na raspolaganju Crnoj Gori. U tom smislu je potrebno unapređenje kapaciteta za pristup i upravljanje sredstvima koja se dodjeljuju kroz donatorske projekte, sa posebnim naglaskom na EU fondove, ali i druge dostupne izvore bespovratnog finansiranja;

9. Konačno, u cilju unapređenja međuinstitucionalne saradnje i komunikacije, kao i komunikacije sa građanima i medijima, bilo bi potrebno izraditi i Komunikacioni plan za Strategiju. Pored predlaganja načina za internu i eksternu komunikaciju, Komunikacionim



planom bi se predvidjele i određene promotivne, informativne i edukativne aktivnosti, gdje bi pored medija važni stejkholderi bili i obrazovne institucije i nevladin sektor.

### **SPECIFIČNE PREPORUKE**

**Ministarstvo unutrašnjih poslova** - smatra se neophodnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova planira, realizuje i opredijeli adekvatna finansijska sredstva neophodna za sprovođenje sledećih aktivnosti: nabavku opreme i sredstava zaštite i spašavanja od zemljotresa; nabavka protivpožarnih aviona; formiranje, obučavanje i opremanje jedinica civilne zaštite; izradu i donešenje Odluke o obezbjeđivanju materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja; sprovođenje aktivnosti na temu podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa kod donosilaca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou; nastaviti sa potpisivanjem ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja; izraditi i donijeti jedinstvenu metodologiju za procjenu šteta, gubitaka i potreba; izraditi i donijeti nedostajuću pravnu regulativu; pravno zaokružiti uspostavljanje Nacionalnog trening centra, itd.

**Ministarstvo vanjskih poslova** - obzirom na činjenicu da je Ministarstvo vanjskih poslova izradilo Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći koji je značajan dio zakonske regulative u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, preporučuje se da nakon usvajanja Zakona, pristupi uspostavljanju sistema međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći.

**Ministarstvo odbrane** – jača tehničke i administrativne kapacitete 3. misije Vojske Crne Gore. Nastavi sa obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koji su vezani za samnjenje rizika od katastrofa (civilno – vojni odnosi CMR, CMI, civilno-vojna saradnja CIMIC, civilno – vojno planiranje u vanrednim situacijama CMEP, aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara).

**Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju** – da planira i realizuje sledeće aktivnosti: Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija, Usvajanje Zakona o seizmološkim poslovima; Nastavi sa obukama meteorologa/škinja za primjenu mašinskog učenja i vještačke inteligencije u meteorologiji; Uspostavi posebni (Remote) sistema na obali (južni Jadran) za automatski meteorološki monitoring i online platforme za kretanje meteoroloških sistema za potrebe pomorsko-privredno-turističke sigurnosti u regionu južnog Jadrana i obalnom dijelu; Ojača tehničke kapacitete seizmičkog monitoringa - širenje mreže permanentnih GPS stanica, Tehničko-tehnološko opremanje - nabavka meteorološkog radara i edukacija meteorologa za korišćenje radara i praćenje meteoroloških sistema za Nowcasting prognoze, itd.

**Uprava za vode** – nastavi sa izradom projektne dokumentacije u cilju zaštite od štetnog dejstva voda (poplava); Usvaji i ažurira Planova upravljanja rizicima od poplava;

**JP Nacionalni parkovi** - zaokruži sistema video nadzora u nacionalnim parkovima.

**JU Zavod za geološka istraživanja** – Izradi kartu vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta 1:200.000; Izradi kartu vjerovatnoća pojavljivanja debrijskih tokova 1:200.000; izradi kartu aktivnih rasjeda 1:200.000; izradi seizmotektonske karte 1:200.000; izradi karte ranjivosti podzemnih voda 1:200.000; izradi karte obnovljive količine podzemnih voda 1:200.000; izradi karte raspoloživih količina podzemnih voda 1:200.000; realizuje aktivnosti vezane za proširivanje obima mikroseizmičkog zoniranja; ispitivanja potencijala likvifikacije; ojača

kadrovskih kapacitete; unaprijedi tehničko-tehnološke kapacitete uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja;

**Glavni grad, Prijestonica i opštine** – Na lokalnom nivou je nephodno donošenje lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa i drugih povezanih dokumenta, kao i uključivanje lokalnih službi zaštite i spašavanja u proces planiranja; preporučuje se da pristupe izradi opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju događanja prirodnih i drugih katastrofa, akustičkih studija radi uspostavljanja sistema javljanja i obavještavanja na lokalnom nivou kao i lokalnih procjena rizika.
