



**CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

PREDLOG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
AKCIONOG PLANA
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2021. GODINU**

Podgorica, mart 2022. godine

SADRŽAJ:

I UVOD	3
II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA u 2021. godini.....	9
III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE.....	12
IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA.....	74
V PREDLOG ZAKLJUČKA.....	75

I UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 21. decembra 2017. godine usvojila **Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina**. Strategija je izrađena u skladu sa globalnim ciljevima i prioritetima Sendai okvira i predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Sa ciljem ostvarenja prioriteta aktivnosti, kao sastavni dio Strategije izrađen je **Dinamički plan aktivnosti za period 2018-2023. godina (DPA)**. Riječ je o operativnom dokumentu, zasnovanom na principima i posvećenosti Sendai okvira, kao i prioritetima Crne Gore za period 2018-2023, a čijom će se realizacijom unaprijediti stanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, pozitivno uticati na integraciju smanjenja rizika u politike, programe i planove, dodatno osnažiti i povećati kapaciteti za rano upozoravanje, stvoriti otpornije zajednice na katastrofe i u spriječiti događanje novih rizika u Crnoj Gori.

Dinamički plan aktivnosti obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i biće detaljno razrađen kroz tri dvogodišnja akciona plana, u okviru kojih će biti utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave dužni da sprovode. Ministarstvo unutrašnjih poslova je do sada izradilo dva akciona plana: **Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018/2019 i Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021**. Sprovođenje Strategije i Akcionih planova za period 2018-2023. godine, samim tim i Akcionog plana za 2020 i 2021. godinu prati Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktor za zaštitu i spašavanje, o čemu priprema godišnje izvještaje koje Vlada Crne Gore usvaja na svojim sjednicama. **Vlada Crne Gore do sada je usvojila tri izvještaja: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2018 godinu, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2019 godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, za 2020 godinu.**

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktor za zaštitu i spašavanje sačinilo je i četvrti po redu Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, za 2021. godinu. Izvještaj obuhvata pregled realizovanih aktivnosti, odnosno podaktivnosti definisanih Akcionim planom 2020/2021, a za 2021. godine i izrađen je u saradnji sa: Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom vanjskih poslova, Upravom za šume, Upravom za vode, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavodom za školstvo, Zavodom za geološka istraživanja, Crvenim krstom Crne Gore, JP

Nacionalni parkovi, Građevinskim fakultetom UCG, Glavnim gradom Podgorica, Prijestonicom Cetinje i svim opštinama.¹ Sačinjen je u skladu sa dostavljenim izvještajima od strane nosilaca aktivnosti, te predstavlja svojevrsan pokazatelj napretka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Svi dobijeni podaci integrisani su u tabelarnu formu koja je sastavni dio ovog dokumenta.

U prethodnoj godini pratila se realizacija 52 aktivnosti, realizovano je 14 aktivnosti, u toku je realizacija 19 aktivnosti, dok nije realizovano 19 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 231 planirane u 2021. godini, realizovano je 58 podaktivnosti, u toku je realizacija 32 podaktivnosti, dok nije realizovano 141 podaktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 28% aktivnosti, da je u toku realizacija 36 % aktivnosti, te da nije realizovano 36 % aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, procentualno je realizovano 25,11 % podaktivnosti, u toku je realizacija za 13,85 % podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 61,04 % podaktivnosti.² Na grafiku niže prikazan je stepen realizacije aktivnosti Akcionog plana u 2021. godini.



¹ Nazivi nosilaca aktivnosti iz Akcioni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021, izmijenjeni su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave „Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21.


² Velika razlika u statusu realizacije aktivnosti i podaktivnosti je iz razloga što 5 aktivnosti Akcionog plana imaju 125 podaktivnosti čiji nosioci realizacije su opštine.

Kako bismo što bolje sagledali rezultate ostvarene u prethodnoj godini, na sledećem grafiku biće prikazana uspešnost realizacije aktivnosti **jedinica lokalne samouprave - opština kao najbrojnih nosilaca realizacije podaktivnosti**. Opštine su u prethodnoj godini, imale obavezu realizacije 5 aktivnosti od čega nijedna aktivnost nije u potpunosti realizovana. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 125 planiranih u 2021. godini, realizovano je svega 13 podaktivnosti, u toku je realizacija 17 podaktivnosti, dok nije realizovana 95 podaktivnost.

Na grafiku niže prikazana je ukupna realizacija podaktivnosti od strane opština u 2021. godini.




Na grafiku niže dat je prikaz realizacije podaktivnosti opština po aktivnostima u 2021. godini.

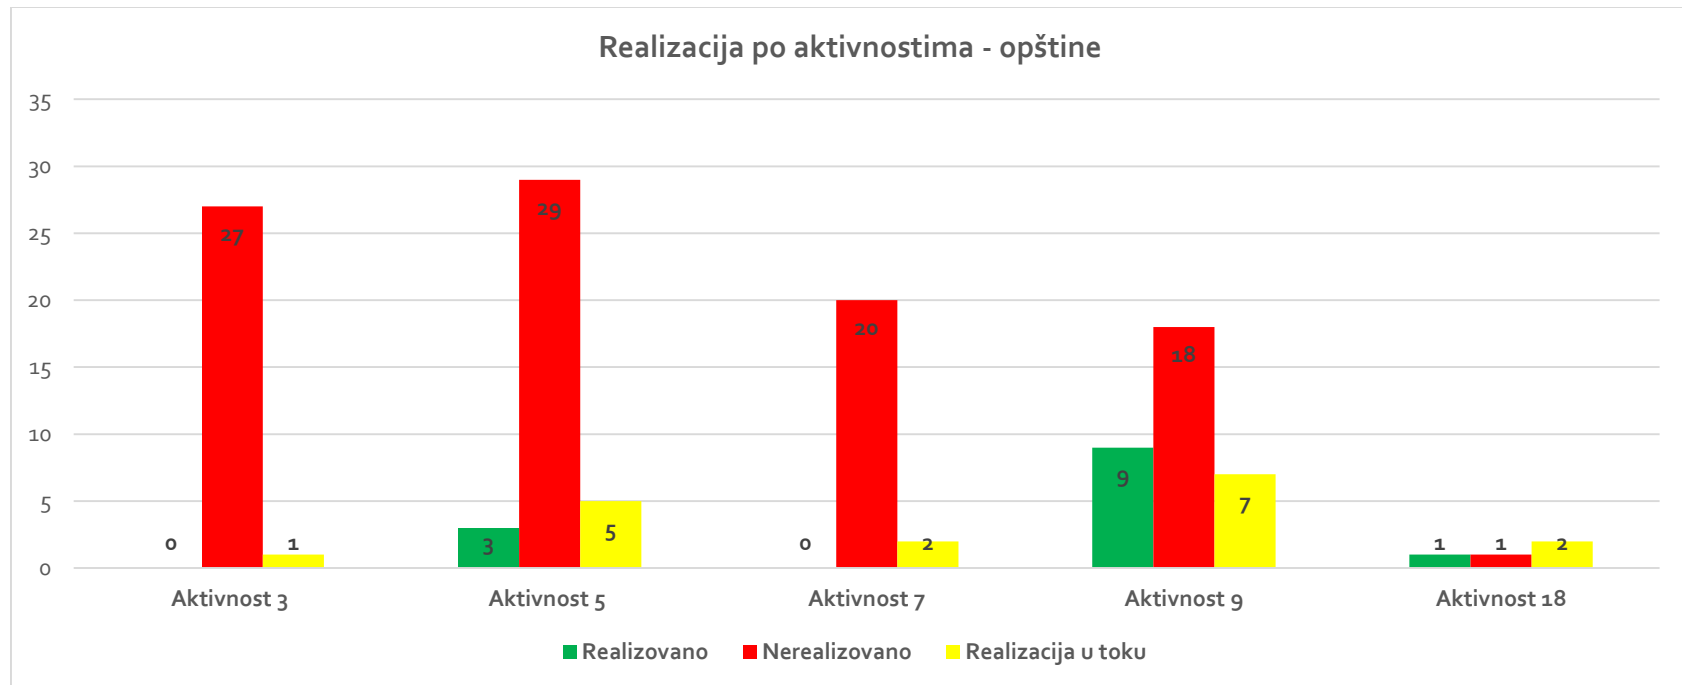

Ostali subjekti u prethodnoj godini imali su za obavezu realizaciju 47 aktivnosti od čega je 14 aktivnosti realizovano, realizacija je u toku za 17 aktivnosti, a nije realizovano 16 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 106 planiranih u 2021. godini, realizovano je 45 podaktivnosti, u toku je realizacija 15 podaktivnosti, a nije realizovano 46 podaktivnosti.

Na sledećem grafiku prikazan je status realizacije podaktivnosti od strane ostalih subjekata u 2021. godini.

Realizacija podaktivnosti ostalih subjekata

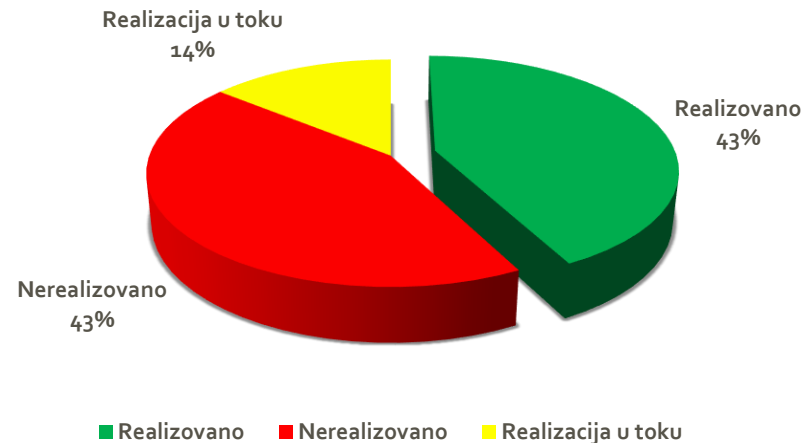

Stepen realizacije aktivnosti u 2021. godini je na niskom nivou. Kao i prethodne godine, kao glavni razlog zašto određene aktivnosti nijesu realizovane, odnosno djelimično su realizovane, nosioci aktivnosti naveli su uglavnom nedostatak finansijskih sredstava, odnosno situaciju izazvanu pandemijom COVID 19. Kada uporedimo grafik uspješnosti realizacije opština i ostalih subjekata, dolazimo da zaključka, da je manja uspješnost realizacije opština primjetna u odnosu na ostale subjekte realizacije. Takođe, opštine prednjače u prenošenju nerealizovanih aktivnosti iz godine u godinu. Posebno zabrinjava činjenica da je veoma mali broj opština izradilo, odnosno započelu izradu opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, te da pojedine opštine ovu aktivnost nijesu planirale u narednom dvogodišnjem periodu. Takođe, bitan nedostatak sistema zaštite i spašavanja odnosi se na izradu akustičkih studija i uspostavljanje sistema javljanja i obavještanja u jedinicama lokalne samouprave, što onemogućava adekvatno informisanje građana prije, tokom i nakon poplava, požara itd. U cilju implementacije obaveza preciziranih Sendai okvirom je i obaveza lokalnih samouprava da izrade strateška dokumenta za smanjenje

rizika od katastrofa na lokalnom nivou. Grafici nesumnjivo pokazuju da je i kod ove aktivnosti stepen realizacije na veoma niskom nivou, te da je u narednom dvogodišnjem periodu potrebno dodatno ukazati na značaj i važnost realizacije predviđenih aktivnosti.

Manja uspješnost realizacije aktivnosti primjetna je i kod Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva vanjskih poslova i Građevinskog fakulteta, kao i kod JP Nacionalni parkovi i Zavoda za geološka istraživanja. Poseban izazov u narednom dvogodišnjem periodu predstavljaće realizacija nekoliko aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno obezbjeđivanje materijalnih resursa za potrebe sistema zaštite i spašavanja i poboljšanje tehničke opremljenost Direktorata za zaštitu i spašavanje, odnosno obezbjeđivanje opreme i sredstava za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika, naročito zemljotresa.

Najznačajnije aktivnosti koje su realizovane tokom 2021. godine su: izrađena Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i dostavljena Evropskoj komisiji na upoznavanje – ovim dokumentom unaprijediće se stanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u našoj državi, pozitivno uticati na integraciju smanjenja rizika u politikama, programima i planovima, dodatno osnažiti i povećati kapaciteti za rano upozoravanje, te spriječiti događanje novih rizika i stvoriti otpornija zajednica na uticaj katastrofa koje će se neminovno događati u budućnosti. Usvojena su i dva nacionalna plana zaštite i spašavanja: Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona i Nacionalnog plana za zaštitu i spašavanje od hemijskih i bioloških rizika, kao i nekoliko opštinskih planova za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika. Izrađena je i preliminarna procjena rizika od poplava koja sadrži podatke o poplavama koje su se dešavale u prošlosti, a koje su imale značajnije štetne posljedice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti i predstavlja prvi korak ka izradi Planova upravljanja rizicima od poplava.

Opština Pljevalja započela je izradu lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa. Nastavljena je realizacija programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom na dječju populaciju i obrazovne ustanove. Realizovan je značajan broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara. Implementirana je operativna upotreba DASHBOARD web online profesionalne operativne platforme evropskog centra za prognozu vremena, te poboljšani tehnički kapaciteti seizmičkog monitoringa. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije i NATO-a.

Finansiranje aktivnosti vršilo se iz Budžeta Crne Gore, Budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija,

kao i iz drugih izvora. Većina aktivnosti realizovala se u dvogodišnjem periodu, a ukupan iznos finansijskih sredstava koji je planiran za sprovođenje 61 aktivnosti Akcionog plana za **period 2020 i 2021. godinu iznosio je 6.102.000,00 eura**. Na osnovu dostavljenih izvještaja u **2020. godini utrošeno je 2.429.529,36 eura dok je u 2021. godinu utrošeno ukupno 1.417.442,73 eura**. U **2021. godini iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno je cca 975.670,00 eura**. Jedinice lokalnih samouprava su u prethodnoj godini utrošile svega **38.400 eura**. Utrošena sredstva za izradu ovog izvještaja nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: **5.3; 9.22; 15.1; 16; 18.3; 34; 53;**

Detaljni podaci o planiranim i utrošenim sredstvima, kao i o izvoru finansiranja u 2021. godini nalaze se u sklopu tabele koja je sastavni dio ovog izvještaja.

II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA

Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine, usvojena je prije donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije. Iz tog razloga u prvom, drugom i trećem Izvještaju o realizaciji Akcionih planova za 2018, 2019 i 2020. godinu, kao i u ovom Izvještaju za 2021. godinu nije bilo moguće podijeliti aktivnosti u tematske grupe i podvesti ih pod strateške i operativne ciljeve jer nijesu definisani u Strategiji. Iz navedenih razloga uspješnost realizacije biće prikazana po subjektima realizacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova realizovalo je nekoliko veoma važnih aktivnosti u prethodnoj godini, između ostalih izrađen je dokument Procjena rizika od katastrofa Crne Gore. Izrađeni su i usvojeni od strane Vlade Crne Gore Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona i Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od hemijskih i bioloških rizika. Nastavljena je implementacija preuzetih obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, učestvovanje u aktivnostima i radnim tijelima Mehanizma civilne zaštite EU, kao i aktivnosti usmjerene u pravcu jačanja svijesti građana i djece na temu smanjenja rizika od katastrofa. Započete su i aktivnosti na otvaranju Nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje u Podgorici.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je članstvom u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) obezbijedilo tehničku podršku stranih eksperata u oblasti zaštite ljudi i životne sredine, te omogućilo učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama.

Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Crne Gore su u okviru godišnjih planova rada realizovali značajan broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Uprava za šume izradila je Plan sanacije šuma za šume degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca, te je u okviru planiranih aktivnosti djelimično izvršeno pošumljavanje.

Uprava za vode je kroz IPA projekat “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori” izradila preliminarnu procjenu rizika od poplava koja sadrži podatke o poplavama koje su se dešavale u prošlosti, a koje su imale značajnije štetne posljedice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti i predstavlja prvi korak ka izradi Planova upravljanja rizicima od poplava.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju realizovao je nekoliko značajnih aktivnosti u prethodnoj godini uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija, odnosno Direktorata za rudarstvo. Pripremljen je Nacrt Zakona o seizmološkim poslovima, u završnoj je fazi Nabavka softvera Sigma kao podrške seizmičkom monitoringu i analizi podataka. Uspostavljena je operativna upotreba profesionalne Dashboard platforme - Evropskog centra za prognozu vremena, kao i evidencija ekstremnih i značajnih meteoroloških situacija.

Zavod za geološka istraživanja u prethodnoj godini realizovao je veoma važne aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i validaciju podataka sa izradom projektnih zadataka, dok u periodu 2022-2026. slijedi izrada Projekta, terenska istraživanja i izrada karata podložnosti na klizanje i debratne tokova 1:200.000 i Karte odrona u Crnoj Gori.

Zavod za školstvo u saradnji sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje sprovodi međupredmetnu oblast „*Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa*“. Tokom 2021. godine izvršena je edukacija nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola u Beranama (2 seminara), Podgorici (2 seminara), Nikšiću (2 seminara) i Ulcinju (jedan seminar, a prisustvovalo je ukupno 139 nastavnika i direktora škola. Na seminarima Psihosocijalne podrške djeci/učenicima u stresnim situacijama je bilo prisutno 47 direktora, pedagoga i psihologa iz 25 vaspitno-obrazovnih ustanova iz Nikšića i Bara

Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu realizuje aktivnosti u oblasti smanjenje rizika od katastrofa koje su edukativnog karaktera, usmjerene prevashodno na dječiju populaciju. U prethodnoj godini organizovane su radionice za učenike osnovnih i srednjih škola - na temu smanjenja rizika od katastrofa i očekivanih reakcija, radionica za psiho-socijalnu podršku za zaposlene i volontere CKCG, kao i predavanja iz prve pomoći.

Opštine Ulcinj, Budva, Danilovgrad i Kolašin izradile su opštinske planove za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika. Ovi planovi su značajni iz razloga što se zaštita i spašavanje u lokalnoj zajednici sprovodi na osnovu opštinskih planova zaštite i spašavanja. Poseban korak naprijed napravila je opština Pljevlja koja je započela izradu Lokalne strategiju za smanjenje rizika od katastrofa.

TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2021. GODINU

R.b.	Aktivnosti / Ključne tačke (podaktivnosti)	Indikator uspjeha	Status realizacije / komentar	Vodeća institucija / Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Planirani rok za početak/završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Novi rok za početak/završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Planirana i utrošena sredstva	Izvor finansiranja	Preporuka-komentar	
1.	Potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja	1.1 Priprema Nacrta ugovora	1.1 Pripremljen Nacrt	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje	I 2020/IV 2021	I 2023/IV 2023	100.000€	Budžet	<u>*Potpisati ugovore sa specijalističkim jedinicama u 2021. godini.</u>	
		1.2 Utvrđivanje vrste specijalističke jedinice sa kojom treba potpisati ugovor	1.2 Definisane vrste specijalističkih jedinica							*Nerealizovano
		1.3 Potpisivanje ugovora	1.3 Potpisani ugovori							*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.
2.	Poboljšati tehničku opremljenost	2.1 Izvršiti nabavku utvrđene opreme i	2.1 Izvršena nabavka potrebne opreme i	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za	I 2020/IV 2021	I 2023/IV 2023	/		<u>*Obezbijediti potrebna finansijska sredstva</u>	

	Direktorata za zaštitu i spašavanje (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika)	sredstava za zemljotres	sredstava	nedostatka finansijskih sredstava	zaštitu i spašavanje			400.000€	Budžet	
3.	Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje)									
	3.1 Opština Ulcinj	3.1 Izrada akustičke studije	3.1 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano U CG ne postoje firme koje se bave izradom akustičke studije	Opština Ulcinj	I 2020/IV 2021	II 2022/IV 2023	6.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	3.2 Opština Bar	3.2a Formiranje radne grupe	3.2a Formirana radna grupa	*Nerealizovano	Opština Bar	I 2021/II 2021	IV 2022/IV 2022	10.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u</u>

		3.2b Izrada akustičke studije	3.2b Izrađena akustička studija	*Nerealizovano		I 2021/II 2021	IV 2023/IV 2023			<u>označenom kvartalnom periodu</u>
		3.2c Donošenje plana potreba za materijalno - tehničko opremanje	3.2c Donesen plan	*Nerealizovano U CG ne postoje firme koje se bave izradom akustičke studije		III 2021/IV 2021	IV 2023/IV 2023			
3.3 Opština Pljevlja	3.3 Izrada akustičke studije	3.3 Izrađena akustička studija	3.3 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Zbog nedostatka finansijskih sredstava	Služba zaštite i spašavanja	III 2020/IV 2021	I 2023/IV 2023	60.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.4 Opština Žabljak	3.4 Izrada akustičke studije	3.4 Izrađena akustička studija	3.4 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Opština Žabljak	IV 2021	IV 2022/I 2023	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.5 Opština Herceg Novi	3.5 Izrada akustičke studije	3.5 Izrađena akustička studija	3.5 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Herceg Novi	III 2021/IV 2021	II 2022/IV 2022	10.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.6 Opština Tivat	3.6a Izrada akustičkog elaborata	3.6a Izrađen elaborat	3.6a Izrađen elaborat	*Nerealizovano	Opština Tivat	IV 2021	I 2023/IV 2023	Predviđeno 20.000€ Sada se	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u</u>

		3.6b Nabavka opreme 3.6c Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS	3.6b Nabavljena oprema 3.6c Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena	*Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nerealizacije nijesu dostavljeni				planira 5.000€		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
3.7 Opština Bijelo Polje	3.7 Izrada akustičke studije	3.7 Izrađena akustička studija	3.7 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Nemogućnost prikupljanja ponuda i raspisivanja tendera	Opština Bijelo Polje	II 2021/IV 2021	II 2022/IV 2022	4.000€	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
3.8 Opština Andrijevica	3.8 Izrada akustičke studije	3.8 Izrađena akustička studija	3.8 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nerealizacije nijesu dostavljeni	Opština Andrijevica	II 2021/IV 2021	II 2022/IV 2022	5.000€	Budžet opštine	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
3.9 Opština Berane	3.9 Izrada akustičke studije	3.9 Izrađena akustička studija	3.9 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano U CG ne postoje firme koje se bave izradom akustičke studije	Opština Berane	I 2021 / IV 2021	II 2022/IV 2023	5.000 €	Budžet opštine	* <u>Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog</u>

										<u>koncepta i pribavljanja neophodnih informacija.</u>
3.10 Opština Budva	3.10a Formiranje radne grupe 3.10b Izrada akustičke studije 3.10c Utvrđivanje spiska opreme i sredstava za sistem obavještanja	3.10a Formirana radna grupa 3.10b Izrađena akustička studija 3.10c Utvrđen spisak opreme	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Na samom početku realizacije, potrebna saradnja sa ostalim opštinama i DZS zbog nedostatka licence za izradu akustičke studije	Opština Budva	I 2021/ II 2021 II 2021/IV 2021 III 2021/IV2021	I 2023/ IV 2023	10.000€	Budžet opštine	* <u>Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog koncepta i pribavljanja neophodnih informacija.</u>	
3.11 Opština Mojkovac	3.11 Izrada akustične studije	3.11 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Raspisan tender, nije bilo prijava	Opština Mojkovac	I 2021/IV 2021	I 2022/IV 2023	7.000€	Budžet opštine	* <u>Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog koncepta i pribavljanja</u>	

									<u>neophodnih informacija.</u>
3.12 Opština Plužine	3.12 Izrada akustičke studije	3.12 Izrađena akustička studija	*Relizacija u toku Iz tehničkih razloga sistem obavještanja i uzbunjivanja je u prekidu	Opština Plužine	I 2021/IV 2021	I 2022/IV 2022	5.000€	Budžet opštine	* <u>Otkloniti postojeći kvar</u>
3.13 Opština Šavnik	3.13 Izrada akustičke studije	3.13 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Zbog pandemije COVID19	Opština Šavnik	II 2021/IV 2021	I 2022/IV 2022	Predviđeno 5.000€ Sada se planira 1.000€	Budžet opštine	* <u>Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.14 Opština Kotor	3.14 Izrada akustičke studije	3.14 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Zbog pandemije COVID19	Opština Kotor	I 2021/IV 2021	II 2022/IV 2022	5.000€	Budžet opštine	* <u>Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.15 Opština Kolašin	3.15a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin 3.15b Izrada akustičke studije	3.15a Pripremljen i objavljen tender 3.15b Izrađena akustička studija	*Nerealizovano U CG ne postoje firme koje se bave izradom akustičke studije	Opština Kolašin	II 2021/IV 2021 I 2021/IV 2021	I 2022/IV 2023	/ 5.000€	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>

3.16 Prijestonica Cetinje	3.16a Formiranje tenderske komisije i izbor najboljeg izvođača	3.16a Formirana komisija i izabran izvođač	*Nerealizovano	Prijestonica Cetinje	II 2021/IV 2021	II 2022/III 2022	/	Budžet prijesto nice	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	3.16b Izrada akustičke studije	3.16b Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni		II 2021/IV 2021	III 2022/ IV 2022	5.000€		
3.17 Glavni grad Podgorica	3.17a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju	3.17a Pripremljen i objavljen tender	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Glavni grad Podgorica	II 2021 /III 2021	II 2022 /III 2022	/	Budžet Glavno g grada	<u>*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti.</u>
	3.17b Izrada akustičke studije	3.17b Izrađena akustička studija			IV 2021/ IV 2021	IV 2022/ IV 2022			
	3.17c Štampanje i isticanje jedinstvenih znakova za uzbunjivanje	3.17c Izvršeno postavljanje znakova za uzbunjivanje			IV 2021/IV 2021	IV 2022/ IV 2022			
	3.17d Nabavka i postavljanje opreme i puštanje u rad	3.17d Izvršena ugradnja opreme i puštanje sistema u rad			II 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2022			

4.	Obezbjeđiva nje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke	4.1 Izrada i usvajanje Odluke	4.1 Izrađena i usvojena Odluka	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/IV 2021	I 2023/IV 2023	/	/	/
5.	Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa									
	5.1 Opština Ulcinj	5.1a Formiranje Radne grupe 5.1b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.1a Formirana Radna grupa 5.1b Izrađena Strategija	*Nerealizovano *Nerealizovano Nedostatak ekspertize u lokalnoj samoupravi	Opština Ulcinj	I 2021/II 2021	I 2022/IV 2021	Prdviđeno 20.000€ Sada se planira 10.000€	Budžet opštine	*Od <u>Direktorata za zaštitu i spašavanje zatražiti smjernice za izrdu ovog dokumenta</u>
	5.2 Opština Bar	5.2a Formiranje Radne grupe	5.2a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Bar	I 2021/II 2021	I 2022/IV 2022	10.000€	Budžet opštine	*Realizovati u označenom kvartalnom

		5.2b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.2b Izrađena Strategija	*Nerelizovano Nedostatak ekspertize u lokalnoj samoupravi		II 2021/IV 2021				<u>periodu</u>
5.3 Opština Pljevlja	5.3a Formiranje Radne grupe 5.3b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.3a Formirana Radna grupa 5.3b Izrađena Strategija	*Realizovano *Realizacija u toku	Služba zaštite i spašavanja	II 2021/II 2021 II 2021/IV 2021	I 2022/III 2022	Predviđeno 5.000€ Sada se planira 3.000€ Podaci o utršenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Nastaviti realizaciju započetih aktivnosti</u>	
5.4 Opština Rožaje	5.4 Izrada Nacrta	5.4 Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.	Opština Rožaje	IV 2021/IV 2021	III 2022/IV 2023	Predviđeno 1.000€ Sada se planira 7.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.5 Opština Žabljak	5.5a Formiranje Radne grupe 5.5b Izrada lokalne Strategije za smanjenje	5.5a Formirana Radna grupa 5.5b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije	Opština Žabljak	IV 2021/II 2022	IV 2022/I 2023	3.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	

		rizika od katasrofa		COVID - 19.						
5.6 Opština Herceg Novi	5.6a Formiranje Radne grupe 5.6b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	5.6a Formirana Radna grupa 5.6b Izrađena Strategija	*Realizovano	Opština Herceg Novi	III 2021/IV 2021	/	Planirano 5.000€ Utrošeno 400€	Budžet opštine	/	
5.7 Opština Petnjica	5.7a Formiranje Radne grupe 5.7b Izrada Nacrta 5.7c Utvrđivanje i usvajanje Strategije	5.7a Formirana Radna grupa 5.7b Izrađen Nacrt 5.7c Izrađena Strategija	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Petnjica	I 2021/IV 2021 I 2021/IV 2021 III 2021/IV 2021	I 2022/ I 2022 I 2022/ I 2022 III 2022/ III 2022	2.000€	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu	
5.8 Opština Tivat	5.8a Formiranje Radne grupe 5.8b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.8a Formirana Radna grupa 5.8b Izrađena Strategija	*Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Tivat	IV 2021	I 2023/ IV 2023	25.000€	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu	
5.9 Opština	5.9b Izrada	5.9b Izrađen	*Nerealizovano	Opština Bijelo	I 2021/	I 2023/ IV	2.000€	Budžet	*Realizovati	

	Bijelo Polje	Nacrta	Nacrt	Razlozi nijesu dostavljeni	Polje	IV2021	2023		opštine	<u>i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.10 Opština Andijevica	5.10a Formiranje Radne grupe 5.10b Izrada Nacrta 5.10c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	5.10a Formirana Radna grupa 5.10b Izrađen Nacrt 5.10c Izrađena Strategija	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andijevica	I 2021/ I 2021 IV 2021 I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2022 IV 2022 I 2022/ IV 2022	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.11 Opština Plav	5.11b Izrada Nacrta	5.11b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Plav	I 2021/ II 2021	II 2022/ IV 2023	800€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.12 Opština Berane	5.12a Formiranje Radne grupe 5.12b Izrada Nacrta 5.12c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	5.12a Formirana Radna grupa 5.12b Izrađen Nacrt 5.12c Izrađena Strategija	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog	Opština Berane	I 2021/ I 2021 I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2022 II 2022/ IV 2022	4.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>

				nedostatka finansijskih sredstava i nedostatka ekspertize						
5.13 Opština Budva	5.13a Formira- nje Radne grupe 5.13b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	5.13a Formirana Radna grupa 5.13b Izrađena Strategija	*Realizovano *Nerealizovano Procijenili na nivou lokalne samuprave da ova aktivnost nije prioritet u odnosu na ostale iz ove oblasti.	Opština Budva	I 2021/ IV 2021 I 2021/ IV 2021	/ I 2023/ IV 2023	Planirano 20.000€ Utrošeno 8.000€	Budžet opštine	<u>*Planirati ovu aktivnost u AP za 2022/2023.</u>	
5.14 Opština Plužine	5.14a Izrada Nacrta 5.14b Utvrđi- vanje predloga i usvajanje Strategije	5.14a Izrađen Nacrt 5.14b Izrađena Strategija	*Realizacija u toku *Aktivnost nije u cjelosti realizovana zbog aktuelne pandemije COVID - 19.	Opština Plužine	I 2021/ I 2021 I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	7.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.15 Opština Šavnik	5.15a Formira- nje Radne grupe 5.15b Izrada lokalne Strategije za smanjenje	5.15a Formira- na Radna grupa 5.15b Izrađena Strategija	*Realizacija u toku *Nerealizovano	Opština Šavnik	I 2021/ I 2021 I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2021	2.000€ *Bez utrošenih sredstava	Budžet opštine	<u>*Realizovati i u označenom kvartalnom periodu</u>	

		rizika od katastrofa								
		5.15c Usvajanje lokalne Strategije	5.15c Usvojena lokalna Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije u cjelosti realizovana zbog aktuelne pandemije COVID - 19.						
5.17 Opština Kolašin	5.17a Formiranje Radne grupe za izradu strategije 5.17b Izrada Nacrta strategije	5.17a Formirana Radna grupa 5.17b Izrađen Nacrt strategije		*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Opština Kolašin	I 2021/ II 2021 II 2021/ IV 2021	III 2022/ I 2023	4.000€	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
5.18 Glavni grad Podgorica	5.18a Formiranje Radne grupe za izradu strategije 5.18b Izrada Nacrta strategije 5.18c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	5.18a Formirana radna grupa 5.18b Izrađen Nacrt strategije 5.18c Izrađena Strategija		*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Glavni grad Podgorica	I 2021/ IV 2021 II 2021/ IV 2021 III 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2022 II 2022/ IV 2022 III 2022/ IV 2022	/	Budžet Glavnog grada	*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti
5.19 Opština	5.19 Izrada	5.19 Izrađena		*Nerealizovano	Opština Kotor	I 2021/ IV	II 2022/ II	5.000€	Budžet	*Realizovati

	Kotor	lokalne Strategije	Strategija	Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.		2021	2023		opštine	<u>i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
6.	Izrada Nacionalne procjene rizika od katastrofa	6.2 Izrada Nacrta	6.2 Izrađen Nacrt	*Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/ III 2021	/	Predviđeno 50.000€ Utrošeno cca 450.000€	EU Grant	/
		6.3 Utvrđivanje Predloga i usvajanje	6.3 Utvrđen predlog i usvojena Nacionalna procjena rizika od katastrofa	*Realizovano Procjena rizika od katastrofa dostavljena je Evropskoj komisiji na mišljenje						
7.	Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa <u>7.1 Opština Pljevlja</u>	7.1a Formiranje radne grupe	7.1a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Služba zaštite i spašavanja	II 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	4.500€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
		7.1b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	7.1b Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana iz dva razloga. Prvi se odnosi na izradu Nacionalne		II 2021/ IV 2021				

				procjene rizika dok je drugi vezan za pandemiju COVID 19						
<u>7.2 Opština Herceg Novi</u>	7.2a Formiranje Radne grupe 7.2b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	7.2a Formirana Radna grupa 7.2b Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano *Nerealizovano Nedostatak ekspertskog znanja na ovu temu, zahtijeva uključivanje nacionalnih i međunarodnih eksperata, nakon usvajanja Procjene rizika od katastrofa za Crnu Goru decembra mjeseca 2021. godine	Opština Herceg Novi	IV 2020/ IV 2021 IV 2020/ IV 2021	II 2022/ IV 2022	5.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>	
<u>7.3 Opština Andrijevica</u>	7.3a Formiranje Radne grupe 7.3b Izrada Nacrta 7.3c Utvrđiva-	7.3a Formirana Radna grupa 7.3b Izrađen Nacrt 7.3c Izrađena	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano	Opština Andrijevica	I 2021/ II 2021 II 2021/ IV2021 I	I 2022/ II 2022 II 2022/ IV2022 IV	4.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>	

	nje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	procjena rizika	Razlozi nerealizacije nisu dostavljeni		2021/ III 2021	2022/ IV 2022			
<u>7.4 Opština Berane</u>	7.4a Formiranje Radne grupe 7.4b Izrada Nacrta 7.4c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	7.4a Formirana Radna grupa 7.4b Izrađen Nacrt 7.4c Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Berane	I 2021/ I 2021 I 2021/ III 2021 III 2021/ IV 2021	II 2022/ II 2022 II 2022/ III 2023 III 2023/ IV 2023	5.000 €	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu
<u>7.5 Opština Plužine</u>	7.5a Formiranje Radne grupe 7.5b Izrada Nacrta 7.5c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	7.5a Formirana Radna grupa 7.5b Izrađen Nacrt 7.5c Izrađena procjena rizika	*Realizovano Realizacija u toku Realizacija u toku *Aktivnost nije u cjelosti realizovana zbog aktuelne	Opština Plužine	I 2021/ I 2021 II 2021/ IV 2021 IV 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	5.000 €	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

			pandemije COVID - 19.						
<u>7.6 Opština Kolašin</u>	7.6a Formiranje Radne grupe 7.6b Izrada procjene rizika od katastrofa 7.6c Usvajanje procjene rizika	7.6a Formirana Radna grupa 7.6b Izrađena procjena 7.6c Usvojena procjena	*Nerealizovano *Nerealizovano *Nerealizovano Planirana aktivnost nije realizovana iz razloga što su donosioci odluka na loklanom nivou smatrali da prvobitno treba izraditi lokalnu strategiju pa pristupiti izradi ovog dokumenta.	Opština Kolašin	I 2021/ I 2021 I 2021/ IV 2021 IV 2021/ IV 2021	II 2023/ IV 2023	/	/	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
<u>7.7 Opština Kotor</u>	7.7 Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika	7.7 Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.	Služba zaštite i spašavanja	II 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2022	5.000 €	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
<u>7.8 Opština Budva</u>	7.8a Formiranje Radne grupe	7.8a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Opština Budva	I 2021/ II 2021	I 2023/IV 2023	/	Budžet opštine	*Planirati ovu aktivnost u AP za

		7.8b Izrada procjene rizika od katastrofa	7.8b Izrađena procjena	*Nerealizovano Procijenili na nivou lokalne samuprave da ova aktivnost nije prioritet u odnosu na ostale iz ove oblasti.		III 2021/ IV 2021				<u>2022/2023.</u>
<u>7.9 Glavni grad Podgorica</u>	7.9a Formiranje Radne grupe	7.9a Formirana radna grupa	7.9a Formirana radna grupa	*Nerealizovano	Glavni grad Podgorica	II 2021/ II 2021	II 2022/ III 2022	/	Budžet Glavnog grada	*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti
	7.9b Izrada procjene rizika od katastrofa	7.9b Izrađen Nacrt	7.9b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano		II 2021/ IV 2021	IV 2022/ IV 2022			
	7.9c Usvajanje procjene rizika	7.9c Usvojena procjena	7.9c Usvojena procjena	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19. - Održan sastanak predstavnika Glavnog grada i Direktorata za zaštitu i spašavanje na		IV 2021/ IV 2021	IV 2022/ IV 2022			

				ovu temu, prosljeđen zahtjev za formiranje radne grupe.							
8.	Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika	8.1 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odroni	8.1 Izrađen Plan	*Realizovano Usvojila Vlada Crne Gore u II kvartalu 2022. godine	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/ I 2021		/	/	/	
		8.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika	8.2 Izrađen Plan	*Realizovano Usvojila Vlada Crne Gore u II kvartalu 2022. godine		I 2021/ I 2021					
		8.3 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od ekstremnih meteroloških pojava	8.3 Izrađen Plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.		I 2021/ IV 2021	I 2023/ IV 2023				*Precizirati naziv Nacionalnog plana
		8.4 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća	8.4 Izrađen Plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i		I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2023				*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

				pandemije COVID - 19.						
9.	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika									
	9.1 Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor	9.1a Formiranje Radne grupe 9.1b Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor	9.1a Formirana Radna grupa 9.1b Izrađen Plan	*Realizovano *Realizacija u toku	Služba zaštite i spašavanja opština Kotor	I 2021/ IV 2021 /	 I 2022/ IV 2022	5.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu
	9.2 Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi	9.2 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi	9.2 Usvojen Plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Skupština Opštine Herceg Novi	III 2021/ III 2021	II 2022/ III 2022	1.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu
	9.3/9.4 Izrada opštinskih planova	9.3 Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od	9.3 Ažuriran Plana	*Nerealizovano	Služba ZiS Tivat	IV 2021	I 2023/ IV 2023	1.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u

	zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Tivat	poplava 9.4 Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa	9.4 Izrađen Plana	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni		I 2021/ IV 2022	I 2023/ IV 2023	1.000€	Budžet opštine	<u>označenom kvartalnom periodu</u>
9.5/9.6/9.7 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Ulcinj		9.5 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Ulcinj	9.5 Usvojen Plan	*Realizovano	Opština Ulcinj	I 2021/ IV 2021	/	25.000€ Nema podataka o utrošenim sredstvima	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u <u>označenom kvartalnom periodu</u>
		9.6a Formiranje Radne grupe	9.6a Formirana Radna grupa	*Realizovano		I 2021/ IV 2021	/		Budžet opštine	
		9.6b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara	9.6b Usvojen Plan	*Realizacija u toku		II 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Predviđeno 25.000€ Sada se planira 10.000€		
		9.7a Formiranje Radne grupe	9.7a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano		IV 2021/ IV 2021	IV 2022/ III 2023	Sada se planira 10.000€		
		9.7b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	9.7b Usvojen Plan	*Nerealizovano		I 2021/ IV 2021				
9.8/9.9/9.10/9.11	9.8 Formiranje radne grupe za	9.8a Formirana radna grupa za	*Nerealizovano	Opština Bar	I 2021/ II 2021	I 2022/ IV 2023	Planirano 20.000€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u	

Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Bar	izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara	izradu opštinskih planova					Sada se planira 10.000€		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
	9.10 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa	9.10 Izrađen Plan	*Nerealizovano						
	9.11 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara	9.11 Izrađen Plan	*Nerealizovano Nedostatak ekspertize na lokalnom nivou		I 2021/ IV 2021		Planirano 20.000€ Sada se planira 10.000€	Budžet opštine	
					II 2021/ IV 2021		Sada se planira 10.000€	Budžet opštine	
9.12 Izrada plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava opština	9.12a Formiranje Radne grupe 9.12b Izrada Plana	9.12a Formirana Radna grupa 9.12b Izrađen Plan	*Realizovano * Realizacija u toku	Služba zaštite i spašavanja	I 2021/ IV 2021	I 2022/ III 2022	Predviđeno 2.000€ Sada se planira 3.000€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u <u>označenom kvartalnom periodu</u>

Pljevlja									
9.13 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Žabljak	9.13a Formiranje Radne grupe 9.13b Izrada Plana	9.13a Formirana Radna grupa 9.13b Izrađen plan	*Nerealizovano *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Opština Žabljak	IV 2021/ II 2022	IV 2022/ I 2023	1.500€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu
9.14 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština Petnjica	9.14b Izrada Nacrta 9.14c Utvrđivanje i usvajanje Plana	9.14b Izrađen Nacrt 9.14c Izrađen Plan	* Realizacija u toku Prikupljeni i obrađeni terenski podaci, nije realizovan zbog odsustva dijela članova radne grupe, zbog epidimiološke situacije.	Opština Petnjica	I 2021/ II 2021 IV 2021/ IV 2021	III 2022/ I 2023	2.000€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu
9.15/9.16 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Andrijevica	9.15 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.16 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških	9.15 Izrađen Plan 9.16 Izrađen Plan	*Nerealizovano *Nerealizovano Razlozi nerealizacije nijesu	Opština Andrijevica	I 2021/ IV 2021 I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022 I 2022/ IV 2022	/	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu

	pojava		dostavljeni						
9.17/9.18/9.19 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Budva	9.17 Usvajanje plana zaštite i spašavanja od požara	9.17 Izrađen Plan	*Realizovano	Opština Budva	I 2021/ I 2021			Predviđeno 25.000€ Utrošeno 15.000€	Budžet opštine
	9.18 Dorada i usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava	9.18 Plan doraden i usvojen	*Realizovano		I 2021/ IV 2021				
	9.19a Formiranje Radne grupe	9.19a Formirana Radna grupa	*Realizovano		I 2021/ IV 2021				
	9.19b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	9.19b Izrađen Plan zaštite	*Realizacija u toku		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022			
9.21 Izrada lokalnog planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Danilovgrad	9.21b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	9.21b Izrađen plan	*Realizovano	Opština Danilovgrad	II 2021	/	Predviđeno 5.000€ Utrošeno 5.000€	Budžet opštine	/
9.22/9.23 Izrada	9.22 Usvajanje Plana zaštite I	9.22 Usvojen Plan	*Realizovano	Opština Kolašin	I 2021/ I 2021	/	1.000€ Podaci o	Budžet opštine	/

lokalnih planova zaštite I spašavanja za različite vrste rizika opština Kolašin	spašavanja od požara 9.23 Izrada Plana zaštite I spašavanja od zemljotresa	9.23 Izrađen Plan	*Nerealizovano Nedostatak ekspertize		I 2021/ IV 2021	I 2023/ IV 2023	utršenim sredstvima nijesu dostavljeni 5.000€		<u>*Realizovati planiranu podaktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
9.24 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica	9.24a Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.24b Utvrđivanje predloga Plana i usvajanje	9.24a Izrađen plan 9.24b Usvojen plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Glavni grad Podgorica	II 2021/ II 2021 IV 2021/ IV 2021	II 2022/ III 2022 IV 2022/ IV 2022	/	Budžet Glavnog grada	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>

	9.26/27 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik	9.26a Formiranje Radne grupe 9.26b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.27a Formiranje Radne grupe 9.27b Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	9.26a Formirana Radna grupa 9.26b Izrađen Plan 10.27a Formirana Radna grupa 9.27b Izrađen Plan	*Nerealizovano *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19. *Realizacija u toku *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.	Opština Šavnik	I 2021/ IV 2021 I 2021/ IV 2021	IV 2022/ II 2023 IV 2022/ II 2023	1.000€ 500€	Budžet opštine Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period /
10.	Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovan je konferencija na različite teme tj. shodno različitim	10.2 Održavanje konferencije u 2021. godini	10.2 Održana konferencija	*Realizovano Održana Sedma konferencija 2. decembra 2021. godine	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/ IV 2021	/	/	/	/

	vrstama rizika									
11.	Nastavak realizacije programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti građana o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom na zdravstvene i obrazovne ustanove	11.1 Realizacija vježbi evakuacije	11.1 Realizovane vježbe evakuacije	*Realizovano Organizovane vježbe evakuacije u nekoliko osnovnih škola	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/ IV 2021	/	/	/	/
12.	Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateral nom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije,	12.2 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2021. godinu	12.2 Plaćena članarina za 2021. godinu	*Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	I 2021/ II 2021	/	Predviđeno 38.000€ Utrošeno cca 272.000€	Budžet	/
		12.4 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2021. godinu	12.4 Plaćena članarina za 2021. godinu	*Realizovano		I 2021/ I 2021	/	Predviđeno 25.000€ Utrošeno 25.000€	Budžet	/

NATO i DPPI SEE	12.6 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2021. godini	12.6 Realizovan program obuka	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	/	/	* <u>Realizovati program obuka nakon ublažavanja mjera pandemije Covid- 19</u>
	12.8 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2021. godini	12.8 Realizovan program obuka	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	/	/	* <u>Realizovati program obuka nakon ublažavanja mjera pandemije Covid- 19</u>
	12.9 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2020. godini	12.9 Realizovan program obuka	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	/	/	* <u>Realizovati program obuka nakon ublažavanja mjera pandemije Covid- 19</u>

13.	Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje	13.2 Realizacija Programa u 2021. godini	13.2 Realizovan Program u 2021. godini	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i pandemije COVID - 19.	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave / Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	12.000€	Budžet	*Realizovati program obuka nakon ublažavanja mjera pandemije Covid- 19
14.	Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa	14.2 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2021. godini	14.2 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa	*Realizovano Organizovane vježbe evakuacije u osnovnim školama	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	III 2021/ IV 2021	/	/	/	/

15.	Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP))	15.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)	15.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2021. godinu	*Realizovano Civilno-vojna saradnja se ogleda kroz pružanje podrške Ministarstvu zdravlja i domovima zdravlja na teritoriji CG u sprječavanju širenja pandemije COVID 19 civilno-vojno planiranje - planirana vježba "CMX 22"	Ministarstvo odbrane Direktorat za politiku i odbranu i Generalštab Vojske Crne Gore / Direktorat za materijalne resurse i	I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 5.000€ *Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima
		15.2 Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite	15.2 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2021. godinu	*Realizovano -Timovi HBRN Vojske sprovedili su aktivnosti u oblasti biološke dekontaminacije -Realizovane obuke u 2021 godini: 1. osnovni kurs RHB dekontaminacije 2. Osnovni kurs		I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 4.000€ *Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima

				detekcije, dozimetrije i zaštite od jonizujućeg zračenja						
		15.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)	15.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2020. i 2021. godinu	*Realizovano Sprovedenje redovnih aktivnosti u skladu sa važećim propisima i planovima obuke (gašenje požara : na deponiji “Mislov do “ u Nikšiću, akcija sprečavanja zagađenja i čišćenja mora u kumborskom tjesnacu i tivatskom zalivu.		I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 3.000€ *Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>
16.	Nabavka formacijske opreme koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne	16.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja	16.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2020. i 2021. godini	*Realizovano Nabavljena je oprema za realizaciju zadataka traganja i spašavanja iz vazduha	Ministarstvo odbrane Direktorat za materijalne resurse	I 2021/ IV 2021		Predviđeno 1.010.000€ *Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>* Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima</u>

	Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa								
17.	Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenja rizika od katastrofe - organizovan je stručnih konferencija, radionica, panel tribina, skupova i tribina	17.1 Održavanje jedne stručne radionice	17.1 Održana jedna stručna konferencija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog pandemije COVID - 19.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	IV 2022/ IV 2022	Predviđeno 2.000€ + 800€ Sada se planira 1.000€	UCPM project BALANCE NCE	*Iskoristiti priliku održavanja vježbe (projekat BALANCE) za organizovane aktivnosti na otvorenom prostoru namijenjenim podizanju javne svijesti

18.	Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata)				Opština Plužine, Petnjica i Gusinje					
	18.1 Opština Petnjica	18.1a Jačanje kadrovskih kapaciteta	18.1a Upošljen neophodan broj lica	*Realizovano Zaposlen neophodan broj lica	Opština Petnjica	I 2021/ II 2021	/	/	/	/
		18.1b Jačanje tehničke opremljenosti	18.1b Nabavljena neophodna sredstva i oprema	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plužine	I 2021/ II 2021	II 2022/ IV 2023	/	/	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti
	18.2 Opština Plužine	18.2 Formiranje službe zaštite spašavanja	18.2 Formirana Služba zaštite i spašavanja	*Realizacija u toku Pokrenut postupak popune radnih mjesta	Opština Gusinje	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Planirano 10.000€ Utrošeno 10.000€	Budžet opštine	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti
18.3 Opština Gusinje	18.3b Jačanje tehničke opremljenosti	18.3b Nabavljena neophodna sredstva i oprema	*Realizacija u toku Pokrenut proces javne nabavke		II 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2022	13.000€ Podaci o utrušenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine kroz projekat	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti	

19.	Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći	19.1 Izrada Informacije za Vladu o stanju i izazovima u oblasti razvojne saradnje i humanitarne pomoći	19.1 Izrađena Informacija	*Realizovano Usvojena na sjednici Vlade 9. decembra 2021. godine	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	II 2022/ u zavisnosti od dinamike				
		19.2 Formiranje Međuresorske radne grupe na rukovodnom nivou	19.2 Formirana Međuresorska radna grupa	*Nerealizovano U skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore 16. decembra 2021. godine potrebno je formirati Međuresorsku radnu grupu u cilju pripreme Nacrta Zakona						
20.	Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći	20.1 Priprema i izrada Nacrta strategije	20.1 Definisan predmet Strategije	*Nerealizovano	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2023	20.000€ + dodatna sredstva	Budžet / donatorska sredstva GIZ i UNDP	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

23.	Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje: - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursevima i konferencijama u zemlji i inostranstvu	23.2 Plaćanje godišnje članarine za 2021.godinu	23.2 Plaćena godišnja članarina za 2021. godinu	*Realizovano	Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta / Javni sektor / Naučno-istraživačke institucije / Univerziteti	I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 6.000,00€ Utrošeno 5103.93	Budžet Ministarstva nauke	/
		23.3 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2021. godinu i njihova realizacija	23.3 Realizovani projekti	*Realizovano	Centar za ekotoksikološka ispitivanja / Klinički centar CG	IV 2021	/	Utrošeno 127.750 242.920	Budžet IAEA + 5% vrijednosti projekta (učešće institucije)	/

26.	Izrada Zakona o seizmološkim poslovima	26.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona	26. Usvojen Zakon	*Realizovano Sektor za seizmologiju pripremio je tekst Nacrta zakona i dostavio RIA obrazac	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	IV 2020/ II 2021	/	1.000€	Budžet	/
		26.2 Javna rasprava		Realizacija u toku		I 2021/ II 2021	I 2022/ II 2022	500€		*Realizovati planirane aktivnosti
		26.3 Odgovori na pitanja javne rasprave i formiranje Predloga zakona		Realizacija u toku Razlozi nijesu dostavljeni		I 2021/ II 2021	II 2022/ IV 2023	500€		
27.	Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija	27.1 Formiranje radne grupe i izrada Nacrta	27.1 Usvojene izmjene i dopune	*Realizacija u toku Radna grupa je formirana u IV kvartalu 2021. godine, u toku je izrada predloga zakona. Paralelno sa izradom Zakona izrađuje se tekst Pravilnika. Do kašnjenja je došlo s obzirom	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2023	2.500€	Budžet	* U novom AP izmijeniti nosioca aktivnosti, tj.vodeće instituciju.

				da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, na formiranje radnih grupa uticale su mjere propisane za sprečavanje virusa Covid - 19						
28.	Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti	28. Usvajanje izmjena i dopuna zakona	28. Usvojene izmjene i dopune	*Realizacija u toku Radna grupa je formirana u IV kvartalu 2021. godine, u toku je izrada Predloga zakona. Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	I 2022/ III 2021	/	/	* <u>Realizovati planirane aktivnosti</u>

				otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, na formiranje radnih grupa uticale su mjere propisane za sprečavanje virusa Covid - 19						
29.	Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ,obuka	29.1 Stručno usavršavanje- post-diplomske studije u oblasti seizmologije/sr odnih nauka	29.1 Upisan jedan doktorant	*Nerelizovano Nema upisanih kandidata	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	IV 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2023	Predviđeno 5.000€ Sada se planira 2.000€	Budžet	<u>*Neophodno zaposliti mladi kadar</u>

	zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.	29.2 Stručno usavršavanje jednog zaposlenog Obuka Seiscomp – pozvani ekspert	29.2 Jedan službenik završio obuku od interesa za aktivnosti Sektora	*Relizovano Izdvojena sredstva za stipendiranje jednog studenta geofizike		IV 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 1.000€ Utršeno 1.000€	Budžet	/
31.	Nabavka softvera kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka	31.1 Raspi- sivanje međunarodnog tendera 31.2 Nabavka dodatnih paketa za automatsku lokaciju zemljotresa i obradu seizmičkih podataka	33. 1/2 Unaprijeđen System auto- lokacije postojećeg režima obrade podataka	*Relizovano *Relizacija u toku Nabavka softvera Sigma. U procesu je oslobađanja od PDV prema propozicijama EC projekata. Tokom I kvartala 2022 godine završava se ovaj proces i sama instalacija softvera	Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno za obje podaktivnosti 200€ + 14.800€ Utrošeno 11.900€	Budžet ZHMS - 5.400 / projekat BALA NCE i UCPM	* Zaokružiti realizaciju ove aktivnosti

32.	Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogodenom zemljotresu	32.1 Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije - ZHMS	32.1 Fina-nsirana pripravnost	*Realizacija u toku Pripravnost obezbijedena preraspodjelom radnog vremena	Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2023	Predviđeno 6.000€ Utrošeno cca 500€ Planira se 1.500€	Budžet	*Definisati <u>Zakonom o seizmološkim poslovima</u>
		32.2 Unapre- đenje web servisa i vidljivosti informacija na društvenim mrežama.	32.2 Aktivna nova web stranica i nalozi	*Realizacija u toku		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022			*Za <u>realizaciju akticnosti izgraditi kapacitete unutar sektora</u>
34.	Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne temperature (topli i ledeni talasi) na bazi primjene numeričkog meteorološkog modela vrlo visoke	/	34.4 Testiranje platforme, verifikacija, uvođenje u operativno stanje	*Realizovano operativna upotreba profesionalne Dashboard platforme - Evrpskog centra za prognozu vremena	Zavod za hidrometeorol ogiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 30.000€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	/

	rezolucije WRF NMM									
35.	Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika	35.1 Formiranje Radne grupe	35.1 Formirana Radna grupa	*Nerealizovano	Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Inženjerska komora	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2023	5.000€	Budžet Inženjerske komore	*Precizirati u Zaključcima Vlade Crne Gore nosilac ove aktivnosti koji će u saradnji sa Inženjerskom komorom realizovati ovu aktivnost.
		35.2 Izrada Uputstva	35.2 Izrađeno Uputstvo	*Nerealizovano Nije preciziran nosila aktivnosti u prethodnoj godini		I 2021/ IV 2021				
36.	Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima	36.1 Rad komisije na Izradi Nacrta studije	36.1 Izrađen Nacrt studije	*Realizacija u toku	JP Nacionalni parkovi / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za	I 2021/ III 2023	II 2022/ IV 2023	15.000€	Budžet	*Mješovita komisija će izraditi nacrt Studije za uspostavljanje video nadzora u nacionalnim parkovima CG. Studija će se dostaviti
		36.2 Donošenje Studije od strane Ministarstva	36.2 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora	*Nerealizovano Nemogućnost dobijanja adekvatnih informacija od specijalizovani						

				h subjekata, koji se bave video nadzorom za otkrivanjem i javljanje požara na otvorenom prostoru	zaštitu i spašavanje					<u>relevantnim institucijama na pribavljanje mišljenja.</u>
37.	Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja	37.1 Formiranje Radne grupe	37.1 Formirana Radna grupa	*Relizacija u toku	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Jedinice lokalne samouprave	I 2021/ II 2021	I 2022/ II 2022	1.276.113,89€	Projekat	<u>*Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti</u>
		37.2 Izrada analize o najboljem modelu za uspostavljanje NTC	37.2 Izrađena analiza	*Relazicija u toku		II 2021/ IV 2021	I 2022/ II 2022			
		37.3 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra	37.3 Uspostavljen Nacionalni trening centar	*Nerealizovano U okviru projekta "SAFE TOGETHER" uspostaviće se i izvršiti rekonstrukcija Nacionalnog trening centra		II 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2023			

38.	Izrada stručnih uputstava za sanaciju opožarenih površina	38.2 Godišnji Program gazdovanja šumama za 2021. godinu (sadrži i Plan sanacije - pošumljavanja požarišta)	38.2a Izrađena stručna uputstva	*Realizovano	Uprava za šume Crne Gore / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Predviđeno 100.000,00€ Utrošeno 9.420,00€ Sada se planira 70.000,00€	Budžet/ Uprava za šume	*Dovršiti <u>započeto pošumljavanje</u>
		38.3 Plan sanacije šuma period realizacije 2021.godina	38.3a Izrađena stručna uputstva	*Realizovano		I 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2022	280.000,00€	Budžet	*Izraditi Plan <u>sanacije za opožarene površine na cijeloj teritoriji Crne Gore</u>
39.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta i debritskih tokova 1:200.000	39.2 Izrada Projektnog zadatka	39. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore, 1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom,	*Realizovano	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo kapitalnih investicija - Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike /			Predviđeno 100.000€ Utrošeno 25.319,8€	Budžet	*Nastaviti sa <u>započetim aktivnostima</u>
				*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni						

		39.3 Realizacija projekta	zakonskim propisima, pravilicima i standardima	*Realizacija u toku Za naredni period planirana realizacija projekta	Zavod za hidrometeorol ogiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	IV 2023	I 2022/ IV 2026	Sada se planira 120.000€	Budžet	
--	--	---------------------------------	---	--	---	---------	--------------------	--------------------------------	--------	--

40.	Izrada karte odrona 1:200.000	<p>40.2 Analiza i validacija pripremljenih podataka i osnova.</p> <p>40.3 Izrada Projektnog zadatka</p>	40.Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte odrona Crne Gore,1:200.000 " u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima	<p>*Realizovano</p> <p>Ministarstvo kapitalnih investicija obezbijelo je sredstva za podršku aktivnostima koje se odnose na izradu Projektnog zadatka</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>Za naredni period planirana realizacija projekta</p>	<p>JU Zavod za geološka istraživanja / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju /</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje /</p> <p>Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja /</p> <p>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma /</p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova /</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</p>	IV kvartal 2021	/	<p>Predviđeno 100.000€ Utrošeno 25.319,8€</p> <p>Sada se planira 102.800€</p>	Budžet	*Nastaviti sa <u>započetim</u> aktivnostima
-----	--------------------------------------	---	--	--	---	-----------------	---	---	--------	---

41.	Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavod za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.)		41. Ojačani kadrovski kapaciteti	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo kapitalnih investicija - Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike	I 2021/ IV 2021	*Realizacija nije predviđena u narednom dvogodišnjem periodu	10.000€	Budžet	/
42.	Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju formiranja GEOISCG	42.1 Nastavak realizacije započetih aktivnosti na vektorizaciji geoloških osnova i formiranju baze podataka	42. Unaprijeđen i tehničko-tehnološki kapaciteti (nabavka opreme i specijalizovanih softvera)	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo kapitalnih investicija - Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	I 2021/ IV 2021	*Realizacija nije predviđena u narednom dvogodišnjem periodu	30.000€	Budžet	/

					/ Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede					
43.	Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovan je akcija dobrovoljno g davanja krvi u 23 opštine	43.1 Vaspitno- motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog davalastva krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	43.1 Realizovana vaspito- motivaciona predavanja u svim opštinama u Crnoj Gori	*Realizovano Organizovane dvije obuke za 15 motivatora ddk iz 12 opština	Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK) / Crveni krst CG i lokalne organizacije Crvenog krsta / Zavod za transfuziju krvi	III 2021/ III 2021	/	Predviđeno 17.300€ Utrošeno 780€	Budžet	*Nastaviti realizaciju aktivnosti
		43.2 Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	43.2 Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	*Realizovano Organizovane dvije akcije ddk sa volonterima CKCG u Podgorici		I 2021/ IV 2021	/	Utrošeno 9.080€		*Nastaviti realizaciju aktivnosti
		43.3 Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster,) promotivna kampanja, obuka motivatora u	43.3 Izraden promotivni materijal	*Realizovano Pokrenuta promotivno- motivaciona kampanja za mlade na društvenim mrežama pod nazivom #ddkizazov sa poznatim		III 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 18.000€ Utrošeno 2.000€	Budžet	*Nastaviti realizaciju aktivnosti

		oblasti ddk...)		ličnostima iz javnog života Izrađeni flajeri, privjesci i pokloni za učesnike ddk izazova						
44.	Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije	<p>44.1 Organizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština.</p> <p>44.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.</p> <p>44.3 Angažovanje tima predavača.</p> <p>44.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.</p>	<p>44.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice)</p> <p>44.2 Izabrane škole</p> <p>44.3 Angažovani predavači</p> <p>44.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama</p>	<p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p>	<p>Crveni krst Crne Gore</p> <p>/</p> <p>Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta</p> <p>/</p> <p>Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)</p>	I 2021/ IV 2021	/	<p>Predviđeno 500 €</p> <p>/</p> <p>Nisu bila potrebna sredstva, materijali su korišćeni iz zaliha CKCG.</p>	Budžet /CKCG	/

45.	Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije	45.1 Realizovati 4 radionice za djecu i odrasle RE populacije.	45. Organizovano najmanje 8 radionica za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori	*Nerealizovano	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta / Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)	III 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Predviđeno 600 € Sada se planira 2.000 €	Budžet/ CKCG	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
		45.2 Realizovati najmanje 4 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica sa statusom zaštite		*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID19						
46.	Radionice psihosocijalne podrške (PSP) za pomagače	46.1 Organizovati 4 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština.	46.1 Organizovane 4 radionice za pomagače. (Najmanje 60pomagača pohađalo radionicu na temu psihosocijalne podrške)	*Realizovano Organizovana 1 radionica za 16 pripadnika službe zaštite i spašavanja iz Bara, Andrijevice, Budve i Tivta. Organizovane dvije obuke za 30 volontera i zaposlenih CKCG.	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / UNHCR					

		46.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice.	46.2 Izvršena selekcija pomagača	*Nerealizovano		I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Predviđeno 2.000 € Utrošeno 5.000 € Sada se planira 5.000 €	Budžet/ CKCG	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
		46.3 Angažovanje predavača.	46.3 Angažovani predavači	*Nerealizovano						
		46.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	46.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji način prevazilaženja profesionalnog stresa.	*Nerealizovano Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID 19						
47.	Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći	47.1 Dva treninga za instruktore prve pomoći	47.1 92 instruktora prve pomoći – po 4 instruktora u svim gradovima	*Nerealizovano Podaktivnosti nisu realizovane zbog pandemije COVID 19	Crveni krst CG / Lokalne organizacije Crvenog krsta / Vrtići / Osnovne škole / Srednje škole	III 2021/ IV 2021	I 2022/ II 2022	Predviđeno 9.000 € Sada se planira 7.000 €	Budžet	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
		47.2 Obuka u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i	47.2 Najviše 6000 osoba edukovanih za pružanje prve pomoći	*Realizovano Organizovano je 7 predavanja za učenike i nastavnike u		I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 5.000 € Utršeno 2.000 €	Budžet	/

	fakultetima		Osnovnim i srednjim školama u Baru, Budvi, Ulcinju i Podgorici	/ Fakulteti					
	47.3 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou	47.3 Najmanje 6000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći	*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID 19		III 2021/ IV 2021	II 2022/ II 2022	Predviđeno 6.000 € Sada se planira 3.000 €	Budžet	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
	47.4 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći	47.4 Oko 600 učesnika učestvovalo na državnom takmičenju	*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID 19		I 2021/ IV 2021	II 2022/ II 2022	Predviđeno 8.000 € Sada se planira 7.000 €	Budžet	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
	47.5 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama	47.5 Najmanje 2500 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći	*Realizovano 923 osobe završile osnovni kurs 147 resertifikaciju		I 2021/ IV 2021	/	Utršeno 2.000 €	Budžet	/
	47.6 Organizovanje predavanja prve pomoći	47.6 Oko 2000 osoba odslušalo predavanja o značaju prve pomoći	*Realizovano 1800 osoba odslušalo predavanje prve pomoći		III 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 1.000 € Utrošeno 3.000 €	Budžet	/

		47.7 Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći	47.7 Organizovano najmanje 8 pokaznih vježbi u kojima je učestvovalo oko 200 učesnika/spasilaca	*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID 19		III 2021/ IV 2021	II 2022/ IV 2023	Predviđeno 1.000 € Sada se planira 1.500 €	Budžet	<u>*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu</u>
		47.8 Izrada promotivnog materijala	47.8 Preko 10000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala	*Realizovano Kroz obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći i preko društvenih mreža 10000 osoba upoznato sa značajem pp		I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 5.000 € Utršeno 2.000 €	Budžet	/
48.	Izrada Zakona o požarima	48.1 Obrazovanje Radne grupe	48.1 Obrazovanje Radne grupe	*Nerealizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	I 2021/ IV 2021	/	1.000€	Budžet	/
	48.2 Izrada Nacrta zakona	48.2 Izrada Nacrta zakona	*Nerealizovano							
	48.3 Izrada Predloga zakona	48.3 Izrada Predloga zakona	*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog pandemije COVID 19							

49.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	/	49. Izrađena preliminarna procjena rizika od poplava	<p>*Realizovano Kroz IPA projekat “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori” urađena je PFRA.</p> <p>PFRA sadrži podatke o poplavama koje su se dešavale u prošlosti, a koje su imale značajnije štetne posljedice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti i predstavlja prvi korak ka izradi Planova upravljanja rizicima od poplava.</p> <p>PFRA je</p>	<p>Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje</p>	I 2021/ II 2021	/	<p>Ukupan budžet za implementaciju 4 direktive je 2.300.003€ (nije rađena procjena troškova po aktivnostima) a) Sredstva opredjeljena za preliminarnu procjenu rizika od poplava procijenjena su na oko 155.000 €</p>	IPA 2016	/
-----	--	---	--	---	---	-----------------	---	---	----------	---

				dostupna na linku: https://www.gov.me/clanak/pr-eliminarna-procjena-rizika-od-poplava-za-vodna-podrucja-dunavskog-i-jadranskog-siva						
51.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	51.1. Planirano pet seminara u Ulcinju, Beranama i Podgorici	51.1 Relizovano pet seminara u Ulcinju, Beranama i Podgorici	*Realizovano Od pet predviđenih seminara svih pet su realizovana. Realizovana su i dva seminara iz prošlog AP koja nijesu bila realizovana zbog pandemije Covid 19.	Zavod za školstvo / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	I 2021/ IV 2021	/	Predviđeno 6.000€ Utrošeno 1.400	Budžet	/
52.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama	52.1 Planirano dva seminara u Nikšiću i Baru	52.1 Realizovano u Nikšiću i Baru	*Realizovano Na seminarima Psihosocijalne podrške djeci/učenicima u stresnim situacijama je bilo prisutno 47 direktora,	Zavod za školstvo / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	II 2021/ III 2021		Predviđeno 2.500€ Utrošeno 550€	Budžet	

				pedagoga i psihologa iz 25 vaspitno-obrazovnih ustanova iz Nikšića i Bara						
53.	Uspostavljanje baze podataka informacija o ekstremnim meteorološkim situacijama sa njihovim uticajem i posljedicama	53.1 Formiranje Radne grupe za izradu dokumenta – Metodologije prikupljanje podataka i njihovu evidenciju u bazi sa tehničkim osobinama baze	53.1 Formirana Radna grupa i izrađena Metodologija	*Realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2021/ II 2021	/	5.000€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	/
		53.2 Realizacija nabavke, testiranje i operativnu primjenu baze/Tender-nabavka baze	53.2 Operativna baza za ekstremne meteorološke i hidrološke događaje	*Realizovano Uspostavljena evidencija ekstremnih i značajnih meteoroloških situacija		III 2021/ IV 2021	/	10.000€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	/

54.	Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi.	54.1 Formiranje Radne grupe	54.1 Izrađen Pravilnik sa SOP	*Realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2023	3.500€	Budžet	
		54.2 Izrada tehničkog pravilnika o tipovima ekstremnih situacija i SOP sa metodologijom za njihovo prepoznavanje, rane najave i izveštavanje		*Realizacija u toku Formirana radna grupa, u toku je izrada pravilnika. Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, na formiranje						*U novom AP izmijeniti nosioca aktivnosti, tj. vodeće instituciju.

				radnih grupa uticale su mjere propisane za sprečavanje virusa Covid - 19						
55.	Izrada Pravilnika za implementaciju meteoroloških podloga-inputa sa procjenom rizika od nesrećekatastrofe, prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije, kao obaveza obrađivačaprojektanta.	55.1 Formiranje Radne grupe	55. Izrađen Pravilnik	*Realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2023	3.500€	Budžet	* U novom AP izmijeniti nosioca aktivnosti, tj.vodeće instituciju.
	55.2. Analiza postojeće dokumentacije	*Realizovano								
	55.3 Izrada Nacrta Pravilnika	*Realizacija u toku Formirana radna grupa za izradu propisa, analiza postojeće dokumentacije izvršena, u toku je izrada pravilnika. Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i								

				dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, na formiranje radnih grupa uticale su mjere propisane za sprečavanje virusa Covid - 19						
57.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Instaliranje kompjuterske radne stanice kao hardverske podrške za instalaciju softvera za akviziciju seizmičkih podataka u relnom vremenu, automatsko lociranje	57.1 Kupovina radio stanice	57. Instalirana radna stanica	*Nerealizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2021/ IV 2021	I 2022/ IV 2022	Predviđeno 11.000€ Sada se planira 5.000€	Budžet	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>

	zemljotresa i diseminacija informacija									
59.	Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava		59. Izrađene mape opasnosti i mape rizika od poplava.	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova	II 2021/ IV 2021	IV 2021/ IV 2022	2.300.000€ ukupan budžet za implementaciju 4 direktive	IPA 2016	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
60.	Izrada analize seizmičkog rizika u sklopu Plana generalne regulacije Crne Gore	60.1 Priprema mapa seizmičkog hazarda kao osnov ulaza za analizu seizmičkog rizika	60.1 Pripremljene mape seizmičkog hazarda	*Nerealizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Građevinski fakultet	I 2021/ I 2021	I 2022/ I 2022	4.000€	Budžet	<u>*Za realizaciju ove aktivnosti odnosno podaktivnosti potrebno je obezbijediti finansijska sredstva. Preporuka je da se ova sredstva planiraju budžetom Vlade</u>
		60.2 Analiza mapa seizmičkog hazarda za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine	60.2 Izrađena analiza	*Nerealizovano		I 2021/ I 2021	I 2022/ I 2022	6.000€	Budžet	

		60.3 Analiza podataka o gustini naseljenosti na teritoriji Crne Gore	60.3 Izrađena analiza	*Nerealizovano		I 2021/ I 2021	I 2022/ I 2022	5.000€	Budžet	
		60.4 Izrada analize potrebne za prikupljanje podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima)-metodološki okvir	60.4 Izrađena analiza	*Nerealizovano		II 2021/ III 2021	II 2022/ III 2022	15.000€	Budžet	
		60.5 Podloge za izradu baze podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima) za za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine	60.5 Pripremljene podloge	*Nerealizovano		III 2021/ IV 2021	III 2022/ IV 2022	10.000€	Budžet	

		60.6 Analize vulnerabiliteta izgrađene sredine – metodološki okvir	60.6 Izrađena analiza	*Nerealizovano		IV 2021/ I 2022	IV 2022/ III 2023	40.000€	Budžet	
		60.7 Analiza Seizmičkog rizika	60.7 Izrađena analiza	*Nerealizovano Podaktivnosti nijesu realizovane zbog nedostataka finansijskih sredstava i nedostatka saradnje sa vodećom institucijom		III 2021/ IV 2021	III 2023/ IV 2023	20.000€	Budžet	
61.	Obuka timova za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa. Obuka timova za brzu procjenu sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa.	61.1 Analiza postojeće prakse u procjeni štete i brze procjene sigurnosti objekata nakon zemljotresa u zemljama okruženja i šire (dodatno organizovanje okruglih stolova sa eksternim ekspertima)	61.1 Izrađena analiza	*Nerealizovano	Građevinski fakultet	I 2021/ IV 2021	I 2022/ I 2022	20.000€	Budžet	* <u>Za realizaciju ove aktivnosti odnosno podaktivnosti potrebno je obezbijediti finansijska sredstva. Preporuka je da se ova sredstva planiraju budžetom Vlade</u>

		61.2 Izrada studije za utvrđivanje procjene štete nakon zemljotresa sa priručnikom i obrascima	61.2 Izrađen priručnik	*Nerealizovano		III 2021/ II 2022	III 2022/ II 2023	50.000€	Budžet	
		61.3 Izrada studije za brzu procjenu sigurnosti vitalnih objekata nakon zemljotresa sa priručnikom i obrascima	Završava se u II kvartalu 2022	*Nerealizovano Podaktivnosti niju realizovane zbog nedostataka finansijskih sredstava		III 2021	III 2023/ II 2024	50.000€	Budžet	

IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA

Opšte preporuke

U cilju prevazilaženja izazova i prepreka u implementaciji aktivnosti predviđenih **Akcionim planom za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021. godine**, ali i postizanja maksimuma kvaliteta rezultata izdvojio se set preporuka u odnosu na sve subjekte realizacije:

- Preporučuje se ministarstvima, organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave da sve planirane aktivnosti koje nijesu realizovale u prethodnom periodu, planiraju i realizuju u narednom dvogodišnjem periodu shodno **Akcionom planu za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2021/2022. godine**, a što će za rezultat imati značajno unaprijeđenje sistema zaštite i spašavanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou;
- Potrebno je izvršiti analizu realizovanih aktivnosti do sada, kako bi se adekvatno i ciljano sprovelo planiranje aktivnosti za naredni period, a sve u cilju sprovođenja svih planiranih aktivnosti determinisanih Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije 2018-2023;
- Neophodno je adekvatno i precizno planiranje finansijskih sredstava od strane resornih ministarstava, organa državne uprave i organa lokalne samouprave u cilju realizacije definisanih aktivnosti.

Specifične preporuke

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - smatra se neophodnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom dvogodišnjem periodu planira i opredijeli adekvatna finansijska sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti (uspostavljanje Nacionalnog trening centra, nabavka opreme i sredstava zaštite i spašavanja od zemljotresa, potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja itd.,), a sve u cilju unapređenja sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih katastrofa;

U odnosu na aktivnost 35 AP - potrebno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Inženjerskom komorom preuzme realizaciju ove aktivnosti, a ovo iz razloga što je definisani nosilac u Akcionom planu prestao da postoji u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave „Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21

- Ministarstvo vanjskih poslova - obzirom na činjenicu da je Ministarstvo vanjskih poslova planiralo sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći koji je značajan dio zakonske regulative u

oblasti smanjenja rizika od katastrofa, preporučuje se da u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore 16. decembra 2021. godine formira Međuresorsku radnu grupu u cilju pripreme Nacrta Zakona;

- Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma preporučuje se preuzimanje statusa nosioca aktivnosti, tj. vodeće institucije u odnosu na sledeće aktivnosti: Izrada zakona o seizmološkim poslovima; Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacije i Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti;
- Ministarstvo odbrane - preporučuje se da u narednom izvještajnom periodu, dostavlja podatke o utrošenim sredstvima;
- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju – preporučuje se nastavak realizacije započetih aktivnosti posebno u odnosu na poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu,
- Nacionalni parkovi - preporučuje se da u odnosu na aktivnost izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima formira mješovita komisija koja će izraditi nacrt Studije za uspostavljanje sistema video nadzora.
- Glavni grad, Prijestonica i opštine – preporučuje se da pristupe izradi opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju događanja prirodnih i drugih katastrofa, kao i akustičkih studija radi uspostavljanja sistema javljanja i obavještavanja na lokalnom nivou;
- Plužine, Petnjica i Gusinje - da zaokruže proces formiranja službi zaštite i spašavanja i ojačaju kadrovske kapacitete i tehničku opremljenost.
