



**CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA
SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA PERIOD
2025-2030. GODINE, SA IZVJEŠTAJEM O
REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2025-
2026. GODINE, ZA 2025. GODINU**

Mart, 2026. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD
KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

1. UVODNI REZIME	2
1.1. UVODNE NAPOMENE.....	2
1.2. STEPEN I STATUS REALIZACIJE AKTIVNOSTI.....	3
1.3. PREGLED REALIZOVANIH ULAGANJA U ODNOSU NA PLANIRANA	7
1.4. OSTVARENI REZULTATI I IZAZOVI	9
2. INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA	10
2.1. OPŠTI PREGLED	10
2.2. NAPREDAK U OSTVARENJU CILJEVA.....	11
3. TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE	16
4. PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA.....	85

1. Uvodni rezime

1.1. Uvodne napomene

Vlada Crne Gore je donijela **Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030.** sa pratećim **Akcionim planom za 2025–2026. godinu.** Ovaj strateški dokument predstavlja osnovni planski okvir javne politike u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, kroz koji se definišu vizija, strateški prioriteti, operativni ciljevi, aktivnosti i indikatori učinka neophodni za smanjenje rizika, povećanje otpornosti i osnaživanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.

Strategija nastavlja kontinuitet prethodnog dokumenta (2018–2023) i ugrađuje naučene lekcije i preporuke iz evaluacije, dok istovremeno usklađuje nacionalne ciljeve sa međunarodnim okvirima (Sendai, SDG, Pariški sporazum) i zahtjevima pristupnih obaveza prema EU. Dokument je izrađen uz široku međuinstitucionalnu koordinaciju i učešće ekspertize nacionalnih i međunarodnih partnera.

Strategijom su jasno definisana **četiri strateška cilja** koji obuhvataju cjelokupan pristup smanjenju rizika od katastrofa:

1. Razumijevanje rizika od katastrofa;
2. Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa;
3. Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti;
4. Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i unaprijeđenu ponovnu izgradnju (Build Back Better).

Ova četiri strateška cilja se ostvaruju kroz **šest operativnih ciljeva** definisanih u Akcionom planu koji predstavljaju konkretne oblasti djelovanja i mjerenja napretka:

- **OC1 — Predviđanje:** poboljšanje procjene rizika, predviđanja i planiranja upravljanja rizicima od katastrofa.
- **OC2 — Priprema:** povećanje informisanosti i pripravnosti stanovništva u pogledu rizika.
- **OC3 — Uzbunjivanje:** unapređenje ranog upozoravanja i sistema uzbunjivanja.
- **OC4 — Odgovor:** jačanje kapaciteta za efikasan odgovor na katastrofe.
- **OC5 — Sigurnost:** osiguravanje snažnog i funkcionalnog sistema civilne zaštite.
- **OC6 — Učinimo gradove otpornim:** unapređenje otpornosti gradova kroz planske i strateške akte (Making Cities Resilience/2030 inicijativa).

Akциони plan (2025–2026) sadrži detaljnu razradu aktivnosti, raspodjelu odgovornosti, indikatore učinka, početne i ciljne vrijednosti za 2028. i 2030. godinu, te procjenu potrebnih sredstava za prioritetne intervencije (npr. ulaganja u vazduhoplove za gašenje, izradu planova, edukacije i sisteme ranog upozoravanja).

Ovaj Izvještaj je izrađen u skladu sa Metodologijom razvijanja politika i Smjernicama za izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata; uspostavljen je mehanizam monitoring-izvještavanja i evaluacije kojim Ministarstvo (Direktorat za zaštitu i spašavanje) priprema godišnje i završne izvještaje. Izvještaj o sprovođenju Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030, sa Akcionim planom za 2025–2026, za 2025. godinu predstavlja obavezu Ministarstva unutrašnjih poslova koja proizilazi iz Programa rada Vlade za 2026. godinu.

1.2. Stepen i status realizacije aktivnosti

Za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025-2030, Akcionim planom za 2025. godinu predviđena je realizacija 85 aktivnosti kroz 6 operativnih ciljeva, u funkciji ostvarenja 4 strateška cilja.

Dakle, ovim izvještajem prati se realizacija ukupno 85 aktivnosti i to sljedećim redoslijedom:

1. SC1 - Razumijevanje rizika od katastrofa

OC 1.1 Predviđanje–poboljšanje procjene rizika, predviđanja i planiranja upravljanja rizicima od katastrofa – imao je ukupno **44 planirane aktivnosti** od kojih je realizovano 14 aktivnosti, nerealizovano 18 aktivnosti, a djelimično realizovano 12 aktivnosti.

OC 1.2 Priprema–povećanje informisanosti i pripravnosti stanovništva u pogledu rizika - ukupno **18 planiranih aktivnosti** od kojih je realizovano 6 aktivnosti, nerealizovano 3 aktivnosti, a djelimično realizovano 9 aktivnosti.

Od ukupno 62 planirane aktivnosti, trećina je u potpunosti realizovana, dok su gotovo podjednako zastupljene djelimično realizovane i nerealizovane aktivnosti, što ukazuje na potrebu za intenzivnijim radom u okviru ovog strateškog cilja.

2. SC2 - Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa

OC 2.3 Uzbunjivanje–poboljšanje ranog upozoravanja – ukupno **2 planirane aktivnosti** i obje su nerealizovane.

OC 2.5 Sigurnost-osiguravanje snažnog sistema civilne zaštite – ukupno **4 planirane aktivnosti** od kojih su 2 realizovane, a 2 djelimično realizovane.

Od ukupno 6 planiranih aktivnosti, trećina je u potpunosti realizovana, trećina djelimično, a jedna trećina uopšte nije realizovana, pri čemu nedostatak realizacije aktivnosti u oblasti ranog upozoravanja naglašava potrebu za fokusom na ovu oblast.

3. SC3 - Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti

OC 3.4 Odgovor – jačanje kapaciteta za odgovor – 1 planirana aktivnost koja je nerealizovana.

Planirana aktivnost za jačanje kapaciteta za odgovor, uključujući nabavku helikoptera i obuku osoblja, još nije realizovana zbog visokih troškova i tekućih pregovora nadležnih institucija, što ukazuje na izazove u implementaciji kapitalno zahtjevnih mjera.

4. SC4 - Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i za unaprijeđenu ponovnu izgradnju (Build Back Better) prilikom oporavka, sanacije i obnove

OC 4.6 Učiniti gradove otpornim – ukupno 16 planiranih aktivnosti od kojih je 1 realizovana aktivnost, 5 nerealizovanih aktivnosti i 10 djelimično realizovanih aktivnosti. Imajući u vidu da se veći broj aktivnosti sprovodi kroz jedinice lokalne samouprave, stepen realizacije varira po opštinama, što utiče na ukupnu dinamiku implementacije ovog operativnog cilja.




Na osnovu dostavljenih podataka o realizaciji aktivnosti, evidentan je napredak u sprovođenju strateških prioriteta, pri čemu je dio aktivnosti u potpunosti realizovan, dio djelimično realizovan, dok određeni broj aktivnosti nije realizovan u planiranom roku. Na osnovu prikupljenih podataka, od ukupno 85 aktivnosti:

23 aktivnosti su u potpunosti **realizovane**,

33 aktivnosti su djelimično **realizovano**,

29 aktivnosti je **nerealizovano**.

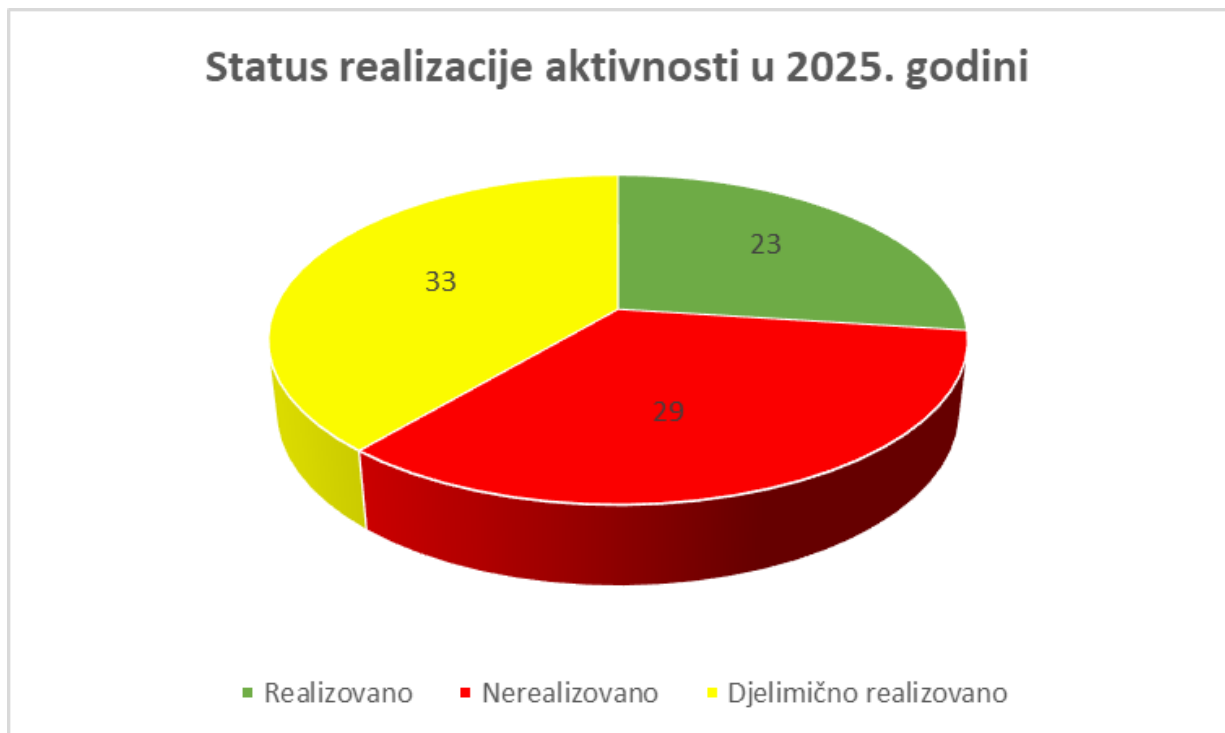


Ukupan proces sprovođenja Akcionog plana u 2025. godini može se ocijeniti kao **umjereno zadovoljavajući**, uz vidljiv napredak u pojedinim prioritarnim oblastima, ali i uz potrebu za intenziviranjem realizacije aktivnosti u narednom periodu.

U izvještajnom periodu za 2025. godinu u procesu prikupljanja i dostavljanja podataka učestvovalo je ukupno 19 institucija na nacionalnom nivou, kao i organi jedinica lokalne samouprave. Time je u procesu izvještavanja učestvovalo ukupno 20 subjekata, što potvrđuje širok institucionalni obuhvat i međuresornu uključenost u praćenju sprovođenja aktivnosti.

Ovakav nivo učešća doprinosi sveobuhvatnosti podataka i kvalitetnijem sagledavanju stepena realizacije planiranih mjera.

U cilju transparentnog prikaza raspodjele aktivnosti među nosiocima realizacije, u nastavku je predstavljen grafički pregled realizacije aktivnosti po institucijama u 2025. godini.

STEPEN REALIZACIJE AKTIVNOSTI PO ODGOVORNIM INSTITUCIJAMA ZA 2025. GODINU

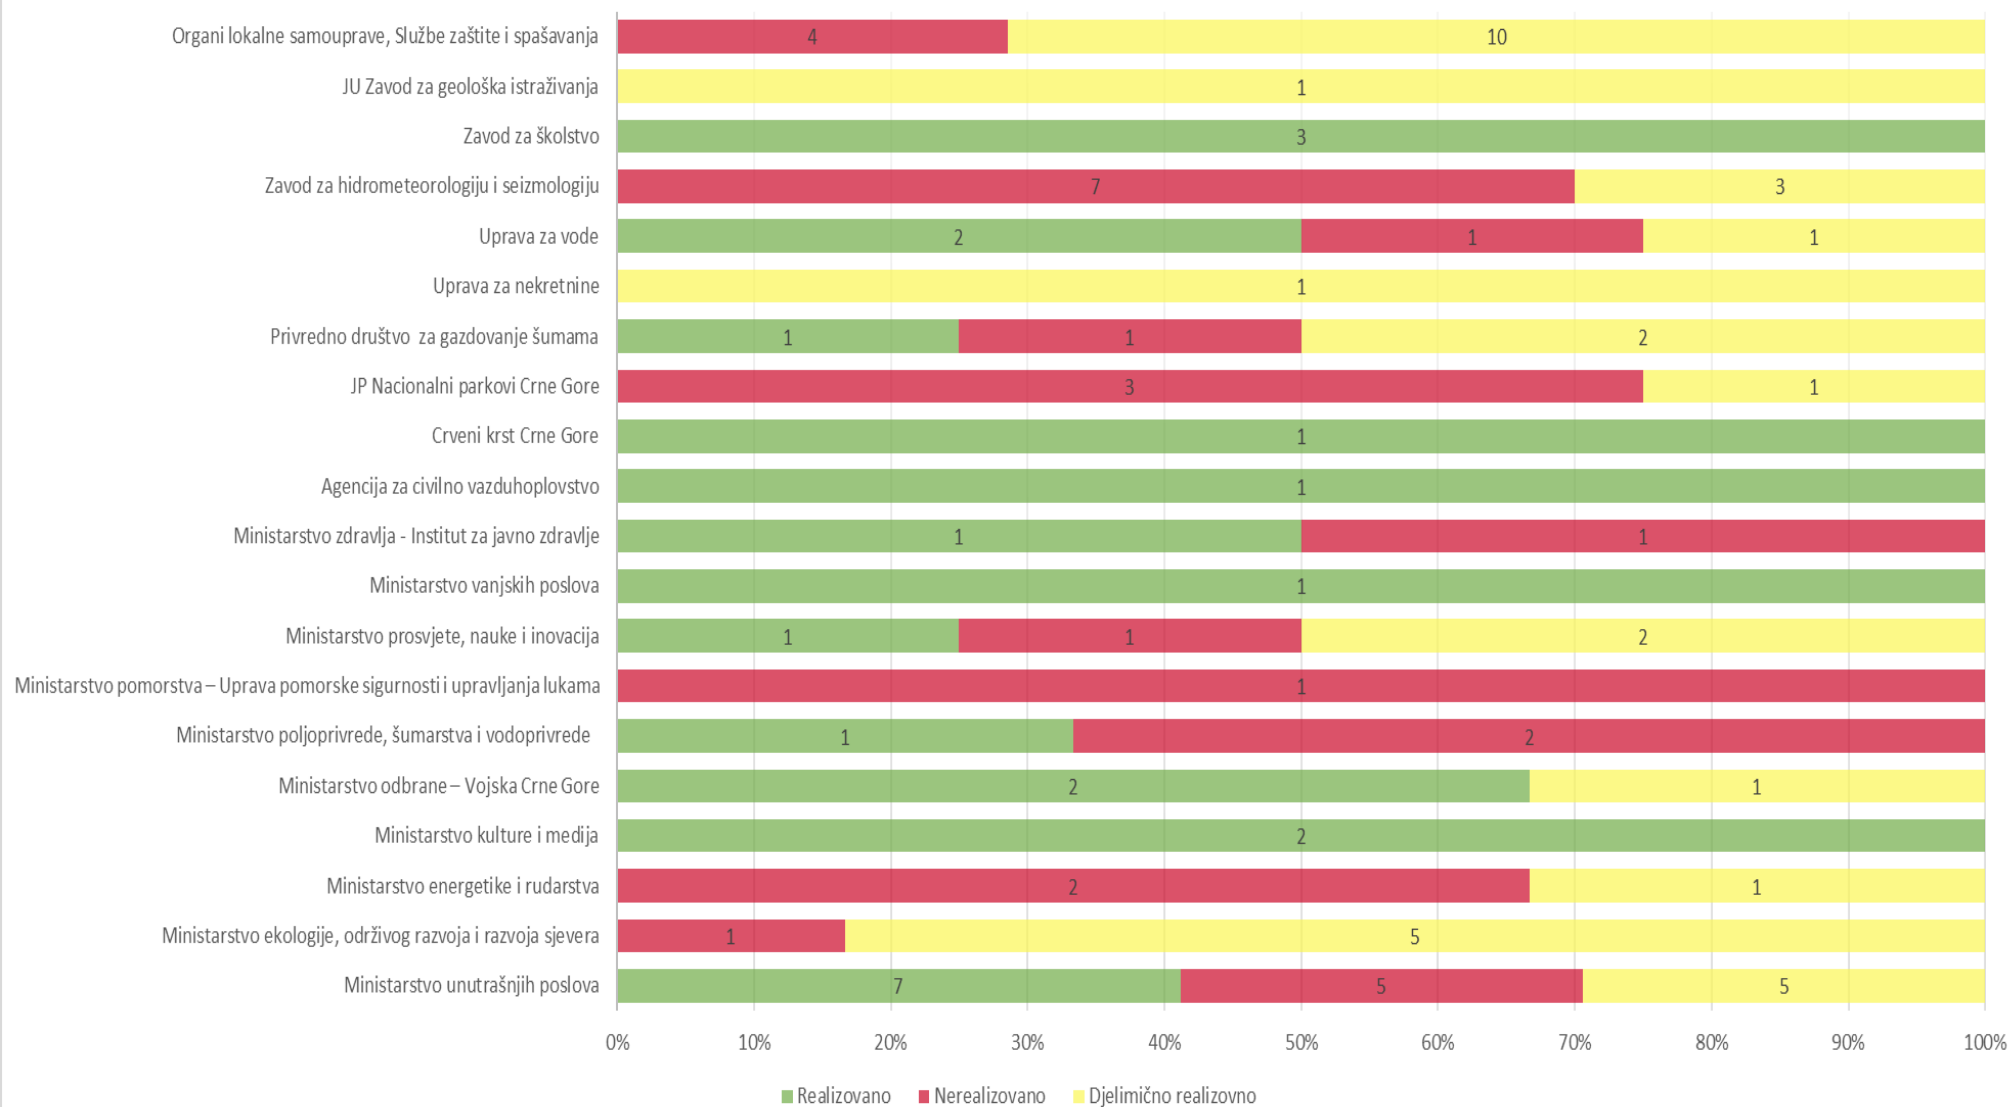

1.3. Pregled realizovanih ulaganja u odnosu na planirana

Za sprovođenje Akcionog plana Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030 za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **22.198.528,00 eura**. U izvještajnom periodu realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od **11.247.022,22 eura**, što predstavlja 50,66% planiranih sredstava za 2025. godinu.

Analiza ostvarenih ulaganja za 2025. godinu integriše podatke o realizaciji aktivnosti i projekata predviđenih Akcionim planom za 2025/2026. godinu, uključujući i one aktivnosti koje su, iako planirane za kasniji period, uspješno realizovane već u 2025. godini, doprinoseći ostvarivanju ciljeva Strategije.

Posmatrano po strateškim ciljevima:

Za realizaciju aktivnosti u okviru **strateškog cilja 1** – Razumijevanje rizika od katastrofa, planirano je 3.253.570 eura, od čega je do sada utrošeno 1.907.313,55 eura što ukazuje da je realizovano 59% planiranog budžeta. Sredstva su korišćena za aktivnosti koje doprinose poboljšanju procjene rizika kao i povećanju informisanosti i pripravnosti stanovništva u pogledu rizika.

Za aktivnosti u okviru **strateškog cilja 2** – Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa, planirano je 868.000 eura, dok je do sada utrošeno 208.249 eura, odnosno 24% planiranog budžeta. To ukazuje na niži nivo realizacije aktivnosti koje doprinose poboljšanju ranog upozoravanja i jačanju sistema civilne zaštite.

Najveći dio sredstava planiran je za **strateški cilj 3** – Ulaganje u smanjenje rizika radi povećanja otpornosti, ukupno 11.848.750 eura, međutim do sada ova sredstva nisu realizovana zbog visokih troškova kapitalnih aktivnosti i tekućih pregovora nadležnih institucija.

Za **strateški cilj 4** – Jačanje pripravnosti i Build Back Better, planirano je 6.228.208 eura, dok je do sada utrošeno 9.131.459,67 eura, što pokazuje prekoračenje planiranog budžeta, uglavnom zbog intenzivnih aktivnosti kroz jedinice lokalne samouprave.

Ova raspodjela budžeta pokazuje da je najveći fokus finansiranja usmjeren na kapitalno intenzivne aktivnosti koje jačaju otpornost i pripravnost na katastrofe, dok su za druge strateške ciljeve sredstva djelimično iskorišćena ili još uvijek u fazi implementacije.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD
KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Strateški cilj	Planirano za 2025. godinu (€)	Utrošeno (€)	Operativni cilj	Utrošeno (€)
SC1 – Razumijevanje rizika od katastrofa	3.253.570	1.907.313,55	OC 1.1 Predviđanje – procjena rizika	1.558.976,55
			OC 1.2 Priprema – informisanost i pripravnost	348.337,00
SC2 – Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa	868.000	208.249	OC 2.3 Uzbunjivanje – rano upozoravanje	0,00
			OC 2.5 Sigurnost – sistem civilne zaštite	208.249,00
SC3 – Ulaganje u smanjenje rizika radi povećanja otpornosti	11.848.750	0,00	OC 3.4 Odgovor – jačanje kapaciteta	0,00
SC4 – Jačanje pripravnosti i Build Back Better	6.228.208	9.131.459,67	OC 4.6 Učiniti gradove otpornim	9.131.459,67
UKUPNO				11.247.022,22

Realizacija aktivnosti u 2025. godini zasnivala se na kombinovanom modelu finansiranja koji uključuje:

- budžet Crne Gore i budžete organa državne uprave,
- budžete jedinica lokalne samouprave,
- kapitalni budžet,
- sredstva javnih preduzeća,

Značajan dio aktivnosti realizovan je uz podršku međunarodnih partnera i donatora, uključujući:

- Evropsku uniju (IPA II i IPA III fondovi)
- EU fondove i programe
- UNDP
- UNICEF
- Globalni fond za životnu sredinu (GEF)
- FAO
- JICA
- Svjetsku banku (Regionalni program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine – SDIP)
- druge međunarodne organizacije i razvojne partnere

Učešće međunarodnih donatora potvrđuje usklađenost nacionalnih prioriteta sa međunarodnim obavezama i strateškim okvirima u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa i klimatske otpornosti.

Najveći obim finansijskih sredstava realizovan je u okviru Operativnog cilja 4.6 „Učiniti gradove otpornim“, gdje dominiraju budžeti jedinica lokalne samouprave i sredstva regionalnih razvojnih programa.

Operativni cilj 2.5 finansiran je isključivo iz nacionalnih budžetskih sredstava, dok su Operativni ciljevi 1.1 i 1.2 realizovani kroz kombinovani model budžetskog i međunarodnog finansiranja.

Zbog kombinovanog modela sufinansiranja i višekomponentne strukture projekata, u izvještajnom periodu nije izvršena konsolidacija realizovanih sredstava po pojedinačnim izvorima finansiranja, već je dat pregled ukupno realizovanih sredstava.

1.4. Ostvareni rezultati i izazovi

U izvještajnom periodu ostvaren je napredak u sprovođenju aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. Ukupna finansijska realizacija iznosila je 11.247.022,22 €, pri čemu su sredstva obezbijedena iz budžeta državnih organa, budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i iz međunarodnih izvora finansiranja (EU IPA fondovi, UNDP, GEF, Svjetska banka i drugi partneri).

Realizacija aktivnosti po operativnim ciljevima pokazuje različitu dinamiku sprovođenja.

Kod Operativnih ciljeva 1.1 i 1.2 realizovan je značajan dio planiranih aktivnosti, uz kombinovano finansiranje iz budžetskih i donatorskih izvora. Aktivnosti su se odnosile na mjere normativnog, planskog i preventivnog karaktera, čime je obezbijeden kontinuitet u sprovođenju strateških opredjeljenja.

U okviru Operativnog cilja 2.5 realizovane su aktivnosti usmjerene na unapređenje kapaciteta sistema zaštite i spašavanja, posebno u dijelu opremljenosti nadležnih službi.

Kod Operativnih ciljeva 2.3 i 3.4 u izvještajnom periodu nije evidentirana finansijska realizacija, iako su određene aktivnosti planirane kroz projektne ili donatorske aranžmane.

Najveći dio ukupne finansijske realizacije odnosi se na Operativni cilj 4.6, pri čemu su sredstva dominantno obezbijedena iz budžeta jedinica lokalne samouprave, uz učešće međunarodnih razvojnih programa i donacija. Visok finansijski obim u okviru ovog cilja u značajnoj mjeri proizilazi iz realizacije dvije finansijski najzahtjevnije aktivnosti, dok su ostale planirane aktivnosti imale znatno manju pojedinačnu vrijednost.

Iako je ovaj operativni cilj zabilježio najveći finansijski obim, to ne znači da je ostvaren proporcionalan stepen realizacije planiranih aktivnosti. Veći broj aktivnosti na lokalnom nivou realizovan je djelimično ili nije realizovan u izvještajnom periodu, što ukazuje da finansijski pokazatelji nijesu u potpunosti odraz ukupne dinamike implementacije.

Ovakva struktura realizacije potvrđuje potrebu da se, pored finansijskih pokazatelja, u narednom periodu dodatno unaprijedi praćenje stepena realizacije aktivnosti, kako bi se preciznije sagledao napredak u odnosu na planirane ciljeve.

Izazovi u sprovođenju odnose se na neujednačenu dinamiku realizacije među nosiocima aktivnosti, ograničene administrativne i tehničke kapacitete, posebno na lokalnom nivou, kao i zavisnost pojedinih aktivnosti od eksternih izvora finansiranja. U narednom periodu prioritet ostaje unapređenje koordinacije, jačanje kapaciteta za pripremu i realizaciju projekata, te dalje unapređenje sistema praćenja realizacije aktivnosti.

2. Informacija o napretku u postizanju strateških i operativnih ciljeva

2.1. Opšti pregled

U izvještajnom periodu 2025. godine ostvarena je djelimična implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. Realizacija je bila različitog intenziteta u okviru pojedinih strateških i operativnih ciljeva, pri čemu finansijska realizacija ne odražava u potpunosti stepen sprovedenih aktivnosti.


Ukupno je realizovan dio planiranih aktivnosti, dok je značajan broj aktivnosti realizovan djelimično ili je njihova implementacija odložena usljed finansijskih i administrativnih ograničenja.

Iako formalno mjerenje napretka po indikatorima nije predmet ovog izvještajnog perioda, može se konstatovati da su u više oblasti ostvareni konkretni institucionalni, tehnički i infrastrukturni pomaci.

2.2. Napredak u ostvarenju ciljeva

Strateški cilj 1 – Razumijevanje rizika od katastrofa

U okviru **Operativnog cilja 1.1** – *Predviđanje: poboljšanje procjene rizika*, predviđanja i planiranja upravljanja rizicima od katastrofa, u izvještajnom periodu sproveden je niz aktivnosti koje su doprinijele unapređenju normativnog okvira, jačanju institucionalnih kapaciteta i razvoju tehničke infrastrukture za praćenje i procjenu rizika.

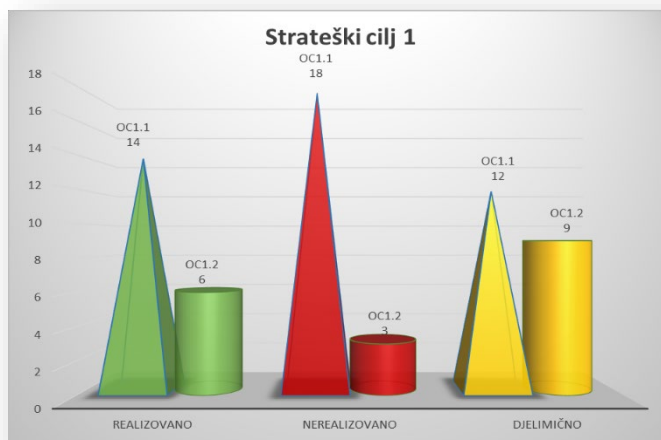

Značajan napredak ostvaren je u oblasti normativnog i planskog okvira, kroz izradu i usvajanje ključnih planskih i strateških dokumenata. Među najznačajnijim rezultatima izdvajaju se izrada Programa međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći, usvajanje planova upravljanja rizicima od poplava, kao i izrada Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja. Takođe su sprovedene aktivnosti na unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti hidrometeoroloških i seizmoloških poslova, koje su u završnoj fazi procedura usvajanja.

Napredak je ostvaren i u oblasti jačanja stručnih kapaciteta i edukacije, kroz organizovanje seminara i obuka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, psihosocijalne podrške u kriznim situacijama, kao i kroz obuke pripadnika Vojske Crne Gore i kroz obuke članova lokalnih komisija za procjenu šteta. Dodatno, realizovane su aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja i koordinacije kroz rad Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

U dijelu tehničkog i infrastrukturnog unapređenja sistema za praćenje rizika, ostvareni su određeni rezultati kroz jačanje seizmičkog monitoringa, obezbjeđivanje prostornih podataka za potrebe informacionog sistema zaštite i spašavanja, kao i kroz realizaciju projekata istraživanja terena za izradu karata geoloških hazarda.

Međutim, značajan broj planiranih aktivnosti u okviru ovog operativnog cilja nije realizovan ili je realizovan djelimično, prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava i zavisnosti od međunarodnih izvora finansiranja. To se posebno odnosi na aktivnosti koje podrazumijevaju kapitalna ulaganja u tehničku opremu i monitoring sisteme, kao što su nabavka meteorološkog radara, revitalizacija mreže stanica za podzemne vode, proširenje mreže GPS stanica i uspostavljanje naprednih sistema meteorološkog monitoringa na obali.

Napredak u postizanju **Operativnog cilja 1.2** – *Priprema: informisanost i pripravnost*

U okviru Operativnog cilja 1.2 sprovedene su aktivnosti usmjerene na jačanje informisanosti javnosti, edukaciju institucija i građana, kao i unapređenje kapaciteta za prevenciju i reagovanje u slučaju katastrofa.

U izvještajnom periodu realizovan je značajan broj aktivnosti koje su doprinijele podizanju nivoa informisanosti i edukacije o rizicima od katastrofa. Posebno se izdvaja izrada baze edukativnih materijala o rizicima i zaštiti od katastrofa u okviru Crnogorskog informacionog sistema, kao i organizovanje savjetovanja sa organizacijama civilnog društva u cilju identifikovanja specifičnih potreba žena i ranjivih grupa stanovništva u sistemu zaštite i spašavanja.

Važan doprinos ostvaren je kroz aktivnosti Crvenog krsta Crne Gore, koje obuhvataju edukaciju stanovništva, jačanje kapaciteta za pružanje prve pomoći, psiho-socijalnu podršku i aktivnosti spasilaštva. Tokom 2025. godine organizovane su brojne obuke i radionice, uključujući edukaciju hiljada građana iz oblasti prve pomoći, obuke za pružanje psiho-socijalne podrške, kao i obuke i resertifikaciju spasilaca na vodi i skijalištima.

Napredak je ostvaren i u oblasti edukacije i jačanja kapaciteta institucija, kroz razvoj više trening modula koji se odnose na klimatske promjene, procjenu ranjivosti i planiranje mjera prilagođavanja. Ovi moduli razvijeni su uz podršku međunarodnih partnera i biće dostupni putem online platforme Uprave za ljudske resurse, čime će biti omogućeno njihovo korišćenje od strane zaposlenih u javnoj upravi, ali i šire javnosti.

U okviru ovog operativnog cilja sprovedene su i aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti javnosti, poput obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa i realizacije edukativnih aktivnosti u obrazovnom sistemu.

Istovremeno, dio aktivnosti je djelimično realizovan ili odložen za naredni period, uglavnom zbog potrebe usklađivanja sa drugim strateškim dokumentima, obezbjeđivanja finansijskih sredstava ili organizacionih izazova u pojedinim institucijama. Takođe, određene aktivnosti planirane su da se realizuju kroz međunarodne projekte koji su u fazi pripreme ili implementacije.

Ukupno posmatrano, u okviru Strateškog cilja 1 – Razumijevanje rizika od katastrofa ostvaren je umjeren napredak. Poseban doprinos ostvaren je kroz izradu stručnih i edukativnih materijala, sprovedenje obuka i edukativnih programa, kao i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana i jačanje otpornosti zajednica. Istovremeno, dio planiranih aktivnosti nalazi se u fazi realizacije ili je planiran za sprovedenje u narednom periodu, što ukazuje na potrebu kontinuiteta u implementaciji mjera koje doprinose boljem razumijevanju i upravljanju rizicima od katastrofa.

Strateški cilj 2 – Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa

U okviru Strateškog cilja 2 – *Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa*, realizovane su aktivnosti usmjerene na unapređenje sistema civilne zaštite i jačanje kapaciteta institucija za odgovor u slučaju katastrofa. Strateški cilj obuhvata operativne ciljeve 2.3 – *Uzbunjivanje: poboljšanje ranog upozoravanja* i 2.5 – *Sigurnost: osiguravanje snažnog sistema civilne zaštite*.



Kada je riječ o **Operativnom cilju 2.3**, koji se odnosi na unapređenje sistema ranog upozoravanja, tokom izvještajnog perioda nijesu realizovane planirane aktivnosti. Aktivnost izrade Studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima za rano otkrivanje požara nije započeta zbog nedostatka finansijskih sredstava i planirana je za realizaciju u narednom periodu kroz međunarodne projekte. Takođe, aktivnost uspostavljanja sistema monitoringa šumskih ekosistema, koja podrazumijeva razvoj operativnog informacionog sistema o šumama, nije realizovana u 2025. godini. Razlog odlaganja odnosi se na izmjene u planiranju finansiranja projekta kroz međunarodne programe podrške i institucionalne promjene u sektoru šumarstva, zbog čega je realizacija pomjerena za naredni period.

Za razliku od toga, u okviru **Operativnog cilja 2.5** – *Sigurnost: osiguravanje snažnog sistema civilne zaštite*, zabilježen je određen napredak kroz aktivnosti jačanja kapaciteta sistema zaštite i spašavanja. Tokom izvještajnog perioda sprovedene su obuke za pripadnike specijalističkih i dobrovoljnih jedinica za zaštitu i spašavanje, pri čemu je obuku prošlo 18 pripadnika ovih jedinica. Pored toga, realizovana je nabavka opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje u slučaju zemljotresa za potrebe Direktorata za zaštitu i spašavanje, čime su unaprijeđeni operativni kapaciteti sistema za reagovanje u kriznim situacijama.

Napredak je ostvaren i kroz aktivnosti Ministarstva odbrane, gdje je izvršena nabavka opreme za traganje i spašavanje za potrebe Vojske Crne Gore, dok je proces nabavke protivpožarne opreme za pripadnike Vojske Crne Gore djelimično realizovan, pri čemu je prvi kontingent opreme isporučen tokom 2025. godine, a završetak nabavke očekuje se tokom 2026. godine.

Ukupno posmatrano, realizacija Strateškog cilja 2 u izvještajnom periodu dominantno je usmjerena na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta sistema civilne zaštite, dok aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje savremenih sistema ranog upozoravanja nijesu realizovane u planiranom periodu, te će njihova implementacija biti predmet daljih aktivnosti u narednim fazama sprovođenja Strategije.

Strateški cilj 3 – Ulaganje u smanjenje rizika radi povećanja otpornosti

Strateški cilj 3 realizuje se kroz jedan operativni cilj (OC 3.4 – *Jačanje kapaciteta za odgovor na katastrofe*).

U okviru **Operativnog cilja 3.4** – *Jačanje kapaciteta za odgovor na katastrofe*, planirana je aktivnost nabavke helikoptera za potrebe sistema zaštite i spašavanja, uključujući i obuku dva pilota i dva tehničara. Ovaj cilj se odnosi na unapređenje vazduhoplovnih kapaciteta sistema zaštite i spašavanja. U izvještajnom periodu realizacija ovog cilja nije ostvarena, budući da planirana aktivnost nabavke višenamjenskog helikoptera nije sprovedena.



Predmetna aktivnost predstavlja finansijski najzahtjevniju investiciju u okviru Strategije, ukupne vrijednosti od oko 23,9 miliona eura, čije je finansiranje planirano kombinacijom budžetskih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova i sredstava međunarodnih partnera kroz donacije ili kreditne aranžmane. S obzirom na složenost postupka nabavke, potrebu obezbjeđivanja finansijske konstrukcije i sprovođenje međunarodnih procedura nabavke, realizacija aktivnosti je pomjerena za naredni period sprovođenja Strategije.

Imajući u vidu da je ova aktivnost ključna za unapređenje kapaciteta za odgovor na katastrofe, posebno u situacijama gašenja požara iz vazduha, evakuacije i spašavanja u nepristupačnim područjima, njena realizacija ostaje jedan od prioriteta u narednom periodu sprovođenja Strategije.

Strateški cilj 4 – Jačanje pripravnosti i Build Back Better

U okviru Strateškog cilja 4 realizuje se **Operativni cilj 4.6** koji je usmjeren na unapređenje otpornosti gradova kroz jačanje planskog okvira, unapređenje sistema zaštite i spašavanja i sprovođenje infrastrukturnih mjera za smanjenje rizika od katastrofa. Aktivnosti u okviru ovog cilja dominantno se realizuju na lokalnom nivou i obuhvataju izradu planskih dokumenata, procjena rizika, lokalnih strategija, kao i unapređenje tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta.



U izvještajnom periodu zabilježen je ograničen napredak u realizaciji velikog broja planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu lokalnih planskih i strateških dokumenata. Dio lokalnih samouprava započeo je procese izrade planova zaštite i spašavanja, lokalnih procjena rizika i strategija za smanjenje rizika od katastrofa, ali je značajan broj ovih aktivnosti i dalje u fazi pripreme ili je njihov rok realizacije pomjeren za naredni period. Kao najčešći razlozi odlaganja identifikovani su ograničeni administrativni i stručni kapaciteti na lokalnom nivou, potreba usklađivanja sa nacionalnim dokumentima, kao i nedostatak finansijskih sredstava ili tehničkih podataka neophodnih za izradu planskih dokumenata.

Uprkos sporijoj realizaciji dijela planskih aktivnosti, u izvještajnom periodu realizovane su pojedine značajne investicione aktivnosti koje doprinose jačanju otpornosti lokalnih zajednica. Posebno se izdvaja realizacija projekta regulacije rijeke Lim u Bijelom Polju i Beranama, koji se sprovodi u okviru Regionalnog programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz podršku Svjetske banke. U okviru ovog projekta realizovani su radovi u vrijednosti većoj od 9 miliona eura, čime se značajno unapređuje zaštita od poplava u ovim područjima.

Pored toga, određeni napredak ostvaren je i kroz aktivnosti jačanja tehničkih kapaciteta službi zaštite i spašavanja u pojedinim lokalnim samoupravama, uključujući nabavku zaštitne i spasilačke opreme, čime se doprinosi unapređenju operativne spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama.

Istovremeno, veliki broj infrastrukturnih i sistemskih projekata, uključujući izgradnju vatrogasnih domova, uspostavljanje sistema obavještavanja i uzbunjivanja, kao i rekonstrukciju zaštitnih vodnih objekata, nalazi se u fazi pripreme projektne dokumentacije, obezbjeđivanja finansiranja ili sprovođenja administrativnih procedura, zbog čega se njihova realizacija očekuje u narednom periodu sprovođenja Strategije.

Ukupno posmatrano, realizacija Operativnog cilja 4.6 u izvještajnom periodu karakteriše izražen nesklad između finansijskog obima realizacije i stepena sprovođenja planiranih aktivnosti, budući da najveći dio finansijskih sredstava potiče iz realizacije nekoliko kapitalnih projekata, dok je značajan broj aktivnosti na lokalnom nivou i dalje u fazi pripreme ili djelimične realizacije.

Zaključna ocjena napretka

U cjelini posmatrano, u izvještajnom periodu ostvaren je umjeren napredak u sprovođenju Strategije za smanjenje rizika od katastrofa. Realizovane aktivnosti prvenstveno su bile usmjerene na jačanje institucionalnih i operativnih kapaciteta sistema zaštite i spašavanja, unapređenje tehničke opremljenosti nadležnih službi, kao i sprovođenje pojedinih infrastrukturnih projekata od značaja za smanjenje rizika od katastrofa. Istovremeno, dio planiranih aktivnosti, naročito onih koje zahtijevaju značajnija finansijska sredstva ili složenije administrativne procedure, realizovan je djelimično ili je njihova implementacija odložena za naredni period. Imajući u vidu da je riječ o početnoj fazi sprovođenja strateškog dokumenta, dosadašnji rezultati ukazuju na postepeno uspostavljanje institucionalnih i finansijskih pretpostavki za intenzivniju realizaciju planiranih aktivnosti u narednim godinama.

3. Tabela za izvještavanje

Razumijevanje rizika od katastrofa										
Predviđanje–poboljšanje procjene rizika, predviđanja i planiranja upravljanja rizicima od katastrofa										
STRATEŠKI CILJ 1.										
OPERATIVNI CILJ 1.1										
Indikator učinka	Polazna vrijednost			Prelazna vrijednost–2028. godina			Ciljana vrijednost–2030. godina			
Broj sprovedenih preventivnih aktivnosti za bolje predviđanje	0			legislativni okvir: <u>143</u>			legislativni okvir: <u>197</u>			
	0			obuke, istraživanje, vježbe <u>73 + 240 lica + 25 interventnih ekipa</u>			obuke, istraživanje, vježbe <u>98 + 358 lica + 25 interventnih ekipa</u>			
	0			mrežne stanice, akcelerometri, gps stanice, dronovi <u>58</u>			mrežne stanice , akcelerometri, gps stanice, dronovi <u>61</u>			
	0			uspostavljenih i zaokruženih sistema <u>16</u>			uspostavljenih i zaokruženih sistema <u>16</u>			
	0			tehnički opremljena - adaptirana objekta <u>174</u>			tehnički opremljena - adaptirana objekta <u>224</u>			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuka za naredni period sprovođenja
					AAA					

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

							u 2025. godini			
1. Izrada Programa međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći za period 2026 – 2029	Izrađen Program međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći za period 2026–2029 sa djelimičnom primjenom pravne tekovine EU, celeksi 42017Y0630(01) i 42008X0130(01)	Ministarstvo vanjskih poslova	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Realizovano		Nijesu potrebna sredstva	/	/	
2. Savjetovanje sa direktorima/kama obrazovno-vaspitnih ustanova	Izvršeno 6 novih savjetovanja sa obavezama u vezi sa implementacijom aktivnosti iz Strategije	Zavod za školstvo	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Realizovano	/	1.000 €	/	Budžet Zavoda za školstvo	Periodično realizovati savjetovanja, u zavisnosti od potreba
3. Ratifikacija međunarodnog Sporazuma o	Ratifikovan međunarodni sporazum	Agencija za civilno	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Realizovano	/	Nijesu potrebna sredstva	/	/	

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

<p>traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu u potpisanog između Crne Gore, Republike Srbije, Republike Slovenije i Republike Sjeverne Makedonije</p>		<p>vazduhoplovstvo</p>								
<p>4. Izrada Preduzetnog plana za zaštitu i spašavanje od požara za Privredno društvo za gazdovanje šumama</p>	<p>Izrađen Preduzetni plan za Privredno društvo za gazdovanje šumama</p>	<p>Privredno društvo za gazdovanje šumama</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2026.</p>	<p>Djelimično</p>	<p>I-IV kvartal 2027. (Izrađen Preduzetni plan za područnu jedinicu Pljevlja. Privredno društvo za gazdovanje šumama, iako formalno osnovano u skladu sa</p>	<p>15.000€</p>	<p>3.000€</p>	<p>Budžet Privrednog društva za gazdovanje šumama 100%</p>	<p>Izraditi Preduzetni plan za Privredno društvo za gazdovanje šumama</p>

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

						Odlukom osnivača i Statutom, nije faktički konstituisano niti započelo obavljanje djelatnosti iz svoje nadležnosti)				
5. Edukacija/obuka zaposlenih za zaštitu od požara	Izvršena edukacija 80 čuvara šuma, šumarskih tehničara i inženjera za zaštitu šuma	Privredno društvo za gazdovanje šumama i Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	I-IV kvartal 2027.	2025 – 750€ 2026 – 1.250€ Ukupno 2.000€	/	Budžet Privrednog društva za gazdovanje šumama 100 % Budžet Uprave za gazdovanje šumama i lovištima 50%	Izvršiti edukaciju 80 čuvara šuma, šumarskih tehničara i inženjera za zaštitu šuma
6. Izrada i ažuriranje planova zaštite i spašavanja – Preduzetnih planova Nacionalnih parkova CG	Izrađen Plan zaštite i spašavanja za PP Solana Izrađen Plan zaštite i spašavanja za Botaničku	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Godišnje 12.500€ Ukupno 25.000€	/	Budžet JPNPCG 0 – 50 % Donatorska sredstva (IPA fondovi) 50 – 100%	Plan zaštite i spašavanja za ulcinjsku Solanu je u nadležnosti Opštine Ulcinj. Izrada Plana zaštite i spašavanja za

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	baštu – Kolašin Sprovedena revizija postojećih Planova i donešena odluka o potrebi i izradi novih Planova zaštite i spašavanja za nacionalne parkove (2 ažurirana ili 2 nova plana)									Botaničku baštu u Kolašinu i revizija Planova zaštite i spašavanja će se realizovati tokom 2026. godine
9. Seminar: „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa“	Organizovano 10 seminara	Zavod za školstvo	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	Godišnje 5.000€ Ukupno 10.000€	946,00€	40 % Budžet Zavoda za školstvo, 60 % UNICEF ili druga međunarodna organizacija, ili Fond za zaštitu i spašavanje	U skladu sa Akcionim planom Zavod za školstvo je u obavezi da realizuje dva seminara, dok će preostale realizovati UNICEF
10. Seminar: „Psihosocijalna podrška djeci/učenicima /cama u	Organizovano 4 seminara	Zavod za školstvo	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	Godišnje 2.000€ Ukupno 4.000€	2.000€	20% Budžet Zavoda za školstvo, 20 % Budžet Crveni Krst, 60% Budžet Unicef	

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

stresnim situacijama“									ili druga međunarodna organizacija	
12. Osposobljavanje članova Koordinacionog i opštinskih timova za zaštitu i spašavanje	Izvršeno osposobljavanje Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	/	2025 – 15.000€ 2026 – 15.000€ Ukupno 30.000€	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	
13. Izrada projektne dokumentacije u cilju zaštite od štetnog dejstva voda (poplava)	Izrađena 3 projekta regulacije korita rijeke Tare i Lima	Uprava za vode	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025 – 100.000€ 2026 – 70.000€ Ukupno 170.000€	138.363,60 €	Budžet Uprave za vode 100%	/
14. Usvajanje i ažuriranje Planova upravljanja rizicima od poplava	Usvojeni i ažurirani planovi upravljanja rizicima od poplava	Uprava za vode	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	Godišnje 50.000€ Ukupno 100.000€	/	EU IPA sredstva 100%	Na sjednici održanoj 25. decembra 2025 godine Vlada Crne Gore je usvojila planove upravljanja

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										rizicima od poplava
15. Analiza podataka neophodnih za proglašavanje vanredne zaštite od štetnog dejstva voda (poplava)	Izrađena analiza podataka	Uprava za vode	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026 Realizacija aktivnosti je odložena usljed potrebe za dodatnom pripremom podataka i usaglašavanjem sa nadležnim institucijama	7.000€	/	Budžet Uprave za vode 100%	U narednom periodu fokus staviti na prikupljanje i ažuriranje podataka, definisanje metodologije i izradu analize za proglašavanje vanredne zaštite od poplava.
16. Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koji su vezane za upravljanje rizikom od katastrofa (civilno – vojni odnosi CMR, CMI, civilno-vojna saradnja)	Izvršeno obučavanje 8 pripadnika/ca Vojske CG i Ministarstva odbrane	Ministarstvo odbrane – Vojska Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025. – 12.000€ 2026. – 12.000€ Ukupno 24.000€	30.000€	Budžet – Ministarstvo odbrane 100%	Nastaviti obučavanje i vježbe za reagovanje na katastrofe, unaprijediti procedure angažovanja VCG u podršci civilnim organima, kao i razvoj planova zaštite i otpornosti

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

<p>CIMIC, civilno – vojno planiranje u vanrednim situacijama CMEP, aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)</p>										<p>vojnih lokacija na klimatske i katastrofalne rizike.</p>
<p>17. Jačanje otpornosti kulturne baštine na rizike od katastrofa</p>	<p>2025: Formiran Savjet za upravljanje područjem Kotora</p> <p>2025: Izvršena revizija Menadžment plana za upravljanje područjem Kotora</p>	<p>Ministarstvo kulture i medija</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2026.</p>	<p>Realizovano</p> <p>1. Formiran Savjet za upravljanje područjem Kotora</p> <p>2. 2025. Izvršena revizija Menadžment plana za</p>	<p>/</p>	<p>1.760.000 €</p>	<p>929.000 €</p>	<p>Budžet Ministarstva kulture i medija 95% Budžeti institucija i organa državne uprave koji sprovode aktivnosti 5%</p>	

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	<p>2025: Donesen Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2025. godinu</p> <p>2026: Donesen Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2026. godinu</p>				<p>upravljanje područjem Kotora</p> <p>poslato UNESCO na mišljenje</p> <p>3. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2025. godinu</p>					
<p>18. Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija</p>	<p>Usvojene izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima</p>	<p>Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2026.</p>	<p>Djelimično</p>	<p>/</p>	<p>Godišnje 2.000€</p> <p>Ukupno 4.000€</p>	<p>/</p>	<p>Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%</p>	<p>Radna grupa, koju je formirao MERS je izradila Predlog zakona koji je upućen stručnim institucijama na davanje mišljenja. Nakon dobijanja istih, Predlog zakona će biti upućen</p>

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

									na davanje mišljenja i institucijama definisanim Poslovnikom Vlade CG. Imajući u vidu dinamiku, Zakon bi trebalo da bude usvojen i prije planiranog datuma završetka.	
19. Donošenje Zakona o seizmološkim poslovima	Usvojen Zakon o seizmološkim poslovima	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	/	Godišnje 7.500€ Ukupno 15.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	Radna grupa, koju je formirao MERS je izradila Predlog zakona. S obzirom da se radi o novom zakonu, kojim se prvi put uređuje ova oblast, za isti će u skladu sa procedurama biti organizovana Javna rasprava. Imajući vidu dinamiku,

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										Zakon bi trebalo da bude usvojen i prije planiranog datuma završetka.
20. Obuka meteorologa/škinja za primjenu mašinskog učenja i vještačke inteligencije u meteorologiji	Realizovana jednomjesečna obuka u ECMWF- obučeni jedan meteorolog/škinja	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026 I kvartal 2027. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena, što je onemogućilo organizaciju obuke.	20.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	Prioritetno osigurati finansiranje iz grantova ECMWF ili EU fondova za realizaciju obuke u 2026. ili 2027. godini.
21. Pripremne aktivnosti za izradu druge generacije Eurokoda 8	Prikupljeni i sistematizovani i svi potrebni podaci za izradu Eurokoda 8	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	I kvartal 2026. IV kvartal 2026.	Godišnje 2.500€ Ukupno 5.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	U cilju obezbjeđenja donacije za izradu nove karte seizmičkog hazarda podnijet je predlog

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										neophodne za uspješnu tranziciju na novu generaciju Eurokod normi.
22. Obuka za rad sa WISKI bazom hidroloških podataka	Realizovana jedna obuka – obučeno 6 inženjera/ki	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena, što je onemogućilo organizaciju obuke	10.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	Tražiti dodatna sredstva iz EU fondova za nastavak aktivnosti.
23. Migracija podataka u hidrološku bazu WISKI	Izvršena migracija podataka	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena, što je onemogućilo	10.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	Provjeriti mogućnosti za grantove od međunarodnih organizacija i IPA fondova. Neophodan update softwera I nabavka novog servera. Procijenjena

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

						o nabavku potrebne opreme i softvera.				vrijednost: ~ 30.000€
24. Revitalizacija mreže stanica za podzemne vode	Izvršena revitalizacija mreže stanica - 46 stanica za podzemne vode i monitoring podzemnih voda	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2027. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena, uz zavisnost od IPA fondova koji nisu realizovani.	Godišnje 12.500€ Ukupno 25.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 40% IPA fondovi 60%	Intenzivirati pregovore sa IPA fondovima i tražiti alternativne EU grantove za revitalizaciju u 2027. Više nije moguće osloniti se samo na revitalizaciju – neophodna je temeljna i sveobuhvatna rekonstrukcija. Procjenjena vrijednost investicije: ~300.000€
25. Izrada planske dokumentacije za zaštitu i spašavanja obrazovno-vaspitnih ustanova za	Izrađeni planovi zaštite i spašavanja od zemljotresa i požara	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	5.000€	/	Budžet Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 100%	Ralizovati aktivnost u narednom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

<p>zgradu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo i Ispitnog centra</p>										
<p>26. Izrada planske dokumentacije u oblasti zaštite i spašavanja za sve obrazovno- vaspitne ustanove u Crnoj Gori</p>	<p>Izrađeni preduzeti planovi za 50 obrazovno- vaspitnih ustanova</p>	<p>Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2026.</p>	<p>Djelimično</p>	<p>IV kvartal 2026 -80 ustanova ima plan zaštite i stasavanja od požara - 49 ustanova ima plan zaštite i spašavanja od zemljotresa -24 ustanove imaju Plan zaštite i spašavanja od poplava</p>	<p>2025– 50.000€ 2026 – 50.000€ Ukupno 100.000€</p>		<p>Budžet Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 30% Donacije 40% Međunarodni izvori finansiranja 30%</p>	<p>Nastaviti sa realizacijom započete aktivnosti</p>

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

29. Izrada Nacionalnog plana zaštite i spašavanje od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja	Izrađen Nacionalni plan za zaštitu i spašavanje od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja	Ministarstvo unutrašnjih poslova	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Realizovano	/	5.000€	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	
30. Jačanje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta zdravstvenog sistema u slučaju katastrofa	Izrađen integrisani plan koordinisanog postupanja u zdravstvenim kriznim situacijama	Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje	IV kvartal 2025.	II kvartal 2026.	Realizovano Izrađen Akcioni plan za prevenciju i pripremu odgovora na prekograničnu prijetnju zdravlju.	/	2025 – 5.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 10.000€	/	Sopstveni izvori, Vlada, budžet Ministarstva zdravlja –40 % Donatori, Međunarodne institucije (UNICEF, UNDP, SZO,) - 60 %	
31. Izrada smjernica za postavljanje ciljeva prilagođavanja na klimatske promjene	Izrađene smjernice	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	/	2025 – 12.500€ 2026 – 12.500€ Ukupno 25.000€	/	UNDP 100%	Planom prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025 – 2035 sa Akcionim planom za period 2025 – 2027 su definisane smjernice za

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										buduće revizije Plana, uključujući smjernice za postavljanje ciljeva prilagođavanja na klimatske promjene. Dalja razrada smjernica predviđena je kroz podzakonske akte koji će se donositi u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama.
32. Izrada smjernica za finansijsko planiranje prilagođavanja na klimatske promjene	Izrađene smjernice	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	/	2025 – 6.250€ 2026 – 6.250€ Ukupno 12.500€	/	UNDP 100%	Kroz Plan prilagođavanja na klimatske promjene već je uspostavljen osnovni finansijski okvir, odnosno definisan je set smjernica za buduće revizije Plana koje između ostalog obuhvataju i finansijsko planiranje za prilagođavanje

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										na klimatske promjene.
33. Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim vrstama rizika	Održane dvije godišnje konferencije Nacionalne platforme	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025 – 5.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 10.000€	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	
35. Obuka članova Komisija za procjenu šteta, gubitaka i potreba	2025–Izrađen Program obuke 2026 – Sprovedena obuka za 25 članova komisija	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano 2025. su realizovane 3 obuke	/	15.000€	10.000€	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	/
36. Izrada Zakona o prekursorima eksploziva	Izrađen Zakon o prekursorima eksploziva	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	II kvartal 2025.	II kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	5.000 €	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	
37. Nabavka drona za praćenje	Izvršena nabavka jednog drona	Privredno društvo za	I kvartal 2025.	IV kvartal 2025.	Realizovano	/	10.000 €	7.550,25€	Budžet Privrednog društva za	Nabavljena 3 drona 2024/2025, iz

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

aktivnosti na zaštiti šuma		gazdovanje šumama							gazdovanje šumama 100 %	budžeta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima 100%)
38. Izgradanja i instalacija potrebne infrastrukture za brzo djelovanje u cilju gašenja požara	Izrađen Plan izgradnje potrebne infrastrukture i sanacionih aktivnosti Obnovljeni i sanirani šumski putevi (minimum 5 km po parku)	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	2025 – 30.000€ 2026 – 30.000€ Ukupno 60.000€		Budžet JPNPCG 10 % Donatorska sredstva (IPA fondovi) 90%	Aktivnost će se realizovati u 2026. godini ukoliko se obezbijede finansijska sredstva iz EU fondova
39. Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa	Proširena mreža akcelerometara – izvršena nabavka 1 instalacija 2 akcelerometra	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026. Nabavljen i instaliran 1 akcelerometar i digitalizato. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu.	2025 – 40.000€ 2026 – 40.000€ Ukupno 80.000€	10.000€	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 100%	Tražiti dodatna sredstva iz EU fondova.
40. Rekonstrukcija	2025–Izrađen plan aktivnosti,	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026.	2025 – 40.000€	/	Kapitalni budžet Zavoda za	Ponovno aplicirati za JICA donaciju i

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

seizmološke mreže	<p>pribavljene potrebne dozvole i mapiran teren</p> <p>2026–izvršena priprema tenderske dokumentacije i nabavka opreme</p>	ogiju i seizmologiju				<p>Aktivnosti za 2025. su završene, Planirana parcijalna rekonstrukcija mreže, koja podrazumijeva nabavku 1 instumenta)</p> <p>Izrada nove stanice na Fraskanjeli, Ulcinj, kao i rekonstrukcija postojećih stanica, biće završena tokom 2026.</p>	<p>2026 – 40.000€</p> <p>Ukupno 80.000€</p>		<p>hidrometeorol ogiju i seizmologiju 30%</p> <p>IPA fondovi 30%</p> <p>Donacija JICA 40%</p>	<p>IPA fondove, uz internu optimizaciju resursa za preliminarne korake u 2026.</p>
41. Tehničko-tehnološko opremanje - nabavka meteorološkog	Izvršena priprema tenderske dokumentacije sa	Zavod za hidrometeorol ogiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	<p>IV kvartal 2027.</p> <p>Nedostatak finansijskih</p>	<p>2025 – 1.000.000 €</p>	/	<p>Kapitalni budžet Crne Gore 100%</p>	<p>Uključiti Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i</p>

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

<p>radara i edukacija meteorologa za korišćenje radara i praćenje meteoroloških sistema za Nowcasting prognoze</p>	<p>kompletnom tehničkom specifikacijom i nabavka radara i instalacija radara i obuka kadra</p>				<p>Nerealizovano</p>	<p>sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena.</p>	<p>2026 – 1.000.000 € Ukupno 2.000.000 €</p>		<p>IPA fondovi – dodatni troškovi</p>	<p>razvoja sjevera i Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a zbog prioriteta u sistemu ranog upozoravanja.</p>
<p>42. Uspostavljanje posebnog (Remote) sistema na obali (južni Jadran) za automatski meteorološki monitoring i online platforme za kretanje meteoroloških sistema za potrebe pomorsko-privredno-turističke sigurnosti u regionu južnog</p>	<p>2025–izvršena nabavka plutače za Ulcinj</p>	<p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2026.</p>	<p>Nerealizovano</p>	<p>IV kvartal 2027. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena, uz veću zavisnost od IPA fondova.</p>	<p>2025 – 100.000€ 2026 – 100.000€ Ukupno 200.000€</p>	<p>/</p>	<p>Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 10% IPA fondovi 90%</p>	<p>Jačati aplikacije za IPA fondove i razmotriti javno-privatna partnerstva sa javnim preduzećima kao što je Morsko Dobro za finansiranje u 2027.</p>

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Jadrana i obalnom dijelu.										
43. Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa – širenje mreže permanentnih GPS stanica	2025 – izrađen plan aktivnosti, pribavljene potrebne dozvole i mapiranje terena	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	I kvartal 2026. IV kvartal 2027. Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu; planirana sredstva nisu odobrena.	2025 – 5.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 10.000€	/	Budžet Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 40% EU fondovi 60%	Ponovno aplicirati za EU fondove i integrisati sa sličnim projektima za efikasnije finansiranje. S obzirom da se radi o vrlo zastarjeloj opremi, treba je u potpunosti zamijeniti i planirati još jednu referentnu GPS stanicu. Iznos koji je planiran projektom koji nije odobren za ove aktivnosti iznosio je 66.000€.
44. Obezbeđivanje prostornih podataka i novih e-servisa	Obezbeđeni prostorni podaci za 95% teritorije Crne Gore	Uprava za nekretnine	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	1. Sistem je u ranijem periodu uspostavljen i	400.000€	380.000€	Budžet Uprave za nekretnine 100%	Podaci se ažuriraju u kontinuitetu i dostupni e-servisi..

<p>iz nadležnosti Uprave za nekretnine za potrebe informacionog Sistema za zaštitu i spašavanje – Update postojećih podataka i obezbjeđivanje novih e-servisa</p>	<p>Obezbijeđeno 100 % podataka Adresnog registra</p>					<p>omogućeni e-servisi za preuzimanje podataka. Aktivnosti na obezbjeđivanju novih prostornih podataka iz nadležnosti UZN obavljaju se u kontinuitetu</p> <p>2. Sistem je uspostavljen i omogućeno svim lokalnim samoupravama korišćenje aplikacije za unos i održavanje podataka.</p>			<p>S obzirom na stalne promjene u prostoru, status realizacije ne može biti završen 100 %, ali na određeni datum postoji procjena. Veoma bitno je da je dostupnost podataka obezbijeđena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 92% 2. 50% 3. 100% <p>Za 3 neophodno aktivno uključivanje LS</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	Obezbijeđeno 100% podataka evidencije prostornih jedinica					LS kao izvor podataka su zadužene za unos podataka. Obezbjeđivanje podataka radi se u kontinuitetu, ali od strane nekih LS neophodna hitnost u ažuriranju.				
45. Unapređenje tehničke infrastrukture za	Izvršena nabavka neophodne infrastrukturne	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	3. Sistem uspostavljen i dostupni podaci na kojima je rađen popis stanovništva IV kvartal 2026.	2025 – 25.000€	/	Budžet Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija	Nastaviti sa realizacijom ove aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

potrebe preventivnog djelovanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	opreme za 50 obrazovno-vaspitnih ustanova					Urađena detaljna analiza. Određeni broj ustanova ima potrebnu opremu. Nastavak opremanja prema planu za 2026.godinu	2026 – 25.000€ Ukupno 50.000€		100%	
46. Izvođenje interesorne vježbe „Jadran 2025“	Izvedene dvije interesorne vježbe u 2025. i 2026. godini	Ministarstvo pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama	II kvartal 2025.		Nerealizovano	IV kvartal 2026.	2025 – 7.000€ 2026 – 7.000€ Ukupno 14.000€	/	Budžet Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama – 100%	Blagovremeno planirati vježbu
47. Projekat istraživanja terena za potrebe izrade karte odrona 1:200 000	2025/2026– Izvršeno prikupljanje dodatnih podataka iz raznih institucija za	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa Promjenjen naziv	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2028. Ovaj projekat će se	2025– 50.000€ 2026 – 50.000€ Ukupno	48.116,70€	Budžet Ministarstva rudarstva, nafte i gasa 100%	Nastaviti sa realizacijom ove aktivnosti

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	dopunu digitalnog katastra odrona, snimanje dronom i verifikacija podataka na terenu, obrada izvedenih snimaka dronom, analiza snimaka i prikupljenih podataka sa terena i izrada godišnjeg izvještaja;	Ministarstvo energetike i rudarstva				kontinuirano izvoditi dok se ne pokrije čitava teritorija Crne Gore.	100.000€			
48. Projekat istraživanja terena za potrebe izrade karte klizišta i debritnih tokova 1:200 000	2025/2026– Izvršeno prikupljanje i sistematizacija dodatnih podataka; Izvršeno pokretanje i godišnje održavanje portala klizišteprijave;	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa Promjenjen naziv Ministarstvo energetike i rudarstva	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	/ Projekat nije u planu realizacije	2025– 50.000€ 2026 – 50.000€ Ukupno 100.000€	/	Budžet Ministarstva rudarstva, nafte i gasa 100%	Razmotriti važnost realizacije ove aktivnosti i obezbijediti sredstva za realizaciju.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	Izvršena promocija projekta; Izvršena verifikacija podataka na terenu; Izvršena obrada podataka; Izrađeni godišnji izvještaji									
49. Projekat istraživanja terena za potrebe izrade karte ranjivosti podzemnih voda 1:200 000	Izrađena Karta ranjivosti podzemnih voda sa tumačem 2025: Izrađen Projekat za izvođenje karte ranjivosti podzemnih voda, 1:200 000, sa prikupljanjem, sistematizacijom i analizom postojećih podataka iz objavljenih	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa Promjenjen naziv Ministarstvo energetike i rudarstva	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	/	2025 – 45.000€ 2026 – 78.250€ Ukupno 123.250€	/	Budžet Ministarstva rudarstva, nafte i gasa – 80% EU fondovi – 20%	Razmotriti važnost realizacije ove aktivnosti i obezbijediti sredstva za realizaciju.


IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

radova i fondovskih materijala iz Zavoda za geološka istraživanja, kao i drugih institucija i Ministarstava nadležnih za vodne resurse i topografske podloge

Izvršena nabavka GIS (Geografski informacijski sistem) softvera

2026 - Izvršena sinteza prikupljenih podataka i verifikacija u procesu terenskog izviđanja terena,

Definirani hidrogeološki uslovi na području Crne Gore



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	Izrađen godišnji izvještaj									
50. Adaptacija magacinskih prostora na lokalitetu Rogami	Adaptirana 4 objekta	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2027. U budžetu za 2025. godinu nije bilo sredstava za sprovođenje male javne nabavke kojom bi se platili troškovi premjera i predračuna	2025 – 423.500 € Ukupno 423.500	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova – 30% EU fondovi, donacije –70 %	Planirati sredstva iz budžeta za ovu aktivnost kao i za sprovođenje male javne nabavke kojom bi se platili troškovi premjera i predračuna koji je urađen prošle godine.
OPERATIVNI CILJ 1.2	Priprema–povećanje informisanosti i pripravnosti stanovništva u pogledu rizika									
Indikator učinka	Polazna vrijednost			Prelazna vrijednost – 2028. godina			Ciljana vrijednost –2030. godina			
Broj različitih edukacija zainteresovanih strana u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	0			224 + 40 126 obučenih (prva pomoć i psihosocijalna podrška)			306 + 60 190 obučenih (prva pomoć i psihosocijalna podrška)			

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja
1. Napraviti bazu materijala o rizicima i zaštiti od katastrofa u okviru Crnogorskog Informacionog sistema za različite vrste rizika	Izrađena baza materijala - 10 edukativnih materijala - 5 materijala koji su prevedeni na strane jezike	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	III kvartal 2025.	Realizovano	/	3.000€	/	Budžet MUP-a Direktorat za zaštitu i spašavanje 100%	
2. Savjetovanje privatnih vlasnika šuma i udruženja privatnih vlasnika šuma o požarima i preduzimanju mjera u cilju zaštite od požara	2025. godina Izvršeno savjetovanje 15 privatnih vlasnika šuma 2026. godina Izvršeno savjetovanje 15 privatnih vlasnika/ca šuma	Privredno društvo za gazdovanje šumama Udruženja privatnih vlasnika šuma	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	I-IV kvartal 2026.	2025–500€ 2026–500€ Ukupno 1.000€	500€ U okviru redovnog budžeta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima	Budžet Privrednog društva za gazdovanje šumama 100 %	Nastaviti sa realizacijom započete aktivnosti
3. Edukacija–Obuka zaposlenih/	- Formirane i obučene 2	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026.	2025 – 15.000€	5.000€	Budžet JPNPCG 0–50 %	Realizovati aktivnosti u označenom

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

zainteresovanih strana	<p>preduzetne jedinice</p> <p>- Sprovedene minimum 2 obuke za službe zaštite: javljanja, obavještanje, reagovanje</p> <p>- Sprovedene obuke i edukativne aktivnosti za zainteresovane strane</p> <p>- minimum 5 predavanja</p> <p>Shodno Planu, izrađeni i opremljeni protivpožarni punktovi, nabavljena potrebna oprema</p>					<p>Izvršena redovna obuka Službe zaštite i Službe ambijentalne higijene od strane Direktorata za zaštitu i spašavanje. Izvršena je obuka Službe kontrole i monitoringa o korišćenju video nadzora za rano otkrivanje požara.</p>	<p>2026 – 15.000€</p> <p>Ukupno 30.000€</p>		<p>Donatorska sredstva (IPA fondovi) 50 – 100 %</p>	<p>periodu, planirati obuku i formirati preduzetne jedinice i sertifikovati učesnike za sposobnost gašenja požara.</p>
4. Organizovati savjetovanje sa NVO koji se bave zaštitom	<p>Izrađeno 5 preporuka vezanih za pojedinačne</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za</p>	<p>I kvartal 2025.</p>	<p>IV kvartal 2025.</p>	<p>Realizovano</p>		<p>5.000€</p>		<p>Budžet MUP-a Direktorat za zaštitu i</p>	

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

žena i ranjivih grupa stanovništva, nacionalnim i lokalnim institucijama i međunarodnim organizacijama radi definisanja specifičnih potreba žena i ranjivih grupa stanovništva u svim segmentima zaštite od katastrofa (informisanje i rano upozoravanje, odgovor, sigurnost, otporni gradovi)	segmente zaštite od katastrofa	zaštitu i spašavanje							spašavanje 100%	
7. Uspostavljanje i održavanje katastra riječnih nanosa sa ciljem registrovanja	2025 – Izrađen katastar riječnih nanosa 2026 – Ažuriran katastar sa pregledom	Uprava za vode	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026 Aktivnost je djelimično realizovana	2025 – 20.000€ 2026 – 20.000€ Ukupno	25.000€	Budžet Uprave za vode 100%	Finalizovati i operativno uspostaviti katastar riječnih nanosa kroz verifikaciju podataka i

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

promjena u koritima vodotoka	promjena na terenu					. Katastar riječnih nanosa je izrađen u tehničkom smislu, međutim proces nije u potpunosti finalizovan kroz verifikaciju, institucionalno usvajanje i uspostavljanje mehanizama za redovno ažuriranje, zbog čega katastar nije stavljen u punu funkciju.	40.000€			definisanje sistema održavanja.
8. Organizovanje kampanja i	Održano 6 edukativnih kampanja na	Ministarstvo ekologije, održivog	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	2025 – 15.000€		Ministarstvo ekologije, održivog	Aktivnost je u 2025. godini bila u fazi

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

<p>edukativnih programa koji će informisati građane/ke o klimatskim promjenama, njihovim efektima i načinima na koje mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa i prilagođavanju na klimatske promjene</p>	<p>temu smanjenja rizika od katastrofa (DRR) i klimatskih promjena u Crnoj Gori</p>	<p>razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo unutrašnjih poslova</p>					<p>2026 – 15.000€</p> <p>Ukupno 30.000€</p>		<p>razvoja i razvoja sjevera 50% i Ministarstvo unutrašnjih poslova 50%</p>	<p>strateškog usklađivanja sa krovnim Planom prilagođavanja na klimatske promjene (2025-2035). Kako bi se izbjeglo dupliranje aktivnosti i racionalizovala budžetska sredstva, realizacija kampanja je integrisana u budžetski ciklus za 2026. godinu, kada se očekuje puna implementacija. Kroz Plan javnih nabavki za 2026. godinu, kao i Planom prilagođavanja na klimatske promjene definisane su</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										konkretne mjere koje se odnose na kampanje i programske edukacije usmjerene na podizanje svijesti javnosti i jačanje kapaciteta zajednica za prilagođavanje klimatskim promjenama.
9. Promovisanje i unapređenje zdravlja, bezbjednosti i dobrobiti zajednice kroz edukaciju, motivaciju i praktičnu	Sprovedene akcije DDK prikupljenih jedinica krvi – 7486	Crveni krst Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano Tokom 2025 godine prikupljeno je 4763 jedinice krvi.	/	2025 – 47.000€ 2026 – 47.000€ Ukupno 94.000€	32.574€	Crveni krst Crne Gore 100%	/

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

podršku u oblasti dobrovoljnog davalatva krvi, prve pomoći, psiho-socijalne podrške i aktivnosti spasilaštva na vodi i uređenim skijalištima (Povećanje broja dobrovoljnih davalaca/teljki krvi, jačanje kapaciteta za pružanje prve pomoći, edukacija ranjivih grupa o kriznim situacijama,	Sprovedene radionice za ranjive grupe 10				Realizovano je 12 radionica za ranjive grupe (djeca, starija lica, tražioci azila, izbjeglice iz Ukrajine) -		960 €		
	Sprovedene obuke prve pomoći – 20000 (broj obučениh ljudi)				6785 osoba		15.000 €		

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

organizovanje takmičenja i vježbi prve pomoći, obuku spasilaca na vodi i skijalištima, pružanje psiho-socijalne podrške u kriznim situacijama, i promociju aktivnosti kroz izradu promotivnog materijala)	Sprovedene obuke na temu psiho-socijalne podrške (broj obučanih ljudi) - 63				79 ljudi obučeno je za pružanje psiho-socijalne podrške u kriznim situacijama		7.500 €		
	Sprovedene obuke spasilaca na vodi 12 obuka				16 jednodnevnih provjera za resertifikaciju – 525 spasilaca 4 sedmodnevnih obuka za nove spasioce – 120 spasilaca		25,000 €		

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	Sprovedene obuke spasilaca na ski stazama (broj obuka) 20				20 ljudi obučeno je i resertifikovano za spasioce na ski-stazama—			4.800 €		
10. Obilježavanje 13. oktobra - Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa	Obilježen 13 oktobar – uvršten u školski kalendar kao dio slobodnog kurikuluma – sprovođenje aktivnosti na godišnjem nivou	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025 – 4.000€ 2026 – 4.000€ Ukupno 8.000€	3.748 € Sredstva obezbijede na putem projekta koji finansira Evropska komisija, a sprovodi Direktorat za zaštitu i spašavanje pod nazivom „Mjere prevencije i pripremljenosti	Budžet Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija 100 %	Organizovan likovni konkurs za učenike osnovnih škola na temu: „Evropski broj za hitne situacije 112“

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

								upravljanja rizicima od katastrofa u Crnoj Gori”		
11. Edukacija i podizanje svijesti stanovništva o uticaju klimatskih promjena i katastrofa na zdravlje	Organizovana najmanje jedna kampanja Izrađeni edukativni materijali u okviru kampanje	Ministarstvo zdravlja / Institut za javno zdravlje	IV kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	2025 – 5.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 10.000€	/	Sopstveni izvori, Vlada, budžet Ministarstva zdravlja – 40 % Donatori, Međunarodne institucije (UNICEF, UNDP, SZO...) – 60 %	Formirati stručni tim u Institutu za javno zdravlje kako bi se realizovala ova aktivnost
12. Izrada 2 informativna trening modula za zaposlene u javnoj upravi, nevladinom sektoru uz mogućnost pristupa modulima široj javnosti	Održan jedan modul	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Uprava za ljudske resurse	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično Tokom 2025. godine razvijeno je ukupno 8 modula obuke koji su relevantni za pitanja	Realizacija teče planiranom dinamikom . Svi moduli će biti javno dostupni tokom marta 2026. godine na online	2025 – 10.000€ 2026 – 1.500€ Ukupno 11.500€	80.000€ od strane donatora UNDP, CIBIT, GEF 7	Projekti koji za temu imaju unapređenje kapaciteta u oblasti klimatskih promjena, smanjenja rizika od katastrofa 100%	Nakon što obuke/moduli postanu dostupni na online platformi Uprave za ljudske resurse, motivisati zaposlene u sektoru da iskoriste materijale i dostupnost

					<p>klimatskih promjena i prilagodnja na klimatske promjene koji pokrivaju oblasti strateškog planiranja, priprema studija zaštite i revizija zaštićenih područja uz uključenje javnosti (sa izraženim elementima planiranja rizika), procjena kapaciteta upravljača zaštićenih područja da reaguju na požare, transparentnost u</p>	<p>platformi Uprave za ljudska resurse.</p>				<p>modula za unapređenje sopstvenog znanja iz oblasti.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

					kontekstu klimatskih promjena, upravljanje podacima, prilagođavanje na klimatske promjene, priručnik za procjene ranjivosti, kao i finasiranje u klimatskim promjenama					
13. Izrada smjernica za procjenu ranjivosti na klimatske promjene	Izrađena jedna smjernica	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	/	2025 – 9.000€ 2026 – 9.000 € Ukupno 18.000€	/ Nije bilo realizovanih isplata iz budžeta Ministarstva u izvještajnom periodu jer su pripremne faze izrade smjernica pokrivene donatorski	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera 20% UNDP 80%	U narednom periodu će se pristupiti realizaciji planiranih aktivnosti na izradi smjernica za procjenu ranjivosti na klimatske promjene. Takođe, važno je napomenuti da je izradi Plana prilagođavanja

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

								m sredstvima.		na klimatske promjene prethodilo sprovođenje detaljne procjene ranjivosti za prioritetne sektore, pri čemu je izrađen i spisak konkretnih mjera prilagođavanja koje će biti implementirane.
14. Izrada informacionog trening modula na temu procjene ranjivosti na klimatske promjene za zaposlene u javnoj upravi, nevladinom sektoru uz mogućnost pristupa modulima široj javnosti	Razvijen jedan modul i promovisan od strane mreže koordinatora/ki	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Uprava za ljudske resurse UNDP	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično Modul na temu procjene ranjivosti na klimatske promjene je razvijen. Naredni korak prilagođavanje materijala kako bi bio	Realizacija teče planiranom dinamikom. Planira se da na platformi modul bude dostupan u prvoj polovini 2026	2025 – 1.666€ 2026 – 1.666€ Ukupno 3.333€	10.000€ od strane donatora UNDP, CIBIT, GEF 7	Projekti koji za temu imaju unapređenje kapaciteta u oblasti klimatskih promjena, smanjenja rizika od katastrofa 100%	Nakon što obuke/moduli postanu dostupni na online platformi Uprave za ljudske resurse, motivisati zaposlene u sektoru da iskoriste materijale i dostupnost modula za unapređenje sopstvenog

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

					dodat na online platformu Uprave za ljudska resurse.					znanja iz oblasti.
15. Izrada informacionog trening modula na temu za postavljanje ciljeva prilagođavanja na klimatske promjene za zaposlene u javnoj upravi, nevladinom sektoru uz mogućnost pristupa modulima široj javnost	Razvijen jedan modul i promovisan od strane mreže koordinatora/ki	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Uprava za ljudske resurse UNDP	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično Modul na temu procjene ranjivosti na klimatske promjene je razvijen. Naredni korak prilagođavanje materijala kako bi bio dodat na online platformu Uprave za ljudska resurse.	Realizacija teče planiranom dinamikom Planira se da na platformi modul bude dostupan u prvoj polovini 2026	2025 – 1.666€ 2026 – 1.666€ Ukupno 3.333€	10.000€ od strane donatora UNDP, CIBIT, GEF 7	UNDP 100%	Nakon što obuke/moduli postanu dostupni na online platformi Uprave za ljudska resurse, motivisati zaposlene u sektoru da iskoriste materijale i dostupnost modula za unapređenje sopstvenog znanja iz oblasti.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

16. Izrada informacionog trening modula na temu finansijsko planiranje prilagođavanja na klimatske promjene za zaposlene u javnoj upravi, nevladinom sektoru uz mogućnost pristupa modulima široj javnosti	Razvijen jedan modul i promovisan od strane mreže koordinatora/ki	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Uprava za ljudske resurse UNDP	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično Modul je razvijen. Planira se da na platformi modul bude dostupan tokom marta 2026.	Realizacija teče planiranom dinamikom . Planira se da na platformi modul bude dostupan tokom marta 2026.	2025 – 1.666€ 2026 – 1.666€ Ukupno 3.333€	10.000€ od strane donatora UNDP, CIBIT, GEF 7	UNDP 100%	Nakon što obuke/moduli postanu dostupni na online platformi Uprave za ljudska resurse, motivisati zaposlene u sektoru da koriste materijale i dostupnost modula za unapređenje sopstvenog znanja iz oblasti.
17. Integracija Zelenih rješenja za prirodne katastrofe (NbS) u sektorsko i nacionalno planiranje	Izrađena Mapa puta za mainstreaming NbS u planiranje smanjenja rizika od katastrofa Unapređene metodologije izrade strateškog dokumenata sa	Ministarstvo unutrašnjih poslova	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano Planirano je da se realizuju aktivnosti kao dio GEF8 alokacije. Predlog projekta za GEF8 je i dalje u fazi	IV kvartal 2028	2025 – 58.333€ 2026 – 58.333€ Ukupno 116.666€	110.505€	Globalni fond za životnu sredinu 100%	Osigurati da se razvije adekvatan projektni zadatak I plan aktivnosti za realizaciju aktivnosti kroz projekat GEF8.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	<p>smjernicama za uključenje NbS</p> <p>Doprinijeto izradi Nacionalnih strategija i akcionih planova za očuvanje bioraznородnosti (NBSAP) i finansiranje zaštite bioraznородnosti kako bi se identifikovale sinergije sa ciljevima NDC, NAP i DRR strategije</p> <p>U saradnji sa Nacionalnim Savjetom za održivi razvoj organizovan multi-stakeholderski forum za promociju</p>				<p>pripreme (finalni komentar i finalizacija projekta se očekuje tokom marta 2026)</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	međusektorske saradnje na NbS Razvijen pilot projekte za implementacij u NbS rješenja: makar 1 predlog projekta									
18. Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa – 13. oktobar	Održane 2 kampanje	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025 – 5.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 10.000€	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	
19. Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavoda za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim	Održane obuke i stručne radionice zaposlenih za funkcionalno korišćenje GIS softvera i drugih naprednih geoloških	JU Zavod za geološka istraživanja	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2027. Razlog djelimične realizacije je nepredviđe na stavka u Programu	2025 – 20.000€ 2026 – 5.000€ Ukupno 25.000	7.000€	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa – 80% EU fondovi – 20%	Realizovati što više obuka i učešća na stručnim i naučnim skupovima.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

radionicama itd.)	vještina i tehnologija					geoloških istraživanja za 2025.g. Takođe veći dio 2025. godine Zavod je bio bez rukovodnog kadra.				
20. Jačanje administrativnih kapaciteta institucija kulture u upravljanju rizicima od katastrofa	<p>Održana 1 obuka za edukaciju direktora ustanova i zaposlenih u kulturi</p> <p>Održana 2 info dana/radionice za, lokalnu zajednicu, vlasnike/ce i držaoce/teljke kulturnih dobara sa najmanje 20/30 učesnika/ca po danu</p>	Ministarstvo kulture i medija	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	<p>Realizovano</p> <p>Održana 2 info dana/radionice za, lokalnu zajednicu, vlasnike/ce i držaoce/teljke kulturnih dobara sa najmanje 20/30 učesnika/ca po danu-</p>	/	<p>2025 – 2.000 €</p> <p>2026 – 2000 €</p> <p>Ukupno 4.000€</p>	750€	<p>Budžet Ministarstva kulture i medija 70%</p> <p>Budžeti institucija i organa državne uprave koji sprovode aktivnosti 30%</p>	

STRATEŠKI CILJ 2.	Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa									
OPERATIVNI CILJ 2.3	Uzbunjivanje–poboljšanje ranog upozoravanja									
Indikator učinka	Polazna vrijednost			Prelazna vrijednost–2028. godina			Ciljana vrijednost–2030. godina			
Broj uspostavljenih savremenih sistema ranog upozoravanja	0			2			2			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.3	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja
1. Studija izrade sistema video nadzora u nacionalnim parkovima za potrebe ranog otkrivanja požara, kontrole nelegalnih aktivnosti i ostalih	Izrađena Studija uspostavljanja video nadzora za brzo otkrivanje požara na području nacionalnih parkova	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	2025 – 25.000€ 2026 – 25.000€ Ukupno 50.000€	/	Budžet JPNPCG 0 – 15 % Donatorska sredstva (IPA fondovi) 85 – 100 %	Realizacija aktivnosti će se sprovesti, kada se obezbjede finansijska sredstva, kroz projekat JICA, uz prioritet izrade Studije, kao i nabavku i instalaciju sistema video-

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

incidenata koji utiču na prirodno okruženje										nadzora za rano otkrivanje požara.
2. Uspostavljanje sistema monitoringa šumskih ekosistema	Uspostavljen operativni informacijski sistem o šumama	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvenu industriju; Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	I kvartal 2027. IV kvartal 2031.	2025 – 400.000€ 2026 – 308.000€ Ukupno 708.000€	/	EK (IPA III kroz projekat „Uspostavljanje informacijskog sistema u šumarstvu”) GEF (Projekat „II nacionalna inventura šuma u CG”) FAO (Podrška sistemu planiranja gazdovanja šumama u CG) Budžet CG (Realizacija Strategije razvoja šumarstva 2024–2029– razvoj integrisanog sistema planiranja	Projekat je skinut sa liste projekata koji se finansiraju kroz EU IPA fondove, zbog neosnivanja državnog preduzeća za gazdovanje šumama. U narednom periodu ova aktivnost predviđena je kroz projekat “Šume Crne Gore za zajednički prosperitet”, koji je u fazi predloga. Odluka o odobravanju projekta se očekuje u II

									gazdovanja šuma) (EU 0,4; GEF 1,6; FAO 0,18 i Budžet 0,36)	kvartalu ove godine.
OPERATIVNI CILJ 2.5	Sigurnost-osiguravanje snažnog sistema civilne zaštite									
Indikator učinka	Polazna Vrijednost			Prelazna vrijednost – 2028. godina			Ciljana vrijednost – 2030. godina			
Broj osposobljenih pripadnika – ca na nacionalnom nivou za jači sistem zaštite i spašavanja	0			1330			3390			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.5	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuć e obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenj e aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja
1. Organizovanje osposobljavanja i usavršavanja pripadnika/ca specijalističkih i dobrovoljnih jedinica za zaštitu i spašavanje	Izvršena obuka za oko 60 osoba	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično Izvršena obuka za 18 pripadnika/c a specijalistič kih i dobrovoljni h jedinica za	IV kvartal 2026.	2025 – 50.000€ 2026 – 50.000€ Ukupno 100.000€	20.330€	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	Nastaviti sa realizacijom u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

					zaštitu i spašavanje					
2. Pобољшanje tehničke opremljenosti Direktorata za zaštitu i spašavanje (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju zemljotresa)	Izvršena nabavka opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje od zemljotresa	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025 – 250.000€ 2026 – 250.000€ Ukupno 500.000€	112.919€ Oprema i sredstva za zaštitu i spašavanje u slučaju zemljotresa	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 100%	Pored opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje u slučaju zemljotresa nabavljena je i oprema za zaštitu i spašavanje 260.255€
3. Nabavka protivpožarne opreme i materijala za protivpožarnu opremu koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju odgovora na ublažavanje i otklanjanju posljedica požara.	Izvršeno nabavka protivpožarne opreme i materijala za 300 pripadnika/ca Vojske	Ministarstvo odbrane – Direktorat za logistiku	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Djelimično	I kvartal 2026. Prvi kontigent PP opreme isporučen je tokom 2025. godine. Za drugi kontigent završen je tenderski postupak, te se isporuka očekuje	2025 – 100.000€ 2026 – 100.000€ Ukupno 200.000€	25.000€	Budžet – Ministarstvo odbrane 100%	Buduće nabavke planiraju se finansirati iz redovnih budžetskih sredstava Ministarstva u okviru godišnjih budžetskih aproprijacija, bez preuzimanja dodatnih finansijskih obaveza van važećih

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

						tokom marta 2026. godine				planskih dokumenata.
4. Nabavka opreme za traganje i spašavanje koja će biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju osiguravanja snažnog sistema civilne zaštite.	Izvršena nabavka opreme za traganje i spašavanje za 4 pripadnika/ce Vojske (2 tima)	Ministarstvo odbrane – Direktorat za logistiku	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano		2025 – 43.000€	50.000€	Budžet – Ministarstvo odbrane 100%	nabavke planiraju se finansirati iz redovnih budžetskih sredstava Ministarstva u okviru godišnjih budžetskih aproprijacija, bez preuzimanja dodatnih finansijskih obaveza van važećih planskih dokumenata
							2026 – 43.000€			
							Ukupno 86.000€			
STRATEŠKI CILJ 3.	Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti									
OPERATIVNI CILJ 3.4	Odgovor – jačanje kapaciteta za odgovor									

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Indikator učinka	Polazna vrijednost			Prelazna vrijednost – 2028. godina			Ciljana vrijednost – 2030. godina			
Broj vazduhoplova za bolji odgovor na katastrofe	5			8			8			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.4	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja
1. Nabavka višenamjenskog helikoptera	Izvršena nabavka helikoptera, obuka 2 pilota 2 tehničara	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV 2030.	2025 – 23,746.25 0 € 2026 – 151.250€ Ukupno 23.897.500 €	/	Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova – 30% Donacija EU programi ili krediti 70%	
STRATEŠKI CILJ 4.	Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i za unaprijedenu ponovnu izgradnju (Build Back Better) prilikom oporavka, sanacije i obnove									
OPERATIVNI CILJ 4.6	Učiniti gradove otpornim									
Indikator učinka	Polazna vrijednost			Prelazna vrijednost – 2028. godina			Ciljana vrijednost – 2030. godina			

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Broj strateških, planskih i drugih akata za otpornije gradove	67			90			109			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.6	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Status realizacije AAA	Novi rok za realizaciju (uz odgovarajuće obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana	Izvor finansiranja	Preporuke za naredni period sprovođenja
1. Izrada akustičkih studija: Nikšić, Šavnik, Žabljak, Bijelo Polje, Kolašin, Zeta	Izrađene akustičke studije u 6 lokalnih samouprava	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Nikšić II kvartal 2025.	Nikšić III kvartal 2026.	Nerealizovano	II kvartal 2026.	Nikšić 10.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Šavnik I kvartal 2025.	Šavnik IV kvartal 2025.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Šavnik 7.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Žabljak I kvartal 2025.	Žabljak IV kvartal 2025.	Nerealizova no	I kvartal 2026.	Žabljak 7.000€	Utrošeno je 3.100€ ali za izradu lokalne Strategije koja je planirana za 2027. godinu	Budžet Opštine 100%	Tokom 2025.god. Opština Žabljak-Služba zaštite izradila je Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa koja je bila planirana za izradu u 2027.god. i sredstva za akustičku studiju su usmjerena na lokalnu strategiju.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Zeta I kvartal 2025.	Zeta IV kvartal 2025.	Djelimično	IV kvartal 2026 Stupili u kontakt sa firmom i dobili ponudu od koja se uklapa u finansijski okvir	Zeta 5.000€ Ukupno 42.000€	/	Budžet Opštine 100%	Nedovršen proces razgraničenja sa susjedim opštinama, a od tog procesa zavisi veličina teritorije koja treba da bude obuhvaćena studijom
2. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja: Bar, Budva, Cetinje, Nikšić, Plužine	Izrađeno 5 planova zaštite i spašavanja od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Bar II kvartal 2024.	Bar II kvartal 2025 .	Djelimično	IV kvartal 2026.	Bar 5.000€	5.000€	Budžet Opštine 100%	Nastaviti rad na Opštinskom planu u skladu sa Nacionalnim planom z/s od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja koji je usvojen krajem 2025.
			Budva IV kvartal 2025.	Budva IV kvartal 2026.	Nerealizova no	II kvartal 2026.	Budva 10.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom period

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Nikšić III kvartal 2025.	Nikšić IV kvartal 2026.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Nikšić 10.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom period
3. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika: Bar, Budva	Izrađena 2 plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Bar II kvartal 2025.	Bar II kvartal 2025.	Realizovano	/	Bar 5.000€	5.000€	Budžet Opštine 100%	/
			Budva III kvartal 2025.	Budva III kvartal 2026.	Nerealizova no	III kvartal 2027.	Budva 10.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom period
							Ukupno 15.000€			
4. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od klizišta i odrona: Budva, Cetinje, Danilovgrad, Plužine, Pljevlja, Mojkovac	Izrađeno 6 planova zaštite i spašavanja od klizišta i odrona na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Budva IV kvartal 2025.	Budva IV kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026.	Budva 10.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom period
			Plužine I kvartal 2025.	Plužine IV kvartal 2025.	Nerealizova no	I kvartal 2026 – IV kvartal 2026.	Plužine 5.000€	/	Budžet Opštine 100%	Započeti su pregovori oko sastava radne grupe

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

5. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od poplava: Zeta, Tivat, Gusinje i Petnjica	Izrađena 4 plana zaštite i spašavanja od poplava na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Gusinje I kvartal 2025.	Gusinje IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2027.	Gusinje 2.000€	/	Budžet Opštine 100%	Planirati dodatna budz.sredstva za implementaciju prioriternih mjera iz planova.
6. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od požara: Zeta, Ulcinj, Plav	Izrađena 3 plana zaštite i spašavanja od požara na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Ulcinj IV kvartal 2025.	Ulcinj III kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026. Prikupljaju se podaci i unose u Gis	Ulcinj 15.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Obuka lica za unošenje podataka u Gis. Uključiti više stručnih lica za izradu planova.
7. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća: Bar, Budva, Danilovgrad	Izrađeno 3 plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Bar II kvartal 2024.	Bar II kvartal 2025.	Realizovano	/	Bar 5.000€	5.000€	Budžet Opština 100%	/
			Budva I kvartal 2025.	Budva I kvartal 2026.	Nerealizovano	III kvartal 2027.	Budva 10.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Danilovgrad I kvartal 2025.	Danilovgrad IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvarta 2027. Aktivnost nije	Danilovgrad 2.000€	/	Budžet Opštine Danilovgrad	Realizovati aktivnost u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

					realizovana zbog nedostavljanja neophodnih podataka od dijela privrednih subjekata.		Ukupno 17.000€			
8. Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja od zemljotresa: Zeta, Nikšić, Šavnik	Izrađena 3 Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Nikšić III kvartal 2025.	Nikšić IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Nikšić 10.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Šavnik I kvartal 2025.	Šavnik IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Šavnik 5.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu
9. Izrada lokalnih Procjena rizika od katastrofa : Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Andrijevica, Gusinje, Petnjica, Plav,	Izrađeno 14 Procjene rizika od katastrofa na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Kotor I kvartal 2025.	Kotor IV kvartal 2025.	Realizovano	/	Kotor 5.000€	6.900€	Budžet Opštine 100 %	/
			Pljevlja II kvartal 2025.	Pljevlja IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Pljevlja 4.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Izraditi lokalnu procjenu rizika u naznačenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Rožaje, Berane, Kolašin, Zeta, Podgorica			Andrijev ica I kvartal 2025.	Andrijev ica IV kvartal 2025.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Andrijev ica 7.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Gusinje I kvartal 2025.	Gusinje I kvartal 2026.	Nerealizova no	IV kvartal 2027.	Gusinje 7.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Jačati tehničke kapacitete službi zaštite i spašavanja (oprema, GIS, obuke) Kandidovati projekte za finansiranje iz nacionalnih i mđunarodnih fondova
			Plav I kvartal 2025.	Plav IV kvartal 2025.	Nerealizova no	III kvartal 2026.	Plav 10.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Rožaje I kvartal 2025.	Rožaje IV kvartal 2025.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Rožaje 10.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Realizovati aktivnost u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Kolašin I kvartal 2025.	Kolašin IV kvartal 2025.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Kolašin 5.000€	/	Budžet Opštine 100 %	Za potrebna sredstva aplicirano kod EU-fondova
10. Izrada lokalnih Strategija za smanjenje rizika od katastrofa: Ulcinj, Tivat, Kotor, Nikšić, Bijelo Polje, Andrijevića, Gusinje, Plav, Rožaje, Kolašin, Mojkovac, Berane, Zeta, Podgorica	Izrađeno 14 Strategija na lokalnom nivou	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Tivat II kvartal 2025.	Tivat II kvartal 2026.	Djelimično	IV kvartal 2026.	Tivat 5.000€		Budžet Opštine 100%	Planirati i obezbijeditinovčana sredstva za izradu lokalne strategije
			Nikšić čeka se usvajanje i kvartal 2026	Nikšić čeka se usvajanje i kvartal 2026.	Djelimično	I kvartal 2026	Nikšić /	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Bijelo Polje II kvartal 2024.	Bijelo Polje IV kvartal 2025.	Nerealizova no	IV kvartal 2026. godine	Bijelo Polje 3.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Gusinje I kvartal 2025.	Gusinje I kvartal 2026.	Nerealizovano	I kvartal 2027.	Gusinje 5.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Mojkovec I kvartal 2025.	Mojkovec IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026. Aktivnost je nerealizovana zbog nedostatka kadrovske kapaciteta	Mojkovec 15.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u naznačenom periodu, formirati radnu grupu za izradu lokalne strategije
			Berane I kvartal 2025.	Berane IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026	Berane 7.000€	/	Budžet Opštine 100%	Realizovati aktivnost u naznačenom periodu, formirati radnu grupu za izradu lokalne strategije
			Zeta I kvartal 2025.	Zeta IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2026	Zeta 5.000€	/	Budžet Opštine 100%	Nedovršen proces razgraničenja sa susjednim opštinama, a od tog procesa zavisi veličina teritorije koja treba da bude

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										obuhvaćena Strategijom
			Podgorica I kvartal 2025.	Podgorica IV kvartal 2025.	Djelimično	I kvartal 2026. (održana javna rasprava 27.01.2026. godine, upućene primjedbe i sugestije na upoznavanj e)	Podgorica 10.000€ Ukupno 106.000€	15.000€ Finansiran o od strane UNDP-a	Budžet Opštine 100%	Dovršiti proces realizacije aktivnosti
11. Izvođenje radova po Glavnom projektu rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani	Sprovedena rekonstrukcija dijela nasipa Štodra – Sukobin Sprovedena rekonstrukcija nasipa: Sveti Nikola – Reč (6,337 m), Sutjel – Sveti Đorđe (1,455 m)	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2028. IV kvartal 2031.	2025. – 500.000€ 2026. – 2.000.000 € Ukupno 2.500.000 €	/	EU IPA III sredstva 100%	Projekat se nalazi na listi za odobravanje projekata kroz EU IPA III. Tenderski postupak će biti pokrenut u toku III kvartala 2027. godine, tenderska procedura traje oko godinu dana od dana

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

										objavljivanja, a sam projekat će trajati 36 meseci.
12. Izvođenje radova po Glavnom projektu regulacije rijeke Lim u Bijelom Polju i Beranama	Izvedeni radovi po projektu regulacije rijeke Lim u Bijelom Polju i Beranama	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za vodoprivredu	I kvartal 2025.	IV kvartal 2026.	Realizovano	/	2025. – 4.300.000 € 2026. – 4.300.000 € Ukupno 8.600.000 €	Realizovana sredstva za Bijelo Polje 4.628.303,83 € Realizovana sredstva za Beranama 4.381.470,84 €	Regionalni Program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine (SDIP) – Inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama 100%	Kada je u pitanju regulacija rijeke Lim u Beranama završeno je 90% radova, završetak se planira u martu 2026.
13. Izgradnja smještajnih kapaciteta Službi zaštite i spašavanja:	Izrađene 3 adekvatna smještajna kapaciteta – Vatrogasna doma	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Tivat I kvartal 2025.	Tivat IV kvartal 2026.	Nerealizovano Idejno resenje vatrogasne	IV kvartal 2029.	Tivat 433.332€	/	Budžet Opštine – Tivat	Realizovati aktivnost u označenom periodu

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

Tivat, Pljevlja i Kolašin				stanice je izabrano, dati su prijedlozi za promjenu istog kako bi se uradio projekat.					
	Pljevlja I kvartal 2025.	Pljevlja IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2027.god. Projekat još nije moguće realizovati zbog nedostatka sredstava, ali će se u narednom period raditi na revidiranje projekta zbog izmjene standarda pa se očekuje izgradnja u 2027. god.	Pljevlja 2.000.000 €	/	Projekti – Pljevlja	Realizovati aktivnost u naznačenom periodu	

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

			Kolašin I kvartal 2025.	Kolašin IV kvartal 2026.	Nerealizova no	IV kvartal 2026.	Kolašin 2.307.000 €	/	Budžet 697.000€ i Projekti 1.610.000€ – Kolašin	
							Ukupno 4.740.332 €			
14. Jačanje tehničkih kapaciteta Službi zaštite i spašavanja: Danilovgrad, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin	2025/26 – 4 opštine	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Danilovg rad I kvartal 2025.	Danilovg rad IV kvartal 2026.	Djelimično	III kvartal 2026.	Danilovg rad 12.000€	/	Projekti (Danilovgrad)	Nastaviti sa realizacijom aktivnosti u označenomperi odu.
	Pljevlja Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme		Pljevlja I kvartal 2025.	Pljevlja IV kvartal 2026.	Realizovano	Nastaviće se sa aktivnostim a nabavke opreme do kraja planiranog perioda	Pljevlja 66.666€	68.785,00€	Budžet, projekti i donacije	Nastaviti realizaciju ove aktivnosti

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

	Mojkovac Nabavka opreme		Mojkova c I kvartal 2025.	Mojkova c IV kvartal 2026.	Realizovano	Nastaviće se sa aktivnostim a jačanja tehničkih kapaciteta do IV kvartala 2026.	Mojkova c 5.000€	5.000€	Budžet Opštine (Mojkovac)	Nastaviti sa realizacijom aktivnosti, staviti akcenat na nabavku opreme koja omogućava efikasno reagovanje (zaštitna oprema, vozni park, transportna oprema itd.)
	Kolašin Nabavka opreme za punjenje i servisiranje vatrogasnih aparata		Kolašin I kvartal 2025.	Kolašin IV kvartal 2025.	Nerealizovano	II kvartal 2027.	Kolašin 20.000€	/	Budžet Opštine	Realizovati aktivnost u navedenom periodu.
15. Uspostavljanje sistema obavještanja i uzbunjivanja– Nabavka	Uspostavljanje sistema obavještanja i uzbunjivanja u 6 lokalnih samouprava	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Herceg Novi I kvartal 2025.	Herceg Novi IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.god.	Herceg Novi 6.666€	7. 900 € Izrada Akustične studije	Budžet Opštine	Realizovati aktivnost u navedenom periodu.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

opreme i postavljanje opreme: Herceg Novi, Bar, Tivat, Nikšić, Šavnik, Žabljak			Bar I kvartal 2025.	Bar IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2027. Aktivnost nije realizovana jer nije dobijena odgovarajuća ponuda	Bar 3.333€	/	Budžet Opštine	Ponovno pokretanje postupka u narednom periodu, radi dobijanja adekvatne ponude kako bi u potpunosti ispunjavala tehničke i finansijske uslove.
			Tivat II kvartal 2025.	Tivat IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2029.	Tivat 15.000€	/	Budžet Opštine	Preporučuje se da toranj za sistem obavještanja i uzbunjivanja bude projektovan na što je moguće višoj tački objekta radi efikasnijeg funkcionisanja sistema.
16. Uspostavljanje sistema obavještanja i uzbunjivanja	Uspostavljeni sistemi obavještanja i uzbunjivanja	Organi lokalne samouprave, Služba zaštite i spašavanja	Ulcinj III kvartal 2025.	Ulcinj II kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Ulcinj 15.000€	/	Budžet Opštine	Realizovati aktivnost u označenom periodu
							Ukupno 74.999€			

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA, ZA 2025. GODINU

(izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje): Ulcinj, Budva, Cetinje, Podgorica	u 4 lokalne samouprave		Budva I kvartal 2025.	Budva IV kvartal 2026.	Nerealizovano	IV kvartal 2026.	Budva 3.333 €	/	Budžet Opštine	Realizovati aktivnost u označenom periodu
			Cetinje I kvartal 2025.	Cetinje IV kvartal 2025.	Nerealizovano	IV kvartal 2027. Aktivnost nije realizovana jer nije bilo dovoljno finansijskih sredstava	Cetinje 20.000€ Ukupno 68.333€	/	Budžet Opštine	Obezbijediti sredstva i realizovati aktivnost u navedenom periodu.

4. Preporuke za naredni period sprovođenja

Na osnovu analize realizacije aktivnosti u 2025. godini, identifikovane su okolnosti koje su uticale na dinamiku sprovođenja Strategije, posebno u dijelu finansiranja, administrativnih procedura i koordinacije institucija. Za efikasniju implementaciju u narednom periodu, preporuke se odnose na prioritete aktivnosti koje su djelimično realizovane ili nijesu započete, s fokusom na plansku dokumentaciju, tehničko opremanje i jačanje otpornosti gradova.

Opšte preporuke

- Pravovremeno planirati i obezbijediti finansijska sredstva, koristeći nacionalne budžete i međunarodne fondove.
- Ojačati koordinaciju između nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou radi efikasnijeg sprovođenja aktivnosti.
- Prioritetno realizovati djelimično ili nerealizovane aktivnosti uz jasno definisane rokove i odgovornosti.
- Fokusrirati se na jačanje sistema ranog upozoravanja, kapaciteta civilne zaštite i lokalne otpornosti.
- Unaprijediti sistem praćenja sprovođenja Strategije kroz redovno prikupljanje i razmjenu podataka.

Specifične preporuke po institucijama

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje

- Završiti edukaciju i osposobljavanje članova timova za zaštitu i spašavanje.
- Realizovati adaptaciju magacinskih prostora i nabavku helikoptera sa obukom pilota i tehničara.
- Redovno održavati Nacionalnu platformu za smanjenje rizika od katastrofa i konferencije.
- Završiti izradu Zakona o prekursorima eksploziva.

Ministarstvo prosvjete / Zavod za školstvo

- Nastaviti izradu i ažuriranje planske dokumentacije u obrazovnim ustanovama.
- Završiti opremanje i tehničku infrastrukturu prema planu za 2026. godinu.
- Organizovati savjetovanja i uključiti obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u kurikulum.

Ministarstvo zdravlja / Institut za javno zdravlje

- Jačati kapacitete zdravstvenog sistema za krizne situacije i prekogranične prijetnje.
- Redovno ažurirati akcione planove prevencije i pripreme za krizne situacije.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

- Organizovati kampanje i edukacije o klimatskim promjenama i smanjenju rizika, u koordinaciji sa MUP-om.
- Nastaviti izradu i implementaciju smjernica za prilagođavanje klimatskim promjenama.
- Podržati nabavku infrastrukture i tehničkih sistema u saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Nastaviti implementaciju sistema monitoringa šumskih ekosistema kroz projekat „Šume Crne Gore za zajednički prosperitet“.

Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

- Realizovati projekte istraživanja terena za karte klizišta, debritnih tokova i ranjivosti podzemnih voda.
- Integrisati aktivnosti u nacionalni sistem ranog upozoravanja i planiranja zaštite od katastrofa.

Ministarstvo pomorstva

- Osigurati realizaciju planiranih aktivnosti, uključujući interresornu vježbu „Jadran 2025“.

Uprava za vode

- Završiti infrastrukturne projekte regulacije rijeka i rekonstrukcije nasipa, posebno u kritičnim zonama (Bojana, Lim).
- Unaprijediti tehničke kapacitete (GIS, monitoring, oprema) i koordinaciju sa lokalnim samoupravama.

Uprava za nekretnine

- Kontinuirano ažurirati prostorne podatke i e-servise, uz aktivno uključivanje lokalnih samouprava za potpunu ažurnost i dostupnost podataka.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

- Finansirati obuke meteorologa za primjenu AI i mašinskog učenja.
- Završiti migraciju podataka, revitalizaciju mreže podzemnih voda, rekonstrukciju seizmološke mreže i nabavku meteorološkog radara.
- Implementirati remote sisteme za monitoring južnog Jadrana.

Privredno društvo za gazdovanje šumama / Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

- Završiti izradu Preduzetnog plana za zaštitu i spašavanje od požara.
- Realizovati edukacije čuvara šuma i tehničara te unaprijediti tehničku opremu (dronovi, stanice za praćenje).

JP Nacionalni parkovi Crne Gore

- Realizovati video nadzor za rano otkrivanje požara, edukacije i formiranje preduzetnih jedinica.
- Nastaviti izradu planova zaštite i infrastrukture za gašenje požara.

Crveni krst Crne Gore

- Nastaviti promociju dobrovoljnog davalatstva krvi, obuke prve pomoći i psiho-socijalne podrške.
- Fokusirati se na ranjive grupe i obuke spasilaca.

Lokalne samouprave / Službe zaštite i spašavanja

- Kontinuirano razvijati plansku dokumentaciju: opštinske planove, lokalne strategije i procjene rizika od katastrofa.
- Pravovremeno tehnički opremiti službe (oprema, vozni park, vatrogasne stanice, sistemi obavještanja).
- Osigurati kadrovske kapacitete kroz radne grupe, obuke i digitalna rješenja, uz koordinaciju sa susjednim opštinama.

Ove aktivnosti su ključne za jačanje otpornosti gradova i omogućavaju efikasan odgovor na katastrofe, te unaprijeđenu sanaciju i obnovu u skladu sa principom Build Back Better.
