ID	Task Name	Duration	Start	Finish
0	**ŽIČARA - Pripremni, zemljani i AB radovi za stubove od Duba do Kuka**	**136 days**	**Mon 25/07/22**	**Thu 29/12/22**
1	**START**	**0 days**	**Mon 25/07/22**	**Mon 25/07/22**
2	**POČETNA STANICA**	**105 days**	**Mon 25/07/22**	**Wed 23/11/22**
3	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	2 days	Mon 25/07/22	Tue 26/07/22
4	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	92 days	Wed 27/07/22	Thu 10/11/22
5	Iskop za stubno mjesto i platformu	7 days	Fri 11/11/22	Fri 18/11/22
6	Temelj	4 days	Sat 19/11/22	Wed 23/11/22
7	**STUBNO MJESTO 01**	**16 days**	**Mon 25/07/22**	**Thu 11/08/22**
8	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	6 days	Mon 25/07/22	Sat 30/07/22
9	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	6 days	Tue 26/07/22	Mon 01/08/22
10	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Tue 02/08/22	Sat 06/08/22
11	Temelj	4 days	Mon 08/08/22	Thu 11/08/22
12	**STUBNO MJESTO 02**	**12 days**	**Mon 08/08/22**	**Sat 20/08/22**
13	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	3 days	Mon 08/08/22	Wed 10/08/22
14	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	3 days	Tue 09/08/22	Thu 11/08/22
15	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Fri 12/08/22	Tue 16/08/22
16	Temelj	4 days	Wed 17/08/22	Sat 20/08/22
17	**STUBNO MJESTO 03**	**23 days**	**Wed 17/08/22**	**Mon 12/09/22**
18	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	13 days	Wed 17/08/22	Wed 31/08/22
19	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	13 days	Thu 18/08/22	Thu 01/09/22
20	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Fri 02/09/22	Wed 07/09/22
21	Temelj	4 days	Thu 08/09/22	Mon 12/09/22
22	**STUBNO MJESTO 04**	**11 days**	**Thu 08/09/22**	**Tue 20/09/22**
23	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	2 days	Thu 08/09/22	Fri 09/09/22
24	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	2 days	Fri 09/09/22	Sat 10/09/22
25	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Mon 12/09/22	Thu 15/09/22
26	Temelj	4 days	Fri 16/09/22	Tue 20/09/22
27	**STUBNO MJESTO 05**	**50 days**	**Fri 16/09/22**	**Sat 12/11/22**
28	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	40 days	Fri 16/09/22	Tue 01/11/22
29	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	40 days	Sat 17/09/22	Wed 02/11/22
30	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Thu 03/11/22	Tue 08/11/22
31	Temelj	4 days	Wed 09/11/22	Sat 12/11/22
32	**STUBNO MJESTO 06**	**19 days**	**Wed 09/11/22**	**Wed 30/11/22**
33	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	9 days	Wed 09/11/22	Fri 18/11/22
34	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	9 days	Thu 10/11/22	Sat 19/11/22
35	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Mon 21/11/22	Fri 25/11/22
36	Temelj	4 days	Sat 26/11/22	Wed 30/11/22
37	**STUBNO MJESTO 07**	**14 days**	**Sat 26/11/22**	**Mon 12/12/22**
38	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	5 days	Sat 26/11/22	Thu 01/12/22
39	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	5 days	Mon 28/11/22	Fri 02/12/22
40	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Sat 03/12/22	Wed 07/12/22
41	Temelj	4 days	Thu 08/12/22	Mon 12/12/22
42	**STUBNO MJESTO 08**	**9 days**	**Thu 08/12/22**	**Sat 17/12/22**
43	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	1 day	Thu 08/12/22	Thu 08/12/22
44	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	1 day	Fri 09/12/22	Fri 09/12/22
45	Iskop za stubno mjesto i platformu	3 days	Sat 10/12/22	Tue 13/12/22
46	Temelj	4 days	Wed 14/12/22	Sat 17/12/22
47	**STUBNO MJESTO 09**	**22 days**	**Mon 25/07/22**	**Thu 18/08/22**
48	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	12 days	Mon 25/07/22	Sat 06/08/22
49	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	12 days	Tue 26/07/22	Mon 08/08/22
50	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Tue 09/08/22	Sat 13/08/22
51	Temelj	4 days	Mon 15/08/22	Thu 18/08/22
52	**STUBNO MJESTO 10**	**21 days**	**Mon 15/08/22**	**Wed 07/09/22**
53	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	11 days	Mon 15/08/22	Fri 26/08/22
54	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	11 days	Tue 16/08/22	Sat 27/08/22
55	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Mon 29/08/22	Fri 02/09/22
56	Temelj	4 days	Sat 03/09/22	Wed 07/09/22
57	**STUBNO MJESTO 11**	**56 days**	**Fri 02/09/22**	**Mon 07/11/22**
58	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Fri 02/09/22	Fri 02/09/22
59	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	46 days	Sat 03/09/22	Wed 26/10/22
60	Iskop za stubno mjesto i platformu	6 days	Thu 27/10/22	Wed 02/11/22
61	Temelj	4 days	Thu 03/11/22	Mon 07/11/22
62	**STUBNO MJESTO 12**	**49 days**	**Wed 02/11/22**	**Thu 29/12/22**
63	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Wed 02/11/22	Wed 02/11/22
64	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	40 days	Thu 03/11/22	Mon 19/12/22
65	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Tue 20/12/22	Sat 24/12/22
66	Temelj	4 days	Mon 26/12/22	Thu 29/12/22
67	**PRISTUPNI PUT**	**37 days**	**Mon 25/07/22**	**Mon 05/09/22**
68	Crtež nivelacije	7 days	Mon 25/07/22	Mon 01/08/22
69	Probijanje puta	30 days	Tue 02/08/22	Mon 05/09/22
70	**STUBNO MJESTO 19**	**13 days**	**Mon 05/09/22**	**Tue 20/09/22**
71	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Mon 05/09/22	Mon 05/09/22
72	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	5 days	Tue 06/09/22	Sat 10/09/22
73	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Mon 12/09/22	Thu 15/09/22
74	Temelj	4 days	Fri 16/09/22	Tue 20/09/22
75	**STUBNO MJESTO 18**	**8 days**	**Thu 15/09/22**	**Sat 24/09/22**
76	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Thu 15/09/22	Thu 15/09/22
77	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	0 days	Thu 15/09/22	Thu 15/09/22
78	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Fri 16/09/22	Tue 20/09/22
79	Temelj	4 days	Wed 21/09/22	Sat 24/09/22
80	**STUBNO MJESTO 17**	**11 days**	**Tue 20/09/22**	**Mon 03/10/22**
81	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Tue 20/09/22	Tue 20/09/22
82	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	3 days	Wed 21/09/22	Fri 23/09/22
83	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Sat 24/09/22	Wed 28/09/22
84	Temelj	4 days	Thu 29/09/22	Mon 03/10/22
85	**STUBNO MJESTO 16**	**28 days**	**Wed 28/09/22**	**Mon 31/10/22**
86	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Wed 28/09/22	Wed 28/09/22
87	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	20 days	Thu 29/09/22	Fri 21/10/22
88	Iskop za stubno mjesto i platformu	4 days	Sat 22/10/22	Wed 26/10/22
89	Temelj	4 days	Thu 27/10/22	Mon 31/10/22
90	**STUBNO MJESTO 15**	**24 days**	**Wed 26/10/22**	**Wed 23/11/22**
91	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Wed 26/10/22	Wed 26/10/22
92	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	15 days	Thu 27/10/22	Sat 12/11/22
93	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Mon 14/11/22	Fri 18/11/22
94	Temelj	4 days	Sat 19/11/22	Wed 23/11/22
95	**STUBNO MJESTO 14**	**20 days**	**Fri 18/11/22**	**Mon 12/12/22**
96	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Fri 18/11/22	Fri 18/11/22
97	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	11 days	Sat 19/11/22	Thu 01/12/22
98	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Fri 02/12/22	Wed 07/12/22
99	Temelj	4 days	Thu 08/12/22	Mon 12/12/22
100	**STUBNO MJESTO 13**	**17 days**	**Wed 07/12/22**	**Tue 27/12/22**
101	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Wed 07/12/22	Wed 07/12/22
102	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	8 days	Thu 08/12/22	Fri 16/12/22
103	Iskop za stubno mjesto i platformu	5 days	Sat 17/12/22	Thu 22/12/22
104	Temelj	4 days	Fri 23/12/22	Tue 27/12/22
105	**IZLAZNA STANICA**	**19 days**	**Fri 18/11/22**	**Sat 10/12/22**
106	Krčenje; Sječa drveća sa vađenjem panjeva	0 days	Fri 18/11/22	Fri 18/11/22
107	Pristupni put (iskop sa tamponiranjem)	8 days	Sat 19/11/22	Mon 28/11/22
108	Iskop za stubno mjesto i platformu	7 days	Tue 29/11/22	Tue 06/12/22
109	Temelj	4 days	Wed 07/12/22	Sat 10/12/22

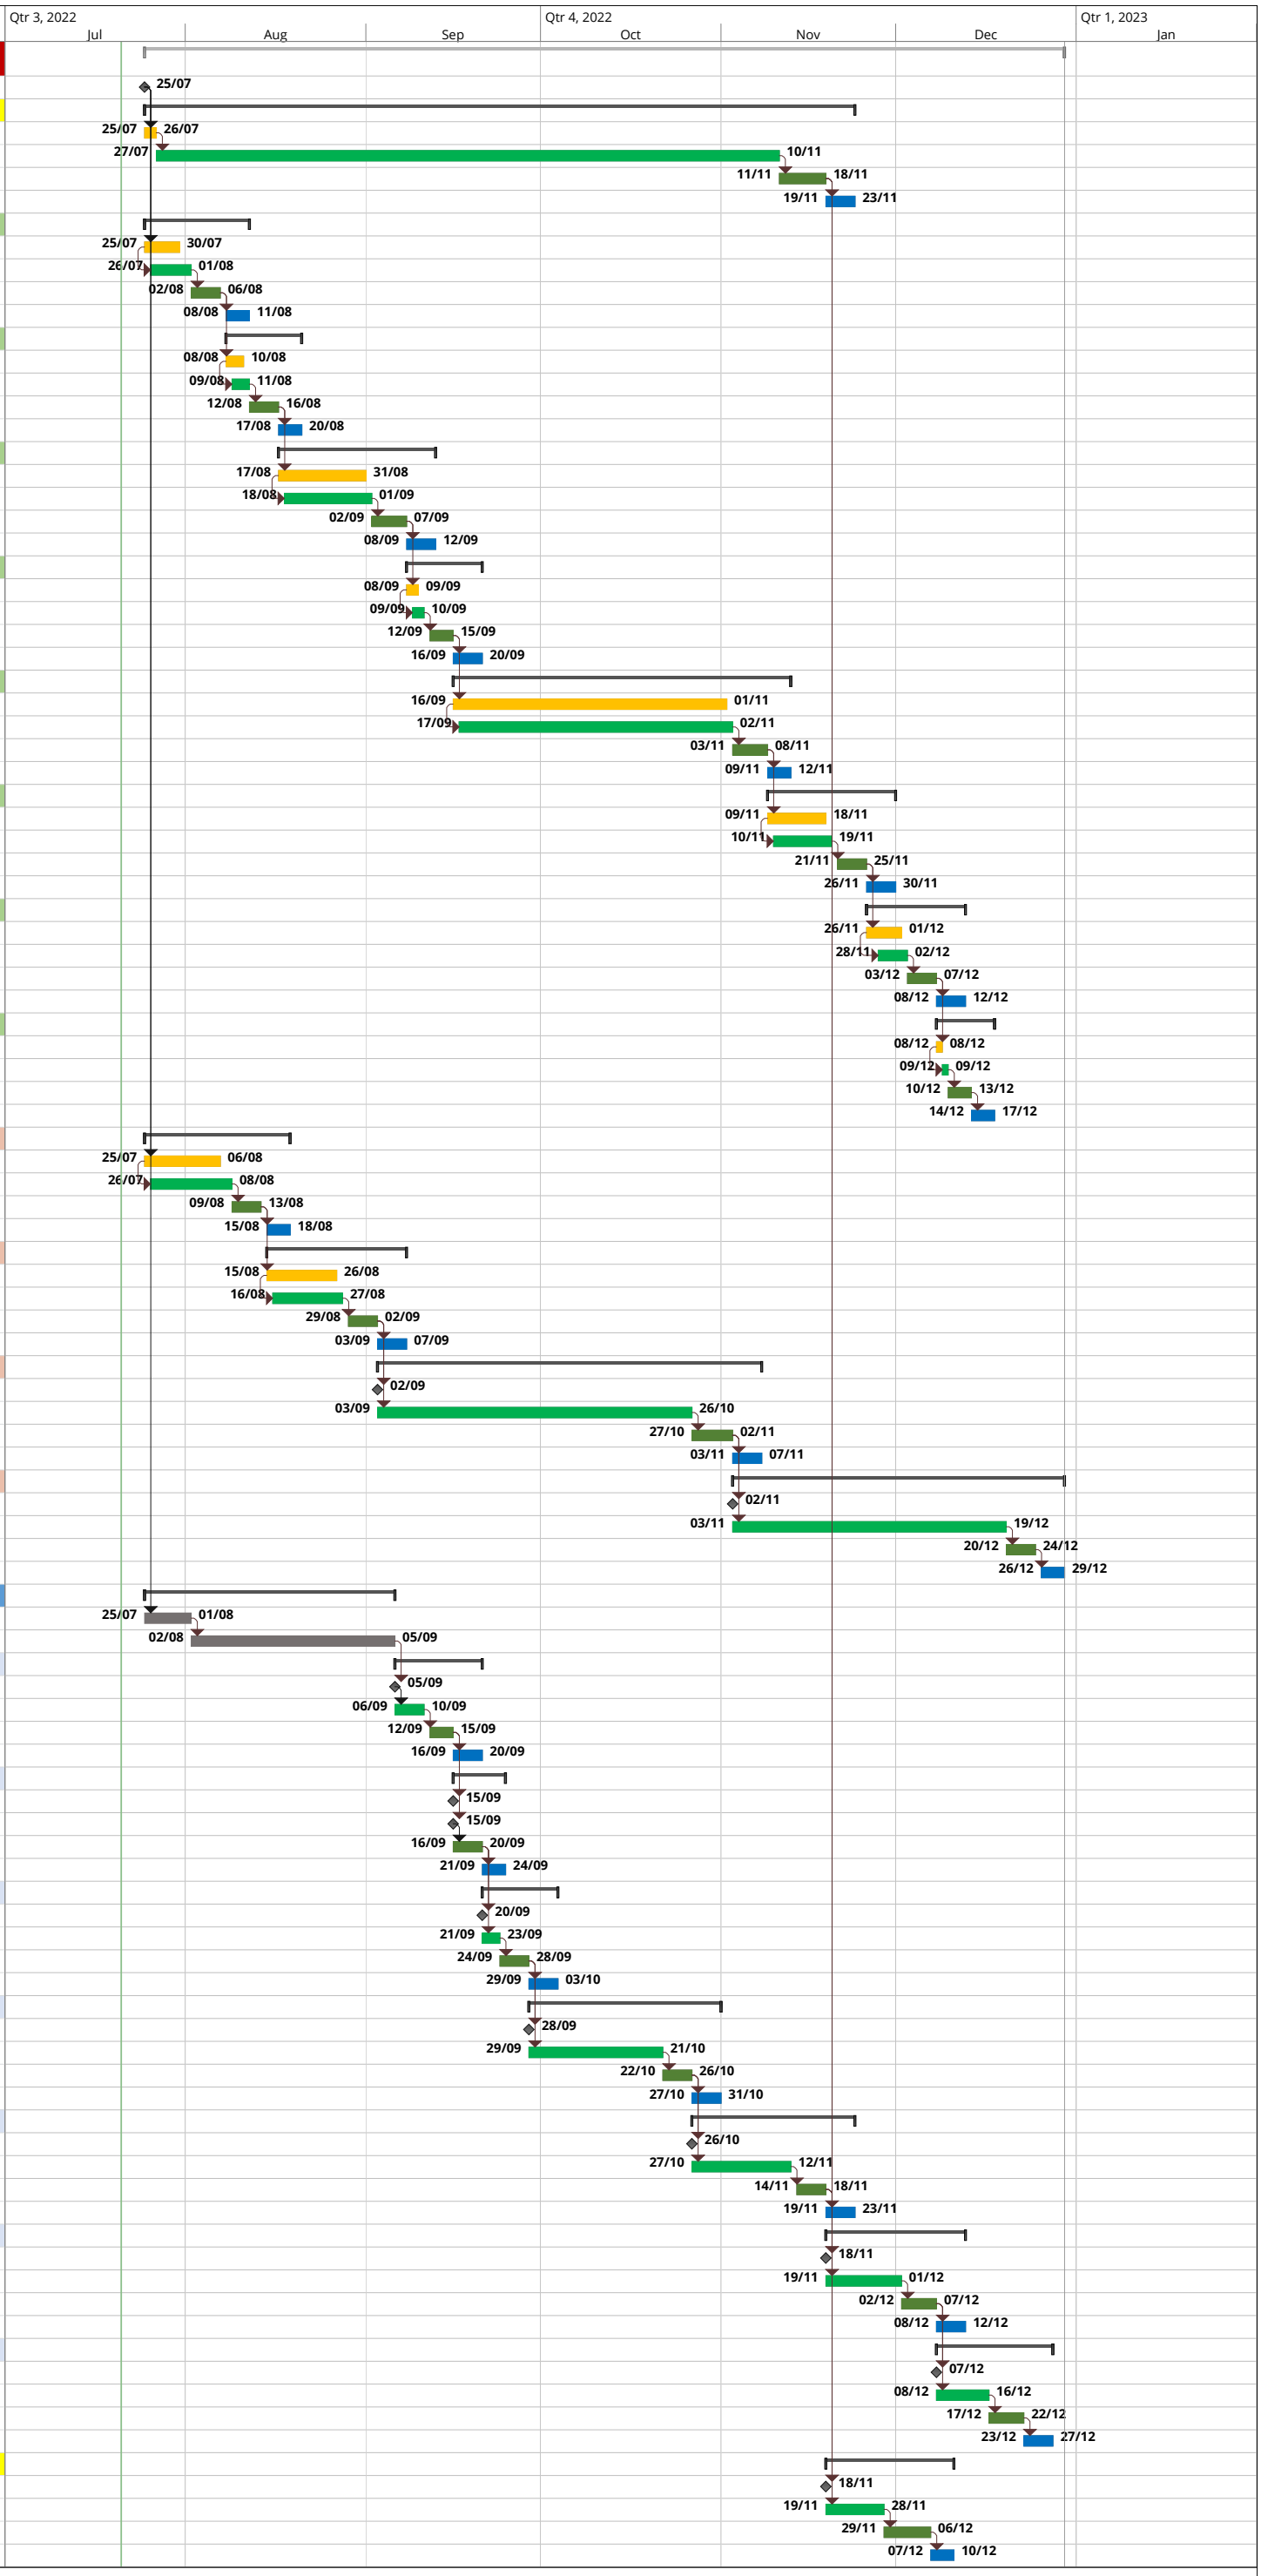

Project: ŽIČARA - Pripremni, zeml
Date: Thu 21/07/22

Task — Milestone — Project Summary — Pristupni put — AB radovi
Split — Summary — Krčenje — Iskop za stubno mjesto
